ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	4.3	$ 44,997.00	$ 193,487.10				**4.3**	$ 193,487.10	**4.3**	$ 193,487.10	**4.3**	**$ 193,487.10**	
2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	2.6	$ 44,596.00	$ 115,949.60				**2.6**	$ 115,949.60	**2.15**	$ 95,881.40	**2.15**	**$ 95,881.40**	
3	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	16	$ 64,772.00	$ 1,036,352.00	**16**			**16**	$ 1,036,352.00			**16**	**$ 1,036,352.00**	**100.00**
Subtotal					**$ 1,345,788.70**					**$ 1,345,788.70**		**$ 289,368.50**		**$ 1,325,720.50**	
	CIMIENTOS														
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1	$ 37,756.00	$ 37,756.00				**1**	$ 37,756.00					
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	3.6	$ 970,300.00	$ 3,493,080.00				**3.6**	$ 3,493,080.00					
6	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	4	$ 177,989.00	$ 711,956.00				**4**	$ 711,956.00					
Subtotal					**$ 4,242,792.00**					**$ 4,242,792.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	20	$ 135,290.00	$ 2,705,800.00	**15**			**20**	$ 2,705,800.00			**15**	**$ 2,029,350.00**	**75.00**
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	12	$ 226,850.00	$ 2,722,200.00	**2**			**12**	$ 2,722,200.00			**2**	**$ 453,700.00**	**16.67**
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 151,509.00	$ 909,054.00	**4**			**6**	$ 909,054.00			**4**	**$ 606,036.00**	**66.67**
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios deconexión unión y yee).	UND	2	$ 131,785.00	$ 263,570.00	**1**			**2**	$ 263,570.00			**1**	**$ 131,785.00**	**50.00**
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 35,912.00	$ 861,888.00				**24**	$ 861,888.00					
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18	$ 34,353.00	$ 618,354.00	**10.6**			**18**	$ 618,354.00			**10.6**	**$ 364,141.80**	**58.89**
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 60,276.00	$ 1,446,624.00				**24**	$ 1,446,624.00					
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H- 4"x3"	UND	3	$ 24,867.00	$ 74,601.00				**3**	$ 74,601.00					
Subtotal					**$ 9,602,091.00**					**$ 9,602,091.00**		**$ 0.00**		**$ 3,585,012.80**	
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA														
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m enambos sentidos (Incluye alambre negro, c	KG	140	$ 8,465.00	$ 1,185,100.00				**140**	$ 1,185,100.00					
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1.4	$ 1,683,739.00	$ 2,357,234.60				**1.4**	$ 2,357,234.60					
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 psi para Templetes o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esm	KG	212	$ 22,124.00	$ 4,690,288.00				**212**	$ 4,690,288.00					
Subtotal					**$ 8,232,622.60**					**$ 8,232,622.60**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	MAMPOSTERIA														
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	96	$ 78,212.00	$ 7,508,352.00	**5.94**			**96**	$ 7,508,352.00	**4.59**	$ 358,993.08	**10.53**	**$ 823,572.36**	**10.97**
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	48	$ 25,634.00	$ 1,230,432.00				**48**	$ 1,230,432.00					
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	48	$ 21,312.00	$ 1,022,976.00				**48**	$ 1,022,976.00				**$ 0.00**	
Subtotal					**$ 9,761,760.00**					**$ 9,761,760.00**		**$ 358,993.08**		**$ 823,572.36**	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	32	$ 114,516.00	$ 3,664,512.00	**27**			**32**	$ 3,664,512.00			**27**	**$ 3,091,932.00**	**84.38**
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	3	$ 25,452.00	$ 76,356.00				**3**	$ 76,356.00					
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	43	$ 25,282.00	$ 1,087,126.00	**20.89**			**43**	$ 1,087,126.00			**20.89**	**$ 528,140.98**	**48.58**
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	25	$ 28,214.00	$ 705,350.00				**25**	$ 705,350.00					
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	45	$ 40,566.00	$ 1,825,470.00				**45**	$ 1,825,470.00					
Subtotal					**$ 7,358,814.00**					**$ 7,358,814.00**		**$ 0.00**		**$ 3,620,072.98**	
	REVOQUES-RESANES														
26	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML	87	$ 23,937.00	$ 2,082,519.00	**85.77**			**87**	$ 2,082,519.00			**85.77**	**$ 2,053,076.49**	**98.59**
27	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M	ML	96	$ 25,679.00	$ 2,465,184.00	**50.4**			**96**	$ 2,465,184.00	**45.25**	$ 1,161,974.75	**95.65**	**$ 2,456,196.35**	**99.64**
28	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	54	$ 27,770.00	$ 1,499,580.00	**54**			**54**	$ 1,499,580.00			**54**	**$ 1,499,580.00**	**100.00**
Subtotal					**$ 6,047,283.00**					**$ 6,047,283.00**		**$ 1,161,974.75**		**$ 6,008,852.84**	
	CUBIERTAS														
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	230	$ 60,605.00	$ 13,939,150.00				**230**	$ 13,939,150.00					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
30	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	1840	$ 19,362.00	$ 35,626,080.00	950			1840	$ 35,626,080.00			950	$ 18,393,900.00	51.63
Subtotal					$ 49,565,230.00					$ 49,565,230.00		$ 0.00		$ 18,393,900.00	
	CIELO RASOS														
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	127	$ 99,472.00	$ 12,632,944.00				127	$ 12,632,944.00					
Subtotal					$ 12,632,944.00					$ 12,632,944.00					
	PISOS - ACABADOS														
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 mts	M2	223	$ 37,856.00	$ 8,441,888.00				223	$ 8,441,888.00	58.56	$ 2,216,847.36	58.56	$ 2,216,847.36	26.26
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INC	M2	223	$ 115,446.00	$ 25,744,458.00				223	$ 25,744,458.00					
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INC	M2	127	$ 231,382.00	$ 29,385,514.00				127	$ 29,385,514.00					
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PU	ML	42	$ 64,621.00	$ 2,714,082.00				42	$ 2,714,082.00					
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluyedestroncada, pulida y brillada + dilatacione	ML	4.2	$ 81,912.00	$ 344,030.40				4.2	$ 344,030.40					
Subtotal					$ 66,629,972.40					$ 66,629,972.40		$ 2,216,847.36		$ 2,216,847.36	
	ENCHAPES Y ACCESORIOS														
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (IN	M2	192	$ 116,107.00	$ 22,292,544.00				192	$ 22,292,544.00	76	$ 8,824,132.00	76	$ 8,824,132.00	39.58
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Coron	UND	8	$ 186,416.00	$ 1,491,328.00				8	$ 1,491,328.00					
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLO	UND	2	$ 589,982.00	$ 1,179,964.00				2	$ 1,179,964.00					
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	2	$ 57,852.00	$ 115,704.00				2	$ 115,704.00					
Subtotal					$ 25,079,540.00					$ 25,079,540.00		$ 8,824,132.00		$ 8,824,132.00	
	VIDRIOS Y ESPEJOS														
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	4	$ 218,441.00	$ 873,764.00				4	$ 873,764.00					
Subtotal					$ 873,764.00					$ 873,764.00		$ 0.00			
	APARATOS SANITARIOS														
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	11	$ 548,750.00	$ 6,036,250.00				11	$ 6,036,250.00					
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco linea Adriática Tipo Corona o Similar de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico + mueble abierto, para ALTA PRESION.	UND	1	$ 1,754,506.00	$ 1,754,506.00				1	$ 1,754,506.00					
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	4	$ 819,187.00	$ 3,276,748.00				4	$ 3,276,748.00					
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea STILO Color Blanco Tipo Corona Ref. 072591001 o similar (Incluye conjunto griferia galaxia 8", desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	14	$ 684,749.00	$ 9,586,486.00				14	$ 9,586,486.00					
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MANANTIAL DUO Color blanco Ref. 07411100k Tipo Corona o similar (Incluye sifon botella, desague sencillo y accesorios de conexión e instalacion) A todo costo	UND	1	$ 567,035.00	$ 567,035.00				1	$ 567,035.00					
Subtotal					$ 21,221,025.00					$ 21,221,025.00		$ 0.00			
	CARPINTERIA METALICA														
47	MINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA. SUMIN	M2	32.4	$ 826,377.00	$ 26,774,614.80				32.4	$ 26,774,614.80					
48	S SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. TIPO GRIJALBA O SIMILAR SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN	M2	32.4	$ 1,377,289.00	$ 44,624,163.60				32.4	$ 44,624,163.60					
49	SPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0,45 ACERO INOXIDABLE CAL.20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UND	2	$ 824,871.00	$ 1,649,742.00				2	$ 1,649,742.00					
Subtotal					$ 73,048,520.40					$ 73,048,520.40					
	PINTURA														
50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	2850	$ 31,193.00	$ 88,900,050.00	1548.1			2850	$ 88,900,050.00	1067.05	$ 33,284,490.65	2615.15	$ 81,574,373.95	91.76
51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	800	$ 36,419.00	$ 29,135,200.00				800	$ 29,135,200.00	766.98	$ 27,932,644.62	766.98	$ 27,932,644.62	95.87
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2	48	$ 46,546.00	$ 2,234,208.00				48	$ 2,234,208.00					
Subtotal					$ 120,269,458.00					$ 120,269,458.00		$ 61,217,135.27		$ 109,507,018.57	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	OBRAS EXTERIORES														
53	PODA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROXIMADO (INCLUYE RETIRO)	UND	30	$ 169,347.00	$ 5,080,410.00				**30**	$ 5,080,410.00					
54	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	48	$ 10,061.00	$ 482,928.00				**48**	$ 482,928.00					
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MALLA ESLABONADA Y ZÓCALO EN SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI	M2	187.2	$ 497,382.00	$ 93,109,910.40				**187.2**	$ 93,109,910.40	**186.88**	$ 92,950,748.16	**186.88**	**$ 92,950,748.16**	**99.83**
Subtotal					**$ 98,673,248.40**					**$ 98,673,248.40**		**$ 92,950,748.16**		**$ 92,950,748.16**	
	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA														
56	ASEO GENERAL	M2	1589	$ 4,023.00	$ 6,392,547.00	**500**			**1589**	$ 6,392,547.00			**500**	**$ 2,011,500.00**	**31.47**
Subtotal					**$ 6,392,547.00**					**$ 6,392,547.00**		**$ 0.00**		**$ 2,011,500.00**	
	ACUEDUCTO														
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	5	$ 76,099.00	$ 380,495.00	**5**			**5**	$ 380,495.00			**5**	**$ 380,495.00**	**100.00**
Subtotal					**$ 380,495.00**					**$ 380,495.00**		**$ 0.00**		**$ 380,495.00**	
	DESMONTES														
58	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	144	$ 16,685.00	$ 2,402,640.00	**128.1**			**144**	$ 2,402,640.00	**15.9**	$ 265,291.50	**144**	**$ 2,402,640.00**	**100.00**
59	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$ 68,615.00	$ 960,610.00	**11**			**14**	$ 960,610.00			**11**	**$ 754,765.00**	**78.57**
60	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	127	$ 25,190.00	$ 3,199,130.00				**127**	$ 3,199,130.00					
Subtotal					**$ 6,562,380.00**					**$ 6,562,380.00**		**$ 265,291.50**		**$ 3,157,405.00**	
	DEMOLICIONES														
61	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1	$ 202,654.00	$ 202,654.00				**1**	$ 202,654.00					
62	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	198	$ 11,483.00	$ 2,273,634.00	**181.5**			**198**	$ 2,273,634.00	**16.5**	$ 189,469.50	**198**	**$ 2,273,634.00**	**100.00**
63	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	192	$ 11,540.00	$ 2,215,680.00	**76.5**			**192**	$ 2,215,680.00			**76.5**	**$ 882,810.00**	**39.84**
64	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA	M3	72	$ 144,826.00	$ 10,427,472.00	**6.98**			**72**	$ 10,427,472.00			**6.98**	**$ 1,010,885.48**	**9.69**
65	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	3.6	$ 123,541.00	$ 444,747.60	**2.04**			**3.6**	$ 444,747.60			**2.04**	**$ 252,023.64**	**56.67**
66	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO hasta E=0.30 m. .	M2	14.4	$ 60,148.00	$ 866,131.20				**14.4**	$ 866,131.20					
67	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA h=0.10 m. .	ML	4.2	$ 36,004.00	$ 151,216.80	**4.2**			**4.2**	$ 151,216.80			**4.2**	**$ 151,216.80**	**100.00**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
68	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	448	$ 37,209.00	$ 16,669,632.00	**94.4**			**448**	$ 16,669,632.00			**94.4**	**$ 3,512,529.60**	**21.07**
69	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	48	$ 9,539.00	$ 457,872.00	**47.33**			**48**	$ 457,872.00			**47.33**	**$ 451,480.87**	**98.60**
Subtotal					**$ 33,709,039.60**					**$ 33,709,039.60**		**$ 189,469.50**		**$ 8,534,580.39**	
	JORNALES														
70	JORNAL AYUDANTE	DIA	5	$ 98,386.00	$ 491,930.00				**5**	$ 491,930.00					
Subtotal					**$ 491,930.00**					**$ 491,930.00**					
	ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
71	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	48	$ 10,371.00	$ 497,808.00				**48**	$ 497,808.00					
72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	635	$ 30,840.00	$ 19,583,400.00				**635**	$ 19,583,400.00					
73	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	287	$ 4,580.00	$ 1,314,460.00	**270**			**287**	$ 1,314,460.00			**270**	**$ 1,236,600.00**	**94.08**
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	143	$ 54,956.00	$ 7,858,708.00	**53.89**			**143**	$ 7,858,708.00			**53.89**	**$ 2,961,578.84**	**37.69**
75	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	6	$ 114,659.00	$ 687,954.00				**6**	$ 687,954.00					
76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2	$ 763,526.00	$ 1,527,052.00				**2**	$ 1,527,052.00	**2**	$ 1,527,052.00	**2**	**$ 1,527,052.00**	**100.00**
Subtotal					**$ 31,469,382.00**					**$ 31,469,382.00**		**$ 1,527,052.00**		**$ 5,725,230.84**	
TOTAL					$ 593,590,627					**$ 593,590,627**		**$ 169,001,012**		**$ 267,065,089**	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO		$ 593,590,627	VALOR ANTICIPO	0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 98,064,077		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 169,001,012		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0
SALDO POR EJECUTAR	$ 326,525,538		SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES	0			
SUMAS IGUALES	$ 593,590,627	$ 593,590,627	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 169,001,012		VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL DOCE PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0			
VALOR A PAGAR	$ 169,001,012			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	FIRMA
NOMBRE: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 900.811.229-4	C.C.75.031.453
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	1	DESCRIPCIÓN ITEM	**EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M**	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Apiques cimentacion Aula Maxima	1.10	1.10	0.89			4		**4.30**		
								TOTAL	**4.30**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

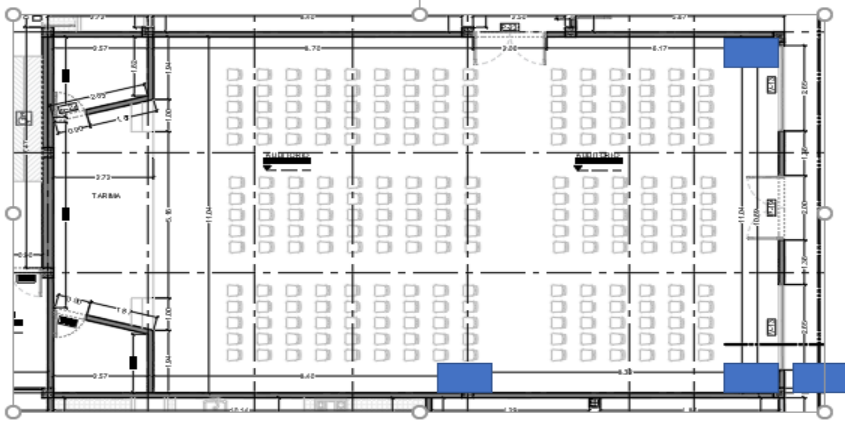









ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	**2**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)**	**Unidad de Medida**	**m3**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Apiques cimentacion Aula Maxima	1.10	1.10	0.89			2		**2.15**		
								TOTAL	**2.15**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

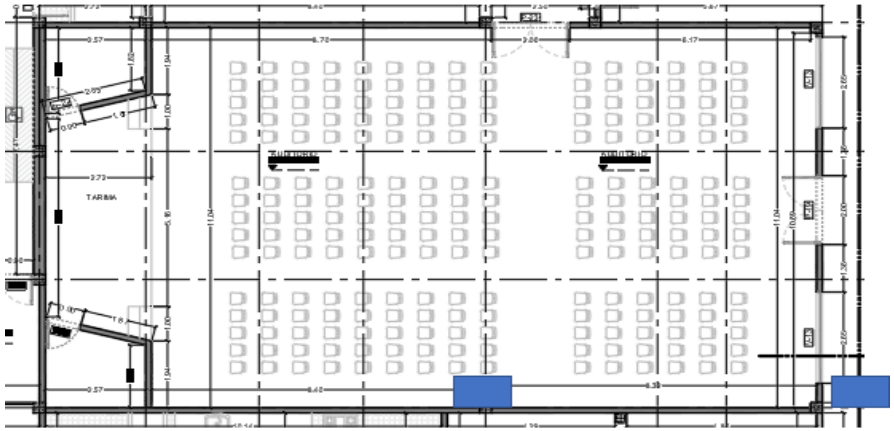









ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	18	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm.**	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Muro cuarto de Herramientas colegio	1.80		2.55			1		**4.59**		
12								**TOTAL**	**4.59**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

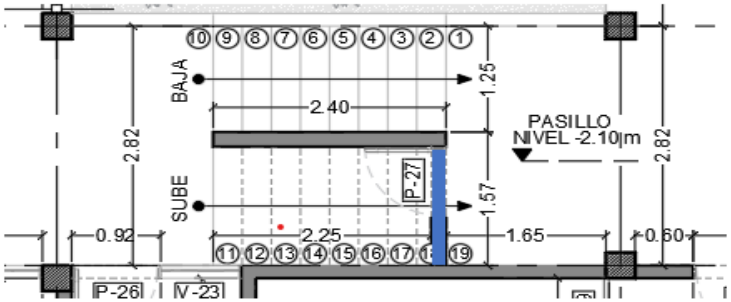





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	27	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M**	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Revoques fachada patios central- interna		1.70				1			**1.70**	
	Revoques fachada patios central -interna		2.70				1			**2.70**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.95				1			**2.95**	
	Revoques fachada patios central - interna		1.70				2			**3.40**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.70				2			**5.40**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.70				3			**8.10**	
	Revoques fachada patios central - interna		1.00				1			**1.00**	
	Revoques fachada patios central - interna		1.00				2			**2.00**	
	Revoques fachada patios central - interna		1.00				1			**1.00**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.00				4			**8.00**	
	Revoques fachada patios central - interna		1.75				2			**3.50**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.65				1			**2.65**	
	Revoques fachada patios central - interna		3.00				2			**6.00**	
	Revoques fachada patios central - interna		2.00				1			**2.00**	
	Revoques fachadas patio central salones		18.50				1		**12.50**		
	Revoques fachadas externa principal		8.40				1		**8.40**		
	Revoques fachadas externa principal lateral norte		17.85				1		**17.85**		
	Revoques fachadas externa Oeste		7.50				1		**6.50**		
								TOTAL	**45.25**	**50.40**	

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


VEICCON Ingeniería con responsabilidad


ITEM 27 **SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M**


ACTA PARCIAL DE OBRA No.02

ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

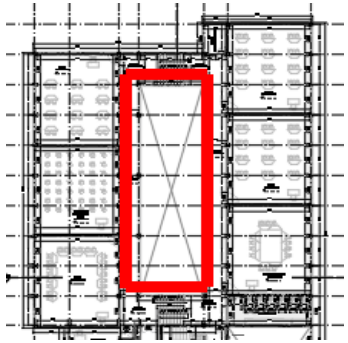

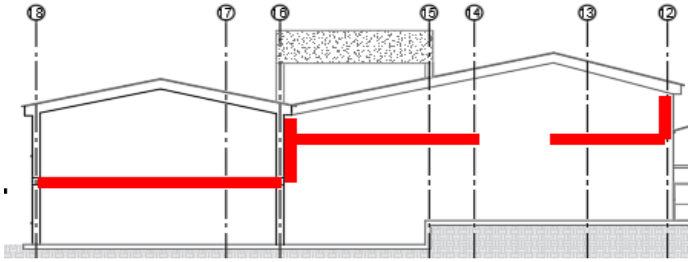


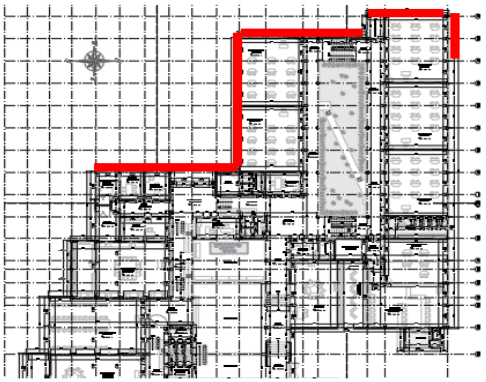







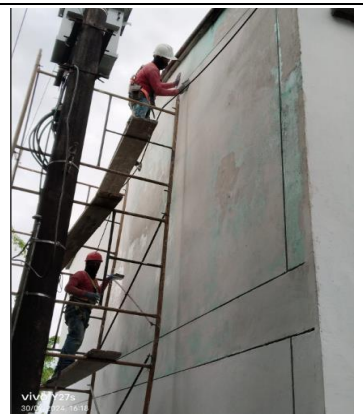

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	32	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 mts**	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Baños Bloque de salones primer piso	2.80	7.35				1		**20.58**		
	Baños Bloque de salones segundo piso	2.80	7.35				1		**20.58**		
	Laboratorio zona de meson 1	1.20	8.50				1		**10.20**		
	Laboratorio zona de meson 2	1.20	6.00				1		**7.20**		
								TOTAL	**58.56**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

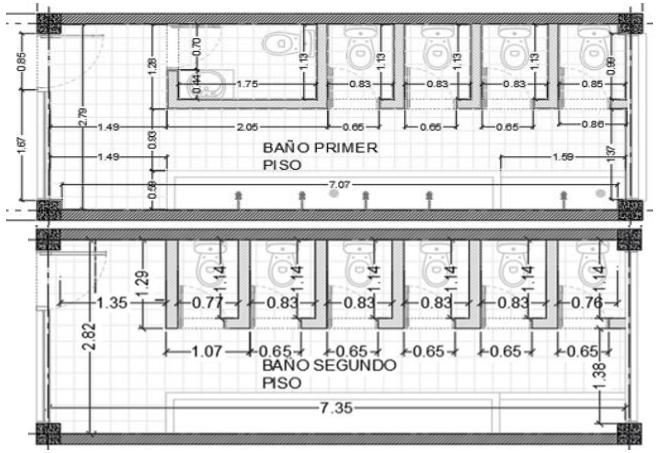

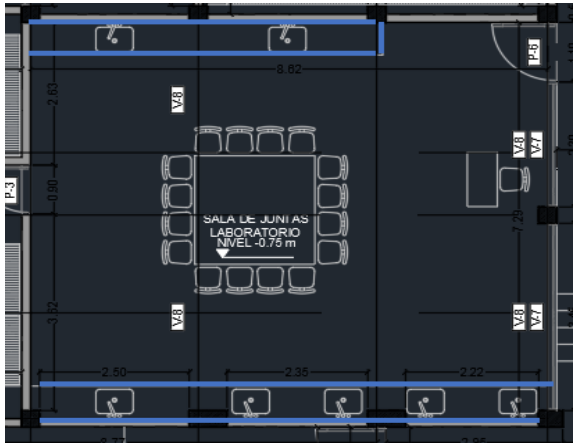









ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	37	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.**	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	muros baño piso dos		1.50	1.80			1		**2.70**		
2	muros baño piso dos		1.35	1.80			1		**2.43**		
3	columnas baños piso dos		0.44	1.80			2		**0.79**		
4	muros baño piso dos- bases mesones		0.60	0.90			4		**2.16**		
5	muros baño piso dos		1.75	1.80			1		**3.15**		
6	muros baño piso dos		7.00	1.80			1		**12.60**		
	muros baño piso dos		1.32	1.80			1		**2.38**		
	muros baño piso dos		0.36	1.80			7		**4.54**		
7											
8	muros baño piso uno		3.60	1.80			1		**6.48**		
9	muros baño piso uno		1.15	1.80			1		**2.07**		
10	muros baño piso uno		1.70	1.80			1		**3.06**		
11	muros baño piso uno		2.06	1.80			1		**3.71**		
12	muros baño piso uno		1.50	1.80			1		**2.70**		
12	muros baño piso dos		0.33	1.80			6		**3.56**		
12	muros baño piso uno		1.30	1.80			1		**2.34**		
12	muros baño piso uno		6.70	1.80			1		**12.06**		
12	muros baño piso uno		2.65	1.80			1		**4.77**		
12	columnas baños piso dos		0.40	1.80			1		**0.72**		
12	muros baño piso uno-bases mesones		0.60	0.90			7		**3.78**		
								TOTAL	**76.00**		


FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

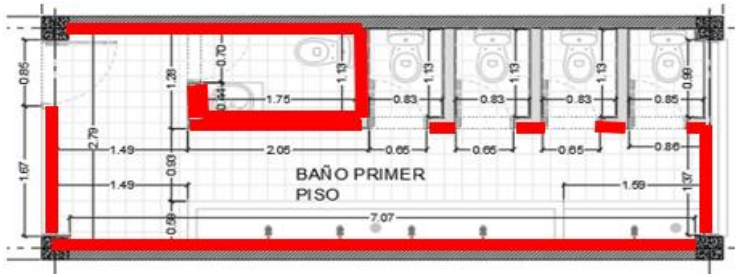

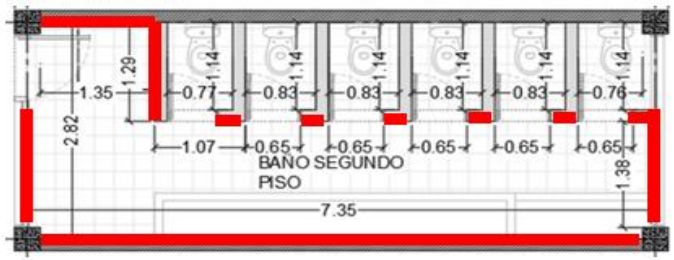













ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	50	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	7.50		2.55			2			38.25	
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	7.50		2.45			1			18.38	
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	8.70		0.95			1			8.27	
	Columna	0.76		1.70			3			3.88	
	Techo	7.40	8.70				0			-	
	SUBTOTAL SALON 1									**68.77**	
	SUBTOTAL SALONES 1,2 Y3						3			**206.30**	
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	7.50		2.55			2			38.25	
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	7.50		2.45			1			18.38	
	Salón 4 segundo piso Bloque salones		8.70	0.95			1			8.27	
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	0.80	8.70				1			6.96	
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	0.70	8.70				1			6.09	
	Cuchilla	7.55	1.60				1			6.04	
	SUBTOTAL SALON 4									83.98	
	SUBTOTAL SALONES 4,5,y 6						3			**251.94**	
	Salón 7									93.06	
	Cuchilla	7.55	1.60				1			6.04	
	SUBTOTAL SALON 7									99.10	
	SUBTOTAL SALON 7,8 Y 9						3			**297.30**	
	Salón 11		11.60	2.55			1			29.58	
	Salón 11	5.60		3.40			1			19.04	
	Salón 11	1.90		3.40			1			6.46	
	Salón 11		7.40	3.60			1			26.64	
	Salón 11	2.40		3.60			1			8.64	
	SUBTOTAL salon 11									**90.36**	
	Salón 12	9.59		2.55			1			24.45	

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Descuento ventana	2.65		0.43			-3			- 3.42	
	Descuento puerta	1.20		2.04			-1			- 2.45	
	Salón 12	9.89		2.55			1			25.22	
	Descuento ventana	2.65		1.68			-3			- 13.36	
	Salón 12	7.28		2.55			2			37.13	
	Techo placa	7.55	8.85				0			**-**	
	SUBTOTALsalon 12									**67.58**	
	SUBTOTAL salones 12y 13						2			**135.16**	
	TOTAL SALONES									**981.06**	
	Pasillo primer piso	2.55	26.50				1			67.58	
	Descuento puertas	1.20		2.05			-3			- 7.38	
	Descuento ventanas		2.68	0.42			-9			- 10.13	
	SUBTOTAL pasillo									**50.06**	
	Muro biblioteca		3.50	2.50			1			8.75	
	Centro de electricidad		3.50	2.50			1			8.75	
	Centro de electricidad		1.60	2.50			1			4.00	
	SUBTOTAL									**21.50**	
	Descuento puertas	1.20		2.05			-1			- 2.46	
	Descuento puertas	0.90		2.05			-1			- 1.85	
	Descuento puertas	0.80		2.05			-1			- 1.64	
	SUBTOTAL									**- 5.95**	
	SUBTOTAL									**15.56**	
	Pasillo profesores		20.75	2.57			1			53.33	
	Descuento puertas	1.21		2.07			-3			- 7.51	
	Descuento ventanas		2.70	0.45			-7			- 8.51	

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	pared lateral	3.40		2.54			1			8.64	
	columnas	1.22		2.57			2			6.27	
	columnas	0.90		1.57			3			4.24	
	SUBTOTAL									**56.45**	
	Pasillo baño profesores		7.60	2.54			1			19.30	
	Descuento puerta	0.92		2.04			-1			- 1.88	
	Descuento ventana	1.14		1.14			-1			- 1.30	
	Descuento ventana	1.20		0.45			-1			- 0.54	
	pared trofeos	3.87		2.84			1			10.99	
	SUBTOTAL									**26.58**	
	Pasillo salones 7,8 y 9		26.57	3.45			1			91.67	
	Descuento puerta	1.21		2.07			-3			- 7.51	
	Descuento ventana		2.69	0.45			-9			- 10.89	
	pared lateral fondo salon 7	3.48		2.96			1			10.30	
	antepecho escalera	1.56		0.73			1			1.14	
	Antepecho pasillo 7,8 y 9		26.30	0.85			1			22.36	
	Columnas	1.07		1.73			2			3.70	
	Columnas	0.90		1.73			3			4.67	
	Viga canal	20.90		0.54			1			11.29	
	Viga canal	20.90		0.67			1			14.00	
	Viga techo	1.50		1.19			2			3.57	
	SUBTOTAL									**144.28**	
	Pasillo 4,5,y 6						2			**288.57**	
	Columnas 1 piso y 2 piso		1.40	2.55			20			**71.40**	
	Columnas costado derecho baños		1.40	2.55			4			**14.28**	
	Cafeteria de los profesores		11.60	1.00			1			11.60	
	Cafeteria de los profesores		3.00	3.80			2			22.80	
	Cafeteria de los profesores		5.45	3.40			2			37.06	
	Cafeteria de los profesores		11.60	3.80			1			44.08	
	SUBTOTAL									**115.54**	
	Muros sala de coordinación		3.00	2.50			2		15.00		
	Muors sala de coordinación		4.46	2.55			1		11.37		
	Descuento ventana	1.17		1.20			1		1.40		
	SUBTOTAL								**24.97**		
	Muos Enfermeria		1.75	2.55			1		4.46		
	Muros Enfermeria		2.65	2.55			2		13.52		
	Muros Enfermeria		0.83	2.55			1		2.12		
	SUBTOTAL								**20.09**		
	Muro psicologia 1-esquina		3.60	2.55			2		18.36		
	Muro psicologia-esquina		2.55	2.55			2		13.01		
	Descuento ventana	1.00		0.40			3		1.20		

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Descuento puerta	0.90		2.05			1		1.85		
	SUBTOTAL								**28.32**		
	Muors Salon 10		6.05	3.60			1		21.78		
	Muros Salon 10		9.15	3.10			1		28.37		
	Muros Salon 10		5.05	3.92			1		19.80		
	Muros Salon 10		7.32	3.55			1		25.99		
	Muros Salon 10		1.10	3.15			1		3.47		
	Muros Salon 10		1.22	3.15			1		3.84		
	Descuento ventana	2.65		1.70			3		13.52		
	Descuento puerta	1.20		2.05			1		2.46		
	SUBTOTAL								**87.26**		
	Muros Salon 14-psicologia	5.60		2.58			2		28.90		
	Muros Salon 14--psicologia		8.80	2.58			2		45.41		
	Muros Descuento ventana		2.70	1.70			1		4.59		
	SUBTOTAL								**69.71**		
	Muros Antepecho escalera		4.40	1.10			2		9.68		
	Muros Antepecho salón		2.65	1.15			2		6.10		
	Muros Antepecho salón		5.60	1.15			2		12.88		
	Muros Antepecho salón		5.60	1.15			2		12.88		
	Muros Antepecho salón		5.60	1.15			2		12.88		
	SUBTOTAL								**54.42**		
	Muros Antepechos escaleras		6.00	1.15			2		13.80		
	Muros Antepechos escaleras		1.55	1.15			2		3.57		
	Muros Antepechos escaleras		2.50	1.15			2		5.75		
	SUBTOTAL								**23.12**		
	Muros Antepecho interno Escalera		1.55	1.50			2		4.65		
	Muros Antepecho interno Escalera		1.15	1.50			2		3.45		
	SUBTOTAL								**8.10**		

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Muros culata interna		3.85	3.50			2		26.95		
	Muros culata interna		3.80	3.35			2		25.46		
	SUBTOTAL								**52.41**		
	Muros Antepecho escalera		1.40	6.00			2		16.80		
	Muros Techo escalera	1.40	6.00				2		16.80		
	Techo escalera	2.50	2.70				2		13.50		
	SUBTOTAL								**47.10**		
	Muros Corredor primer piso	2.55		3.80			1		9.69		
	Muros Techo corredor	5.60	4.60				1		25.76		
	SUBTOTAL								**35.45**		
	Muros Pasillo hacia el aula multiple		16.10	2.55			1		41.06		
	Descuento puerta	1.20		2.10			1		2.52		
	Descuento ventana	1.65		1.50			1		2.48		
	SUBTOTAL								**36.06**		
	Muro rectoria	7.30		4.00			1		29.20		
	Descuento ventana	2.70		1.70			1		4.59		
	Descuento puerta	2.05		1.35			1		2.77		
	Muro pasillo rectoria entrada		6.00	4.30			1		25.80		
	Antepecho		1.90	0.90			1		1.71		
	Muro interno	1.40		2.35			1		3.29		
	SUBTOTAL								**52.64**		
	Muros Pasillo hacia la sala de informatica		7.50	2.55			1		19.13		
	Muros Pasillo hacia la sala de informatica		3.35	3.00			1		10.05		
	Muro baño niños		4.05	3.20			1		12.96		
	SUBTOTAL								**42.14**		
	Pasillo transicion		14.00	3.80			1		53.20		
	Descuento puertas	1.20		2.10			1		2.52		
	SUBTOTAL								**50.68**		

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Muro baño transicion		15.00	3.40			1		51.00		
	Descuento puerta	0.90		2.00			1		1.80		
	Muro baño transicion		2.85	3.20			1		9.12		
	Descuento puerta	0.90		2.00			1		1.80		
	Muro baño transicion		7.60	2.50			1		19.00		
	Muro baño transicion	3.85		3.20			1		12.32		
	Descuento puerta	1.20		2.00			1		2.40		
	Muro baño transicion	3.25		3.30			1		10.73		
	Descuento puerta	1.20		2.00			1		2.40		
	SUBTOTAL								**93.77**		
	Muro escalera		2.45	2.55			1		6.25		
	Muro baño de mujeres externo		6.46	2.55			1		16.47		
	Antepecho segundaria	2.90		0.80			1		2.32		
	Antepecho segundaria	4.50		0.80			1		3.60		
	Puerta principal	1.80		2.60			1		4.68		
	Muro acceso principal	1.80		3.90			1		7.02		
	Sala de espera	2.50		4.10			1		10.25		
	SUBTOTAL								**50.59**		
	Muros Laboratorio Quimica		8.80	3.50			2		61.60		
	Muros Laboratorio Quimica		7.30	3.35			1		24.46		
	Descuento ventana	1.40		3.40			2		9.52		
	Descuento puerta	1.20		2.00			1		2.40		
	Muros Laboratorio Quimica		7.30	2.70			2		39.42		
	Muros Descuento puerta	0.90		2.10			1		1.89		
	Muros Laboratorio Quimica		7.30	3.15			1		23.00		
	Muros Laboratorio Quimica		2.70	3.15			1		8.51		
	SUBTOTAL								**143.17**		
	Muros Cuarto de aseo		3.32	3.80			1		12.62		
	Muros Cuarto de aseo		3.43	2.74			1		9.40		
	Muros Cuarto de aseo		3.60	3.80			1		13.68		
	Descuento puerta	0.90		2.08			1		1.87		
	Descuento ventana	3.42		1.67			1		5.71		
	SUBTOTAL								**28.11**		

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Muros tesoreria		2.42	2.72			2		13.16		
	Muros tesoreria		2.84	2.72			2		15.45		
	Descuento ventana	2.60		1.70			1		4.42		
	Descuento puerta	0.86		2.06			1		1.77		
	SUBTOTAL								**22.42**		
	Muros Rectoria		2.85	2.72			1		7.75		
	Muros Rectoria		3.70	2.72			2		20.13		
	Muros Rectoria		2.72	2.72			1		7.40		
	Descuento ventana	2.60		2.72			1		7.07		
	Descuento puerta	0.90		2.06			2		3.71		
	SUBTOTAL								**24.50**		
	Muros Almacen rectoria		2.70	2.72			2		14.69		
	Muros Almacen rectoria		3.70	2.72			2		20.13		
	Descuento ventana	2.60		1.65			1		4.29		
	Descuento puerta	0.90		2.06			2		3.71		
	SUBTOTAL								**26.82**		
	Muros Bodega rectoria		5.70	4.35			1		24.80		
	Muros Bodega rectoria		2.85	3.90			2		22.23		
	Descuento ventana	2.65		1.65			1		4.37		
	Descuento puerta	0.90		2.85			1		2.57		
	SUBTOTAL								**45.22**		
								TOTAL	**1067.05**	**1548.10**	

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900.811.229-4


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			

ITEM 50 **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2**

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ZONAS EJECUTADAS
ACTA 2

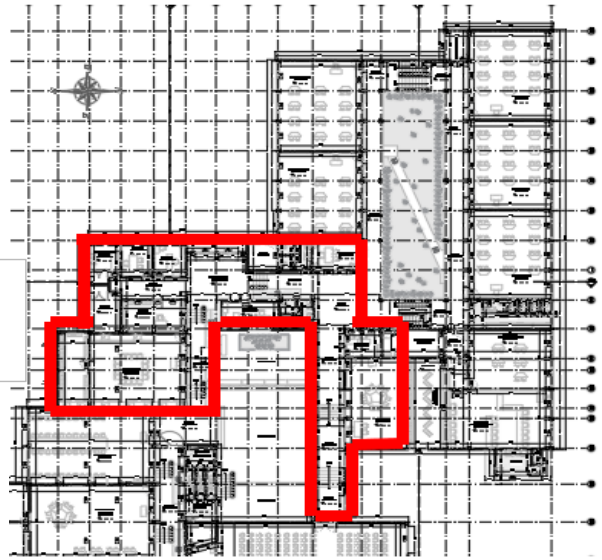





N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			









ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	51	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.**		Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Muros fachada principal rectoria- oeste		9.00	4.40			1		**39.60**		
	Descuento ventanas	2.65		1.70			1		**- 4.51**		
	Muros fachada principal rectoria- oeste		1.50	3.15			1		**4.73**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		5.40	4.40			1		**23.76**		
	Descuento puertas princiaples	1.80		2.50			2		**- 9.00**		
	Muros fachada principal rectoria- oeste		3.15	3.30			1		**10.40**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		2.60	3.50			1		**9.10**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		21.15	6.60			1		**139.59**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste nivel +2.50		6.20	2.50			1		**15.50**		
	Descuento ventanas		2.70	1.70			13		**- 59.67**		
	Descuento ventanas	2.70		0.45			1		**- 1.22**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		2.65	4.12			1		**10.92**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		1.70	4.12			1		**7.00**		
	Muros fachada principall rectoria- oeste		2.65	1.55			2		**8.22**		
	Descuento puertas princial	0.90		2.00			1		**- 1.80**		
	Muros fachada principal culata- oeste		15.00	6.62			1		**99.30**		
	Muros fachada principal culata- oeste		2.45	5.80			1		**14.21**		
	Muros fachada principal culata- oeste		9.44	6.50			1		**61.36**		
	Muros fachada principal norte		30.50	6.80			1		**207.40**		
	Descuento ventanas		2.65	1.70			18		**- 81.09**		
	Descuento ventanas		2.50	0.04			2		**- 0.20**		
	Muros fachada principal norte		12.55	4.40			1		**55.22**		
	Descuento ventanas		2.70	2.55			4		**- 27.54**		
	Muro fachada patios int- culata secretaria		5.60	5.20			1		**29.12**		
	Descuento ventanas	1.96		1.40			1		**- 2.74**		
	Muro fachada patios int- culata w.c profesores		2.75	6.50			1		**17.88**		

	Muro fachada patios int- culata salon 10		8.95	3.80			1		**34.01**		
	Descuento ventanas	2.60		1.70			1		**- 4.42**		
	columnas patios central		1.20	2.80			3		**10.08**		
	Muro fachada patios int- culata salon 10		3.00	5.10			1		**15.30**		
	Muro fachada patios int- culata salon 11		3.05	4.40			1		**13.42**		
	Descuento ventanas		2.65	1.70			1		**- 4.51**		
	Descuento ventanas		2.65	0.40			1		**- 1.06**		
	Muro fachada patios int- culata posterior		6.40	2.75			1		**17.60**		
	Muro fachada patios int- culata posterior		9.60	0.35			1		**3.36**		
	columnas patios central		1.20	2.80			2		**6.72**		
	columnas patios central		0.85	2.58			1		**2.19**		
	Muro fachada patios int- culata aula maxila		3.10	4.70			1		**14.57**		
	Muro fachada patios int- culata aula maxila		8.50	5.70			1		**48.45**		
	Muro fachada patios int- culata w.c primaria		3.60	4.62			1		**16.63**		
	Descuento ventanas		3.60	0.45			2		**- 3.24**		
	Muro fachada patios int- culata w.c primaria		4.02	5.05			1		**20.30**		
	Viga canal fachada patio central		10.95	1.10			1		**12.05**		
								TOTAL	**766.98**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

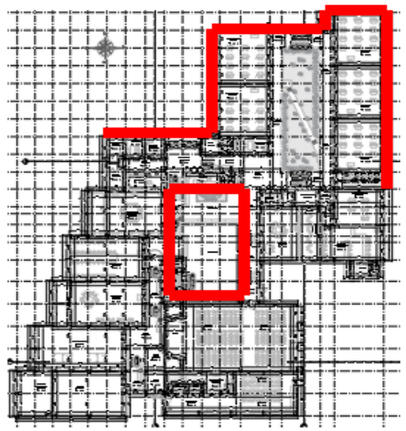











ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA


N° ITEM	55	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MALLA ESLABONADA Y ZÓCALO EN SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI		Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CERRAMIENTO NIVEL +0.00 CANCHA		15.00	5.50			1		**82.50**		
2	CERRAMIENTO NIVEL +2.80 -GRADAS		30.70	3.40			1		**104.38**		
								TOTAL	**186.88**		


FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

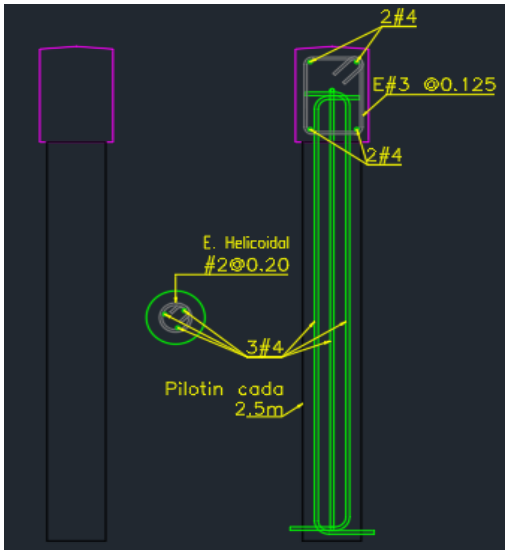

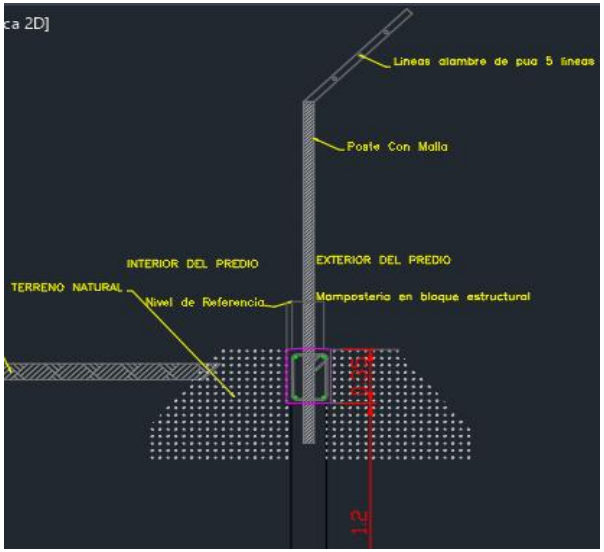

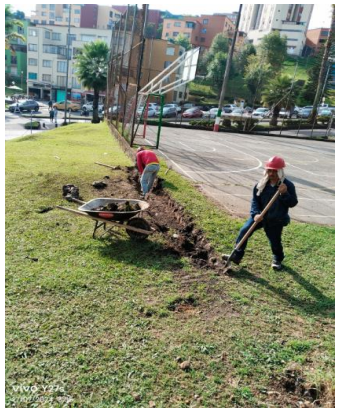










vivo Y27s


8 ago. 2024 2:03:24 p. m.
Manizales
Caldas
Gestión sst



ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	58	DESCRIPCIÓN ITEM	**DESMONTE CERRAMIENTO MALLA**	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	cerramiento nivel 1		15.50	5			1			**83.70**	
	cerramiento nivel 2		12.00	3.70			1			**44.40**	
	cerramiento nivel 1-reparacion de malla		7.95	2.00			1		**15.90**		
								TOTAL	**15.90**	**128.10**	

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1


FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	62	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Piso Aula multiple	11.00	9.00				1			**99**	
	Piso Aula multiple	11.00	7.50				1			**83**	
	Laboratorio zona de meson 1	1.20	8.50				1		**10.20**		
	Laboratorio zona de meson 2	1.20	5.25				1		**6.30**		
								TOTAL	**16.50**	**181.50**	

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

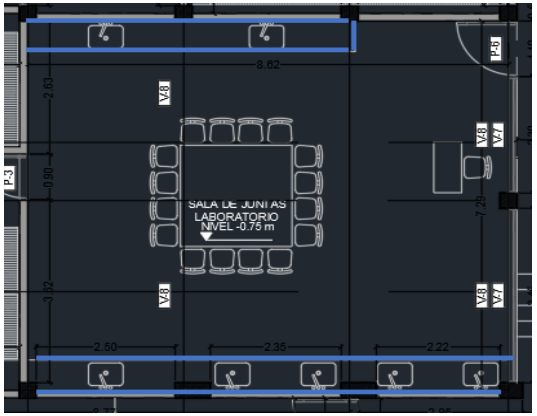
SALA DE JUNTAS
LABORATORIO
NIVEL -0.75 m
8.62
2.63
0.90
3.12
7.20
2.50
2.35
2.22
P-3
V-8
V-31
V-24





ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	20/08/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	76	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO**	Unidad de Medida	un

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	baños bloque de salones piso uno						1		**1.00**		
	baños bloque de salones piso uno						1		**1.00**		
								TOTAL	**2.00**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

