CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.

Número Contrato de Obra No: 244 DE 08/02/2023.
N° Contrato Secop II CO1, PCCNTR, 4338829



CONTRATISTA:
CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

Informe Técnico No 16
Informe Técnico de Gestión Social Contratista

DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2024

PEREIRA

INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA

3.2 INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL N° 016

Tabla de contenido

3.2 INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL N° 016.....2

INTRODUCCIÓN.....4

OBJETIVOS 5

OBJETIVO GENERAL.....5

OBJETIVOS ESPECIFICOS 6

IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE GESTIÓN SOCIAL.....7

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.....7

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD.....9

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 12

PAC Punto de atención a la comunidad 12

Buzón de Sugerencias. 14

Recepción y seguimiento de PQRS 15

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 16

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 19

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 23

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 28

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 29

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 31

MONITOREO DE MEDIOS 33

ANEXOS 35

INTRODUCCIÓN

En busca del desarrollo de un proyecto que cuente con la comunidad como aliado estratégico y facilitador de su ejecución, se desarrolló un Plan de Gestión Social, con el fin generar un acompañamiento social y un acercamiento a la comunidad y sus pobladores, promoviendo así la participación comunitaria y que a través de esta se conviertan en agentes de divulgación de la obra donde los habitantes del sector y aledaños se enteren del proceso de ejecución de obra y así mismo multipliquen la información.

Por medio de este documento se presenta el seguimiento realizado al PGS (Pla

n de Gestión Social)

correspondiente al contrato de obra N° 0244 de 2023, que tiene por objeto la **"construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa uno del Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de los Remedios"** a partir

de diferentes actividades realizadas durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar acompañamiento social alrededor y en beneficio del proyecto que corresponde al "Contrato de obra No. 0244 de 2023. "Construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa uno del Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de los Remedios", a través de programas que reduzcan o mitiguen los impactos generados por las diferentes actividades de obra, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible y a un fortalecimiento de las relaciones con la comunidad del área de influencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Proporcionar información clara, oportuna y confiable acerca del proyecto a las autoridades locales, representantes institucionales, organizaciones sociales y a la comunidad que se ubica en la zona de influencia directa del proyecto.
- Atender oportuna y eficazmente las inquietudes, solicitudes, sugerencias, quejas y/o reclamos ciudadanos derivados del contrato.
- Fomentar la apropiación del proyecto promoviendo su sostenibilidad y buen uso, generando consciencia de sus beneficios a los residentes y/o usuarios del sector.
- Promover la participación ciudadana para forjar sentido de pertenecía del entorno, como eje para la optimización en el desarrollo de los proyectos, mediante la interacción permanente, asertiva y oportuna con la comunidad del área de influencia.

- Facilitar la creación de espacios de participación ciudadana y generar los canales de comunicación que posibiliten el intercambio permanente de información entre la Gobernación de Risaralda, el contratista y la ciudadanía.

IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

El relacionamiento con la comunidad del área de influencia directa se constituye en la oportunidad de generar acompañamiento y procesos encaminados a la minimización de los impactos que pueden desarrollarse en la ejecución de las obras. Por tal razón, el Plan de Gestión Social aporta en el acompañamiento y la gestión de la disminución de estos.

En el cumplimiento de las obligaciones del contrato N°0244 de 2023 **“Construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa uno del Hospital Regional de Alta**

Complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de los Remedios”, durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024 se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento al programa de Gestión social.

Es importante mencionar que, Durante este mes, se llevaron a cabo actividades en los diferentes programas enmarcados en el PGS (Plan de Gestión Social) y así mismo se realizaron acciones que permiten el cumplimiento de aspectos contractuales con la entidad interventora.

- ✓ Información y divulgación
- ✓ Atención ciudadana
- ✓ Programa de infraestructura y servicios públicos
- ✓ Programa de participación comunitaria
- ✓ Programa de generación de generación de empleo
- ✓ Protección al patrimonio arqueológico y cultural
- ✓ Programa de monitoreo de medios

- ✓ Programa de sostenibilidad.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Este programa se desarrolla con el fin brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población ubicada en el AID (Área de Influencia Directa), durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024 se realizaron algunas actividades correspondientes a este ítem.

El jueves 15 de agosto se realiza diseño y envío de volante digital de invitación a reunión para lideres y representantes del sector Esperanza Galicia programada para el miércoles 21 de agosto a las 4:00 pm en el campamento de obra del edificio hospitalario de alta complejidad carolina Larrarte-Nuestra Señora de los Remedios, por medio de grupo de WhatsApp a 12 personas.

El miércoles 21 de agosto se realiza reunión mensual de seguimiento con lideres y representantes del área de influencia directa de la obra de construcción del hospital de alta complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de los Remedios, a la cual asisten 5 personas. En este espacio se atienden y resuelven inquietudes e inconformidades de los asistentes, además se establece el compromiso para septiembre, de programar una actividad con los lideres y representantes de la zona en la que se promueva la apropiación del territorio por medio de las narrativas construidas históricamente por los habitantes del área de influencia directa.

	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA **Secretaría de Salud** **Proceso de Obra Públicas e Infraestructura Física** **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE CONTRATISTA** **Versión 0, Vigencia 1-2020**



INDICADOR DE GESTIÓN

- Volantes programados 1 / volantes entregados 1* 100 = 100%

• Reuniones realizadas 1/ Reuniones programadas 1* 100 = 100%

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PAC Punto de atención a la comunidad

Para el cumplimiento del Plan de Gestión Social, es pertinente la implementación del PAC (punto de atención a la comunidad) donde se publicará horario de atención y número de contacto, para recepcionar las inquietudes; además, como actividades propias del programa se propicia la recepción de hojas de vida bajo las condiciones que permiten garantizar aspectos importantes como la contratación de personal habitante en el AID del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se mantiene instalado el pendón informativo en la entrada de la obra en el cual se exponen los días y horarios de atención a la comunidad (miércoles de 8:00 am a 5:00 pm y viernes de 8:00 am a 5:00 pm) y los canales de comunicación establecidos (dos correos electrónicos: social.hacp@gmail.com y pqrs.hacp@gmail.com) lo anterior, con el fin de que el dialogo con la comunidad sea más eficiente y eficaz, el punto de atención a la comunidad se encuentra establecido en la entrada de la

obra, allí se atenderán las inquietudes de la población en primera instancia y según sea necesario se harán pasar a las oficinas del campamento de obra.





Buzón de Sugerencias.

El buzón de sugerencias hace referencia a un canal de comunicación activa, lo cual permite garantizar la escucha por parte de los ejecutantes del proyecto y de esta manera atender a la población impactada.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se mantiene instalado el buzón de sugerencias en la entrada de la obra, con el fin de generar más cercanía con la comunidad, brindando diferentes herramientas por parte del área social para acceder a la comunicación con la población, durante este periodo se realizó la revisión del buzón de sugerencias una vez a la semana y no se encontraron novedades.



RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRS

Las PQRS hace referencia a una herramienta que permite conocer de manera formal inquietudes y manifestaciones que tiene la población impactada de manera directa, con el fin de fortalecer las herramientas de comunicación con la comunidad; son presentadas por parte de la comunidad a la coordinadora social de la obra, las cuáles serán recepcionadas en un formato establecido, se gestionarán y se les dará respuesta en un tiempo no mayor a 15 días hábiles,

como lo indica la ley. En caso de que los PQRS se refieran a temas técnicos o de diseño de la obra, estos se direccionaran a la entidad contratante.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28 julio y el 27 de agosto de 2024 no se recibió PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias).

INDICADOR DE GESTIÓN

PQRS atendidas 0 / PQRS interpuestas 0* 100 = 0%

Punto de atención a la comunidad instalado: 100%

Instalación de buzón de sugerencias: 100%

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La relevancia de los procesos relacionados con el levantamiento de las actas de vecindad como etapa central del programa, se constituye en la garantía de la

preservación del buen relacionamiento con la comunidad habitante y directamente involucrada en los procesos constructivos como salvaguarda del estado de las viviendas antes y después del desarrollo de la obra.

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem; es importante mencionar que las actas de vecindad de inicio proyectadas para este proyecto fueron realizadas y entregadas en el informe mensual N. 04 del área social del CEHR.

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA
Secretaría de Salud

Proceso de Obra Públicas e Infraestructura Física

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE CONTRATISTA
Versión 0, Vigencia 1-2020

CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	CRONOGRAMA PROYECCION ACTAS DE VECINDAD	CODIGO: NA
		FECHA:
		VERSION: 1

CONTRATO No. 0244 08/06/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD

PREDIO Nº	FECHA	DIRECCIÓN DEL PREDIO	BARRIO	ESTADO DEL ACTA	OBSERVACIÓN
1	11/07/2023	Institución educativa Esperanza Galicia	Esperanza Galicia	Finalizada	Sin observaciones
2	27/06/2023	vivienda N° 1	Esperanza Galicia	Finalizada	Vivienda informal
3	27/06/2023	vivienda N° 2	Esperanza Galicia	Finalizada	Vivienda informal
4	27/06/2023	vivienda N° 3	Esperanza Galicia	Finalizada	Vivienda informal
5	27/06/2023	vivienda N° 4	Esperanza Galicia	Finalizada	Vivienda informal
6	11/07/2023	Lote valdío	Esperanza Galicia	Finalizada	Propiedad de Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira
7	11/07/2023	Patio de maniobras para maquinaria	Esperanza Galicia	Finalizada	Propiedad de UTP
8	27/06/2023	Lote en construcción Gerenciar	Esperanza Galicia	Finalizada	Edificio de apartamentos Villa Palma
9	27/06/2023	via carreteable (acta de entorno)	Esperanza Galicia	Finalizada	Sin observaciones

INDICADOR DE GESTIÓN

Actas de vecindad levantadas 9 /Actas de vecindad programadas 9 * 100 =

100%

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La participación ciudadana es el mecanismo que permite contemplar a la población impactada por el proyecto con una participación directa, esto con el fin de mantener una aceptación general del proyecto reconociendo a la comunidad como parte activa del mismo, demostrando así el compromiso con una gestión eficaz, transparente e incluyente.

Es preciso aclarar que la ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías ciudadanas, las cuales son libres y autónomas en su conformación y deben ser creadas sin la intervención de la entidad contratista y la entidad contratante.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024 no se evidencia la conformación del comité veedor por parte de los habitantes del área de influencia directa de la obra, sin embargo, hasta la fecha se ha trabajado con lideres y representantes activos de la zona de influencia directa, por medio de reuniones en las que se socializan diferentes temas de importancia para la comunidad acerca de la obra y se atienden inquietudes.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se recibe por medio de correo electrónico social.hacp@gmail.com resolución No. 99 del 27 de agosto del 2024 por medio de la cual se inscribe y legaliza la veeduría ciudadana del proyecto de construcción del hospital regional de alta complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de Los Remedios en su primera etapa, es importante mencionar que los integrantes de esta veeduría ciudadana hacen parte de la mesa departamental de participación ciudadana de la contraloría.

El miércoles 21 de agosto a las 9:00 am en el campamento de obra, se recibe visita de tres representantes de la veeduría ciudadana del proyecto de

construcción del hospital regional de alta complejidad Carolina Larrarte-Nuestra Señora de Los Remedios en su primera etapa, esta reunión fue atendida por las profesionales sociales del CEHR (Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda) y del CIAC (Consorcio Interventoría Alta Complejidad), y por los ingenieros Juan David Colmenares y Juliana Llano del CIAC, con el fin de atender las inquietudes de la veeduría ciudadana y de realizar una exposición acerca de las áreas que conforman el proyecto y los avances técnicos desarrollados hasta la fecha, se realizó recorrido de obra, se realizó una socialización de los avances del área de arqueología y de los avances de la gestión social realizada. Finalmente, ante la petición de documentación levantada durante la ejecución del proyecto por las diferentes áreas del CEHR y el CIAC, se responde que ninguno de los consorcios cuenta con la facultad o competencia para realizar el envío de estos documentos, por tal razón deberá ser solicitada a la entidad contratante (Gobernación del Departamento de Risaralda).

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA
Secretaría de Salud

Proceso de Obra Públicas e Infraestructura Física

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE CONTRATISTA
Versión 0, Vigencia 1-2020



INDICADOR DE GESTIÓN

Actividades programadas 1 / Actividades realizadas 1 * 100 = 100%

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Para el desarrollo del proyecto es esencial brindar herramientas que contribuyan al mejoramiento del AID y de la calidad y condiciones de vida de sus pobladores, brindar el acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado es un mecanismo fundamental el crecimiento de las condiciones de vida favorables de la comunidad.


Los alcances de este programa son: generar ingreso en los hogares de las comunidades del AID que así lo requieran, además es importante la verificación de la inclusión de género en la obra y de realizar la clasificación del personal dentro de categorías como Afrodescendiente, indígena o desplazado.

En el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se implementó el formato MONC (Mano de Obra No Calificada); hasta la fecha se da cumplimiento a los porcentajes requeridos por la entidad contratante de que el 5% del personal contratado en la obra pertenezca al área de influencia directa y

de que el 5% de la mano de obra no calificada del área de influencia directa sean mujeres.

INDICADOR DE GESTIÓN

Personal contratado del AID 23 / Personal contratado 128 = 18% del personal contratado en obra pertenece al AID

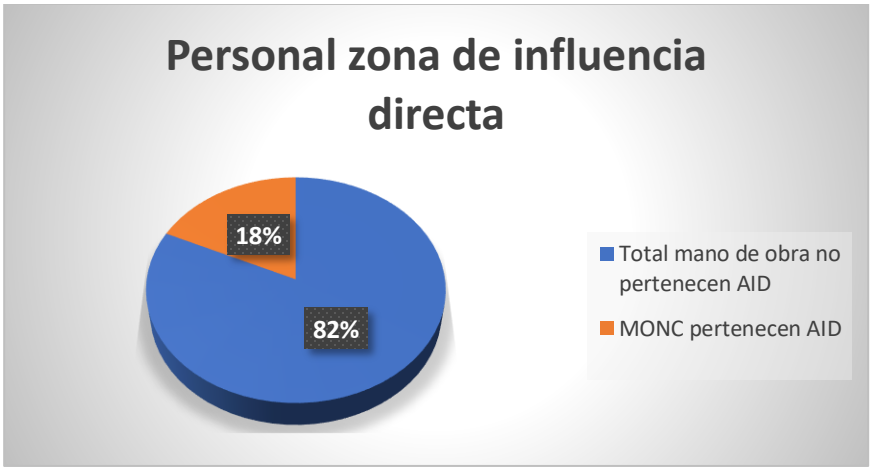

Total, de personal MONC contratado en obra 90/ Personal MONC perteneciente al AID 23*100 = 26% del personal MONC contratado en obra pertenece al AID



PERSONAL MONC FEMENINO CONTRATADO

Personal MONC femenino contratado 3/ Total, de personal MONC contratado en obra 90*100= 3% del personal MONC contratado son mujeres



Actualmente se encuentran contratadas y activas tres mujeres que corresponden a mano de obra no calificada, durante el periodo que comprende del 28 de julio al 27 de agosto no se da cumplimiento al requerimiento de la entidad contratante debido a que en esta fase de la obra ha aumentado la contratación de ayudantes y oficiales, cargos para los cuales no se ha postulado personal femenino.

El jueves 22 de agosto se realiza charla al personal de la obra de construcción sobre el tema “Derechos Humanos”, se realiza un conversatorio acerca de este

tema con el fin de brindar herramientas para el conocimiento de los Derechos Humanos y su importancia, se profundiza en que son los DDHH y su contextualización histórica, importancia de los DDHH a nivel individual y colectivo, reconocimiento de la individualidad y su importancia en el funcionamiento social. finalmente se realiza una reflexión que invita a considerar la importancia de respetar los Derechos Humanos desde los espacios en los que cada individuo se desarrolla en su cotidianidad.



INDICADOR DE GESTIÓN

Capacitaciones programadas 1 / Capacitaciones realizadas 1 * 100 = 100%

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Para el desarrollo histórico del país y de las comunidades es fundamental el reconocimiento del patrimonio arqueológico y su importancia, por tal razón se hace esencial que las poblaciones visualicen y refuercen el sentido de pertenencia y respeto por su territorio, su historia y se cultura.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se programa capacitación correspondiente al programa de Arqueología Pública del área de arqueología del CEHR para el miércoles 04 de septiembre del 2024 en la Institución Educativa Comunitario Cerritos.

INDICADOR DE GESTIÓN

Reuniones programadas 1 / Reuniones realizadas * 100 = 0%

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Con este componente se pretende generar estrategias de apropiación y sentido de pertenencia con la comunidad, lideres del área de influencia directa (AID) y con el comité de participación ciudadana una vez este esté conformado.

En este componente participarán las diferentes áreas de obra con el fin de plantear actividades pedagógicas.

El viernes 02 de agosto se realiza charla educativa acerca de inteligencia emocional, específicamente “como fomentar la inteligencia emocional desde el ámbito familiar” dirigida a la escuela de padres de la Institución Educativa Esperanza Galicia; en la charla se define y explica que es la inteligencia emocional, además se brindan herramientas que promueven el conocimiento, reconocimiento y desarrollo de las capacidades humanas que permiten potencializar la inteligencia emocional, se

repasan los estilos de crianza existentes con el fin de reflexionar sobre cual es el correcto, se incentiva un espacio de debate en el que se socializan herramientas como: la manera correcta de gestionar y expresar las emociones, como enseñar habilidades de regulación emocional, como fomentar la comunicación abierta, como promover la empatía, como establecer consecuencias consistentes, como practicar la resolución pacífica de los problemas, como reforzar el autoestima y la autocompasión y como nombrar y validar las emociones; esto con el fin de generar interiorización y apropiación del tema.



INDICADOR DE GESTIÓN

Estrategias y actividades programadas 1/ Estrategias y actividades generadas 1*

100

= 100%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2024 se realizó la actualización del archivo documental físico y digital del área social del Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda.

El viernes 02 de agosto se realiza actividad lúdica con el personal administrativo del CEHR (Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda) y el CIAC (Consorcio Interventoría Alta Complejidad) sobre reconocimiento de las emociones e inteligencia emocional, con el fin de reconocer las emociones que los seres humanos

atravesamos cotidianamente y las maneras saludables de transitarlas para mantener una buena salud mental.



El viernes 09 de agosto se envía documento con resumen de los sucesos ocurridos respecto al cierre del carreteable que atravesaba el predio dispuesto para la construcción del edificio de consulta externa y administración y de obras de urbanismo en su entorno inmediato. etapa uno del Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte – Nuestra Señora de los Remedios a el señor Juan Diego Santa, abogado de la Gobernación del Departamento de Risaralda con el fin

de proveer insumos para la respuesta de acción de tutela presentada por los lideres y representantes del área de influencia directa de la obra.

El lunes 26 de agosto se recibe correo electrónico de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Cerritos-Pereira con copia de repuesta emitida por la Gobernación del Departamento de Risaralda frente a la inconformidad de los lideres y representantes del área de influencia directa por no haber sido invitados a la visita del Señor Gobernador del Departamento de Risaralda al edificio en construcción el pasado 28 de junio del 2024.

MONITOREO DE MEDIOS

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 27 de agosto se reporta:

“MinSalud pasa revista a construcción del Hospital de Alta Complejidad” https://risaraldahoy.com/minsalud-pasa-revista-a-construccion-del-hospital-de-alta-complejidad/ Publicado el jueves 08 de agosto de 2024.

"Documento Confis asegura financiamiento para Hospital Regional del Alta Complejidad" https://www.eje21.com.co/2024/08/documento-confis-asegura-financiamiento-para-hospital-regional-de-alta-complejidad/ Publicado el miércoles 07 de agosto del 2024.

"El hospital de alta complejidad, despierta el civismo en Pereira" https://elpereirano.com/2024/07/31/el-hospital-de-alta-complejidad-despierta-el-civismo-en-pereira/ Publicado el 31 de julio del 2024.

"MinSalud avanza en la construcción del Hospital de Alta Complejidad" https://noticias360digital.com/2024/08/06/minsalud-proyecto-hospital/ Publicado el martes 06 de agosto del 2024.

"Descubriendo el pasado: curaduría de los vestigios arqueológicos encontrados en el lote de construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad" https://comunicaciones.utp.edu.co/69445/facultades/facultades-facultades-6/descubriendo-el-pasado-curaduria-de-los-vestigios-arqueologicos-encontrados-en-el-lote-de-construccion-del-nuevo-hospital-de-alta-complejidad/ Publicado el lunes 23 de agosto del 2024.

ANEXOS

- Actas y listado de asistencia
  Acta No. 29 del 02 de agosto del 2024
  Acta No. 30 del 21 de agosto del 2024
  Acta No. 31 del 21 de agosto del 2024

- Listado de asistencia de capacitación a personal de obra


- Formato MONC
  Formato de generación de empleo MONC

- Volantes entregados en formato digital
  Formato de entrega de volante digital a lideres y representantes del área de influencia directa a reunión programada para el 21 de agosto del 2024
  Volante de invitación a reunión enviado el 15 de agosto del 2024

- Formato de registro fotográfico

- Oficios y correspondencia

	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA **Secretaría de Salud** **Proceso de Obra Públicas e Infraestructura Física** **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE CONTRATISTA** **Versión 0, Vigencia 1-2020**



Elaboró: Prof. Maria Isabel Flórez Romero

Coordinadora Gestión Social

Consorcio Edificio Hospitalario Pereira

Contrato de Obra No: 0244 DE 08/02/2023
