INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO

NOMBRE PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR:	$ 1.036.471.855,00
TIPO DE RECURSO:	SPGR
VALOR APROBADO POR EL OCAD:	$ 1.036.471.855,00

1.2. VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

FUENTES APROBADAS	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL SGR	VALOR APROBADO
NACIÓN	SPGR	2024	$ 1.036.471.855,00

1.3. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
LP-019-2023	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$907.491.333
MC-010-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	$75.757.185
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 1.036.471.855,00**

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°	3538 de 2023
FECHA DEL ACUERDO:	16 de junio de 2023
NOMBRE PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
SECTOR:	DEPORTE Y RECREACIÓN
FASE:	FACTIBILIDAD FASE
VALOR:	$ 1.036.471.855,00
TIPO DE RECURSO:	SGR – ASIGNACIONES DIRECTAS

1.2. VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

FUENTES APROBADAS	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL SGR	VALOR APROBADO
DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR – ASIGNACIONES DIRECTAS	2023 - 2024	$ 1.036.471.855,00

1.3. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
LP-019-2023	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$907.491.333
MC-010-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	$75.757.185
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 983.248.518**

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

1.4. TRÁMITES SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD:

TIPO DE AJUSTE	ACUERDO / RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-010-2024	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DE CONTRATO:	$75.757.185
VALOR DE ADICIÓN:	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO:	$75.757.185
% DEL ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
CORREO ELECTRÓNICO:	interventoriaparqueslineales@gmail.com
FECHA DE INICIO:	14/05/2024
PRÓRROGA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN:	NO APLICA
REINICIO:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	13/11/2024
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	42%
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	42%
AVANCE FINANCIERO:	0%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024	PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

2. CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	NO APLICA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	NO APLICA
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA

3. AVANCE DEL PROYECTO

3.1. AVANCE GENERAL:

PERIODOS	PROGRAMADO			EJECUTADO		
	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
Periodo 1	MAYO	$25.746.620,47	$25.746.620,47	MAYO	$0	0$
Periodo 2	JUNIO	$89.361.879,78	$115.108.500,25	JUNIO	$28.280.695,50	$28.280.695,50
Periodo 3	JULIO	$271.171.507,50	$386.280.007,75	JULIO	$108.754.406,00	$137.035.101,50
Periodo 4	AGOSTO	$168.609.694,50	$554.889.702,25	AGOSTO	$84.304.848,25	$221.339.949,75

3.2. CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No. LP-019-2023	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR DE CONTRATO:	$907.491.333
VALOR DE ADICIÓN:	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO:	$907.491.333
% DEL ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
CONTRATISTA:	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CORREO ELECTRÓNICO:	manaconstrucciones2023@gmail.com

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					


FECHA DE INICIO:	14/05/2024
PRÓRROGA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN:	NO APLICA
REINICIO:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	13/11/2024
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	37%
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	19%
AVANCE FINANCIERO:	0%
OBSERVACIONES:	
El avance fisico programado del contrato de obra es del 37%, si tenemos en cuenta que el avance fisico ejecutado es del 19%, podemos evidenciar un retraso del 18% en la ejecución.	

AVANCE GENERAL CONTRATO DE OBRA

PERIODOS	PROGRAMADO			EJECUTADO			% AVANCE EJECUTADO
	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	MAYO	$19.433.521	$19.433.521	MAYO	$0		0%
Periodo 2	JUNIO	$76.735.682	$96.169.204	JUNIO	$15.654.498	$15.654.498	1,62%
Periodo 3	JULIO	$258.545.310	$354.714.514	JULIO	$96.128.208	$111.782.706	11,63%
Periodo 4	AGOSTO	$155.983.497	$510.698.011	AGOSTO	$71.678.649	$183.461.355	19,09%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

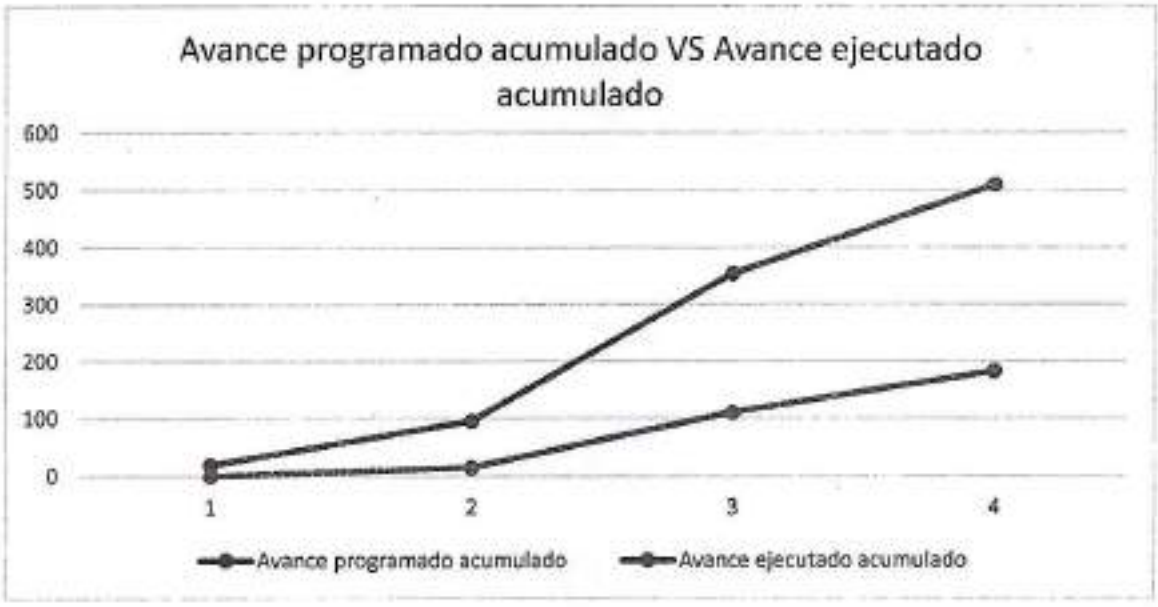

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

4. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 AVANCE INTERVENTORÍA

5.1.1 CONTROL DE COSTOS

AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
	Director	1	15%	3 meses	$630.000	$1`890.000
	Residente	1	100%	3 meses	$3`000.000	$9`000.000
	Siso	1	25%	3 meses	$500.000	$1`500.000
PERFIL TECNICO						
	Topógrafo	1	20%	3 meses	$500.000	$1`500.000
	Cadenero	1	20%	3 meses	$300.000	$900.000
PERFIL AUXILIAR						
SUBTOTAL PERSONAL						3
FACTOR MULTIPLICADOR						3
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$14.790.000

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	CANTIDAD	%	MESES	VALOR	VALOR TOTAL
Gastos administrativos mensuales (arriendo, servicios públicos, gasolina, papeleria, baños portátiles, etc)	2	100%	3	$800.000	$2`400.000
Ensayos de laboratorio de materiales y suelos: (Diseños de mezclas, rotura de cilindros, fuentes de material)	2	100%	3	$250.000	$750.000
Alquiler equipos topográficos	2	20%	3	$2`000.000	$1`200.000
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	
				TOTAL COSTOS	$4`350.000
				IVA (%)	
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	

Avance fisico programado 58,3% y avance fisico ejecutado 50%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024	PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)			

5.1.2 AVANCE GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODOS	PROGRAMADO			EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO
Periodo 1	MAYO	$6.313.098	$6.313.098	MAYO	$6.313.098	$6.313.098	8,33%
Periodo 2	JUNIO	$12.626.197	$18.939.296	JUNIO	$12.626.198	$18.939.296	24,99%
Periodo 3	JULIO	$12.626.197	$31.565.493	JULIO	$12.626.198	$31.565.493	41,66%
Periodo 4	AGOSTO	$12.626.197	$44.191.691	AGOSTO	$6.313.099	$37.878.593	50%

5.2 GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

5.2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
JUNIO 11/24	CBS-2024-001	NO INICIO DE LAS ACTIVIDADES	JOSE HERNANDEZ	MANA CONSTRUCIONES S.A.S.
JULIO 22/24		SOLICITUD DE PLAN DE CHOQUE	JOSÉ HERNANDEZ	MANA CONSTRUCIONES S.A.S.
JULIO 23/24		PRESENTACIÓN PLAN DE CHOQUE	MARÍA JULIA FAYAD	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

5.2.2 GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Director de Interventoria	Prepara informes de interventoría con la periodicidad requerida por el gerente responsable del contrato.
Residente de Obra	Preparar informes de interventoría con la periodicidad requerida por el gerente responsable del contrato.
Profesional Siso	

5.2.3 CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista presentó planilla de pago N°: 9471718370, correspondiente a mayo 2024.
El contratista presentó planilla de pago N°: 9471718041, correspondiente a junio 2024.
El contratista presentó planilla de pago N°: 9471717030, correspondiente a julio 2024.

Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

5.3 INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

5.3.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

5.3.2 GARANTÍAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado para el contrato de obra>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	B-100045320
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	B-100045320
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	13 DE JUNIO DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros mundial.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14-05-2024	14-03-2025	$90`749.133.30
Prestaciones Sociales	14-05-2024	12-11-2027	$90`749.133.30
Estabilidad de la obra	12-11-2024	12-11-2029	$90`749.133.30

5. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

6.1 PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: DIA/MES/AÑO AL DIA/MES/AÑO

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024			PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO						
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)						

6.2 PAGOS REALIZADOS INTERVENTORIA

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: DIA/MES/AÑO AL DIA/MES/AÑO

6. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

6.3 PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: DIA/MES/AÑO AL DIA/MES/AÑO

6.4 PAGOS REALIZADOS INTERVENTORIA

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: DIA/MES/AÑO AL DIA/MES/AÑO

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024	PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

7. GESTIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISION

7.1 ACTVIDADES REALIZADAS

	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES	CANTIDAD ASISTENTES	EVIDENCIA	RESPONSABLE SOCIAL SID
1	ACTA SOCIALIZACION CONFORMACION VEEDURIA CIUDADANA	PARQUE HOTEL COROZAL	10 de MAYO de 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, INTERVENTORIA, CONTRATISTA, ALCALDE MUNICIAPL, VEEDORES Y COMUNIDAD	30	ACTA	LUISA MARTINEZ
2	ACTA DE SOCIALIZACION, CONCEJO DE CULTURA Y PATRIMONIO	CASA DE LA CULTURA	21 de MAYO De 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y CONCEJO DE CULTURA Y PATRIMONIO	25	ACTA	LUISA MARTINEZ
3	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N°1 INICIO DE OBRA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	27 de MAYO de 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	10	ACTA	LUISA MARTINEZ
4	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N°2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	13 de JUNIO de 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	9	ACTA	LUISA MARTINEZ
5	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N°3	GOBERNACION DE SUCRE	19 de JULIO de 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	5	ACTA	LUISA MARTINEZ

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

				INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.			
6	ACTA DE COMITÉ DE OBRA Nº4	GOBERNACION DE SUCRE		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	4	ACTA	LUISA MARTINEZ

7.2 PETICIONES DE LA COMUNIDAD

TIPO DE PETICIÓN	CANAL DE RECEPCIÓN PETICIONES	No. RECIBIDAS		No. ABIERTAS		No. CERRADAS		OBSERVACIONES
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Denuncia								
Petición								
Queja								
Reclamo								
Solicitud información								
Sugerencia								
TOTAL								

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024	PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA, identificación de personal y costos directos ejecutados por la interventoria.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	%
	SOCIALIZACIÓN		100%






OBSERVACIONES
Se realizaron dos socializaciones antes del inicio de actividades, la primera ante la comunidad en general y ente municipal y la segunda ante el concejo de patrimonio del municipio de Corozal

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	%
	CERRAMIENTO		100%

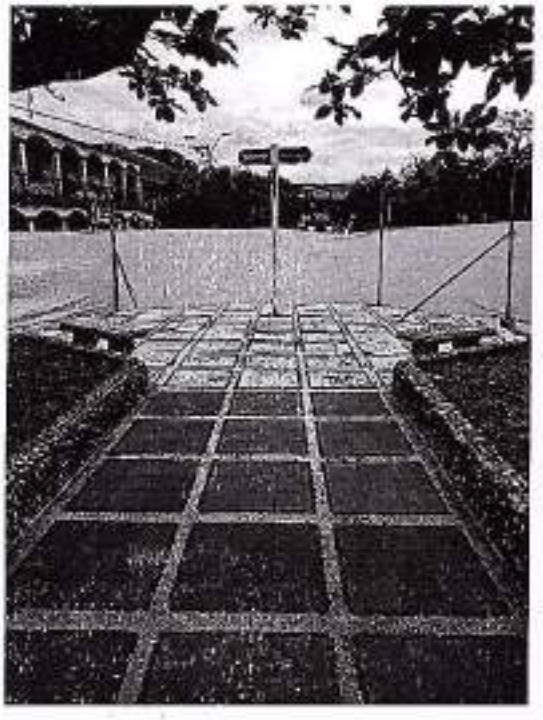




OBSERVACIONES
Se realizó el cerramiento perimetral de la obra y construcción de caseta de almacenamiento

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024	PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024		
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	%
	EXCAVACIONES		77%



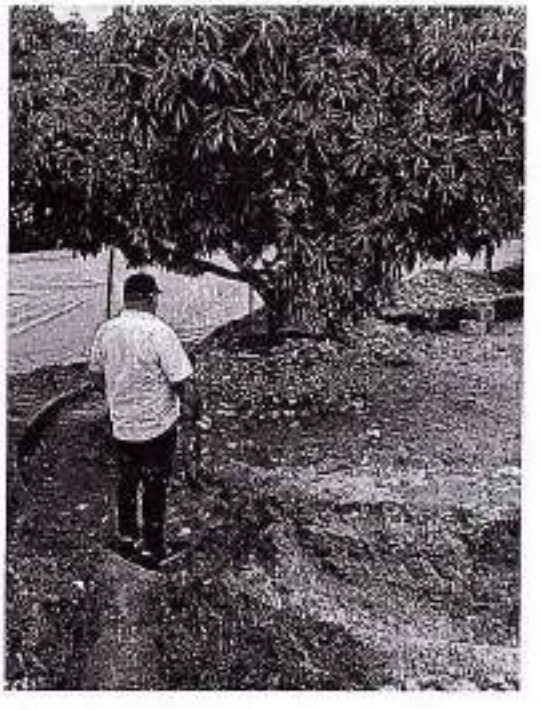

OBSERVACIONES
Se realizaron excavaciones perimetrales para construcción de muro de contención tipo 2 y viga de cimentación

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	%
	CONCRETO PARA MURO CONTENCIÓN		50%





OBSERVACIONES
Se realizó fundición de concreto para muro de contención y acero de refuerzo

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

INFORME No.	01	FECHA	27/08/2024		PERIODO	14 MAYO – 16 AGOSTO 2024	
CONTRATO N°	LP-019-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

9. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento de la labor de supervisión del *CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-010-2024 cuyo* objeto es: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.* Se viene realizando el seguimiento por parte de la entidad contratante, por medio de un grupo interdisciplinario de profesionales que se han encargado de la verificación del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales.

El avance físico programado del contrato de obra es del 37%, si tenemos en cuenta que el avance físico ejecutado es del 19%, podemos evidenciar un retraso del 18% en la ejecución. Se solicitó a la interventoría requerir al contratista de obra para la implementación de un plan de choque que debe ser ejecutado en el mes de agosto. A continuación, se presenta el balance de avance físico detallado.

10. ANEXOS

ACTA DE INICIO
PÓLIZAS
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 28 días del mes agosto del 2024.

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura - Supervisor

JULIO CÉSAR VILLEGAS SADDER
Apoyo a la Supervisión

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
www.sucre.gov.co

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO	LP-019-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	MANA CONSTRUCCIONES SAS
NIT	Nit. No. 901548710-2
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JULIA FAYAD PADILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	53.000.947
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($907.491.333),
PLAZO	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

En el **MUNICIPIO DE COROZAL**, a los 14 días del mes de mayo de 2024, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Corozal, los suscritos a saber, **JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO,** Secretario de Despacho código 020 grado 02 de la Secretaría de Infraestructura, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.102.794.721, expedida en Sincelejo – Sucre, en calidad de supervisor por parte de la Gobernación de Sucre, **MARÍA JULIA FAYAD PADILLA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.000.947, quien actúa como representante legal de **MANA CONSTRUCCIONES SAS**, NIT: 901548710-2 **CONTRATISTA** y **JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.550.719 expedida en Galeras – Sucre, representante legal de **CONSTRUCCIONES BETANIA SAS**, identificada con NIT:901465043-0, quien actúa como **INTERVENTOR,** según contrato de interventoría No. MC-010-2024, con el fin de dar inicio a la obra del contrato de la referencia una vez verificado los requisitos de legalización y ejecución.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.

Maria Julia Fayad P.

MARIA JULIA FAYAD PADILLA
CONTRATISTA

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
INTERVENTOR

Vo Bo. JORGE ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PROYECTÓ:	Julio Villegas	Profesional Universitario Secretaría Infraestructura

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gM1wSmYJTCn2E0NO84ybkIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

AVISO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1217-P-66-PPSS0308000000327-0002

No. PÓLIZA	8-1008112005	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22234425	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	12/11/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
ASEGURADO	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

EN EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE INICIO FECHA 14 DE MAYO DE 2024. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MANA CONSTRUCCIONES SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE SUCRE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	259.200,00
PATRONAL	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 200.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	259.200,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	259.200,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	50.215,00
TOTAL A PAGAR	$	314.501,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACIA - ACIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	8-100012005	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22234421	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	12/11/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE VÍAS - ANI

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22234421

Fecha de Facturación	05/06/2024		Fecha Limite de Pago	05/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	264.288,00
Póliza No.	8-100012005		IVA	50.215,00
Periodo Facturado	14/05/2024	12/11/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	314.503,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS	
CRA 5 7 CLL REAL		901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el mismo se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22234421

Fecha de Facturación	05/06/2024		Fecha Limite de Pago	05/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	264.288,00
Póliza No.	8-100012005		IVA	50.215,00
Periodo Facturado	14/05/2024	12/11/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	314.503,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS	
CRA 5 7 CLL REAL		901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000222344 21(3900)000000314503(96)20240705

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900222344 21(3900)000000314503(96)20240705

VIGILADO

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Punto Red · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gZSMrgol3w5dpv1G6T8r8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-65-PPSES1000000213-1001

No. PÓLIZA	8-100045328	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22234419	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	12/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.548.716-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	TELÉFONO	3214456338
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 #25B-35	TELÉFONO	6852799470
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 #25B-35	TELÉFONO	6852799470

OBJETO DE CONTRATO

EN EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE INICIO FECHA 14 DE MAYO DE 2024. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/05/2024	24:00 Horas Del 14/03/2025	90.749.133,30	136.049,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/05/2024	24:00 Horas Del 12/11/2027	90.749.133,30	476.246,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/11/2024	24:00 Horas Del 12/11/2035	90.749.133,30	817.190,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 272.247.399,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.429.485,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.429.485,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	272.552,00
TOTAL A PAGAR	$	1.707.037,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNER - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

SUJETO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | ECSA - 009

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS280000000059-D00I

No. PÓLIZA	8-100045320	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22134419	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	12/11/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguroseundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100045320** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **MANA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE SUCRE / DEPARTAMENTO DE SUCRE** , expedida por la Compañía en **05/06/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **05** dias del mes **JUNIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22234419

Fecha de Facturación	05/06/2024	
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	8-100045320	
Periodo Facturado	14/05/2024	12/11/2029

Fecha Limite de Pago	05/07/2024
Prima (Incluye gastos de expedición)	1.434.485,00
IVA	272.552,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.707.037,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el asegurador aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la contratación de este (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local, a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 830053212-7, el respaldo endoselo correctamente y diligencie los datos del girador (banco, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22234419

Fecha de Facturación	05/06/2024	
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	8-100045320	
Periodo Facturado	14/05/2024	12/11/2029

Fecha Limite de Pago	05/07/2024
Prima (Incluye gastos de expedición)	1.434.485,00
IVA	272.552,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.707.037,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque


Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1



(415)7709998434219(8020)(0000022234419(3900)(000001707037(96)20240705

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2



(415)7709998039935(8020)(031594(8020)(225908222344191(3900)(000001707037(96)20240705

VIGILADO

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre
