INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Leticia, 29 de febrero de 2024

Señor
CÉSAR CHÁVEZ PARRA
SUPERVISOR CONTRATO No. **49** (**CO1.PCCNTR.5817784)** de **2024**
No. de Proceso: GOB-AMA-CPS-049-2024
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación de Amazonas
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes **Enero** del año **2024**

Contrato No. 49 (CO1.PCCNTR.5817784) (GOB-AMA-CPS-049-2024) del año 2024

(NOMBRE DEL CONTRATISTA), identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.198.854 expedida en Bogota - Cundinamarca, en mi calidad de Contratista **PROFESIONAL ESPECIALISTA** - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL de la GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de **SETENTA Y SIETE MILONES DE PESOS M/CTE ($ 77.000.000)**. El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas así: ONCE (11) MENSUALIDADES vencidas por valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)** cada una.

Plazo: Será hasta el **28 de diciembre de 2024**.
(***Once (11) meses*** *– Fecha inicio: 29 de enero de 2024. Fecha fin: 28 de diciembre de 2024)*.

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO COMO APOYO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

Obligaciones Especificas:

No	**Obligación**
1	Apoyar y asesorar en el desarrollo de presupuestos, estudios y diseños de obra, de los proyectos que requiera adelantar la Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial en la formulación, evaluación y seguimiento de las áreas de infraestructura.
1.1	**Acciones realizadas**
Se apoya a la dirección de infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en la revision de los presupuestos contractuales de los proyectos en ejecucion: 1. REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	

Del mismo modo se hace seguimiento a las actividades contractuales de la interventoria contratada para llevar a cabo el seguimiento al componente vial del proyecto anteriormente enunciado.

2. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACTRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

3. CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACION DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

   Del mismo modo se hace seguimiento a las actividades contractuales de la interventoria contratada para llevar a cabo el seguimiento al componente vial del proyecto anteriormente enunciado.

1.2 **Evidencias**

Se realiza la revisión de memorias de cantidades del contrato de obra Pública No. 1544 de 2022 cuyo objeto es REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, las cuales reflejan cantidades diferentes a las contractuales, permitiendo llevar a cabo un balance de mayores y menores cantidades que permita optimizar el recurso económico y ampliar su alcance, lo anterior como:

Fecha 09-02-2024

MEMORIA DE CANTIDADES COMPONENTE SANEAMIENTO BASICO

REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

1	CONFORMACION NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE EXISTENTE	UNIDAD
INPPAV01		m2



Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
Ancho Calzada Izquierda	1194	6,60		1	7880,40
Ancho Calzada Derecha	1194	6,60		1	7880,40
Area Adicional Intersecciones	18,20	3,77		13	891,19
Bocacalles					-955,20
Calle 12 Calzada Derecha	2,5	10,10		1	25,25
Calle 11a Calzada Derecha	2,5	9,50		1	23,75
Calle 11 Calzada Derecha	2,5	15,80		1	39,50
Calle 10 Calzada Derecha	2,5	11,25		1	28,13
Calle 9 Calzada Derecha	2,5	9,40		1	23,50
Calle 8 Calzada Derecha	2,5	8,70		1	21,75
Calle 7 Calzada Derecha	2,5	10,30		1	25,75
Calle 6 Calzada Derecha	2,5	7,60		1	19,00
Calle 5 Calzada Derecha	2,5	7,30		1	18,25
Calle 4 Calzada Derecha	2,5	7,40		1	18,50
Calle 3 Calzada Derecha	2,5	14,00		1	35,00
Calle 12 Calzada Izquierda	2,5	10,10		1	25,25
Calle 11a Calzada Izquierda	2,5	9,50			0,00
Calle 11 Calzada Izquierda	2,5	15,80			0,00
Calle 10 Calzada Izquierda	2,5	11,25		1	28,13
Calle 9 Calzada Izquierda	2,5	9,40			0,00
Calle 8 Calzada Izquierda	2,5	8,00			0,00
Calle 7 Calzada Izquierda	2,5	8,70		1	21,75
Calle 6 Calzada Izquierda	2,5	7,60		1	19,00
Calle 5 Calzada Izquierda	2,5	7,30		1	18,25
Calle 4 Calzada Izquierda	2,5	7,40		1	18,50
Calle 3 Calzada Izquierda	2,5	6,00		1	15,00
TOTAL					16121,04
Elaboro	**Reviso y Aprobo**				**VoBo**

Página 3

Se realiza la revisión de memorias de cantidades del contrato de obra pública No. 1399 de 2023 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, las cuales reflejan cantidades diferentes a las contractuales, permitiendo llevar a cabo un balance de mayores y menores cantidades que permita optimizar el recurso económico y ampliar su alcance, lo anterior como:

Fecha 16-02-2024

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACTRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	SUB-TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES				Nueva Cantidad		
						CANT. MENOR	SUB-TOTAL	CANT. MAYOR	SUB-TOTAL	CANT. ACTUALIZADAS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL
CIRCUITO DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA												
1	ESTACION I. ARCO "EL PENSADOR"											
1.1	Tuberia rectangular metalica de 2"*1" C.18 para la estructura del "PENSADOR" soldada en los bordes y la parte superior de la estructura de la cubierta del puente . (Incluye sOldadura y montaje)	ML	85	$ 26,782.00	$ 2,276,470.00	-31.82	-$ 852,203.24			53.18	$ 26,782.00	$ 1,424,266.76
1.2	Suministro e instalacion de Fibra de vidrio + resina+ catalizador sobre la estructura metalica.	M2	58	$ 91,336.00	$ 5,297,488.00	-37.34	-$ 3,410,486.24			20.66	$ 91,336.00	$ 1,887,001.76
1.3	Pintura tipo Coraza y aerosoles a base de acrílico de mural artístico exterior de escultura de fibra de vidrio completos de la estructura metalica recubierta de fibra de vidrio, incluye diseño de mural y andamio.	M2	58	$ 64,869.00	$ 3,762,402.00	-58	-$ 3,762,402.00			0	$ 64,869.00	$ -
1.4	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)	UND	7	$ 273,348.00	$ 1,913,436.00					7	$ 273,348.00	$ 1,913,436.00
		SUBTOTAL			$13,249,796		-$8,025,091		$0	SUBTOTAL		$5,224,705
2	ESTACION II. ARCO "GEOMETRIA TRADICIONAL MAGÜTA"											
2.1	Tuberia rectangular metalica de 2"*1" C.18 para la estructurade la Mandala soldada en los bordes y en la parte superior del la estructura de la cubierta del puente	ML	83	$26,773	$2,222,159	-43.42	-$ 1,162,483.66			39.58		$ 1,059,675.34

Se realiza la revisión de memorias de cantidades del contrato de obra Pública No 1036 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, dado a que la firma constructora requiere pago parcial:

Fecha 23-02-2024

GOBERNACION DEL AMAZONAS
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

ACTA No. 2 de Modificacion 1 — TIPO DE CONTRATO: OBRA

PROYECTO: FORTALECIMEINTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANCHAS AMAZONAS 2022 — CONTRATO No. 1036 del 10 de mayo de 2023

SUPERVISOR: PSI - PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS — CONTRATO No. 0980 del 27 de marzo de 2023

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
	CANCHA NUEVO PARAISO										
I.	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PORTERIA	M2	810.96	7,370.15	$ 5,976,897.63		220.56		$ 1,625,560.28	590.40	$ 4,351,336.56
1.2	CAMPAMENTO	M2	25.00	201,004.12	$ 5,025,102.94					25.00	$ 5,025,103.00
1.3	CERRAMIENTO EN LONA (POLISOMBRA) INCLUYE PARALES EN MADERA Y ALTURA A 3,5 MTS	ML	118.50	26,800.55	$ 3,175,865.06		8.56		$ 229,412.71	109.94	$ 2,946,452.47
1.4	EXCAVACIONES MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO INCLUYE DESCAPOTE, NIVELACION, COMPACTACION Y RETIRO DE SOBRANTES.	M3	242.34	53,601.10	$ 12,989,690.09	140.77		$ 7,545,426.85	$ 0.00	383.11	$ 20,535,117.00
1.5	CUNETEO ENCOLES Y DESCOLES DEL CAMINO MANUAL - ZANJAS INCLUYE RETIRO MAX 2 KM	ML	104.40	13,400.27	$ 1,398,988.66		2.80	$ 0.00		101.60	$ 1,361,467.43
	SUB - TOTAL				$ 28,566,544.38			$ 7,545,426.85	$ 1,854,972.99	113.53	$ 34,219,476.46
II.	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
2.1	BASE ESTABILIZADORA EN ARENA - CEMENTO EN PROPORCION 1 : 5 PARA PLACA EN CONCRETO DE ESPESOR 0.05 METROS. INCLUYE FORMALETA BORDES Y COMPACTACION CON RANA.	M2	615.60	60,301.24	$ 37,121,440.42		25.20	$ 0.00	$ 1,519,591.25	590.40	$ 35,601,852.10

No	Obligación
2	Apoyar en la elaboración de informes, actas de inicio, cierre y demás actos administrativos, hasta la liquidación de proyectos de infraestructura.
2.1	**Acciones realizadas**


1. Se apoya a la Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en la elaboracion del acta de ampliacion No. 01 de la suspensión No. 01 del contrato de consultoria No. 1010 de 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE LA ES HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, AMAZONAS.

2. Se apoya a la Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en la elaboracion del acta de Reinicio No. 01 de obra pública No. 1399 de 2023 cuyo objeto es OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

3. Se proyecta modelo de informe estándar de interventoría y de supervisión, para que se pueda llevar a cabo la revisión de los proyectos de inversión de manera clara y precisa sobre los componentes técnicos, jurídicos, ambientales y financieros de cada uno.

2.2	**Evidencias**

Fecha 29-01-2024

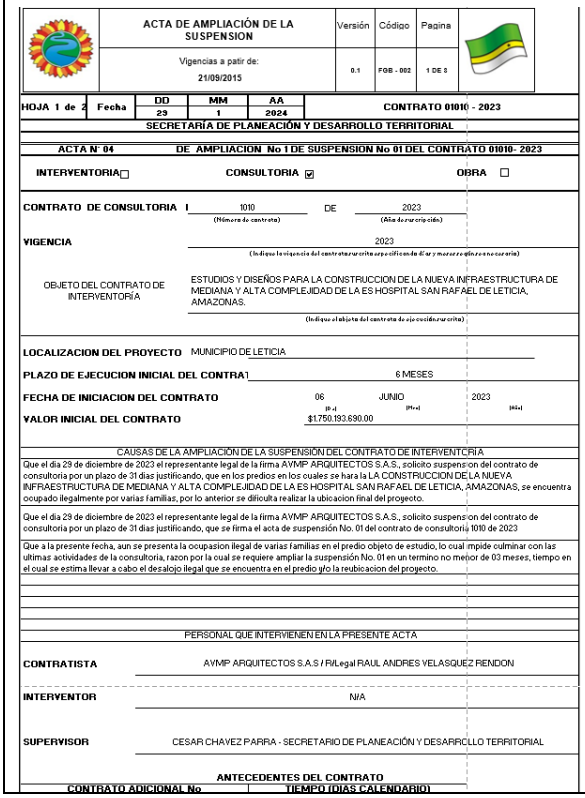

ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION | Versión 0.1 | Código FGB - 002 | Pagina 1 DE 3

Vigencias a patir de: 21/09/2015

HOJA 1 de 2 | Fecha DD 29 MM 1 AA 2024 | CONTRATO 01010 - 2023

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA N° 04 DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 01 DEL CONTRATO 01010- 2023

INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☑ OBRA ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA 1010 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2023 (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando el año y mencione si es prorroga o no el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE LA ES HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, AMAZONAS. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE LETICIA

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRA1: 6 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06 (D-d) JUNIO (M-m) 2023 (Aa)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.750.193.690,00

CAUSAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que el dia 29 de diciembre de 2023 el representante legal de la firma AVMP ARQUITECTOS S.A.S., solicito suspension del contrato de consultoria por un plazo de 31 dias justificando, que en los predios en los cuales se hara la LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE LA ES HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, AMAZONAS, se encuentra ocupado ilegalmente por varias familias, por lo anterior se dificulta realizar la ubicacion final del proyecto.

Que el dia 29 de diciembre de 2023 el representante legal de la firma AVMP ARQUITECTOS S.A.S., solicito suspension del contrato de consultoria por un plazo de 31 dias justificando, que se firma el acta de suspensión No. 01 del contrato de consultoria 1010 de 2023

Que a la presente fecha, aun se presenta la ocupasion ilegal de varias familias en el predio objeto de estudio, lo cual impide culminar con las ultimas actividades de la consultoria, razon por la cual se requiere ampliar la suspensión No. 01 en un termino no menor de 03 meses, tiempo en el cual se estima llevar a cabo el desalojo ilegal que se encuentra en el predio y/o la reubicacion del proyecto.

PERSONAL QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

CONTRATISTA: AVMP ARQUITECTOS S.A.S / R/Legal RAUL ANDRES VELASQUEZ RENDON


INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CESAR CHAVEZ PARRA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

Fecha 29-01-2024

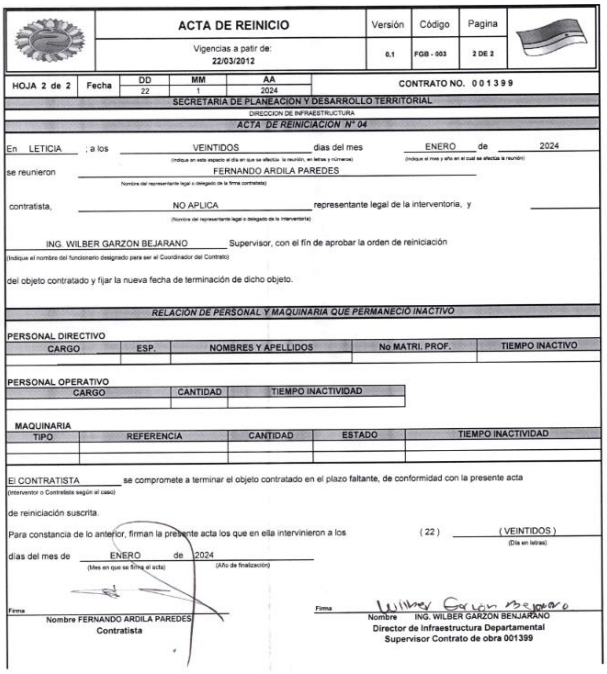

ACTA DE REINICIO | Versión 0.1 | Código FGB - 003 | Pagina 2 DE 2

Vigencias a patir de: 22/03/2012

HOJA 2 de 2 | Fecha DD 22 MM 1 AA 2024 | CONTRATO NO. 001399

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REINICIACION N° 04

En LETICIA ; a los VEINTIDOS (Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes ENERO (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2024

se reunieron FERNANDO ARDILA PAREDES (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

contratista, NO APLICA (Nombre del representante legal o delegado de la interventoria) representante legal de la interventoria, y

ING. WILBER GARZON BEJARANO (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del Contrato) Supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación

del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRI. PROF.	TIEMPO INACTIVO

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD


El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (22) (VEINTIDOS) (Dia en letras) dias del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de finalización)

Firma
Nombre FERNANDO ARDILA PAREDES
Contratista

Firma
Nombre ING. WILBER GARZON BENJARANO
Director de Infraestructura Departamental
Supervisor Contrato de obra 001399

Fecha 07-02-2024 Actualizacion continua

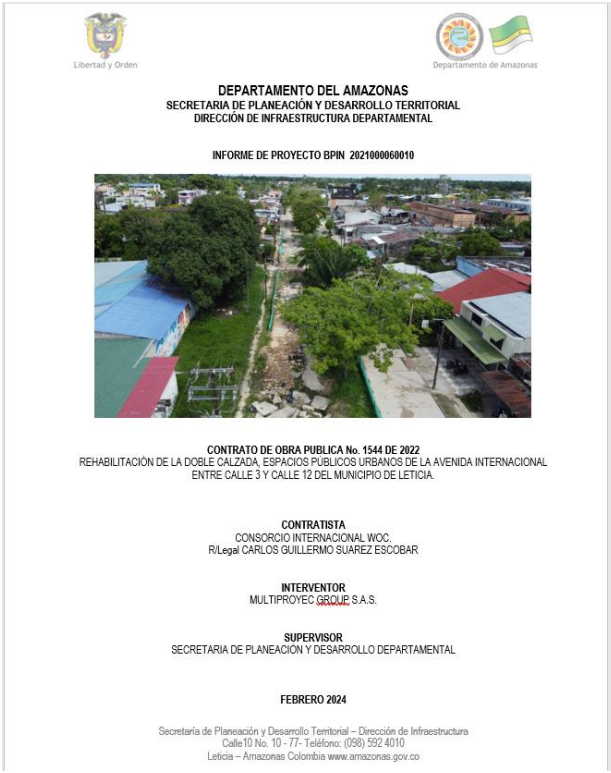

Libertad y Orden

Departamento de Amazonas

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME DE PROYECTO BPIN 202100060010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1544 DE 2022
REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.


CONTRATISTA
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC.
R/Legal CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR

INTERVENTOR
MULTIPROYEC GROUP S.A.S.

SUPERVISOR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEPARTAMENTAL

FEBRERO 2024

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co

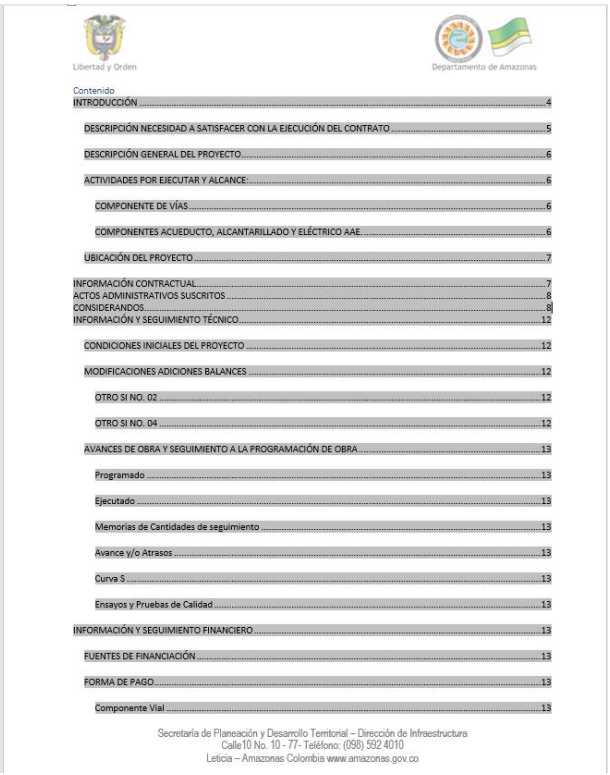

Libertad y Orden

Departamento de Amazonas

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
DESCRIPCIÓN NECESIDAD A SATISFACER CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 6
COMPONENTE DE VÍAS 6
COMPONENTES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ELÉCTRICO AAE 6
UBICACIÓN DEL PROYECTO 7
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 7
ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 8
CONSIDERANDOS 8
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO 12
CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO 12
MODIFICACIONES ADICIONES BALANCES 12
OTRO SI NO. 02 12
OTRO SI NO. 04 12
AVANCES DE OBRA Y SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 13
Programado 13
Ejecutado 13
Memorias de Cantidades de seguimiento 13
Avance y/o Atrasos 13
Curva S 13
Ensayos y Pruebas de Calidad 13
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 13
FUENTES DE FINANCIACIÓN 13
FORMA DE PAGO 13
Componente Vial 13

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co

No	Obligación
3	Apoyar y asesorar en los comités directivos, técnicos y de contratación de contratos supervisados por la Dirección de Infraestructura.
3.1	**Acciones realizadas**

Se apoya a la dirección de infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en el acompañamiento de a los comites tecnicos adelantados para el proyecto en ejecucion:

1. REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Adicionalmente se brinda acompañamiento al proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento de contrato de obra Pública No. REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

Se apoya a la dirección de infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en el acompañamiento a la segunda socializacion del proyecto con la veeduria del contrato.


Se realiza visita Tecnica a campo para la verificacion de actividades ejecutadas en el contrato de obra publica No. 1544 de 2022 cuyo objeto es REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

Se realiza visita Tecnica a campo para la verificacion de actividades ejecutadas en el contrato de obra publica No. 1544 de 2022 cuyo objeto es DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS HÍBRIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

3.2 Evidencias

CONTRATO INTERNACIONAL

Fecha 29-01-2024 Acta de Comité No.25

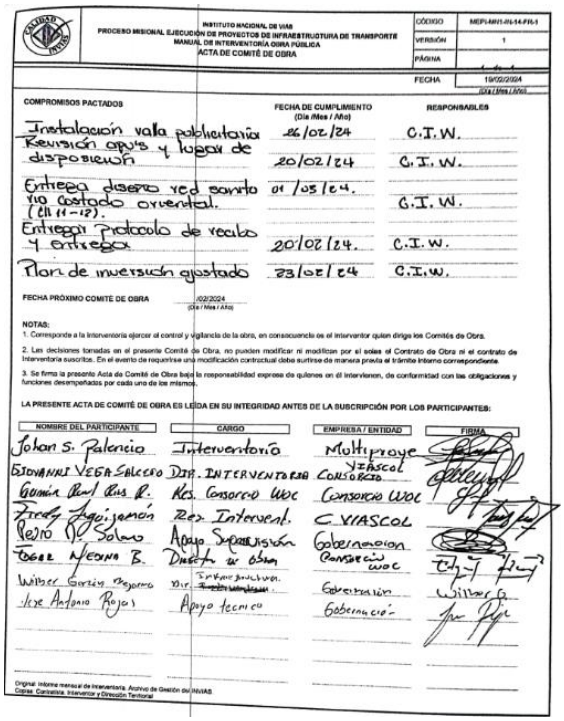

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-14-FR-1 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA: 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instalacion valla publicitaria	26/02/24	C.I.W.
Revisión apoyos y lugar de disposición	20/02/24	C.I.W.
Entrega diseño red sanitario costado oriental. (Cll 11-12).	01/03/24.	C.I.W.
Entrega Protocolo de recibo y entrega	20/02/24.	C.I.W.
Plan de inversión ajustado	23/02/24	C.I.W.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: /02/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por el solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Johan S. Palencia	Interventoría	Multiproyec	
GIOVANNI VEGA SALCEDO	DIR. INTERVENTORIA	CONSORCIO VIASCOL	
Ramón Raul Ros R.	Res. Consorcio WOC	Consorcio WOC	
Freddy Agojamen	Res. Interventoría	C. VIASCOL	
Pedro R. Solano	Apoyo Supervisión	Gobernación	
Edgar Medina B.	Director de obra	Consorcio WOC	
Wilber Gorzón Bayona	Dir. Infraestructura	Gobernación	Wilber G.
Jose Antonio Rojas	Apoyo tecnico	Gobernación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Fecha 29-01-2024 Acta de Comité No.26

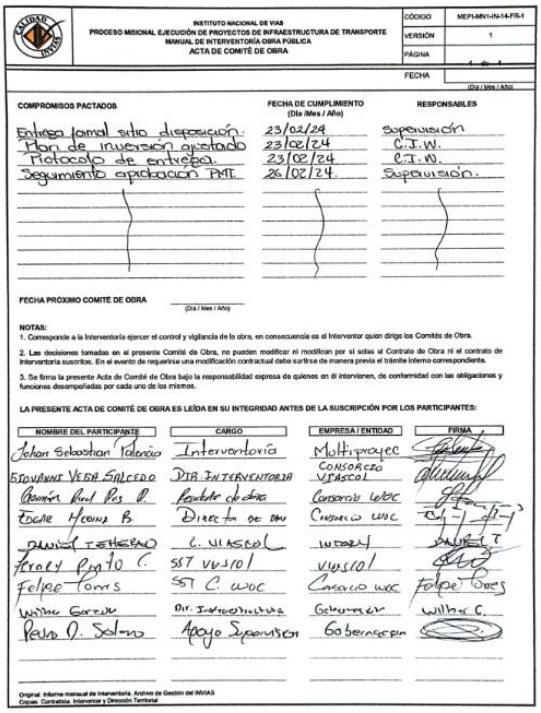

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-14-FR-1 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega formal sitio disposición.	23/02/24	Supervisión
Plan de inversión ajustado	23/02/24	C.I.W.
Protocolo de entrega.	23/02/24	C.I.W.
Seguimiento aplicación PMT.	26/02/24.	Supervisión.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por el solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Johan Sebastian Palencia	Interventoría	Multiproyec	
GIOVANNI VEGA SALCEDO	DIR. INTERVENTORIA	CONSORCIO VIASCOL	
Ramón Raul Ros R.	Residente de obra	Consorcio WOC	
Edgar Medina B.	Director de obra	Consorcio WOC	
DANIEL TETHERO	C. VIASCOL	INTERV	
Freddy Rojas C.	SST VIASCOL	VIASCOL	
Felipe Torres	SST C. WOC	Consorcio WOC	Felipe Tores
Wilber Gorzón	Dir. Infraestructura	Gobernación	Wilber G.
Pedro R. Solano	Apoyo Supervisión	Gobernación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Visita de Campo Fecha 29/01/2024



Socialización Internacional Fecha 14/02/2024



Visita de Campo Fecha 23/02/2024 Audiencia Probatoria Maquinaria y Equipos



Visita de Campo Fecha 26/02/2024 Realización de Fotogrametría



Visita de Campo Fecha 10/02/2024 Fotovoltaicos



Visita de Campo Fecha 10/02/2024 Fotovoltaicos



Visita de Campo Fecha 10/02/2024 Fotovoltaicos



Visita de Campo Fecha 24/02/2024 Cinco Canchas



Visita de Campo Fecha 24/02/2024 Calle 3 y Carrera 11, Levantamiento de Fotogrametría



No	Obligación
4	Apoyar y asesorar en la rendición de conceptos técnicos sobre los temas que se le pongan en consideración referente a las actividades misionales de la entidad en los diferentes sectores central, salud y educación.
4.1	**Acciones realizadas**

Durante las visitas de Inspección ocular a diferentes contratos de obra, se aprovecha el desplazamiento a cada una de las comunidades, con el fin de recoger informaciones referentes a las necesidades en el campo de Infraestructura vial, educativa, comunicación y salud. Los sitios visitados son:

- Puerto Nariño
- Macedonia
- San Martin de Amacayu
- Vergel
- Zaragoza
- Valencia
- San Francisco
- Nuevo Paraíso

4.2	**Evidencias**

Visita de Campo Fecha 03/02/2024 Acercamiento con las comunidades



No	**Obligación**
5	Apoyar en la digitalización de los documentos que se requieran dentro del Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

5.1	**Acciones realizadas**

Se apoya a la dirección de infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en la identificacion, organización y reconociemiento de la gestion documental que no fue entregada en debida forma por la administracion departamental saliente.

Se inicia con la identificación del estado actual de los contratos de obra, interventoría, consultoría. Lo anterior con el fin de verificar si se encuentran en ejecución, suspensión, recibidos y/o liquidados. Razón por la cual, se le solicito a la secretaria Jurídica Departamental, la relación total de la contratación que se encuentra reportada en el SECOP I, sus archivos digitales de cada uno de los procesos para realizar un filtro y separar exclusivamente, contratos que cuya naturaleza se encuentre enfocada a la infraestructura civil.


Esta actividad a permitido dar de manera oportuna, respuesta a los entes de control, quienes a su vez solicitan entre otros solicitan: Información precontractual, Contractual y postcontractual de proyectos de vigencias anteriores.


Se apoya a la dirección de infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, en la creacion y retroalimentacion de una matriz de contratacion en la cual se puede

identificar el estado actual de los contratos de obra, interventoria y consultoria de diferentes vigencias.

5.2	**Evidencias**

Fecha 01/02/2024 Retroalimentación continua

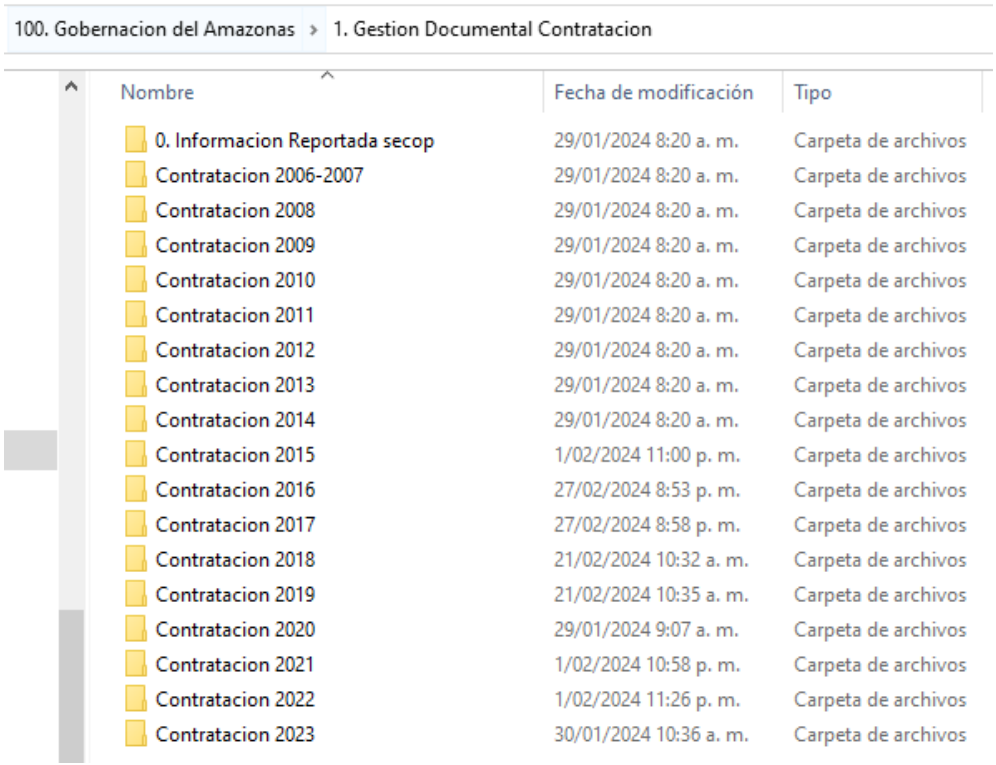

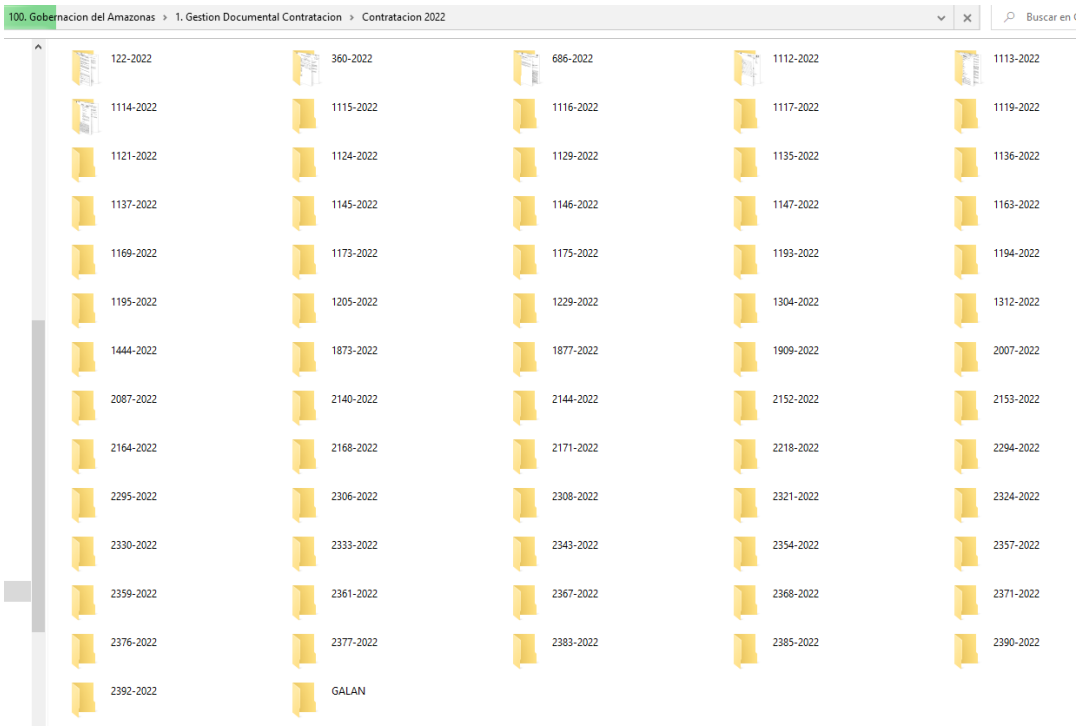


No	Obligación
6	Apoyar y asesorar en la revisión de documentos necesarios para los procesos contractuales que se generen en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.
6.1	**Acciones realizadas**

Se Realiza revisión de los informes presentados por interventorías y contratistas de obra, actos administrativos propuestos y demás documentación presentada a la supervisión, para lo cual se hacen observaciones a su presentación.

6.2 **Evidencias**

Fecha 16/02/2024 Observaciones

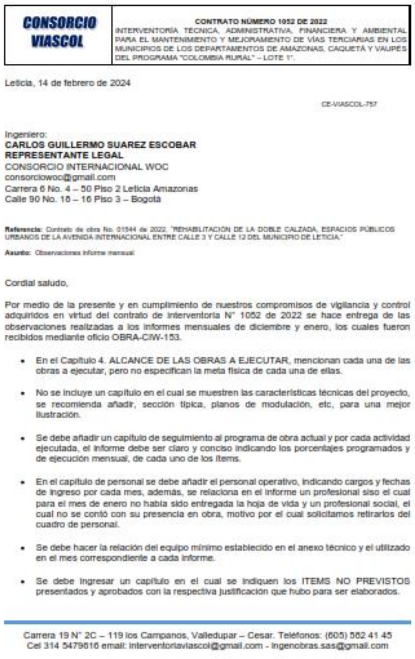

CONSORCIO VIASCOL

CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 1".

Leticia, 14 de febrero de 2024

CE-VIASCOL-757

Ingeniero:
CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
consorciowoc@gmail.com
Carrera 6 No. 4 – 50 Piso 2 Leticia Amazonas
Calle 90 No. 18 – 16 Piso 3 – Bogotá

Referencia: Contrato de obra No. 01544 de 2022, "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA."

Asunto: Observaciones informe mensual


Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestros compromisos de vigilancia y control adquiridos en virtud del contrato de interventoría N° 1052 de 2022 se hace entrega de las observaciones realizadas a los informes mensuales de diciembre y enero, los cuales fueron recibidos mediante oficio OBRA-CIW-153.

- En el Capítulo 4. ALCANCE DE LAS OBRAS A EJECUTAR, mencionan cada una de las obras a ejecutar, pero no especifican la meta física de cada una de ellas.
- No se incluye un capítulo en el cual se muestren las características técnicas del proyecto, se recomienda añadir, sección típica, planos de modulación, etc, para una mejor ilustración.
- Se debe añadir un capítulo de seguimiento al programa de obra actual y por cada actividad ejecutada, el informe debe ser claro y conciso indicando los porcentajes programados y de ejecución mensual, de cada uno de los ítems.
- En el capítulo de personal se debe añadir el personal operativo, indicando cargos y fechas de ingreso por cada mes, además, se relaciona en el informe un profesional siso el cual para el mes de enero no había sido entregada la hoja de vida y un profesional social, el cual no se contó con su presencia en obra, motivo por el cual solicitamos retirarlos del cuadro de personal.
- Se debe hacer la relación del equipo mínimo establecido en el anexo técnico y el utilizado en el mes correspondiente a cada informe.
- Se debe ingresar un capítulo en el cual se indiquen los ITEMS NO PREVISTOS presentados y aprobados con la respectiva justificación que hubo para ser elaborados.

Carrera 19 N° 2C – 119 los Campanos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: (605) 582 41 45
Cel 314 5479616 email: interventoriaviascol@gmail.com - ingenobras.sas@gmail.com

Fecha 23/02/2024 Observaciones

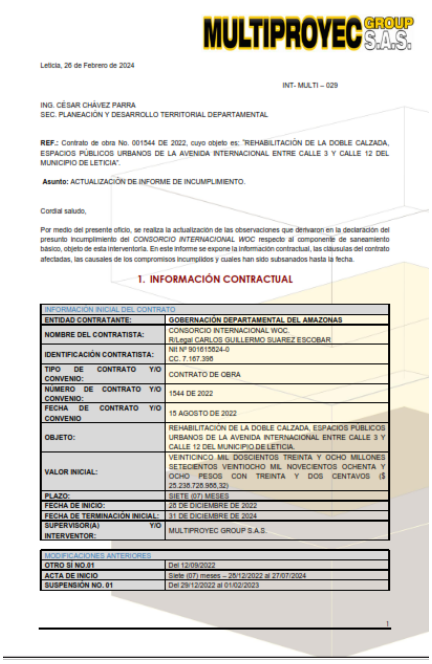

MULTIPROYEC GROUP S.A.S.

Leticia, 26 de Febrero de 2024

INT- MULTI – 029

ING. CÉSAR CHÁVEZ PARRA
SEC. PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL

REF.: Contrato de obra No. 001544 DE 2022, cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA".

Asunto: ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE INCUMPLIMIENTO.

Cordial saludo,


Por medio del presente oficio, se realiza la actualización de las observaciones que derivaron en la declaración del presunto incumplimiento del CONSORCIO INTERNACIONAL WOC respecto al componente de saneamiento básico, objeto de esta interventoría. En este informe se expone la información contractual, las cláusulas del contrato afectadas, las causales de los compromisos incumplidos y cuales han sido subsanados hasta la fecha.

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC R/Legal CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	Nit N° 901615524-0 CC. 7.167.398
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	1544 DE 2022
FECHA DE CONTRATO Y/O CONVENIO	15 AGOSTO DE 2022
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO, MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 25.238.728.988,32)
PLAZO:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR:	MULTIPROYEC GROUP S.A.S.

MODIFICACIONES ANTERIORES	
OTRO SÍ NO.01	Del 12/09/2022
ACTA DE INICIO	Siete (07) meses – 25/12/2022 al 27/07/2024
SUSPENSIÓN NO. 01	Del 29/12/2022 al 01/02/2023

Fecha 24/02/2024 Observaciones

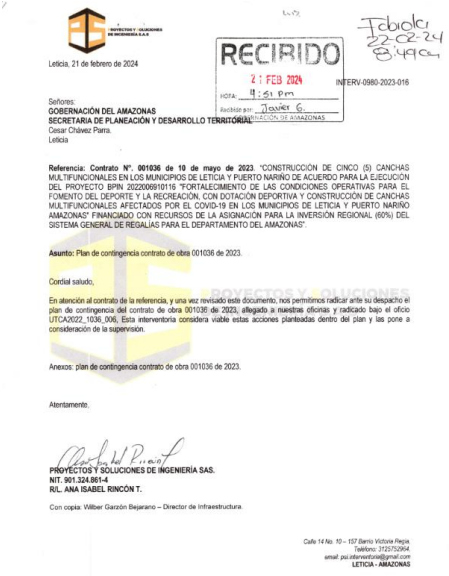

Leticia, 21 de febrero de 2024

RECIBIDO
21 FEB 2024
HORA: 4:51 Pm
Recibió en: Jaxmer G.
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Tdoc(c)
22-02-24
8:49am

INTERV-0980-2023-016

Señores:
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Cesar Chávez Parra.
Leticia

Referencia: Contrato N°. 001036 de 10 de mayo de 2023. "CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

Asunto: Plan de contingencia contrato de obra 001036 de 2023.

Cordial saludo,

En atención al contrato de la referencia, y una vez revisado este documento, nos permitimos radicar ante su despacho el plan de contingencia del contrato de obra 001036 de 2023, allegado a nuestras oficinas y radicado bajo el oficio UTCA2022_1036_006. Esta interventoría considera viable estas acciones planteadas dentro del plan y las pone a consideración de la supervisión.

Anexos: plan de contingencia contrato de obra 001036 de 2023.

Atentamente.

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS.
NIT. 901.324.861-4
R/L. ANA ISABEL RINCÓN T.

Con copia: Wilber Garzón Bejarano – Director de Infraestructura.

Calle 14 No. 10 – 157 Barrio Victoria Regia
Teléfono: 3125750964
email: psi.interventoria@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS

Fecha 24/02/2024 Observaciones



CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2023

RECIBIDO
FECHA: 21-02-24
HORA: 10:36 am

Leticia, 21 de febrero de 2023

UTCA2022_1036_006

Señor (a):
Ingeniera
ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO
R.L. PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS
Interventor
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1036 DE 2023, "CONSTRUCCIÓN DE CINCO (05) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

Asunto: Respuesta al oficio INTERV-0980-2023-015. Deberes contractuales, medidas

Cordial saludo,


Por medio de la presente y dando respuesta al oficio INTERV-0980-2023-014, hacemos entrega del plan de contingencia adoptado por la U.T. CANCHAS AMAZONAS 2022, para su revisión, manifestando en este documento, las acciones eficaces para poder superar el atraso presentado en la obra.

Atentamente,

LUZ ADRIANA DOMÍNGUEZ URREA
C.C. 51.899.973 de Bogotá
R.L.: U.T. Canchas Amazonas 2022


No	Obligación
7	Entregar informes de actividades mensuales, y un informe final en el cual haga referencia al cumplimiento del objeto del contrato.
7.1	**Acciones realizadas**
Se hace relación en el presente informe de las actividades realizadas, el cual describe cada una de ellas a corte 29 del mes de febrero	
7.2	**Evidencias**

Fecha 29/02/2024 Observaciones

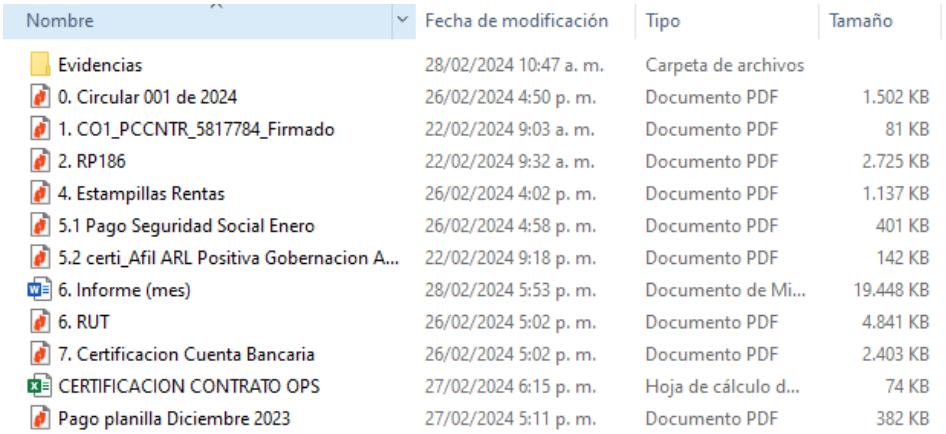

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Evidencias	28/02/2024 10:47 a. m.	Carpeta de archivos	
0. Circular 001 de 2024	26/02/2024 4:50 p. m.	Documento PDF	1.502 KB
1. CO1_PCCNTR_5817784_Firmado	22/02/2024 9:03 a. m.	Documento PDF	81 KB
2. RP186	22/02/2024 9:32 a. m.	Documento PDF	2.725 KB
4. Estampillas Rentas	26/02/2024 4:02 p. m.	Documento PDF	1.137 KB
5.1 Pago Seguridad Social Enero	26/02/2024 4:58 p. m.	Documento PDF	401 KB
5.2 certi_Afil ARL Positiva Gobernacion A...	22/02/2024 9:18 p. m.	Documento PDF	142 KB
6. Informe (mes)	28/02/2024 5:53 p. m.	Documento de Mi...	19.448 KB
6. RUT	26/02/2024 5:02 p. m.	Documento PDF	4.841 KB
7. Certificacion Cuenta Bancaria	26/02/2024 5:02 p. m.	Documento PDF	2.403 KB
CERTIFICACION CONTRATO OPS	27/02/2024 6:15 p. m.	Hoja de cálculo d...	74 KB
Pago planilla Diciembre 2023	27/02/2024 5:11 p. m.	Documento PDF	382 KB

No	Obligación
8	El contratista se obliga con la entidad que una vez finalice la relación contractual deberá proceder a realizar la entrega de los informes de trabajos realizados en medios físicos como magnéticos sean este en Word, Excel, Pdf y registros fotográficos, equipos, material de archivo usuarios y contraseña a que haya lugar, la cual debe ser presentada al supervisor en medio físico y digital donde se evidencie el seguimiento de todas las actividades en el desarrollo del objeto contractual mediante contratista y el líder del Área o quién sea designado para tal fin.
8.1	**Acciones realizadas**
Como contratista me encuentro en continua realización de informes y almacenamiento del material a entregar al líder del área.	
8.2	**Evidencias**



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
0. Contrato Pedro Solano Amazonas	27/02/2024 5:09 p. m.	Carpeta de archivos	
1. Gestion Documental Contratacion	28/02/2024 4:21 p. m.	Carpeta de archivos	
2. Tera	27/02/2024 9:14 p. m.	Carpeta de archivos	
3. Supervision de Contratos	28/02/2024 4:21 p. m.	Carpeta de archivos	
4. Correspondencia	27/02/2024 6:55 p. m.	Carpeta de archivos	
50. Salidas Amazonas	29/01/2024 11:14 a. m.	Carpeta de archivos	
100. Sobretasa	29/01/2024 12:00 p. m.	Carpeta de archivos	
APUS CONCRETOS	29/01/2024 11:18 a. m.	Carpeta de archivos	
Relacion de Contratos Juridica 2020-2023	9/01/2024 10:59 a. m.	Documento PDF	221 KB
Relacion de Contratos Juridica 2020-2023	27/02/2024 10:11 p. m.	Hoja de cálculo d...	2.677 KB
Seguimiento Director 2024	15/02/2024 9:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	136 KB

No	Obligación
9	Apoyar la revisión, verificación de la documentación y proyección de las respuestas a requerimientos de los diferentes entes de control y demás solicitudes de información de los proyectos asignados por el supervisor, generando los conceptos técnicos necesarios para su oportuna respuesta, dentro de los términos de ley.
9.1	**Acciones realizadas**
Se proyectan oficios de requerimiento al secretario de planeación saliente con respecto al material entregado en el proceso de empalme Se Proyecta	
9.2	**Evidencias**

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar:
Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados.

Soporte de pago de seguridad social, Planillas No. **9461016640 y 9462130346 de** la planilla, expedida por **aportes en línea** correspondiente al periodo **diciembre** de **2023** y **enero** de **2024** (Decreto Ley 2106 de 2019 – "*Decreto Ley Anti trámites"*)

Cordialmente,

PEDRO DANIELSOLANO JAIME
Contratista
C.C. No. 80.198.854 de Bogotá – Cundimarca

Recibí a satisfacción:

WILBER GARZÓN BEJARANO
Supervisor Contrato 49 (CO1_PCCNTR_5817784) de 2024
Director de Infraestructura
Gobernación de Amazonas
