RAFAEL CAMARGO
DISEÑO E INGENIERIA DE VANGUARDIA
NIT. No. 7227486-7

MANI-37-2024

Maní, 17 de Septiembre de 2024

Yopal, 2024/09/18 10:34:59
RAD: 20240110249
Empresa de energía de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Ingeniero
FERNANDO PARRA CELY
Gerente de distribución
ENERCA S.A E.S.P
Yopal- Casanare

REFERENCIA: Contrato de obra No. **050 de 2024,** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE REDES ELÉTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13,2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

ASUNTO: **APROBACION A SOLICITUD DE PRORROGA**

Respetado ingeniero

Por medio de la presente, la interventoría da visto bueno a la solicitud de prórroga al contrato de obra No. 050 de 2024, por UN (1) mes, ya que como se expresa en el oficio de fecha 12 de Septiembre de 2024 remitido por el CIVITEL INGENIEROS P S.A.S se presentan los siguientes hechos:

1. Continua la ola invernal con descargas atmosféricas que reduce el rendimiento en las actividades de obra civil de la subestación .

2. El paro camionero presentado ocasiono retrasos en la entrega de materiales por parte de los proveedores de aceros, concretos, rieles de la carrilera del transformador entre otros.

3. Que las obras civiles en la subestación dados los retrasos mencionados y la instalación de equipos: reconectadores y seccionadores motorizados en un tiempo de un (1) mes.

Por lo anterior la interventoría ve viable técnicamente la presente prorroga por un plazo de UN (1) mes, para la terminación del proyecto. Por lo tanto, ya que aspectos como el alcance del proyecto y su valor contractual no se ven alterados y es necesario el tiempo adicional, se da el aval y se aprueba la justificación de la prórroga, para lo cual se hace alusión a la modificación de la cláusula cuarta "PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO" de obra.

DIRECCIÓN: CARRERA 1 Nº 24 – 34 DUITAMA BOYACÁ
TEL: 310 3136813 – 311 2541347
EMAIL: camargorodriguezr@yahoo.com

Quedamos atentos a su inquietudes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTORIA CONTRATADA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 081-2024

Copia:- *CIVITEL INGENIEROS P S.A.S (Contratista)*
- Beyer Yesid Rivera Camacho (supervisor designado)

Anexo: - *oficio del contratista, con su respectivo cronograma*

DIRECCIÓN: CARRERA 1 Nº 24 – 34 DUITAMA BOYACÁ
TEL: 310 3136813 – 311 2541347
EMAIL: camargorodriguezr@yahoo.com

CIVITEL
INGENIERÍA INTELIGENTE
Responsables de I.V.A
NIT 900.055.878-0

Yopal, 12 de septiembre de 2024

Señores RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ.
R/L Contrato de interventoría No. 081-2024
Carrera 1 24-34 Duitama Boyacá.

Referencia: Contrato de Obra Pública 050-2024 que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: solicitud prorroga final contrato 050-24.

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto en referencia solicitamos nuevamente su apoyo en la ampliación del plazo en tiempo de ejecución de las obras del contrato 050-24 debido a:

1. Hemos sufrido afectaciones significativas en el cronograma de ejecución de las obras civiles debido a retrasos en la entrega de los materiales requeridos, tales como concretos y aceros.

   Estos retrasos se deben a la modificación de los tiempos de entrega y despacho por parte del proveedor, como consecuencia directa de las dificultades logísticas imprevistas ocasionadas por el paro camionero. Esta situación ha afectado el normal desarrollo de nuestras actividades, limitando el avance de las obras conforme a lo programado.

2. Así mismo, informamos que se han presentado retrasos en la entrega de los rieles de la carrilera del transformador y las varillas de puesta a tierra. Se prevé que la entrega e instalación de estos materiales se realice dentro de 15 días calendario y por otra parte se requieren 15 días para la instalación de los equipos especiales de subestación.

   Estos retrasos son consecuencia directa de la variación en los despachos por parte del proveedor, lo que ha afectado el normal avance del proyecto.

Correo Electrónico: g.tecnica@civitel.co
CR 45 95 86 OF 205 Bogota DC
Celular: 3008095902

3. Adicionalmente a lo anterior tenemos que las condiciones climáticas actuales en maní presentan una ola invernal que está acompañada de descargas atmosférica lo cual disminuye el rendimiento de las actividades dentro de la subestación:


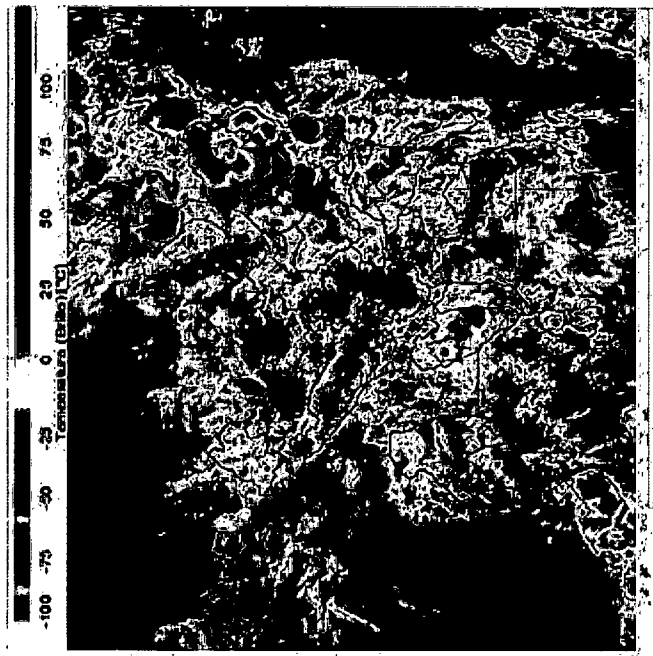


Imagen GOES East Canal Infrarrojo,
17 de septiembre de 2024 - Hora 11:50 HLC.
Fuente: GOES 16

En las últimas horas, se han registrado lluvias moderadas a localmente fuertes, en algunos casos acompañadas de descargas eléctricas, sobre sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Casanare, Vichada y Caquetá. Lluvias de menor intensidad igualmente fueron reportadas en algunos sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, sur de Huila Guaviare y Vaupés.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominó el tiempo seco con cielo parcialmente nublado.



Fuente:https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/ultimo/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(ITD)

De acuerdo a lo anterior solicitamos una prórroga de un mes del contrato de obra con el objeto de terminar las obras civiles de forma segura y a su vez contar con el tiempo remanente para la ejecución de las obras eléctricas dentro y fuera de la subestación. Para lo anterior presentamos el plan de contingencia para las actividades restantes.

Atentamente,

DEISSY CALVO ALVAREZ
CC. 40.034.160
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Jorge Alberto Uribe Daza
Dir Proy CTO 050-2024

CIVITEL
INGENIERIA INTELIGENTE
Responsables de I.V.A
NIT 900.055.878-0

PLAN DE CONTINGECIA

ACTIVIDAD		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
REMATE OBRAS CIVILES SUBESTACION MANI													
TENDIDO EXTENSION CKTO RURAL 13.2 KV													
INSTALCION DE PUESTA A TIERRA													
ENTREGA CORRECIONES INFORME PMT													
TENDIDO RED 34.5 KV													
MONTAJE RECONECTADORES 34.K VK EN POSTE													
MONTAJE RECONECTADORES 34.K VK SUBESTACIÓN													
CERTIFICACION RETIE													
SUSPENSION DE OBRA													
RECONFIGURACION Y MONTAJE EQUIPOS RESTANTES SUBESTACIÓN													

Correo Electrónico: g.tecnica@civitel.co
CR 45 95 86 OF 205 Bogota DC
Celular: 3008095902
