	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 27-may-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA — SEMANA N°: 8 del 16-may-24 al 22-may-24 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNÁN ESTRADA LONDOÑO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Estudios y Diseños:
- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales.

Actividades de mejoramiento:
- Construcción de placa huella en longitud aproximada de 880 m, distribuidos en seis (6) tramos, con pendientes mayores al 15%.

Actividades de Mantenimiento:
- Conformación de la subrasante, afirmado y desmonte y limpieza.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con el Anexo Técnico de Proceso de Selección abreviada, a través del presente contrato se atenderán las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de la transitabilidad y accesibilidad de la red terciaria del municipio de Salónica, particularmente en la vía Crucero - Palmas - La Vigorosa identificada con el código 28486. Las obras a ejecutar tienen por propósito coadyuvar a la productividad del campo. Los tramos por intervenir están localizados en el sector comprendido entre el crucero y la vereda Palmas. Este sector cuenta con una longitud de 3.1 km, de los cuales 240m cuentan con Placa huella y con este trabajo se van a construir seis (6) tramos adicionales, que suman aproximadamente 880m de placa huellas en los sectores mas escarpados cuyas pendientes superan el 15%, la zona a intervenir cuenta con sistema de alcantarillado, la vía a intervenir cuenta con doce (12) alcantarillas de 24".

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ
INTEGRANTES: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA - INTERPROYECT - MY S.A.S.
CONTRATO N°: 3549 DE 2023
FECHA DE INICIO: 29-dic-23
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 04-ago-24

Nota: El presente contrato fue suspendido el día 30-dic-23 hasta el 28-enr-24, dicha suspensión fue ampliada desde el 29-enr-24 hasta el 04-mar-24 finalmente prorrogado hasta el 04-agt-24.

VALOR INICIAL:	$ 987.779.607,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 987.779.607,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
INTEGRANTES: NO APLICA
CONTRATO N°: 3315 DE 2023
FECHA DE INICIO: 19-dic-23
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 04-ago-24

Nota: El presente contrato fue suspendido el día 29-dic-23 hasta el 28-enr-24, dicha suspensión fue ampliada desde el 29-enr-24 hasta el 04-mar-24 finalmente prorrogado hasta el 04-agt-24.

VALOR INICIAL:	$ 218.362.770,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 218.362.770,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 987.779.607			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 987.779.607	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 218.362.770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.362.770			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 873.187.755,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA [1]:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.672.003,50	39,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.342.618,00	25,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.750.556,70	4,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.693.913,15	2,61%

Nota: Los valores de inversión ejecutada e inversión acumulada, corresponden al básico + IVA.

FECHA: 27-may-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA SEMANA N°: 8 del 16-may-24 al 22-may-24 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNÁN ESTRADA LONDOÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

N° RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con corte al presente informe e Contratista se encuentra elaborando y ajustando los documentos contractuales y en la fase de estudios y diseño, por lo que a la fecha no ha facturado.

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con corte a la fecha la Interventoría se encuentra pendiente de presentar los documentos correspondientes , para realizar el respectivo cobro del mes de marzo.

ANTICIPOS [2]	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C [1]
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS [3]	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base [1]					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada [1]					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GL	1			Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador sobre llantas	1	-
Motoniveladora mín. 125 HP.	1	-
Vibro compactador de tándem liso de 15 toneladas	1	-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones, (modelo 2.003).

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A X

OBSERVACIONES:

FECHA: 27-may-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA SEMANA N°: 8 del 16-may-24 al 22-may-24 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNÁN ESTRADA LONDOÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En elaboración con compromiso de entrega para el 29-may-24.

OBSERVACIONES: Con corte al presente informe el Consorcio Operativo IJ, se encuentra en el proceso de elaboración del PAGA, para presentarlo a la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	-	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Con corte al presente informe el Consorcio Operativo IJ, se encuentra en el proceso de elaboración del PAGA, para presentarlo a la Interventoría.
Se realizó la reunión de socialización del contrato la cuál se llevo a cabo el día lunes 20-may-24 a las 3:00 p.m.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Para el presente proyecto no se tiene contemplada la adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- El día 16 de mayo se realiza recorrido al proyecto en compañía del Especialista Ambiental Ing. John O. Cano.
- El día 17 de mayo se realiza reunión de socialización de los aspectos evidenciados en campo producto del recorrido del día anterior, con el Contratista, igualmente y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha entregado el PAGA se recuerda la necesidad de presentar dicho documento PAGA tal como se informo en el oficio T-004-2023-006 radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-043121 del 15-may-24 y se entrega una lista de chequeo para evitar reprocesos al momento de la revisión y agilizar la probación.
- El día 19 de mayo, se realizó visita por parte del área social de la interventoría, a los predios aledaños al área de influencia del proyecto, con el fin de verificar la cantidad de predios existentes, evidenciando que existen un total de ocho (8) predios, a los cuales aparentemente no se les ha levantado su respectiva Acta de vecindad.
- El día 20 de mayo se realizó en las horas de la mañana una mesa de trabajo con el área social, técnica y SST del contratista e Interventoría con el fin de revisar la atención de las observaciones a la presentación de la reunión de Inicio, en las instalaciones de la interventoría.
- Igualmente se realizó la Reunión de Socialización con la Comunidad en la Vda. Las Palmas, contando con la presencia de la comunidad dela área e influencia directa e indirecta del proyecto corregomientos de Salónica y La Fenicia, los presidentes de las Juntas de Acción comunal de las veredas La Vigoroza, Palmas, Pto Fenicia y Fenicia, la Personería, la Alcaldía de Riofrío, el equipo del contratista Social, SST, Técnico, Jurídico y Administrativo y por parte de la Interventoría el área Social, SST y el equipo Técnico de la Interventoría.
- La Interventoría en función de sus labores recordó al Contratista el compromiso acordado frente al cumplimiento de la normatividad SST, para que el personal en obra cuente con la respectiva DOTACIÓN y los EPP para la ejecución de sus labores.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuará con las labores de limpieza de alcantarillas.
- Realizará la gestión administrativa para que el personal contratado para realizar las labores de campo cuente con la respectiva dotación.
-Entregará para revisión de la Interventoría el PAGA y las Actas de Vecindad.
- Remitirá a la Interventoría los APU´s revisados en la mesa de trabajo realizada el 21-may-24.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS [1]

El esquema gráfico de avance se muestra en la hoja X. Esquema Gráfico

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FECHA: 27-may-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA SEMANA N°: 8 del 16-may-24 al 22-may-24 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNÁN ESTRADA LONDOÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de Alcantarillas N° 2 y 5



Limpieza de Alcantarilla N° 3



Recorrido Social, verificación Actas Vecindad



Mesa de trabajo Social Contratista - Interventoría y Reunión Socialización Comunidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

*1 El contratista se encuentra elaborando los documentos establecidos en el numeral 8,1 del Anexo técnico de Obra y numeral 14.9.2 del Anexo Técnico del Contrato de Interventoría, razón por la cual, aún no se cuenta con el Programa de Inversiones, Programa de Obra, PAGA, entre otros, para presentarlos a la Interventoría para su posterior revisión.

*2 El contratista radico a la Interventoría mediante oficio COIJ-V.CAU-0010-2023 radicado el día 03 de abril de 2.024 documentos para tramitar el Anticipo, la Interventoría realizó observaciones mediante comunicado T-004-2023-023-OFC radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-029478 del 04-abr-24, solicitando la entrega del Programa de Inversiones, Programa de Obra y Flujo de Caja con el fin de realizar una revisión del mismo, acorde a la planeación de la ejecución, observaciones que con corte al presente Informe no ha subsanado, por tal razón no se ha tramitado el desembolso del Anticipo ante el Instituto.

*3 La Interventoría mediante oficio T-004-2023-003-OFC radicado al Instituto renunció expresamente al Anticipo contemplado en la cláusula décima primera del Contrato N° 3315 de 2023.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Considerando que el Contratista no ha entregado la totalidad de los documentos contractuales PAGA, la Interventoría remitió mediante oficio T-004-2023-005 y T-004-2023-006 radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-042414 de fecha 14-may-24 y 2024E-VUVRAZ-043124 de fecha 15-may-24, solicitudes de la áreas Social y Ambiental recordando los compromisos contractuales que tiene el contratista y que a la fecha no ha cumplido, instandolo a entregar el PAGA y los Informes sociales a la mayor brevedad posible.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL


Matrícula Profesional No.: 17202 - 098732 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS [1]

PR0+000 AL PR3+100

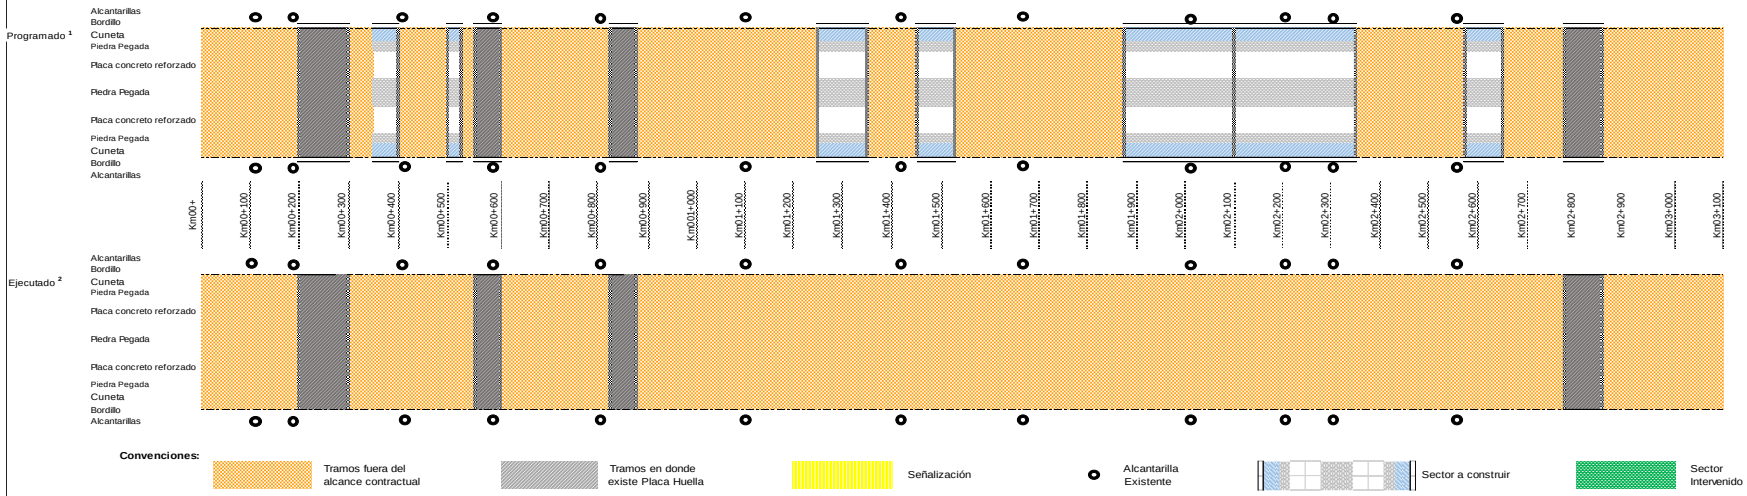

Convenciones:

- Tramos fuera del alcance contractual
- Tramos en donde existe Placa Huella
- Señalización
- Alcantarilla Existente
- Sector a construir
- Sector Intervenido

NOTAS: Se aclara que el gráfico de lo programado corresponde al alcance plasmado en el Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones y será ajustado, de acuerdo con el diseño que presente el Contratista.

En el gráfico ejecutado, no se presenta avance ya que el Contratista se encuentra trabajando en la revisión de los Estudios y Diseños a presentar, cuyo plazo de presentación no se cumplió.
