ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

Montería 05 de septiembre 2024

Señor(es):
SENA-MONTERIA
Estimado Sr:
Ref: Contrato N° CO1.PCCNTR.6425104

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

ANEXO CUADRO APROBADO CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR IVA (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)	VALOR TOTAL CON IVA
1	**AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE**					
1.1	Suministro de Equipo: Casete Estándar Refrigerante: ecológico R410a Voltaje: 220V monofásico Compresor: estándar rotativo alta eficiencia Tubería de serpentín condensador Cobre. Capacidades: BTU/H: 60.000 Monofásico / 220 Voltaje/1 PH Condensadora de descarga vertical Tecnología Inverter incluye bomba de drenaje	1	UND	8.204.000,00	1.558.760,00	9.762.760,00
1.2	Suministro de Equipo: Casete Estándar Refrigerante: ecológico R410a Voltaje: 220V monofásico Compresor: estándar rotativo alta eficiencia Tubería de serpentín condensador Cobre. Capacidades: BTU/H: 24.000 Monofásico / 220 Voltaje/1 PH Condensadora de descarga vertical Tecnología Inverter incluye bomba de drenaje	1	UND	5.646.000,00	1.072.740,00	6.718.740,00
1.3	Tubería flexible de cobre de 1/2 aislada en rubatex	1	ML	54.000,00	10.260,00	64.260,00
1.4	Tubería Flexible de cobre de 7/8 aislada en rubatex	1	ML	84000	15.960,00	99.960,00
1.5	Cableado para la interconexión entre unidad exterior e interior (4X14)	1	ML	15000	2.850,00	17.850,00
1.6	Drenaje a la vista en tubería PVC 1" aislado en rubatex para cuello de evaporadoras tipo casete	1	ML	38000	7.220,00	45.220,00
2	**AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT**					
2.1	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 9.000 BTU/220V R 410	1	UND	1.802.000,00	342.380,00	2.144.380,00
2.2	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 12.000 BTU/220V R 410	1	UND	1.435.000,00	272.650,00	1.707.650,00
2.3	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 18.000 BTU/220V R 410	1	UND	4.925.000,00	935.750,00	5.860.750,00
2.4	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 24.000 BTU/220V R 410	1	UND	5.255.000,00	998.450,00	6.253.450,00
2.5	Suministro de aire a acondicionado tipo piso techo Inverter de 60.000 BTU/220V R 410	1	UND	13.980.000,00	2.656.200,00	16.636.200,00
						49.311.220,00

Nombre del Proponente ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA
C. C. Nº 11106092 de Pueblo Nuevo - Córdoba
Dirección de correo CALLE 52 No 13-30 Barr Monte Verde
Correo electrónico Romulo4444@hotmail.com
Telefax 3043857090
Ciudad Montería Córdoba

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

1. De conformidad con el cuadro aprobado y especificaciones aprobados para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionados, tubería de cobre, plomería y accesorios se procedió a instalar los siguientes equipos.

- **Edificio Administrativo. Auditorio equipo piso techo N1- 60.000btu/hr**

PISO TECHO	**MANEJADORA**	**CONDENSADORA**
MODELO	AVNQ60GM2A5	AUUQ60GH5
SERIE	404TAEJDY796	404TAACDJ536





ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Auditorio equipo piso techo N2 - 60.000btu/hr**

PISO TECHO	**MANEJADORA**	**CONDENSADORA**
MODELO	AVNQ60GM2A5	AUUQ60GH5
SERIE	404TAHQOY785	404TAKKDJ533










Carrera 8 No 39-45 | Cel. 304 385 7090 | E-mail. climaro2014@gmail.com
Montería - Córdoba

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Oficinas de empleo. Auditorio. 24.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC24ACEXF-D3DNA1B/I	GWC24ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J89540000060	63249920244

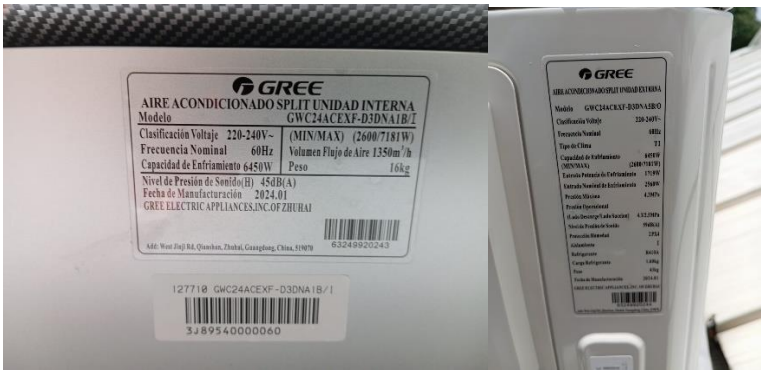



Climaro

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Oficinas de empleo. Oficina. 24.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC24ACEXF-D3DNA1B/I	GWC24ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J89540000068	63249920244









Climaro

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Oficinas de empleo. General. Piso techo N 1 -60.000btu/hr**

PISO TECHO	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	AVNQ60GM2A5	AUUQ60GH5
SERIE	403TAKKAE461	404TADRDJ530






Climaro

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Oficinas de empleo. General. Piso techo N 2 - 60.000btu/hr**

PISO TECHO	**MANEJADORA**	**CONDENSADORA**
MODELO	AVNQ60GM2A5	AUUQ60GH5
SERIE	404TAMOOY723	404TAXTDJ538

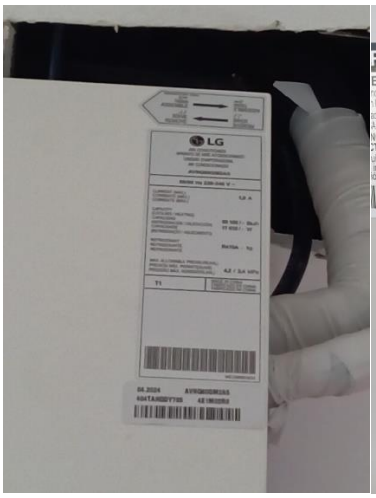







Carrera 8 No 39-45 | Cel. 304 385 7090 | E-mail. climaro2014@gmail.com
Montería - Córdoba

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Oficinas de emprendimiento. General. Piso techo 60.000btu/hr.**







ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Dirección. Equipo minisplit 24.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC24ACEXF-D3DNA1B/I	GWC24ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J89540000080	63249920244

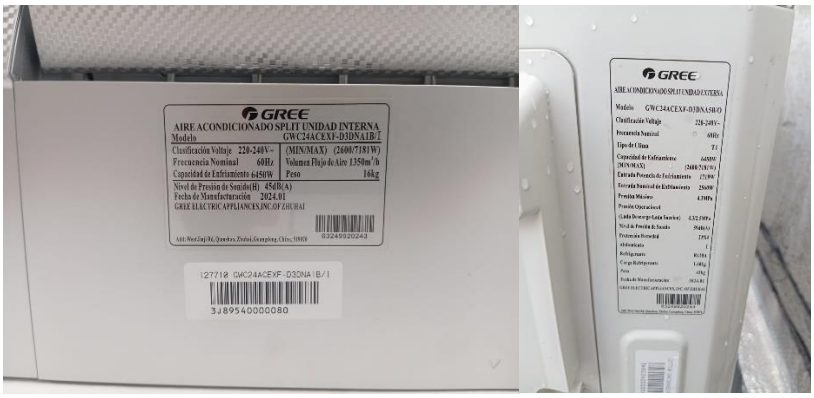



ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Subdirección. Equipo minisplit 24.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC24ACEXF-D3DNA1B/I	GWC24ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J89540000058	63249920244









ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Recepción servicio médico. Equipo minisplit 18.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC18ACDXE-D3DNA1B/I	GWC18ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J890440000019	63249920244








ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Consultorio médico. Equipo minisplit 24.000btu/hr**









Climaro

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

- **Edificio Administrativo. Sistemas. Equipo minisplit 12.000btu/hr**

MINISPLIT	MANEJADORA	CONDENSADORA
MODELO	GWC12ACCXB-D3DNA1A/I	GWC12ACEXF-D3DNA5B/O
SERIE	3J890440000019	63249920244









NOTA; A todos los equipos de aire acondicionado se les instalo red de cobre asilada nueva, drenaje, cable encauchetado, protectores de voltaje, soportes de caucho, bases de hierro donde se requirió.

Carrera 8 No 39-45 | Cel. 304 385 7090 | E-mail. climaro2014@gmail.com
Montería - Córdoba

ROMULO SALGADO PADILLA
NIT: 11.106.092-4
CR 15 E N 38-91

2. Se adjunta cuadro de ejecución.

SUMINISTRO E INSTALACION					
Ítem	Descripción	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Vr.Parcial
1	Suministro de aire a acondicionado tipo piso techo Inverter de 60.000 BTU/220V R 410	Und.	5	16,636,200	$ 83,181,000
2	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 24.000 BTU/220V R 410	Und.	5	6,253,450	$ 31,267,250
3	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 18.000 BTU/220V R 410	Und.	1	5,860,750	$ 5,860,750
4	Suministro de aire a acondicionado tipo Split Inverter de 12.000 BTU/220V R 411	Und.	1	1,707,650	$ 1,707,650
5	Drenaje a la vista en tubería PVC 1" aislado en rubatex para cuello de evaporadoras tipo casete	M	14.87947	45,220	$ 672,850
6	Cableado para la interconexión entre unidad exterior e interior (4X14)	M	150	17,850	$ 2,677,500
7	Tubería Flexible de cobre de 7/8 aislada en rubatex	M	150	99,960	$ 14,994,000
8	Tubería flexible de cobre de 1/2 aislada en rubatex	M	150	64,260	$ 9,639,000
				TOTAL	$ 150,000,000
	VALOR CON IVA INCLUIDO				

.

Atentamente

Rómulo Salgado Padilla
Gerente (CLIMARO)
Ing Industrial.
Esp. Gerencia de Proyectos.
Esp. Gerencia de Marketing.
Cel: 3043857090
