INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande (Boyacá), 19 de septiembre de 2024.

ASUNTO: RECIBO FINAL Nº 01

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TUBERÍA 36 PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024
FECHA:	JULIO 10 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
NIT:	1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE
DURACIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M. CTE. ($36.378.140,00)
VALOR ADICIONAL	DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M. CTE. (18.148.152,00)
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.
B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 11 de julio de 2024.
C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 19 de septiembre de 2024; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024, en el informe anexo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
FACTURA.
Los cuales pueden ser consultados en el informe de Actividades N.º 01 del contratista.

D. DOCUMENTOS A REALIZAR: ACTA N.º 02 RECIBO FINAL de fecha de fecha 19 de septiembre de 2024, ACTA N.º 03 DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN Y ACTA N.º 04 DE LIQUIDACIÓN de fecha 19 de septiembre de 2024.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024 de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación y Obras Publicas Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES INICIAL

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO GRIS 50 KG	Bulto	273	$ 44.650,00	$ 12.189.450,00
2	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M	Un	700	$ 20.660,00	$ 14.462.000,00
3	GRAVILLA DE TRITURADORA	M3	16	$ 265.000,00	$ 4.240.000,00
4	ARENA LAVADA Y / O TRITURADA	M3	17	$ 210.000,00	$ 3.570.000,00
5	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	Kg	21	$ 27.993,00	$ 587.853,00
6	ALAMBRE NEGRO	Kg	23	$ 12.043,00	$ 276.989,00
7	FORMALETA METÁLICA PARA TUBERIA EN CONCRETO 36" X 1.00M	Un	3	$ 5.200.000,00	$ 15.600.000,00

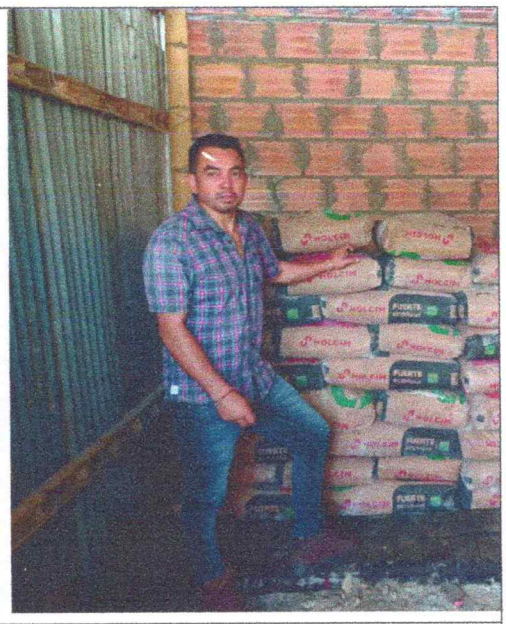
8	MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)	Un	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00
9	GUAYA 7/8" ALMA DE ACERO	ML	0	$ 43.732,00	$ -
	TOTAL				**$ 54.526.292,00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido A SATISFACCIÓN con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024.**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

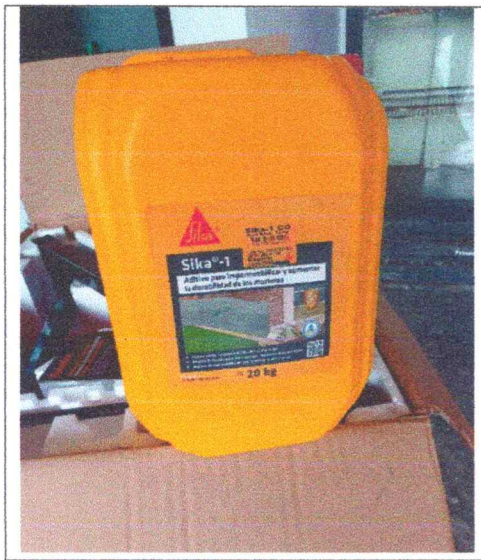


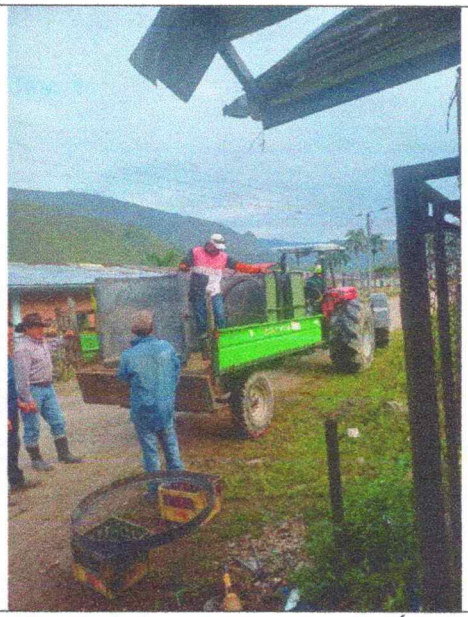
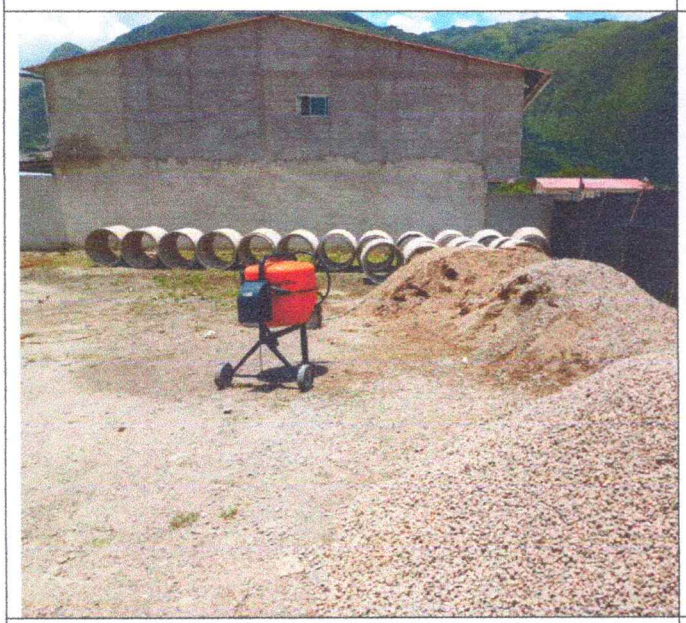
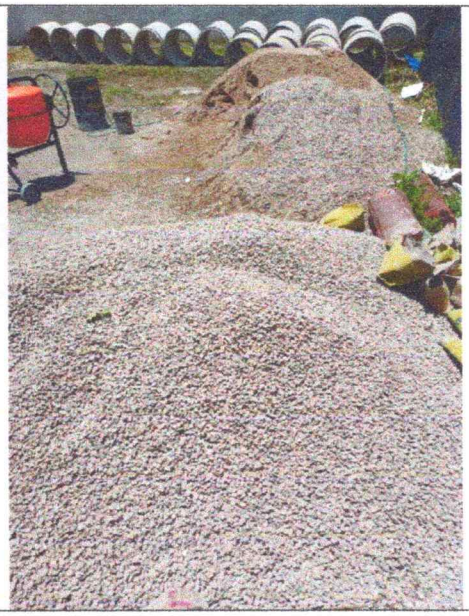
Descripción: CEMENTO GRIS 50 KG



Descripción: CEMENTO GRIS 50 KG

	
Descripción: GRAVILLA DE TRITURADORA y ARENA LAVADA Y / O TRITURADA	Descripción: GRAVILLA DE TRITURADORA y ARENA LAVADA Y / O TRITURADA
	
Descripción: MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)	Descripción: MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)

	
Descripción: Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	Descripción: Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros y ALAMBRE NEGRO
	
Descripción: Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M	Descripción: Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M

	
Descripción: FORMALETA METÁLICA PARA TUBERÍA EN CONCRETO 36" X 1.00M	Descripción: FORMALETA METÁLICA PARA TUBERÍA EN CONCRETO 36" X 1.00M
	
Construcción de Tubería de 36”	Construcción de Tubería de 36”

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nª PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
1744555921	JULIO	$ 75.500
7942543209	AGOSTO	$381.000
TOTAL		$456.500

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 36.378.140,00
Valor adicional		$ 18.148.152,00
Valor anticipo	$ 0,00	
Valor acta parcial No. (1)	$0,00	
valor acta de Liquidación	$54.526.292,00	
Valor anticipo amortizado	$0,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$54.526.292,00**	**$54.526.292,00**

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$54.526.292,00
Valor total recibido (1)	$ 0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$54.526.292,00	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$54.526.292,00**	**$54.526.292,00**

5.2. **VALOR ACTA N.º 02 RECIBO FINAL:** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.CTE ($54.526.292,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA N.º 02 RECIBO FINAL, ACTA N.º 03 DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN Y ACTA N.º 04 DE LIQUIDACIÓN,** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato
