INFORME DE INTERVENTORÍA No 5

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023:

OBJETO: REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA DEL INFORME: 30/04/2024

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCO VIAL 2023

ABRIL DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ALCANCE DEL PROYECTO 5
Valor Costo Inicial del Proyecto. 5
2. ASPECTO TÉCNICO. 6
2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 6
Actividades de obra física. 7
3. PROGRAMACION DE OBRA 11
4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO 13
4.1 PROYECCIONES DEL SEDUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS 13
4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO 13
Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista 13
Valor De Las Actas Pagadas 13
Valor Anticipo Cobrado 14
5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 14
6. CONTROL ESPECIFICACIONES 15
6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA 15
7. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15
7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15

8. SEGURIDAD SOCIAL 17
9. MEMORIA DIARIA O BITACORA 17
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 18
11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 18
12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA 18
13. ASPECTO JURÍDICO 19
13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 19
13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 20
13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
14. PERMISOS AMBIENTALES 27
14.1. PERMISOS AMBIENTALES 27
14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES) 27
15. INFORMES DE OBRA 25
16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 26

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. *Municipios a intervenir:* 5
Tabla 2. *Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo* 5
Tabla 3 *Control de programación y avance de obra.* 7
Tabla 4 *Flujo del proyecto.* 8
Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado. 11
Tabla 6. Maquinaria mínima requerida 14
Tabla 7. Condiciones contrato de obra 18
Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría 19
Tabla 9. *Control de pólizas contratista* 20
Tabla 10. *Control de pólizas interventoría* 22

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Control Personal Interventoría
Anexo 7 Informe HSQ Interventoría
Anexo 8 Correspondencia
Anexo 9 Laboratorios

1. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 2,87 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de 17.489 m2 de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de cunetas y demarcación de señalización horizontal.

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
AIPE	Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita	2,87 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
AIPE	Vía de tercer orden	$ 2.720.013.516,14
TOTAL C.D.		**$ 2.720.013.516,14**

Fuente: Interventoría

Valor adicional del contrato de obra desglosado por capitulo

AIPE	Vía de tercer orden	$ 3.579.734.915
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 3.579.734.915

Plazo Inicial = Ochos (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo total contrato de obra = 8 meses

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

Condiciones Vigentes:

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido 4 meses y 7 días (24 de octubre de 2023 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad de los inconvenientes presentados y el estado o de avance de estos:

El día 12/04/2024 se envió comunicado CV-INT-23 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 1 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de octubre de 2023 al 23 de noviembre de 2023.

El día 12/04/2024 se envió comunicado CV-INT-24 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 2 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023.

El día 17/04/2024 se envió comunicado CV-INT-25 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 3 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

El día 18/04/2024 se envió comunicado CV-INT-26 al Supervisor con respecto a la entrega de acta parcial No 1 del contrato de interventoría.

El día 23/04/2024 se envió comunicado CV-INT-27 al contratista de obra con respecto al avance de obra del contrato No 1478 de 2023.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

Actividades de obra física.

Municipio de Aipe- Praga.

Actividades ejecutadas actualmente. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- Debido a que no ha sido aprobado el ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la mezcla asfáltica, no se ha podido ejecutar las actividades faltantes como los son la instalación de la carpeta asfáltica, fundición de cunetas en concreto e instalación de señalización horizontal.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANT. ACTUAL	% PROGRAMADO (físico)	% EJECUTADO (Físico)	DIFERENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1	Localización y replanteo	KM	2,87	100%	100,00%	0,00%	Localización y replanteo
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	17488,7	75,00%	100,00%	+25,00%	Fresado de pavimento asfaltico
2.1	Corte en conglomerado	M3	6960,8	70,00%	100,00%	+30,00%	Corte en conglomerado
3.1	Conformación de calzada	M2	26600	63,64%	100,00%	+36,36%	Conformación de calzada
3.2	Base granular	M3	2610,30	58,33%	100,00%	+41,67%	Base granular
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	866,10	50,00%	0,00 %	-50,00%	Mezcla Densa en caliente MDC-19
3.4	Sub-Base granular	M3	2610,30	58,33%	100,00%	+41,67%	Sub-Base granular
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17202	56,00%	100,00%	+44,00%	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ	M3	860,10	21,05%	0,00%	-21,05%	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8601	0,00%	0,00%	0,00%	Línea de demarcación con pintura en frío
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación	M3-KM	122247,5	66,67%	100,00%	+33,33%	Transporte proveniente de la excavación de la explanación

Fuente. Interventoría

Tabla 4 Flujo del proyecto.

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACION FLUJO DE CAJA 1 MES 1	1 MES 2	1 MES 3	1 MES 4	2 MES 1	2 MES 2	2 MES 3	2 MES 4	3 MES 1	3 MES 2	3 MES 3	3 MES 4	4 MES 1	4 MES 2	4 MES 3	4 MES 4
		PRELIMINARES																				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	12.889.859,98															
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**																
		EXPLANACIONES																				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00			$ 16.399.644,80		$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**																
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00			$ 6.770.909,09		$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00			$ 44.803.624		$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00			$ 36.883.539,00		$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00			$ 4.720.228,80		$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**																
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000													$ 173.441.428,421			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**																
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frio	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000																
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**																
		TRANSPORTES																				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000			$ 16.162.485,714		$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**																
						SUBTOTAL OBRAS	$															
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98															
						PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00		$ 1.101.200,00		$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
						PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00		$ 1.813.289,60		$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
						VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**															
								$ 143.544.781,235			$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260				$ 641.026.523,681			
								4,06%			13,06%				13,06%				17,91%			

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
			$ 13.541.818,18	$ 13.541.818,18											
			$ 89.607.248,50	$ 89.607.248,50				$ 44.803.624,25							
			$ 190.316.814,00	$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00							
			$ 73.767.078,00	$ 73.767.078,00				$ 36.883.539,00							
			$ 9.440.457,60	$ 9.440.457,60				$ 7.080.343,20							
			$ 173.441.428,421	$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 130.081.071,316			
				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000			
			$ 36.324.971,429	$ 27.243.728,57											
			$ 2.202.400,00	$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
			$ 3.626.579,20	$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

3. PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
DEPARTAMENTO	HUILA — FECHA DE INICIO
PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA	

PROGRAMACION DE OBRA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.705.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.705.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98
					PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
					VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.916**

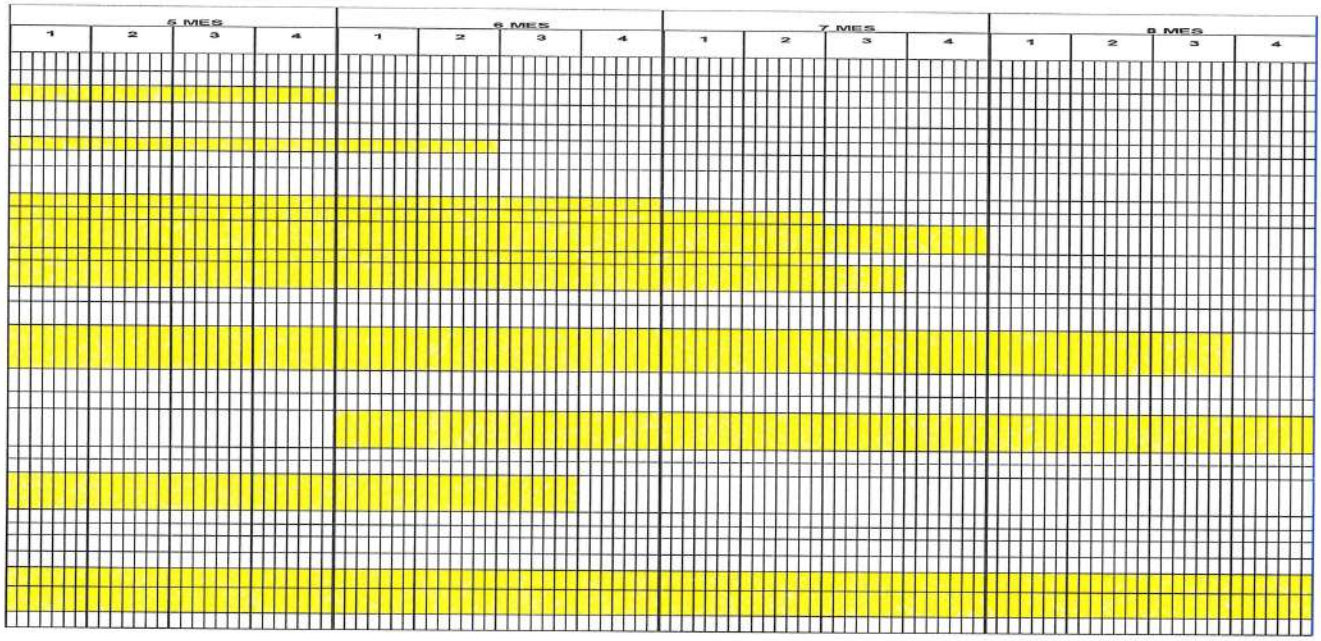


Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado.

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 5**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	17,91%	48,04%
valor de la obra programada	$641.026.523,68	$1.719.741.495,44
obra ejecutada (%)	0,00%	40,72%
valor de la obra ejecutada	$0,00	$1.457.813.125



4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO

El contratista presentó los documentos para el ajuste al contrato de obra con respecto a la Mezcla asfáltica MDC-19, ya que, debido a la corrección de el espesor de la misma, no se ha podido iniciar estas actividades.

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 48,04% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 7,32%.

El equipo de la interventoría ha solicitado al contratista de obra de forma verbal y escrita el incremento del pie de fuerza con el fin de dar cumplimiento a la reprogramación establecida.

4.1 PROYECCIONES DEL SEGUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS

El contratista de obra no logró cumplir con la reprogramación de obra hasta la fecha de cierre del Informe No 5, luego que se reinició el contrato de obra el 01 de febrero de 2024.

4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO

Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista

A la fecha del presente informe el contratista de obra Consorcio Vial Maranatha 91, presentó el acta parcial No 1 por un valor de $1.457.813.125, la cual ya se encuentra en trámite en la gobernación.

Valor De Las Actas Pagadas

El departamento pagará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento 90%, previa amortización del anticipo.

Valor Anticipo Cobrado

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO VIAL MARANATHA 91					
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91				
CONTRATO DE OBRA No.	1478-2023				
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS					
REHABILITACIÓN VÍAS					
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR CONTRATO	$3.579.734.914,98				
% ANTICIPO	30%				
VALOR ANTICIPO	$1.073.920.475,00				
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.073.920.475,00				
DESCUENTOS	$53.696.024,00				
VALOR NETO GIRADO	$1.020.224.451,00				

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	29,41%	$300.000.000,00	$300.000.000,00
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	15,68%	$160.000.000,00	$160.000.000,00
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	GLB	25,48%	$260.000.000,00	$260.000.000,00
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	11,78%	$120.224.451,00	$120.224.451,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	5,88%	$60.000.000,00	$60.000.000,00
6	MANO DE OBRA	GLB	11,76%	$120.000.000,00	$120.000.000,00
					$1.020.224.451,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	**$1.020.224.451,00**
SON	**$1.020.224.451,00**				

La interventoría aprobó el plan de inversión del anticipo del contratista de obra y se radicaron los documentos en la Gobernación del Huila para el trámite respectivo.

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- **Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita**: A lo largo del periodo del presente informe el contratista no ha podido ejecutar actividades, ya que está a la espera de la aprobación del ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la Mezcla asfáltica. Durante este periodo se presentaron lluvias leves y esporádicas.

6. CONTROL ESPECIFICACIONES

Por parte de interventoría se ha solicitado la documentación concerniente a los diferentes permisos de canteras y disposición de RCD.

Certificaciones de calidad de los materiales, para verificar cumplan con lo especificado en el contrato de obra, además de lo que se evidencia en obra.

6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 48,04 % y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 7,32%.

7. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 6. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 Galones)	2
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Cortadora de pavimento	2
Regla vibratoria	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1
COMPRESOR	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 1478-2023

Informe De Personal

En el presente periodo ya se tienen revisadas las hojas de vida del personal mínimo requerido envidas por el contratista. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Personal Técnico Requerido

Aprobado inicial

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	1	100%
INSPECTOR DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SISO	1	78%
AUX. TRANSITO	1	100%

Fuente. Interventoría

Personal Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL		
CARGO	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**
Director de Interventoría	1	100%
Residente de Interventoría	1	100%
PERSONAL TÉCNICO		
Inspector de obra de obra	1	100%
Comisión topográfica Topógrafo, 1 cadenero con equipo topográfico	1	100%

Fuente. Interventoría

8. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a la obligación de la interventoría, según el pliego de condiciones se estipula verificar y certificar la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud) e informar si el pago se realizó mensualmente, el cual se acreditara mediante recibo de pago efectuado por el Contratista (planilla de seguridad social).

- El Contratista a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de algunos trabajadores incluyendo director de obra y residente. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

9. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Teniendo en cuenta el Decreto 1772 de 1994, donde se expresa la importancia de contar con la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social, no solo para el cumplimiento de las leyes, sino para proteger, conservar y preservar la salud y seguridad de todos sus empleados, todo el equipo de trabajo que hace parte del CONSORCIO VIAL MARANATHA 91, se encuentra al día en el pago de EPS, ARL, AFP esto se puede evidenciar en las planillas adjuntas a este documento.
De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, por el cual se modifica el pago de la seguridad de independientes "Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior".

12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA

MES	% PROGRAMADO MES	% ACUMULADO PROGRAMADO	% EJECUTADO MES	% ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR / ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1	14,29 %	54,29 %	14,29 %	54,29 %	0,00%

13. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.1478-2023.

13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
NIT:	901.749.436-1
CONTRATO No.:	1478 DE 2023
OBJETO.:	REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 3.579.734.915
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

La Gobernación del Huila realizó el seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de Interventoría No. 1492 – 2023, de la siguiente manera:

13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2023
NIT:	901.753.844-9
CONTRATO No.:	1492 DE 2023
OBJETO.:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 261.763.600
VALOR TOTAL:	$ 261.763.600
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

Fuente. Interventoría

13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101018547, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101050819.

Tabla 9. Control de pólizas contratista

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	12/09/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	12/09/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 715,946,983.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2023	12/05/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	24/10/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	24/10/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	24/10/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 415,080,202.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/10/2023	24/06/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Interventoría, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Tabla 10. Control de pólizas interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2023	18/05/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		18/05/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/11/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO		18/04/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	18/09/2023	18/11/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		18/11/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		18/11/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		18/11/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2023	23/06/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/06/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/06/2024	24/05/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO	29/10/2023	24/12/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		24/12/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		24/12/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		24/12/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2024	25/08/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/08/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		25/02/2028	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2024	25/08/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE R.C- ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	29/10/2023	25/02/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/02/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/02/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/02/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/02/2024	25/12/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/12/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/12/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	24/10/2023	25/06/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/06/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/06/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/06/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

14. PERMISOS AMBIENTALES

14.1. PERMISOS AMBIENTALES

Para la ejecución del contrato de obra No. 1478 de 2023, se ha requerido la solicitud de premisos para la disposición de materiales pétreos y provenientes de las excavaciones.

14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (Residuos convencionales y especiales)

Mediante oficio se le solicito al contratista enviar los siguientes documentos:

- Señalización y demarcación de las áreas a intervenir.
- Licencias RCD.

15. INFORMES DE OBRA

El contratista a la fecha ha presentado los informes de obra solicitados de forma escrita mediante oficios por la interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato de obra.

16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

16.1 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

Dar cumplimiento estricto a la entrega de la documentación solicitada en los plazos requeridos en el contrato de obra y tramitados por la interventoría externa.

Cumplir con los perfiles y dedicaciones de los profesionales ofertados cumpliendo con el pliego de condiciones una vez se inicie la ejecución de los trabajos.

Una función contractual del Consorcio Vial 2023; es la de reportar el avance o atraso de la programación aprobada; y el no cumplimiento se le comunicará a la Gobernación del Huila; por lo que se recomienda al contratista de obra hace entrega inmediata del plan de contingencia y mitigación para implementar estrategias que aporten en el avance de obra y de tal manera evitar se adelanten los trámites administrativos y jurídicos de un presunto incumplimiento frente a la programación; en estricto cumplimiento a la cláusula vigésima séptima del contrato de obra No. 1478 de 2023.

Continuar realizando el pago a la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades de obra estipuladas o del balance en el contrato de obra No. 1478 de 2023.

Exigir la utilización de los elementos de protección personal que entrego el Consorcio Vial Maranatha 91 a cada uno de los trabajadores.

16.2 CONCLUSIONES

La interventoría envió comunicado CV-INT-23 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 1 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de octubre de 2023 al 23 de noviembre de 2023.

La interventoría envió comunicado CV-INT-24 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 2 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023.

La interventoría envió comunicado CV-INT-25 al Supervisor con respecto a la entrega del informe No 3 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

La interventoría envió comunicado CV-INT-26 al Supervisor con respecto a la entrega de acta parcial No 1 del contrato de interventoría.

La interventoría envió comunicado CV-INT-26 al contratista de obra con respecto al avance de obra del contrato No 1478 de 2023.

En el trascurso del proyecto esta interventoría ha realizado el control de calidad a cada una de las actividades desarrolladas en este proyecto, garantizando la estabilidad de la obra en el transcurso del tiempo.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

El contratista de obra presentó a la interventoría el acta parcial No 1 por un valor de $ 1.457.813.125 y se encuentra en trámite en la gobernación.

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 48,04% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso del 7,32%.

LUIS MIGUEL SUAZA
R.L CONSORCIO VIAL 2023

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE AIPE-HUILA VIA A PRAGA RUTA 45HL22

Equipo, Maquinaria y Stop de materiales granulares









Anexo 2
Programación

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1 MES 1	1 MES 2	1 MES 3	1 MES 4	2 MES 1	2 MES 2	2 MES 3	2 MES 4	3 MES 1	3 MES 2	3 MES 3	3 MES 4	4 MES 1	4 MES 2	4 MES 3	4 MES 4
		PRELIMINARES																				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	12.889.859,98															
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**																
		EXPLANACIONES																				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00				$ 16.399.644,80	$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**																
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00				$ 6.770.909,09	$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00				$ 44.803.624	$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00				$ 36.883.539,00	$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00				$ 4.720.228,80	$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**																
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000													$ 173.441.428,421			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**																
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frio	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000																
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**																
		TRANSPORTES																				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000				$ 18.182.485,714	$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**																
						SUBTOTAL OBRAS $ 3.536.017.571																
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 3.536.017.570,98																
						PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT) $ 16.518.000,00				$ 1.101.200,00	$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
						PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL) $ 27.199.344,00				$ 1.813.289,60	$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
						VALOR TOTAL $ 3.579.734.915																
							$ 143.544.781,235				$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260				$ 641.026.523,681			
							4,06%				13,06%				13,06%				17,91%			


CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		


PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18											
$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 44.803.624,25							
$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00							
$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 36.883.539,00							
$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 7.080.343,20							
$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 130.081.071,316			
				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000			
$ 36.324.971,429				$ 27.243.728,57											
$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**

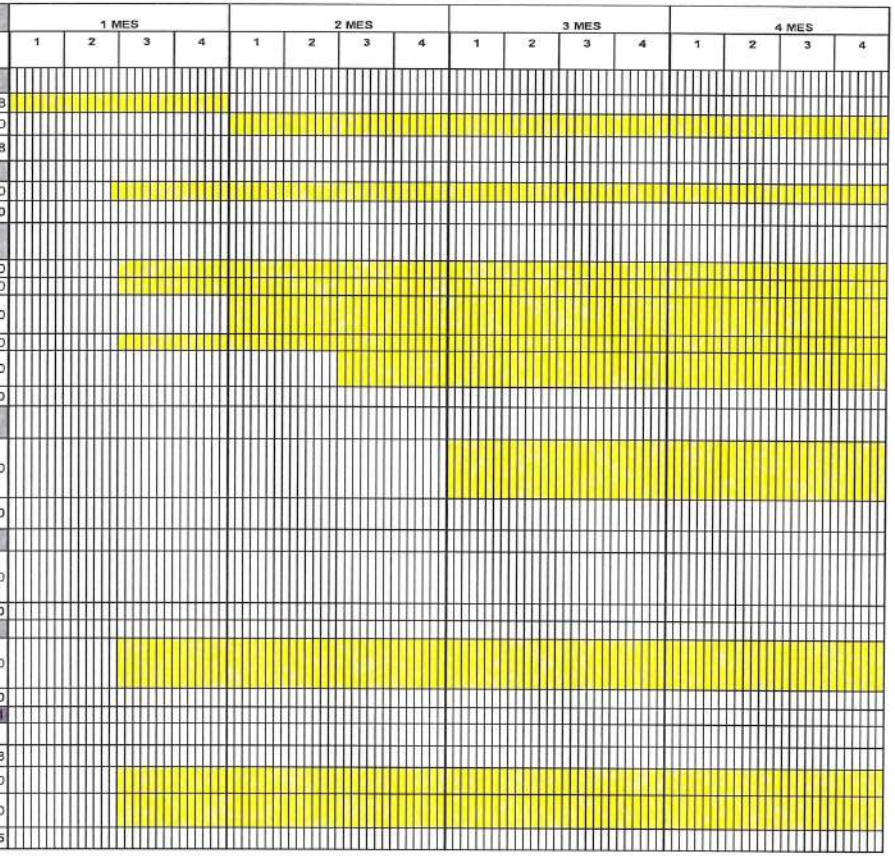

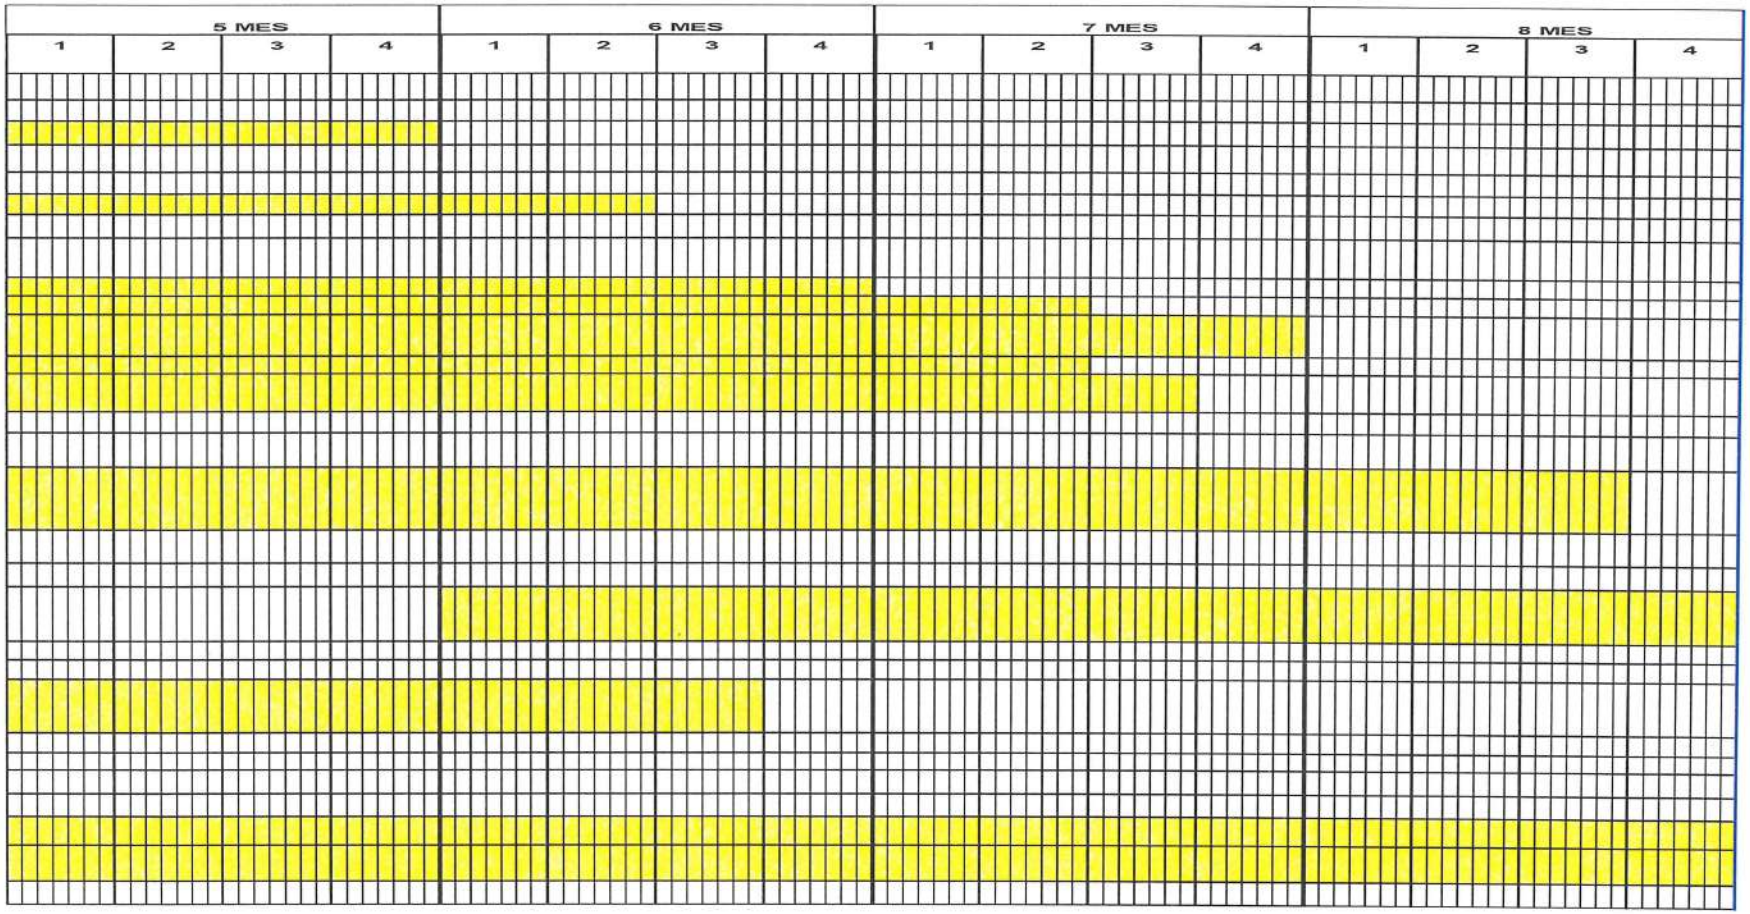
5 MES
6 MES
7 MES
8 MES
1
2
3
4

Anexo 3
Bitacora de Obra

FECHA= 31/08/2018
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
POR FALTA DE FLUIDO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

Claudia Lorena
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 01/09/2018
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, SOBRESTANTE, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASOCIE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FACIANTES DE MEZCLA ASFALTICA CONEXAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 25 RETROEXCAVADORA HANIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE LX VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 11M3, EQUIPO DE FINISHER BABABER GREEN 260, IMPRIMADOR ASFALTO COMPRESOR CERO, 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA = 2/OCT/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 11M3, EQUIPO DE PINTURA BARRER GREEN 260, BARREDOR ASFALTO, COMPRESOR PEROY 185 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA = 3/OCT/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR

Scanned with CamScanner

MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, PUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS, EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, RASTRILLO ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARRETILLA.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 4/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, ASEO, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, PUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, RASTRILLO ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARRETILLA.
OBSERVACIONES=

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 5/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CERRADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CONTEOS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MANIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR IKROY 185 CFM, CARRETANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 6/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CERRADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA

Scanned with CamScanner

ASFALTICA, CUNETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, Y VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD78, EQUIPO DE FINISHER BARBARA GREEN 760, ARRASADOR ASFALTO, COMPACTOR CEPROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 7/04/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 8/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, FALTA MAESTRO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL NUMERO DE ESPESOR.

Scanned with CamScanner

MEDIANTE OFICIO. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FACTURADOS DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION VIAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD 78, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR PERKY 185 CFM, CARRETILLAS=

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 9/OCT/2024

ESTADO CLIMA=

PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES

ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OFICIO. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FACTURADOS DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN VIAL.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD 78, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR PERKY 185 CFM, CARRETILLAS.

OBSERVACIONES=

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 10/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS PAGANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA CHANTA KMA250, MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IMPRIMADORA ASFALTO, COMPRESOR CEROY 785CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 11/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS PAGANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BABABER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 17/04/2024
ESTADO DE CLIMA=
PERSONAL=RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SERA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BABABER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTICO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 13/04/2024
ESTADO DE CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PINTORES, HSEQ, AYUDANTES, CERADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTRO NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE PINTURA BARRIER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CEBOY 185 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA=14/04/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES=NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR EL DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA= 15/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PINCHEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 15T, VIBROCOMPACTADOR CA 25D, RETROEXCAVADORA PANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, PARIGADOR ASFALTO, COMPRESOR PERKY 185CFM, CARRETANQUE.
OBSERVACIONES=

Claudia Reyes
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 16/OCT/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PINCHEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES, DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 15T, VIBROCOMPACTADOR CA25D, RETROEXCAVADORA PANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70,

Scanned with CamScanner

VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, ABRIGADOR ASFALTO, COMPACTADOR LEROY 185 CPM, CARROTANQUE
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 17/04/2024
ESTADO DE CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTRO. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 714, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, ABRIGADOR ASFALTO, COMPACTADOR LEROY 185CPM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 18/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL RIEGO DE CONTRASTE EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 752, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CHANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 260, CARGADOR ASFALTO, COMPRESOR CHOY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 19/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL RIEGO DE CONTRASTE EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 752, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CHANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO

Scanned with CamScanner

DE FINISHER BARRIER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR JERRY 185 CFM, CARBOTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 20/04/2020
ESTADO CIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERO, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDAD= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10 m3, EQUIPO FINISHER BARRIER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR JERRY 185 CFM, CARBOTANQUE.
OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 21/OCT/2024
ESTADO CLIMA = N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES = NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = N/A
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 22/OCT/2024
ESTADO CLIMA = . .
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, AYUDANTES, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MONTACARGA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150, RETROEXCAVADORA CAMIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, Y VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI, LUX M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR TERRY 185 CFM, CARBOMANOJE
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA= 23/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CERADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-30, VOLQUETA HYUNDAI HD78, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CERO 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 24/OCT/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CERADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR

Scanned with CamScanner

CASE, 1X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA: 25/04/2024
ESTADO CLIMA:
PERSONAL: RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS Y DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA PLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 1X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO COMPRESOR LEROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA= 26/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PAILERO, ASEO, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESORES MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA25C, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA MINIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14m3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CEROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 27/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PAILERO, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESORES MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA25C, VIBROCOMPACTADOR

Scanned with CamScanner

DYNAPAC CA152, RETROEXCAVADORA PLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARBOMAQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 28/04/2024
ESTADO CLIMA = N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES = NO SE REALIZABON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 29/04/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, MAESTRO, AYUDANTES Y CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 716, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA LIANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBROAPISONADOR ASFALTO, COMPRESOR ATLAS COPCO 185 CFM, CARRETILLA
OBSERVACIONES =

Claudia L Muñoz L
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 30/04/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTO AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 716, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LIANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBROAPISONADOR ASFALTO, COMPRESOR ATLAS COPCO 185 CFM, CARRETILLA
OBSERVACIONES =

Claudia L Muñoz L
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

Anexo 5
Control Personal Obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749436	1	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 7 4 34	NEIVA-HUILA	8720825	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	655189607	9466845125	E	2024/05/10	2024/05/22	BANCOLOMBIA	12	$9,546,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (21 Afiliados)																							$28,358,001	$4,537,400			$34,158,001	$1,366,500			$33,878,001	$1,355,300			$34,158,001		$2,195,500		$0	$0		$9,454,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS ALTO RIESGO (6 Afiliados)																							$9,500,000	$1,520,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000		$661,300		$0	$0		$2,941,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																							$9,500,000	$1,520,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000		$661,300		$0	$0		$2,941,300
1	CC	36069417	ALVIRA ANGELICA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	94393644	AVILA ALEJANDRO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	38196879	FERREIRA ELIZABETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1075544006	GARCIA JUAN																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
5	CC	36288338	MAJE YUDY																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO																		23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
7	CC	1075266993	RAMIREZ YENNY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1075544289	TAVERA ANDRES																		25-14	30	$1,538,000	$246,100	EPS037	30	$1,538,000	$61,600	CCF32	30	$1,538,000	$61,600	14-11	30	$1,538,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,400
Centro de Trabajo: CUADRILLA TOPOGRAFIA (2 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,900		$0	$0		$1,061,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,900		$0	$0		$1,061,900
9	CC	83169787	RIVERA DEIVER																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
10	CC	4884422	TOVAR MILLER																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF32	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	SI	$628,400
Centro de Trabajo: OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
11	CC	1003818343	HIO CARLOS																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
Centro de Trabajo: OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
12	CC	83222180	CRUZ GIOVANNI																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: OPERADORES VOLQUETA (5 Afiliados)																							$6,366,667	$1,018,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667		$554,700		$0	$0		$2,210,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																							$6,366,667	$1,018,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667		$554,700		$0	$0		$2,210,800
13	CC	1078777075	CARDOSO CESAR																		23100 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC62	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
14	CC	1120361787	LOZANO ALVARO																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
15	CC	4891355	MANRIQUE MILSAR																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$239,400
16	CC	12095605	PERDOMO JUAN		X																25-14	20	$1,066,667	$170,700	EPS005	20	$1,066,667	$42,700	CCF32	20	$1,066,667	$42,700	14-11	20	$1,066,667	6.960%	$74,300	20	$0	$0	SI	$330,400
17	CC	4884991	ROA RICARDO																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (4 Afiliados)																							$4,853,334	$776,600			$4,853,334	$194,200			$4,573,334	$183,000			$4,853,334		$338,000		$0	$0		$1,491,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,853,334	$776,600			$4,853,334	$194,200			$4,573,334	$183,000			$4,853,334		$338,000		$0	$0		$1,491,800
18	CC	55160794	GARZON MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
19	CC	83169033	PERDOMO JAVIER		X																23030 1	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000
20	CC	1075539707	TRUJILLO OMAR		X																23030 1	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000
21	CC	1075544484	VARGAS YENY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(21)		$28,358,001	$4,537,400			$34,158,001	$1,366,500			$33,878,001	$1,355,300			$34,158,001		$2,195,500		$0	$0		$9,454,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749436	1	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 7 4 34	NEIVA-HUILA	8720825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	655189607	9466845125	E	2024/05/10	2024/05/22	BANCOLOMBIA	12	$9,546,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,537,400	$44,100	$0	$4,581,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$944,000	$9,200	$0	$953,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,104,800	$10,700	$0	$1,115,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,960,600	$19,000	$0	$1,979,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$528,000	$5,200	$0	$533,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,195,500	$21,300	$0	$2,216,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$2,195,500	$21,300	$0	$2,216,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,355,300	$13,200	$0	$1,368,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	21	$1,355,300	$13,200	$0	$1,368,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,366,500	$13,500	$0	$1,380,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$84,000	$900	$0	$84,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$600	$0	$60,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$802,700	$7,800	$0	$810,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$600	$0	$52,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$367,800	$3,600	$0	$371,400
TOTAL				21	$9,454,700	$92,100	$0	$9,546,800

2024/05/24 04:34 PM

Anexo 6
Control Personal Interventoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	697758687	9468470336	E	2024/05/14	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	28	$3,482,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4377250	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1075239208	GONSALEZ SALAS YESICA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	1003828965	MALLUNGO REINOSO JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO																		25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
5	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO																		23100I	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total	**Afiliados(5)**																						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$765,700		$0	$0		$3,405,700

2024/09/19 09:31 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	697758687	9468470336	E	2024/05/14	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	28	$3,482,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,760,000	$39,600	$0	$1,799,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$14,400	$0	$654,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$800,000	$18,000	$0	$818,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$7,200	$0	$327,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$765,700	$17,200	$0	$782,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$765,700	$17,200	$0	$782,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$440,000	$9,900	$0	$449,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$440,000	$9,900	$0	$449,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$440,000	$10,000	$0	$450,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$2,200	$0	$98,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$344,000	$7,800	$0	$351,800
TOTAL				**5**	**$3,405,700**	**$76,700**	**$0**	**$3,482,400**

2024/09/19 09:31 AM

Anexo 7
Informe HSQ Interventoría

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

INFORME DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1492 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023



INFORME N.5 DEL 1 AL 30 ABRIL 2024

CONSORCIO VIAL 2023

2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos Específicos 4
3. Contenido del Informe 5
3.1. Generalidades Contractuales 5
4. Marco Legal 7
4.1. Normatividad Aplicable 7
5. Actividades Realizadas Durante el Periodo de Seguimiento 8
5.1. Componente Social 8
5.1.1. Actas de Vecindad y Actas de Entorno 9
5.2. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo 10
5.4. Plan de Manejo de Trafico 13
6. Personal de la Obra 16
7. Personal de Interventoría 17
8. Conclusiones 18
8.1. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo 18
8.2. Plan de Manejo de Tráfico (PMT) 18
9. Anexos de Registros de Asistencia de Charlas de Seguridad 19
10. Anexos de Registros de Asistencia de Capacitaciones 23
11. Anexos de Permisos de Trabajo y Analisis de Trabajo ATS 24
12. Anexos de Formato de Reposición E.P.P 27
13. Anexos de Seguimiento de Actas de Vecindad y Actas de Entorno 28

1. INTRODUCCIÓN

El Presente informe correspondiente al mes de Abril de 2024 recopila las actividades desarrolladas por el Contratista del Consorcio VIAL MARANATHA 91 y consignadas en el Contrato **"REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.".** El cual es supervisado por el equipo Técnico del Consorcio de Interventoría Vial 2023.

Las actividades de control y seguimiento están direccionadas hacia la ejecución de las actividades propuestas por el equipo Técnico del Contratista en los Componentes Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, además del seguimiento a la Calidad del Contrato 1478 de 2023. Donde el Contratista es el responsable con el acompañamiento de la Interventoría.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Revisar, evaluar y acompañar las actividades Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Contratista en el periodo correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2024.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Evaluar las actividades realizadas por parte del consorcio Vial Maranatha 91 del componente de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo comprendido en mención del contrato.
- Identificar el cumplimiento de las actividades Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Manejo de Transito propuesto por el Contratista en el proceso de ejecución de la obra de construcción.

3. CONTENIDO DEL INFORME

El informe describe las actividades realizadas por el equipo Técnico del Contratista en los componentes: Social, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1478 DE 2023, REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.** Durante el periodo correspondiente a los Informes correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2024.

3.1. GENERALIDADES CONTRACTUALES

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
No. DEL CONTRATO	**1492 DE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023 R.L. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON NIT: 901.753844-9
VALOR DEL CONTRATO	$261.763.600
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024



CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
NO. DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 1478 DEL 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.579.734.915
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

4. MARCO LEGAL

4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE

De acuerdo a la normatividad legal vigente

NORMATIVIDAD	DESCRIPCION
Decreto 1443 del 2014	Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST
Decreto 1072 de 2015	Regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia y es de obligado cumplimiento por todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño
Resolución 1111 de2017	Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución 0312 de 2019	Establece los estándares mínimos que deben cumplir las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y su implementación es obligatoria para todas las empresas del país.
Ley 100 de1993	El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten
Resolución 2346 de 2007	Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.
Decreto 1772 1994	Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales
Resolución 0541 1994	Manejo de desechos de la construcción
Norma OHSAS 18001	Propone una jerarquía de medios de control en la que los equipos de protección personal ocupan el quinto puesto
Resolución 4272 de 2021	se define el permiso de trabajo en alturas como un mecanismo administrativo para fomentar la prevención durante los trabajos en alturas
Real Decreto 1627/1997	se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución 1885 de 2015	Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

5.1. COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Actas de Vecindad de Inicio	X		X	
2	Actas de Entorno	X		X	
3	Conformación de Veeduría y Acta de Veeduría (Resolución No. 44 del 14 de Noviembre de 2023)	X		X	
4	Atención a la Comunidad (PQR)	X		X	
5	Capacitación Manejo de cultura vial y participación comunitaria	X		X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2024, El Contratista presento el seguimiento de las Actas de Vecindad, Actas de Entorno en cual no se ha presentado daños ni afectaciones de ningún propietario.
El contratista presento e implemento el Buzón de sugerencia para que la comunidad exprese alguna queja o reclamo y se pueda dar solución de inmediata .

Anexos:





5.1.1. ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNO

ACTA DE ENTORNO	CEDULA	VEREDA
EDILMER LUNA OSORIO	1075538360	SANTA BARBARA
NARCIZO TOVAR CAMACHO	4884490	SANTA BARBARA
FABIO PLAZAS OLIVERO	12103520	SAN ISIDRO
JOSE EDGAR SANCHEZ QUIROGA	4884227	RIO AIPE
SANDRA AVILES ROJAS	55276036	CALLEJON
ANDRES MORENO	83168907	CALLEJON
URIEL CASTILLA SANCHEZ	83169695	CALLEJON
ACTA DE VECINDAD	**CEDULA**	**VEREDA**
ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38196879	SANTA BARBARA
JESUS ANTONIO HORTA REINOSO	83169705	SANTA BARBARA
CRISTIAN JAVIER ANDRADE CUBILLOS	1075543519	SAN ISIDRO

5.2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	ACTIVIDADES	PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Inducción	X		X	
2	Afiliaciones	X		X	
3	Elementos de Protección Personal (E.P.P)	X		X	
4	Capacitaciones	X		X	
5	Charlas Pre Operacionales	X		X	
6	Orden aseo y limpieza	X		X	
7	Inspecciones de seguridad (camilla, Botiquín, Extintores etc.)		X	X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2024, El Contratista presento las siguientes Actividades:
1.E.p.p
2. Capacitaciones
3.Charlas Preoperacionales
4.Orden, Aseo y Limpieza
Quedan pendiente las Inspecciones de seguridad (camilla, Botiquín, Extintores etc.)

ANEXOS





DESCRIPCIÓN: El contratista Realiza Charlas Pre-Operacionales antes de iniciar las labores y capacita al personal de la obra. Ya que son componentes esenciales que protege a los empleados de lesiones y accidentes, beneficia en la reducción costos,



DESCRIPCIÓN: El contratista Realiza Pausas Activas y calistenia ya que nos ayuda a eliminar la rigidez muscular del reposo y Evita lesiones osteomusculares.

mejora la moral y la productividad, garantiza el cumplimiento de las normativas.	
 	
DESCRIPCIÓN: El contratista le realiza Reposición de E.P.P a los trabajadores para protegerlos de posibles lesiones, enfermedades o accidentes en el entorno laboral.	**DESCRIPCIÓN:** Se realizan campañas de aseo al finalizar la jornada laboral teniendo en cuenta la clasificación de los residuos.

5.3. ANEXOS CHARLAS PRE-OPERACIONALES

CHARLAS DIARIAS DE 15 MINUTOS - PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2024

No	TEMA	FECHA
1	Uso adecuado de los elementos de protección personal	1/04/2024
2	El estrés	2/04/2024
3	Acciones inseguras	3/04/2024
4	Medio ambiente	4/04/2024
5	Riesgo silencioso	5/04/2024
6	Reporte Oportuno De Accidentes e Incidentes De Trabajo	6/04/2024
7	Levantamiento Adecuado de carga	8/04/2024
8	tareas De Alto Riesgo	9/04/2024
9	Riesgo físico	10/04/2024
10	Uso Adecuado De Dotación	11/04/2024
11	Impacto Por Ruido	12/04/2024
12	Memorandos informativos	13/04/2024
13	Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo	15/04/2024
14	Trabajo en equipo	16/04/2024
15	Cuidado de manos	17/04/2024
16	Orden y aseo	18/04/2024
17	Reducir el riesgo de caída desplazamiento	19/04/2024
18	Limpieza de los E.P.P	20/04/2024
19	La importancia del mantenimiento	22/04/024

20	Primeros auxilios en el trabajo	23/04/2024
21	Capacitación Investigación de Accidentes de trabajo	24/04/2024
22	Prevención de Incendios	25/04/2024
23	El casco de seguridad	26/04/2024
24	Caídas en lugar de trabajo	27/04/2024
25	La prevención de las enfermedades	29/04/2024
26	ARL,EPS,AFP	30/04/2024

5.4. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

ACTIVIDADES:					
DESCRIPCIÓN		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1.1	SPO01 – Trabajos en la vía	X		X	
1.2	SPO02 – Maquinaria en la vía		X	X	
1.3	SPO03 – Banderero		X	X	
1.4	SRO01 - Vía cerrada		X	X	
1.5	SRO02 – Desvío		X	X	
1.6	SRO03 – Paso uno a uno		X	X	
1.7	SIO01 – Aproximación a obra en la vía	X		X	
1.8	SIO02 – Información de inicio de obra	X		X	
1.9	SIO03 – Información de fin de obra		X	X	
1.10	SIO04 – Carril cerrado	X		X	
1.11	Barricadas con señalizador vial tubular	X		X	
1.12	Barreras plásticas flexibles (maletines)	X		X	
1,13	Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche		X	X	
1,14	Auxiliar de tránsito	X		X	
1,15	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	X		X	
1,16	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Casco de seguridad	X		X	
1,17	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Chaleco Reflectivo	X		X	
Observaciones: Se debe mejorar la señalización durante el proceso de ejecución de la obra; la Interventoría en varias ocasiones le ha solicitado al Contratista la señalización de la obra; además este actividad cuenta con la financiación suficiente para la adquisición y puesta en marcha de estos elementos; debiéndose tener en cuenta el riesgo para los trabajadores y personal de la región que frecuenta la obra.					
Registro Fotográfico					

			
SPO01 – Trabajos en la vía	SIO01 –Aproximación a obra en la vía	SIO02 – Información de inicio de obra	SIO02 –Información de inicio de obra
			
SIO04 – Carril cerrado	Barricadas con señalizador vial tubular	Barreras plásticas flexibles (maletines)	1.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco
			
Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	2.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco.	Conos	Maletines con cinta de seguridad Peligro.

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

6. PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL DE LA OBRA			
	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
1	ANGELICA MARIA ALVIRA RAMIREZ	36.069.417	DIRECTOR DE OBRA
2	CLAUDIO CESAR MEJÍA	12.138.187	RESIDENTE DE OBRA
3	ALEJANDRO AVILA RESTREPO	94.393.644	INSPECTOR DE OBRA
4	YUDY MAGNOLIA MAJE PEÑA	36.288.338	PROFESIONAL SISOMA
6	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38.196.879	AUXILIAR ADMNISTRATIVO
7	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006	AUXILIAR
8	YENNY SAMANDA RAMIREZ BOTERO	1.075.266.993	AUXILIAR
9	ANDRES FELIPE TAVERA SANCHEZ	1.075.544.289	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	DEIVER RIVERA CARDOZO	83.169.787	CADENERO
11	MILLER TOVAR MONTES	4.884.422	TOPOGRAFO
12	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.818.343	VIGILANTE
13	GIOVANNI CRUZ FAJARDO	83.222.180	OPERADOR ORUGA
14	CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.078.777.075	CONDUCTOR VOLQUETA
15	ALVARO JAVIER LOZANO GUILOMBO	1.120.361.787	CONDUCTOR VOLQUETA
16	MILSAR MANRIQUE	4.891.355	CONDUCTOR VOLQUETA
17	JUAN PERDOMO	12.095.605	OPERADOR CARRO TANQUE
18	RICARDO ROA LUGO	4.884.991	CONDUCTOR VOLQUETA
19	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794	CONTROLADORAS DE TRAFICO
20	JAVIER PERDOMO HORTA	83.169.033	OPERATIVO
21	OMAR FABIAN TRUJILLO DUSSAN	1.075.539.707	OPERATIVO
22	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484	CONTROLADORAS DE TRAFICO

7. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

ITEMS	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGOS
1	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	1.075.227.937	DIRECTOR DE OBRA
2	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	1.075.246.303	RESIDENTE DE OBRA
3	GONSALEZ SALAS YESICA	1.075.239.208	INSPECTOR DE OBRA Y SISO
4	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	4.377.250	TOPOGRAFO
5	JUAN SEBASTIAN MALLUNGO REINOSO	1.003.828.965	CADENERO

8. CONCLUSIONES

Una vez terminado el proceso de seguimiento correspondiente a los periodos del 01 al 30 Abril. La Interventoría concluye:

8.1. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Contratista viene ejecutando las actividades propuestas; la Interventoría le ha realizado las respectivas recomendaciones tendientes a mejorar la calidad de la Seguridad de los Trabajadores.

8.2. Plan de Manejo de Tráfico (PMT)


El Contratista no cuenta con la totalidad de la señalización que se requiere para el proceso de construcción. La Interventoría le solicita al contratista los siguientes elementos del plan de Manejo de Trafico.

- SPO02-Maquinaria en la Vía.
- SPO03-Banderero
- SRO01-Via Cerrada
- SRO02 – Desvío
- SRO03 – Paso uno a uno
- SIO01 – Aproximación a obra en la vía
- SIO03 – Información de fin de obra
- Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche

Atentamente:

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023

9. ANEXOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA DE CHARLAS DE SEGURIDAD

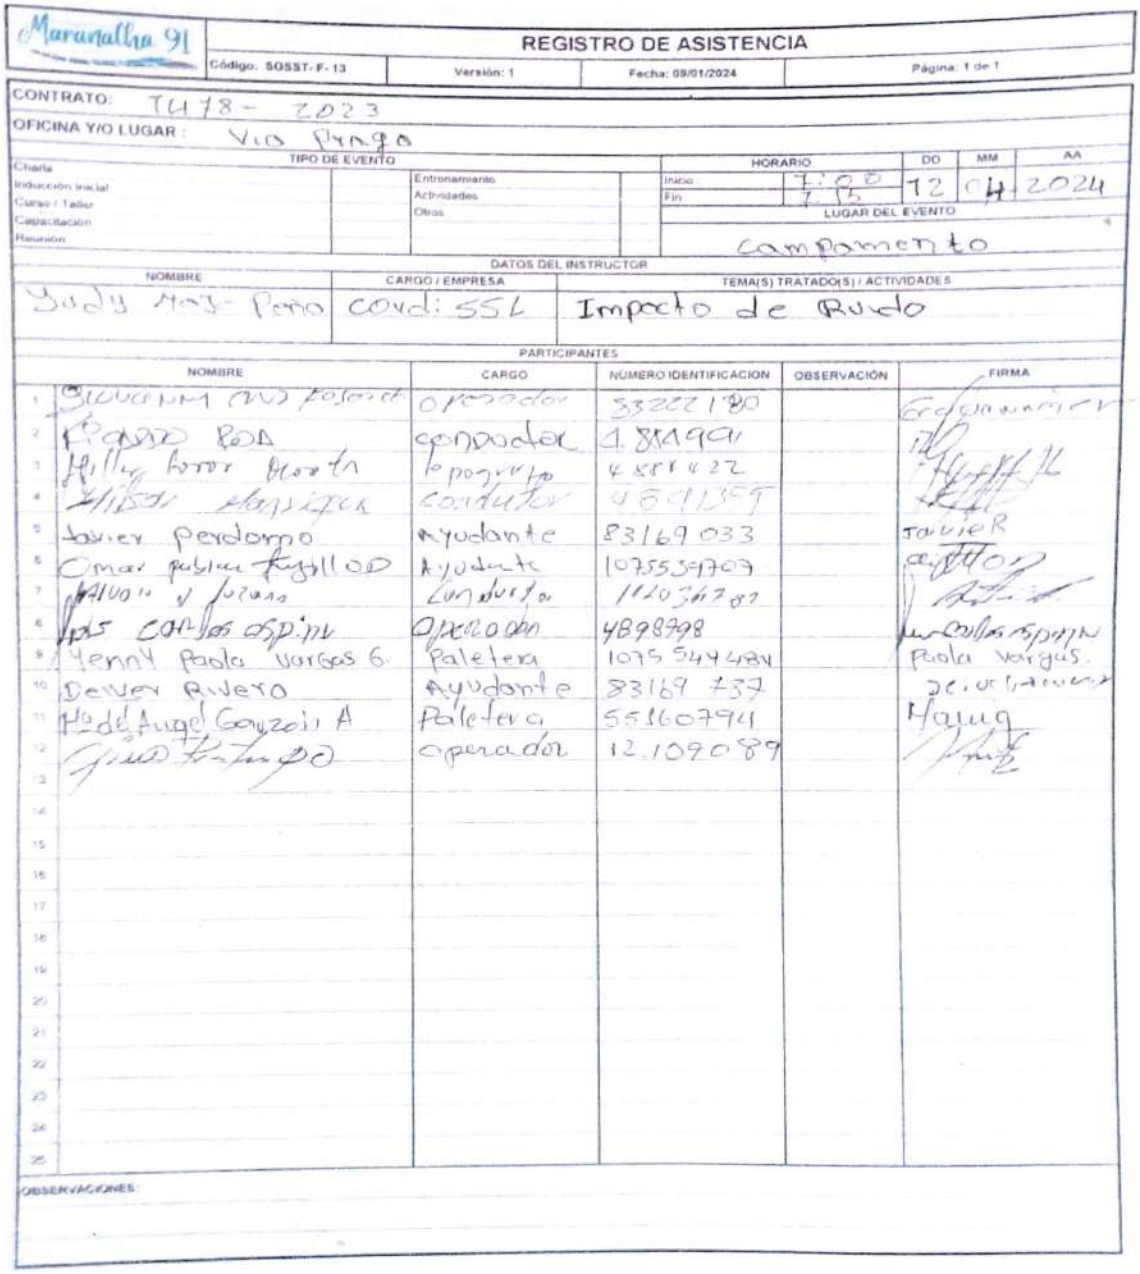

Maranatha 91 — REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST- F- 13	Versión: 1	Fecha: 09/01/2024	Página: 1 de 1

CONTRATO: TH 78 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Prado

TIPO DE EVENTO				HORARIO		DD	MM	AA
Charla		Entrenamiento		Inicio	7:00	12	04	2024
Induccion inicial		Actividades		Fin	7:45			
Curso / Taller		Otros		LUGAR DEL EVENTO				
Capacitacion				campamento				
Reunion								


DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Judy Mary Perdomo	covid: SSL	Impacto de Ruido

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NÚMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Segundo Orlando Polanco	operador	33222180		
2	Ricardo Rojas	conductor	1.8[illegible]191		
3	Holly Lotor Morta	topografo	4[illegible]22		
4	Wilson [illegible]	conductor	8[illegible]9		
5	Javier Perdomo	Ayudante	83169033		Javier
6	Omar Fabian Trujillo	Ayudante	1075549707		
7	[illegible]	Conductor	1120367887		
8	Jhon Carlos Ospina	Operador	4898798		
9	Yenny Paola Vargas G.	Paletera	1075544484		Paola Vargas.
10	Denver Rivera	Ayudante	83169 737		
11	Hade Angel Goyzoli A	Paletera	55160794		Hayuq
12	Jhon Tatunpo	operador	12.109089		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

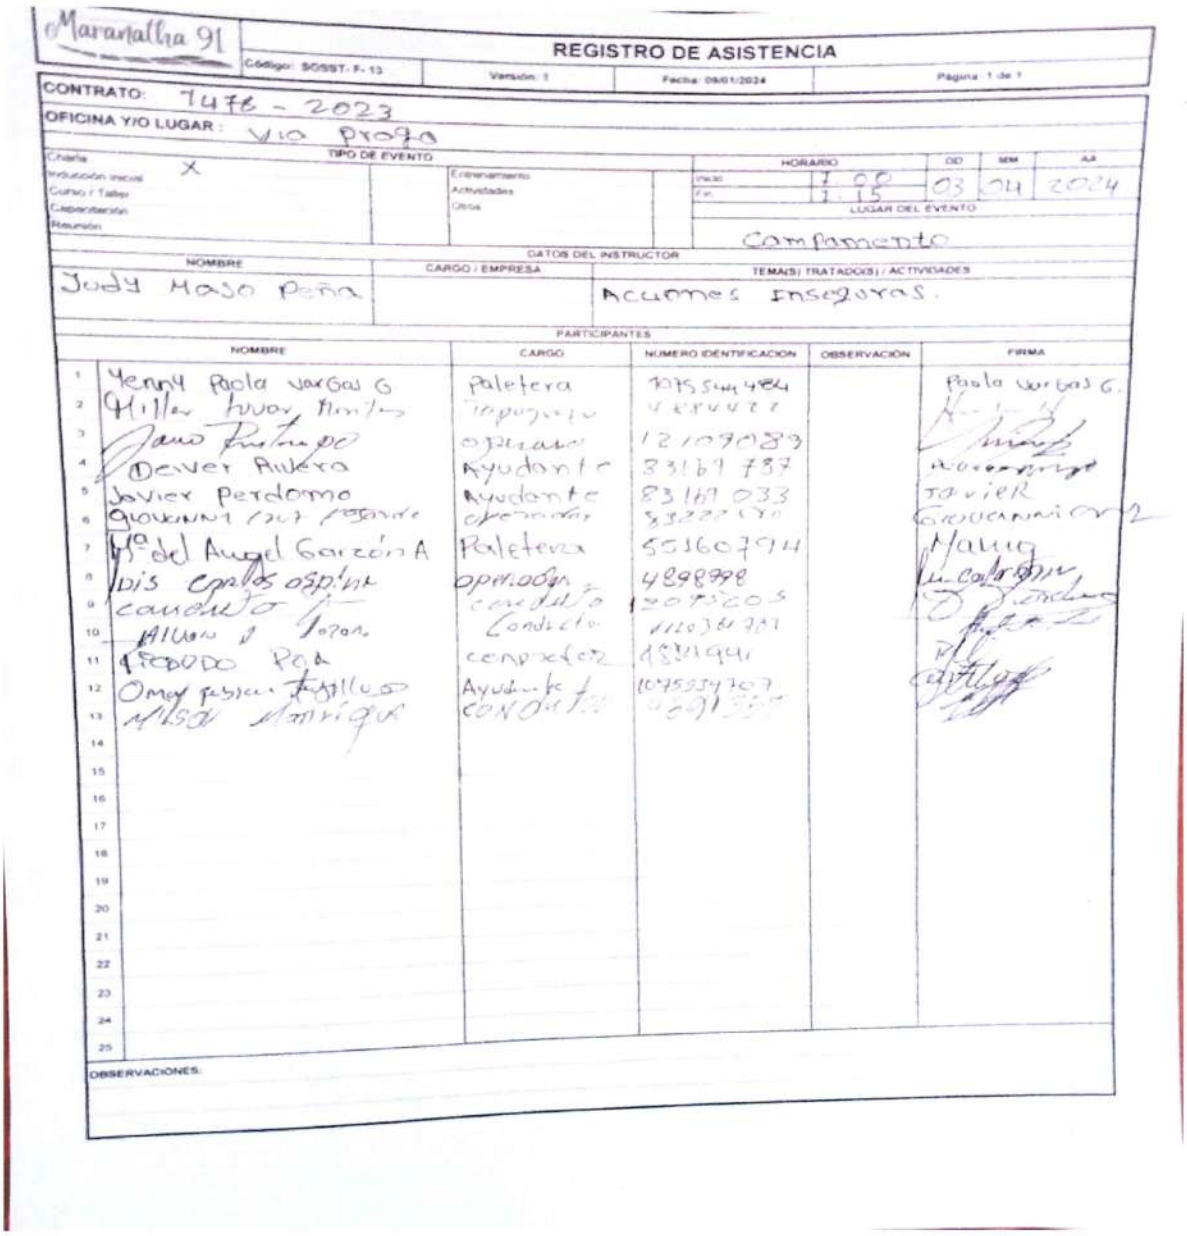

Maranatha 91

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST- F- 13 | Versión: 1 | Fecha: 09/01/2024 | Página: 1 de 1

CONTRATO: 7476 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Vía Prado

TIPO DE EVENTO: Charla X; Inducción inicial; Curso / Taller; Capacitación; Reunión; Entrenamiento; Actividades; Otros

HORARIO: Desde 7 09 | Fin 1 15 | DD 03 | MM 04 | AA 2024

LUGAR DEL EVENTO: Campamento


DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Judy Maso Peña		Acuerdos Ingresos.

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Yenny Paola Vargas G	Paletera	1075544484		Paola Vargas G.
2	Miller Ivan Ramirez	Topografo	4654427		
3	Jano Rodriguez	operario	12109083		
4	Dever Rivera	Ayudante	83169787		
5	Javier Perdomo	Ayudante	83169033		JAVIER
6	Giovanni Ruiz Losada	operador	83222170		GIOVANNI OR 2
7	Mª del Angel Garzón A	Paletera	55160794		Maria
8	Luis Carlos ospina	operador	4898798		
9	conductor	conductor	12075205		
10	Alvaro J Lopez	Conductor	1110361787		
11	Eduardo Paz	carpintero	1831941		
12	Omar Jesus Trujillo	Ayudante	1075534709		
13	Misa Manrique	conductor	4691		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

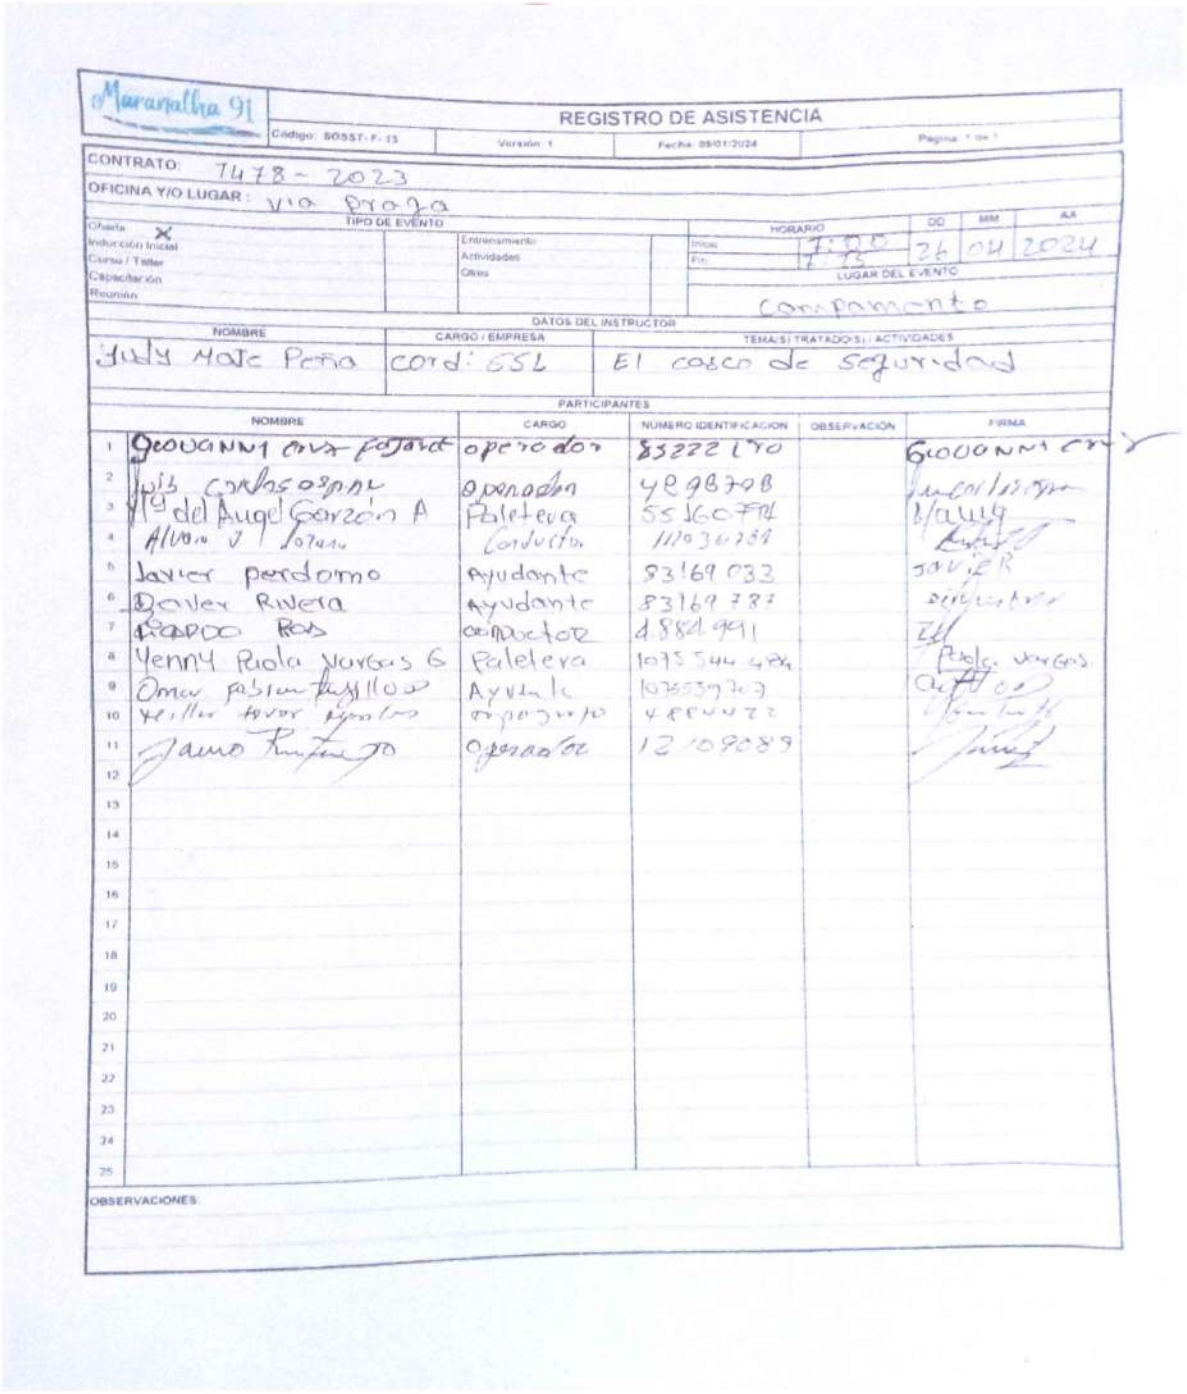

Maranatha 91

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST- F- 13	Versión: 1	Fecha: 05/01/2024	Página: 1 de 1

CONTRATO: 1478 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Praga

TIPO DE EVENTO

Oferta		Entrenamiento		HORARIO	DD	MM	AA
Inducción Inicial	X	Actividades		Inicio: 7:00	26	04	2024
Curso / Taller		Otros		Fin: 12			
Capacitación				LUGAR DEL EVENTO			
Reunión				Campamento			


DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Judy Maie Peña	cord: SSL	El casco de seguridad

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Giovanni Cruz Pajaro	operador	83222170		Giovanni Cruz
2	Luis Carlos Ospina	Operador	4898798		
3	Yg del Angel Garzón A	Paletera	55160714		
4	Alvaro J Jotaro	Conductor	1120361789		
5	Javier perdomo	Ayudante	83169033		Javier
6	Dover Rivera	Ayudante	83169787		
7	Pedro Ros	Operador	4882991		
8	Yenny Paola Vargas G	Paletera	1075 544 484		Paola Vargas
9	Omar Fabian Trujillo	Ayudante	1076539707		
10	Heiller Javier Ayala	operario	4884472		
11	Jairo Ruiz	Operador	12109089		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

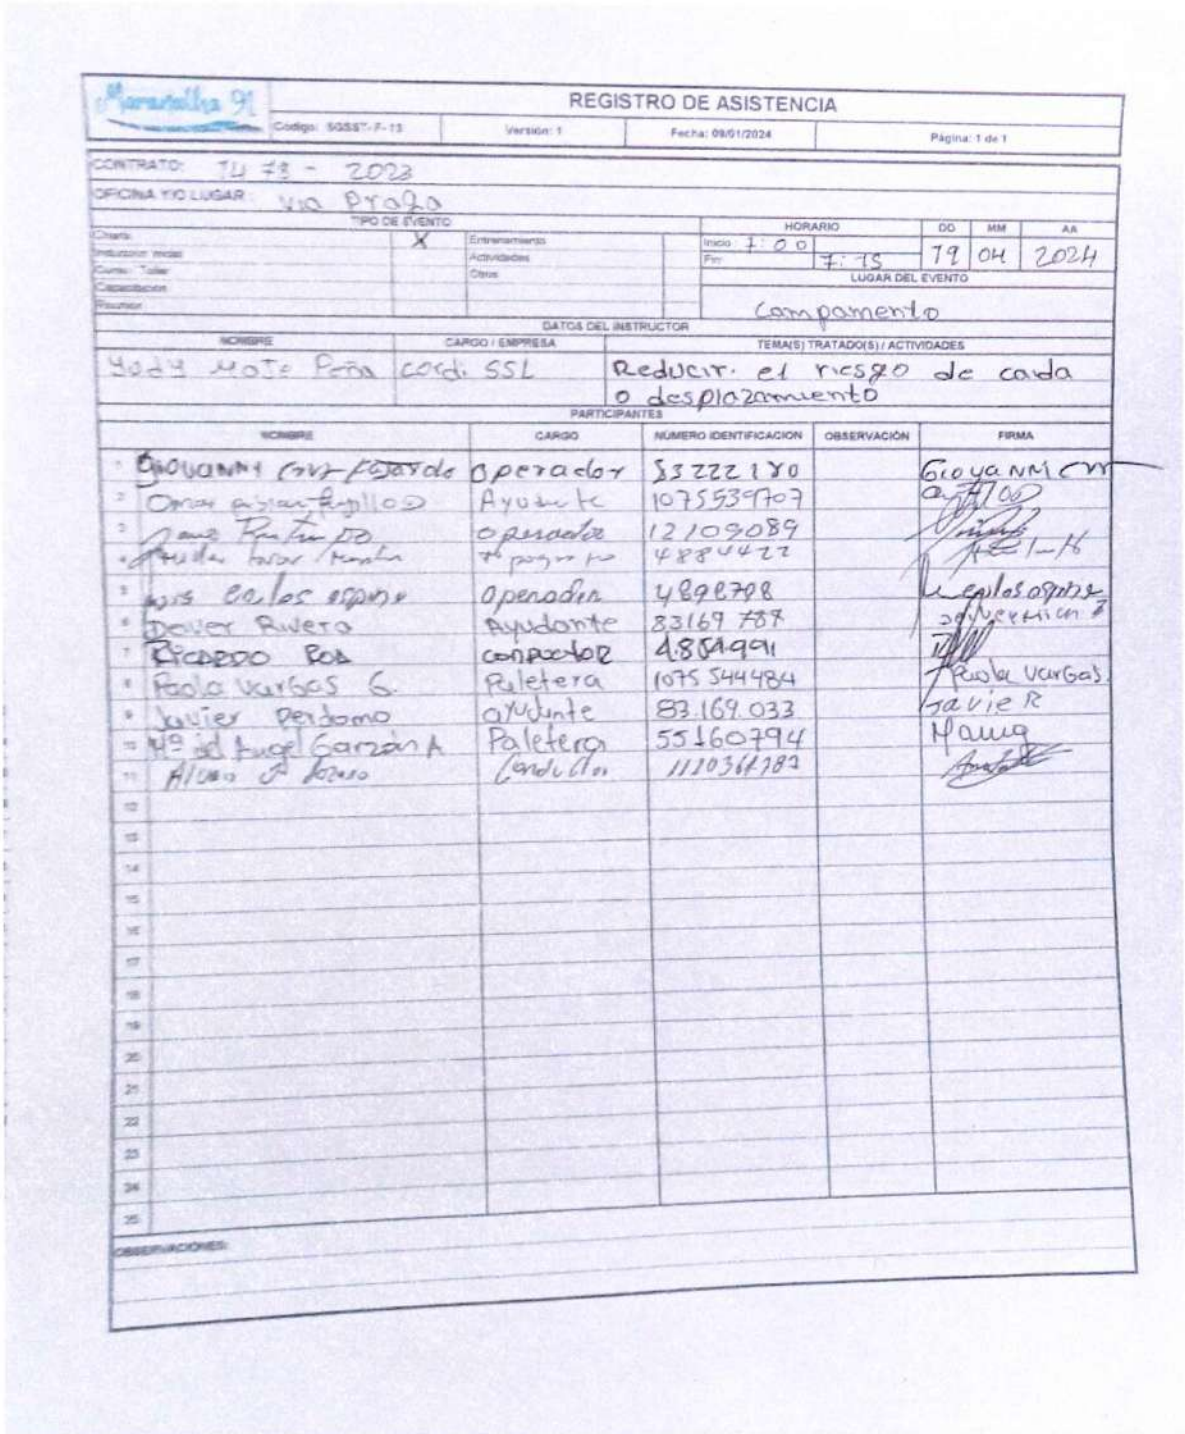

Maravilla 91

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo: SGSST- F- 13	Version: 1	Fecha: 09/01/2024	Página: 1 de 1

CONTRATO: TH 73 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Praga

TIPO DE EVENTO

						HORARIO		DD	MM	AA
Charla	X	Entrenamiento				Inicio	1:00	19	04	2024
Induccion inicial		Actividades				Fin	7:15			
Curso Taller		Otros				LUGAR DEL EVENTO				
Capacitacion						Campamento				
Reunion										

DATOS DEL INSTRUCTOR


NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Yoda Mota Peña	coord. SST	Reducir el riesgo de caida o desplazamiento

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Giovanny Cortazar	Operador	83222170		Giovanny Cortazar
2	Oscar Arley Trujillo	Ayudante	1075539707		
3	Jaime Ramirez	operador	12109089		
4	Aquiles Tovar Montes	Operador	4884422		
5	Luis Carlos Ospina	Operador	4898708		Luis Carlos Ospina
6	Dover Rivera	Ayudante	83169 787		
7	Ricardo Roa	compactor	4.884991		
8	Paola Vargas G.	Paletera	1075 544484		Paola Vargas
9	Javier Perdomo	ayudante	83.169.033		Javier R
10	Miguel Angel Garzón A	Paletero	55160794		Miguel
11	Alvaro J Lozano	Conductor	1110364782		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

10. ANEXOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES

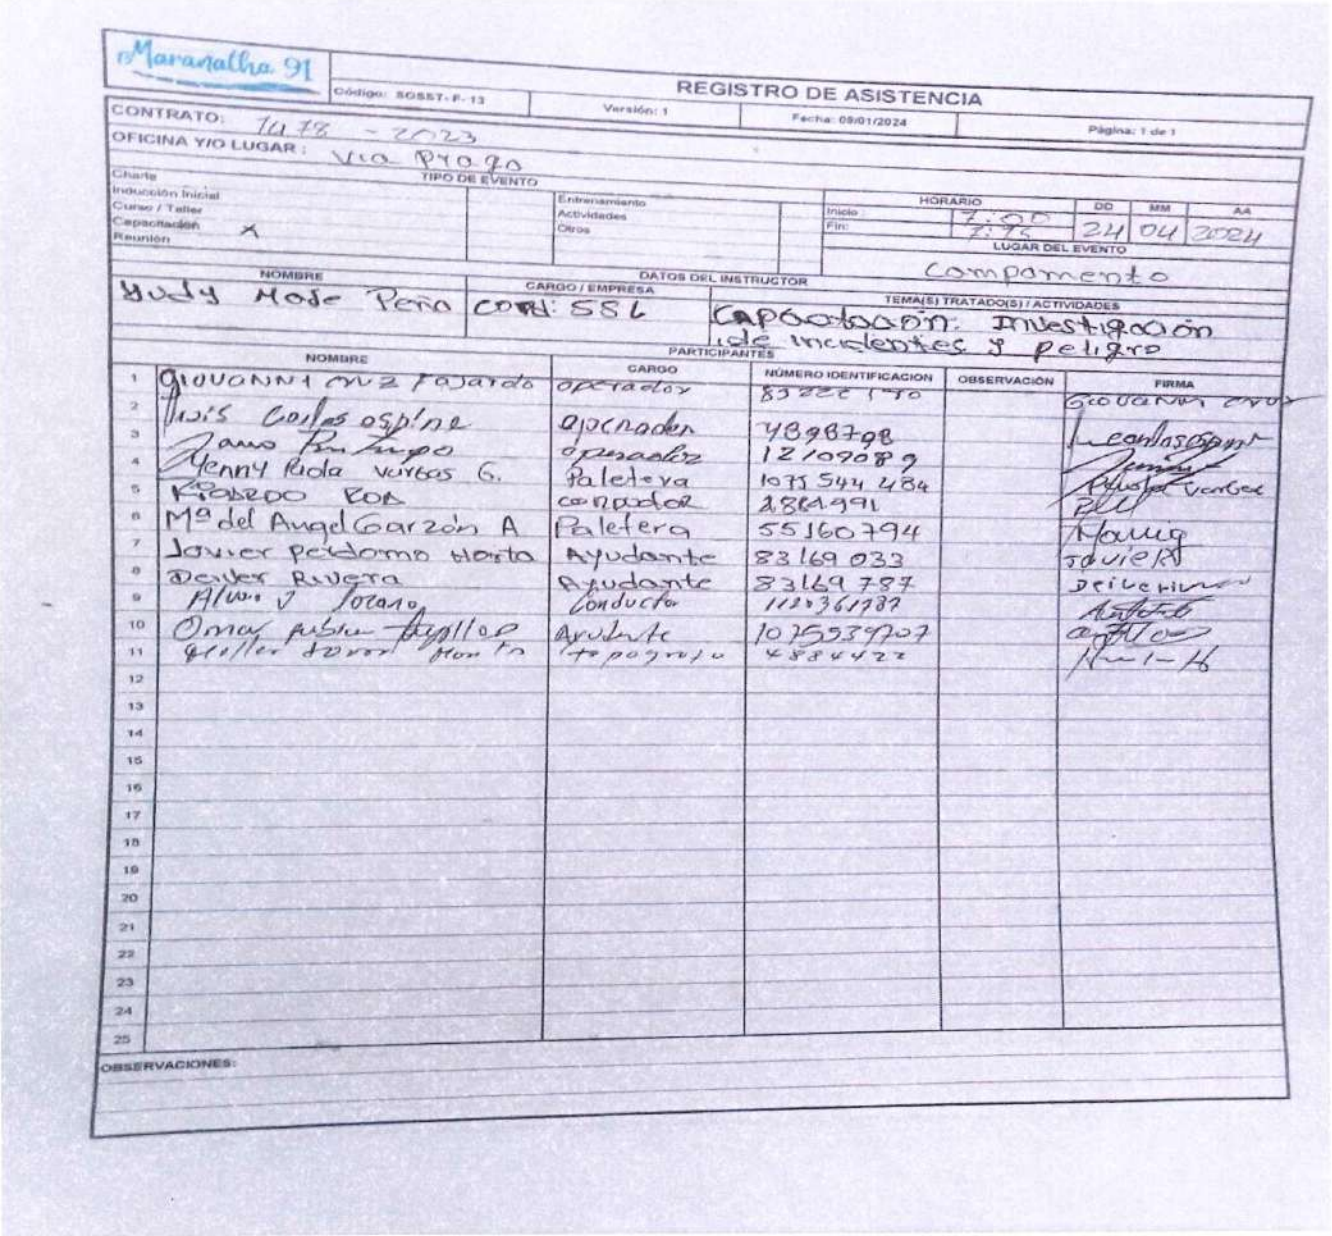

Maranatha 91 — REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST-F-13 | Versión: 1 | Fecha: 09/01/2024 | Página: 1 de 1

CONTRATO: 1178 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Palo

TIPO DE EVENTO: Charla; Inducción Inicial; Curso / Taller; Capacitación: X; Reunión; Entrenamiento; Actividades; Otros

HORARIO: Inicio: 7:00 | Fin: 7:45 | DD: 24 | MM: 04 | AA: 2024

LUGAR DEL EVENTO: Campamento

DATOS DEL INSTRUCTOR


NOMBRE: Judy Rose Peña | CARGO / EMPRESA: CONI SAS | TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES: Capacitación: Investigación de incidentes y peligro

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NÚMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	GIOVANNI ORTEGA Pajarito	operadora	83222170		GIOVANNI ORTEGA
2	Luis Carlos Ospina	operador	4898798		
3	Jairo Pinzon	operador	12109089		
4	Jenny Paola Ventos G.	Paletera	1075544484		
5	Rosbedo Ros	conductor	2864991		
6	Mª del Angel Garzón A	Paletera	55160794		
7	Javier Perdomo Horta	Ayudante	83169033		
8	Dayler Rivera	Ayudante	83169787		
9	Alvaro J Tocaria	Conductor	1120361789		
10	Omar Julian Trujillo	Ayudante	1075539707		
11	Greiller Dorado Montes	topografo	4884422		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

11. ANEXOS DE PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE TRABAJO ATS

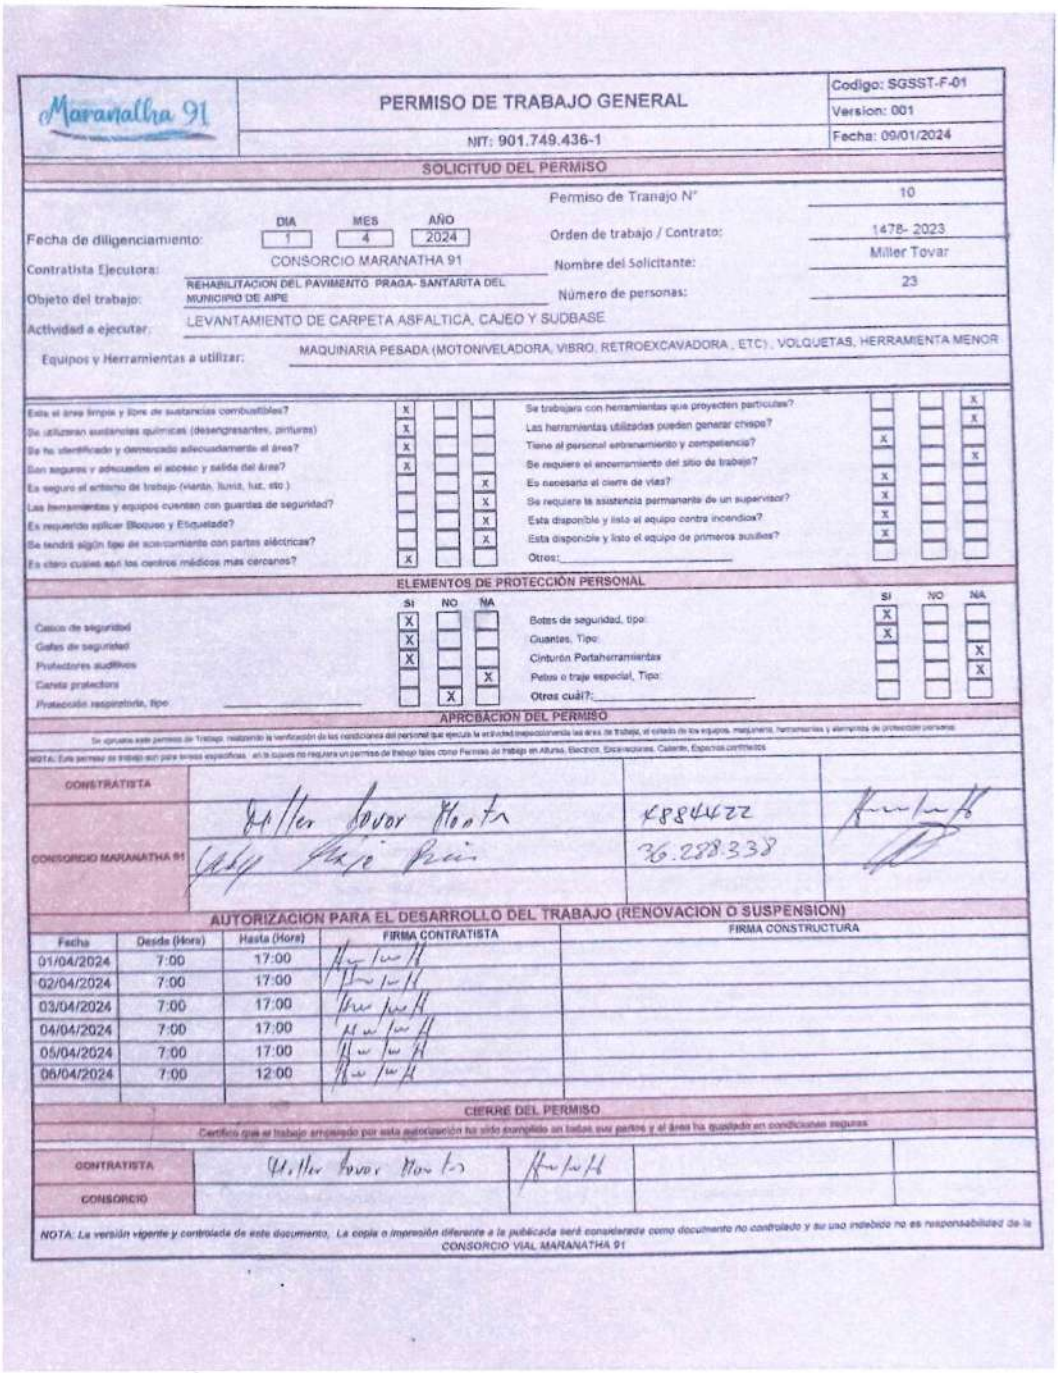

Maranatha 91

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

NIT: 901.749.436-1

Codigo: SGSST-F-01
Version: 001
Fecha: 09/01/2024

SOLICITUD DEL PERMISO

Permiso de Tranajo N°: 10

Fecha de diligenciamiento: DIA 1 MES 4 AÑO 2024

Orden de trabajo / Contrato: 1478- 2023

Contratista Ejecutora: CONSORCIO MARANATHA 91

Nombre del Solicitante: Miller Tovar

Objeto del trabajo: REHABILITACION DEL PAVIMENTO PRAGA- SANTARITA DEL MUNICIPIO DE AIPE

Número de personas: 23

Actividad a ejecutar: LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE

Equipos y Herramientas a utilizar: MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA, VIBRO, RETROEXCAVADORA , ETC) , VOLQUETAS, HERRAMIENTA MENOR

Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X			Se trabajara con herramientas que proyecten particulas?			X
Se utilizaran sustancias quimicas (desengrasantes, pinturas)	X			Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?			X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X			Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X		
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X			Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?			X
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)			X	Es necesario el cierre de vias?	X		
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?			X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X		
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado?			X	Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X		
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?			X	Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X		
Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X			Otros:_____			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA		SI	NO	NA
Casco de seguridad	X			Botes de seguridad, tipo:	X		
Gafas de seguridad	X			Guantes, Tipo:	X		
Protectores auditivos	X			Cinturón Portaherramientas			X
Careta protectora			X	Peto o traje especial, Tipo:			X
Protección respiratoria, tipo: _____		X		Otros cuál?:_____			

APROBACION DEL PERMISO

Se aprueba este permiso de Trabajo, realizando la verificación de las condiciones del personal que ejecuta la actividad inspeccionando las áreas de trabajo, el estado de los equipos, maquinaria, herramientas y elementos de protección personal.

NOTA: Este permiso de trabajo son para tareas específicas, en la cuales no requiera un permiso de trabajo tales como Permiso de trabajo en Alturas, Electrico, Excavaciones, Caliente, Espacios confinados

CONTRATISTA			
CONSORCIO MARANATHA 91	Miller Tovar Manta	4884422	
	Jesus Plazas Rios	36.288.338	

AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (RENOVACION O SUSPENSION)

Fecha	Desde (Hora)	Hasta (Hora)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA CONSTRUCTURA
01/04/2024	7:00	17:00		
02/04/2024	7:00	17:00		
03/04/2024	7:00	17:00		
04/04/2024	7:00	17:00		
05/04/2024	7:00	17:00		
06/04/2024	7:00	12:00		

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido ejecutado en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

CONTRATISTA	Miller Tovar Manta			
CONSORCIO				

NOTA: La versión vigente y controlada de este documento, La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

Maranatha 91	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Codigo: SGSST-F-04	Pagina 1 -2
		Version: 001	
	NIT. 901.749.436 - 1	Fecha: octubre/ 2023	

ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE		NO. PERMISO: 10
FECHA: 01 - 04 - 2024	CONTRATISTA: Miller Tovar Montes	PROYECTO: 1478 - 2023

Nota: Identificar las tareas y peligros que se pueden generar en la tarea realizada de acuerdo a condiciones relacionadas por fenomenos naturales.

No.	TAREAS	PELIGRO (ACTO O CONDICIÓN INSEGURA)	RIESGO (RESULTADO PROBABLE)	CONTROLES (ELIMINACIÓN - SUSTITUCIÓN - CONTROL ADMINISTRATIVO - USO EPP)
1	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**BIOLOGICO:** COVID-19 **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS SIN DESINFECTAR **PSICOSOCIAL:** INDISCIPLINA INDIVIDUAL O COLECTIVA	**BIOLOGICO:** CONTACTO COVID-19, DOLOR DE CABEZA, IRRITABILIDAD, CANSANCIO, **PSICOSOCIAL:** PERDIDA DE TRABAJO / PUESTO LABORAL	**BIOLOGICO:** USO PERMANENTE DE TAPABOCAS, LAVADO DE MANOS, CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO PERMANENTE. **PSICOSOCIAL:** CHARLAS, CAPACITACIONES, SUPERVISION EFECTIVA.
2	INSPECCION DE ARNAS, BOLIPOS O HERRAMIENTAS.	RIESGOS FISICO, QUIMICO, MECÁNICO, RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES, MACHUCONES, ATRAPAMIENTOS.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	INSPECCION PREOPERACIONAL, USO DE EPP, COMUNICACIÓN ASERTIVA, VALORACIÓN ADECUADA DEL RIESGO.
3	REPLANTEO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES, BACTERIAS.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL. **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** DOLOR LUMBAL, ESGUINCES **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
4	REAHAVILITACION DEL PAIMENTO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **QUIMICO:** MATERIAL PARTICULADO. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, CANSANCIO, QUEMADURAS EN LA PIEL. **QUIMICO:** PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, IN HALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO). **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **QUIMICO:** UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
6	LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **QUIMICO:** MATERIAL PARTICULADO. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, CANSANCIO, QUEMADURAS EN LA PIEL. **QUIMICO:** PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, IN HALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO). **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **QUIMICO:** UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. USO DE ARNES Y ESLINGAS SIEMPRE ANCLADO A LA LINEA DE VIDA EXISTENTE. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
7	ORDEN Y ASEO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL. **MECANICO:** GOLPES, HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.

APROBACIÓN			
	CONTRATISTA	Miller Tovar Montes	
	CONSTRUCTORA		

Maranatha 91	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Codigo: SGSST-F-04	Pagina 1 -2
	NIT. 901.749.436 - 1	Version: 001	
		Fecha: octubre/ 2023	

ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE — NO. PERMISO: 10

FIRMAS DE QUIENES PARTICIPAN DE LA ACTIVIDAD: Mediante la firma certificamos que conocemos todos los riesgos a los que estamos expuestos al desarrollar la actividad y nos comprometemos a realizar los controles establecidos en el ATS.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	36.196.879					
2	DEIVER RIVERA CARDOZO	83.169.787					
3	JAVIER PERDOMO HORTA	83.169.033					
4	MILLER TOVAR MONTES	4.884.~~891~~477					
5	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484	Paola Vargas.				
6	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794	Maria Garzon				
7	GIOVANNI CRUZ FAJARDO	83.222.180	GIOVANNI CRUZ				
8	JUAN PERDOMO	12.095.605					
9	LUIS CARLOS OSPINA	~~1.003.051.624~~ 4898798					
10	JAIRO RESTREPO ROJAS	~~7.720.219~~ 12109089					
11	ALVARO JAVIER LOZANO GUILOMBO	1.120.361.787					
12	CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.078.777.075					
13	MILSAR MANRIQUE	4.891.355					
14	RICARDO ROA LUGO	4.884.991					
15	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.818.343	Carlos A.O				
16	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006					
15	OMAR FABIAN TRUJILLO	1.075.539.707					
16							
17							
16							
17							

La versión vigente y controlada de este documento, La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del CONSORCIO MARANATHA 91

12. ANEXOS DE FORMATO DE REPOSICIÓN E.P.P

Maranatha 91

REPOSICION DE DOTACION Y EPP


Codigo: SGSST - F-15 | Version: 1 | Fecha: 10/01/2024 | Pagina: 1 de 1

CONTRATO: 1478 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Campamento

FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL													FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			CAMISA	JEANS	CASCO	BOTAS	BARBUQUEJO	GUANTES			GAFAS		TAPA OIDOS	MASCARILLA DESECHABLE	OTROS		
								VAQUETA	POLIESTER	CAUCHO	CLARAS	OSCURAS					
16/04/24	Omar F. Trujillo	7075539762						X									
16/04/24	Alberto Lozano	1120364742						X				X					
16/04/24	Dever Rivera	83169787						X				X					
16/04/24	Cesar cardoso	7078777035						X									
16/04/24	Javier Pedroza	83169033						X				X					
16/04/24	Miller Toro	4.884422						X				X					
22/04/24	Giovanny Cruz	83222180						X									

13. ANEXOS DE SEGUIMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNO

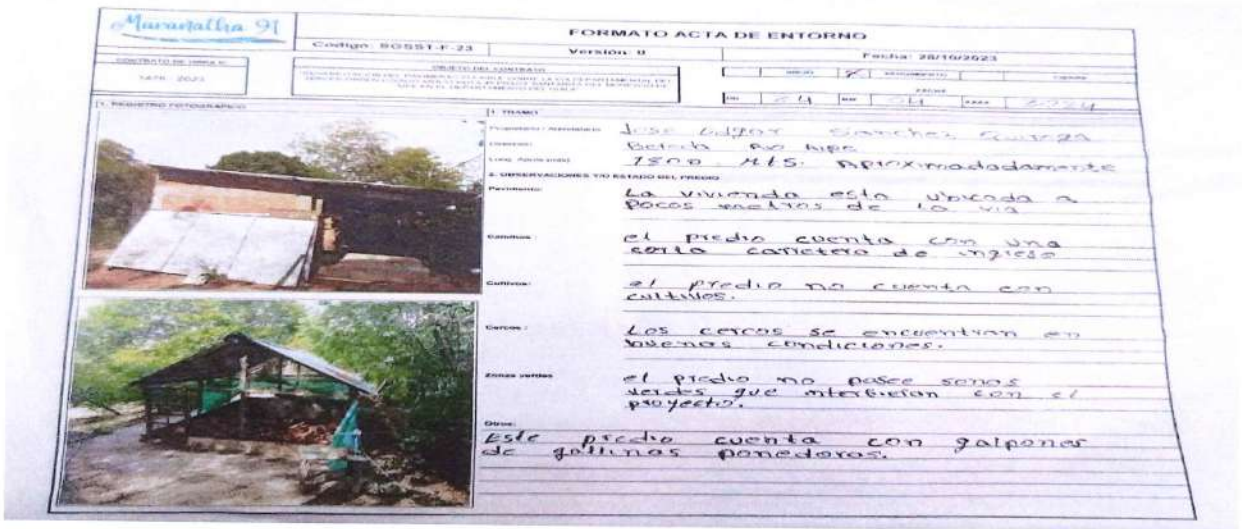

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Código: SGSST-F-23 | Versión: 0 | Fecha: 28/10/2023

Jose Edgar Sanchez Suarez

Belén No hice

1500 M.S. Aprox. Medadamente

La vivienda esta ubicada a pocos metros de la vía


el predio cuenta con una sola carretera de ingreso

el predio no cuenta con cultivos.

Los cercos se encuentran en buenas condiciones.

el predio no posee sonos sensibles que interfieran con el proyecto.

Este predio cuenta con galpones de gallinas ponedoras.

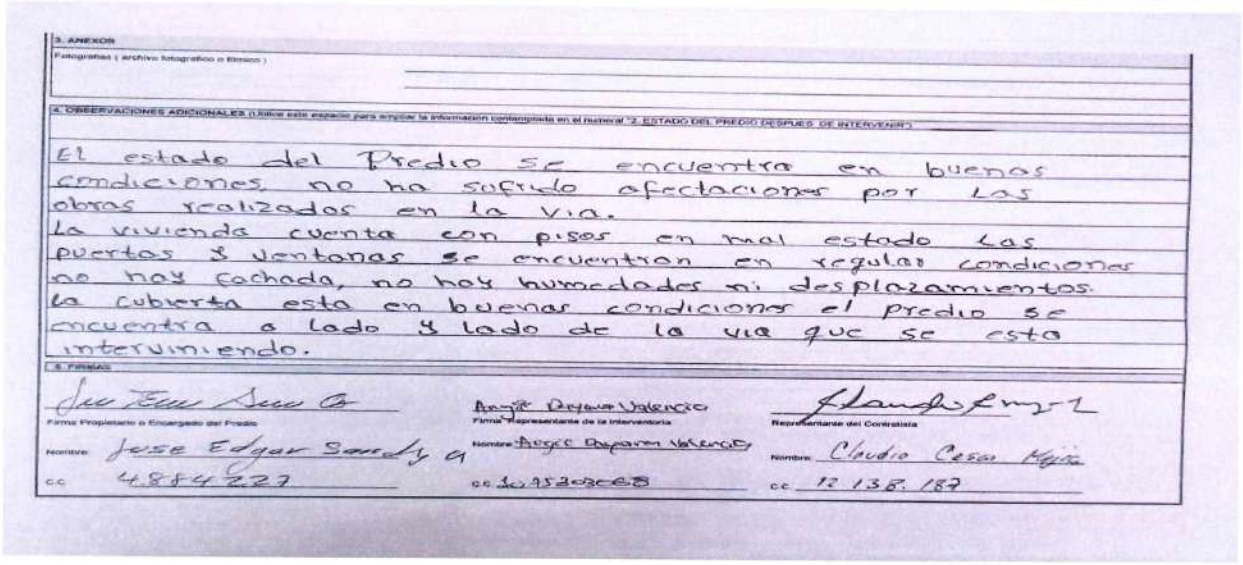

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o físico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")

El estado del Predio se encuentra en buenas condiciones no ha sufrido afectaciones por las obras realizadas en la vía.
La vivienda cuenta con pisos en mal estado las puertas y ventanas se encuentran en regulares condiciones no hay fachada, no hay humedades ni desplazamientos.
La cubierta esta en buenas condiciones el predio se encuentra a lado y lado de la vía que se esta interviniendo.

5. FIRMAS

Firma Propietario o Encargado del Predio — Nombre: Jose Edgar Sanchez — CC 4884227

Firma Representante de la Interventoría — Nombre: Angie Dayana Valencia — CC 1.075.252.268

Representante del Contratista — Nombre: Claudio Cesar Mejia — CC 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Codigo: SGSST-F-23	Versión: 0	Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE SOBRE LA VÍA CENTRO ORIENTE CERCA DEL PUENTE PEATONAL EL MACHO DEL ESTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA: DIA 01 MES 11 AÑO 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. TRAMO

Propietario / Arrendatario: Andres Moreno

Dirección: Bateda callejon

Long. Aprox. (Mts): 900 MTS

2. OBSERVACIONES Y/O ESTADO DEL PREDIO

Pavimento: La vivienda esta ubicada en la via

Caminos: No cuenta con caminos de acceso.

Cultivos: Este predio cuenta con cultivos de mango, papaya y limon

Cercos: El predio cuenta con los cercos en buen estado.

Zonas verdes: El predio no posee zonas verdes que interfieran en el proyecto.

Otros: La casa no cuenta con pares, ventanas, pisos.

3. ANEXOS

Fotografías / archivo fotográfico o filmico 1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR)

Este predio no cuenta con una casa para vivir allí ya que se le estan levantando paredes como tambien cedolo se esta haciendo un algibe para sacar agua para regar los arboles.

Este predio no se encuentra afectado por los trabajos que se estan realizando por parte del consorcio vial maranatha 91.

5. FIRMAS

Andres Moreno	Angie Dayana Valencia	
Firma Propietario o Encargado del Predio	Firma Representante de la Interventoría	Representante del Contratista
Nombre Andres Moreno	Nombre Angie Dayana Valencia	Nombre
CC 83168907	CC 1075283058	CC 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Codigo: SGSST-F-23	Versión: 0	Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1476 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL TERCER ORDEN CODIGO 4906 20 ACETA 45 PRADA SANTAFE DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

INICIO | X | SEGUIMIENTO | CIERRE

FECHA: DD 19 | MM 04 | AÑO 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





1. TRAMO

Propietario / Arrendatario: Uriel castilla Sanchez
Direccion: Acceda calleson
Long. Aprox (mts): 580 415 Approximadamente

2. OBSERVACIONES Y/O ESTADO DEL PREDIO

Pavimento: La casa se encuentra ubicada a unos 250. 415. de la via.

Caminos: El predio no cuenta con caminos de acceso

Cultivos: el predio posee cultivos pequeños como melon y patilla.

Cercos: Los cercos del predio se encuentran en buenas condiciones.

Zonas verdes: el predio no posee zonas verdes que interfieran con el proyecto.

Otros: Este predio es una hacienda que cuenta con ganado y cultivos.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o filmico):

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")

Este predio se encuentra ubicado al lado de la via que se esta interviniendo por parte del consorcio vial maranatha 91. Cuenta con pastos para ganado y cultivos de melon y papaya.
Los cuales no se an visto afectados por los obras que se estan realizando en la via.
La vivienda se encuentra ubicada a pocos metros de la via y tampoco se a visto afectada por los obras.
Los puertas, ventanas, pisos, paredes y cobierta se encuentras en buen estado.

5. FIRMAS

Firma Propietario o Encargado del Predio	Firma Representante de la interventoria	Representante del Contratista
Nombre: URIEL	Nombre: Jorge Dayana Valencia	Nombre:
C.C. 83169695	C.C. 1093230248	C.C. 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Codigo: SGSST-F-23 | Versión: 0 | Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2023


OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL TERCER ORDEN CONOCIDA COMO VIA HUILA 45 PRADA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INICIO: X | SEGUIMIENTO: | CIERRE:

FECHA: DD: 22 MM: 04 AAAA: 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



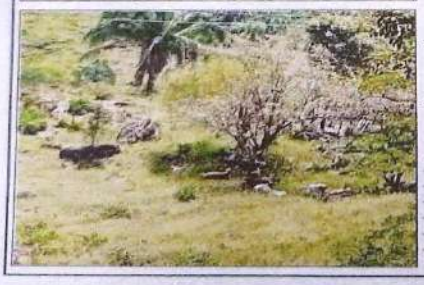

1. TRAMO

Propietario / Arrendatario: Edwer Lima Osorio

Dirección: Vereda Santa Barbara Cruce

Long. Aprox (mts): 800 Mts:

2. OBSERVACIONES Y/O ESTADO DEL PREDIO

Pavimento: este predio se encuentra sobre la via que se esta interviniendo.

Caminos: el predio no posee caminos de acceso.

Cultivos: el proyecto no interviene con el cultivo de ganaderia

Cercos: cerca de alambre pua al rededor de la casa

Zonas verdes: el predio no posee zonas verdes que interfieran con el proyecto.

Otros: La estructura fisica de la casa se encuentra en muy malas condiciones.

3. ANEXOS

Fotografías / archivo fotográfico o filmico:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")

En este predio se evidenciaron las paredes agrietadas los pisos levantados el techo con goteras la estructura se encuentra en malas condiciones.
Las ventanas y puertas estan en buen estado
la fachada esta en malas condiciones.
La casa cuenta con un salon donde hay una mesa de billar pul un juego de mesa y el piso de este salon se esta empesando a agrietar.

5. FIRMAS

Edwer Lima O.	Angie Dayana Valencia	Claudio Mejia
Firma Propietario o Encargado del Predio	Firma Representante de la Interventoria	Representante del Contratista
Nombre: Edwer Lima O.	Nombre: Angie Dayana Valencia	Nombre: Claudio Cesar Mejia
CC 1075538360.	CC 1075302068	CC 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Codigo: SGSST F-23 | Versión: 0 | Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N° 1478 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, SUMINISTRO, CARGUE, DESCARGUE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACIÓN DENSA DE LA VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Fecha: DD 22 MM 04 AAAA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Propietario / Arrendatario: Fabio Plazas Alvarez

Dirección: Vereda San Isidro Sitio la Pradera

Long. Aprox. (mts): 300 Mts. Aproximadamente

2. OBSERVACIONES Y/O ESTADO DEL PREDIO

Pavimento: La casa se encuentra ubicada apocos metros de la carretera.

Caminos: el predio cuenta con un camino de acceso a la vivienda.

Cultivos: el predio cuenta con cultivo de caña de azucar

Cercos: Los cercos son de alambre Pua a los al rededores del predio.

Zonas verdes: el predio no posee zonas verdes que interfieran con la obra que se esta realizando

Otros: El predio se encuentra en buenas condiciones y los cultivos no han sido afectados por los trabajos que se estan realizando.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o Blanco):

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")

Las condiciones de la casa se encuentra en buenas condiciones. las paredes, ventanas, puertas y pisos estan en buenas condiciones.
Los cultivos no han sido afectados por los trabajos realizados por parte del consorcio Vial maranatha 91.

5. FIRMAS

Fabio Plazas
Firma Propietario o Encargado del Predio

Fabio Plazas
Nombre

1210320
CC

Angie Dayana Valencia
Firma Representante de la Interventoria

Angie Dayana Valencia
Nombre

1075303068
CC

Claudio Cesar Mejia
Representante del Contratista

Claudio Cesar Mejia
Nombre

12.138.187
CC

Maranatha II

FORMATO ACTA DE ENTORNO

Codigo: SGSST-F-23	Versión: 0	Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL TUNEL 24 (INCLUYENDO ESTRUCTURAS 22 PUNTA ALTA Y OTRAS) SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INICIO: X | SEGUIMIENTO: | CIERRE:

FECHA: DIA 24 | MES 03 | AÑO 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







1. TRAMO

Propietario / Arrendatario: Marcos Tovar

Dirección: Borde seca barbara

Long. Aprox (mts): 400 Mts. Aproximadamente

2. OBSERVACIONES Y/O ESTADO DEL PREDIO

Pavimento: el predio esta ubicado a unos 1.50. de la via.

Caminos: el predio no cuenta con caminos de acceso.

Cultivos: Los cultivos estan en buenas condiciones se esta cultivando. limon, pollos de engorde y mamanas

Cercas: hay cercas de limon y alambre pua. Al rededor de la vivienda.

Zonas verdes: el predio no cuenta con zonas verdes y interfieran en la obra.

Otros: La casa esta ubicada cerca a la quebrada bambuca.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográficos o fílmicos):

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")

Este predio esta en buenas condiciones no e encontrado daños por parte del consorcio vial maranatha 2. la casa se encuentra ubicada al borde de una quebrada. las puertas y ventanas se encuentran en buenas condiciones.

5. FIRMAS

Marcos Tovar	Angel Dayana Valencia	Claudio Cesar Mejia
Firma Propietario o Encargado del Predio	Firma Representante de la Interventoria	Representante del Contratista
Nombre: Marcos Tovar	Nombre: Angel Dayana Valencia	Nombre: Claudio Cesar Mejia
CC 1188449O	CC 1083393663	CC 12.138.187

Maramatha 91

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

Codigo: SGSST-F-23 | Version: 0 | Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL OCI TERCER UNIDEN CUCHO 45+622 RUTA 40 PRADA SANTANITA DEL MUNICIPIO OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO OCI NOLA"

INICIO: X | SEGUIMIENTO: | CIERRE:

FECHA: DD 29 MM 04 AAAA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Elizabeth Ferreira Narvaez
Tenencia: Propietario: X | Arrendatario: | Poseedor: | Otro Cual?:
Nombre del Propietario: Elizabeth Ferreira Narvaez
Dirección: Vereda santa barbara
Telefono: 3118255796 | No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 15 mts.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	El ander de la vivienda se esta agrietando por la vibracion del vibrocompactador
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL: 1. Residencial: X | 2. Comercial | 3. Industrial | 4. Institucional | 5. Recreacional | 6. Baldio | 7. Otro | Cual?

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI | NO: X | Cubierto | El garaje es usa como comercio SI | NO

3. ESTADO DEL PREDIO: (Utilice el numeral "3. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Si hay
MUROS: no hay
CUBIERTA: Si hay
PISOS: Si hay
FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: No hay
HUMEDADES: No hay
HUNDIMIENTO PISO: No hay
DESPLAZAMIENTOS: No hay
OTRO Cual?:

3. ANEXOS
Fotografias (archivo fotografico o filmico):

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Esta vivienda esta ubicada al lado de la via y cuenta con pisos, paredes y esta enrejada no cuenta con puertas y ventanas las paredes se estan agrietando por la vibracion del vibrocompactador y igual que el piso del ander se esta agrietando por la vibracion.
de resto no ha tenido mas afectaciones por los trabajos que se estan realizando en la via por parte del consorcio vial maramatha 91.

5. FIRMAS

Firma Propietario o Encargado del Predio
Nombre: Elizabeth Ferreira Narvaez
CC: 38196799.

Firma Representante de la Interventoria
Nombre: Angie Daniela Valencia Sanchez
CC: 1075303068

Representante del Contratista
Nombre: Claudio Cesar Rojas
CC: 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

Codigo: SGSST-F-23 | Versión: 0 | Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL TERCER ORDEN CODIGO 4906ZE RUTA 45 PRADA SANTARITA DEL MUNICIPIO DE ALPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

INICIO: X | SEGUIMIENTO | CIERRE | FECHA: DD 28 MM 04 AAAA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Jesus Antonio Hoyo Ramos
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? USUFRUCTO
Nombre del Propietario: Jesus Antonio Hoyo Ramos
Dirección: Barrio santa barbara
Teléfono: 3209726577 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts.): 12 MTS. APROXIMADAMENTE

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☒
2. Alcantarillado	☐	☒
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: esta vivienda se encuentra sola ya la estan habitando
Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒
Cuantos:
El garaje se usa como: comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Si hay	GRIETAS Y FISURAS:	Si hay
MUROS:	No hay	HUMEDADES:	No hay
CUBIERTA:	Si hay	HUNDIMIENTO PISO:	Si hay
PISOS:	Si hay	DESPLAZAMIENTOS:	No hay
FACHADA:	No hay	OTRO: Cual?	esta cosa no esta apta para vivir

4. ANEXOS
Fotografías (archivo fotografico o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Este predio se encuentra en muy malas condiciones no esta habitable ya que las paredes, pisos, puertas, ventanas y cubierta no estan en buenas condiones. La casa esta totalmente danada al lado de la casa hay un Arbol de mango.

5. FIRMAS

JESUS ANTONIO H
Firma Propietario o Encargado del Predio
Nombre JESUS ANTONIO
CC 83164705

Firma Representante de la Interventoria
Nombre Angie Daniela Valencia
CC 1075303080

Representante del Contratista
Nombre Claudio Cesar Mejia
CC 12.138.187

Maranatha 91

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

Código: SGSST-F-23 | Versión: 0 | Fecha: 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA N°: 1478 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DEL TERCER ORDEN CÓDIGO 4516-27 RUTA 40 PISAGUA SANTARITA DEL MUNICIPIO DE ARPU EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

INICIO: X | SEGUIMIENTO: | CIERRE:

FECHA: DD 29 MM 04 AAAA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Cecilia Cubillos Polanco

Tenencia: Propietario: X | Arrendatario: | Poseedor: | Otro Cual? Cuidador

Nombre del Propietario: Jose Walter Narvaez

Dirección: Vereda San Isidro Finca las mamas

Teléfono: 3105600687 | No. de predios: 1

Long. del frente (mts): 400 mts

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	El predio no se encuentra conectado a ningun servicio publico ya que se encuentra alejado de la via
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI | NO X
Cuantos:
El garaje es uso zarro comercio: SI | NO

3. ESTADO DEL PREDIO (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Si Tiene	GRIETAS Y FISURAS: Si tiene
MUROS: No Tiene	HUMEDADES: Si hay humedad
CUBIERTA: Si Tiene	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: Si tiene	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
FACHADA: Si tiene	OTRO Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Las paredes se encuentran en mal estado con agrietamientos y los pisos se levantan por las raices de los arboles que se encuentran al rededor de la vivienda.
Puertas y ventanas se encuentran en mal estado estan oxidadas y forsadas
El predio no se encuentra afectado por los trabajos realizados por el consorcio vial maranatha 91

5. FIRMAS

Cecilia Cubillos	Angie Daysuri Valencia Suarez	Claudia Lucia Reyes
Firma Propietario o Encargado del Predio	Firma Representante de la Interventoria	Representante del Contratista
Nombre: Cecilia Cubillos	Nombre: Angie Dayana Valencia	Nombre: Claudia Lucia Reyes
cc. 36.320.030	cc. 1075303068	cc. 52 138 182

Anexo 8
Correspondencia

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 12 de abril 2024

CV-INT-23

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Asunto: Entrega de informe No 1 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de octubre de 2023 al 23 de noviembre de 2023 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023 cuyo objeto es: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Cordial saludo

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1492 de 2023, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; me permito entregar el informe No 1 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de octubre de 2023 al 23 de noviembre de 2023.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Anexo 98 Folios

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 12 de abril 2024

CV-INT-24

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Asunto: Entrega de informe No 2 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre 2023 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023 cuyo objeto es: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Cordial saludo

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1492 de 2023, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; me permito entregar el informe No 2 de interventoría correspondiente al periodo del 24 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Anexo 62 Folios

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 17 de abril 2024

CV-INT-25

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Asunto: Entrega de informe No 3 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero 2024 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023 cuyo objeto es: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Cordial saludo

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1492 de 2023, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; me permito entregar el informe No 3 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Anexo 101 Folios

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 18 de abril 2024

CV-INT-26

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Referencia: Contrato de interventoría No 1492 de 2023: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: Entrega de acta parcial No 1 del contrato de referencia

Cordial saludo

Por medio de la presente se entrega el acta parcial No 1 del contrato de interventoría No 1492 de 2023, se anexa una carpeta nombrada "ACTA PARCIAL No 1 DE INTERVENTORIA" con 52 folios y una carpeta nombrada "INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No 1" con 166 folios.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Carpeta No 1 con 52 folios
Carpeta No 2 con 166 folios

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 23 de abril 2024

CV-INT-27


Ingeniero
CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
Representante Legal
Consorcio Vial Maranatha 91
Contrato de obra No 1478 de 2023
Dirección: CR7 No 4-34 Neiva-Huila
E-mail: consorciovialmaranatha91@gmail.com

Referencia: Contrato de interventoría No 1492 de 2023: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: Avance de obra del contrato No 1478 de 2023

Cordial Saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1492 de 2023, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; me permito comunicarle que se tiene el siguiente avance de obra así:



CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	% PROGRAMADO (físico)	% EJECUTADO (Físico)	DIFERENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1	Localización y replanteo	KM	100%	100,00%	0,00%	Localización y replanteo
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	68,75%	100,00%	+31,25%	Fresado de pavimento asfaltico
2.1	Corte en conglomerado	M3	65,00%	100,00%	+35,00%	Corte en conglomerado
3.1	Conformación de calzada	M2	59,09%	100,00%	+40,91%	Conformación de calzada
3.2	Base granular	M3	54,17%	100,00%	+45,83%	Base granular
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	39,22%	0,00 %	-39,22%	Mezcla Densa en caliente MDC-19
3.4	Sub-Base granular	M3	56,85%	100,00%	+43,15%	Sub-Base granular
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	52,00%	100,00%	+48,00%	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ	M3	15,79%	0,00%	-15,79%	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	0,00%	0,00%	0,00%	Línea de demarcación con pintura en frío
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación	M3-KM	100,00%	100,00%	0,00%	Transporte proveniente de la excavación de la explanación

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

De acuerdo a la programación acumulada aprobada por la interventoría al 21 de abril de 2024 el porcentaje es del 43,56% y se lleva actualmente una ejecución acumulada del 40,72%, lo que significa un atraso del 2,84%.

Se le solicita incrementar los frentes de obra, con el fin de nivelarse y poder cumplir en el plazo actual la ejecución total del proyecto.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Copia: Supervisor del contrato Ing. Rodrigo Coronado Gutiérrez

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

Anexo 9
Laboratorios
