INFORME DE INTERVENTORÍA No 6

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023:

OBJETO: REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA DEL INFORME: 31/05/2024

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCO VIAL 2023

MAYO DE 2024

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. ALCANCE DEL PROYECTO 5
Valor Costo Inicial del Proyecto. 5
2. ASPECTO TÉCNICO. 6
2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 6
Actividades de obra física. 7
3. PROGRAMACION DE OBRA 11
4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO 13
4.1 PROYECCIONES DEL SEDUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS 13
4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO 13
Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista 13
Valor De Las Actas Pagadas 13
Valor Anticipo Cobrado 14
5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 14
6. CONTROL ESPECIFICACIONES 15
6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA 15
7. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15
7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15

8. SEGURIDAD SOCIAL 17

9. MEMORIA DIARIA O BITACORA 17

10. REGISTRO FOTOGRAFICO 18

11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 18

12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 18

12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA 18
13. ASPECTO JURÍDICO 19
13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 19
13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 20
13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

14. PERMISOS AMBIENTALES 27

14.1. PERMISOS AMBIENTALES 27
14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES) 27

15. INFORMES DE OBRA 25

16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 26

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios a intervenir: 5
Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo 5
Tabla 3 Control de programación y avance de obra. 7
Tabla 4 Flujo del proyecto. 8
Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado. 11
Tabla 6. Maquinaria mínima requerida 14
Tabla 7. Condiciones contrato de obra 18
Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría 19
Tabla 9. Control de pólizas contratista 20
Tabla 10. Control de pólizas interventoría 22

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Control Personal Interventoría
Anexo 7 Informe HSQ Interventoría
Anexo 8 Correspondencia
Anexo 9 Laboratorios

1. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 2,87 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de 17.489 m2 de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de cunetas e instalación de señalización horizontal.

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
AIPE	Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita	2,87 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
AIPE	Vía de tercer orden	$ 2.720.013.516,14
TOTAL C.D.		**$ 2.720.013.516,14**

Fuente: Interventoría

Valor adicional del contrato de obra desglosado por capitulo

AIPE	Vía de tercer orden	$ 3.579.734.915
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 3.579.734.915

Plazo Inicial = Ochos (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo total contrato de obra = 8 meses

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

Condiciones Vigentes:

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido 5 meses y 7 días (24 de octubre de 2023 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad de los inconvenientes presentados y el estado o de avance de estos:

El día 07/05/2024 se envió comunicado CV-INT-28 al supervisor del contrato con respecto a la entrega del informe No 4 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

Actividades de obra física.

Municipio de Aipe- Praga.

Actividades ejecutadas actualmente. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- Debido a que no ha sido aprobado el ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la mezcla asfáltica, no se ha podido ejecutar las actividades faltantes como los son la instalación de la carpeta asfáltica, fundición de cunetas en concreto e instalación de señalización horizontal.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANT. ACTUAL	% PROGRAMADO (físico)	% EJECUTADO (Físico)	DIFERENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1	Localización y replanteo	KM	2,87	100%	100,00%	0,00%	Localización y replanteo
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	17488,7	100,00%	100,00%	0,00%	Fresado de pavimento asfaltico
2.1	Corte en conglomerado	M3	6960,8	90,00%	100,00%	+10,00%	Corte en conglomerado
3.1	Conformación de calzada	M2	26600	81,82%	100,00%	+36,36%	Conformación de calzada
3.2	Base granular	M3	2610,30	75,00%	100,00%	+25,00%	Base granular
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	866,10	66,67%	0,00 %	-66,67%	Mezcla Densa en caliente MDC-19
3.4	Sub-Base granular	M3	2610,30	75,00%	100,00%	+25,00%	Sub-Base granular
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17202	72,00%	100,00%	+28,00%	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ	M3	860,10	42,11%	0,00%	-42,11%	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8601	0,00%	0,00%	0,00%	Línea de demarcación con pintura en frío
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación	M3-KM	122247,5	85,71%	100,00%	+14,29%	Transporte proveniente de la excavación de la explanación

Fuente. Interventoría

Tabla 4 Flujo del proyecto.

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACION FLUJO DE CAJA											
							1 MES				2 MES				3 MES			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		PRELIMINARES																
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	$ 12.889.859,98											
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			$ 15.958.438,75
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**												
		EXPLANACIONES																
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00			$ 16.399.644,80		$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			$ 32.799.289,60
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**												
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00			$ 6.770.909,09		$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			$ 13.541.818,18
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00			$ 44.803.624		$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			$ 89.607.248,50
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			$ 190.316.814,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00			$ 36.883.539,00		$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			$ 73.767.078,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00			$ 4.720.228,80		$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			$ 9.440.457,60
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**												
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000												$ 173.441.426,421
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**												
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000												
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**												
		TRANSPORTES																
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000			$ 18.162.485,714		$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			$ 36.324.971,429
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**												
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**												
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98												
		PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)				$ 16.518.000,00			$ 1.101.200,00		$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			$ 2.202.400,00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)				$ 27.199.344,00			$ 1.813.289,60		$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			$ 3.626.579,20
					VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**												
							$ 143.544.781,235				$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260			$ 641.026.523,681
							4,06%				13,06%				13,06%			17,91%

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18											
$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 44.803.624,25							
$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00							
$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 36.883.539,00							
$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 7.080.343,20							
$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 130.081.071,316			
				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000			
$ 36.324.971,429				$ 27.243.728,57											
$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

3. PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO	HUILA — FECHA DE INICIO
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA

PROGRAMACION DE OBRA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 3.536.017.570,98**
					PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
					VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**

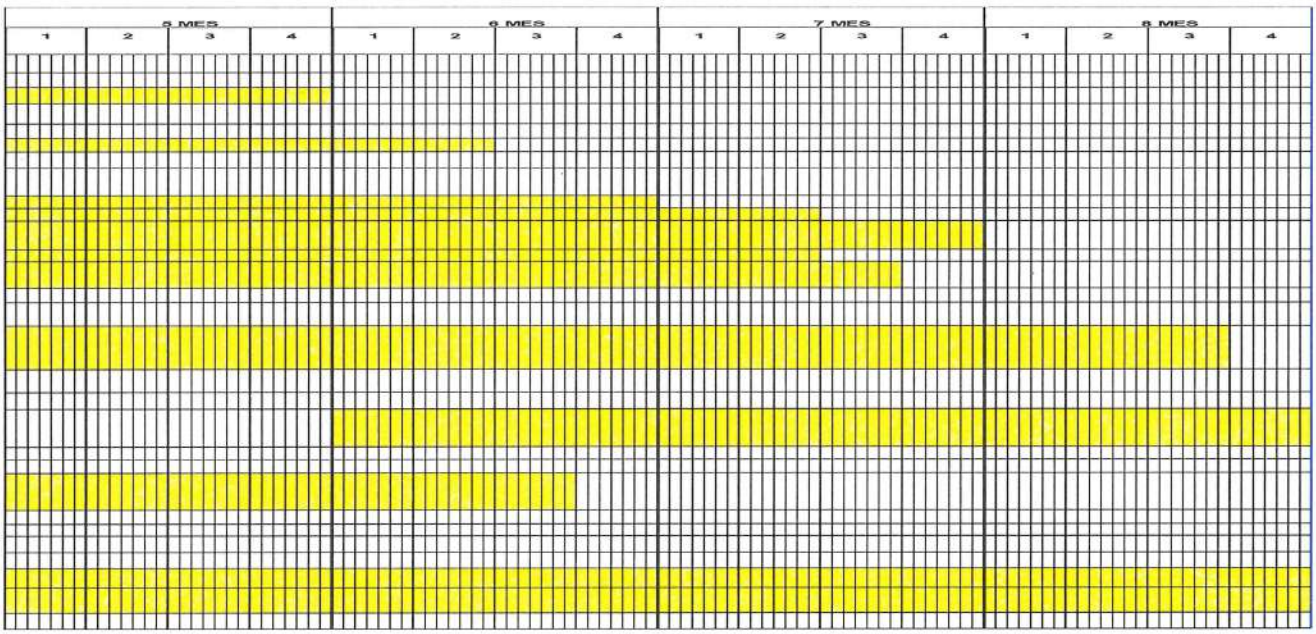


Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado.

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 6**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	17,91%	65,95%
valor de la obra programada	$641.026.523,68	$2.360.768.019,12
obra ejecutada (%)	0,00%	40,72%
valor de la obra ejecutada	$0,00	$1.457.813.125



4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO

El contratista presentó los documentos para el ajuste al contrato de obra con respecto a la Mezcla asfáltica MDC-19, ya que, debido a la corrección de el espesor de la misma, no se ha podido iniciar estas actividades.

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 65,95% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 25,23%.

El equipo de la interventoría ha solicitado al contratista de obra de forma verbal el proceso del ajuste al contrato de obra, ya que por esta razón no se ha podido autorizar las ejecución de las actividades pendientes.

4.1 PROYECCIONES DEL SEGUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS

El contratista de obra no logró cumplir con la reprogramación de obra hasta la fecha de cierre del Informe No 6, luego que se reinició el contrato de obra el 01 de febrero de 2024.

4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO

Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista

A la fecha del presente informe el contratista de obra Consorcio Vial Maranatha 91, el contratista ya facturó el acta parcial No 1 por un valor de $1.457.813.125.

Valor De Las Actas Pagadas

El departamento pagará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento 90%, previa amortización del anticipo.

Valor Anticipo Cobrado

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO VIAL MARANATHA 91					
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91				
CONTRATO DE OBRA No.	1478-2023				
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS					
REHABILITACIÓN VÍAS					
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR CONTRATO	$3.579.734.914,98				
% ANTICIPO	30%				
VALOR ANTICIPO	$1.073.920.475,00				
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.073.920.475,00				
DESCUENTOS	$53.696.024,00				
VALOR NETO GIRADO	$1.020.224.451,00				

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	29,41%	$300.000.000,00	$300.000.000,00
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	15,68%	$160.000.000,00	$160.000.000,00
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	GLB	25,48%	$260.000.000,00	$260.000.000,00
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	11,78%	$120.224.451,00	$120.224.451,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	5,88%	$60.000.000,00	$60.000.000,00
6	MANO DE OBRA	GLB	11,76%	$120.000.000,00	$120.000.000,00
					$1.020.224.451,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	**$1.020.224.451,00**
SON	**$1.020.224.451,00**				

La interventoría aprobó el plan de inversión del anticipo del contratista de obra y se radicaron los documentos en la Gobernación del Huila para el trámite respectivo.

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- **Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita**: A lo largo del periodo del presente informe el contratista no ha podido ejecutar actividades, ya que está a la espera de la aprobación del ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la Mezcla asfáltica. Durante este periodo se presentaron lluvias leves y esporádicas.

6. CONTROL ESPECIFICACIONES

Por parte de interventoría se ha solicitado la documentación concerniente a los diferentes permisos de canteras y disposición de RCD.

Certificaciones de calidad de los materiales, para verificar cumplan con lo especificado en el contrato de obra, además de lo que se evidencia en obra.

6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 65,95 % y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 25,23%.

7. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 6. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 Galones)	2
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Cortadora de pavimento	2
Regla vibratoria	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1
COMPRESOR	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 1478-2023

Informe De Personal

En el presente periodo ya se tienen revisadas las hojas de vida del personal mínimo requerido envidas por el contratista. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Personal Técnico Requerido

Aprobado inicial

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	1	100%
INSPECTOR DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SISO	1	78%
AUX. TRANSITO	1	100%

Fuente. Interventoría

Personal Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL		
CARGO	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**
Director de Interventoría	1	100%
Residente de Interventoría	1	100%
PERSONAL TÉCNICO		
Inspector de obra de obra	1	100%
Comisión topográfica Topógrafo, 1 cadenero con equipo topográfico	1	100%

Fuente. Interventoría

8. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a la obligación de la interventoría, según el pliego de condiciones se estipula verificar y certificar la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud) e informar si el pago se realizó mensualmente, el cual se acreditara mediante recibo de pago efectuado por el Contratista (planilla de seguridad social).

- El Contratista a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de algunos trabajadores incluyendo director de obra y residente. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

9. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Teniendo en cuenta el Decreto 1772 de 1994, donde se expresa la importancia de contar con la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social, no solo para el cumplimiento de las leyes, sino para proteger, conservar y preservar la salud y seguridad de todos sus empleados, todo el equipo de trabajo que hace parte del CONSORCIO VIAL MARANATHA 91, se encuentra al día en el pago de EPS, ARL, AFP esto se puede evidenciar en las planillas adjuntas a este documento.
De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, por el cual se modifica el pago de la seguridad de independientes "Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior".

12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA

MES	% PROGRAMADO MES	% ACUMULADO PROGRAMADO	% EJECUTADO MES	% ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR / ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1	14,29 %	68,57 %	14,29 %	68,57 %	0,00%

13. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.1478-2023.

13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
NIT:	901.749.436-1
CONTRATO No.:	1478 DE 2023
OBJETO.:	REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 3.579.734.915
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

La Gobernación del Huila realizó el seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de Interventoría No. 1492 – 2023, de la siguiente manera:

13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2023
NIT:	901.753.844-9
CONTRATO No.:	1492 DE 2023
OBJETO.:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 261.763.600
VALOR TOTAL:	$ 261.763.600
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

Fuente. Interventoría

13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101018547, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101050819.

Tabla 9. Control de pólizas contratista

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	12/09/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	12/09/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 715,946,983.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2023	12/05/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	24/10/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	24/10/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	24/10/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 415,080,202.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/10/2023	24/06/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Interventoría, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Tabla 10. Control de pólizas interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2023	18/05/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		18/05/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/11/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO		18/04/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	18/09/2023	18/11/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		18/11/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		18/11/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		18/11/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2023	23/06/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/06/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/06/2024	24/05/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO	29/10/2023	24/12/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		24/12/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		24/12/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		24/12/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2024	25/08/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/08/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		25/02/2028	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2024	25/08/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE R.C- ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO	29/10/2023	25/02/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/02/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/02/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/02/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/02/2024	25/12/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/12/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/12/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	24/10/2023	25/06/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/06/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/06/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/06/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

14. PERMISOS AMBIENTALES

14.1. PERMISOS AMBIENTALES

Para la ejecución del contrato de obra No. 1478 de 2023, se ha requerido la solicitud de premisos para la disposición de materiales pétreos y provenientes de las excavaciones.

14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (Residuos convencionales y especiales)

Mediante oficio se le solicito al contratista enviar los siguientes documentos:

- Señalización y demarcación de las áreas a intervenir.
- Licencias RCD.

15. INFORMES DE OBRA

El contratista a la fecha ha presentado los informes de obra solicitados de forma escrita mediante oficios por la interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato de obra.

16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

16.1 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

Dar cumplimiento estricto a la entrega de la documentación solicitada en los plazos requeridos en el contrato de obra y tramitados por la interventoría externa.

Cumplir con los perfiles y dedicaciones de los profesionales ofertados cumpliendo con el pliego de condiciones una vez se inicie la ejecución de los trabajos.

Una función contractual del Consorcio Vial 2023; es la de reportar el avance o atraso de la programación aprobada; y el no cumplimiento se le comunicará a la Gobernación del Huila; por lo que se recomienda al contratista de obra hace entrega inmediata del plan de contingencia y mitigación para implementar estrategias que aporten en el avance de obra y de tal manera evitar se adelanten los trámites administrativos y jurídicos de un presunto incumplimiento frente a la programación; en estricto cumplimiento a la cláusula vigésima séptima del contrato de obra No. 1478 de 2023.

Continuar realizando el pago a la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades de obra estipuladas o del balance en el contrato de obra No. 1478 de 2023.

Exigir la utilización de los elementos de protección personal que entrego el Consorcio Vial Maranatha 91 a cada uno de los trabajadores.

16.2 CONCLUSIONES

El día 07/05/2024 se envió comunicado CV-INT-28 al supervisor del contrato con respecto a la entrega del informe No 4 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023.

En el trascurso del proyecto esta interventoría ha realizado el control de calidad a cada una de las actividades desarrolladas en este proyecto, garantizando la estabilidad de la obra en el transcurso del tiempo.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

El contratista de obra ya facturó el acta parcial No 1 por un valor de $ 1.457.813.125.


De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 6 tiene un porcentaje programado acumulado del 65,95% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso del 25,23%.

LUIS MIGUEL SUAZA
R.L CONSORCIO VIAL 2023

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE AIPE-HUILA VIA A PRAGA RUTA 45HL22

Equipo, Maquinaria y Stop de materiales granulares

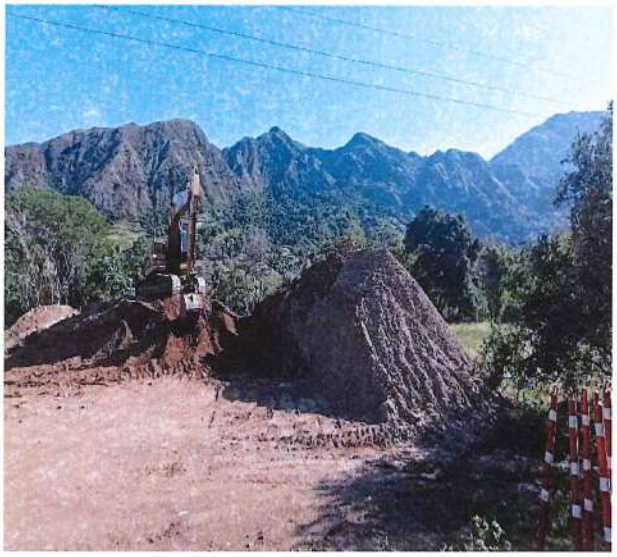







Anexo 2
Programación

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE APE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1 MES 1	1 MES 2	1 MES 3	1 MES 4	2 MES 1	2 MES 2	2 MES 3	2 MES 4	3 MES 1	3 MES 2	3 MES 3	3 MES 4	4 MES 1	4 MES 2	4 MES 3	4 MES 4
		PRELIMINARES																				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	12.889.859,98															
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**																
		EXPLANACIONES																				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00			$ 16.399.644,80		$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**																
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00			$ 6.770.909,09		$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00			$ 44.803,624		$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00			$ 36.883.539,00		$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00			$ 4.720.228,80		$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**																
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000															$ 173.441.428,421	
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**																
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000																
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**																
		TRANSPORTES																				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000			$ 18.162.485,714		$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**																
					SUBTOTAL OBRAS	$ 3.536.017.571																
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98																
					PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00			$ 1.101.200,00		$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00			$ 1.813.289,60		$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
					VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**																
							$ 143.544.781,235				$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260				$ 641.026.523,681			
							4,06%				13,06%				13,06%				17,91%			


CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA	


PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
$			13.541.818,18	$			13.541.818,18								
$			89.607.248,50	$			89.607.248,50	$ 44.803.624,25							
$			190.316.814,00	$			190.316.814,00	$			190.316.814,00				
$			73.787.078,00	$			73.767.078,00	$ 36.883.539,00							
$			9.440.457,60	$			9.440.457,60	$		7.080.343,20					
$			173.441.428,421	$			173.441.428,421	$			173.441.428,421	$			130.081.071,316
				$			8.371.640,000	$			8.371.640,000	$			8.371.640,000
$			36.324.971,429	$			27.243.728,57								
$			2.202.400,00	$			2.202.400,00	$			2.202.400,00	$			2.202.400,00
$			3.626.579,20	$			3.626.579,20	$			3.626.579,20	$			3.626.579,20
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**

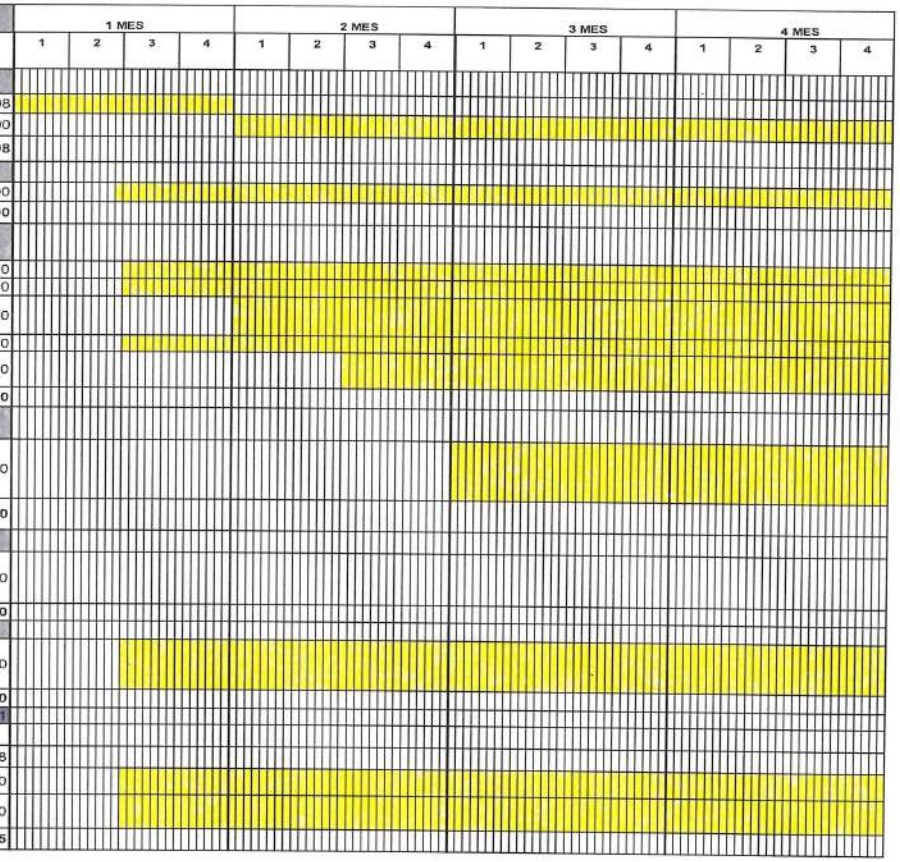

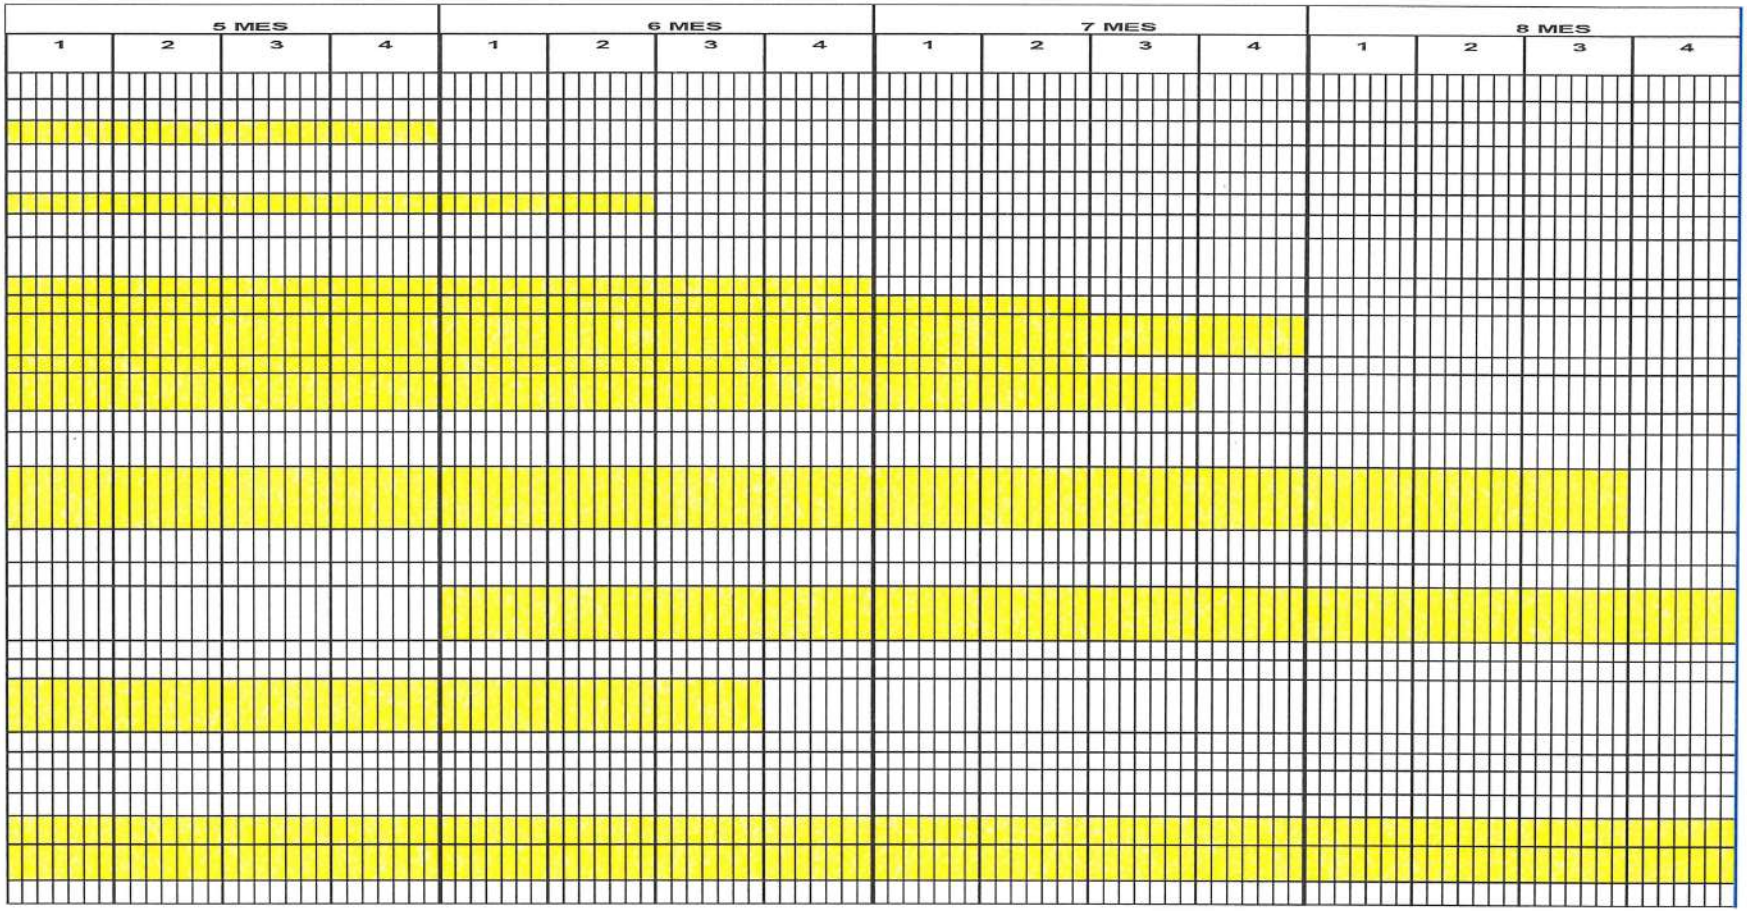
5 MES
6 MES
7 MES
8 MES
1
2
3
4

Anexo 3
Bitacora de Obra

FECHA = 7/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CEMADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 1X VOLQUETA C-30, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADORES ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARRETILLA.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 2/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CEMADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715,

Scanned with CamScanner

VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, Y VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE PINISHER BARBER GREEN 260, HIRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CEPOY 185CFM, CARROTANQUE.

OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 3/05/2024

ESTADO CLIMA=

PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES

ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA CLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, Y VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, HIRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CEPOY 185CFM, CARROTANQUE.

OBSERVACIONES=

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 4/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA15C, VIBROCOMPACTADORS DYNAPAC CA25D, RETROEXCAVADORA CIANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, HIDRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CERO 750CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 5/05/2024
ESTADO CLIMA = N/A
PERSONAL =N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 6/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERAS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CERO 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 7/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERAS HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI.

Scanned with CamScanner

NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETRO-EXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR ELROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 8/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETRO EXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR ELROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 9/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA PLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN, 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPACTADOR CATERPILLAR 185 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA = 10/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR CA250, RETROEXCAVADORA PLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER

Scanned with CamScanner

BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 785CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 11/05/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL NUMERO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI.
NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, Y VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD78, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 760, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 785CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 12/05/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO.

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = N/A
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 13/05/2024
ESTADO CLIMA = N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES = NO SE REALIZABAN ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPO = N/A
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 14/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUNTO AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 752, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LIANNA XCM35U, MINICARGADOR CASE IX VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 18 M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 760, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR ATLAS 185 CFM, CARROTANQUE.

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 15/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI, NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 752, VIBROCOMPACTADOR CA 250, RETROEXCAVADORA HANIA ROMASIU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HXM3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 260, IBRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CERO 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 16/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPÓGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES,
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI, NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA,

Scanned with CamScanner

CONEXIAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LINIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE IX VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR LEMOY 185CFM, CARRETILLAS.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA: 17/09/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, ASEO, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD OBRA, NO SE HA REALIZADO EL RIEGO DE LIGANTE EN EL DEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO DE ESPESOR MEDIANTE OMO SI. NO SE PUEDE ESTENDER LOS DEMS PAVIMENTOS DE MEZCLA ASFALTICA, CONEXIAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LINIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE IX VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR LEMOY 185 CFM, CARRETILLAS.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA= 18/09/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEBRAS, ASEO, AYUDANTES Y CELADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA, EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CHANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE Y VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IBRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 19/09/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 20/05/2024
ESTADO CLIMA:
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEIRAS, HSEQ, AYUDANTES, CEBADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL NUM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HX M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, RASTRILLO ASFALTO, COMPACTOR LEROY 185 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 21/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEIRAS, HSEQ, AYUDANTES, CEBADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL NUM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CONEXAS NI DEMARCACIÓN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HX M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260,

Scanned with CamScanner

VIBROCOMPACTADOR ASFALTO, COMPRESOR DEWOY 185CFM, CARGUIANQUE, OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 22/05/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERAS HSEQ, AYUDANTES Y CEMADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA151, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CHANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 1X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA AYUNDAI 10 M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 260, VIBROCOMPACTADOR ASFALTO, COMPRESOR DEWOY 185CFM, CARGUIANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 23/05/2024
ESTADO CLIMA
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, HSEQ, AYUDANTE, CEMADORES.
ACTIVIDAD= NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA

Scanned with CamScanner

ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS/. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CLANSA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETA C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN, ARRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR EXTRAY 185 CFM, CARRETILLA.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 24/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD E OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS/. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CLANSA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 14 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, ARRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR EXTRAY 185 CFM, CARRETILLA.
OBSERVACIONES =

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 25/05/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALEERA, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ALMACEN DE ESPECIES MEDIANTE OFICIO. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CONEXAS NI DEMARCACIÓN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA15C, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD78, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPACTADOR LEROY 185CPM, CARROTANQUE
OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 26/05/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTA Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 24/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CONETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CAMPION 716, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IMPRIMADOR ASFALTO, COMPRESOR ATLAS 185 CFM, CARRETILLAS
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 28/05/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL ASUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DEL ESPESOR MEDIANTE OTROS. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CONETAS Y DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CAMPION 716, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC AC 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4X VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IMPRIMADOR

Scanned with CamScanner

ASFALTO, COMPACTADOR LEROY 189CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 29/09/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, HSEQ, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL ANCHO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 13M3, EQUIPO FINISHER BARBER GREEN 260, FRIGADOR ASFALTO, COMPACTADOR LEROY 189CFM, CARROTANQUE
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 30/05/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PAVIMENTA, ASEO, AYUDANTES, CEMADORES
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI, NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-90, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPRESOR CETEC, TRACTOR CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 31/05/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PAVIMENTA, ASEO, AYUDANTES, CEMADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE LA MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-90, VOLQUETA HYUNDAI 10M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

Anexo 5
Control Personal Obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749436	1	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 4 34	NEIVA-HUILA	8720825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	898830082	9470127378	E	2024/06/13	2024/09/09	BANCOLOMBIA	88	$7,466,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$21,454,670	$3,433,100			$26,454,671	$1,058,700			$26,174,671	$1,047,700			$26,454,671		$1,462,000		$0	$0		$7,001,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS ALTO RIESGO (6 Afiliados)																						$9,500,001	$1,520,100			$9,500,001	$380,100			$9,500,001	$380,100			$9,500,001		$637,200		$0	$0		$2,917,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$9,500,001	$1,520,100			$9,500,001	$380,100			$9,500,001	$380,100			$9,500,001		$637,200		$0	$0		$2,917,500
1	CC	36069417	ALVIRA ANGELICA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	94393644	AVILA ALEJANDRO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	38196879	FERREIRA ELIZABETH													X					25-14	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$83,300
4	CC	38196879	FERREIRA ELIZABETH																		25-14	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
5	CC	1075544006	GARCIA JUAN																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
6	CC	36288338	MAJE YUDY																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
7	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO																		23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
8	CC	1075266993	RAMIREZ YENNY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1075544289	TAVERA ANDRES																		25-14	30	$1,538,000	$246,100	EPS037	30	$1,538,000	$61,600	CCF32	30	$1,538,000	$61,600	14-11	30	$1,538,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,400
Centro de Trabajo: CUADRILLA TOPOGRAFIA (2 Afiliados)																						$1,400,001	$224,100			$5,600,001	$224,100			$5,600,001	$224,100			$5,600,001		$363,900		$0	$0		$1,036,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$1,400,001	$224,100			$5,600,001	$224,100			$5,600,001	$224,100			$5,600,001		$363,900		$0	$0		$1,036,200
10	CC	83169787	RIVERA DEIVER														X				23030 1	8	$373,334	$59,800	EPS005	8	$373,334	$15,000	CCF32	8	$373,334	$15,000	14-11	8	$373,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$89,800
11	CC	83169787	RIVERA DEIVER																		23030 1	22	$1,026,667	$164,300	EPS005	22	$1,026,667	$41,100	CCF32	22	$1,026,667	$41,100	14-11	22	$1,026,667	6.960%	$71,500	22	$0	$0	SI	$318,000
12	CC	4884422	TOVAR MILLER																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF32	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	SI	$628,400
Centro de Trabajo: OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
13	CC	1003818343	HIO CARLOS																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
Centro de Trabajo: OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (1 Afiliados)																						$1,333,334	$213,400			$1,333,334	$53,400			$1,333,334	$53,400			$1,333,334		$55,700		$0	$0		$375,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,333,334	$213,400			$1,333,334	$53,400			$1,333,334	$53,400			$1,333,334		$55,700		$0	$0		$375,900
14	CC	83222180	CRUZ GIOVANNI														X				23100 1	8	$533,334	$85,400	EPS037	8	$533,334	$21,400	CCF32	8	$533,334	$21,400	14-11	8	$533,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$128,200
15	CC	83222180	CRUZ GIOVANNI		X																23100 1	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	6.960%	$55,700	12	$0	$0	SI	$247,700
Centro de Trabajo: OPERADORES VOLQUETA (3 Afiliados)																						$2,383,334	$381,400			$3,183,335	$127,500			$3,183,335	$127,500			$3,183,335		$166,000		$0	$0		$802,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																						$2,383,334	$381,400			$3,183,335	$127,500			$3,183,335	$127,500			$3,183,335		$166,000		$0	$0		$802,400
16	CC	1078777075	CARDOSO CESAR		X																23100 1	15	$1,050,000	$168,000	ESSC62	15	$1,050,000	$42,000	CCF32	15	$1,050,000	$42,000	14-11	15	$1,050,000	6.960%	$73,100	15	$0	$0	SI	$325,100
17	CC	1120361787	LOZANO ALVARO													X					23030 1	7	$373,334	$59,800	EPS037	7	$373,334	$15,000	CCF32	7	$373,334	$15,000	14-11	7	$373,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$89,800
18	CC	1120361787	LOZANO ALVARO		X																23030 1	18	$960,000	$153,600	EPS037	18	$960,000	$38,400	CCF32	18	$960,000	$38,400	14-11	18	$960,000	6.960%	$66,900	18	$0	$0	SI	$297,300
19	CC	4891355	MANRIQUE MILSAR		X																	0	$0	$0	EPS037	7	$373,334	$15,000	CCF32	7	$373,334	$15,000	14-11	7	$373,334	6.960%	$26,000	7	$0	$0	SI	$56,000
20	CC	4891355	MANRIQUE MILSAR													X						0	$0	$0	EPS037	8	$426,667	$17,100	CCF32	8	$426,667	$17,100	14-11	8	$426,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$34,200

2024/09/09 02:25 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Anexo 6
Control Personal Interventoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	697774309	9468470761	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,405,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4377250	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1075239208	GONSALEZ SALAS YESICA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	1003828965	MALLUNGO REINOSO JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO																		25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
5	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO																		231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total	Afiliados(5)																						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$765,700		$0	$0		$3,405,700

2024/09/19 09:31 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	697774309	9468470761	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,405,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,760,000	$0	$0	$1,760,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$765,700	$0	$0	$765,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$765,700	$0	$0	$765,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$440,000	$0	$0	$440,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$440,000	$0	$0	$440,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$440,000	$0	$0	$440,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$344,000	$0	$0	$344,000
TOTAL				5	$3,405,700	$0	$0	$3,405,700

Anexo 7
Informe HSQ Interventoría

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

INFORME DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1492 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023



INFORME N.6 DEL 1 AL 31 MAYO 2024

CONSORCIO VIAL 2023

2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos Específicos 4
3. Contenido del Informe 5
3.1. Generalidades Contractuales 5
4. Marco Legal 7
4.1. Normatividad Aplicable 7
5. Actividades Realizadas Durante el Periodo de Seguimiento 8
5.1. Componente Social 8
5.1.1. Actas de Vecindad y Actas de Entorno 9
5.2. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo 10
5.4. Plan de Manejo de Trafico 13
6. Personal de la Obra 16
7. Personal de Interventoría 17
8. Conclusiones 18
9. Anexos de Registros de Asistencia de Charlas de Seguridad 19
10. Anexos de Registros de Asistencia de Capacitaciones 22
11. Anexos de Permisos de Trabajo y Analisis de Trabajo ATS 23
12. Anexos de Formato de Reposición E.P.P 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Interventoría recopila las actividades desarrolladas por el Contratista del Consorcio VIAL MARANATHA 91 Durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2024. La Interventoría viene haciendo el acompañamiento a las actividades de obra realizadas por el Contratista, donde prevalece el seguimiento en los componentes Social, Seguridad y Salud en el Trabajo; igualmente las actividades propuestas en el Plan de Manejo de Transito

El Contratista ha implementación las Actas de Vecindad y Actas de Entorno; para el desarrollo de las actividades del proyecto. El Plan de Manejo de Transito la Interventoría recomienda la implementación de los elementos proyectados como son las señales Reglamentarias, Preventivas, Informativas y Transitorias necesarias y reglamentarias para el desarrollo de la obra.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Revisar, evaluar y acompañar las actividades Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Contratista en el periodo correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2024.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar las actividades realizadas por parte del consorcio Vial Maranatha 91 del componente de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo comprendido en mención del contrato.
- Identificar el cumplimiento de las actividades Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Manejo de Transito propuesto por el Contratista en el proceso de ejecución de la obra de construcción.

3. CONTENIDO DEL INFORME

El informe describe las actividades realizadas por el equipo Técnico del Contratista en los componentes: Social, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1478 DE 2023, REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.** Durante el periodo correspondiente a los Informes correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2024.

3.1. GENERALIDADES CONTRACTUALES

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
No. DEL CONTRATO	**1492 DE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023 R.L. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON NIT: 901.753844-9
VALOR DEL CONTRATO	$261.763.600
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024



CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
NO. DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 1478 DEL 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.579.734.915
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

4. MARCO LEGAL

4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE

De acuerdo a la normatividad legal vigente

NORMATIVIDAD	DESCRIPCION
Decreto 1443 del 2014	Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST
Decreto 1072 de 2015	Regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia y es de obligado cumplimiento por todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño
Resolución 1111 de2017	Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución 0312 de 2019	Establece los estándares mínimos que deben cumplir las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y su implementación es obligatoria para todas las empresas del país.
Ley 100 de1993	El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten
Resolución 2346 de 2007	Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.
Decreto 1772 1994	Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales
Resolución 0541 1994	Manejo de desechos de la construcción
Norma OHSAS 18001	Propone una jerarquía de medios de control en la que los equipos de protección personal ocupan el quinto puesto
Resolución 4272 de 2021	se define el permiso de trabajo en alturas como un mecanismo administrativo para fomentar la prevención durante los trabajos en alturas
Real Decreto 1627/1997	se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución 1885 de 2015	Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

5.1. COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Actas de Vecindad de Inicio	X		X	
2	Actas de Entorno	X		X	
3	Conformación de Veeduría y Acta de Veeduría (Resolución No. 44 del 14 de Noviembre de 2023)	X		X	
4	Atención a la Comunidad (PQR)	X		X	
5	Capacitación Manejo de cultura vial y participación comunitaria	X		X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2024, El Contratista no presentó ninguna actividad de este componente.

Anexos:





5.1.1. ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNO

ACTA DE ENTORNO	CEDULA	VEREDA
EDILMER LUNA OSORIO	1075538360	SANTA BARBARA
NARCIZO TOVAR CAMACHO	4884490	SANTA BARBARA
FABIO PLAZAS OLIVERO	12103520	SAN ISIDRO
JOSE EDGAR SANCHEZ QUIROGA	4884227	RIO AIPE
SANDRA AVILES ROJAS	55276036	CALLEJON
ANDRES MORENO	83168907	CALLEJON
URIEL CASTILLA SANCHEZ	83169695	CALLEJON
ACTA DE VECINDAD	**CEDULA**	**VEREDA**
ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38196879	SANTA BARBARA
JESUS ANTONIO HORTA REINOSO	83169705	SANTA BARBARA
CRISTIAN JAVIER ANDRADE CUBILLOS	1075543519	SAN ISIDRO

5.2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	ACTIVIDADES	PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Inducción	X		X	
2	Afiliaciones	X		X	
3	Elementos de Protección Personal (E.P.P)	X		X	
4	Capacitaciones	X		X	
5	Charlas Pre Operacionales	X		X	
6	Orden aseo y limpieza	X		X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 31 de Mayo de 2024, El Contratista presento las siguientes Actividades:
1. Reposición de E.P.P
2. Capacitaciones
3.Charlas Preoperacionales
4.Campañas de Orden, Aseo y Limpieza
Quedan pendiente las Inspecciones de seguridad (camilla, Botiquín, Extintores etc.)

ANEXOS



DESCRIPCIÓN: El contratista le realiza Reposición de E.P.P a los trabajadores para protegerlos de posibles lesiones, enfermedades o accidentes en el entorno laboral.



DESCRIPCIÓN: Se realizan campañas de aseo al finalizar la jornada laboral teniendo en cuenta la clasificación de los residuos.

	
DESCRIPCIÓN: El contratista Realiza Charlas Pre-Operacionales antes de iniciar las labores y capacita al personal de la obra. Ya que son componentes esenciales que protege a los empleados de lesiones y accidentes, beneficia en la reducción costos, mejora la moral y la productividad, garantiza el cumplimiento de las normativas.	**DESCRIPCIÓN:** El contratista Realiza Pausas Activas y calistenia ya que nos ayuda a eliminar la rigidez muscular del reposo y Evita lesiones osteomusculares.

5.3. ANEXOS CHARLAS PRE-OPERACIONALES

CHARLAS DIARIAS DE 15 MINUTOS PERIODO 1 AL 31 DE MAYO 2024		
No	**TEMA**	**FECHA**
1	Prevención de incendios	2/05/2024
2	Caídas en lugar de trabajo	3/05/2024
3	La prevención de las enfermedades	4/05/2024
4	El casco de seguridad	6/05/2024
5	La importancia del mantenimiento	7/05/2024
6	Limpieza de los E.P. P	8/05/2024
7	Cuidado con la piel	09/05/2024
8	Los incidentes son advertencias	10/05/2024
9	Peligro en excavaciones	11/05/2024
10	Uso Adecuado De Dotación	14/05/2024
11	Impacto Por Ruido	15/05/2024
12	Beber y conducir	16/05/2024
13	Agotamiento por calor	17/05/2024
14	Trabajo en equipo	18/05/2024
15	Riesgo eléctrico	20/05/2024


16	Orden y Aseo	21/05/2024
17	Reducir el riesgo de caída desplazamiento	22/05/2024
18	Protección para la cabeza	23/05/2024
19	Capacitación en brigadas de primeros auxilios	24/05/2024
20	Primeros auxilios en el trabajo	25/05/2024
21	Riesgo silencioso	27/05/2024
22	Uso adecuado de los elementos de protección personal	28/05/2024
23	Medio ambiente	29/05/2024
24	El estrés	30/05/2024
25	Acciones inseguras	31/05/2024
CAPACITACIÓN		
1	Manejo del Estrés	14/05/2024

5.4. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

ACTIVIDADES:					
DESCRIPCIÓN		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1.1	SPO01 – Trabajos en la vía	x		x	
1.2	SPO02 – Maquinaria en la vía		x	x	
1.3	SPO03 – Banderero		x	x	
1.4	SRO01 - Vía cerrada		x	x	
1.5	SRO02 – Desvío		x	x	
1.6	SRO03 – Paso uno a uno		x	x	
1.7	SIO01 – Aproximación a obra en la vía	x		x	
1.8	SIO02 – Información de inicio de obra	x		x	
1.9	SIO03 – Información de fin de obra		x	x	
1.10	SIO04 – Carril cerrado	x		x	
1.11	Barricadas con señalizador vial tubular	x		x	
1.12	Barreras plásticas flexibles (maletines)	x		x	
1,13	Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche		x	x	
1,14	Auxiliar de tránsito	x		x	
1,15	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	x		x	
1,16	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Casco de seguridad	x		x	
1,17	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Chaleco Reflectivo	x		x	
Observaciones: Se debe mejorar la señalización durante el proceso de ejecución de la obra; la Interventoría en varias ocasiones le ha solicitado al Contratista la señalización de la obra; además este actividad cuenta con la financiación suficiente para la adquisición y puesta en marcha de estos elementos; debiéndose tener en cuenta el riesgo para los trabajadores y personal de la región que frecuenta la obra.					
Registro Fotográfico					

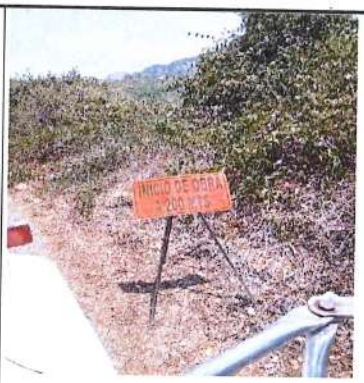			
SPO01 – Trabajos en la vía	SIO01 –Aproximación a obra en la vía	SIO02 – Información de inicio de obra	SIO02 –Información de inicio de obra
			
SIO04 – Carril cerrado	Barricadas con señalizador vial tubular	Barreras plásticas flexibles (maletines)	1.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco
			
Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	2.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco.	Conos	Maletines con cinta de seguridad Peligro.

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

6. PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL DE LA OBRA			
	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
1	ANGELICA MARIA ALVIRA RAMIREZ	36.069.417	DIRECTOR DE OBRA
2	CLAUDIO CESAR MEJÍA	12.138.187	RESIDENTE DE OBRA
3	ALEJANDRO AVILA RESTREPO	94.393.644	INSPECTOR DE OBRA
4	YUDY MAGNOLIA MAJE PEÑA	36.288.338	PROFESIONAL SISOMA
6	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38.196.879	AUXILIAR ADMNISTRATIVO
7	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006	AUXILIAR
8	YENNY SAMANDA RAMIREZ BOTERO	1.075.266.993	AUXILIAR
9	ANDRES FELIPE TAVERA SANCHEZ	1.075.544.289	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	DEIVER RIVERA CARDOZO	83.169.787	CADENERO
11	MILLER TOVAR MONTES	4.884.422	TOPOGRAFO
12	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.818.343	VIGILANTE
13	GIOVANNI CRUZ FAJARDO	83.222.180	OPERADOR ORUGA
14	CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.078.777.075	CONDUCTOR VOLQUETA
15	ALVARO JAVIER LOZANO GUILOMBO	1.120.361.787	CONDUCTOR VOLQUETA
16	MILSAR MANRIQUE	4.891.355	CONDUCTOR VOLQUETA
17	JUAN PERDOMO	12.095.605	OPERADOR CARRO TANQUE
18	RICARDO ROA LUGO	4.884.991	CONDUCTOR VOLQUETA
19	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794	CONTROLADORAS DE TRAFICO
20	JAVIER PERDOMO HORTA	83.169.033	OPERATIVO
21	OMAR FABIAN TRUJILLO DUSSAN	1.075.539.707	OPERATIVO
22	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484	CONTROLADORAS DE TRAFICO

7. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

ITEMS	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGOS
1	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	1.075.227.937	DIRECTOR DE OBRA
2	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	1.075.246.303	RESIDENTE DE OBRA
3	GONSALEZ SALAS YESICA	1.075.239.208	INSPECTOR DE OBRA Y SISO
4	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	4.377.250	TOPOGRAFO
5	JUAN SEBASTIAN MALLUNGO REINOSO	1.003.828.965	CADENERO

8. CONCLUSIONES

Una vez terminado el proceso de seguimiento correspondiente a los periodos del 01 al 31 Mayo. La Interventoría le solicita al contratista las inspecciones del kit de emergencias.


El Contratista no cuenta con la totalidad de la señalización que se requiere para el proceso de construcción. La Interventoría le solicita al contratista los siguientes elementos del plan de Manejo de Trafico.

- SPO02-Maquinaria en la Vía.
- SPO03-Banderero
- SRO01-Via Cerrada
- SRO02 – Desvío
- SRO03 – Paso uno a uno
- SIO01 – Aproximación a obra en la vía
- SIO03 – Información de fin de obra
- Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche

Atentamente:

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023

9. ANEXOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA DE CHARLAS DE SEGURIDAD

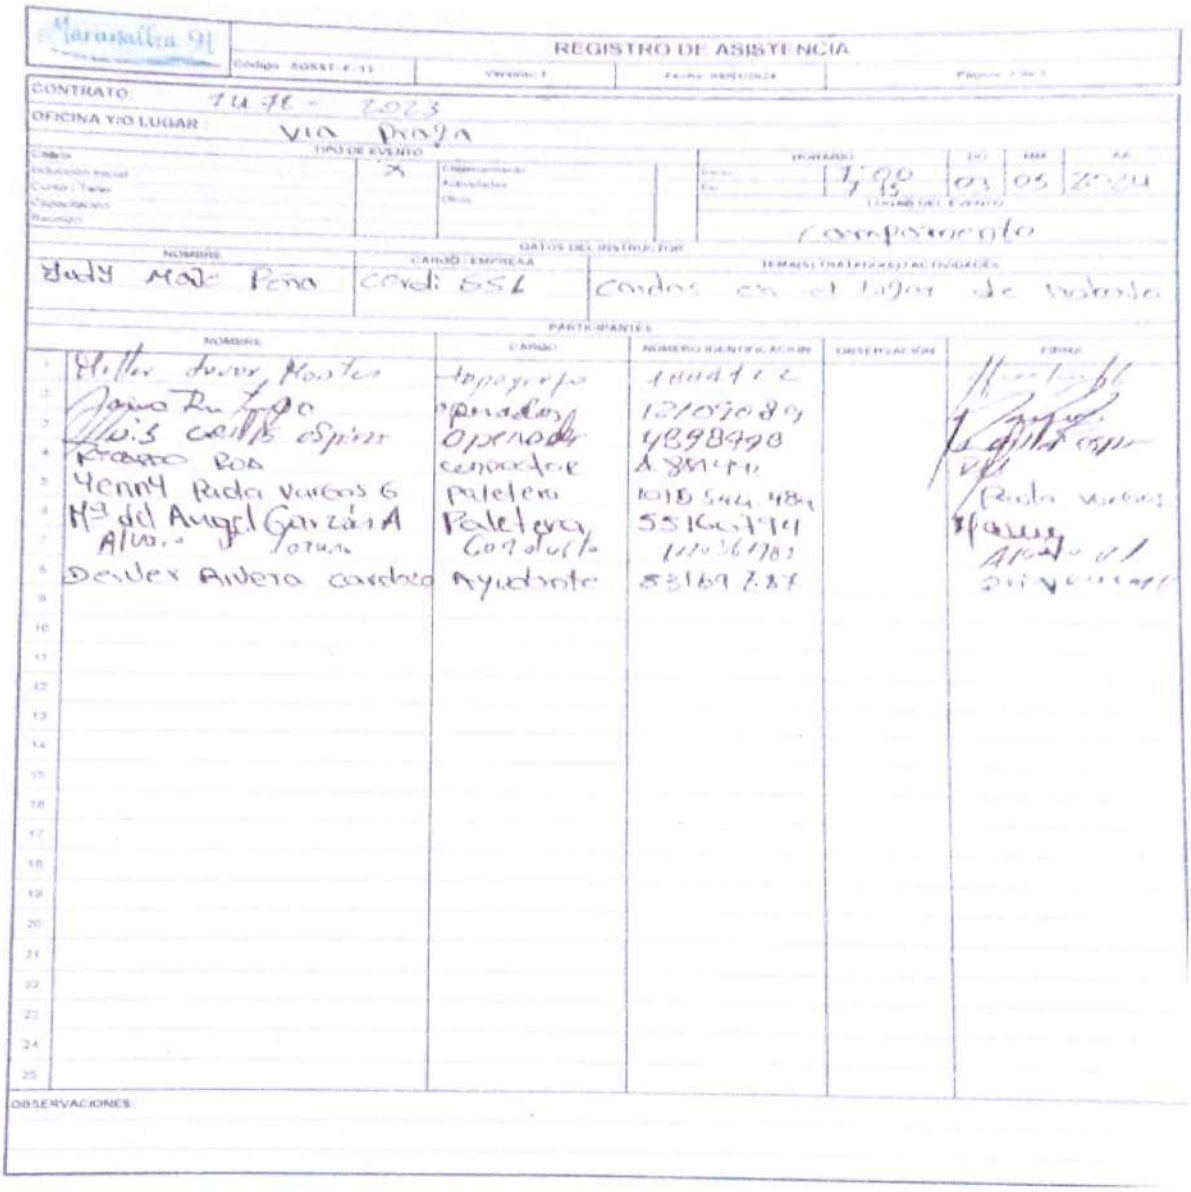

Maratalla 91 — REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO: 14-78 - 2023
OFICINA Y/O LUGAR: VIA Praya
TIPO DE EVENTO: X
HORARIO: 1:00 / 3:15 — DD: 03 MM: 05 AA: 2024
TEMA DEL EVENTO: Cargamento
DATOS DEL INSTRUCTOR — NOMBRE: Judy Milena Pena — CARGO / EMPRESA: Coordi SST — TEMAS TRATADOS/ACTIVIDADES: Cargas en el lugar de trabajo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACION	FIRMA
1	Walter Javier Rosero	topografo	1004412...		
2	Jaime Ramos	operador	1210720893		
3	Luis Carlos Ospina	Operador	4898498		
4	Rosero Roa	conductor	1.081.[illegible]		
5	Yenny Ruda Vargas G	paletero	1018 544 484		Ruda Vargas
6	Mg del Angel Garzón A	Paletera	55166.791		
7	Alvaro Jotun	Conductor	1117361783		
8	Dexter Rivera cardoso	Ayudante	83169 7.87		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

Maranatha SI

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST-F-13	Versión: 1	Fecha: 09/01/2024	Página: 1 de 1

CONTRATO: 1478 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Praga

TIPO DE EVENTO

Charla		Entrenamiento		HORARIO		DD	MM	AA
Inducción Inicial	X	Actividades		Inicio	7:00	27	05	2024
Curso / Taller		Otros		Fin	7:15.			
Capacitación				LUGAR DEL EVENTO				
Reunión				Campamento				

DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Judy Nayc Peña	Coord. SST	Riesgo silencioso

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	H. Mar Javier Mantilla	Topografo	4288422		
2	Yenny Paola Varbas G	Paletera	1075544484		Paola Varbas
3	Ma del Angel Carzón A	Paletera	55160794		
4	Daver Rivera Cardozo	Ayudante	83169787		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

Maranatha 91

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST-F-13	Versión: 1	Fecha: 09/01/2024	Página: 1 de 1

CONTRATO: 1478 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: Via Praga

TIPO DE EVENTO		HORARIO	DD	MM	AA
Charla					
Inducción Inicial	X	Entrenamiento	Inicio 7:00	23	05	2024
Curso / Taller		Actividades	Fin 2:15		
Capacitación		Otros	LUGAR DEL EVENTO		
Reunión			Campamento		

DATOS DEL INSTRUCTOR


NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Yudy Maje Peña	Coord. SST	Proteccion para la cabeza

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIFICACION	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Jaime Rivera	operador	12107087		
2	Abel Hugo Garcés A	Paletero	55160791		
3	Yenny Paola Vargas Gutierrez	Paletera	1075 544 484		
4	Luis Carlos Ramirez	operador	4898798		
5	Wilmer Javier Ramirez	Topografo	4884427		
6	Alvaro J Tovar	Conductor	1102361781		
7	Dewer Rivera Cordoba	Ayudante	83169787		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

10. ANEXOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES

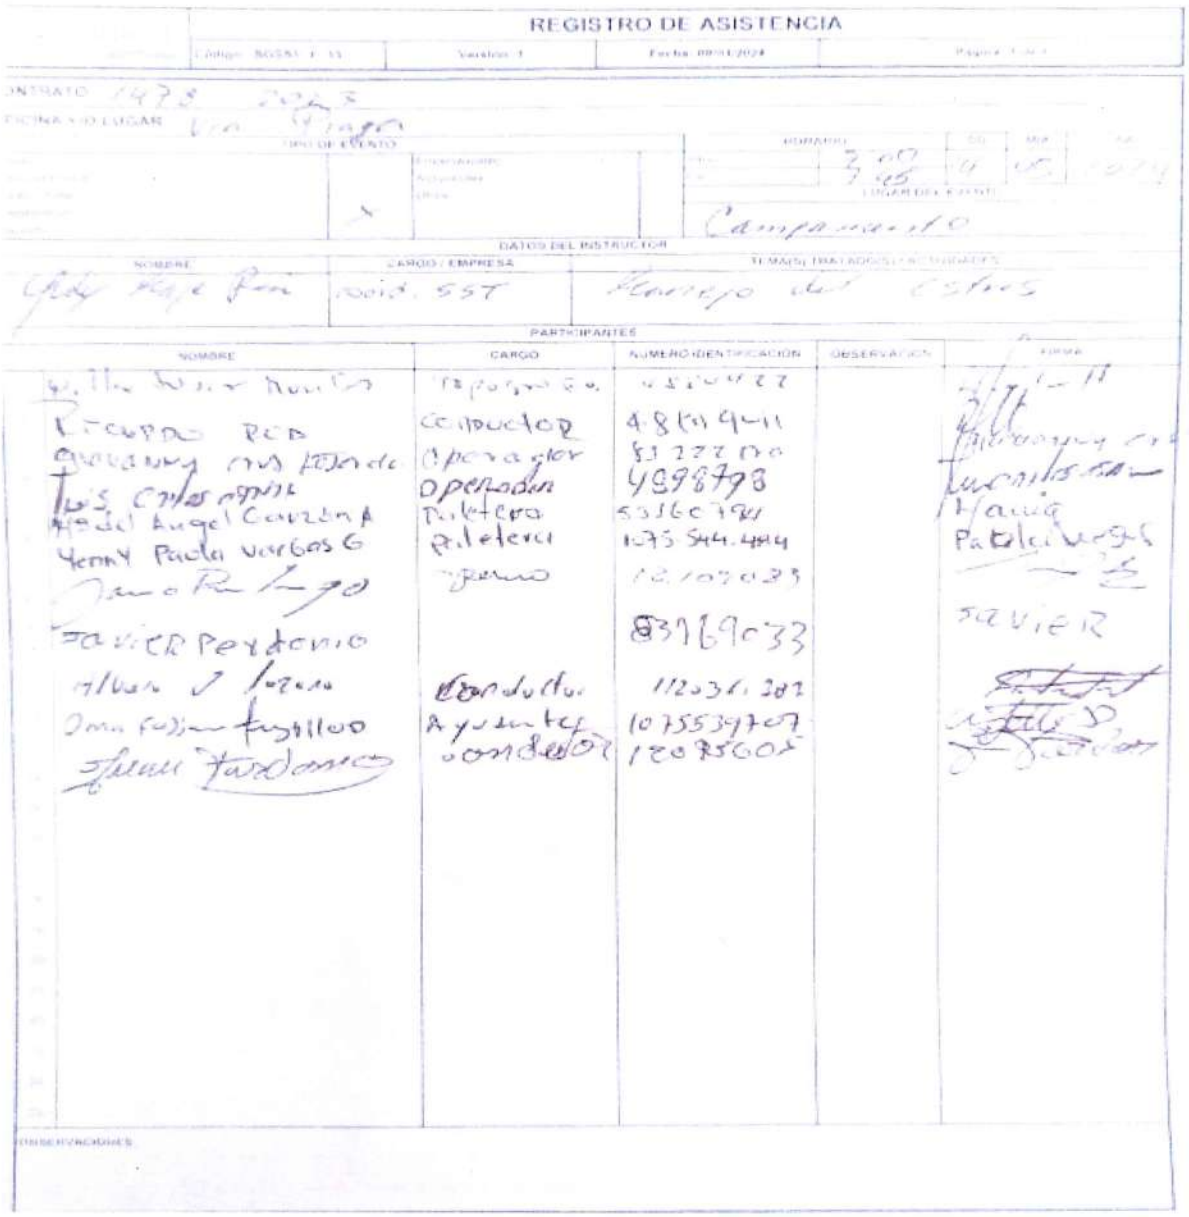

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:	Versión:	Fecha:	Página:

CONTRATO 1478 2023

FECHA Y/O LUGAR Vía Yaguará

TIPO DE EVENTO

HORARIO 7:00 / 9:45

LUGAR DEL EVENTO Campamento

DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) EN LA CHARLA
Cristy Paola Fon	Coord. SST	Manejo del estres

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	FIRMA
Wilmer Nuñez	Topografo	4[illegible]4427		
Ricardo Rios	Conductor	4874941		
Oscar Mauricio Rodriguez	Operador	83177[illegible]		
Luis Carlos Ospina	Operador	4998798		
Yeimy Paola Vargas G	Auxiliar	1075544444		
Javier Perdomo	Topografo	12107033		
Alvaro Lozano	Conductor	83969033		
Jhon Fabian Trujillo	Ayudante	1123612387		
Jhon Jairo Tordoya	Conductor	1075539707		
		1207560[illegible]		

OBSERVACIONES

11. ANEXOS DE PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE TRABAJO ATS

Maranatha 91

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

NIT: 901.749.436-1

Codigo: SGSST-F-01
Version: 001
Fecha: 09/01/2024

SOLICITUD DEL PERMISO

Permiso de Tranajo N°

Fecha de diligenciamiento: DIA 14 MES 5 AÑO 2024

Orden de trabajo / Contrato: 1478- 2023

Contratista Ejecutora: CONSORCIO MARANATHA 91

Nombre del Solicitante: Miller Tovar

Objeto del trabajo: REHABILITACION DEL PAVIMENTO PRAGA- SANTARITA DEL MUNICIPIO DE AIPE

Numero de personas: 14

Actividad a ejecutar: LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE

Equipos y Herramientas a utilizar: MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA, VIBRO, RETROEXCAVADORA , ETC) , VOLQUETAS, HERRAMIENTA MENOR

Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X			Se trabajara con herramientas que proyecten particulas?			X	
Se utilizaran sustancias quimicas (desengrasantes, pinturas)	X			Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?			X	
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X			Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X			
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X			Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?			X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)			X	Es necesario el cierre de vias?	X			
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?			X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X			
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado?			X	Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X			
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?			X	Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X			
Es claro cuales son los centros medicos mas cercanos?	X			Otros:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA		SI	NO	NA
Casco de seguridad	X			Botas de seguridad, tipo:	X		
Gafas de seguridad	X			Guantes, Tipo:	X		
Protectores auditivos	X			Cinturón Portaherramientas			X
Careta protectora			X	Polos o traje especial, Tipo			X
Protección respiratoria, tipo:		X		Otros cual?:			

APROBACIÓN DEL PERMISO

Se aprueba este permiso de Trabajo, habiéndose la verificación de las condiciones del sitio, actual que ejecuta la actividad especificada en área de trabajo, el estado de los equipos, maquinaria, herramientas y elementos de protección personal.

NOTA: Este permiso de inicio son para tareas especificas en la cuales no requiere un permiso de trabajo tales como Permiso de trabajo en Alturas, Electrico, Excavaciones, Caliente, Espacios confinados

CONTRATISTA			
CONSORCIO MARANATHA 91	Miller Tovar Montes	1884422	
	Jhon Jairo Rosa	36.238.338	

AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (RENOVACION O SUSPENSION)

Fecha	Desde (Hora)	Hasta (Hora)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA CONSTRUCTURA
14/05/2024	7:00	17:00		
15/05/2024	7:00	17:00		
16/05/2024	7:00	17:00		
17/05/2024	7:00	17:00		
18/05/2024	7:00	12:00		

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras.

CONTRATISTA	Miller Tovar Montes			
CONSORCIO				

NOTA: La versión vigente y controlada de este documento, La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Codigo: SGSST-F-04	Pagina 1 -2
		Version: 001	
	NIT. 901.748.436 - 1	Fecha: octubre/ 2023	
LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE		NO. PERMISO:	
FECHA: 14 - 08 - 2024	CONTRATISTA: Miller Tovar Montes	PROYECTO: 1478 - 2023	

Nota: Identificar las tareas y peligros que se pueden generar en la tarea realizada de acuerdo a condiciones relacionadas por fenómenos naturales

No.	TAREAS	PELIGRO (ACTO O CONDICIÓN INSEGURA)	RIESGO (RESULTADO PROBABLE)	CONTROLES (ELIMINACIÓN - SUSTITUCIÓN - CONTROL ADMINISTRATIVO - USO EPP)
1	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**BIOLOGICO:** COVID 19. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS SIN DESINFECTAR. **PSICOSOCIAL:** INDISCIPLINA INDIVIDUAL O COLECTIVA.	**BIOLOGICO:** CONTAGIO COVID-19, DOLOR DE CABEZA, IRRITABILIDAD, CANSANCIO, **PSICOSOCIAL:** PERDIDA DE TRABAJO / PUESTO LABORAL.	**BIOLOGICO:** USO PERMANENTE DE TAPABOCAS, LAVADO DE MANOS, CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO PERMANENTE. **PSICOSOCIAL:** CHARLAS, CAPACITACIONES, SUPERVISION EFECTIVA
2	INSPECCION DE AREAS, EQUIPOS O HERRAMIENTAS.	RIESGOS FISICO, QUIMICO, BIOMECANICO, RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES, MAL HUECOS, ATRAPAMIENTOS.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL. **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** DOLOR LUMBAR. **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL, USO DE EPP, COMUNICACION ASERTIVA, VALORIACIÓN ADECUADA DEL RIESGO.
3	REPLANTEO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES, BACTERIAS.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL. **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** DOLOR LUMBAL, ESGUINCES. **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA. **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
4	REHABILITACION DEL PAVIMENTO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **QUIMICO:** MATERIAL PARTICULADO. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, CANSANCIO, QUEMADURAS EN LA PIEL. **QUIMICO:** PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, INHALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO). **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **QUIMICO:** UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA. **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
6	LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **QUIMICO:** MATERIAL PARTICULADO. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, CANSANCIO, QUEMADURAS EN LA PIEL. **QUIMICO:** PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, INHALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO). **MECANICO:** HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** HERIDAS, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **QUIMICO:** UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA. **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. USO DE ARNES Y ESLINGAS SIEMPRE ANCLADO A LA LINEA DE VIDA EXISTENTE. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.
7	ORDEN Y ASEO	**FISICO:** RUIDO, RADIACION SOLAR. **MECANICO:** HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS. **LOCATIVO:** DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES. **BIOMECANICO:** POSTURAS INADECUADAS. **BIOLOGICO:** MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES.	**FISICO:** DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL. **MECANICO:** GOLPES, HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS. **LOCATIVO:** CAIDAS A MISMO NIVEL, FRACTURAS. **BIOMECANICO:** ESGUINCE, DOLOR LUMBAL. **BIOLOGICO:** PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION.	**FISICO:** UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CAMISA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE. **MECANICO:** UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA. **LOCATIVO:** CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR. **BIOMECANICO:** MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS. **BIOLOGICO:** USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS.

APROBACIÓN			
	CONTRATISTA		
	CONSTRUCTORA		

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Codigo: SGSST-F-04	Pagina 1 -2
	NIT. 901.749.436 - 1	Version: 001	
		Fecha: octubre/ 2023	
OBRA: LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA, CAJEO Y SUBBASE		NO. PERMISO:	

FIRMAS DE QUIENES PARTICIPAN DE LA ACTIVIDAD: Mediante la firma certificamos que conocemos todos los riesgos a los que estamos expuestos al desarrollar la actividad y nos comprometemos a realizar los controles establecidos en el ATS.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	36.196.879					
2	DEIVER RIVERA CARDOZO	83.169.787					
3	MILLER TOVAR MONTES	4.864 ~~991~~ 822					
4	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484					
5	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794					
6	GIOVANNI CRUZ FAJARDO	83.222.180					
7	LUIS CARLOS OSPINA	1.003.951.624					
8	JAIRO RESTREPO ROJAS	~~7.720.213~~ 12.109.089					
9	ALVARO JAVIER LOZANO GUILOMBO	1.120.361.787					
10	CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.078.777.075					
11	MILSAR MANRIQUE	4.891.355					
12	RICARDO ROA LUGO	4.864.991					
13	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.818.343					
14	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006					
15							
16							
15							
16							
17							
16							
17							

La versión vigente y controlada de este documento. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del CONSORCIO MAÑANATHA 91

12. ANEXOS DE FORMATO DE REPOSICIÓN E.P.P

Maranatha 91	REPOSICION DE DOTACION Y EPP																	
	Codigo: SGSST - F-15		Version: 1			Fecha: 19/01/2023												
CONTRATO	1478 - 2023																	
OFICINA Y/O LUGAR	Campamento																	
			ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL															
FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CAMISA	JEANS	CASCO	BOTAS	BARBIQUEJO	GUANTES			GAFAS		TAPA OIDOS	MASCARILLA DESECHABLE	OTROS	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
								VAQUETA	POLIESTER	CAUCHO	CLARAS	OSCURAS					
23-01-24	Cesar Londoño	1.078.777.075						X			X						
22-01-24	Willer Tovar	4.884.422						X				X					
17-01-24	Jairo Restrepo	7.730.213						X					X				
21-01-24	Ricardo Rojas	4.884.991						X			X						
20-01-24	Deiver Rivera	83.169.787						X				X					

Anexo 8
Correspondencia

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 7 de mayo 2024

CV-INT-28

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Asunto: Entrega de informe No 4 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo 2024 del seguimiento al contrato de obra No 1478 de 2023 cuyo objeto es: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Cordial saludo

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1492 de 2023, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; me permito entregar el informe No 4 de interventoría correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Anexo 121 Folios

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

Anexo 9
Laboratorios
