INFORME DE INTERVENTORÍA No 7

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023:

OBJETO: REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/06/2024 AL 12/06/2024

FECHA DEL INFORME: 12/06/2024

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCO VIAL 2023

JUNIO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. ALCANCE DEL PROYECTO 5

Valor Costo Inicial del Proyecto. 5

2. ASPECTO TÉCNICO. 6

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 6
Actividades de obra física. 7

3. PROGRAMACION DE OBRA 11

4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO 13

4.1 PROYECCIONES DEL SEDUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS 13
4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO 13
Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista 13
Valor De Las Actas Pagadas 13
Valor Anticipo Cobrado 14

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 14

6. CONTROL ESPECIFICACIONES 15

6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA 15

7. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15

7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15

8. SEGURIDAD SOCIAL 17
9. MEMORIA DIARIA O BITACORA 17
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 18
11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 18
12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA 18
13. ASPECTO JURÍDICO 19
13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 19
13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 20
13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
14. PERMISOS AMBIENTALES 27
14.1. PERMISOS AMBIENTALES 27
14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES) 27
15. INFORMES DE OBRA 25
16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 26

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorcivial2023huila@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. *Municipios a intervenir:* 5
Tabla 2. *Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo* 5
Tabla 3 *Control de programación y avance de obra.* 7
Tabla 4 *Flujo del proyecto.* 8
Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado. 11
Tabla 6. Maquinaria mínima requerida 14
Tabla 7. Condiciones contrato de obra 18
Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría 19
Tabla 9. *Control de pólizas contratista* 20
Tabla 10. *Control de pólizas interventoría* 22

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Control Personal Interventoría
Anexo 7 Informe HSQ Interventoría
Anexo 8 Correspondencia
Anexo 9 Laboratorios

1. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 2,87 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de 17.489 m2 de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de cunetas e instalación de señalización horizontal.

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
AIPE	Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita	2,87 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra desglosado por capítulo

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
AIPE	Vía de tercer orden	$ 2.720.013.516,14
TOTAL C.D.		**$ 2.720.013.516,14**

Fuente: Interventoría

Valor adicional del contrato de obra desglosado por capitulo

AIPE	Vía de tercer orden	$ 3.579.734.915
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 3.579.734.915

Plazo Inicial = Ochos (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo total contrato de obra = 8 meses

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

Condiciones Vigentes:

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido 5 meses y 19 días (24 de octubre de 2023 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad de los inconvenientes presentados y el estado o de avance de estos:

El día 12/06/2024 se envió comunicado CV-INT-29 al supervisor del contrato con respecto a la solicitud de suspensión No 2 del contrato de interventoría No 1492 de 2023.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

Actividades de obra física.

Municipio de Aipe- Praga.

Actividades ejecutadas actualmente. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- Debido a que no ha sido aprobado el ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la mezcla asfáltica, no se ha podido ejecutar las actividades faltantes como los son la instalación de la carpeta asfáltica, fundición de cunetas en concreto e instalación de señalización horizontal.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANT. ACTUAL	% PROGRAMADO (físico)	% EJECUTADO (Físico)	DIFERENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1	Localización y replanteo	KM	2,87	100%	100,00%	0,00%	Localización y replanteo
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	17488,7	100,00%	100,00%	0,00%	Fresado de pavimento asfaltico
2.1	Corte en conglomerado	M3	6960,8	100,00%	100,00%	0,00%	Corte en conglomerado
3.1	Conformación de calzada	M2	26600	90,91%	100,00%	+36,36%	Conformación de calzada
3.2	Base granular	M3	2610,30	83,33%	100,00%	+16,67%	Base granular
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	866,10	75,00%	0,00 %	-75,00%	Mezcla Densa en caliente MDC-19
3.4	Sub-Base granular	M3	2610,30	83,33%	100,00%	+16,67%	Sub-Base granular
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17202	80,00%	100,00%	+20,00%	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ	M3	860,10	52,63%	0,00%	-52,63%	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8601	16,67%	0,00%	-16,67%	Línea de demarcación con pintura en frío
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación	M3-KM	122247,5	100,00%	100,00%	0,00%	Transporte proveniente de la excavación de la explanación

Fuente. Interventoría

Tabla 4 Flujo del proyecto.

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACION FLUJO DE CAJA													
							1 MES				2 MES				3 MES				4 MES			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		PRELIMINARES																				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	$ 12.889.859,98															
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**																
		EXPLANACIONES																				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00			$ 16.399.644,80		$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**																
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00			$ 6.770.909,09		$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00			$ 44.803.624		$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00			$ 36.883.539,00		$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00			$ 4.720.228,80		$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**																
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000													$ 173.441.428,421			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**																
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000																
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**																
		TRANSPORTES																				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000			$ 18.162.485,714		$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**																
					SUBTOTAL OBRAS	$ 3.536.017.571																
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 3.536.017.570,98																
		PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)				$ 16.518.000,00			$ 1.101.200,00		$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)				$ 27.199.344,00			$ 1.813.289,60		$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
		VALOR TOTAL				**$ 3.579.734.915**																
							$ 143.544.781,235				$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260				$ 641.026.523,681			
							4,06%				13,06%				13,06%				17,91%			

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
			$ 13.541.818,18	$ 13.541.818,18											
			$ 89.607.248,50	$ 89.607.248,50				$ 44.803.624,25							
			$ 190.316.814,00	$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00							
			$ 73.767.078,00	$ 73.767.078,00				$ 36.883.539,00							
			$ 9.440.457,60	$ 9.440.457,60				$ 7.080.343,20							
			$ 173.441.428,421	$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 130.081.071,316			
				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000			
			$ 36.324.971,429	$ 27.243.728,57											
			$ 2.202.400,00	$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
			$ 3.626.579,20	$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

3. PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO	HUILA — FECHA DE INICIO
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA

PROGRAMACION DE OBRA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	$ 3.536.017.571

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**

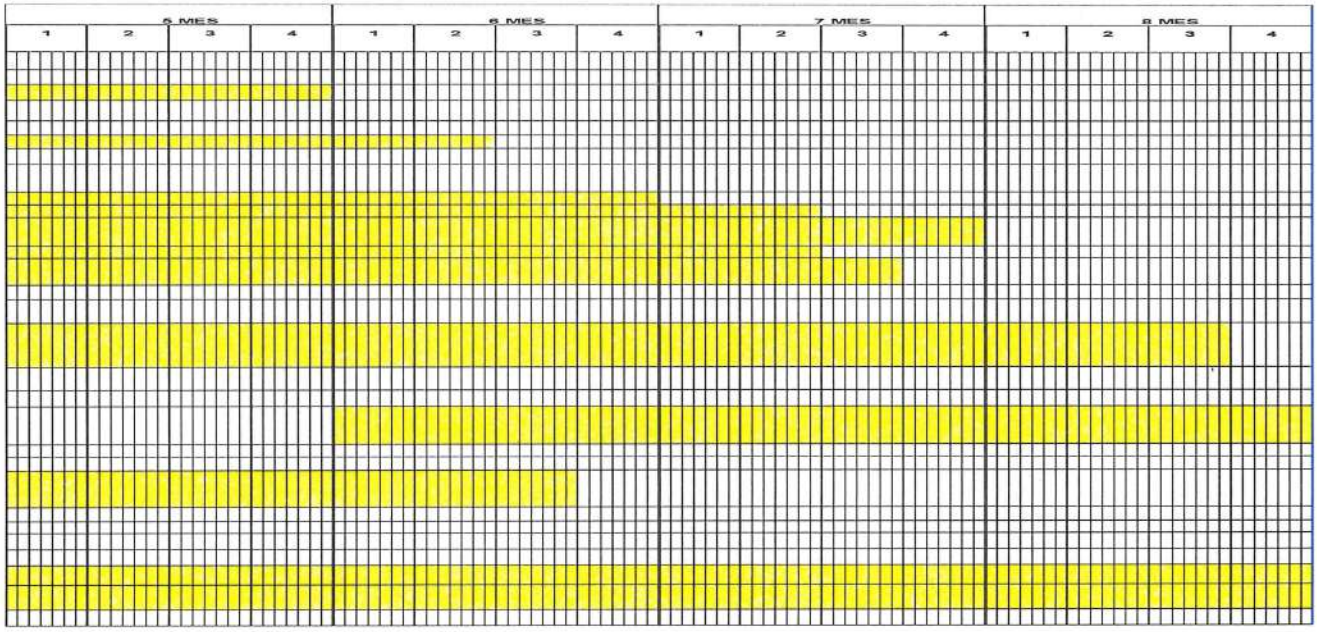


Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado.

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 7**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	8,49%	74,44%
valor de la obra programada	$303.979.418,64	$2.664.747.437,76
obra ejecutada (%)	0,00%	40,72%
valor de la obra ejecutada	$0,00	$1.457.813.125



4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO

El contratista presentó los documentos para el ajuste al contrato de obra con respecto a la Mezcla asfáltica MDC-19, ya que, debido a la corrección de el espesor de la misma, no se ha podido iniciar estas actividades.

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 74,44% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 33,72%.

El equipo de la interventoría ha solicitado al contratista de obra de forma verbal el proceso del ajuste al contrato de obra, ya que por esta razón no se ha podido autorizar la ejecución de las actividades pendientes.

4.1 PROYECCIONES DEL SEGUNDO MES DEL CONTRATO – CUMPLIDAS/NO CUMPLIDAS

El contratista de obra no logró cumplir con la reprogramación de obra hasta la fecha de cierre del Informe No 7, luego que se reinició el contrato de obra el 01 de febrero de 2024.

4.2 CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO

Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista

A la fecha del presente informe el contratista de obra Consorcio Vial Maranatha 91, el contratista ya facturó el acta parcial No 1 por un valor de $1.457.813.125.

Valor De Las Actas Pagadas

El departamento pagará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento 90%, previa amortización del anticipo.

Valor Anticipo Cobrado

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO VIAL MARANATHA 91					
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91				
CONTRATO DE OBRA No.	1478-2023				
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS					
REHABILITACIÓN VÍAS					
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR CONTRATO	$3.579.734.914,98				
% ANTICIPO	30%				
VALOR ANTICIPO	$1.073.920.475,00				
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.073.920.475,00				
DESCUENTOS	$53.696.024,00				
VALOR NETO GIRADO	$1.020.224.451,00				

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	29,41%	$300.000.000,00	$300.000.000,00
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	15,68%	$160.000.000,00	$160.000.000,00
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	GLB	25,48%	$260.000.000,00	$260.000.000,00
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	11,78%	$120.224.451,00	$120.224.451,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	5,88%	$60.000.000,00	$60.000.000,00
6	MANO DE OBRA	GLB	11,76%	$120.000.000,00	$120.000.000,00
					$1.020.224.451,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	**$1.020.224.451,00**
SON	**$1.020.224.451,00**				

La interventoría aprobó el plan de inversión del anticipo del contratista de obra y se radicaron los documentos en la Gobernación del Huila para el trámite respectivo.

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- **Ruta Código 45HL22 Praga- Santa Rita**: A lo largo del periodo del presente informe el contratista no ha podido ejecutar actividades, ya que está a la espera de la aprobación del ajuste del contrato de obra con respecto al espesor de la Mezcla asfáltica. Durante este periodo se presentaron lluvias leves y esporádicas.

6. CONTROL ESPECIFICACIONES

Por parte de interventoría se ha solicitado la documentación concerniente a los diferentes permisos de canteras y disposición de RCD.

Certificaciones de calidad de los materiales, para verificar cumplan con lo especificado en el contrato de obra, además de lo que se evidencia en obra.

6.1. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA

De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 5 tiene un porcentaje programado acumulado del 74,44 % y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso de 33,72%.

7. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

7.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 6. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 Galones)	2
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Cortadora de pavimento	2
Regla vibratoria	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1
COMPRESOR	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 1478-2023

Informe De Personal

En el presente periodo ya se tienen revisadas las hojas de vida del personal mínimo requerido envidas por el contratista. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Personal Técnico Requerido

Aprobado inicial

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	1	100%
INSPECTOR DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SISO	1	78%
AUX. TRANSITO	1	100%

Fuente. Interventoría

Personal Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL		
CARGO	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**
Director de Interventoría	1	100%
Residente de Interventoría	1	100%
PERSONAL TÉCNICO		
Inspector de obra de obra	1	100%
Comisión topográfica Topógrafo, 1 cadenero con equipo topográfico	1	100%

Fuente. Interventoría

8. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a la obligación de la interventoría, según el pliego de condiciones se estipula verificar y certificar la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud) e informar si el pago se realizó mensualmente, el cual se acreditara mediante recibo de pago efectuado por el Contratista (planilla de seguridad social).

- El Contratista a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de algunos trabajadores incluyendo director de obra y residente. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

9. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Teniendo en cuenta el Decreto 1772 de 1994, donde se expresa la importancia de contar con la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social, no solo para el cumplimiento de las leyes, sino para proteger, conservar y preservar la salud y seguridad de todos sus empleados, todo el equipo de trabajo que hace parte del CONSORCIO VIAL MARANATHA 91, se encuentra al día en el pago de EPS, ARL, AFP esto se puede evidenciar en las planillas adjuntas a este documento.
De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, por el cual se modifica el pago de la seguridad de independientes "Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior".

12. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

12.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE INTERVENTORÍA

MES	% PROGRAMADO MES	% ACUMULADO PROGRAMADO	% EJECUTADO MES	% ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR / ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1	5,71 %	74,29 %	5,71 %	74,29 %	0,00%

13. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.1478-2023.

13.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
NIT:	901.749.436-1
CONTRATO No.:	1478 DE 2023
OBJETO.:	REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 3.579.734.915
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

La Gobernación del Huila realizó el seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de Interventoría No. 1492 – 2023, de la siguiente manera:

13.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 8. Condiciones contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2023
NIT:	901.753.844-9
CONTRATO No.:	1492 DE 2023
OBJETO.:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 261.763.600
VALOR TOTAL:	$ 261.763.600
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO TOTAL	8 MESES
ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1:	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024

Fuente. Interventoría

13.3. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101018547, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101050819.

Tabla 9. Control de pólizas contratista

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	12/09/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	12/09/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 715,946,983.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2023	12/05/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	12/09/2023	12/05/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101050819 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	24/10/2023	12/11/2024	$ 715,946,983.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	24/10/2023	12/11/2024	$ 1,073,920,474.50
PAGO DE SALARIO	24/10/2023	12/05/2027	$ 357,973,491.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 415,080,202.00
TOTAL			**$ 2,863,787,932.00**

Fuente. Contratista

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101018547 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/10/2023	24/06/2024	$ 45.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 464.000.000
TOTAL			**$ 464.000.000**

Fuente. Contratista

13.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Interventoría, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial.

Tabla 10. Control de pólizas interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2023	18/05/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		18/05/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/11/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO		18/04/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-POLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	18/09/2023	18/11/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		18/11/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		18/11/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		18/11/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2023	23/06/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/06/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/06/2024	24/05/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL-ACTA DE INICIO			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	29/10/2023	24/12/2024	$232.000.000,00
PATRONAL		24/12/2024	$69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		24/12/2024	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		24/12/2024	$69.600.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2024	25/08/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/08/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		25/02/2028	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2024	25/08/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

POLIZA DE R.C- ACTA DE SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	29/10/2023	25/02/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/02/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/02/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/02/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/02/2024	25/12/2025	$52.352.720,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		25/12/2025	$78.529.080,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2027	$52.352.720,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/12/2029	$52.352.720,00
No. de la Póliza: CHU 100008031 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-OTRO SI			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO	24/10/2023	25/06/2025	$260.000.000,00
PATRONAL		25/06/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/06/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/06/2025	$260.000.000,00
No. de la Póliza: CHU 100001584 Seguros Mundial			

Fuente. Interventoría

14. PERMISOS AMBIENTALES

14.1. PERMISOS AMBIENTALES

Para la ejecución del contrato de obra No. 1478 de 2023, se ha requerido la solicitud de premisos para la disposición de materiales pétreos y provenientes de las excavaciones.

14.2. LIMPIEZA DE LA OBRA (Residuos convencionales y especiales)

Mediante oficio se le solicito al contratista enviar los siguientes documentos:

- Señalización y demarcación de las áreas a intervenir.
- Licencias RCD.

15. INFORMES DE OBRA

El contratista a la fecha ha presentado los informes de obra solicitados de forma escrita mediante oficios por la interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato de obra.

16. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

16.1 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

Dar cumplimiento estricto a la entrega de la documentación solicitada en los plazos requeridos en el contrato de obra y tramitados por la interventoría externa.

Cumplir con los perfiles y dedicaciones de los profesionales ofertados cumpliendo con el pliego de condiciones una vez se inicie la ejecución de los trabajos.

Una función contractual del Consorcio Vial 2023; es la de reportar el avance o atraso de la programación aprobada; y el no cumplimiento se le comunicará a la Gobernación del Huila; por lo que se recomienda al contratista de obra hace entrega inmediata del plan de contingencia y mitigación para implementar estrategias que aporten en el avance de obra y de tal manera evitar se adelanten los trámites administrativos y jurídicos de un presunto incumplimiento frente a la programación; en estricto cumplimiento a la cláusula vigésima séptima del contrato de obra No. 1478 de 2023.

Continuar realizando el pago a la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades de obra estipuladas o del balance en el contrato de obra No. 1478 de 2023.

Exigir la utilización de los elementos de protección personal que entrego el Consorcio Vial Maranatha 91 a cada uno de los trabajadores.

16.2 CONCLUSIONES

El día 12/06/2024 se envió comunicado CV-INT-29 al supervisor del contrato con respecto a la solicitud de suspensión No 2 del contrato de interventoría No 1492 de 2023.

En el trascurso del proyecto esta interventoría ha realizado el control de calidad a cada una de las actividades desarrolladas en este proyecto, garantizando la estabilidad de la obra en el transcurso del tiempo.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gobernación el ajuste al contrato de obra No 1478 de 2023.

El contratista de obra ya facturó el acta parcial No 1 por un valor de $ 1.457.813.125.


De acuerdo a la programación de obra el contratista a la fecha de cierre del informe No 7 tiene un porcentaje programado acumulado del 74,44% y un porcentaje ejecutado acumulado del 40,72%, en donde se presenta un atraso del 33,72%.

LUIS MIGUEL SUAZA
R.L CONSORCIO VIAL 2023

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE AIPE-HUILA VIA A PRAGA RUTA 45HL22

Equipo, Maquinaria y Stop de materiales granulares

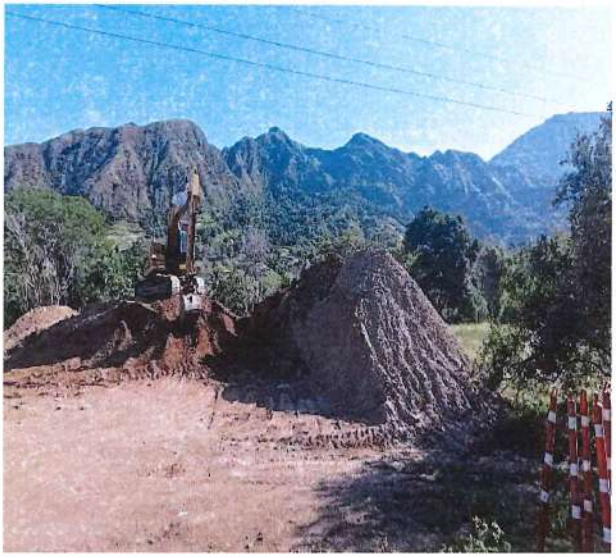







Anexo 2
Programación

CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 41HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		

PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1 MES 1	1 MES 2	1 MES 3	1 MES 4	2 MES 1	2 MES 2	2 MES 3	2 MES 4	3 MES 1	3 MES 2	3 MES 3	3 MES 4	4 MES 1	4 MES 2	4 MES 3	4 MES 4
		PRELIMINARES																				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98	12.889.859,98															
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00					$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75				$ 15.958.438,75			
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**																
		EXPLANACIONES																				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00			$ 16.399.644,80		$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60				$ 32.799.289,60			
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**																
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE																				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00			$ 6.770.909,09		$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18			
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00			$ 44.803.624		$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50			
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00					$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00			
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00			$ 36.883.539,00		$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00			
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00			$ 4.720.228,80		$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**																
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS																				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000													$ 173.441.428,421			
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**																
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frio	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000																
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**																
		TRANSPORTES																				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000			$ 18.182.485,714		$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429				$ 36.324.971,429			
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**																
					SUBTOTAL OBRAS	$ 3.536.017.571																
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98																
		PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)				$ 16.518.000,00			$ 1.101.200,00		$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)				$ 27.199.344,00			$ 1.813.289,60		$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
					VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**																
							$ 143.544.781,235				$ 467.585.095,260				$ 467.585.095,260				$ 641.026.523,681			
							4,06%				13,06%				13,06%				17,91%			


CONTRATO DE OBRA No. 1478-2023	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 – RUTA 45 – PRAGA – SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
DEPARTAMENTO	HUILA	FECHA DE INICIO	
	PRESUPUESTO PRAGA - SANTA RITA		


PROGRAMACION FLUJO DE CAJA

5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			15.958.438,75												
			32.799.289,60	$ 16.399.644,80											
$ 13.541.818,18				$ 13.541.818,18											
$ 89.607.248,50				$ 89.607.248,50				$ 44.803.624,25							
$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00				$ 190.316.814,00							
$ 73.767.078,00				$ 73.767.078,00				$ 36.883.539,00							
$ 9.440.457,60				$ 9.440.457,60				$ 7.080.343,20							
$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 173.441.428,421				$ 130.081.071,316			
				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000				$ 8.371.640,000			
$ 36.324.971,429				$ 27.243.728,57											
$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00				$ 2.202.400,00			
$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20				$ 3.626.579,20			
$ 641.026.523,681				$ 607.958.837,274				$ 466.726.368,071				$ 144.281.690,516			
17,91%				16,98%				13,04%				4,03%			

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo	Km	2,867	$ 4.495.940,00	$ 12.889.859,98
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	17.488,70	3.650,00	$ 63.833.755,00
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 76.723.614,98**
		EXPLANACIONES				
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	6.960,80	$ 23.560,00	$ 163.996.448,00
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 163.996.448,0000**
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE				
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	26.600,00	$ 2.800,00	$ 74.480.000,00
5	3,2	base granular	M3	2.610,30	$ 205.970,00	$ 537.643.491,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	866,10	$ 1.318.440,00	$ 1.141.900.884,00
7	3,4	Sub-base granular	M3	2.610,30	$ 169.560,00	$ 442.602.468,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	17.202,00	$ 3.430,00	$ 59.002.860,00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 2.255.629.703,00**
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS				
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	860,10	$ 957.850,00	$ 823.846.785,000
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 823.846.785,00**
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
10	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	8.601,00	$ 2.920,00	$ 25.114.920,000
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 25.114.920,00**
		TRANSPORTES				
11	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	122.247,50	$ 1.560,00	$ 190.706.100,000
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 190.706.100,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.536.017.571**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.536.017.570,98
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)	$ 16.518.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 27.199.344,00
VALOR TOTAL	**$ 3.579.734.915**

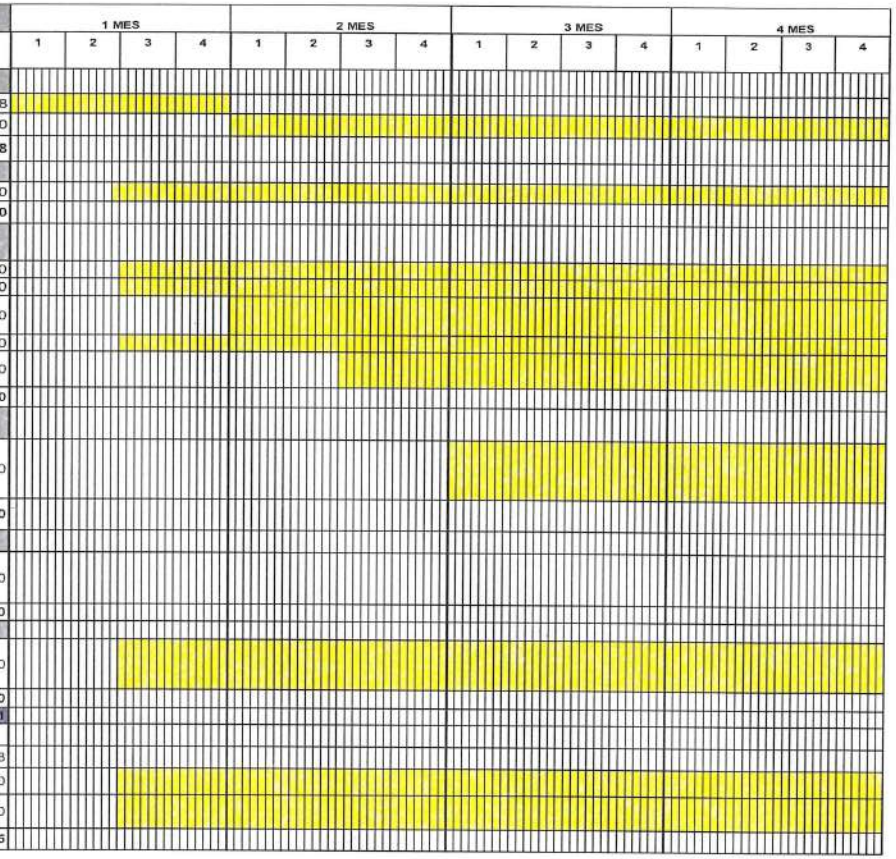

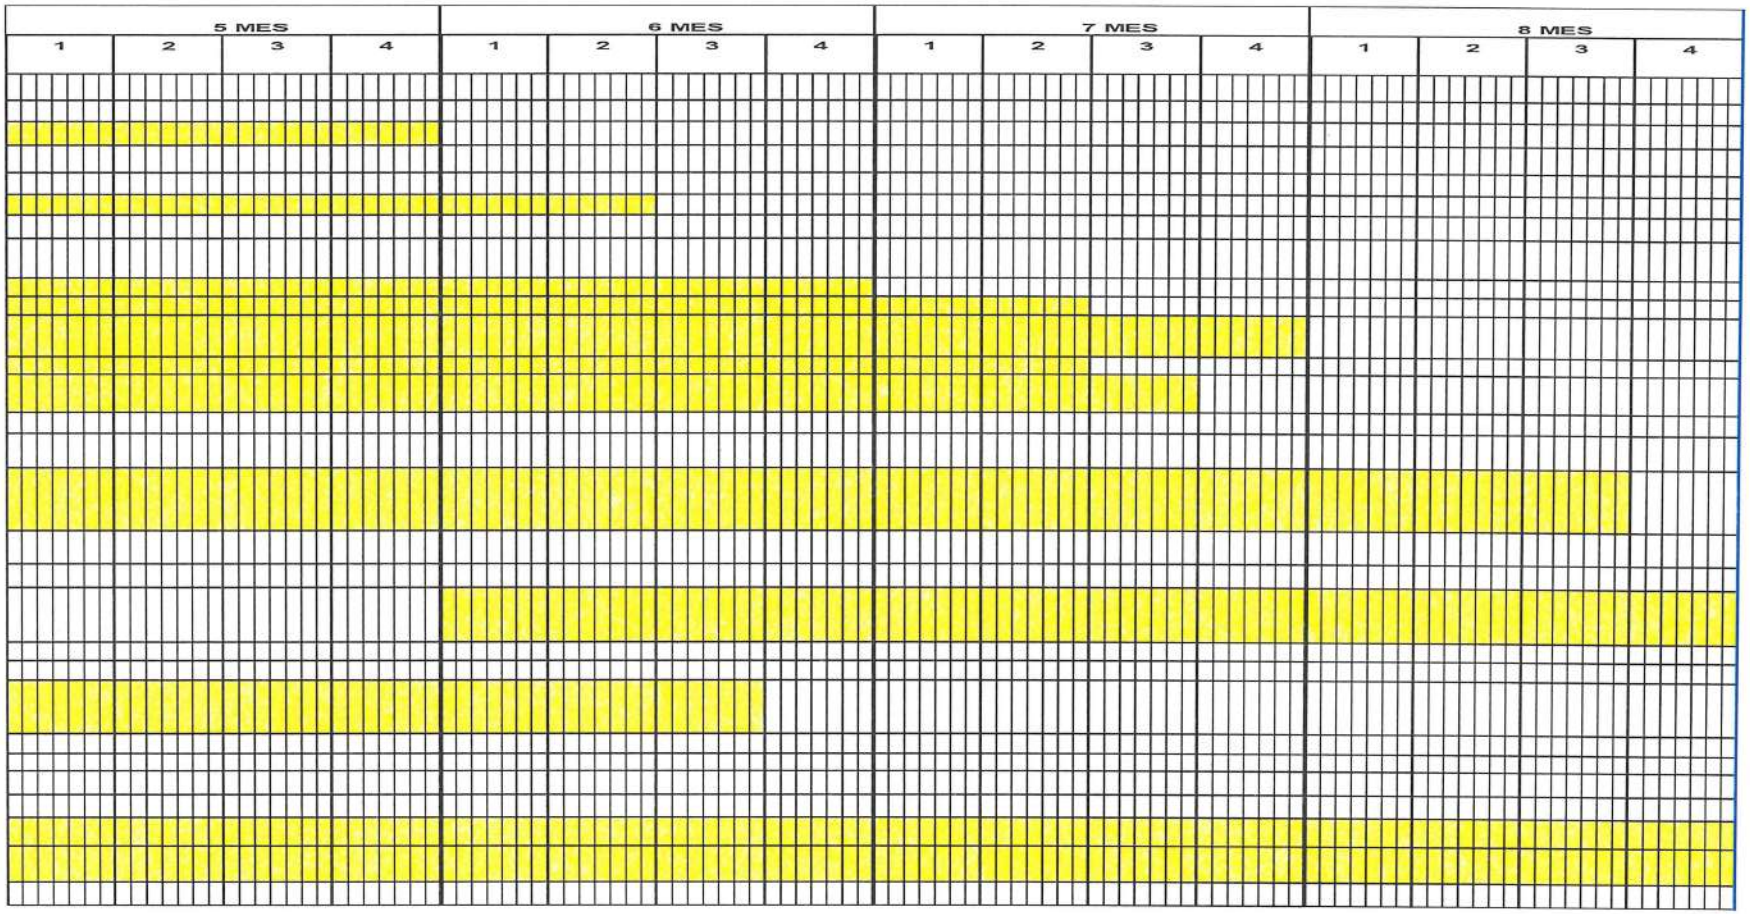
5 MES
1
2
3
4
6 MES
1
2
3
4
7 MES
1
2
3
4
8 MES
1
2
3
4

Anexo 3
Bitacora de Obra

ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185 CFM, CARBOTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 7/06/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, INGEQ, AYUDANTES, CERADORES,
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE CORAZ. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA MANIA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAY 11M3, EQUIPO EINSBAR BARBAR GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR LEROY 185 CFM, CARBOTANQUE.
OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 8/06/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 03/06/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 4/06/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, AseO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO DE EXPERTO MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS DEMAS FACTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA LLANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, IX VOLQUETAS C-40, VOLQUETA HYUNDAI HX413, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, VIBRADOR ASFALTO, COMPRESOR LEMOY 189CFM, CARRO TANQUE.
OBSERVACIONES=

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 5/06/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, OBSEQ, AYUDANTES, CEPADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA CHANTA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI HD78, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, IRRIGADOR ASFALTO, COMPACTOR LEROY 189CFM, CARRO TANQUE.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 6/06/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETERA, OBSEQ, AYUDANTES, CEPADORES.
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR CA 252, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 150, RETROEXCAVADORA (MANTA ROMASA), MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 12M3, EQUIPO DE EMULSIÓN BARBER GREEN 760, MARTILLO NEUMÁTICO, COMPRESOR LEMOY 189 CFM, CARRETILLAS.
OBSERVACIONES:

Claudio Gómez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

FECHA: 7/06/2024
ESTADO CLIMA:
PERSONAL: RESIDENTE, TOPÓGRAFO, OPERARIOS, PALEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTÓ ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ÍTEM DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL TUNEL DE ESPESOR MEDIANTE CORO. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ÍTEMS FINALES DE MEZCLA ASFÁLTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 150, RETROEXCAVADORA MANTA ROMASA, MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 12M3, EQUIPO DE EMULSIÓN BARBER GREEN 760, MARTILLO NEUMÁTICO, COMPRESOR LEMOY 189 CFM, CARRETILLAS.
OBSERVACIONES:

Claudio Gómez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

FECHA= 8/06/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL= RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PARTERAS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACION.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA CHINA KOMATSU, MINICARGADOR CASE, LA VOLQUETA C-30, VOLQUETA HYUNDAI 12 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, MARTILLO ASFALTO, COMPACTADOR JEBOY 708 CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA= 9/06/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL= N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA= 10/06/2024
ESTADO CLIMA= N/A
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES= NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DIA FESTIVO.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= N/A
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FECHA= 11/06/2024
ESTADO CLIMA =
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, ASEO, AYUDANTES, CELADORES
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA, NO SE HA REALIZADO EL AJUSTE AL CONTRATO EN EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN EL AUMENTO DE ESPESOR MEDIANTE OTROSI. NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS ITEMS FACTIBLES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA250, RETROEXCAVADORA PLANTA ROMA150, MINICARGADOR CASE, 4 VOLQUETA C-90, VOLQUETA HYUNDAI 11KM3, EQUIPO DE FINISHER BARBER GREEN 260, FRESADORA ASFALTO, COMPRESOR CEMOY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES =

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

FECHA = 12/06/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL = N/A
ACTIVIDADES= SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION No 2 HASTA QUE SE REALICE OTROSI QUE MODIFICA EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA DE 5CMS A 7,5CMS DE ACUERDO A AJUSTE AL DISEÑO, ACTA DE JUSTIFICACIÓN, BALANCE DE OBRA, COMITE DE OBRA Y DOCUMENTOS DE AJUSTE. NO SE PUEDE ADELANTAR OBRA HASTA TANTO SE MODIFIQUEN LOS ITEMS 2.7 CONCRETO EN CONGLOMERADO. ITEMS 3.3. MEZCLA ASFALTICA MDC-19, ITEMS 6.7 TRANSPORTE.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS= MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250, RETROEXCAVADORA JCM 3CX, MINICARGADOR CASE, 2 VOLQUETAS C-70, VOLQUETA HYUNDAI 12 M3, EQUIPO DE FINISHER BARBERS GREEN 260, TRACTOR ASFALTO, COMPRESOR PERKY 185CFM, CARROTANQUE.
OBSERVACIONES=

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FECHA = 8/08/2024
ESTADO CLIMA=
PERSONAL = RESIDENTE, TOPOGRAFO, OPERARIOS, PALETEROS, OBRERO, AYUDANTES, CELADORES.
ACTIVIDADES= SE REINICIA EL CONTRATO POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN. NO SE EJECUTA ACTIVIDAD DE OBRA. EL AJUSTE AL CONTRATO DE OBRA PARA MODIFICAR EL ITEM DE MEZCLA ASFALTICA EN ESPESOR MEDIANTE OTROSI SE ENCUENTRA EN TRAMITE. NO SE PUEDE EJECUTAR LOS ITEMS FALTANTES DE MEZCLA ASFALTICA, CUNETAS NI DEMARCACIÓN.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS = MOTONIVELADORA CHAMPION 715, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 152, VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

Anexo 5
Control Personal Obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749436	1	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 4 34	NEIVA-HUILA	8720825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	900510081	9470127419	E	2024/07/10	2024/09/09	BANCOLOMBIA	61	$6,196,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																						$17,738,000	$2,838,100			$21,938,000	$877,600			$21,658,000	$866,400			$21,938,000		$1,344,600		$0	$0		$5,926,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS ALTO RIESGO (6 Afiliados)																						$9,500,000	$1,520,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000		$661,300		$0	$0		$2,941,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$9,500,000	$1,520,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000	$380,000			$9,500,000		$661,300		$0	$0		$2,941,300
1	CC	36069417	ALVIRA ANGELICA																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	94393644	AVILA ALEJANDRO																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	38196879	FERREIRA ELIZABETH																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1075544006	GARCIA JUAN																	23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
5	CC	36288338	MAJE YUDY																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO																	23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$2,838,000	$454,100			$2,838,000	$113,600			$2,838,000	$113,600			$2,838,000		$14,900		$0	$0		$696,200
7	CC	1075266993	RAMIREZ YENNY																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1075544289	TAVERA ANDRES																	25-14	30	$1,538,000	$246,100	EPS037	30	$1,538,000	$61,600	CCF32	30	$1,538,000	$61,600	14-11	30	$1,538,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,400
Centro de Trabajo: CUADRILLA TOPOGRAFIA (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,900		$0	$0		$1,061,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,900		$0	$0		$1,061,900
9	CC	83169787	RIVERA DEIVER																	23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
10	CC	4884422	TOVAR MILLER																		0	$0	$0	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF32	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	SI	$628,400
Centro de Trabajo: OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$433,500
11	CC	1003818343	HID CARLOS																	23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,320,000	$92,800			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$793,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,320,000	$92,800			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$793,800
12	CC	55160794	GARZON MARIA																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
13	CC	1075544484	VARGAS YENY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
Total			**Afiliados(13)**																			$17,738,000	$2,838,100			$21,938,000	$877,600			$21,658,000	$866,400			$21,938,000		$1,344,600		$0	$0		$5,926,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749436	1	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 4 34	NEIVA-HUILA	8720825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	900510081	9470127419	E	2024/07/10	2024/09/09	BANCOLOMBIA	61	$6,196,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,838,100	$129,100	$0	$2,967,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$13,100	$0	$301,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$934,100	$42,500	$0	$976,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,088,000	$49,500	$0	$1,137,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$528,000	$24,000	$0	$552,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,344,600	$61,100	$0	$1,405,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,344,600	$61,100	$0	$1,405,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$866,400	$39,400	$0	$905,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	$866,400	$39,400	$0	$905,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$877,600	$40,100	$0	$917,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$2,800	$0	$62,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$485,600	$22,100	$0	$507,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$2,400	$0	$54,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$280,000	$12,800	$0	$292,800
TOTAL				**13**	**$5,926,700**	**$269,700**	**$0**	**$6,196,400**

Anexo 6
Control Personal Interventoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	895868233	9472856082	E	2024/07/11	2024/09/06	BANCO CAJA SOCIAL	57	$1,420,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4377250	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER		X																25-14	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF32	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0	Si	$161,000
2	CC	1075239208	GONSALEZ SALAS YESICA		X																230301	12	$800,000	$128,000	EPS005	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
3	CC	1003828965	MALLUNGO REINOSO JUAN SEBASTIAN		X																25-14	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF32	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0	Si	$161,000
4	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO		X																25-14	12	$960,000	$153,600	EPS037	12	$960,000	$38,400	CCF32	12	$960,000	$38,400	14-11	12	$960,000	$66,900	12	$0	$0	Si	$297,300
5	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO		X																231001	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF32	12	$1,600,000	$64,000	14-11	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
Total	**Afiliados(5)**																						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$306,400		$0	$0		$1,362,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901753844	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	895868233	9472856082	E	2024/07/11	2024/09/06	BANCO CAJA SOCIAL	57	$1,420,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$704,000	$30,000	$0	$734,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$10,900	$0	$266,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$320,000	$13,600	$0	$333,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$128,000	$5,500	$0	$133,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$306,400	$13,100	$0	$319,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$306,400	$13,100	$0	$319,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$176,000	$7,500	$0	$183,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$176,000	$7,500	$0	$183,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$176,000	$7,600	$0	$183,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$38,400	$1,700	$0	$40,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$137,600	$5,900	$0	$143,500
TOTAL				**5**	**$1,362,400**	**$58,200**	**$0**	**$1,420,600**


Anexo 7
Informe HSQ Interventoría

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

INFORME DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1492 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 1478 DE 2023

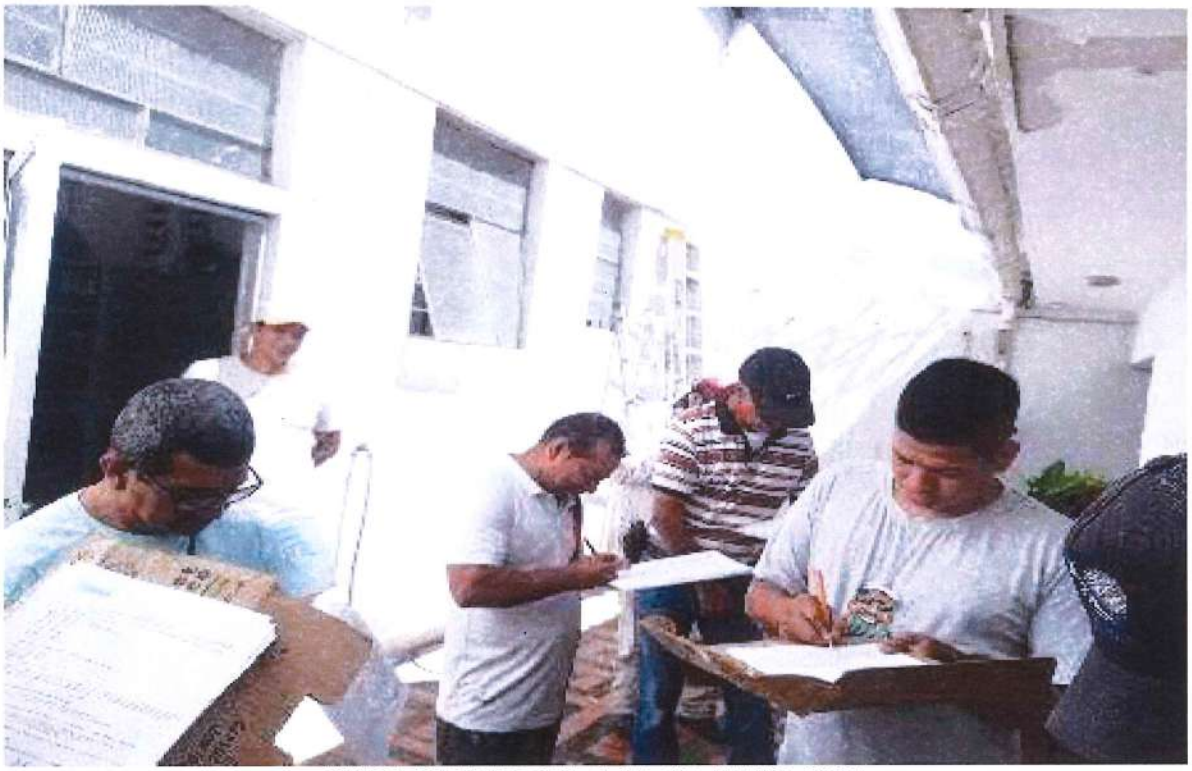

INFORME N.7 DEL 1 AL 12 JUNIO 2024

CONSORCIO VIAL 2023

2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos Específicos 4
3. Contenido del Informe 5
3.1. Generalidades Contractuales 5
4. Marco Legal 7
4.1. Normatividad Aplicable 7
5. Actividades Realizadas Durante el Periodo de Seguimiento 8
5.1. Componente Social 8
5.1.1. Actas de Vecindad y Actas de Entorno 9
5.2. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo 10
5.4. Plan de Manejo de Trafico 13
6. Personal de la Obra 16
7. Personal de Interventoría 17
8. Conclusiones 18
9. Examenes Medico Ocupacionales 19
..... 19
10. Induccion del Personal 23
11. Registro Asistencia a Charla de Seguridad 27
12. Registro de Asistencia a Capacitación 29
13. Permiso de Trabajo y Analisis de Seguro en Altura 30
14. Reposición de Epp 33

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio **VIAL 2023** Interventor Externo del Contrato No**. 1492 de 2023 a través del Contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."** Viene haciendo acompañamiento en el periodo correspondiente del 01 al 12 Julio del 2024.

Las actividades de Control, y Seguimiento están direccionadas hacia la verificación de la ejecución de las actividades planteadas por el Contratista de Obra en el documento Plan de Manejo de Tránsito, Componente Social y componente Seguridad y Salud en el Trabajo), donde se verifican sus posibles alcances y enmiendas respectivas si se llegasen a necesitar

Igualmente, la Interventoría lleva un control en el proceso de ejecución de obra donde previene accidentes de tipo laboral de los trabajadores del Contratista; además del componente de Seguridad y Salud de las personas que habitan en la zona y de aquellas que hacen presencia diaria por su actividad económica; siempre previendo la ausencia de accidentes que afecten a las personas, animales y al medio ambiente.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Revisar, evaluar y acompañar las actividades Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Contratista en el periodo correspondiente del 01 al 12 de Junio de 2024.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Evaluar las actividades realizadas por parte del consorcio Vial Maranatha 91 del componente de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo comprendido en mención del contrato.
- Identificar el cumplimiento de las actividades Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Manejo de Transito propuesto por el Contratista en el proceso de ejecución de la obra de construcción.

3. CONTENIDO DEL INFORME

El informe describe las actividades realizadas por el equipo Técnico del Contratista en los componentes: Social, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1478 DE 2023, REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.** Durante el periodo correspondiente a los Informes correspondiente del 01 al 12 de Junio de 2024.

3.1. GENERALIDADES CONTRACTUALES

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
No. DEL CONTRATO	**1492 DE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023 R.L. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON NIT: 901.753844-9
VALOR DEL CONTRATO	$261.763.600
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	12 DE JUNIO 2024



CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

DATOS DEL CONTRATANTE	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL HUILA
NO. DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 1478 DEL 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTO DE TERCER ORDEN CÓDIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MARANATHA 91
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.579.734.915
FECHA DE INICIO	24 OCTUBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	1 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO	1 DE FEBRERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	12 DE JUNIO 2024

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

4. MARCO LEGAL

4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE

De acuerdo a la normatividad legal vigente

NORMATIVIDAD	DESCRIPCION
Decreto 1443 del 2014	Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST
Decreto 1072 de 2015	Regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia y es de obligado cumplimiento por todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño
Resolución 1111 de2017	Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución 0312 de 2019	Establece los estándares mínimos que deben cumplir las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y su implementación es obligatoria para todas las empresas del país.
Ley 100 de1993	El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten
Resolución 2346 de 2007	Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.
Decreto 1772 1994	Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales
Resolución 0541 1994	Manejo de desechos de la construcción
Norma OHSAS 18001	Propone una jerarquía de medios de control en la que los equipos de protección personal ocupan el quinto puesto
Resolución 4272 de 2021	se define el permiso de trabajo en alturas como un mecanismo administrativo para fomentar la prevención durante los trabajos en alturas
Real Decreto 1627/1997	se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución 1885 de 2015	Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

5.1. COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Actas de Vecindad de Inicio	X		X	
2	Actas de Entorno	X		X	
3	Conformación de Veeduría y Acta de Veeduría (Resolución No. 44 del 14 de Noviembre de 2023)	X		X	
4	Atención a la Comunidad (PQR)	X		X	
5	Capacitación Manejo de cultura vial y participación comunitaria	X		X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 12 de Junio de 2024, El Contratista no presentó ninguna actividad de este componente.

Anexos:





5.1.1. ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNO

ACTA DE ENTORNO	CEDULA	VEREDA
EDILMER LUNA OSORIO	1075538360	SANTA BARBARA
NARCIZO TOVAR CAMACHO	4884490	SANTA BARBARA
FABIO PLAZAS OLIVERO	12103520	SAN ISIDRO
JOSE EDGAR SANCHEZ QUIROGA	4884227	RIO AIPE
SANDRA AVILES ROJAS	55276036	CALLEJON
ANDRES MORENO	83168907	CALLEJON
URIEL CASTILLA SANCHEZ	83169695	CALLEJON
ACTA DE VECINDAD	**CEDULA**	**VEREDA**
ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38196879	SANTA BARBARA
JESUS ANTONIO HORTA REINOSO	83169705	SANTA BARBARA
CRISTIAN JAVIER ANDRADE CUBILLOS	1075543519	SAN ISIDRO

5.2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	ACTIVIDADES	PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1	Inducción	X		X	
2	Afiliaciones	X		X	
3	Elementos de Protección Personal (E.P.P)	X		X	
4	Capacitaciones	X		X	
5	Charlas Pre Operacionales	X		X	
6	Orden aseo y limpieza	X		X	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Durante este periodo correspondiente del 01 al 12 de Junio de 2024, El Contratista presento las siguientes Actividades:

1. Inducción del personal
2. Exámenes de Ingreso Ocupacionales.
3. Reposición de E.P.P
4. Pausas Activas
5. Capacitaciones
6. Charlas Preoperacionales
7. Permisos de trabajo.


ANEXOS





DESCRIPCIÓN: Inducción de Personal. Se realizó inducciones al personal de la obra con el fin de que el trabajador se adapte lo más rápidamente posible a su nuevo entorno laboral.

DESCRIPCIÓN: Exámenes médicos ocupacionales. Para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación

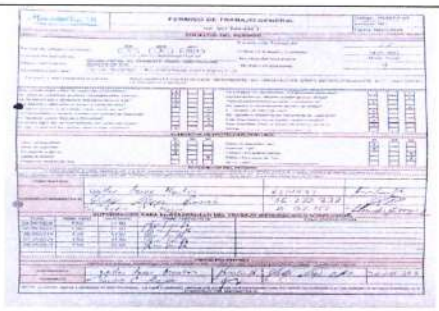 	
DESCRIPCIÓN: El contratista le realiza Reposición de E.P.P a los trabajadores para protegerlos de posibles lesiones, enfermedades o accidentes en el entorno laboral.	**DESCRIPCIÓN:** El contratista Realiza Pausas Activas y calistenia ya que nos ayuda a eliminar la rigidez muscular del reposo y Evita lesiones osteomusculares.
	
DESCRIPCIÓN: El contratista Realiza Charlas Pre-Operacionales antes de iniciar las labores y capacita al personal de la obra. Ya que son componentes esenciales que protege a los empleados de lesiones y accidentes.	**Descripción:** Permisos de trabajo ya que nos permite verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.

5.3. ANEXOS CHARLAS PRE-OPERACIONALES

CHARLAS DIARIAS DE 15 MINUTOS - PERIODO 1 AL 11 DE JUNIO 2024		
No	**TEMA**	**FECHA**
1	Conciencia Ambiental	1/06/2024
2	Uso adecuado de los E.PP	3/06/2024
3	Caídas a un mismo nivel	4/06/2024
4	Capacitación Higiene postural – Golpe de Calor	5/06/2024
5	Protección de brazos y manos	6/06/2024
6	Herramientas Manuales	7/06/2024
7	Programa de Vigilancia Epidemiológica	8/06/2024
8	Manejo manual de cargas	10/06/2024
9	Políticas de SG- SSL de la Empresa	11/06/2024
CAPACITACIÓN		
Higiene Postural - golpe de calor		05/06/2024

5.4. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



ACTIVIDADES:					
DESCRIPCIÓN		PRESENTA	NO PRESENTA	APLICA	NO APLICA
1.1	SPO01 – Trabajos en la vía	x		x	
1.2	SPO02 – Maquinaria en la vía		x	x	
1.3	SPO03 – Banderero		x	x	
1.4	SRO01 - Vía cerrada		x	x	
1.5	SRO02 – Desvío		x	x	
1.6	SRO03 – Paso uno a uno		x	x	
1.7	SIO01 – Aproximación a obra en la vía	x		x	
1.8	SIO02 – Información de inicio de obra	x		x	
1.9	SIO03 – Información de fin de obra		x	x	
1.10	SIO04 – Carril cerrado	x		x	
1.11	Barricadas con señalizador vial tubular	x		x	
1.12	Barreras plásticas flexibles (maletines)	x		x	
1,13	Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche		x	x	
1,14	Auxiliar de tránsito	x		x	
1,15	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	x		x	
1,16	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Casco de seguridad	x		x	
1,17	Indumentaria del auxiliar de tránsito: Chaleco Reflectivo	x		x	

Observaciones: La Interventoría le solicita al contratista Implementar el siguiente elemento del plan de Manejo de Trafico.

- SPO02 – Maquinaria en la vía
- SPO03 – Banderero
- SRO01 - Vía cerrada
- SRO02 – Desvío
- SRO03 – Paso uno a uno
- SIO03 – Información de fin de obra.
- Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche

Registro Fotográfico

			
SPO01 – Trabajos en la vía	SIO01 –Aproximación a obra en la vía	SIO02 – Información de inicio de obra	SIO02 –Información de inicio de obra
			
SIO04 – Carril cerrado	Barricadas con señalizador vial tubular	Barreras plásticas flexibles (maletines)	1.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco
			
Indumentaria del auxiliar de tránsito: Paletas pare – siga	2.Auxiliar de tránsito con su paleta de Siga, casco de seguridad y chaleco.	Conos	Maletines con cinta de seguridad Peligro.

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

6. PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL DE LA OBRA			
	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
1	ANGELICA MARIA ALVIRA RAMIREZ	36.069.417	DIRECTOR DE OBRA
2	CLAUDIO CESAR MEJÍA	12.138.187	RESIDENTE DE OBRA
3	ALEJANDRO AVILA RESTREPO	94.393.644	INSPECTOR DE OBRA
4	YUDY MAGNOLIA MAJE PEÑA	36.288.338	PROFESIONAL SISOMA
5	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	38.196.879	AUXILIAR ADMNISTRATIVO
6	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006	AUXILIAR
7	YENNY SAMANDA RAMIREZ BOTERO	1.075.266.993	AUXILIAR
8	ANDRES FELIPE TAVERA SANCHEZ	1.075.544.289	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
9	DEIVER RIVERA CARDOZO	83.169.787	CADENERO
10	MILLER TOVAR MONTES	4.884.422	TOPOGRAFO
11	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.818.343	VIGILANTE
12	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794	CONTROLADORAS DE TRAFICO
13	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484	CONTROLADORAS DE TRAFICO

7. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

ITEMS	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGOS
1	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	1.075.227.937	DIRECTOR DE OBRA
2	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	1.075.246.303	RESIDENTE DE OBRA
3	GONSALEZ SALAS YESICA	1.075.239.208	INSPECTOR DE OBRA Y SISO
4	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	4.377.250	TOPOGRAFO
5	JUAN SEBASTIAN MALLUNGO REINOSO	1.003.828.965	CADENERO

8. CONCLUSIONES

En el proceso de implementación del Contrato de Interventoría 1492 de 2023, de Obra No. 1478 del 2023 la Interventoría concluye lo siguiente:

1.1. Componente Social. El Contratista y su equipo de trabajo han mantenido buenas relaciones con las personas de la comunidad y transeúntes. En este periodo no hubo PQR.

1.2. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo. No se registraron accidentes durante el proceso de construcción, se realizaron entregas de los Elementos de Protección Personal y la Interventoría verifico su utilización por parte de los trabajadores.

2. Plan de Manejo de Tránsito.
La señalización utilizada en el proceso de construcción de la obra está de acuerdo con la planteada por el Contratista en el Documento PMT. A excepción de la Señalización de SPO02 – Maquinaria en la vía, SPO03 – Banderero, SRO01 - Vía cerrada SRO02 – Desvío, SRO03 – Paso uno a uno, SIO03 – Información de fin de obra, Dispositivos luminosos (reflectores)/para la realización de labores en la noche, no se evidencia en la obra ya que es necesaria para evitar los accidentes laborales y de transito.

Atentamente:

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023

9. EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES

Salud Vital IPS

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA: 2024-05-31 HORA: 14:29

DATOS DEL TRABAJADOR

PACIENTE: FARYD ALDANA FISO
EDAD: 54 Años ID: CC 7684878
FECHA DE NACIMIENTO: 1969-10-27 SEXO: M
TEL. 3172236653 TIPO DE SANGRE: O+
DIRECCION: ASENTAMIENTO VILLA COLOMBIA LOTE 4457 NEIVA (HUILA)
CARGO:
EPS: NUEVA EPS
EMPRESA USUARIO: CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
CONVENIO: CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ



TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

[ ] TRABAJO EN ALTURAS [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS [ ] TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS [ ] CONDUCTORES
[x] ENFASIS OSTEOMUSCULAR OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: CON LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
CONCEPTO DE EGRESO: -
CONCEPTO PERIODICO: -
CONCEPTO REINTEGRO: -
CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -
MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (Aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXAMENES REALIZADOS

[x] AUDIOMETRIA	[ ] ELECTROCARDIOGRAMA	[x] OPTOMETRIA	ESPIROMETRIA
[ ] PSICOTECNICO	[x] EXAMEN OSTEOMUSCULAR	[ ] VISIOMETRIA	
[ ] OXIMETRIA DE PULSO	[ ] PRUEBA PSICOLOGICA	[ ] PRUEBA PSICOSENSOMETRICA	
[ ] RX COLUMNA CERVICAL	[ ] RX COLUMNA DORSAL	[ ] RX COLUMNA DORSOLUMBAR	
[ ] RX COLUMNA TOTAL	[ ] RX TORAX AP Y LATERAL	[ ] RX COLUMNA LUMBOSACRA	
[x] E. LABORATORIO EN SANGRE			

3.18.149.253/plataforma_transaccional_salud_vital/index.php/Verificacion/Imprimir_historia_clinica/MDAwMDAwMDAwMDAwMDQ1MzY2MzUzOQ%... 1/4

1/6/24, 12:14 p.m. 3.18.149.253/plataforma_transaccional_salud_vital/index.php?verificacion=mpnmr_historia_clinica/MDAwMDAwMDAwMDAwMD...

CONTROL CON SOPORTES DE VALORACIONES EN EPS POR ESPECIALISTAS PARA DETEMINAR LA CONTINUIDAD O MODIFICACION EN RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES LABORALES.

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD no aplican énfasis para: *trabajo en Alturas, Manipular Alimentos, Espacios Confinados, conducción trabajos especiales, brigadista, parte de armas, exposición a sustancias quimicas.*

CONDICIONES:

RESTRICCIONES: NO LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS SUPERIOR A 7 KG, NO ACTIVIDADES EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS.

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA Y EN ESTA HISTORIA CLINICA CONSIGNADA, ES VERAZ Y PUEDE SER VERIFICADA, QUE HE RECIBIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MEDICO Y QUE NO HE OCULTADO NINGUNA PATOLOGIA.

JESSICA MEDINA DIAZ
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
R.M. 86257

PACIENTE: FARYD ALDANA PEÑO
ID. CC 7684878

1/6/24 1:02 p.m. 3.16.149.253/plataforma_transaccional_salud_vital/index.php/verificacion/imprimir_historia_clinica/MDAwMDAwMDAwMDAwMD...

Salud Vital IPS

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA: 2024-05-31 HORA: 15:19

DATOS DEL TRABAJADOR



PACIENTE: LUIS ALEJANDRO ALDANA PIZO
FECHA DE NACIMIENTO: 1972-12-02 SEXO: M
DIRECCION: CALLE 81 A N 5-45 NEIVA (HUILA)

EDAD: 51 Años ID: CC 7693051
TEL: 3209552922 TIPO DE SANGRE: O-
CARGO: AYUDANTE DE OBRA

EPS: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO
CONVENIO: CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ

EMPRESA USUARIO: CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ

TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

- [ ] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS
- [ ] CONDUCTORES
- [x] ENFASIS OSTEOMUSCULAR

OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

CONCEPTO DE EGRESO: -
CONCEPTO PERIÓDICO: -
CONCEPTO REINTEGRO: -
CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -

MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXAMENES REALIZADOS

- [x] AUDIOMETRIA
- [ ] ELECTROCARDIOGRAMA
- [x] OPTOMETRIA
- [ ] ESPIROMETRIA
- [ ] PSICOTECNICO
- [x] EXAMEN OSTEOMUSCULAR
- [ ] VISIOMETRIA
- [ ] OXIMETRIA DE PULSO
- [ ] PRUEBA PSICOLOGICA
- [ ] PRUEBA PSICOSENSOMETRICA
- [ ] RX COLUMNA CERVICAL
- [ ] RX COLUMNA DORSAL
- [ ] RX COLUMNA DORSOLUMBAR
- [ ] RX COLUMNA TOTAL
- [ ] RX TORAX AP Y LATERAL
- [ ] RX COLUMNA LUMBOSACRA
- [x] E LABORATORIO EN SANGRE

3.16.149.253/plataforma_transaccional_salud_vital/index.php/verificacion/imprimir_historia_clinica/MDAwMDAwMDAwMDAwMDQ1MzY5ODIwMg%3... 1/4

CONDUCTA

• Conducta de manejo medico:	• Conducta medica laboral:	• Cond. sobre habitos y est. de vida saludables:
☐ a. Continuar manejo medico ☐ b. Remision a EPS. ☐ c. Seguimiento por la ARL. ☑ d. Asistir a programas de promocion y prevencion EPS, de acuerdo a la edad ☐ e. Usar medias de compresion antivarices ☐ f. Usar lentes de correccion optica ☐ g. Usar lentes de proteccion optica frente a luces naturales y artificiales **Otros:**	☑ a. Capacitación y verificación en uso adecuado de los elementos de proteccion personal. ☑ b. Autocapacion higiene postural. ☑ c. Pausas activas ☑ d. Ingreso a programa de vigilancia epidemiologica: - VISUAL,AUDITIVO, CARDIOVASCULAR ☐ e. Educacion en manejo de cargas **f. Otros:**	☐ a. Actividad fisica regular minimo 150 minutos semana ☑ b. Alimentacion sana y balanceada ☐ c. Desestimular consumo de ☐ Cigarrillo ☐ Alcohol ☐ Sustan. psicoactivas **d. Otro:**

Remision:

Observaciones: HEMOGRAMA,GLICEMIA, NORMALES ,PERFIL LIPIDICO ALTERADO, AUDIOMETRIA ALTERADA, OPTOMETRIA ALTERADA

RECOMENDACIONES: NO EXCEDER LOS LIMITES PERMITIDOS POR NORMATIVIDAD, PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE MANERA MANUAL.

VALORACION POR CIRUGIA GENERAL EN EPS.

CONTROL CON SOPORTE DE VALORACION EN EPS.

MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS DE MANERA MANUAL.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN EXPOSICION.

PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA.

CONTINUAR CONTROLES EN EPS DE SU PATOLOGIA DE BASE.

AUDIOMETRIA DE CONTROL EN EPS.

USO DE CORRECCION VISUAL CONTINUO.

ALIMENTACION BAJA EN GRASAS.

CONTROL EN EPS POR MEDICINA GENERAL CON SOPORTE DE PERFIL LIPIDICO.

CONTROL CON SOPORTE DE VALORACION EN EPS.

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD no aplican énfasis para: trabajo en Alturas, Manipular Alimentos, Espacios Confinados, conduccion,trabajos especiales, brigadista, porte de armas, exposicion a sustancias quimicas.

CONDICIONES:

RESTRICCIONES:

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

10. INDUCCION DEL PERSONAL

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SGSST-FOR-02
		Version:001
	Formato de induccion al personal	Fecha:10 -01-2023
	INGENIERIA CIVIL - CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	Paginas:1-1

Nombre: David Tobar M. Fecha: 01-06-2024 Lugar: Oficina P.R.
Cargo: Pastillero Proceso: Induccion Hora: 9:20 AM.

PARAMETRO	SI	NO
Objetivo de la inducción	X	
Politica de seguridad y salud en el trabajo	X	
Politica de alcohol, tabaquismo, drogas y armas	X	
Funciones del COPASST	X	
Definición de Accidente de Trabajo	X	
Definicion de Enfermedad Laboral	X	
Factores de riego asociados al cargo	X	
Uso, cuidado, inspección y mantenimiento de los EPP	X	
Programas de seguridad y salud en el trabajo	X	
Definición de seguridad y salud en el trabajo	X	
Plan de emergencias (alarma , punto de encuentro)	X	

David Tobar M.
FIRMA QUIEN RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE PROFESIONAL SISOMA

FIRMA DEL PROFESIONAL SISOMA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: [illegible]
Acta de responsabilidades frente al SGSST	Versión:001 Fecha: 10 -01-2023
INGENIERIA CIVIL - CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	Paginas: 1-1

RESPONSABILIDADAD DEL CARGO FRENTE AL SGSST

Decreto 1072 2015 Articulo 10. Responsabilidades de los colaboradores. Los colaboradores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:


1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST."

La participación de los colaboradores en el SG-SST es un elemento importante, porque al trabajar mancomunadamente con el empleador pueden detectar riesgos laborales, identificar mejor los problemas y sus causas así como encontrar soluciones eficaces.

Fraid Tobar M.
FIRMA COLABORADOR C.C
CARGO Rastrillero.
7686366 N.

PROFESIONAL SISOMA

1

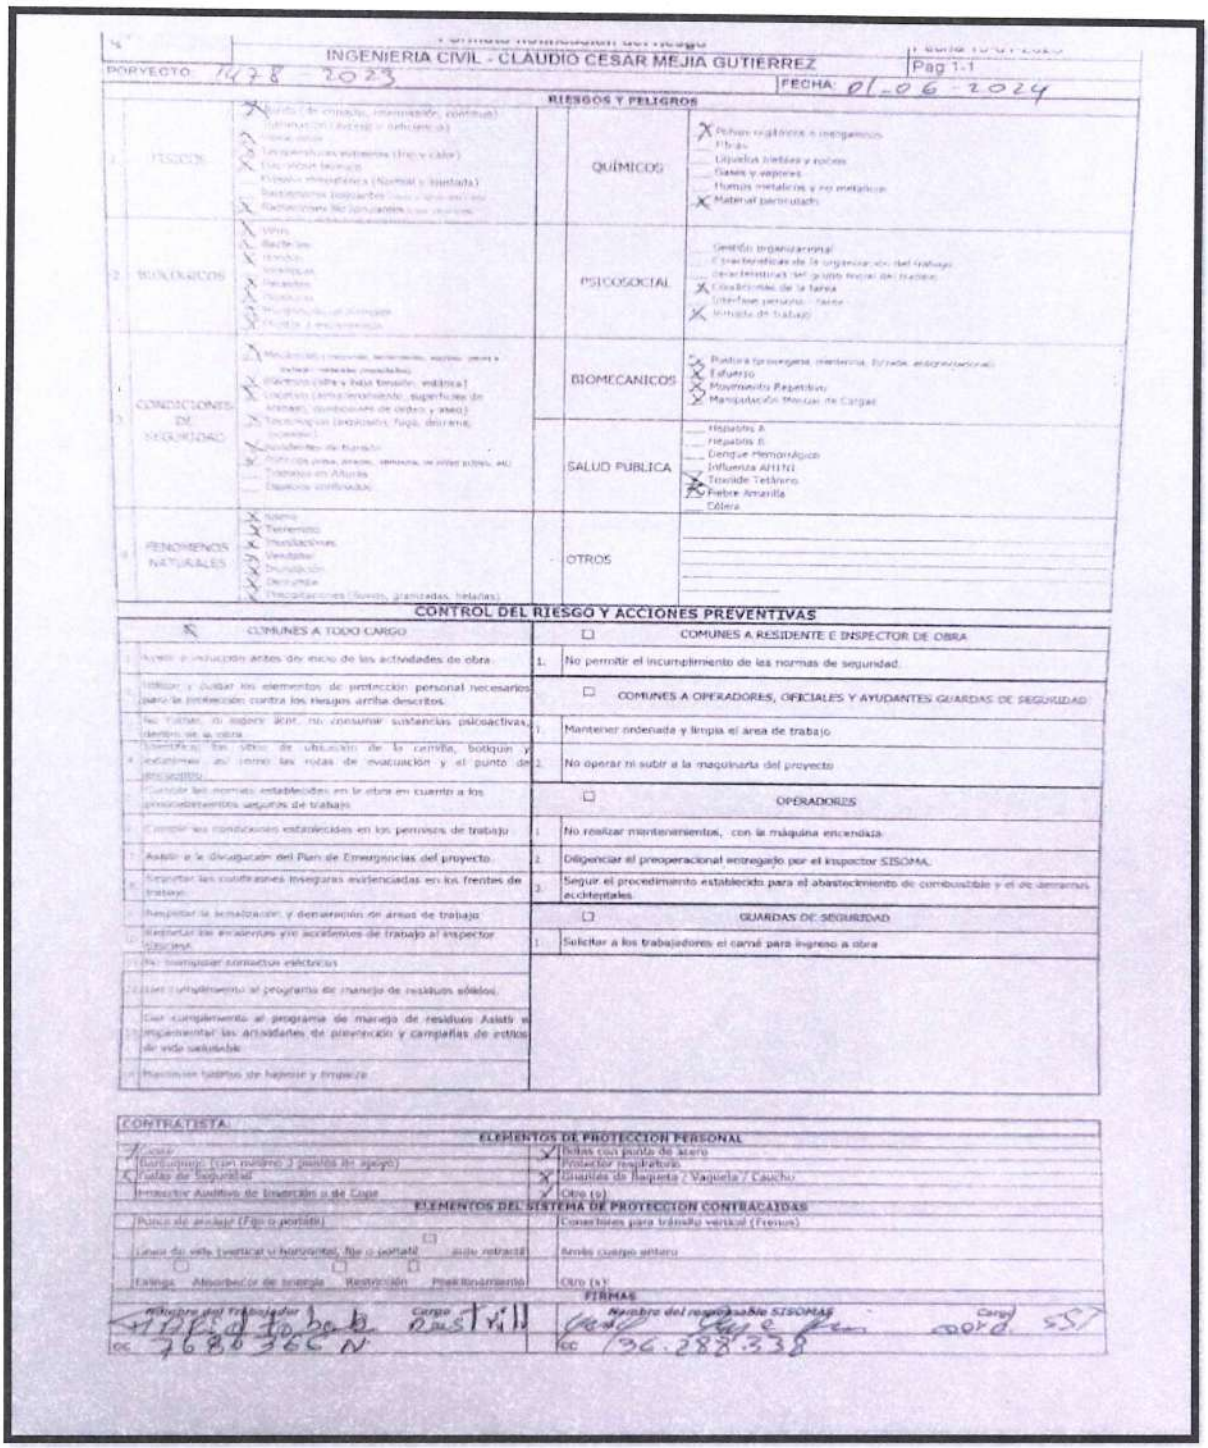

INGENIERIA CIVIL - CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ

PROYECTO: 1428 2023 — Pag 1-1

FECHA: 01-06-2024

RIESGOS Y PELIGROS

1	FISICOS	QUÍMICOS	Polvos orgánicos e inorgánicos Fibras Líquidos (nieblas y rocíos) Gases y vapores Humos metálicos y no metálicos Material particulado
2	BIOLÓGICOS	PSICOSOCIAL	Gestión organizacional Características de la organización del trabajo Características del grupo social del trabajo Condiciones de la tarea Interfase persona - tarea Jornada de trabajo
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD	BIOMECANICOS	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional) Esfuerzo Movimiento Repetitivo Manipulación Manual de Cargas
		SALUD PUBLICA	Hepatitis A Hepatitis B Dengue Hemorrágico Influenza A(H1N1) Tiroide Tetánico Fiebre Amarilla Cólera
4	FENOMENOS NATURALES	OTROS	

CONTROL DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS

	COMUNES A TODO CARGO		COMUNES A RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA
1	Asistir a inducción antes del inicio de las actividades de obra	1.	No permitir el incumplimiento de las normas de seguridad.
2	Utilizar y cuidar los elementos de protección personal necesarios para la protección contra los riesgos arriba descritos		COMUNES A OPERADORES, OFICIALES Y AYUDANTES GUARDAS DE SEGURIDAD
3	No fumar, ni ingerir licor, no consumir sustancias psicoactivas dentro de la obra	1.	Mantener ordenada y limpia el área de trabajo
4	Identificar los sitios de ubicación de la camilla, botiquín y extintores así como las rutas de evacuación y el punto de encuentro	2.	No operar ni subir a la maquinaria del proyecto
5	Cumplir las normas establecidas en la obra en cuanto a los procedimientos seguros de trabajo		OPERADORES
6	Cumplir las condiciones establecidas en los permisos de trabajo	1.	No realizar mantenimientos, con la máquina encendida
7	Asistir a la divulgación del Plan de Emergencias del proyecto	2.	Diligenciar el preoperacional entregado por el inspector SISOMA.
8	Reportar las condiciones inseguras evidenciadas en los frentes de trabajo	3.	Seguir el procedimiento establecido para el abastecimiento de combustible y el de demandas accidentales
9	Respetar la señalización y demarcación de áreas de trabajo		GUARDAS DE SEGURIDAD
10	Reportar los incidentes y/o accidentes de trabajo al inspector SISOMA	1.	Solicitar a los trabajadores el carné para ingreso a obra
11	No manipular conexiones eléctricas		
12	Dar cumplimiento al programa de manejo de residuos sólidos		
13	Dar cumplimiento al programa de manejo de residuos Asistir e implementar las actividades de prevención y campañas de estilos de vida saludable		
14	Mantener hábitos de higiene y limpieza		

CONTRATISTA:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco	Botas con punta de acero
Gafas oscuras (con montura 2 puntos de apoyo)	Protector respiratorio
Cuello de Seguridad	Guantes de Badana / Vaqueta / Caucho
Protector Auditivo de Inserción o de Copa	Otro (s)

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRACAIDAS

Punto de anclaje (Fijo o portátil)	Conectores para trabajo vertical (Frenos)
Línea de vida (vertical o horizontal, fija o portátil / auto retractil)	Arnés cuerpo entero
Eslinga / Absorbedor de energía / Restricción / Posicionamiento	Otro (s)

FIRMAS

Nombre del Trabajador	Cargo	Nombre del responsable SISOMA	Cargo
CC 7680366 N	Obrs	CC 36.288.338	SST

10/10

01-06-2024 Nombre completo [illegible] cedula 76836[illegible]

Seguidamente encontrara sus conocimientos con respecto a los principales conceptos del Sistema de Gestión Integral de ING. CIVIL CLAUDIO MEJIA

1. Cuales son las políticas de Ing. Civil Claudio Mejia:

a) Política de seguridad y salud en el trabajo
b) Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas ✓
c) Política de seguridad vial
d) Política de Buen Trato
e) Todas las anteriores ✓

2. Que significan las siglas SSL

a) Seguridad y Salud Laboral ✓
b) Seguridad industrial e higiene
c) Salud ocupacional

3. Cuales son las brigadas de emergencia que se tiene establecida para el contrato:

a) Brigada contra incendios
b) Brigada de evacuación
c) Brigada de primeros auxilios ✓
d) Brigada Ambiental
e) Todas las anteriores

4. Esta definición corresponde a la misión de Ing. Civil Claudio Mejia: Presta sus servicios de ingeniería civil con estándares y especificaciones innovadoras, para suplir las necesidades de soluciones técnicas y de desarrollo productivo en el sector constructor, contando con profesionales que de forma integral aseguran la calidad y satisfacción en la ejecución de sus trabajos y relaciones interpersonales.

Falso ( ) Verdadero (X) ✓

5. Una con una línea cada opción correspondiente al significado de las siglas:

a) EPS — Paga incapacidades, invalidez del trabajador cuando ha ocurrido un accidente de trabajo
b) ARL — Entidad prestadora de servicios de salud, que atiende al empleado en caso de enfermedad general ✓

6. Una con una línea cada uno de los residuos sólidos a cada código de colores, según la directriz que empleo Ing. Civil Claudio Mejia:

a) BLANCO — PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, PAPEL Y CARTONES CONTAMINADOS CON COMIDA
b) AZUL — PAPEL, CARTON, VIDRIO, METAL, RESIDUOS APROVECHABLES ✓
c) VERDE — RESTO DE COMIDA – DESECHOS AGRICOLAS

7. En caso de un incidente o accidente de trabajo se debe reportar de forma inmediata al profesional SSL, inspector de obra y/o al ingeniero residente. Escriba falso o verdadero.

Falso ( ) Verdadero (X) ✓

8. Marque con una X que elementos de protección personal debe utilizar para la función que va a desempeñar:

Peto	Guantes X	Gafas X
Arnés	Casco X	Botas X
Protector auditivo X	Polainas	Protector respiratorio X

✓

9. Marque con una X la respuesta correcta, para levantar una carga cual es la posición:

a) Doblar las rodillas, alzar la carga ✓
b) Inclinar el cuerpo hacia adelante, alzar la carga
X c) Colocar los pies firmes, tener la espalda recta, doblar rodillas, alzar la carga ✓

10. La empresa Administradora de Riesgos Labores a la que pertenece usted como trabajador es la ARL SURA


Falso ( ) Verdadero (X) ✓

Una vez realizada esta evaluación usted ha APROBADO X REPROBADO ____

[illegible]
FIRMA EVALUADO

[illegible] cod. 557
FIRMA EVALUADOR - CARGO

11. REGISTRO ASISTENCIA A CHARLA DE SEGURIDAD

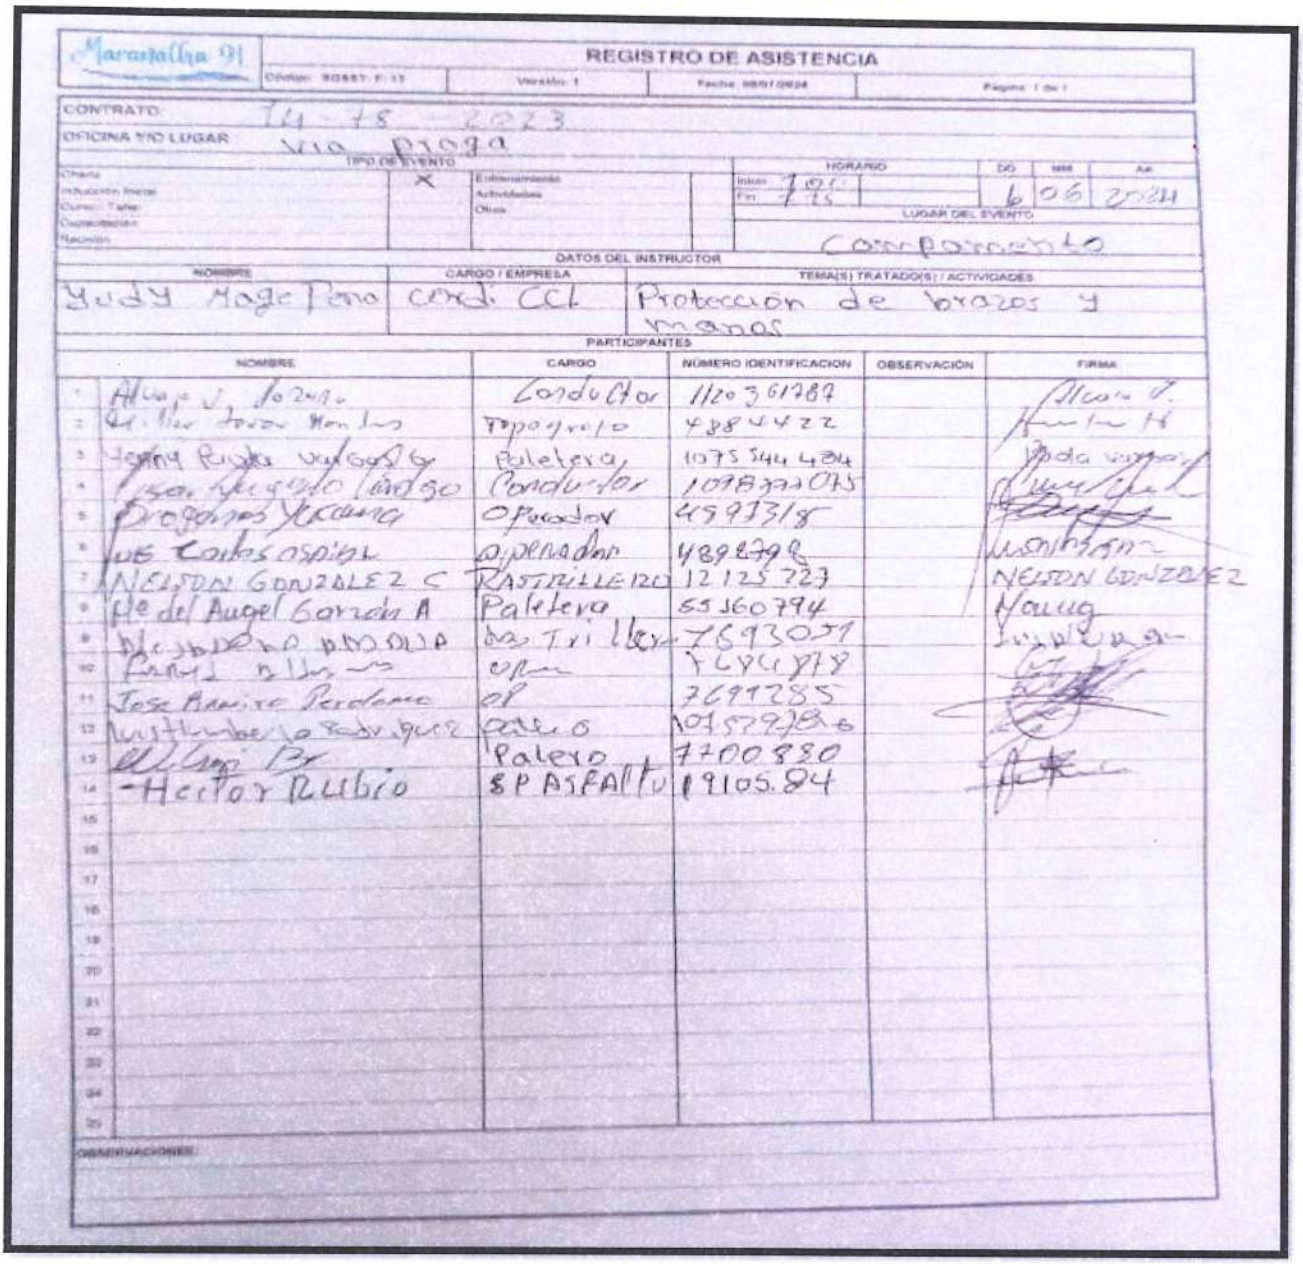

Maratalla 91 — REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST- F- 13 | Versión: 1 | Fecha: 08/01/2024 | Página: 1 de 1

CONTRATO: IA-15-2023

OFICINA Y/O LUGAR: Vía Prado

TIPO DE EVENTO: Charla (X) | Entrenamiento | Inducción Inicial | Actividades | Curso/ Taller | Otros | Capacitación | Reunión

HORARIO: Inicio 7:01 | Fin 7:15 | DD 6 | MM 06 | AA 2024

LUGAR DEL EVENTO: Campamento


DATOS DEL INSTRUCTOR

NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Yudy Magdalena	Coord. CCL	Protección de brazos y manos

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Alvaro V. Jozano	Conductor	1120361787		
2	[illegible]	Topografo	7888422		
3	Jenny Paola Vanegas G	Paletera	1075 344 434		
4	Jhon Alejandro Cardozo	Conductor	1098733075		
5	Brayan Yesenia	Operador	4599318		
6	Luis Carlos Ospina	Ayudante	4898798		
7	NELSON GONZALEZ C	CASTRILLERO	12125727		NELSON GONZALEZ
8	Ale del Angel Garcia A	Paletero	55360794		
9	[illegible]	Volquetero	7693077		
10	[illegible]	Operador	7694778		
11	Jose Ramiro Perdomo	Oficial	7699285		
12	[illegible]	Paletero	1015792[illegible]		
13	[illegible]	Paletero	7700830		
14	Hector Rubio	SP ASFALTO	19105.84		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					


OBSERVACIONES:

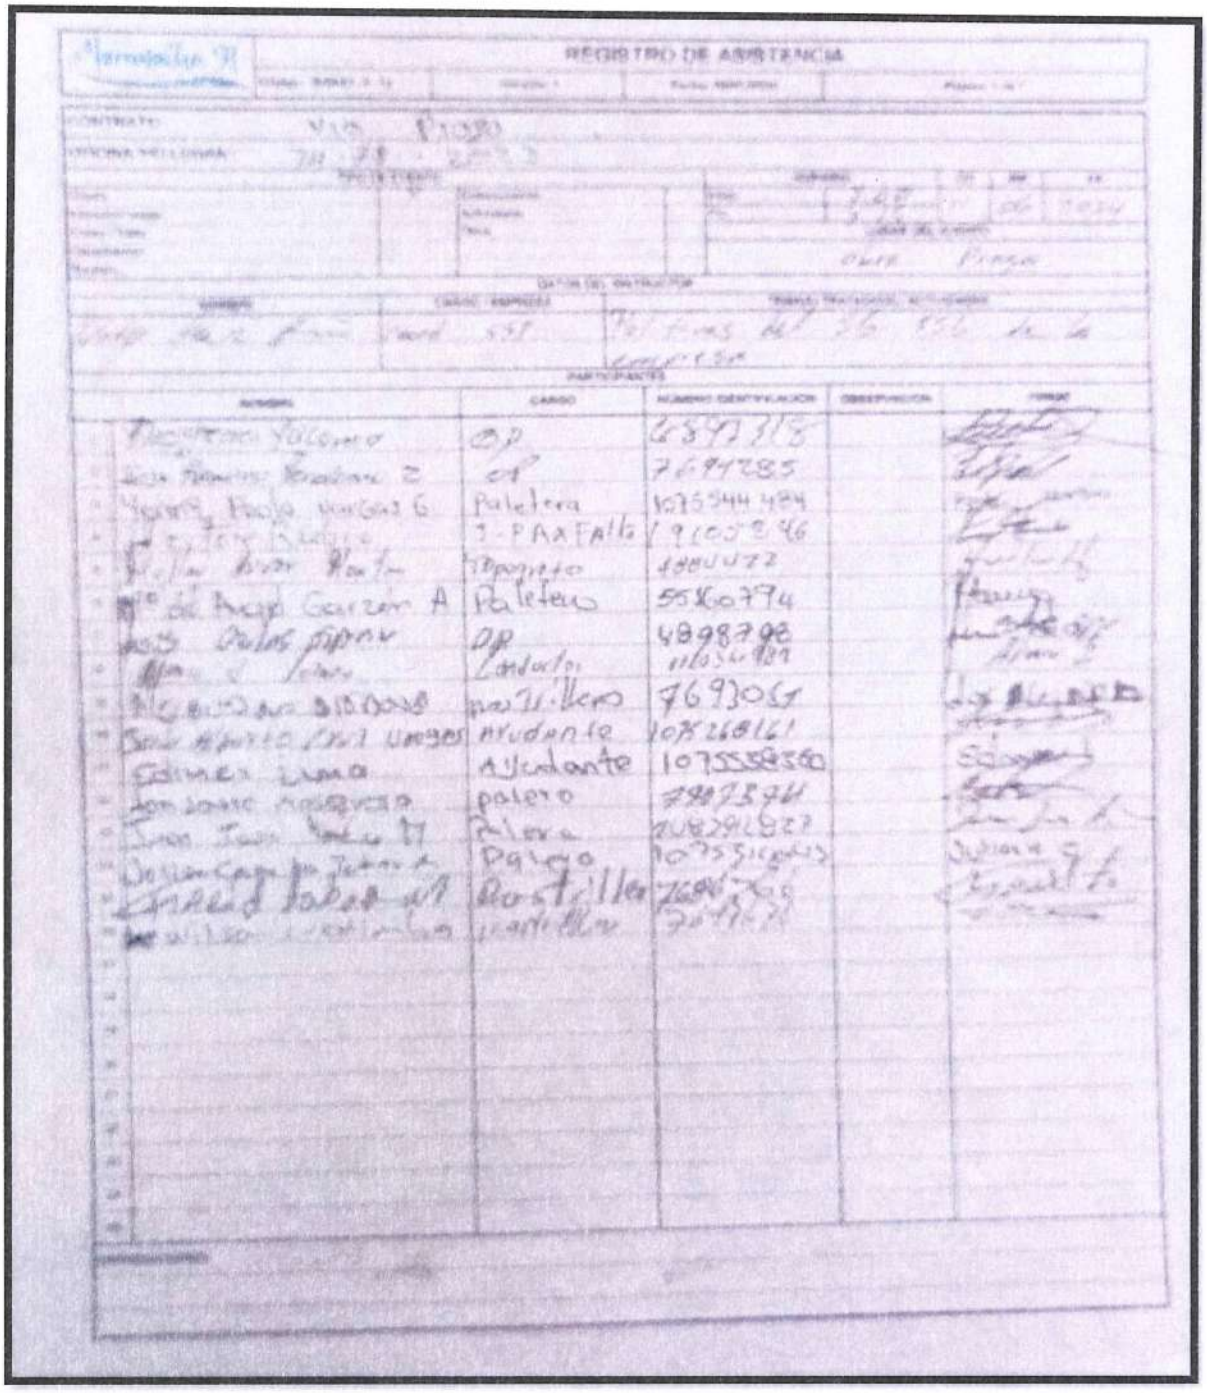

REGISTRO DE ASISTENCIA

		Paletero		
		Paletero		
		Contratista		
		Ayudante		
		Ayudante		
		Paletero		
		Paletero		
		Paletero		
		Rastrillero		

12. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

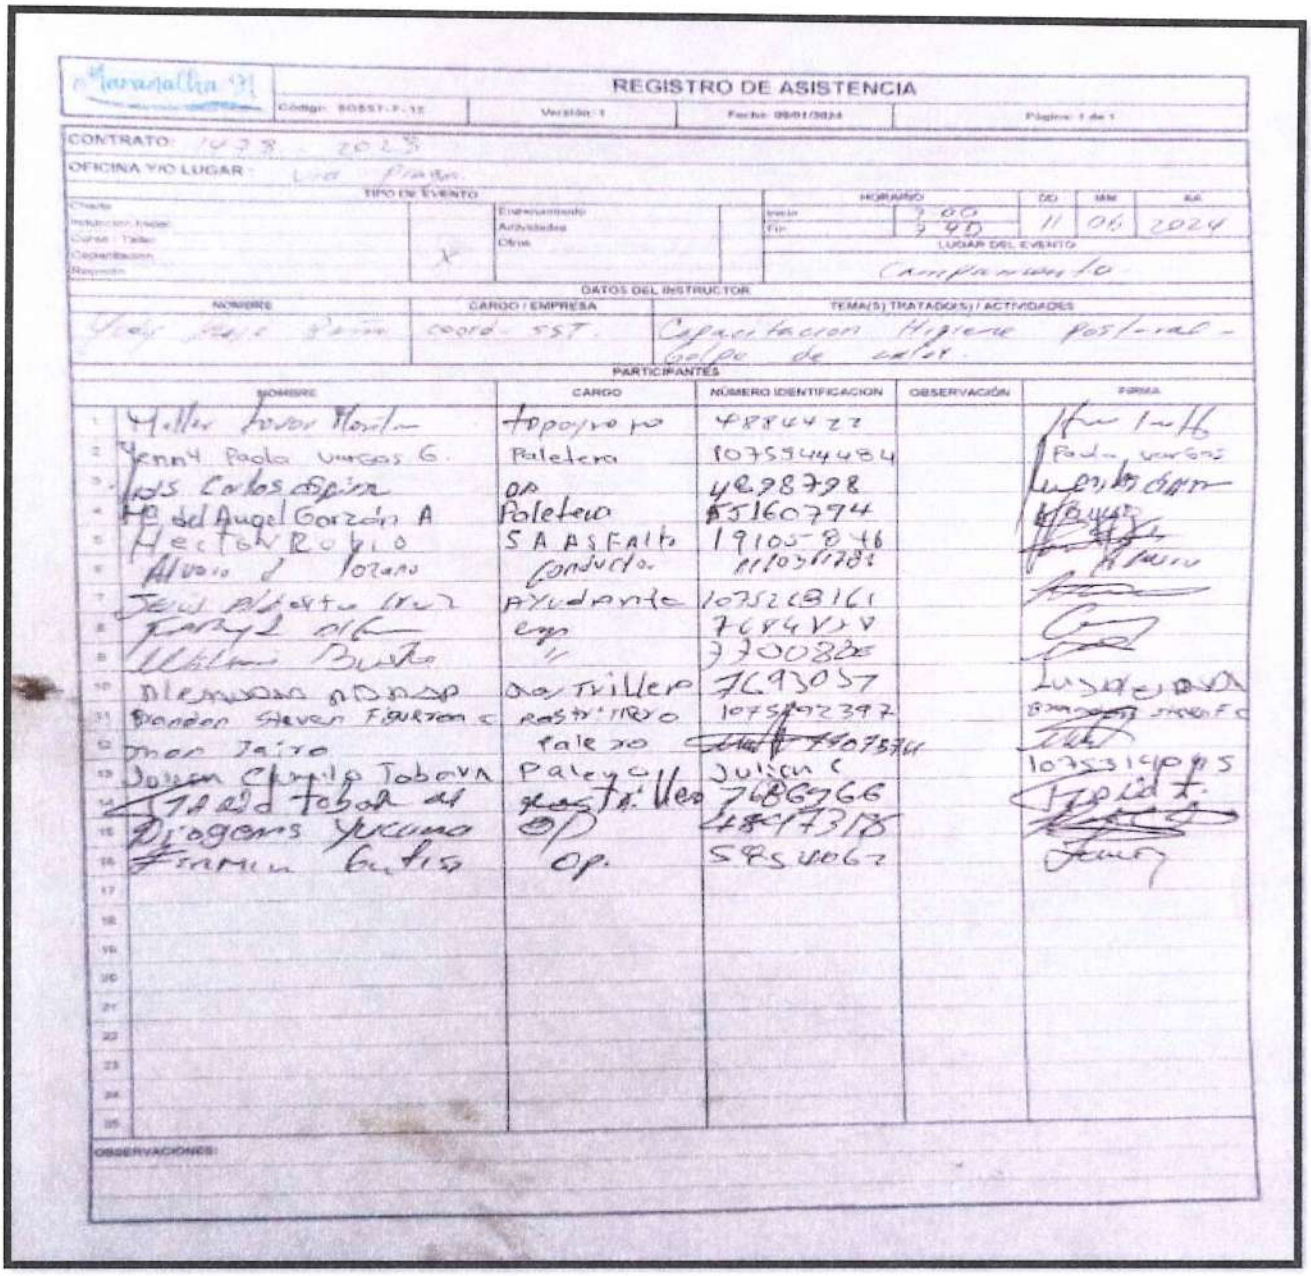

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SGSST-F-12 | Versión: 1 | Fecha: 08/01/2024 | Página: 1 de 1

CONTRATO: 1438 - 2023

OFICINA Y/O LUGAR: La Plata

TIPO DE EVENTO: Charla; Inducción Inicial; Curso - Taller; Capacitación; Reunión: X; Entrenamiento; Actividades; Otros

HORARIO: Inicio 7:00 | Fin 3:00 | DD: 11 | MM: 06 | AA: 2024

LUGAR DEL EVENTO: Campamento

DATOS DEL INSTRUCTOR


NOMBRE	CARGO / EMPRESA	TEMA(S) TRATADO(S) / ACTIVIDADES
Yeny Paola Vargas	coord. SST.	Capacitacion Higiene postural - Golpe de calor.

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	Heiler Javier Mora	topografo	4884477		
2	Yenny Paola Vargas G.	Paletera	1075944484		
3	Luis Carlos Ospina	OP	4298798		
4	Miguel Angel Garzón A	Paletero	85160794		
5	Hector Rubio	SAASFALTO	1910-846		
6	Alvaro J Tolano	conductor	1110511781		
7	Jesus Alberto Cruz	Ayudante	1075268161		
8	Yeny Paola	ing	76845V		
9	Wilmer Bueno	"	7700822		
10	Diego Andres	Ayudante Triller	7693057		
11	Brandon Steven Figueroa C	rastrillero	1075902397		
12	Omar Jairo	Paletero	1075907544		
13	Jairon Camilo Tobaya	Paleyero	Julian C		1075314095
14	Ronald Tobar	rastrillero	7686966		
15	Diogenes Yurama	OP	4847318		
16	Fermin Cortes	op.	5985067		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

13. PERMISO DE TRABAJO Y ANALISIS DE SEGURO EN ALTURA

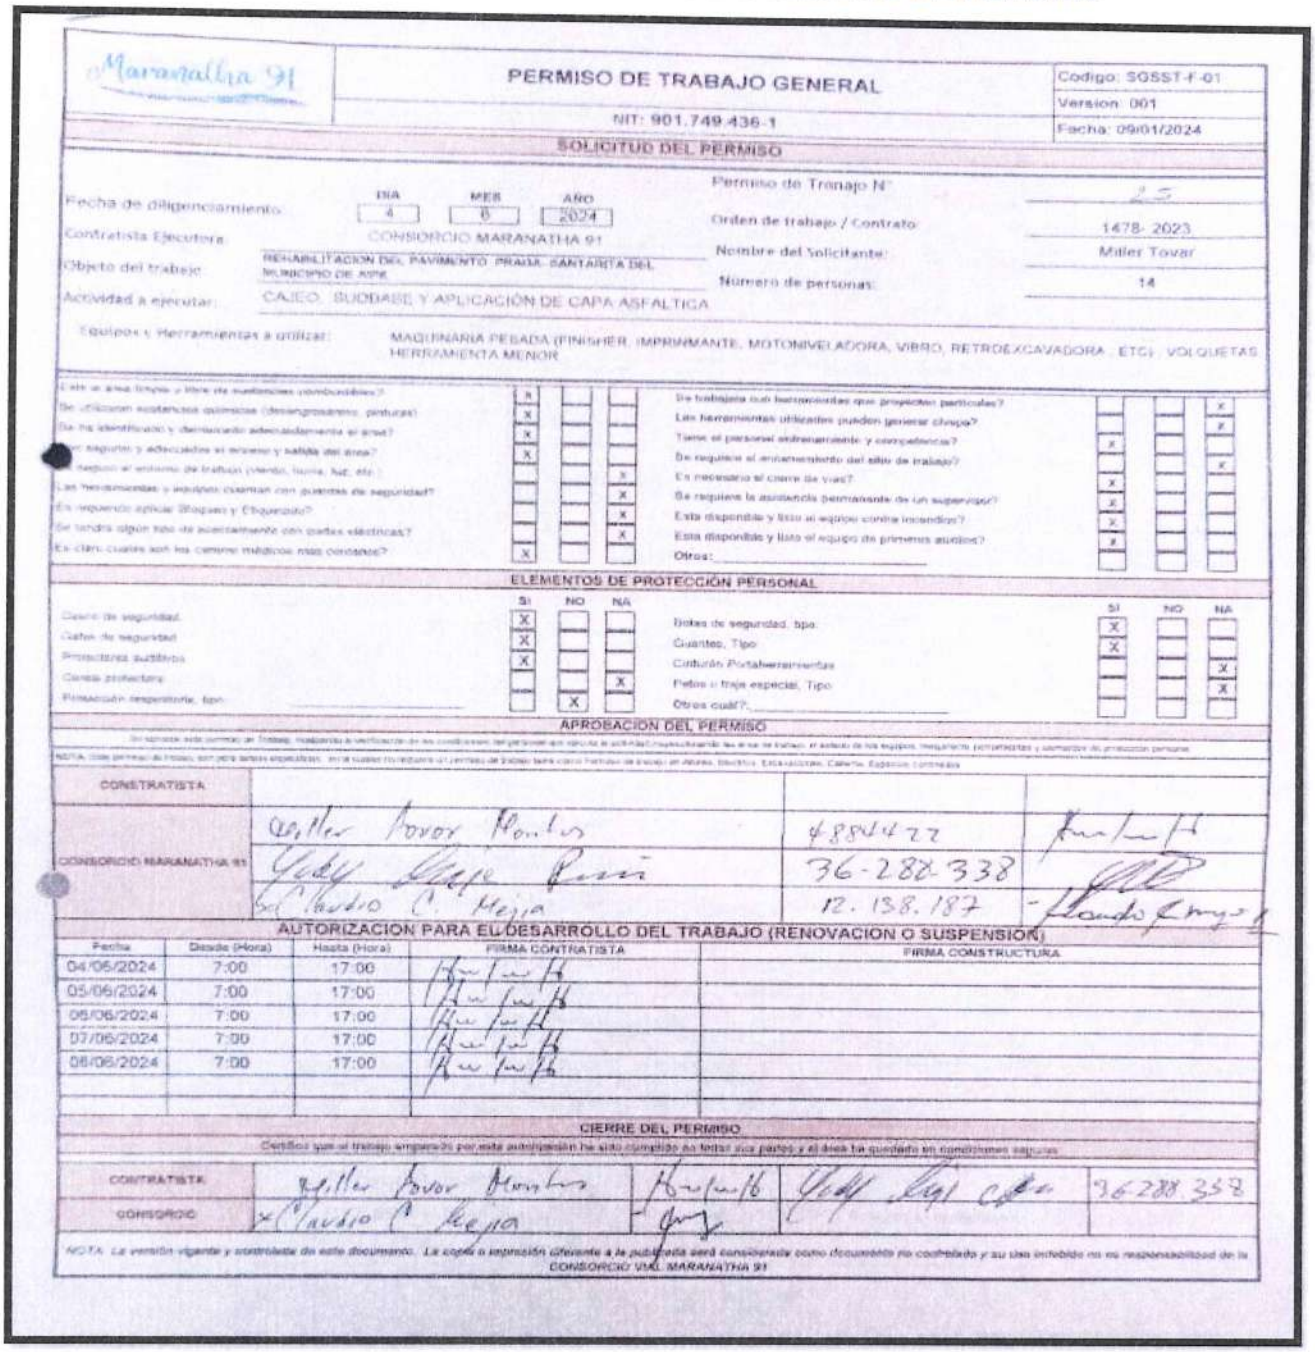

Maranatha 91

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

NIT: 901.749.436-1

Codigo: SGSST-F-01
Version: 001
Fecha: 09/01/2024

SOLICITUD DEL PERMISO

Fecha de diligenciamiento: DIA 4 MES 6 AÑO 2024
Permiso de Trabajo N°: 25
Contratista Ejecutora: CONSORCIO MARANATHA 91
Orden de trabajo / Contrato: 1478- 2023
Objeto del trabajo: REHABILITACION DEL PAVIMENTO PRAIRA- SANTARITA DEL MUNICIPIO DE AIPE
Nombre del Solicitante: Miller Tovar
Actividad a ejecutar: CAJEO, SUDBASE Y APLICACIÓN DE CAPA ASFALTICA
Número de personas: 14
Equipos y Herramientas a utilizar: MAQUINARIA PESADA (FINISHER, IMPRIMANTE, MOTONIVELADORA, VIBRO, RETROEXCAVADORA , ETC) , VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR

Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	N			De trabajara con herramientas que proyecten particulas?			X
Se utilizan sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)	X			Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?			X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area?	X			Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X		
El seguro y adecuados el ingreso y salida del area?	X			Se requiere el entrenamiento del sitio de trabajo?			X
Hay peligros en el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)			X	Es necesario el cierre de vias?	X		
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?			X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X		
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado?			X	Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X		
Se tendra algun tipo de acercamiento con cables eléctricos?			X	Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X		
Es claro cuales son los caminos máximos más cercanos?	X			Otros:			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA		SI	NO	NA
Casco de seguridad	X			Botas de seguridad, tipo	X		
Gafas de seguridad	X			Guantes, Tipo	X		
Protectores auditivos	X			Cinturón Portaherramientas			X
Careta protectora			X	Petos o traje especial, Tipo			X
Respiración respiratoria, tipo:		X		Otros cual?:			

APROBACION DEL PERMISO

Se aprueba este permiso de Trabajo, habiendo la verificación de las condiciones del personal en ejecución de actividades mencionando las áreas de trabajo, el estado de los equipos, maquinaria, herramientas y elementos de protección personal.

NOTA: Este permiso de trabajo, son para tareas especificas, en el cuales no requieren un permiso de ingreso en Alturas, Electrico, Excavaciones, Caliente, Espacios Confinados

CONTRATISTA			
CONSORCIO MARANATHA 91	Miller Tovar Montes	4884477	
	Yudy Lizeth Ramirez	36-288-338	
	Sr Claudio C. Mejia	12. 138. 187	

AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (RENOVACION O SUSPENSION)


Fecha	Desde (Hora)	Hasta (Hora)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA CONSTRUCTURA
04/06/2024	7:00	17:00		
05/06/2024	7:00	17:00		
06/06/2024	7:00	17:00		
07/06/2024	7:00	17:00		
08/06/2024	7:00	17:00		

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo amparado por este autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

CONTRATISTA	Miller Tovar Montes		Yudy Lizeth Ramirez	36288358
CONSORCIO	Sr Claudio C. Mejia			

NOTA: La versión vigente y controlada de este documento. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la CONSORCIO VIAL MARANATHA 91

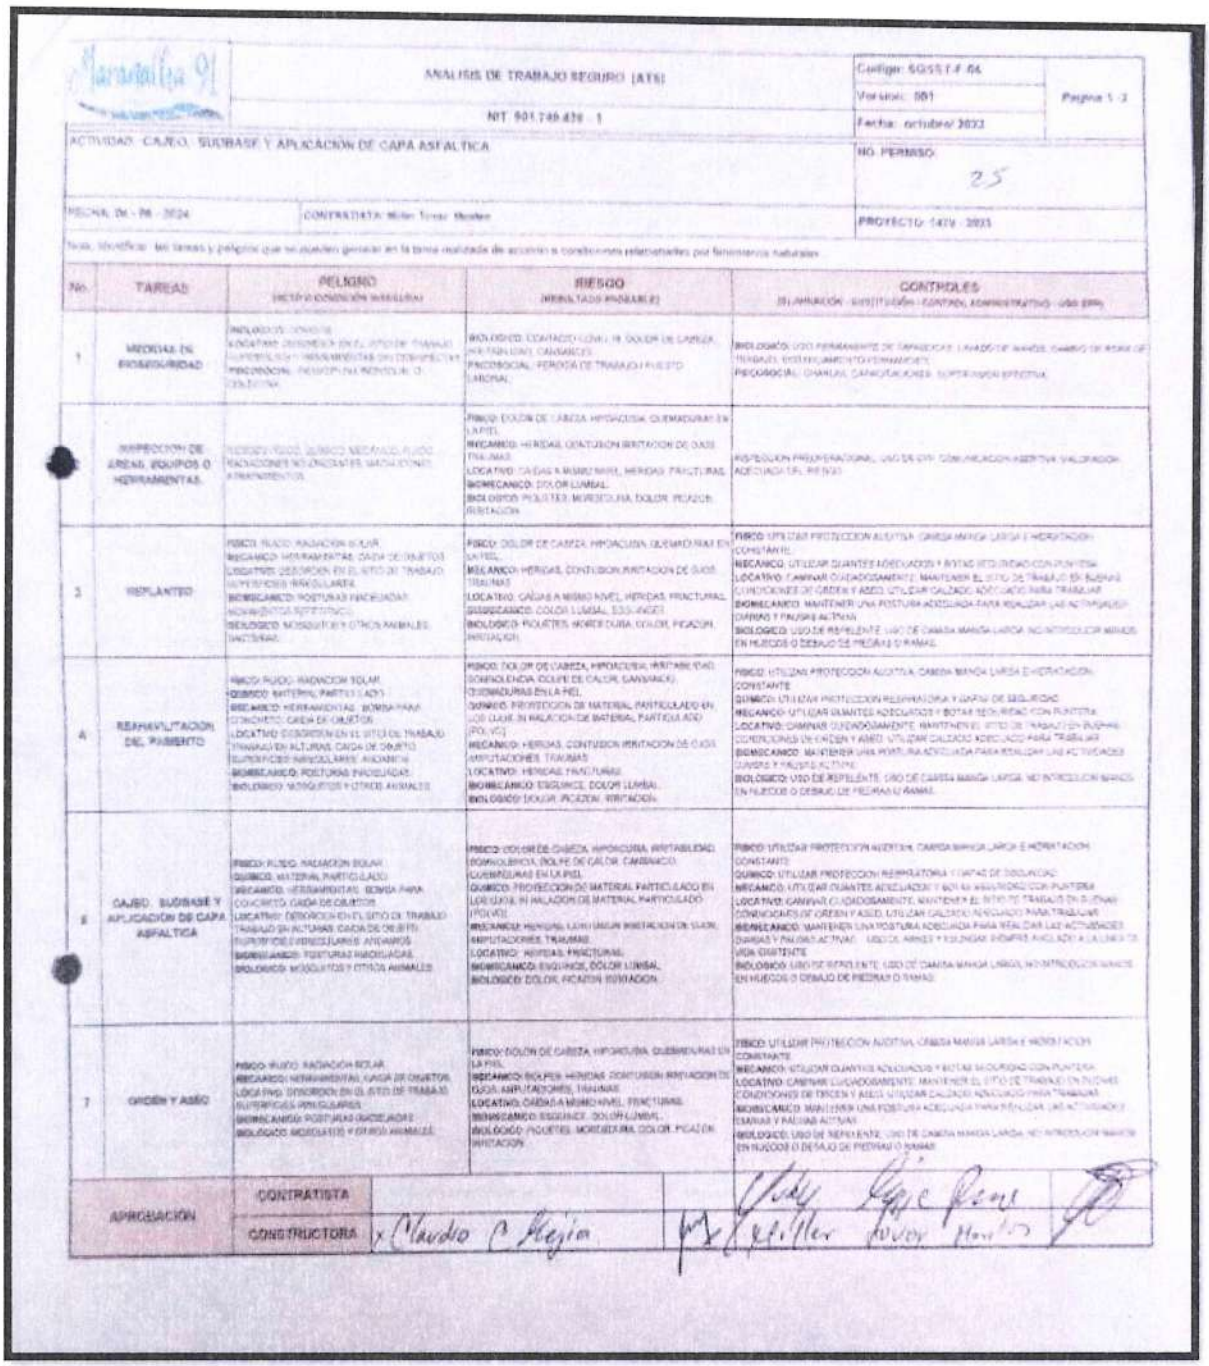

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NIT 901.749.476 - 1

Codigo: SGSST-F-04
Version: 001
Fecha: octubre/ 2023
Pagina 1 - 2

ACTIVIDAD: CAJEO, SUBBASE Y APLICACION DE CAPA ASFALTICA

NO. PERMISO: 25

FECHA: 04 - 06 - 2024

CONTRATISTA: Nolan Tovar Medina

PROYECTO: 1474 - 2023

Tarea, identificar las tareas y peligros que se pueden generar en la obra realizada de acuerdo a condiciones ambientales por fenomenos naturales

No.	TAREAS	PELIGRO (FACTOR CONDICIÓN INSEGURA)	RIESGO (RESULTADOS PROBABLES)	CONTROLES (ELIMINACIÓN - SUSTITUCIÓN - CONTROL ADMINISTRATIVO - USO EPP)
1	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	BIOLOGICO: CONTACTO LOCATIVO: DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO PSICOSOCIAL: PERDIDA DE TRABAJO PUESTO LABORAL	BIOLOGICO: CONTACTO CON LA PIEL DOLOR DE CABEZA, INFECCIONES, CANSANCIO PSICOSOCIAL: PERDIDA DE TRABAJO PUESTO LABORAL	BIOLOGICO: USO PERMANENTE DE CAPACETAS, LAVADO DE MANOS, CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO, DESINFECCION PERMANENTE PSICOSOCIAL: CHARLAS, CAPACITACIONES, SUPERVISION EFECTIVA
2	INSPECCION DE AREAS, EQUIPOS O HERRAMIENTAS.	FISICO: RUIDO, QUIMICO, MECANICO, RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES, VIBRACIONES, ATRAPAMIENTOS	FISICO: DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL MECANICO: HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS LOCATIVO: CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS, BIOMECANICO: DOLOR LUMBAR, BIOLOGICO: PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION	INSPECCION PREOPERACIONAL, USO DE EPP, SEÑALIZACION PREVENTIVA, VALORACION ADECUADA DEL RIESGO
3	REPLANTEO	FISICO: RUIDO, RADIACION SOLAR MECANICO: HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS LOGISTICO: DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES BIOMECANICO: POSTURAS INADECUADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS BIOLOGICO: MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES, BACTERIAS	FISICO: DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL MECANICO: HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, TRAUMAS LOCATIVO: CAIDAS A MISMO NIVEL, HERIDAS, FRACTURAS, BIOMECANICO: DOLOR LUMBAL, ESGUINCE, BIOLOGICO: PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION	FISICO: UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CABEZA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE MECANICO: UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS RESISTENTES CON PUNTERA LOCATIVO: CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR BIOMECANICO: MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS BIOLOGICO: USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS
4	REHABILITACION DEL PAVIMENTO	FISICO: RUIDO, RADIACION SOLAR QUIMICO: MATERIAL PARTICULADO MECANICO: HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS LOCATIVO: DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS BIOMECANICO: POSTURAS INADECUADAS, BIOLOGICO: MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES	FISICO: DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, SARPAZOS, QUEMADURAS EN LA PIEL QUIMICO: PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, IN HALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO) MECANICO: HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS LOCATIVO: HERIDAS, FRACTURAS, BIOMECANICO: ESGUINCE, DOLOR LUMBAL, BIOLOGICO: DOLOR, PICAZON, IRRITACION	FISICO: UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CABEZA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE QUIMICO: UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD MECANICO: UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS RESISTENTES CON PUNTERA LOCATIVO: CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR BIOMECANICO: MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS BIOLOGICO: USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS
5	CAJEO, SUBBASE Y APLICACIÓN DE CAPA ASFALTICA	FISICO: RUIDO, RADIACION SOLAR QUIMICO: MATERIAL PARTICULADO MECANICO: HERRAMIENTAS, BOMBA PARA CONCRETO, CAIDA DE OBJETOS LOCATIVO: DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS, CAIDA DE OBJETO, SUPERFICIES IRREGULARES, ANDAMIOS BIOMECANICO: POSTURAS INADECUADAS, BIOLOGICO: MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES	FISICO: DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, IRRITABILIDAD, SOMNOLENCIA, GOLPE DE CALOR, CANSANCIO, QUEMADURAS EN LA PIEL QUIMICO: PROYECCION DE MATERIAL PARTICULADO EN LOS OJOS, IN HALACION DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO) MECANICO: HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS LOCATIVO: HERIDAS, FRACTURAS, BIOMECANICO: ESGUINCE, DOLOR LUMBAL, BIOLOGICO: DOLOR, PICAZON, IRRITACION	FISICO: UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CABEZA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE QUIMICO: UTILIZAR PROTECCION RESPIRATORIA Y GAFAS DE SEGURIDAD MECANICO: UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS RESISTENTES CON PUNTERA LOCATIVO: CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR BIOMECANICO: MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS, USO DE ARNES Y SOLDADAS SIEMPRE ANCLADO A LA LINEA DE VIDA CONTINUE BIOLOGICO: USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS
7	ORDEN Y ASEO	FISICO: RUIDO, RADIACION SOLAR MECANICO: HERRAMIENTAS, CAIDA DE OBJETOS LOGISTICO: DESORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO, SUPERFICIES IRREGULARES BIOMECANICO: POSTURAS INADECUADAS BIOLOGICO: MOSQUITOS Y OTROS ANIMALES	FISICO: DOLOR DE CABEZA, HIPOACUSIA, QUEMADURAS EN LA PIEL MECANICO: HERIDAS, CONTUSION IRRITACION DE OJOS, AMPUTACIONES, TRAUMAS LOCATIVO: CAIDAS A MISMO NIVEL, FRACTURAS, BIOMECANICO: ESGUINCE, DOLOR LUMBAL, BIOLOGICO: PIQUETES, MORDEDURA, DOLOR, PICAZON, IRRITACION	FISICO: UTILIZAR PROTECCION AUDITIVA, CABEZA MANGA LARGA E HIDRATACION CONSTANTE MECANICO: UTILIZAR GUANTES ADECUADOS Y BOTAS RESISTENTES CON PUNTERA LOCATIVO: CAMINAR CUIDADOSAMENTE, MANTENER EL SITIO DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, UTILIZAR CALZADO ADECUADO PARA TRABAJAR BIOMECANICO: MANTENER UNA POSTURA ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS BIOLOGICO: USO DE REPELENTE, USO DE CAMISA MANGA LARGA, NO INTRODUCIR MANOS EN HUECOS O DEBAJO DE PIEDRAS O RAMAS

APROBACION		
	CONTRATISTA	
	CONSTRUCTORA	x Claudio C Mejia

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

Maravilla 91	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Codigo: SGSST-F-04	Pagina 1 -2
	NIT. 901.748.436 - 1	Version: 001	
		Fecha: octubre/ 2023	


ACTIVIDAD: CAJEO, SUBBASE Y APLICACIÓN DE CAPA ASFALTICA — NO PERMISO: 25

FIRMAS DE QUIENES PARTICIPAN DE LA ACTIVIDAD — Mediante la firma certificamos que conocemos todos los riesgos a los que estamos expuestos al desarrollar la actividad y nos comprometemos a realizar los controles establecidos en el ATS.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	ELIZABETH FERREIRA NARVAEZ	36.190.879					
2	DENVER RIVERA CARDOZO	83.169.787					
3	MILLER TOVAR MONTES	4.884.477					
4	YENY PAOLA VARGAS GUTIERREZ	1.075.544.484					
5	MARIA DEL ANGEL GARZON ALDANA	55.160.794					
6	LUIS CARLOS OSPINA	1.003.951.624					
7	JAIRO RESTREPO ROJAS	7.720.212					
8	ALVARO JAVIER LOZANO GUILOMBO	1.120.361.787					
9	CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.078.777.075					
10	CARLOS EDILSON HIO OSORIO	1.003.618.345					
11	JUAN SEBASTIAN GARCIA VANEGAS	1.075.544.006					
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

La version vigente y controlada de este documento, La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y no del todo fiable no es responsabilidad del CONSORCIO MARAVILLA 91

14. REPOSICIÓN DE EPP

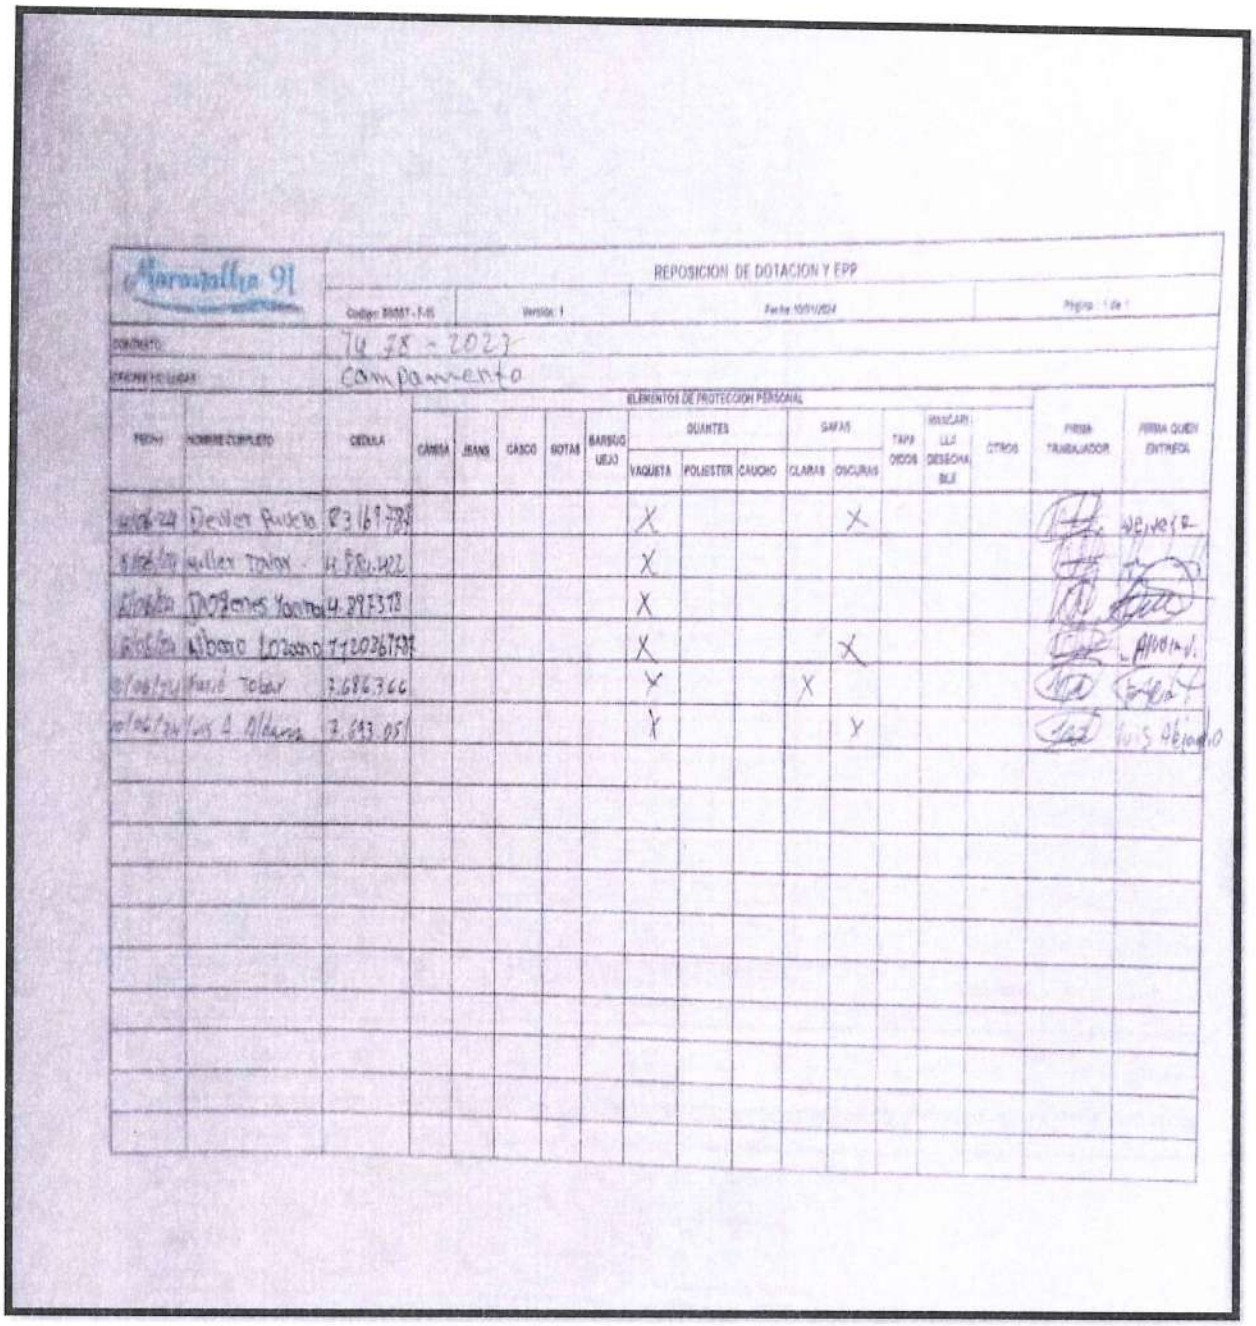

Maravilla 91

REPOSICION DE DOTACION Y EPP

Codigo: [illegible] | Version: 1 | Fecha: 10/01/2024 | Pagina: 1 de 1

CONTRATO: 74 SR - 2023

LUGAR DE LABOR: campamento

FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL													FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			CAMISA	JEANS	CASCO	BOTAS	BARBUQUEJO	GUANTES			GAFAS		TAPA OIDOS	MASCARILLA DESECHABLE	OTROS		
								VAQUETA	POLIESTER	CAUCHO	CLARAS	OSCURAS					
6/06/24	Dexter Rubio	83169788						X				X					
6/06/24	Yuller Tovar	4.891.422						X									
6/06/24	[illegible] Yoanis	4.893.318						X									
6/06/24	Alberto Lozano	7120367[illegible]						X				X					
6/06/24	Yuri Tovar	7.686.366						X			X						
6/06/24	Luis A Alvarez	7.693.051						X				X					

Anexo 8
Correspondencia

CONSORCIO VIAL 2023
NIT. 901.753.844-9

Neiva, 12 de junio 2024

CV-INT-29

Ingeniero
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Cra 4 Calle 8 (Esquina)
Neiva-Huila

Referencia: Contrato de interventoría N° 1492 de 20233, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Asunto: Solicitud de suspensión No 2 contrato de referencia

Cordial saludo

De acuerdo al comunicado CO-1478-23-0045, el contratista de obra solicita la suspensión No 2 debido a que el contrato se encuentra aún en proceso de elaboración del otro si, basado en el acta de justificación y modificación de cantidades de obra con respecto al espesor de la carpeta asfáltica.

Por tal motivo esta interventoría considerable viable la suspensión No 2 de la obra por el plazo necesario para el trámite y legalización del otro si del contrato de obra No 1478 de 2023.

Agradezco la atención prestada

ING. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023
Copia: Consorcio Vial Maranatha 91

Dirección: Carrera 4 No 9 – 25
Edificio Diego de Ospina – Oficina 504
Correo electrónico: consorciovial2023huila@gmail.com
3212004214

Anexo 9
Laboratorios
