MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

CONSORCIO
FRAILECILLO ATLÁNTICO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR





CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2023

INFORME MENSUAL 4 – VERSIÓN 0

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

MAYO 2024

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Contratante	**INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO** - Directora Territorial Cesar **JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA** - Gestor Técnico de Proyecto **OMAR EDIL GOMEZ NAVIA** - Supervisor Contrato de Interventoría	
Proyecto	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5025 DE 2023** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR	
Interventor	**CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO**	
Tipo de informe	Informe Mensual No. 4	
Revisión	00	
Elaboró:	Nombre	Iveth Susana Martínez Martínez
	Firma	
Aprobó:	Nombre	Gilberto Martínez Arguelles
	Firma	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
0	7 DE JUNIO DE 2024	ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 149 DE 2023 **Contratista:** CONSTRUAMBIENTE SAS

Contrato de Interventoría No. 5025 DE 2023 **Interventoría:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** may-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		14
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Anexo 4.1
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Anexo 4.2
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Anexo 4.3
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Anexo 4.4
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Anexo 4.5
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Anexo 4.6
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Anexo 4.7
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Anexo 4.8
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Anexo 4.9.1
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	Anexo 4.9.1
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Anexo 4.9.3
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Anexo 4.9.3
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Anexo 4.9.4
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Anexo 4.9.5
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		17
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		18
5.3	Informes especialistas y profesionales		18
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		19
5.5	Informe matriz de riesgos.		19
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		Anexo 5.6
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		19
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		20
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Anexo 6.1
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Anexo 6.2
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Anexo 6.3
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Anexo 6.4
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Anexo 6.5
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		21
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Anexo 6.6.1
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	Anexo 6.6.1
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Anexo 6.6.2
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	Anexo 6.6.3
7	**Conclusiones y recomendaciones**		22
8	**Anexos**		22
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Anexo 8.1
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Anexo 8.2
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		Anexo 8.3
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Anexo 8.4

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar **PERIODO MES:** may-24

CONTRATO DE OBRA No.: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE SAS

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 10,67

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,065,988,709.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1,065,988,709.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	3720
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Túneles	N/A	
	Puentes	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Construcción de Alcantarillas de 36"	UNIDAD	12
	Construcción de Box Culvert doble de 3x3	UNIDAD	1
	Construcción de Box Culvert de 2X1	UNIDAD	4
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM	7.5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	0
	Mejoramiento	N/A		
	Rehabilitación	N/A		
Estructuras	Túneles	N/A		
	Puentes	N/A		
	Pontones	N/A		
Mantenimiento		N/A		
Otros (Especificar cuales)	Construcción de Alcantarillas de 7m de ancho	UNIDAD	0	0
	Construcción de Box Culvert doble de 3x3	UNIDAD	0	0
	Construcción de Box Culvert de 2X1	UNIDAD	0	0
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	10,644,530,061.10	0.00	10,644,530,061.10
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	4,750,965.00	0.00	4,750,965.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACION VIAL	25,700,616.96	4,429,526.91	30,130,143.87
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	10,674,981,643.06	4,429,526.91	10,679,411,170.0

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	348,221,072.00	0.00	348,221,072.00	348,221,072.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	47,002,620.00	0.00	47,002,620.00	47,002,620.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	395,223,692.00	0.00	395,223,692.00	395,223,692.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 840,242,733.04
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 348,221,072.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 41.44%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: N/A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N/A
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Socomba-Pitalito - Corte de Material de Descapote y Material Comun



Vía Socomba-Pitalito - Material Para Conformación de Terraplen y actividad de conformación de terraplen

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1. Localización 8
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 8
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 9
2.4. Características técnicas del proyecto 10
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 20
3.1. Información general del contrato 20
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 23
3.3. Seguimiento de ítems no previstos 25
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría 25
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 27
4.1. Informe semanal 27
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 27
4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 27
4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra 27
4.5. Estado general del tiempo 27
4.6. Resumen ensayos de laboratorio 28
4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 28
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 28
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 28
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo 28
4.9.2. Seguimiento al Programa de Obra 28
4.9.3. Seguimiento Programa de inversiones 28
4.9.4. Actas de Comité de Obra 29
4.9.5. Actas de Reunión 29
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
5.1. Información general del contrato 30

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor 31
5.3. Informes especialistas y profesionales 33
5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 34
5.5. Informe matriz de riesgos 34
5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 34
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 35
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 35
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 35
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 35
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 35
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 35
6.6. Otros documentos seguimiento mensual 36
6.6.1. Seguimiento a la Inversión del anticipo 36
6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 36
7. CONCLUSIONES 37
8. ANEXOS 38

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, mediante el proceso Concurso de Méritos No. **CMA-DEO-SVR-111-2023**, adjudicó y posteriormente suscribió el contrato No. **5025 de 2023** con la firma **CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO** representado legalmente por el ingeniero **GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES**.

Para la supervisión del contrato de interventoría No. 5025 de 2023 se designó al ingeniero **OMAR EDIL GOMEZ NAVIA** y como Gestor Técnico de Proyecto al ingeniero **JUAN FRANCISCO GARCÍA ACOSTA**.

Bajo el contrato No. 5025 de 2023, se realizará la interventoría al Contrato de Obra No. 149 de 2023, adjudicado y posteriormente suscrito por **El MUNICIPIO DE BECERRIL** mediante el Proceso de Licitación Pública No. **LP-018-2023** con la firma **COSNTRUAMBIENTE S.A.S**., representada legalmente por **JOSE JOSE AVILEZ PERALES** para realizar el **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

Con fecha 19 de febrero de 2024 se firma el acta de inicio del contrato de obra, con un plazo de ejecución de 7 meses. De la misma manera, para la interventoría, el INVIAS imparte orden de inicio el día 28 de diciembre de 2023 con un plazo de 7 meses. Sin embargo, el contrato de interventoría se suspende el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024. El contrato vuelve a suspenderse el día 29 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024. El día 15 de febrero se reinicia el contrato de interventoría y se aprueba prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.

Con el presente informe, tenemos la intención de proporcionar al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) una visión detallada sobre el progreso y la ejecución del contrato de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2024. Esta transparencia facilitará una mejor comprensión de los avances realizados, permitiendo una toma de decisiones informada y oportuna, así como una identificación temprana de posibles desafíos, lo que contribuirá a garantizar la eficiencia y calidad en la ejecución del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Becerril, en el departamento del Cesar. Limita con los municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibírico y la frontera con Venezuela por la Serranía del Perijá, llamada también la Serranía de los Motilones. Al norte, con el municipio de Agustín Codazzi; al sur, con el municipio de la Jagua de Ibírico; por el este con Venezuela y por el oeste con los municipios de Agustín Codazzi y El Paso.



Figura 1. Localización de la vía Socomba – Pitalito.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Municipios en la zona de influencia: Agustín Codazzi, La Jagua de Ibírico y El Paso.

Beneficios de la ejecución del proyecto: La infraestructura vial desempeña un papel vital en el progreso económico de Colombia, ya que posibilita el transporte eficiente de diversos bienes, materias primas y personas. En el caso específico del municipio de Becerril, la falta de mantenimiento adecuado en sus carreteras rurales ha generado dificultades significativas en la conectividad terrestre de la población. Este deterioro ha ocasionado prolongación en los tiempos de viaje y ha obstaculizado la comercialización de los productos locales, lo que a su vez ha restringido el desarrollo socioeconómico de la región.

La mejora de la infraestructura vial, mediante la adecuada atención y mantenimiento de las vías, conlleva una serie de beneficios tangibles. En primer lugar, una red vial eficiente facilita el acceso a nuevos mercados, lo que favorece la expansión económica y comercial del municipio. Además, una mejor conectividad aumenta la disponibilidad de mano de obra al facilitar la movilidad de los trabajadores hacia áreas con mayores oportunidades laborales.

Además de los beneficios económicos, la inversión en infraestructura vial también tiene un impacto positivo en el ámbito social. El acceso mejorado a servicios esenciales, como atención médica y educación de calidad, se vuelve más viable con una red vial eficiente. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y fomenta el desarrollo humano en general.

Por lo tanto, la ejecución del Contrato de Obra No. 149 de 2023 destinado a mejorar las vías de comunicación en el municipio de Becerril no solo impulsará el crecimiento económico al facilitar el transporte de bienes y personas, sino que también promoverá el desarrollo social al mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

La Figura 2 muestra el estado inicial de la vía, la cual en la actualidad es poco más que un camino rural en afirmado rodeado de una densa vegetación. Este carreteable presenta numerosos baches y su acceso es difícil, lo que impide el tránsito de vehículos. Ante esta situación, se hace imperativa la construcción de un pavimento que garantice las condiciones adecuadas para transitar por esta ruta. La necesidad de pavimentar esta vía radica en la mejora significativa que proporcionará al acceso y la movilidad de las personas y vehículos que dependen de ella. Un pavimento adecuado permitirá que tanto los residentes locales como los transportistas puedan desplazarse de manera más segura y eficiente, lo que contribuirá al desarrollo económico y social de la zona.

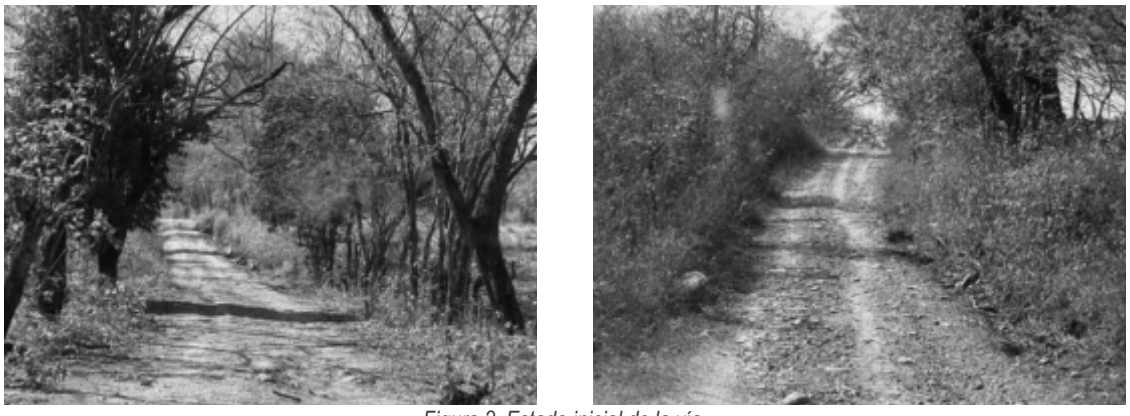


Figura 2. Estado inicial de la vía.

2.4. Características técnicas del proyecto

Contrato inicial

De acuerdo con el presupuesto inicial del contrato, las metas físicas a ejecutar son las que se mencionan a continuación:

El tramo que se va a intervenir se encuentra en la vía que comunica a la vereda Socomba y a la vereda Pitalito, en el Municipio de Becerril, Cesar la cual tiene una longitud de 7,243 Kilómetros en total desde K0+000 (9°37'24.36"N 73°13'38.02"W) hasta el K7+913 (9°41'3,04"N 73°14'24,96"W), del cual se pretende intervenir parcialmente la vía en 2 tramos, de los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Mejoramiento 3.720 metros lineales en concreto hidráulico:

- **Tramo 1:** El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.590 metros, iniciando en la abscisa K0+000 (9°37'24.36"N 73°13'38.02"O) y finalizando en la abscisa K1+590 (9°38'10.83"N 73°13'46.18"O).
- **Tramo 2:** El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.880 metros, iniciando en la abscisa K2+100 (9°38'27.25"N 73°13'43.97"O) y finalizando en la abscisa K3+980 (9°39'26.45"N 73°13'28.92"O).

De acuerdo con los diseños iniciales y los documentos contractuales la vía a construir presenta los siguientes detalles técnicos:

- Ancho 6m
- Pavimento en Placa Huella MR 4.2 Mpa
- Espesor rodadura en concreto hidráulico 0.2 m
- Espesor base granular 0.15 m
- Espesor subbase granular 0.2 m

En resumen, el alcance inicial del contrato de obra comprende las siguientes actividades:

- Construcción de Pavimento Rígido: 3720 m
- Construcción de Alcantarillas: 21 UND de 7 m de Ancho
- Construcción de Box culvert: 1 UND de 3 x 3 x 1 m
- Caracterización del Corredor Vial Postulado: 7,5 km

Revisiones a los estudios y diseños

Al revisar los estudios y diseños enviados por el Municipio de Becerril, se han realizado observaciones y estas se han tenido en cuenta por el contratista. En el momento se continúa con la revisión de estos documentos por lo que el alcance se actualizará una vez estén en aprobación definitiva los diseños.

- **Diseño del trazado**

Se definió la implementación de un ancho de calzada de 6.00 m (un carril de 3.00 m por sentido) y una cuneta de 0.90 m. En la Figura 3 se muestra la sección transversal típica.

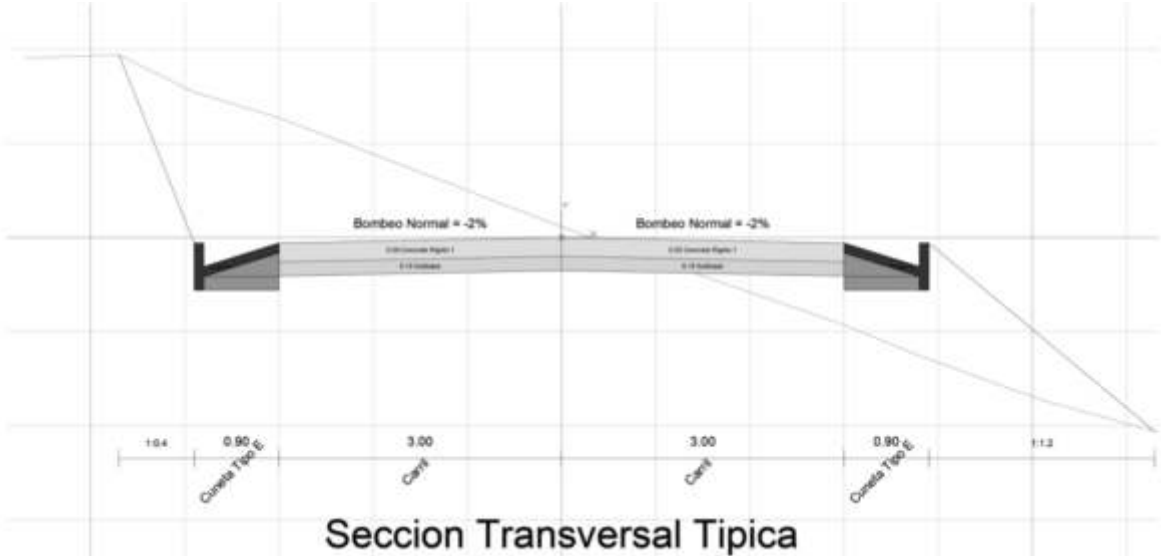


Figura 3. Sección transversal típica K0+000 – K3+720.

- **Diseño del pavimento**

A continuación, se describen los detalles técnicos del diseño del pavimento actualizado de la vía:

- Ancho 6m
- Módulo de rotura pavimento en concreto hidráulico: MR2 (4.0 MPa)
- Espesor rodadura en concreto hidráulico: 0.2 m
- Espesor subbase granular: 0.15 m
- Espesor de subrasante granular en puntos críticos: 30 cm

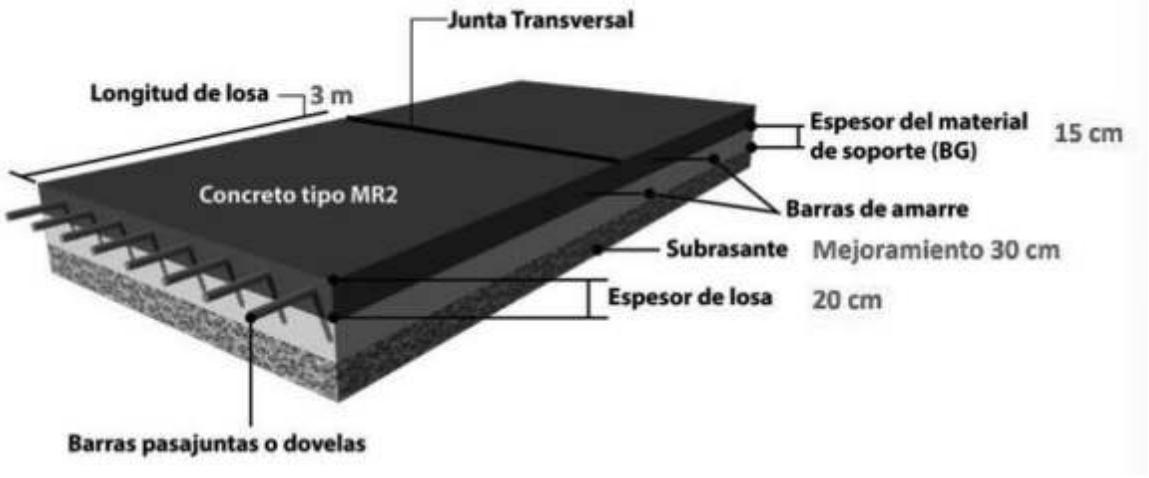


Figura 4. Diseño del pavimento.

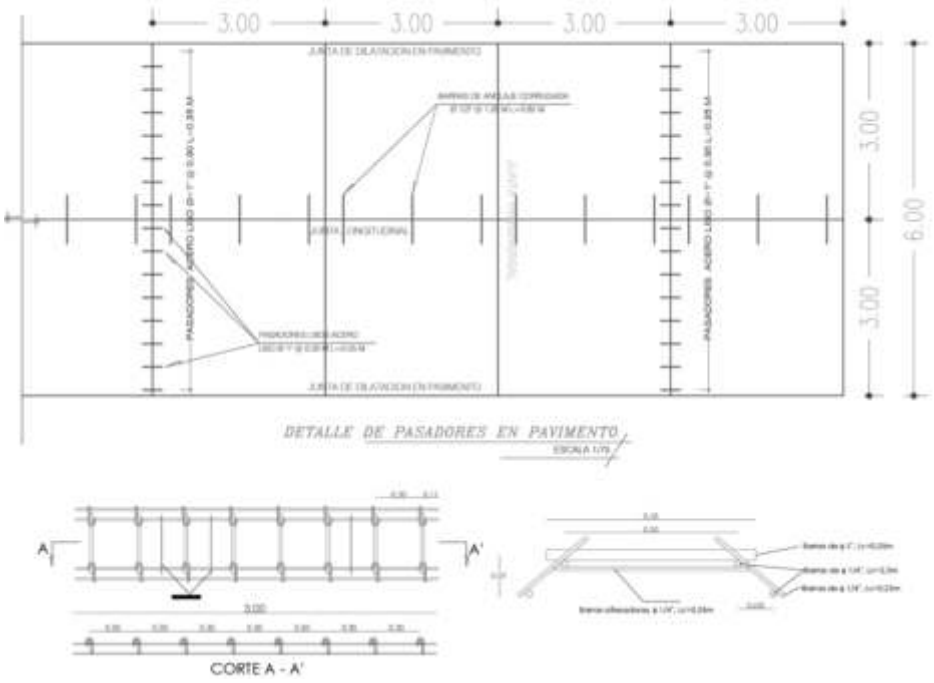


Figura 5. Detalle de losa.

- **Diseño hidrológico e hidráulico**

A continuación, se presenta el diseño hidráulico actualizado en el cual se incluyen las obras de arte que se construirán. En la Figura 6 se muestran los puntos de obras hidráulicas existentes y las que se requieren según las pendientes y los surcos de agua evidenciados en campo.

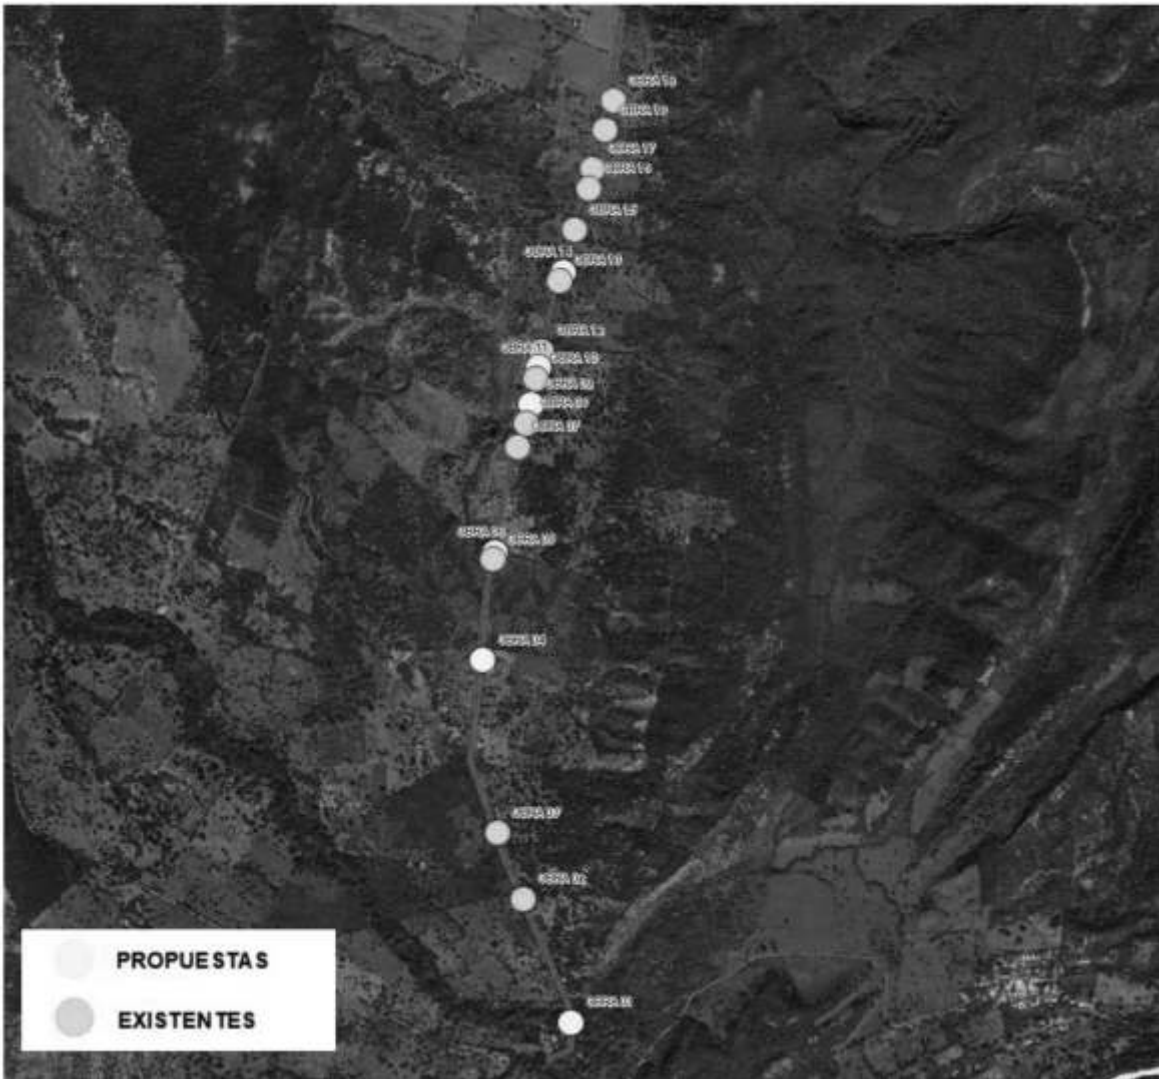


Figura 6. Obras de arte existentes y propuestas.

En la siguiente tabla se puede apreciar el estado inicial de cada obra de arte, las coordenadas y el tipo de obra.

Tabla 1. Obras Proyectadas.

NUM OBRA	FOTO	TIPO OBRA	ESTE	NORTE	ACCIÓN NECESARIA
1		Sin Obra	1093410.71	1556231.67	Nueva Obra
2		Alcantarilla 36	1085480,1	1541162,21	Demolición y construcción
3		Alcantarilla 36	1093143.95	1556916.45	Demolición y construcción
4		Sin Obra	1093090.98	1557543.3	Muro en Gaviones

5		Alcantarilla 36	1093126.99	1557906.31	Demolición y construcción
6		Sin Obra	1093133.64	1557933.05	Nueva Obra
7		Alcantarilla 90 cm	1093215.92	1558313.77	Demolición y construcción
8		Alcantarilla 90 cm	1093246.95	1558400.12	Demolición y construcción

9		Sin Obra	1093265.65	1558467.87	Muro en Gaviones
10		Alcantarilla 90 cm	1093283.08	1558562.15	Demolición y construcción
11		Sin Obra	1093291.8	1558600.2	Nueva Obra
12		Alcantarilla doble 90 cm	1093304.62	1558661.81	Demolición y construcción

13		Alcantarilla doble 90 cm	1093369.22	1558915.83	Demolición y construcción
14		Sin Obra	1093383.42	1558947.05	Nueva Obra
15		Alcantarilla 90 cm	1093423	1559098.99	Demolición y construcción
16		Alcantarilla 90 cm	1093475.24	1559248.2	Demolición y construcción

17		Alcantarilla 90 cm	1093490.38	1559321.22	Demolición y construcción
18		Alcantarilla 90 cm	1093533.94	1559460.09	Demolición y construcción
19		Alcantarilla 90 cm	1093563.37	1559567.29	Demolición y construcción

Para la vía se establecieron 12 alcantarillas de 36" las cuales se presentan en la siguiente tabla con los caudales generados en cada uno de los puntos definidos, para los cuales 13 se requieren reconstrucción y 2 obras nuevas. Asimismo, se requiere 1 Box Culvert Doble de 3x3 y 4 Box Culvert de 2x1.

Tabla 2. Resumen obras de arte.

PUNTOS	PK	ESTE	NORTE	CAUDAL M3/S	TIPO DE OBRA
OBRA 1	K0+150	1093410.71	1556231.67	14.23	Box Culvert Doble de 3X3
OBRA 2	K0+637	1085480,1	1541162,21	0.97	Alc 36"
OBRA 3	K0+879	1093143.95	1556916.45	1.07	Alc 36"
OBRA 5	K1+916	1093126.99	1557906.31	1.08	Alc 36"
OBRA 6	K1+950	1093133.64	1557933.05	2.38	Box Culvert 2X1
OBRA 7	K2+316	1093215.92	1558313.77	2.55	Box Culvert 2X1
OBRA 8	K2+400	1093246.95	1558400.12	0.18	Alc 36"
OBRA 10	K2+600	1093283.08	1558562.15	1.16	Alc 36"
OBRA 11	K2+642	1093291.8	1558600.2	0.83	Alc 36"
OBRA 12	K2+712	1093304.62	1558661.81	2.62	Box Culvert 2X1
OBRA 13	K2+944	1093369.22	1558915.83	2.53	Box Culvert 2x1
OBRA 14	K3+004	1093383.42	1558947.05	0.12	Alc 36"
OBRA 15	K3+146	1093423	1559098.99	1.01	Alc 36"
OBRA 16	K3+300	1093475.24	1559248.2	0.93	Alc 36"
OBRA 17	K3+386	1093490.38	1559321.22	0.17	Alc 36"
OBRA 18	K3+515	1093533.94	1559460.09	0.84	Alc 36"
OBRA 19	K3+643	1093563.37	1559567.29	0.83	Alc 36"

Adicionalmente, en la Figura 7 se presenta la sección típica de la cuneta.

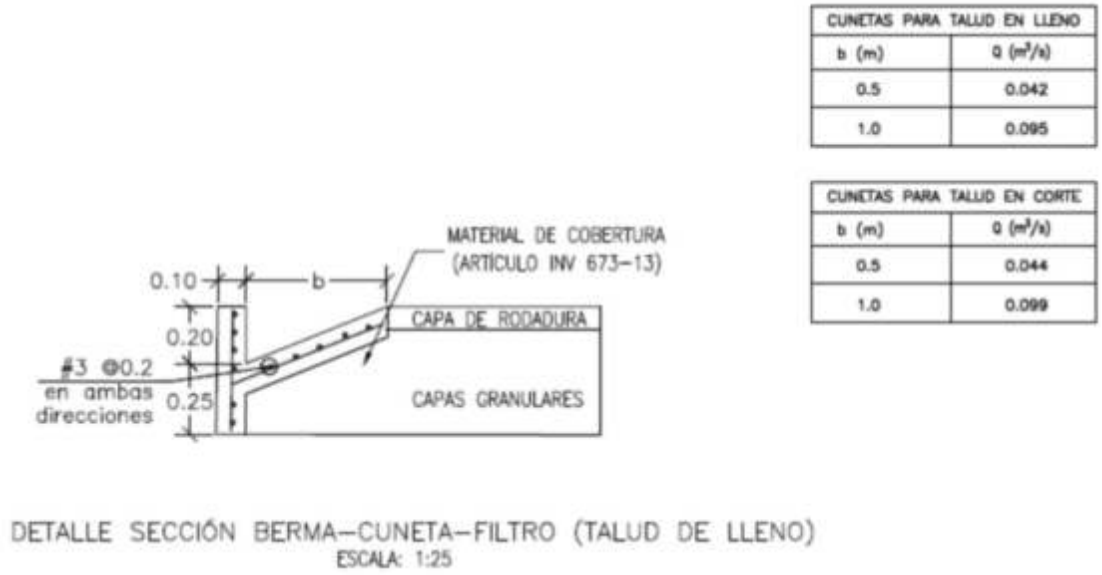


Figura 7. Sección típica de cuneta.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA


3.1. Información general del contrato

No. Proceso de Selección	LP-018-2023
Contrato No.	149 de 2023
Fecha de Suscripción	29 de septiembre de 2023
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratista	CONSTRUAMBIENTE SAS
NIT	824006325-5
Representante Legal	JOSE JOSE AVILEZ PERALES CC: 12.522.884
Valor Inicial del Contrato	$ 10.679.411.170,00
Valor Adicional	$ 0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 10.679.411.170,00
Anticipo	$ 5.339.705.585,00
Plazo Inicial	7 meses
Fecha de inicio	19 de febrero de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Final	31 de diciembre de 2024
Plazo Acumulado	10 meses
Prórroga No. 1 (29 de diciembre de 2023)	31 de diciembre de 2024
Dirección	Calle 6D No. 19A2-62 Barrio Los Músicos
Teléfono	+57 3207660439 - +57 3117792880
Email	**jj.avilez@gmail.com**

Mediante el acta de inicio del día 19 de febrero de 2024 se inician las actividades del presente contrato con la etapa de revisión de estudios y diseños. Se aprobó el siguiente personal de obra mediante el oficio No. FRATLA-2024-039 Observaciones a las hojas de vida Contrato de obra.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	HOJA DE VIDA
Director de Obra	Wilmer Junior Gomez Brito	C.C No. 79.953.559 T.P. No. 08202158763	APROBADA
Residente de Obra 1	Nestor Javier Alfaro Benitez	C.C No. 13.871.003 T.P. No. 08202-118729	APROBADA
Residente de Obra 2	Abelino Quintero Rivera	C.C No. 1.066.086.066 T.P. No. 54202365794	APROBADA
Especialista en Vías y/ Pavimentos	Jesus Edgardo Vergel Lopez	C.C No. 13.175.967 T.P. No. 54202131604	APROBADA
Profesional SST	Erika Yamile Cortazar Torres	C.C No. 52.182.970	APROBADA
Profesional Social	Amarlis Esther Rodriguez Medina	C.C No. 49.733.729	APROBADA
Profesional ambiental	Carlos Enrique Lopez Mejia	C.C No. 2.768.341	APROBADA

A continuación, se presenta la propuesta económica inicial del contratista de obra en la Figura 8. Por otro lado, en OTROS ANEXOS se incluye el acta de modificación No.1 suscrita el día 17 de mayo de 2024.

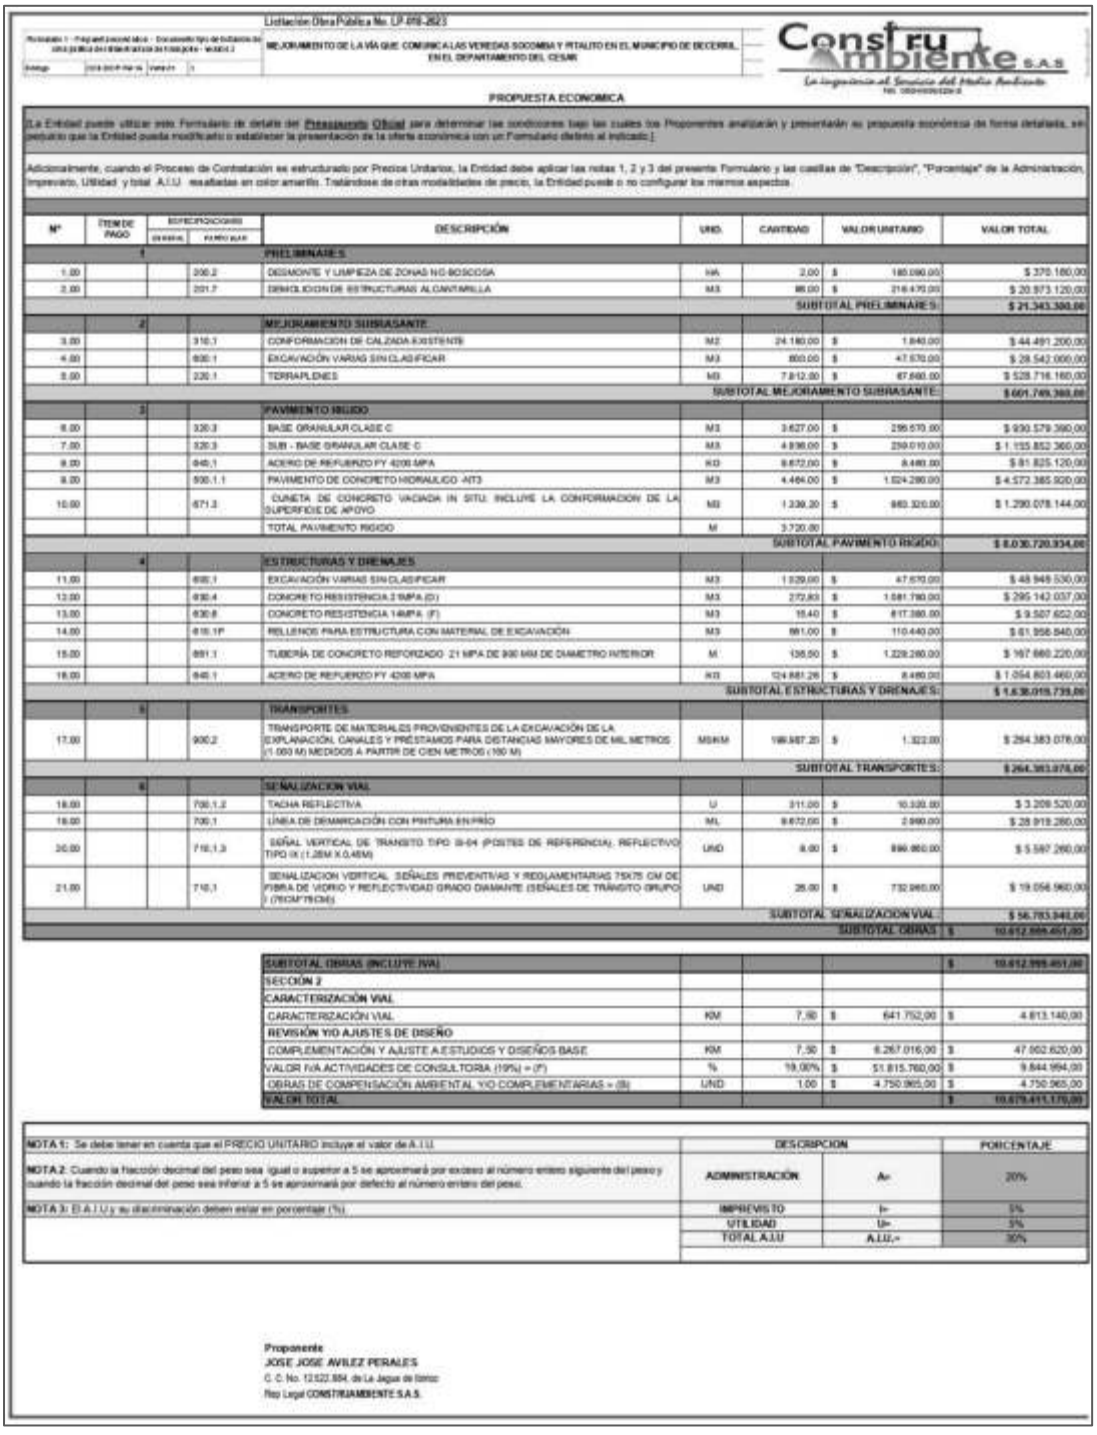

Licitación Obra Pública No. LP-016-2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Construambiente S.A.S

PROPUESTA ECONOMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, es preciso que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación se estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1			PRELIMINARES				
1.00			200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSA	HA	2,00	$ 185.090,00	$ 370.180,00
2.00			201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS ALCANTARILLA	M3	86,00	$ 216.470,00	$ 20.973.120,00
							SUBTOTAL PRELIMINARES:	$ 21.343.300,00
	2			MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
3.00			310.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	24.180,00	$ 1.840,00	$ 44.491.200,00
4.00			600.1	EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	800,00	$ 47.570,00	$ 28.542.000,00
5.00			220.1	TERRAPLENES	M3	7.812,00	$ 67.680,00	$ 528.716.160,00
							SUBTOTAL MEJORAMIENTO SUBRASANTE:	$ 601.749.360,00
	3			PAVIMENTO RIGIDO				
6.00			320.3	BASE GRANULAR CLASE C	M3	3.627,00	$ 256.570,00	$ 930.579.390,00
7.00			320.3	SUB - BASE GRANULAR CLASE C	M3	4.836,00	$ 239.010,00	$ 1.155.852.360,00
8.00			640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	9.672,00	$ 8.480,00	$ 81.825.120,00
9.00			500.1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AIT3	M3	4.484,00	$ 1.024.280,00	$ 4.572.385.920,00
10.00			671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.338,20	$ 860.320,00	$ 1.290.078.144,00
				TOTAL PAVIMENTO RIGIDO	M	3.720,00		
							SUBTOTAL PAVIMENTO RIGIDO:	$ 8.030.720.934,00
	4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
11.00			600.1	EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.029,00	$ 47.570,00	$ 48.949.530,00
12.00			630.4	CONCRETO RESISTENCIA 2 MPA (D)	M3	272,83	$ 1.081.780,00	$ 295.142.037,00
13.00			630.8	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	10,40	$ 817.380,00	$ 9.507.622,00
14.00			610.1F	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	881,00	$ 110.440,00	$ 81.958.840,00
15.00			661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	135,50	$ 1.228.280,00	$ 167.660.220,00
16.00			640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	124.881,26	$ 8.480,00	$ 1.054.803.460,00
							SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES:	$ 1.638.019.739,00
	5			TRANSPORTES				
17.00			900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3KM	199.687,20	$ 1.322,00	$ 264.383.078,00
							SUBTOTAL TRANSPORTES:	$ 264.383.078,00
	6			SEÑALIZACION VIAL				
18.00			700.1.2	TACHA REFLECTIVA	U	311,00	$ 10.320,00	$ 3.209.520,00
19.00			700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	9.672,00	$ 2.960,00	$ 28.918.280,00
20.00			716.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25M X 0.45M)	UND	8,00	$ 686.860,00	$ 5.587.260,00
21.00			716.1	SEÑALIZACION VERTICAL SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS 75X75 CM DE FIBRA DE VIDRIO Y REFLECTIVIDAD GRADO DIAMANTE (SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO I (TECNITECNI).	UND	26,00	$ 732.960,00	$ 19.056.960,00
							SUBTOTAL SEÑALIZACION VIAL:	$ 56.783.340,00
							SUBTOTAL OBRAS:	$ 10.612.999.451,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 10.612.999.451,00
SECCIÓN 2			
CARACTERIZACIÓN VIAL			
CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	7,50	$ 641.752,00	$ 4.813.140,00
REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO			
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE	KM	7,50	$ 6.267.016,00	$ 47.002.620,00
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%) = (F)	%	19,00%	$ 51.815.760,00	$ 9.844.994,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (S)	UND	1,00	$ 4.750.965,00	$ 4.750.965,00
VALOR TOTAL				$ 10.679.411.170,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION A=	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO I=	5%
	UTILIDAD U=	5%
	TOTAL A.I.U A.I.U.=	30%

Proponente
JOSE JOSE AVILEZ PERALES
C. C. No. 12.522.884, de La Jagua de Ibirico
Rep Legal CONSTRUAMBIENTE S.A.S.

Figura 8. Propuesta económica inicial contratista de obra.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de mayo las actividades desarrolladas por parte del **contratista de obra** fueron las siguientes:

Reuniones y comités de obra

- Los días 3, 10, 16 y 29 de mayo se llevaron a cabo reuniones de seguimiento del proyecto junto con la interventoría para tratar temas como el envío de información y establecer compromisos tanto para el contratista como para la interventoría.
- Asistencia al comité de obra realizado el día 7/05/2024 en las instalaciones del INIVAS territorial Cesar.

Actividades de obra

1. Conformación de Calzada Existente: Se inició la actividad de conformación de calzada, que implica la preparación y ajuste del terreno para la instalación de la capa de subbase de la carretera. Este proceso incluye nivelar el terreno, compactar el suelo y asegurarse de que la superficie sea adecuada para soportar el tráfico vehicular. Hasta la fecha, se han ejecutado 24,180 m2 de conformación de calzada.

2. Excavaciones varias sin clasificar: Se inició la actividad de excavaciones varias sin clasificar, que consiste en remover tierra y otros materiales del terreno sin una clasificación específica. Hasta la fecha, se han ejecutado 600 m3 de estas excavaciones

3. Terraplenes: Se inició la actividad de extensión y compactación del material de terraplén, un proceso que consiste en distribuir y compactar capas de tierra para crear una base estable y nivelada en el terreno, crucial para la construcción de la vía. Hasta la fecha, se han compactado 728 metros cúbicos de terraplén.

4. Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m): Se inició la actividad de transporte de material de terraplén, que implica mover grandes volúmenes de material seleccionado desde la fuente de materiales, ubicada a unos 23 km, hasta el sitio de la obra. Hasta la fecha, se han transportado 21,767 m3/km de material de terraplén.

Adicionalmente, durante el mes de mayo, las actividades del contratista se vieron repetidamente interrumpidas debido a condiciones climáticas adversas. Específicamente:

- El 1 de mayo, no se realizaron actividades debido a fuertes lluvias en la tarde y noche.
- El 4 de mayo, no se trabajó debido a las lluvias intensas del 3 y la mañana del 4 de mayo.
- El 8 de mayo, las actividades fueron suspendidas por lluvias en la madrugada y la mañana.
- El 9 de mayo, las fuertes lluvias impidieron continuar con las actividades de terraplén y retiro de material de excavación.
- El 10 de mayo, las altas precipitaciones durante todo el día impidieron cualquier actividad.
- El 21 de mayo, las actividades se suspendieron por lluvias durante toda la jornada.
- El 25 de mayo, no se trabajó debido a las lluvias continuas a lo largo del día.

En resumen, las fuertes lluvias recurrentes en mayo ocasionaron múltiples interrupciones en el cronograma de trabajo del contratista, afectando significativamente el progreso de las actividades planificadas.

Actividades de gestión ambiental

- Capacitaciones ambientales (temas: el ruido, normas para dispositivos sonoros, manejo idóneo de vehículos y maquinaria).
- Jornadas de limpieza dentro de la obra.
- Cargue de material producto de excavaciones - Encarpado de volquetas.
- Terraplenes – medidas de manejo de recurso suelo.
- Transporte de materiales provenientes de las excavaciones de la explanación – medidas de manejo de emisiones atmosféricas.
- Conformación del grupo ambiental.

Actividades de gestión social

- Instalación de pendón informativo con los canales de comunicación y ubicación del punto satélite de Información propuestos en el proyecto de divulgación. Así mismo, la ubicación del buzón de sugerencias.
- Instalación y Funcionamiento del PAC: El contratista dio apertura al punto de Atención al Ciudadano, donde se atenderán todas las solicitudes, quejas o reclamos de la ciudadanía. Buscando dar respuesta o solución oportuna a los usuarios o residentes que se puedan ver afectados por la obra.

- Se diligenciaron las actas de compromisos: actas de compromisos para la construcción de cercas limítrofes por los dueños de las fincas aledañas a la vía.
- Avanzar con el componente de mano de obra: seguimiento y supervisión que la contratación de mano de obra no calificada sea de las veredas aledañas al proyecto, atendiendo al programa de generación de empleo en la zona. Teniendo en cuenta el beneficio social para la comunidad; Por medio de la junta de acción comunal de cada una de las veredas.
- Capacitación: se iniciaron capacitaciones sobre reglamento interno de trabajo, normatividad laboral; seguridad y salud en el trabajo y trabajo en equipo.

3.3. Seguimiento de ítems no previstos

De acuerdo con el acta modificatoria No. 1, suscrita el 17 de mayo de 2024 se incluyen en la ejecución del contrato los siguientes ítems no previstos:

ITEM NO PREVISTO		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
NP 1	201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ML	$ 2386.78	
NP 2	800.1	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	ML	$ 26303.54	

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Durante el periodo abarcado por este informe, la labor de la interventoría ha progresado significativamente en cuanto a la revisión de estudios y diseños, en estrecha colaboración con todos los especialistas involucrados en la supervisión del proyecto. Para garantizar la calidad y la conformidad con los requerimientos, se emitieron observaciones a través del comunicado No. ***FRATLA-2024-077 Respuesta a comunicado No. O-MVPS- 0-18*** del 10 de mayo de 2024, con el propósito de que el contratista realice las correcciones pertinentes en respuesta a dichas observaciones. Para este periodo, se aprobó el diseño hidrológico e hidráulico de la vía mediante el comunicado No. ***FRATLA-2024-089 Aprobación del Diseño Hidrológico e Hidráulico Contrato de Obra No. 149 de 2023*** del 21 de mayo de 2024.

Además, se ha continuado con el proceso de revisión de los documentos necesarios para el buen manejo del proyecto y el avance de la obra. Estos documentos se han solicitado y las observaciones resultantes han sido transmitidas al contratista a través de los comunicados No. ***FRATLA-2024-074 Solicitud de afiliaciones del personal de obra Cto No. 149 de 2023*** del 9 de mayo de 2024, No. ***FRATLA-2024-075 Solicitud de documentación ambiental*** del 9 de mayo de 2024, No. ***FRATLA-2024-083 Observaciones a las Pólizas*** del 16 de mayo de 2024, No. ***FRATLA-2024-086 Aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) Contrato de Obra*** del 20 de mayo de 2024, ***FRATLA-2024-093 Coordinación de Revisión Técnica de Estabilidad de Taludes*** del 27 de mayo de 2024, ***FRATLA-2024-095 Solicitud de Documentación de Volquetas –Cto de Interventoría No. 5025 de 2023*** del 29 de mayo de 2024.

Es importante destacar que, debido a las demoras en la entrega de la información solicitada al contratista de obra, se ha reiterado en varias ocasiones al contratista la necesidad de cumplir con dichas solicitudes, mediante el comunicado No. ***FRATLA-2024-079 Reiteración a la solicitud de información, FRATLA-2024-100 Reiteración a la solicitud de documentos – Documentación Ambiental.***

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

En el Anexo 4.1 se presentan los informes semanales del presente mes en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

El control diario de maquinaria y equipo correspondiente al presente informe mensual se presenta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4** MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA (ver Anexo 4.2).

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6** PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA, se incluye en el Anexo 4.3. Sin embargo, el contratista a la fecha no ha enviado a la interventoría planillas de seguridad social.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

La información financiera del contrato de obra durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, se indica en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8**, el cual se incluye en el Anexo 4.4.

4.5. Estado general del tiempo

El estado general del tiempo correspondiente al presente mes se presenta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (ver Anexo 4.5). Cabe mencionar que, se consultó Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a las estaciones más cercanas donde se ejecutara el proyecto, sin embargo, la página no registra datos para el rango de días que es objeto del presente informe.

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

Para el periodo correspondiente al presente informe, los ensayos de laboratorio realizados por parte del contratista y de la interventoría, se incluyen en el Anexo 4.6 RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11.**

4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

Esta interventoría realizó el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra a través del formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12** SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS OBRA, el cual se incluye en el Anexo 4.7. En este mismo anexo se incluye copia de las pólizas del contrato de obra.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El seguimiento al plan de calidad de obra se hace en el Anexo 4.8, formato **MEPI-MN-1IN-15-FR-14**.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

El seguimiento a la inversión del anticipo del contrato de obra No. 149 de 2023, se hace en los formatos **MEPI-MN-IN-2-FR-1** y **MEPI-MN-IN-2-FR-2** incluidos en el Anexo 4.9.1.

4.9.2. Seguimiento al Programa de Obra

El seguimiento al programa de obra se incluye en el Anexo 4.9.3 **MEPI-MN1-IN-6-FR-1** PROG INVERS O REPROG PROG INV.

4.9.3. Seguimiento Programa de inversiones

Esta Interventoría realiza un seguimiento mensual al programa de inversiones del contratista de obra a través del formato **MEPI-MN1-IN-6-FR-1** PROG INVERS O REPROG PROG INV. Teniendo en cuenta lo anterior, los formatos **MEPI-MN1-IN-6-FR-1** PROG INVERS O REPROG PROG y **MEPI-MN1-IN-6-FR-2** SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES se presentan en el Anexo 4.9.3.

4.9.4. Actas de Comité de Obra

Las actas de los comités de obra llevadas a cabo durante el periodo correspondiente al presente informe se incluyen en el Anexo 4.9.4, en el formato **MEPI-MN1-IN-14-FR-1** ACTA COMITE DE OBRA.

4.9.5. Actas de Reunión

Para el periodo correspondiente se llevaron a cabo reuniones, se presentan en el Anexo 4.9.5 el formato **MEPI-MN1-IN-14-FR-2.**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

No. Proceso de Selección	CMA-DEO-SVR-111-2023
Contrato No.	5025 DE 2023
Fecha de Suscripción	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR
Interventor	CONSORCIO FRALECILLO ATLANTICO
Integrantes	**UMBRELLA INTERNATIONAL SAS** NIT. 901.572.122-2 (90%) **MT PROJECTS S.A.S** NIT. 901.272.031-3 (10%)
NIT	901.781.112-5
Representante Legal	GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES CC: 72.311.243 de Puerto Colombia
Valor Básico del Contrato	$1.065.988.709,00
Valor Adicional	$ 0
Valor Acumulado del Contrato	$1.065.988.709,00
Plazo Inicial	7 meses
Plazo Acumulado	10 meses
Fecha de inicio	28 DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación final	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión # 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Reinicio # 1	28 DE ENERO DE 2024
Suspensión # 2	29 DE ENERO DE 2024
Reinicio # 2	15 DE FEBRERO DE 2024
Prórroga # 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Dirección	Calle 114 # 43 – 204 Torre 3 ap 802 Conjunto Andarríos - Barranquilla - Atlántico
Teléfono	+57 300 368 7541
Email	frailecillo23.bec@gmail.com

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se indican las actividades realizadas en el presente mes por esta interventoría para hacer seguimiento al desarrollo de los trabajos realizados por el contratista de obra:

Reuniones y comités de obra

- Realización de reuniones de seguimiento del proyecto junto con el contratista los días 3, 10, 16 y 29 de mayo para tratar temas como el envío de información y establecer compromisos tanto para el contratista como para la interventoría.
- Asistencia al comité de obra realizado el día 7 de mayo de 2024 en las instalaciones del INIVAS territorial Cesar.

Actividades de obra

- Semana del 2/05/2024 al 9/05/2024: Las actividades en la obra estuvieron marcadas por las condiciones climáticas adversas. El 03 de mayo se realizó el comité de seguimiento de obra, el retiro de material de descapote y la adecuación de vías con motoniveladora bajo clima lluvioso. El 04 de mayo no se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias de la noche anterior y la mañana del mismo día. El 06 y 07 de mayo se trabajó en la conformación del terraplén y el retiro de material de descapote, con clima seco el 07. Sin embargo, el 08 y 09 de mayo no se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias que persistieron, impidiendo continuar con las tareas planificadas.

- Semana del 10/05/2024 al 16/05/2024: Las actividades en la obra comenzaron el 10 de mayo sin ninguna actividad debido a las altas precipitaciones a lo largo del día. El 11 de mayo, con clima seco, se realizaron actividades de corte y retiro de material común con excavadora y volquetas, además de la adecuación de la vía con motoniveladora. Los días 14 y 15 de mayo, también con clima seco, se continuaron las actividades de corte y retiro de material común y de descapote desde K2+720 hasta K3+720, junto con la adecuación de la vía con motoniveladora. El 16 de mayo se avanzó en el corte y retiro de material común desde K2+220 hasta K3+720, manteniéndose el clima seco.

- Semana del 17/05/2024 al 23/05/2024: Las actividades en la obra incluyeron el corte de material común entre las abscisas K3+450 y K3+720. Los días 17 y 18 de mayo, con clima seco, se realizaron estas actividades sin interrupciones. El 20 de mayo, a pesar de las lluvias nocturnas, se continuó con el corte de material y se llevó a cabo un comité de obra. El 21 de

mayo no se realizaron actividades debido a las lluvias durante la jornada. Los días 22 y 23 de mayo, con clima nublado, se retomaron las actividades de corte de material común.

- Semana del 24/05/2024 al 31/05/2024: Las actividades en la obra incluyeron el corte y retiro de material común entre las abscisas K3+000 y K3+450. Los días 24 y 29 de mayo, con clima seco, y el 28 de mayo, con clima nublado, se llevaron a cabo estas actividades sin interrupciones. El 25 de mayo no se realizaron actividades debido a las lluvias durante todo el día. El 31 de mayo, con clima seco, se realizaron actividades de conformación de terraplén entre las abscisas K3+640 y K3+720.

- Control y seguimiento diario de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales son descritas en los informes semanales que se presentan y en la bitácora de obra.

- Apoyo al diligenciamiento y control diario de la Bitácora de Obra, en la que se describen las actividades que se realizan todos los días, equipos operativos, personal del contratista, factores climáticos, entre otros.

- Ejecución de Informes semanales en los formatos INVIAS, en el cual se describen las actividades por día que se ejecutan en cada semana, así mismo se verifica el porcentaje de avance y/o atraso, de acuerdo con la programación de obra establecida por el contratista.

Actividades de gestión ambiental

- Visita técnica a obra el día 6 de mayo con el director de interventoría, profesional social y residente de obra verificando y supervisando el avance de la obra.
- El día 7 de mayo se realizó Comité de obra con el INVIAS, contratista y alcaldía Municipal de Becerril, tocando los temas de avance de la obra, estudios y diseños, permiso de ocupación de cauce, balance general e información entregada por contratista.
- Revisión y aprobación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del contratista.
- Revisión de documentación legal ambiental que esté vigente.
- Verificación de radicado para tramite de permiso de cauce.
- Revisión de actas de compromiso para el uso de predio como bodega.
- Revisión de actas de compromiso para el uso de predio como almacén de maquinaria pesada y equipos.
- Revisión y supervisión de implementación del PMT.

- Supervisión de área de bodega de materiales para la obra.
- Supervisión de predio en el cual se está guardando equipos y maquinaria.
- Supervisión de la conformación de grupo ambiental.
- Supervisión de capacitaciones a personal de obra.
- Supervisión de las actividades del Contratistas de la obra, verificando el cumplimiento al Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y de las especificaciones en todas sus partes con respecto a los aspectos técnicos y ambientales.
- Supervisión a la ejecución de las actividades realizadas en obra en el mes de mayo como lo son: Corte y retiro de material de descapote y material común con retroexcavadora y volqueta. Terraplenes: instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante y nivelación de la calzada. Conformación de la calzada. Terraplenes: instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante y nivelación de la calzada.

Para estas actividades se verificó que se está dando cumplimiento al PAGA del contratista, con las cuales se tuvieron las medidas necesarias durante el proceso de ejecución.

Actividades de gestión social

- Revisión del arte de pendón informativo sobre punto satélite de Información propuestos en el proyecto de divulgación, con todos los datos y canales de comunicación dispuestos para la atención a la comunidad, con el fin de recibir las quejas, reclamos e inquietudes relacionadas con el objeto de la obra.
- Supervisión de instalación de pendón informativo con los canales de comunicación y ubicación del punto satélite de Información propuestos en el proyecto de divulgación. Así mismo, la ubicación del buzón de sugerencias.
- Visita técnica y seguimiento a las actividades llevadas a cabo en la obra.
- Reunión de seguimiento con los profesionales social y ambiental del contratista, residente de la obra y equipo de interventoría.
- Redacción de oficios y comunicado referente al proceso social de la obra.
- Revisión del proceso y cumplimiento de todas las afiliaciones del personal que presta su servicio en la obra por parte del contratista.
- Visita técnica de seguimiento a la obra el día 29 de mayo y supervisión de capacitación por parte de la SISO del contratista.

5.3. Informes especialistas y profesionales

Los informes de los especialistas, profesionales y del director de la interventoría se entregan como anexos en las actas de costos de la interventoría.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

A la fecha el contratista no ha dado respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría a la programación inicial de la obra.

5.5. Informe matriz de riesgos

No se presenta Matriz de Riesgo, ya que no aplica debido a que en los documentos contractuales del contrato de obra no se presenta la matriz de riesgo.

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Dentro del presente período esta Interventoría llevó a cabo el diligenciamiento de los informes semanales en la plataforma o aplicativo CIFRA en los términos establecidos. En el anexo 5.6 se incluye el screenshot de los reportes semanales del presente periodo, diligenciados en el aplicativo CIFRA.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para llevar a cabo la interventoría de los contratos de obra en el periodo del presente informe, fue necesario el uso de los siguientes equipos y vehículos:

Equipo	Descripción
Equipo de computo	Hewfeltt packard CORE I5 modelo 2019
CAMIONETA	RENAULT CAPTUR MODELO 2019 PLACA ENN741
MOTOCICLETA	HONDA MODELO 2019 CC 150 PLACA WPW65E

El formato **MEPI-MN-IN-15-FR-5** se presenta en el Anexo 6.1.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

El formato **MEPI-MN-IN-15-FR-7** se presenta en el Anexo 6.2. En este mismo anexo se incluye las planillas de pago de la seguridad social.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

El formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9** INF FIN Y PRESUPUESTAL INT se presenta en el Acta de Cobro del presente mes.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

El seguimiento a las garantías contractuales del contrato de interventoría se relaciona en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-13** (ver Anexo 6.4). En este mismo anexo se incluye la póliza de garantía del contrato de Interventoría.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Teniendo en cuenta que el contrato de Interventoría No. 5025 de 2023, no contempla un profesional de Calidad, el seguimiento al Plan de Calidad no se encuentra dentro del alcance contractual de esta Interventoría, por lo cual, no se adjunta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-15** al presente documento.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la Inversión del anticipo

Teniendo en cuenta que para el contrato de Interventoría No. 5025 de 2023 la interventoría no solicitó anticipo, no se requiere realizar seguimiento a la inversión del Anticipo y, por lo tanto, los formatos **MEPI-MN-IN-3-FR-1** y **MEPI-MN-IN-3-FR-2** correspondientes al Plan de Inversión del Anticipo mensualizado contrato de Interventoría y registro de los movimientos detallados de la utilización del anticipo y saldo mensual por parte del Supervisor del contrato de interventoría, respectivamente, no aplican y no se incluyen en el presente informe.

6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

El formato **MEPI-MN1-IN-9-FR-2** PLAN CARGAS se incluye en el Anexo 6.6.2.

7. CONCLUSIONES

En conclusión, durante el mes de mayo, la interventoría ha desempeñado un papel crucial en el seguimiento y supervisión de los trabajos realizados por el contratista de obra, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos y el avance del proyecto. A través de reuniones periódicas y comités de obra, se han tratado temas relevantes y se han establecido compromisos para ambas partes, facilitando una comunicación efectiva y oportuna.

A lo largo del mes, las actividades en obra se han visto influenciadas por las condiciones climáticas adversas, con varias interrupciones debido a las fuertes lluvias. A pesar de estos desafíos, se han realizado avances en la conformación de terraplenes, el corte y retiro de material, y la adecuación de vías.

En cuanto a la gestión ambiental, se han llevado a cabo visitas técnicas, revisiones y aprobaciones de programas ambientales, y supervisión continua de las actividades para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales. La formación y supervisión del grupo ambiental y las capacitaciones a los trabajadores han sido fundamentales para mantener altos estándares ambientales en la obra.

La gestión social ha sido igualmente importante, con la instalación de puntos de información y buzones de sugerencias, y la apertura del Punto de Atención al Ciudadano para atender las inquietudes de la comunidad. Además, se ha garantizado que la contratación de mano de obra no calificada provenga de las veredas aledañas, beneficiando social y económicamente a la comunidad local.

En resumen, el mes de mayo ha sido un período de significativo avance y adaptación para el proyecto, con un enfoque integral en el progreso técnico, la gestión ambiental y la participación comunitaria, asegurando así un desarrollo equilibrado y responsable de la obra.

8. ANEXOS

ANEXO 0 RESUMEN DEL PROYECTO

ANEXO 3.2 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES (Se anexan en el acta de cobro)

ANEXO 4.1 INFORMES SEMANALES: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (reportes semanales).

ANEXO 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

ANEXO 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

ANEXO 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 y reporte SIIF.

ANEXO 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 y Registro pluviométrico del IDEAM.

ANEXO 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

ANEXO 4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 y póliza del contrato.

ANEXO 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. (NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA)

ANEXO 4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Formatos MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

ANEXO 4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES: Formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

ANEXO 4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA: formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

ANEXO 4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN: formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

ANEXO 5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS: screenshot estado aplicativo CIFRA.

ANEXO 6.1 EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

ANEXO 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 y planillas de pago.

ANEXO 6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. (Se anexa en el acta de cobro)

ANEXO 6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 y pólizas.

ANEXO 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (**NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**).

ANEXO 6.6.2 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS

ANEXO 8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 8.2 y 8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 8.4 COPIA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE

OTROS ANEXOS: ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1

ANEXO 0 RESUMEN DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar **PERIODO MES:** may-24

CONTRATO DE OBRA No.: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE SAS

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 10.67

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,065,988,709.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1,065,988,709.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	3720
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Túneles	N/A	
	Puentes	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Construcción de Alcantarillas de 36"	UNIDAD	12
	Construcción de Box Culvert doble de 3x3	UNIDAD	1
	Construcción de Box Culvert de 2X1	UNIDAD	4
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM	7.5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	0
	Mejoramiento	N/A		
	Rehabilitación	N/A		
Estructuras	Túneles	N/A		
	Puentes	N/A		
	Pontones	N/A		
Mantenimiento		N/A		
Otros (Especificar cuales)	Construcción de Alcantarillas de 7m de ancho	UNIDAD	0	0
	Construcción de Box Culvert doble de 3x3	UNIDAD	0	0
	Construcción de Box Culvert de 2X1	UNIDAD	0	0
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	10,644,530,061.10	0.00	10,644,530,061.10
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	4,750,965.00	0.00	4,750,965.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACION VIAL	25,700,616.96	4,429,526.91	30,130,143.87
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	10,674,981,643.06	4,429,526.91	10,679,411,170.0

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	348,221,072.00	0.00	348,221,072.00	348,221,072.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	47,002,620.00	0.00	47,002,620.00	47,002,620.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	395,223,692.00	0.00	395,223,692.00	395,223,692.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 840,242,733.04
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 348,221,072.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 41.44%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: N/A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N/A
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Vía Socomba-Pitalito - Corte de Material de Descapote y Material Comun






Vía Socomba-Pitalito - Material Para Conformación de Terraplen y actividad de conformación de terraplen

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 4.1 INFORMES SEMANALES: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (reportes semanales).

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 12 del 2/05/2024 al 9/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía que comunica a de la vereda Socomba a la vereda Pitalito, en el Municipio de Becerril, Cesar la cual tiene una longitud de 7,243 Kilómetros en total desde K0+000 hasta el K7+913, del cual se pretende intervenir parcialmente la vía en 2 tramos. Tramo 1: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.590 metros, iniciando en la abscisa K0+000 y finalizando en la abscisa K1+590. Tramo 2: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.880 metros, iniciando en la abscisa K2+100 y finalizando en la abscisa K3+980.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUAMBIENTES SAS		
INTEGRANTES:	CONSTRUAMBIENTES SAS 100%		
CONTRATO No.	149 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 10,679,411,170.00
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10,679,411,170.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 5,339,705,585.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5,339,705,585.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
INTEGRANTES:	MT PROJECTS SAS (10%), UMBRELLA INTERNATIONAL SAS (90%)		
CONTRATO No.	5025 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,065,988,709.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,988,709			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,988,709			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10,612,999,451.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 461,234,983.92	4.35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 163,670,919.52	1.54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (297,564,064.40)	-2.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 461,234,983.92	4.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,670,919.52	1.54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (297,564,064.40)	-2.80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132,659,463.75	1.25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25,545,120.00	0.24%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha no se encuentra radicadas, ni enviadas cuentas de cobro del contrato de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,441,616.00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,441,616.00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 35,147,205.33	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se envió la primera cuenta de cobro del contrato de interventoría el día 10/04/2024, se está a la espera de la revisión por parte del INVIAS y de la radicación de la factura.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	5,339,705,585.00
Amortizado $	$	3,713,207,792.00
Saldo $	$	1,626,497,793.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.73
Acumulado:	1.55

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa	Ha	2.00			Prog	2.00			2.00	100.0%
						Ejec	2.00			2.00	100.0%
	Demolición de estructuras de Alcantarillas	UND	96.00			Prog	96.00			96.00	100.0%
						Ejec					
*	Conformación de Calzada Existente	m2	24180.00			Prog	24180.00			24180.00	100.0%
						Ejec	24180.00			24180.00	100.00%
*	Excavaciones Varias sin Clasificar (Mejoramiento Subrasante)	m3	600.00			Prog	600.00			600.00	100.0%
						Ejec	600.00			600.00	100.00%
	Terraplenes	m3	7812.00			Prog	708.00			708.00	9.06%
						Ejec	708.00			708.00	9.06%
	Excavaciones Varias sin Clasificar (Estructuras y Drenaje)	m3	1029.00			Prog	229.00			229.00	22.3%
						Ejec					
	Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	m3	272.83			Prog	42.00			42.00	15.4%
						Ejec					
	Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	m3	15.40			Prog	2.40			2.40	15.6%
						Ejec					
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	124681.26			Prog	19182.00			19182.00	15.4%
						Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3.	1	1
Retrocargador de llantas con Potencia nominal del Motor Mínima de 64 kW.	1	
Vibro compactador con peso operativo mínimo de 7.000 Kg.	1	1
Motoniveladora de potencia mínima de 125 Hp.	1	1
Carrotanque con capacidad mínima de 10.000 Galones.	1	
Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen)	4	2
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	199987.20			Prog	57139.20			57139.20	28.6%
					Ejec	14400.00			14400.00	7.20%
Estudios y diseños	Km	3.72			Prog	3.72			3.72	100.0%
					Ejec	3.72			3.72	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PARCELA MAQUENCAL TRITURADORA LA JAGUA DE IBIRICO-LAS PALMITAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES: Se dispondrán materiales de la cantera GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S, ubicada en VIA MESA KM 4, VALLEDUPAR, CESAR. Los cuales cuentan con permiso minero RUCOM-2022080122230 y licencia ambiental emitida por CORPOCESAR mediante Resolución No. 0316 del 26 de octubre de 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Está pendiente la radicación de la solicitud del permiso de ocupación de cauce ante la alcaldía.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión.

OBSERVACIONES: Se encuentra en revisión el PAGA remitido por el contratista el día 30 de abril de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de abril se entregan los flyers del proyecto a la comunidad, citando a la socialización de la obra par el día 15 de abril de 2024. El día lunes 15 de abril se realiza la socialización del proyecto a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se enviaron observaciones de las Actas de Vecindad remitidas por el contratista mediante el comunicado No. O-MVPS-010 del 22 de marzo del 2024. Se está a la espera de la subsanación de las observaciones por parte del contratista.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades en la semana
El dia 03 de Mayo de 2024, se realiza comite de seguimiento de Obra, tambien se realiza retiro de material de descapote y adecuación de vias con motoniveladora, Clima LLuvioso.
El dia 04 de Mayo, No se realizan actividades por fuertes lluvias presentadas el dia 03 de mayo en horas de la noche y el dia 04 de mayo en horas de la mañana.
El dia 06 de Mayo, Se realizan actividades de conformación de Terraplen desde el K3+220 hasta el K3 + 720 y se realizan actividades de retiro de material de descapote con volquetas.
El dia 07 de Mayo, Se continua con la conformación de Terraplen, se presenta clima seco y se continua con el retiro de material de descapote.
El dia 08 de Mayo, No se realizaron actividades por fuertes LLuvias presentadas en horas de la madrugada y en horas de la mañana.
El dia 09 de Mayo, debido a la continuidad de las fuertes lluvias presentadas no se logro continuar con las actividades de terraplen y retiro de material de excavación.

Actividades acumuladas
Longitud acumulada construcción de vía: 0 km

NOTA: El contrato de interventoría No. 5025 de 2023 con fecha de inicio del 28 de diciembre de 2023, fue suspendido el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024. El día 29 de enero se suspende nuevamente el contrato hasta el 15 de febrero de 2024. Adicionalmente, se realizó prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con las actividades de conformación de Terraplen

2. Adecuación de Puntos Criticos de la Via debido a las lluvias presentadas

3. Actividades de Control Topografico

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

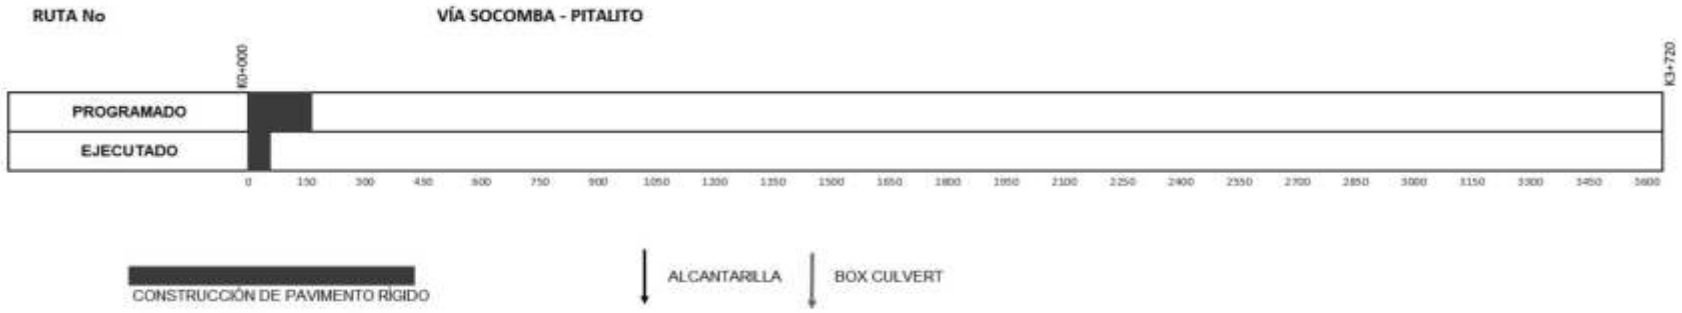

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Socomba Pitalito - Estado de la Via por LLuvias



Via Socomba Pitalito - Conformación de Terraplen



Vía Socomba Pitalito - Material Para Conformación de Terraplen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se remitirá apremio al contratista por la falta de envío de información a la interventoría.	FIRMA NOMBRE: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 13 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía que comunica a de la vereda Socomba a la vereda Pitalito, en el Municipio de Becerril, Cesar la cual tiene una longitud de 7,243 Kilómetros en total desde K0+000 hasta el K7+913, del cual se pretende intervenir parcialmente la vía en 2 tramos. Tramo 1: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.590 metros, iniciando en la abscisa K0+000 y finalizando en la abscisa K1+590. Tramo 2: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.880 metros, iniciando en la abscisa K2+100 y finalizando en la abscisa K3+980.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUAMBIENTES SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
INTEGRANTES:	CONSTRUAMBIENTES SAS 100%			INTEGRANTES:	MT PROJECTS SAS (10%), UMBRELLA INTERNATIONAL SAS (90%)		
CONTRATO No.	149 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 10,679,411,170.00	CONTRATO No.	5025 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10,679,411,170.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 5,339,705,585.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5,339,705,585.00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,065,988,709.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,988,709			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,988,709			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10,612,999,451.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 562,670,995.70	5.30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 250,129,719.52	2.36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (312,541,276.18)	-2.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 47,002,620.00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,664,815,211.00	99.86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 297,132,339.52	2.80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (312,541,276.18)	-2.94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 144,393,516.40	1.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 86,458,800.00	0.81%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha no se encuentra radicadas, ni enviadas cuentas de cobro del contrato de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,441,616.00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,441,616.00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se envió la primera cuenta de cobro del contrato de interventoría el día 10/04/2024, se está a la espera de la revisión por parte del INVIAS y de la radicación de la factura.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	5,339,705,585.00
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	5,339,705,585.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2.46
Acumulado:	2.82

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5.30%
Meta Física Ejecutada % 2.36%
Avance o Atraso Físico % -2.94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa	Ha	2.00			Prog	2.00			2.00	100.0%
					Ejec	2.00			2.00	100.0%
Demolición de estructuras de Alcantarillas	m3	96.00			Prog	96.00			96.00	100.0%
					Ejec					
* Conformación de Calzada Existente	m2	24180.00			Prog	15898.35			15898.35	65.8%
					Ejec	24180.00			24180.00	100.00%
* Excavaciones Varias sin Clasificar (Mejoramiento Subrasante)	m3	600.00			Prog	394.50			394.50	65.8%
					Ejec	600.00			600.00	100.00%
Terraplenes	m3	7812.00			Prog					
					Ejec	708.00			708.00	9.06%
Excavaciones Varias sin Clasificar (Estructuras y Drenaje)	m3	1029.00			Prog	388.45			388.45	37.8%
					Ejec					
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	m3	272.83			Prog	60.96			60.96	22.3%
					Ejec					
Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	m3	15.40			Prog	3.44			3.44	22.3%
					Ejec					
Rellenos de Estructuras Con material de Excavación	m3	561.00			Prog	55.22			55.22	9.84%
					Ejec					
Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de Diametro Interior	m	136.50			Prog	13.44			13.44	9.84%
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	124681.26			Prog	27858.47			27858.47	22.3%
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3.	1	1
Retrocargador de llantas con Potencia nominal del Motor Mínima de 64 kW.	1	
Vibro compactador con peso operativo mínimo de 7.000 Kg.	1	1
Motoniveladora de potencia mínima de 125 Hp.	1	1
Carrotanque con capacidad mínima de 10.000 Galones.	1	
Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen)	4	2
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	199987.20			Prog	99993.60			99993.60	50.0%
					Ejec	79800.00			79800.00	39.90%
Estudios y diseños	Km	3.72			Prog	3.72			3.72	100.0%
					Ejec	3.72			3.72	100.0%
Obras de Compensación ambiental y/o complementarias	und	1.00			Prog	0.29			0.29	29.0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA SOCOMBA PITALITO**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PARCELA MAQUENCAL TRITURADORA	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LA JAGUA DE IBIRICO-LAS PALMITAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES: Se dispondrán materiales de la cantera GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S, ubicada en VIA MESA KM 4, VALLEDUPAR, CESAR. Los cuales cuentan con permiso minero RUCOM-2022080122230 y licencia ambiental emitida por CORPOCESAR mediante Resolución No. 0316 del 26 de octubre de 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Está pendiente la radicación de la solicitud del permiso de ocupación de cauce ante la alcaldía.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión.

OBSERVACIONES: Se encuentra en revisión el PAGA remitido por el contratista el día 30 de abril de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de abril se entregan los flyers del proyecto a la comunidad, citando a la socialización de la obra par el día 15 de abril de 2024. El día lunes 15 de abril se realiza la socialización del proyecto a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se enviaron observaciones de las Actas de Vecindad remitidas por el contratista mediante el comunicado No. O-MVPS-010 del 22 de marzo del 2024. Se está a la espera de la subsanación de las observaciones por parte del contratista.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades en la semana
El dia 10 de Mayo, no se realizaron actividades por las altas precipitaciones presentadas a lo largo del dia.
El dia 11 de Mayo, se realizaron actividades de corte y retiro de material comun con excavadora y volquetas, tambien se realizo la adecuación de la via con motoniveladora. Clima Seco
El dia 14 de Mayo, se continuan con las actividades de corte y retiro de material comun y material de descapote desde K2 + 720 hasta K3 + 720. Clima Seco.
El dia 15 de Mayo, continuan las actividades de corte de material de descapote y material comun desde K2 + 720 hasta K3 + 720, y se continua con la adecuación de la Via con Motoniveladora. Clima Seco.
El dia 16 de Mayo, se avanzan en las actividades de corte y retiro de material comun con excavadora y volquetas desde K2 + 220 hasta K3 + 720. Clima Seco.

Actividades acumuladas
Longitud acumulada construcción de vía: 0 km

NOTA: El contrato de interventoría No. 5025 de 2023 con fecha de inicio del 28 de diciembre de 2023, fue suspendido el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024. El día 29 de enero se suspende nuevamente el contrato hasta el 15 de febrero de 2024. Adicionalmente, se realizó prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar las actividades de corte y retiro de material comun

2. Conformación de Terraplen

3. Demolición de Alcantarillas y Adecuación para Instalación de Nuevas Alcantarillas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

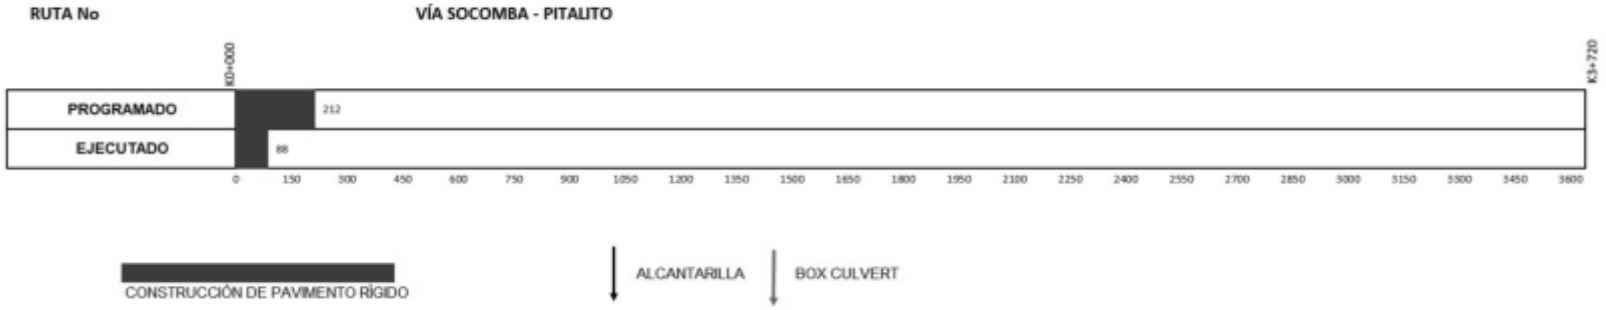

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Socomba Pitalito - Corte de Material de Descapote y Material Comun



Vía Socomba Pitalito - Retiro de Material de Descapote y Material Comun



Vía Socomba Pitalito - Conformación de Via Con Motoniveladora

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se remitirá apremio al contratista por la falta de envío de información a la interventoría.	FIRMA NOMBRE: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 14 del 17/05/2024 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía que comunica a de la vereda Socomba a la vereda Pitalito, en el Municipio de Becerril, Cesar la cual tiene una longitud de 7,243 Kilómetros en total desde K0+000 hasta el K7+913, del cual se pretende intervenir parcialmente la vía en 2 tramos. Tramo 1: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.590 metros, iniciando en la abscisa K0+000 y finalizando en la abscisa K1+590. Tramo 2: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.880 metros, iniciando en la abscisa K2+100 y finalizando en la abscisa K3+980.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUAMBIENTES SAS		
INTEGRANTES:	CONSTRUAMBIENTES SAS 100%		
CONTRATO No.	149 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 10,679,411,170.00
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10,679,411,170.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 5,339,705,585.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5,339,705,585.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
INTEGRANTES:	MT PROJECTS SAS (10%), UMBRELLA INTERNATIONAL SAS (90%)		
CONTRATO No.	5025 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,065,988,709.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,988,709			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,988,709			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10,612,999,451.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 695,849,216.64	6.56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 326,963,440.00	3.08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (368,885,776.64)	-3.48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 47,002,620.00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 742,851,836.64	6.96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 373,966,060.00	3.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (368,885,776.64)	-3.48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 144,393,516.40	1.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53,144,400.00	0.50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha no se encuentra radicadas, ni enviadas cuentas de cobro del contrato de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,441,616.00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,441,616.00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se envió la primera cuenta de cobro del contrato de interventoría el día 10/04/2024, se está a la espera de la revisión por parte del INVIAS y de la radicación de la factura.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5,339,705,585.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 5,339,705,585.00

	INDICADOR I/C
En el mes:	1.51
Acumulado:	3.55

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6.56%
Meta Física Ejecutada % 3.08%
Avance o Atraso Físico % -3.48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa	Ha	2.00			Prog	2.00			2.00	100.0%
					Ejec	2.00			2.00	100.0%
Demolición de estructuras de Alcantarillas	m3	96.00			Prog	96.00			96.00	100.0%
					Ejec					
* Conformación de Calzada Existente	m2	24180.00			Prog	18799.95			18799.95	77.8%
					Ejec	24180.00			24180.00	100.00%
* Excavaciones Varias sin Clasificar (Mejoramiento Subrasante)	m3	600.00			Prog	466.50			466.50	77.8%
					Ejec	600.00			600.00	100.00%
Terraplenes	m3	7812.00			Prog					
					Ejec	708.00			708.00	9.06%
Excavaciones Varias sin Clasificar (Estructuras y Drenaje)	m3	1029.00			Prog	511.93			511.93	49.8%
					Ejec					
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	m3	272.83			Prog	81.42			81.42	29.8%
					Ejec					
Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	m3	15.40			Prog	4.60			4.60	29.8%
					Ejec					
Rellenos de Estructuras Con material de Excavación	m3	561.00			Prog	97.30			97.30	17.34%
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3.	1	1
Retrocargador de llantas con Potencia nominal del Motor Mínima de 64 kW.	1	
Vibro compactador con peso operativo mínimo de 7.000 Kg.	1	1
Motoniveladora de potencia mínima de 125 Hp.	1	1
Carrotanque con capacidad mínima de 10.000 Galones.	1	
Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen)	4	2
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de Diametro Interior	m	136.50			Prog	23.67			23.67	17.34%
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	124681.26			Prog	37209.56			37209.56	29.8%
					Ejec					
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	199987.20			Prog	111826.18			111826.18	55.9%
					Ejec	120000.00			120000.00	60.00%
Estudios y diseños	Km	7.50			Prog	7.50			7.50	100.0%
					Ejec	7.50			7.50	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA SOCOMBA PITALITO**
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PARCELA MAQUENCAL TRITURADORA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LA JAGUA DE IBIRICO-LAS PALMITAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se dispondrán materiales de la cantera GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S, ubicada en VIA MESA KM 4, VALLEDUPAR, CESAR. Los cuales cuentan con permiso minero RUCOM-2022080122230 y licencia ambiental emitida por CORPOCESAR mediante Resolución No. 0316 del 26 de octubre de 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Está pendiente la aprobación de la solicitud de intervención de cauce.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Radicado

OBSERVACIONES: Se dio aval al documento PAGA por parte de la interventoría. Este documento fue enviado y radicado ante el INVIAS mediante el comunicado FRATLA-2024-090 del 27 de mayo de 2024, para su revisión por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de abril se entregan los flyers del proyecto a la comunidad, citando a la socialización de la obra par el día 15 de abril de 2024. El día lunes 15 de abril se realiza la socialización del proyecto a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 17
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se revisaron y se dio aval a las fichas prediales enviadas por el contratista en el informe mensual del mes de abril. Estas serán radicadas ante el INVIAS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades en la semana

El dia 17 de Mayo, se realizan actividades de corte de material comun en las abscisas K3 + 450 a K3 + 720, para un volumen de corte y retiro de material 304 m3. Clima Seco
El dia 18 de Mayo, se continuan con las actividades de corte de manterial comun en las abscisas K3 + 450 a K3 + 720, para un volumen de corte y retiro de Material de 320 m3. Clima Seco.
El dia 20 de Mayo, se continuan con con las actividades de corte de material comun en las abscisas K3 + 450 a K3 + 720, para un volumen de corte y retiro de Material de 224 m3, se realiza comite de obra. Lluvias presentadas en la noche.
El dia 21 de Mayo, no se realizan actividades debido a las lluvias presentadas durate la jornada de operación. Clima LLuvioso.
El dia 22 de Mayo, se continuan con las actividades de corte en las Abscisas K3 + 450 a K3 + 720, para un volumen de corte y retiro de material de 232 m3. Clima Nublado.
El dia 23 de Mayo, se continua con las actividades de corte de material comun en las Abscisas K3 + 450 a K3 + 720, para un volumen de corte y retiro de material de 256 m3. Clima Nublado

Actividades acumuladas


Longitud acumulada construcción de vía: 0 km

NOTA: El contrato de interventoría No. 5025 de 2023 con fecha de inicio del 28 de diciembre de 2023, fue suspendido el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024. El día 29 de enero se suspende nuevamente el contrato hasta el 15 de febrero de 2024. Adicionalmente, se realizó prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar las actividades de corte y retiro de material comun

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

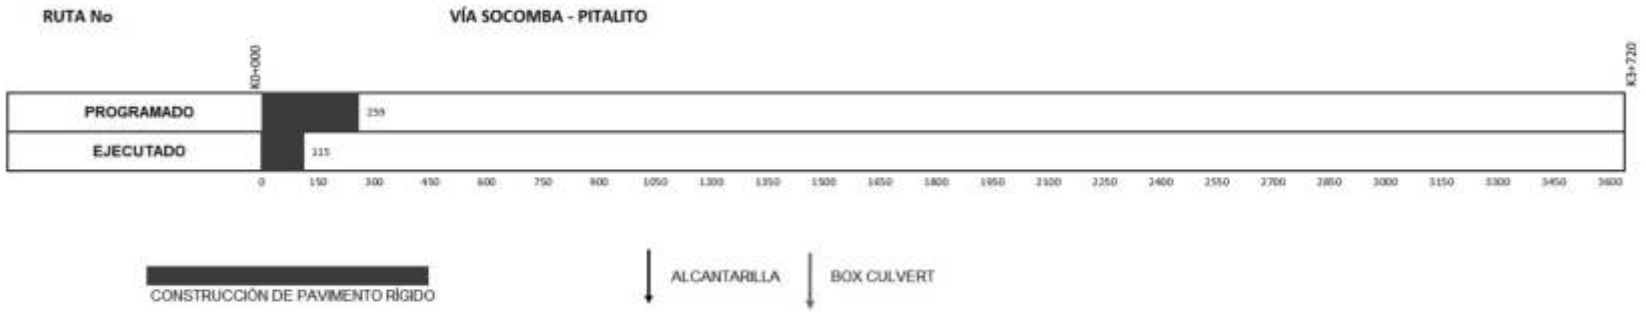

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Socomba Pitalito - Corte de Material Común



Via Socomba Pitalito - Retiro de Material Común



Vía Socomba Pitalito - Actividades de Topografia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se remitirá apremio al contratista por la falta de envío de información a la interventoría.	FIRMA NOMBRE: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 15 del 24/05/2024 al 31/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía que comunica a de la vereda Socomba a la vereda Pitalito, en el Municipio de Becerril, Cesar la cual tiene una longitud de 7,243 Kilómetros en total desde K0+000 hasta el K7+913, del cual se pretende intervenir parcialmente la vía en 2 tramos. Tramo 1: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.590 metros, iniciando en la abscisa K0+000 y finalizando en la abscisa K1+590. Tramo 2: El tramo en concreto hidráulico tiene una longitud de 1.880 metros, iniciando en la abscisa K2+100 y finalizando en la abscisa K3+980.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSTRUAMBIENTES SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
INTEGRANTES:	CONSTRUAMBIENTES SAS 100%			INTEGRANTES:	MT PROJECTS SAS (10%), UMBRELLA INTERNATIONAL SAS (90%)		
CONTRATO No.	149 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 10,679,411,170.00	CONTRATO No.	5025 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10,679,411,170.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,988,709.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 5,339,705,585.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 5,339,705,585.00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,065,988,709.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10,679,411,170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,988,709			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,988,709			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10,612,999,451.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 840,242,733.04	7.92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 348,221,072.00	3.28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (492,021,661.04)	-4.64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 47,002,620.00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 887,245,353.04	8.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 395,223,692.00	3.72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (492,021,661.04)	-4.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 144,393,516.40	1.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,257,632.00	0.20%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha no se encuentra radicadas, ni enviadas cuentas de cobro del contrato de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,441,616.00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,441,616.00	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 35,147,205.33	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,147,205.33	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se envió la primera cuenta de cobro del contrato de interventoría el día 10/04/2024, se está a la espera de la revisión por parte del INVIAS y de la radicación de la factura.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5,339,705,585.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 5,339,705,585.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.60
Acumulado:	3.75

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7.92%
Meta Física Ejecutada % 3.28%

Avance o Atraso Físico % -4.64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa	Ha	2.00			Prog	2.00			2.00	100.0%
					Ejec	2.00			2.00	100.0%
Demolición de estructuras de Alcantarillas	m3	96.00			Prog	96.00			96.00	100.0%
					Ejec					
* Conformación de Calzada Existente	m2	24180.00			Prog	21701.55			21701.55	89.8%
					Ejec	24180.00			24180.00	100.00%
* Excavaciones Varias sin Clasificar (Mejoramiento Subrasante)	m3	600.00			Prog	538.50			538.50	89.8%
					Ejec	600.00			600.00	100.00%
Terraplenes	m3	7812.00			Prog					
					Ejec	728.00			728.00	9.32%
Excavaciones Varias sin Clasificar (Estructuras y Drenaje)	m3	1029.00			Prog	635.41			635.41	61.8%
					Ejec					
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	m3	272.83			Prog	101.88			101.88	37.3%
					Ejec					
Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	m3	15.40			Prog	5.75			5.75	37.3%
					Ejec					
Rellenos de Estructuras Con material de Excavación	m3	561.00			Prog	139.37			139.37	24.84%
					Ejec					
Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de Diametro Interior	m	136.50			Prog	33.91			33.91	24.84%
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3.	1	1
Retrocargador de llantas con Potencia nominal del Motor Mínima de 64 kW.	1	
Vibro compactador con peso operativo mínimo de 7.000 Kg.	1	1
Motoniveladora de potencia mínima de 125 Hp.	1	1
Carrotanque con capacidad mínima de 10.000 Galones.	1	
Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen)	4	2
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	124681.26			Prog	46560.66			46560.66	37.3%
					Ejec					
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	199987.20			Prog	119825.66			119825.66	59.9%
					Ejec	135056.00			135056.00	67.53%
Estudios y diseños	Km	7.50			Prog	7.50			7.50	100.0%
					Ejec	7.50			7.50	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA SOCOMBA PITALITO**
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PARCELA MAQUENCAL TRITURADORA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LA JAGUA DE IBIRICO-LAS PALMITAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se dispondrán materiales de la cantera GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S, ubicada en VIA MESA KM 4, VALLEDUPAR, CESAR. Los cuales cuentan con permiso minero RUCOM-2022080122230 y licencia ambiental emitida por CORPOCESAR mediante Resolución No. 0316 del 26 de octubre de 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A			
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		X	

OBSERVACIONES: Está pendiente la aprobación de la solicitud de intervención de cauce.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión.

OBSERVACIONES: Se dio aval al documento PAGA por parte de la interventoría. Este documento fue enviado y radicado ante el INVIAS mediante el comunicado FRATLA-2024-090 del 27 de mayo de 2024, para su revisión por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de abril se entregan los flyers del proyecto a la comunidad, citando a la socialización de la obra par el día 15 de abril de 2024. El día lunes 15 de abril se realiza la socialización del proyecto a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 17
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se revisaron y se dio aval a las fichas prediales enviadas por el contratista en el informe mensual del mes de abril. Estas serán radicadas ante el INVIAS.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades en la semana

El dia 24 de Mayo, se realizan actividades de corte de material comun en las abscisas K3 + 000 a K3 + 450, para un volumen de corte y retiro de material 328 m3. Clima Seco
El dia 25 de Mayo, no se realizaron actividades por motivos de lluvias presentadas en todo el dia. Clima LLuvioso
El dia 27 de Mayo, se continuan las actividades de corte y retiro de material comun en las abscisas K3 + 000 a K3 + 450, para un volumen de corte y retiro de material 224 m3. Clima seco
El dia 28 de Mayo, se continuan las actividades de corte y retiro de material comun en las abscisas K3 + 000 a K3 + 450, para un volumen de corte y retiro de material 160 m3. Clima Nublado.
El dia 29 de Mayo, se continuan ejecutando las actividades de corte y retiro de material en las abscisas K3 + 000 a K3 + 450, para un volumen de corte y retiro de material de 352 m3. Clima Seco.
El dia 31 de Mayo, se realizan actividades de conformación de Terraplen en las abscisas K3 + 640 a K3 + 720. Clima Seco

Actividades acumuladas


Longitud acumulada construcción de vía: 0 km

NOTA: El contrato de interventoría No. 5025 de 2023 con fecha de inicio del 28 de diciembre de 2023, fue suspendido el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024. El día 29 de enero se suspende nuevamente el contrato hasta el 15 de febrero de 2024. Adicionalmente, se realizó prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar las actividades de conformación de Terraplen.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

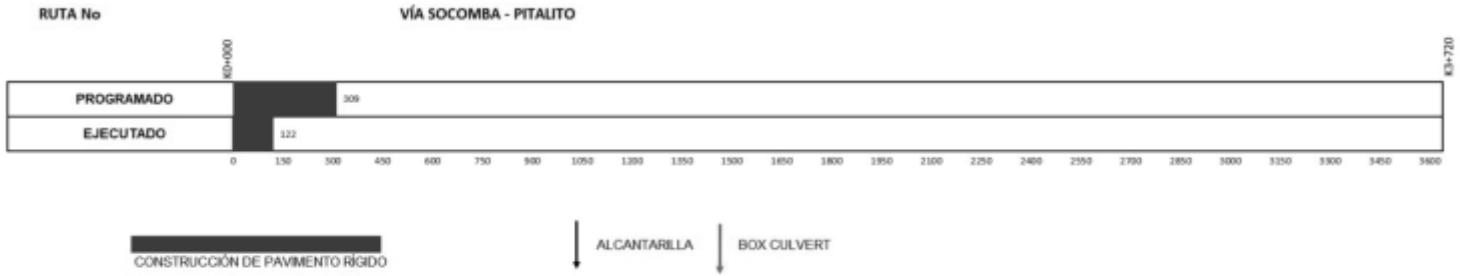

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Socomba Pitalito - Corte de Material Común



Vía Socomba Pitalito - Conformación de Terraplen y Conformación de Calzada.



Vía Socomba Pitalito - Actividades de PMT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se remitirá apremio al contratista por la falta de envío de información a la interventoría.	FIRMA NOMBRE: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MOTONIVELADORA	MARCA: CATERPILLAR AR, MODELO: C-7	Potencia mínima de 125 Hp	Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA DE ORUGA		Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3	Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR		peso operativo mínimo de 7000 Kg	Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
PAJARITA			Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA SENCILLA			Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA			Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA			Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA			Vía Socomba Pitalito	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	248	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	205	83%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	43	17%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La MOTONIVELADORA, empieza a operar desde el 22 de marzo realizando el desmonte y limpieza de los bordes de vía. Cabe resaltar que aún se esta en etapa de estudios y diseños.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contratista presenta documentacion sobre el equipo minimo requerido el dia 26 de febrero, en la revision de las caracteristicas minimas que deben tener los equipos se verifica que la motoniveladora cumple con lo especificado y requerido en el anexo tecnico de obra, sin embargo, no cumple con los demas equipos requeridos, se envia oficio FRATLA-2024-031 con las observaciones al respecto y dando un plazo de 3 dias habiles para que el contratista presente la documentacion requerida para el equipo minimo requerido faltante, los cuales corresponden a Un (1) Vibro compactador con peso operativo mínimo de 7.000 Kg, cuatro (4) Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen), Un (1) Retrocargador de llantas con Potencia nominal del Motor Mínima de 64 kW, Una (1) Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3, Un (1) Carrotanque con capacidad mínima de 10.000 Galones. AÚN SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ABELINO QUINTERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-365794 NTS

Firma
Nombre: JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-83495NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Dirección Territorial Cesar

CONTRATO DE OBRA No: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE S.A.S. NIT: 824.006.325 – 5

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5025 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO NIT: 901.781.112 – 5

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Jose Jose Avilez Perales	12522884	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2,600,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	NUEVA E.P.S. S.A.- EPS037	29562852	$ 104,000	PORVENIR-230301	29562852	$ 416,000	$ 104,000	$ -	$ -	N/A
3	Beleño Quiroz Rosmaris	49786087	SECRETARIA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SANITAS-EPS005	29562852	$ 52,000	PORVENIR-230301	29562852	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
4	Bello Aramendiz Dailin Janeth	1065606272	AUXILIAR CONTABLE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 522	V	SANITAS-EPS005	29562852	$ 52,000	COLPENSION-ES-25-14	29562852	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
5	Cortazar Torres Erika Yamile	52182970	PROFESIONAL SST	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SANITAS-EPS005	29562852	$ 52,000	PORVENIR-230305	29562852	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
6	Peña Bello Lainiris	1065611356	CONTADORA	$ 2,459,200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 522	V	SALUD TOTAL-EPS002	29562852	$ 98,400	COLFONDOS-231001	29562852	$ 393,600	$ 98,400	$ -	$ -	N/A
7	Rodriguez Romero Klaireth Karina	1065820902	AUXILIAR CONTABLE	$ 1,360,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 522	V	SANITAS-EPS005	29562852	$ 54,400	COLPENSION-ES-25-14	29562852	$ 217,600	$ 54,400	$ -	$ -	N/A
8	Gomez Brito Wilmer Junior	79953559	DIRECTOR DE OBRA	$ 2,128,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SANITAS-EPS006	29592810	$ 266,000	COLPENSION-ES-25-14	29592810	$ 340,500	$ -	$ -	$ -	N/A
9	Rodriguez Medina Amarlis Esther	49733729	PROFEDIONAL SOCIAL	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SALUD TOTAL-EPS002	29592810	$ 162,500	SINAFP-SINAFP	29592810	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
10	Vergel Lopez Jesus Edgardo	13175967	ESPECIALISTA EN VIAS Y/O PAVIMENTOS	$ 1,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	NUEVA E.P.S. S.A.- EPS037	29592810	$ 225,000	COLFONDOS-231001	29592810	$ 288,000	$ -	$ -	$ -	N/A
11	Alfaro Benitez Nestor Javier	13871003	RESIDENTE DE OBRA 2	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SALUD TOTAL-EPS002	29392822	$ 162,500	PORVENIR-230301	29392822	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	N/A
12	Egurrola Hernandez Edwar	12644705		$ 2,320,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SANITAS-EPS005	29392822	$ 290,000	PORVENIR-230301	29392822	$ 371,200	$ -	$ -	$ -	N/A
13	Lopez Mejia Carlos Enrique	2768341	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SANITAS-EPS005	29392822	$ 162,500.00	PORVENIR-230301	29392822	$ 208,000.00	$ -	$ -	$ -	N/A
14	Parra Salinas Jorge Eliecer	79262203	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	ALIANSALUD EPS-EPS001	29392822	$ 162,500.00	COLPENSION-ES-25-14	29392822	$ 208,000.00	$ -	$ -	$ -	N/A
15	Quintero Rivera Abelino	1066086066	RESIDENTE DE OBRA 1	$ 2,459,200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	EPS CAJACOPI-CCFC55	29614310	$ 98,400	PORVENIR-230301	29614310	$ 393,500	$ 98,400	$ -	$ -	N/A
16	Puello Carrillo Jorge Luis	1062805874	ALMACENISTA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	NUEVA E.P.S. S.A.- EPS037	29614310	$ 52,000	PORVENIR-230301	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
17	Oñate Rosado Aristides Rafael	5176588	OPERADOR	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SALUD TOTAL-EPS002	29614310	$ 52,000	SINAFP-SINAFP	29614310	$ -	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
18	Gomez Paredes Jorge Leonardo	1064112500	OPERADOR	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	FAMISANAR-EPS017	29614310	$ 52,000	PORVENIR-230301	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
19	Gonzales Garces Enrry Javier	1064720114	OPERADOR	$ 2,120,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	29614310	$ 84,800	PORVENIR-230301	29614310	$ 339,000	$ 84,800	$ -	$ -	N/A
20	Gomez Gutierrez Rafael Antonio	84046057	OPERADOR	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	FAMISANAR-EPS017	29614310	$ 52,000	COLPENSION-ES-25-14	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
21	Cudris Avila Miguel Ricardo	12523951	CONDUCTOR	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	NUEVA E.P.S. S.A.- EPS037	29614310	$ 52,000	COLFONDOS-231001	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
22	Cuartas Atehortua Gonzalo Hernan	3489795	MECANICO	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	EPS-S COOLSALUD-ESSC24	29614310	$ 52,000	COLPENSION-ES-25-14	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
23	Castrillo Amaya Yorbis Domingo	1065853092	CADENERO	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SALUD TOTAL-EPS002	29614310	$ 52,000	PORVENIR-230301	29614310	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	N/A
24	Alvarez Orozco Jesus Alberto	1003039005	CADENERO	$ 1,300,000	X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	SALUD TOTAL-EPS002	29652420	$ 7,000	PORVENIR-230301	29652420	$ 27,800	$ 7,000	$ -	$ -	N/A
25	Parada Dominguez Daniel Enrique	1067595842	CADENERO	$ 1,300,000	X X X	ConstruAmbiente	0	$ 6,960	V	NUEVA E.P.S. S.A.- EPS037	29652420	$ 7,000	PORVENIR-230301	29652420	$ 27,800	$ 7,000	$ -	$ -	N/A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se relacionan aportes legales y seguridad social del contratista de obra mes vencido, es decir, para el presente informe del mes de abril se debería anexar la información correspondiente al mes de ABRIL de 2024. Sin embargo, a la fecha el contratista no ha remitido a esta interventoría las planillas de seguridad social del personal de obra correspondiente al mes de ABRIL.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: WILMER GOMEZ BRITO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202158763

Firma

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 y reporte SIIF.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar

CONTRATO DE OBRA No: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	772	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 - 2023, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOCOMBA - PITALITO	03-31324028-2.3.2.02.02.005.01-1006	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 10,679,411,170	$ -
			TOTAL			$ 10,679,411,170	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 10,679,411,170.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		feb-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	772-2023	$ 10,679,411,170	$ 10,679,411,170	N/A			
		mar-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	772-2023	$ 10,679,411,170	$ 10,679,411,170	N/A			
		abr-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	772-2023	$ 10,679,411,170	$ 10,679,411,170	N/A			
		may-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	772-2023	$ 10,679,411,170	$ 10,679,411,170	N/A			
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 10,679,411,170	$ 10,679,411,170				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -		$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE	$ 0.00	$ -	$ -
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -		$ -
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ -		$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILMER GOMEZ BRITO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202158763

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 y Registro pluviométrico del IDEAM.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar

CONTRATO DE OBRA No: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	18	19	21	17	20	24	24	24	0	15	19	24	24	24	24	24	24	24	24	15	12	19	19	17	8	20	24	24	20	21	24	616
Lluvias moderadas	0	1	0	2	0	0	0	0	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	5	5	3	8	0	0	0	4	3	0	67
Lluvias intensas	6	4	3	5	4	0	0	0	9	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	5	6	4	0	0	0	0	0	60
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	22	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se consulta Registro pluviometrico del IDEAN correspondiente a las estaciones mas cercanas donde se ejecutara el proyecto, sin embargo, la pagina no registra datos para el rango de dias que es objeto del presente informe, se adjunta evidencia.



Firma
Nombre: ABELINO QUINTERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-365794 NTS

Firma
Nombre: JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-83495NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 4/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cesar

CONTRATO DE OBRA No.: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	31/05/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DE CONO Y ARENA	INV E-161	TERRAPLEN SELECCIONADO	4	N/A	DENSIDAD MAXIMA: 123.6 lb/pie3 COMPACTACIÓN TERRENO: 93.4 %	SI	N/A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: WILMER GOMEZ BRITO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202158763

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

V & O INGENIERÍA SAS	**DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DE CONO Y ARENA** NORMA DE ENSAYO – INV. E-161-13	VERSIÓN 3 VIGENCIA 20/05/15
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE: **DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**31 DE MAYO DE 2024**	CÓDIGO:	DT.RE.AP.014-07-2		
SOLICITANTE:	CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	LOCALIZACIÓN OBRA:	**MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR**		
DIRECCIÓN:	**CALLE 6D 19A #2-62 LOS MUSICOS - VALLEDUPAR**	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	**TERRAPLEN**	LABORATORISTA:	**YEIMAR BARROS**
OBRA:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR**	FECHA DE ENSAYO:	**31 DE MAYO DE 2024**		

DENSIDADES N° 01					
Localizacion: K 2+720 al K3+720		K2+960	K3+210	K3+460	K3+710
Peso frasco +cono+arena inicial	**grs**	5215,00	5220,00	5203,00	5197,00
Peso frasco +cono+arena final	**grs**	2122,00	2122,00	2058,00	2211,00
Peso total arena usada	**grs**	3093,00	3098,00	3145,00	2986,00
Constante del cono	**grs**	1612,00	1612,00	1612,00	1569,00
Peso arena en el hueco	**grs**	1481,00	1486,00	1533,00	1417,00
Densidad de la arena	**grs/cm^3**	1,42	1,42	1,42	1,42
Volumen del hueco	**cm^3**	1043,00	1046,48	1080,00	998,00
Peso del material extraído húmedo	**grs**	2064,00	2050,00	2063,00	1975,00
Humedad	**%**	7 ,00	7,00	7,00	7,00
Peso material extraído seco	**grs**	1929,00	1915,89	1928,00	1846,00
Densidad seca	**grs/cm3**	1,85	1,83	1,78	1,85
Densidad seca	**lbs/pie^3**	115,40	114,24	111,40	115,40
Densidad máxima en el laboratorio	**lbs/pie^3**	123,60	123,60	123,60	123,60
Compactación terreno	**%**	93,40	93,50	92,43	93,40

Observaciones _____

_____

IMPORTANTE

* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

REVISÓ Y APROBÓ
EBERTO ORTEGA SERRANO
DIRECTOR TÉCNICO

ANEXO 4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS Y SEGURO S CONTRATO DE OBRA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 y póliza del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

FECHA DE INICIO: 19 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO INICIAL: 7

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 10,679,411,170.00

VALOR ACUMULADO: $ 10,679,411,170.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 47,002,620.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 47,002,620.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1,067,941,117.00	29	12	2023	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 5,339,705,585.00	29	12	2023	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 533,970,558.50	29	12	2023	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 1,067,941,117.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400052402

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 533,970,558.50	29	12	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052403 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1,067,941,117.00	19	2	2024	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 5,339,705,585.00	19	2	2024	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 533,970,558.50	19	2	2024	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 1,067,941,117.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 158061

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 533,970,558.50	19	2	2024	31	12	2024
Otros	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052403 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
152151	BOGOTA	11		15	400052403	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
30 / 11 / 2023	30 / 11 / 2023	00:00	31 / 12 / 2023	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	533.970.558,50	533,970,558.50	533.970.558,50	158.728,23

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 158.728,23	$ 14.700,00	$ 32.951,36	$ 206.379,59	Día - Mes - Año 01/12/2023	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 533.970.558,50	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTA\

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052403	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 30 11 2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
30 11 2023	00:00	31 12 2023	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052403

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	206.380,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
01/12/2023	$ 206.379,59

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 30 DE 2.023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
154260	BOGOTA	11		15	400052403	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
3 / 1 / 2024	29 / 12 / 2023	00:00	31 / 12 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	533.970.558,50	533,970,558.50	533.970.558,50	1.874.017,22

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 1.874.017,22	$ 0,00	$ 356.063,27	$ 2.230.080,49	03/01/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 533.970.558,50	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTA\

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052403	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 3 1 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
29 12 2023	00:00	31 12 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PRORROGA VIGENCIA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052403

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	2.230.080,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
03/01/2024	$ 2.230.080,49

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 3 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
158061	BOGOTA		11		30	400052402	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
1 / 3 / 2024	19 / 2 / 2024	00:00	31 / 12 / 2029	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSULTORIA CONSTRUCCION DE VIAS UR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2024	30/06/2025	1.067.941.117.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/02/2024	31/12/2027	533.970.558.50	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/02/2024	30/06/2025	5.339.705.585.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	1.067.941.117.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 28/02/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 8.009.558.377,50	OCHO MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052402	2	BOGOTA	1 /3 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /2 /2024	00:00 Horas del 31 /12 /2029	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
28/02/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 1 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052402, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSTRUAMBIENTE S.A.S
NIT : 824.006.325 - 5
Asegurado : MUNICIPIO DE BECERRIL
NIT : 800.096.576 - 4

Se expide la presente certificación a los 01 días del mes de Marzo de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
158062	BOGOTA	11		15	400052403	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
1 / 3 / 2024	19 / 2 / 2024	00:00	31 / 12 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	533.970.558,50	533,970,558.50	533.970.558,50	8.793,50

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 8.793,50	$ 0,00	$ 1.670,76	$ 10.464,26	Día - Mes - Año 28/02/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 533.970.558,50	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTA\

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052403	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 1 3 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
19 2 2024	00:00	31 12 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052403

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	10.464,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
28/02/2024	$ 10.464,26

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 1 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
152150	BOGOTA		11			30	400052402	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
30 / 11 / 2023	30 / 11 / 2023	00:00	31 / 12 / 2028	00:00	EXPEDICIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSULTORIA CONSTRUCCION DE VIAS UR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2023	30/06/2024	1.067.941.117.00	2.181.233,16
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/11/2023	31/12/2025	533.970.558.50	3.901.642,41
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/11/2023	30/06/2024	5.339.705.585.00	10.906.165,79
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2028	1.067.941.117.00	18.709.450,61

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 35.698.491,97	$ 14.700,00	$ 6.785.506,47	$ 42.498.698,44	Día - Mes - Año 01/12/2023	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 8.009.558.377,50	OCHO MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	42.498.698,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
01/12/2023	$ 42.498.698,44

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 30 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052402, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSTRUAMBIENTE S.A.S
NIT : 824.006.325 - 5
Asegurado : MUNICIPIO DE BECERRIL
NIT : 800.096.576 - 4

Se expide la presente certificación a los 30 días del mes de Noviembre de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
154265	BOGOTA		11		30	400052402	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
3 / 1 / 2024	29 / 12 / 2023	00:00	31 / 12 / 2029	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PRORROGA VIGENCIA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSULTORIA CONSTRUCCION DE VIAS UR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2023	30/06/2025	1.067.941.117.00	3.737.793,91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2023	31/12/2027	533.970.558.50	3.737.793,91
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/12/2023	30/06/2025	5.339.705.585.00	18.688.969,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	1.067.941.117.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 26.164.557,37	$ 0,00	$ 4.971.265,90	$ 31.135.823,27	Día - Mes - Año 04/01/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 8.009.558.377,50	OCHO MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052402	1	BOGOTA	3 /1 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 29 /12 /2023	00:00 Horas del 31 /12 /2029	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	31.135.823,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
04/01/2024	$ 31.135.823,27

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 3 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052402, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSTRUAMBIENTE S.A.S
NIT : 824.006.325 - 5
Asegurado : MUNICIPIO DE BECERRIL
NIT : 800.096.576 - 4

Se expide la presente certificación a los 03 días del mes de Enero de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
158491	BOGOTA		11		30	400052402	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
8 / 3 / 2024	19 / 2 / 2024	00:00	31 / 12 / 2029	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL, ASI:

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BECERRIL NIT. 800096576-4 Y O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800215807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSULTORIA CONSTRUCCION DE VIAS UR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2024	30/06/2025	1.067.941.117.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/02/2024	31/12/2027	533.970.558.50	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/02/2024	30/06/2025	5.339.705.585.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	1.067.941.117.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 09/03/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 8.009.558.377,50	OCHO MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052402	3	BOGOTA	8 /3 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /2 /2024	00:00 Horas del 31 /12 /2029	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BECERRIL	NIT	800.096.576 - 4
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE BECERRIL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
09/03/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 8 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052402, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSTRUAMBIENTE S.A.S
NIT : 824.006.325 - 5
Asegurado : MUNICIPIO DE BECERRIL
NIT : 800.096.576 - 4

Se expide la presente certificación a los 08 días del mes de Marzo de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
158490	BOGOTA	11		15	400052403	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
8 / 3 / 2024	19 / 2 / 2024	00:00	31 / 12 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	533,970,558,50	533,970,558,50	533,970,558,50	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 09/03/2024	824006325

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 533.970.558,50	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTA\

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052403	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 8 3 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
19 2 2024	00:00	31 12 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5
DIRECCIÓN	CL 6 D 19 A 2 62 OF 101, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3209827345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSTRUAMBIENTE S.A.S	NIT	824.006.325 - 5	TELÉFONO	3209827345
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL, ASI:

TOMADOR: CONSTRUAMBIENTE S.A.S
ASEGURADO: MUNICIPIO DE BECERRIL NIT. 800096576-4 Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800215807-2/CONSTRUAMBIENTE S.A.S
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADO Y/O MUNICIPIO DE BECERRIL NIT. 800096576-4 Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800215807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052403

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
09/03/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 8 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO 4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Formatos MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

JUSTIFICACIÓN:
N/A
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE	$ 309,041,200.00	$ 225,800,000.00	$ 199,141,200.00		$ 733,982,400.00	13.75%
2	REPOSICION DE ESTRUCTURA	$ 965,125,000.00	$ 485,200,000.00	$ 279,725,001.00		$ 1,730,050,001.00	32.40%
3	ACERO DE REFUERZO	$ 584,590,000.00	$ 450,410,000.00	$ 254,590,000.00		$ 1,289,590,000.00	24.15%
4	TRANSPORTE	$ 146,200,000.00	$ 46,200,000.00	$ 46,200,000.00	$ 46,200,000.00	$ 284,800,000.00	5.33%
5	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	$ 100,320,796.00	$ 400,320,796.00	$ 400,320,796.00	$ 400,320,796.00	$ 1,301,283,184.00	24.37%
	TOTAL	$ 2,105,276,996.00	$ 1,607,930,796.00	$ 1,179,976,997.00	$ 446,520,796.00	$ 5,339,705,585.00	100.00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JOSE JOSE AVILEZ PEREZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** 4 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 16900 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 3-0070-0-00724-2 **BANCO** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 5,339,705,585.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	FACTURA PROFORMA No. 900053673-4498685526	15-may-24	CEMEX COLOMBIA S.A.	$ 400,320,796.00	5	PAVIMENTO CONCRETO HIDRUALICO
FACTURA	PROFORMA No. IB 616	15-may-24	IND. FERRETERAS EL PROYECTO	$ 150,000,000.00	3	ACERO DE REFUERZO
FACTURA	PROFORMA No. 0018	16-may-24	INVERSIONES A&N COLOMBIAS.A.S.	$ 104,590,000.00	3	ACERO DE REFUERZO
FACTURA	PROFORMA No. 0015	15-may-24	INVERSIONES A&N COLOMBIAS.A.S.	$ 199,141,200.00	1	PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE
FACTURA	PROFORMA No. 0016	15-may-24	INVERSIONES A&N COLOMBIAS.A.S.	$ 279,725,001.00	2	REPOSICION DE ESTRUCTURA
FACTURA	PROFORMA No. 0017	15-may-24	INVERSIONES A&N COLOMBIAS.A.S.	$ 46,200,000.00	4	TRANSPORTE

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE	$ 733,982,400.00	$ 534,841,200.00	$ 199,141,200.00	$ 733,982,400.00	$ -
2	REPOSICION DE ESTRUCTURA	$ 1,730,050,001.00	$ 1,450,325,000.00	$ 279,725,001.00	$ 1,730,050,001.00	$ -
3	ACERO DE REFUERZO	$ 1,289,590,000.00	$ 1,035,000,000.00	$ 254,590,000.00	$ 1,289,590,000.00	$ -
4	TRANSPORTE	$ 284,800,000.00	$ 192,400,000.00	$ 46,200,000.00	$ 238,600,000.00	$ 46,200,000.00
5	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	$ 1,301,283,184.00	$ 500,641,592.00	$ 400,320,796.00	$ 900,962,388.00	$ 400,320,796.00
	TOTALES	$ 5,339,705,585.00	$ 3,713,207,792.00	$ 1,179,976,997.00	$ 4,893,184,789.00	$ 446,520,796.00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () : ABRIL $ 929,055.00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2,023,991.97
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 1,094,936.97	$ -	mar-24	2/04/2024	$ 1,094,937
2	$ 929,055	$ -	abr-24	3/05/2024	$ 2,023,992

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JOSE AVILEZ PERALES
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	18	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901535623	NIT	INDUSTRIAS FERRETERAS EL PROYECTO SAS	19700003264	Ahorros	Bancolombia	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesar	Valledupar	CRA 16 20B-67	ferreproyecto@hotmail.com		3168233966	4752	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		



FERREMATERIALES EL PROYECTO

Nit 901535623

Cra 16 N° 20B - 67 TEL. 5708269

TEL. 318 567 62 59 - 5708269

Valledupar - Cesar

PROFORMA No.

IB 900

CLIENTE	CONSTRU AMBIENTE S.A.S	**DIRECCION**	CALLE 6B #19A2-62
NIT	824006325 5	**CIUDAD**	Valledupar
FECHA	miércoles, 15 de mayo de 2024	**TELEFONO**	5734514
VENDEDOR	WILCHER ENRIQUE FANDIÑO REDONDO	**FECHA VENC.**	15-may-24

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2" COMP	5.000,00	Und.	23.606	19%	118.029.412
VARILLA CORRUGADA 3/8" COMP	579,00	Und.	13.855	19%	8.021.008

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**126.050.420**
IVA	**23.949.580**
TOTAL DOCUMENTO	**150.000.000**

Observacion: Pago anticipado

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

Generado por software contable y financiero World Office.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 Actualización

4. Número de formulario 14936758833

(415)7707212489984(8020) 000001493675883 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 6 2 3	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INDUSTRIAS FERRETERAS EL PROYECTO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 20 B 67 BRR LA GRANJA

42. Correo electrónico ferreproyecto@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 2 3 3 9 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 1 1 0 2 8	4 6 6 3	2 0 2 1 1 0 2 8	0 1 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	7	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 11 / 09 : 58: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOHORQUEZ GALVIS ISNARDO ACESIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	19	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 46.200.000,00	$ 0,00	$ 46.200.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901170828	NIT	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	19792759693	Corriente	Bancolombia	$ 46.200.000,00		$ 46.200.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesar	Valledupar	CALLE 6 No. 13-24 - Apto 1304	jj.avilez@gmail.com	5725963	3207660439	4731	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S

Nit. 901170828-8

Calle 6 No. 13-24 -Edificio Multicentro :-: Cel. 3207660439
Valledupar-Cesar

Fecha: 15 DE MAYO DE 2024	**FACTURA PROFORMA No 0017**
Nombre: CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	
NIT: 824006325-5	**Forma de Pago: ANTICIPO**
Dirección: CALLE 6D 19A2-62 OFICINA 101	
Ciudad: Valledupar	
Teléfono: 3207660439	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UND	VR. TOTAL
1	TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO DE LA OBRA	M3	1,00	$ 46.200.000,00	$ 46.200.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
			COSTO DIRECTO		$ 46.200.000,00
			TOTAL		$ 46.200.000,00



FIRMA CLIENTE **FIRMA AUTORIZADA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906865321

(415)7707212489984(8020) 000001490686532 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 8 2 8	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INVERSIONES A&N COLOMBIA-SKY BLUE LA JAGUA DE IBIRICO-ESTACION DE S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 N 13 24 AP 13 04

42. Correo electrónico jj.avilez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 3 3 5 1 4	3 2 0 7 6 6 0 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 1 8 0 4 0 3	5 5 3 0	2 0 1 8 0 4 0 3	6 8 1 0	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 04 / 11 : 24: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO LARROTA XIMENA BEATRIZ
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	20	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 400.320.796,00	$ 0,00	$ 400.320.796,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
860002523	NIT	CEMEX COLOMBIA S.A.	30420684311	Corriente	Bancolombia	$ 400.320.796,00		$ 400.320.796,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Bogota	Bogota D.C	CL 99 9A 54 P 8	correo.juridica@cemex.com	6039000	3112209244	2394	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
5,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

CEMEX COLOMBIA S.A.
NIT. 860.002.523-1

Fecha:	May 15, 2024	**FACTURA PROFORMA No.**	**9000053673-4498685526**		
NIT	824006325-5				
Cliente:		CONSTRUAMBIENTE SAS			
Obra:		VIA PITALITO	**Comercial Responsable:**	ANDREA TRESPALACIOS	
Dirección Facturación:	BECERRIL				
Persona Solicitante:	ANDREA TRESPALACIOS				
Cargo:	Asesor Comercial				
Teléfono:	3174409337		**Email:**	andreajuliana.trespalacios@cemex.com	

Codigo Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Vr/Total
10004381	Cemento Uso Estructural * 42.5 Kg	TN	567.12	$ 705,884	$ 400,320,796

Observaciones:

ANTICIPO SEGUN ACUERDO COMERCIAL

Importe en letras:

SON : CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Subtotal		$ 400,320,796
IVA	19%	$
Neto a pagar		**$ 400,320,796**

Banco de Bogotá	**ITAU**	**Davivienda**	**BBVA**	**Bancolombia**
9088881	012-39526-5	470-169985731	297 95045 3	30420684311

No practicar retención, este documento es una factura proforma. sólo tiene efectos informativos para la generación de anticipos y los precios estipulados,no condiciona las facturas que se generen ni sus variaciones. Enviar soporte de consignación al correo ingresos.colombia@cemex.com

Durante y posterior a la venta de materiales o prestación de servicios se podrán generar cargos adicionales que en esta factura proforma no están incluidos.

Aceptada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [ ] 2 Actualización

4. Número de formulario 14963610396

(415)7707212489984(8020) 000001496361039 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 2 5 2 3	1	Operativa de Grandes Contribuyente	3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CEMEX COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 9 A 54 P 8

42. Correo electrónico correo.juridica@cemex.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 3 9 0 0 0	3 1 1 2 2 0 9 2 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 4	1 9 2 7 0 7 2 9	2 3 9 5	2 0 0 7 1 2 2 1		4 6 6 3	0 9 9 0		4 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 21 / 10 : 01: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL CABRERA NATALIE EDITH
985. Cargo Apoderado General Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	15	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 199.141.200,00	$ 0,00	$ 199.141.200,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901170828	NIT	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	19792759693	Corriente	Bancolombia	$ 199.141.200,00		$ 199.141.200,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesar	Valledupar	CALLE 6 No. 13-24 - Apto 1304	jj.avilez@gmail.com	5725963	3207660439	4731	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S

Nit. 901170828-8

Calle 6 No. 13-24 -Edificio Multicentro :-: Cel. 3207660439
Valledupar-Cesar

Fecha: 15 DE MAYO DE 2024	**FACTURA PROFORMA No 0015**
Nombre: CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	
NIT: 824006325-5	**Forma de Pago: ANTICIPO**
Dirección: CALLE 6D 19A2-62 OFICINA 101	
Ciudad: Valledupar	
Teléfono: 3207660439	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UND	VR. TOTAL
1	EJECUCION DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DENTRO DEL CONTRATO 149 DE 2023	GL	1,00	$ 199.141.200,00	$ 199.141.200,00
2					
3					
4					
5					
6					
	COSTO DIRECTO				$ 199.141.200,00
	TOTAL				$ 199.141.200,00

FIRMA CLIENTE **FIRMA AUTORIZADA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906865321

(415)7707212489984(8020) 000001490686532 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 8 2 8	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INVERSIONES A&N COLOMBIA-SKY BLUE LA JAGUA DE IBIRICO-ESTACION DE S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 N 13 24 AP 13 04

42. Correo electrónico jj.avilez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 3 3 5 1 4	3 2 0 7 6 6 0 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 1 8 0 4 0 3	5 5 3 0	2 0 1 8 0 4 0 3	6 8 1 0	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 04 / 11 : 24: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO LARROTA XIMENA BEATRIZ
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	16	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 279.725.001,00	$ 0,00	$ 279.725.001,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901170828	NIT	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	19792759693	Corriente	Bancolombia	$ 279.725.001,00		$ 279.725.001,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesar	Valledupar	CALLE 6 No. 13-24 - Apto 1304	jj.avilez@gmail.com	5725963	3207660439	4731	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S

Nit. 901170828-8

Calle 6 No. 13-24 -Edificio Multicentro :-: Cel. 3207660439
Valledupar-Cesar

Fecha: 15 DE MAYO DE 2024	**FACTURA PROFORMA No 0016**
Nombre: CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	
NIT: 824006325-5	**Forma de Pago: ANTICIPO**
Dirección: CALLE 6D 19A2-62 OFICINA 101	
Ciudad: Valledupar	
Teléfono: 3207660439	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UND	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE	M3	1.462,94	$ 191.208,00	$ 279.725.001,00
2					
3					
4					
5					
6					
	COSTO DIRECTO				$ 279.725.001,00
	TOTAL				$ 279.725.001,00



FIRMA CLIENTE **FIRMA AUTORIZADA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906865321

(415)7707212489984(8020) 000001490686532 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 8 2 8	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INVERSIONES A&N COLOMBIA-SKY BLUE LA JAGUA DE IBIRICO-ESTACION DE S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 N 13 24 AP 13 04

42. Correo electrónico jj.avilez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 3 3 5 1 4	3 2 0 7 6 6 0 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 1 8 0 4 0 3	5 5 3 0	2 0 1 8 0 4 0 3	6 8 1 0	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 04 / 11 : 24: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO LARROTA XIMENA BEATRIZ
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Valledupar	16	5	2024	17	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 104.590.000,00	$ 0,00	$ 104.590.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16900	P.A. ANT. CONSTRUAMBIENTES SAS	19700007199	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901170828	NIT	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	19792759693	Corriente	Bancolombia	$ 104.590.000,00		$ 104.590.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesar	Valledupar	CALLE 6 No. 13-24 - Apto 1304	jj.avilez@gmail.com	5725963	3207660439	4731	Cesar	Becerril

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3,0	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S

Nit. 901170828-8

Calle 6 No. 13-24 -Edificio Multicentro :-: Cel. 3207660439
Valledupar-Cesar

Fecha: 16 DE MAYO DE 2024	**FACTURA PROFORMA No 0018**
Nombre: CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	
NIT: 824006325-5	**Forma de Pago: ANTICIPO**
Dirección: CALLE 6D 19A2-62 OFICINA 101	
Ciudad: Valledupar	
Teléfono: 3207660439	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UND	VR. TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA 1/2" COMP	UND	3.008,55	$ 28.091,00	$ 84.513.120,00
2	VARRILLA CORRUGADA 3/8" COMP	UND	1.060,00	$ 16.488,00	$ 17.477.280,00
3	ALAMBRE NEGRO X KG	KG	400,00	$ 6.499,00	$ 2.599.600,00
4					
5					
6					
			COSTO DIRECTO		$ 104.590.000,00
			TOTAL		$ 104.590.000,00

FIRMA CLIENTE **FIRMA AUTORIZADA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906865321

(415)7707212489984(8020) 000001490686532 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 8 2 8	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INVERSIONES A&N COLOMBIA-SKY BLUE LA JAGUA DE IBIRICO-ESTACION DE S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 N 13 24 AP 13 04

42. Correo electrónico jj.avilez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 3 3 5 1 4	3 2 0 7 6 6 0 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 1 8 0 4 0 3	5 5 3 0	2 0 1 8 0 4 0 3	6 8 1 0	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 04 / 11 : 24: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO LARROTA XIMENA BEATRIZ
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$46.200.000,00
IDENTIFICACIÓN	901170828	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
17/05/2024	19	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	19792759693	CTE	BANCOLOMBIA	$46.200.000,00	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	INVERSIONES A&N COLOMBIA S.A.S.	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$583.456.201,00
IDENTIFICACIÓN	901170828	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
21/05/2024	17	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	19792759693	CTE	BANCOLOMBIA	$104.590.000,00	Transacción Exitosa**	-
21/05/2024	16	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	19792759693	CTE	BANCOLOMBIA	$279.725.001,00	Transacción Exitosa**	-
21/05/2024	15	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	19792759693	CTE	BANCOLOMBIA	$199.141.200,00	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	INDUSTRIAS FERRETERAS EL PROYECTOS SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$150.000.000,00
IDENTIFICACIÓN	901535623	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
21/05/2024	18	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	19700003264	AHO	BANCOLOMBIA	$150.000.000,00	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	CEMEX COLOMBIA S.A.	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$400.320.796,00
IDENTIFICACIÓN	860002523	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
21/05/2024	20	*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	30420684311	CTE	BANCOLOMBIA	$400.320.796,00	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$380.821,76
IDENTIFICACIÓN	900517804	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
05/06/2024		*******7199	AHO	BANCOLOMBIA S.A.	300700007242	CTE	BANCO AGRARIO	$380.821,76	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES: Formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 149 DE 2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

PLAZO INICIAL: 7 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 10 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 10,679,411,170.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 10,679,411,170.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRELIMINARES	$21,343	0.20%	$11,568	% P	0.01%	0.10%	0.09%								
				$ P	$1,304	$10,265	$9,775								
				$ E											
				% E											
MEJORAMIENTNO SUBRASANTE	$601,749	5.67%	$0	% P			0.23%	0.39%	1.01%	1.49%	1.20%	1.20%	0.16%		
				$ P			$24,649	$40,899	$107,281	$158,615	$126,892	$126,892	$16,522		
				$ E											
				% E											
PAVIMENTO RIGIDO	$8,030,721	75.67%	$0	% P					3.38%	14.30%	11.44%	11.44%	14.30%	11.44%	9.38%
				$ P					$358,916	$1,517,222	$1,213,778	$1,213,778	$1,517,222	$1,213,778	$996,028
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$1,638,020	15.43%	$0	% P			0.34%	5.27%	4.67%	4.99%	0.17%				
				$ P			$36,093	$558,850	$495,444	$530,053	$17,580				
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES	$264,383	2.49%	$63,232	% P	0.20%	0.40%	0.43%	0.47%	0.40%	0.50%	0.10%				
				$ P	$20,930	$42,301	$45,826	$49,352	$42,301	$52,877	$10,796				
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN VIAL	$56,783	0.54%	$0	% P											0.54%
				$ P											$56,783
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 10,612,999.45**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.21%**	**0.50%**	**1.10%**	**6.12%**	**9.46%**	**21.28%**	**12.90%**	**12.63%**	**14.45%**	**11.44%**	**9.92%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 22,233.97**	**$ 52,566**	**$ 116,343.12**	**$ 649,099.83**	**$ 1,003,942.17**	**$ 2,258,766.32**	**$ 1,369,045.21**	**$ 1,340,669.51**	**$ 1,533,744.42**	**$ 1,213,777.63**	**$ 1,052,811.46**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.21%**	**0.70%**	**1.80%**	**7.92%**	**17.38%**	**38.66%**	**51.56%**	**64.19%**	**78.64%**	**90.08%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 22,233.97**	**$ 74,799.79**	**$ 191,142.90**	**$ 840,242.73**	**$ 1,844,184.91**	**$ 4,102,951.23**	**$ 5,471,996.43**	**$ 6,812,665.94**	**$ 8,346,410.36**	**$ 9,560,187.99**	**$ 10,612,999.45**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
N/A

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE JOSE AVILEZ PEREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602

Revisó Firma:
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Revisó
Firma:
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 68202 - 1344776 STD

Revisó Firma:
Nombre: JUAN FRANCISCO GARCÍA
Gestor Técnico de Provecto
Matrícula Profesional No.: 25202 - 282367 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

PLAZO INICIAL: 7 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 10,679,411,170.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 10,679,411,170.00

PLAZO ACUMULADO: 10 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	((%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA) / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 19 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	2 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	3 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	4 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	5 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	6 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	7 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	8 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	9 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	10 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	11 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PRELIMINARES	$21,343	0.20%	$11,568	% P	0.01%	0.10%	0.09%									
			$370	$ P	$1,304	$10,265	$9,775									
				$ E	$0	$370	$0									
				% E	0.00%	0.00%	0.00%									
MEJORAMIENTNO SUBRASANTE	$601,749	5.67%	$65,547	% P			0.23%	0.38%	1.01%	1.49%	1.19%	1.19%	0.15%			
			$120,951	$ P			$24,649	$40,899	$107,281	$158,615	$126,892	$126,892	$16,522			
				$ E			$98,992	$23,959								
				% E			0.91%	0.23%								
PAVIMENTO RIGIDO	$8,030,721	75.67%	$0	% P				-	3.37%	14.23%	11.38%	14.23%	11.38%	11.38%	9.34%	
			$0	$ P					$358,916	$1,517,222	$1,213,778	$1,213,778	$1,517,222	$1,213,778	$998,028	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$1,638,020	15.43%	$0	% P			0.34%	5.24%	4.65%	4.97%	0.16%					
			$0	$ P			$36,093	$558,850	$495,444	$530,053	$17,580					
				$ E			$0	$0								
				% E			0.00%	0.00%								
TRANSPORTES	$264,383	2.49%	$63,232	% P	0.20%	0.40%	0.43%	0.46%	0.40%	0.50%	0.10%					
			$25,450	$ P	$20,930	$42,301	$45,826	$49,352	$42,301	$52,877	$10,796					
				$ E	$0	$8,000	$17,450	$4,685								
				% E	0.00%	0.08%	0.16%	0.04%								
SEÑALIZACIÓN VIAL	$56,783	0.54%	$0	% P											0.53%	
			$0	$ P											$56,783	
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 10,612,999.45	100%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.21%**	**0.49%**	**1.09%**	**6.09%**	**9.41%**	**21.18%**	**12.84%**	**12.57%**	**14.38%**	**11.38%**	**9.87%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22,234**	**$52,566**	**$116,343**	**$649,100**	**$1,003,942**	**$2,258,766**	**$1,369,045**	**$1,340,670**	**$1,533,744**	**$1,213,778**	**$1,052,811**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.21%**	**0.70%**	**1.79%**	**7.88%**	**17.29%**	**38.47%**	**51.31%**	**63.88%**	**78.26%**	**89.64%**	**99.51%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22,234**	**$74,800**	**$191,143**	**$840,243**	**$1,844,185**	**$4,102,951**	**$5,471,996**	**$6,812,666**	**$8,346,410**	**$9,560,188**	**$10,612,999**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.08%**	**1.08%**	**0.27%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,370**	**$114,442**	**$28,644**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.08%**	**1.16%**	**1.43%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,370**	**$122,813**	**$151,456**							

105281146.27%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
N/A

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE JOSE AVILEZ PEREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA: formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPIAMN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PAGINA	1 de 3

FECHA: 7/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SVR. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR.

CONTRATO DE OBRA No. 149 de 29/09/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior del comité #5 llevado a cabo el 9 de Abril 2024.
- Se llevó a cabo la Socialización de Inicio de Obra. 15 de Abril.
- Se inició obra en el KO3+720. con actividades de Corte.
- Se Subsana PAGA, y se revisa observaciones.
- Se Instaló PMT previo inicio obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de Obra: Se informa que se llevan actividades de corte y colocación de Terraplén en los primeros 500mts
- Se verifica información pendiente de Entrega adicionales
- Paros y Bloqueos de Comisiones / Volquetas.
- Permiso de Ocupación de Cauce.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3
FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Rendimientos financieros Anticipo: Se solicitará al municipio el reporte de Rendimientos financieros del Anticipo. La Interventoria solicitará dicho reporte. y se remite a INVIAS comprobante y extractos.
- Avance de Obra: A 30 de Abril se tiene un programado 2,3% frente a un ejecutado 1,5%
- Paro de Volquetas: Se han realizado paros de Volquetas en el municipio labor que no ha facilitado el Avance. en el 22 de Marzo y 26 Marzo.
- Acta Modificatoria: Se realizaron ajustes al diseño geométrico existente debido a altas pendientes y ajustes en el diseño de Pavimento con la eliminación de la Base Grosadar. Desmonte de cerca. Se recomienda incluir. precios no previstos si se requieren.
- Permiso de Intervención de Cauce: El contratista adelanta consulta al municipio y se confirma que es obligación del Contratista liderar dicho trámite. se adelantará para el BOX - coulvert.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Radicación Permiso Ocupación	10/05/2024	Contratista
- Rendimientos financieros Anticipo	10/05/2024.	Interventoría.
- PAGA SUBSANADO se Remite a INVIAS	10/05/2024	Interventoría.
- Acta Modificatoria	14/05/2024	Contratista/Inter
- Completar firma Actor Vecindad	10/05/2024.	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gilberto Martinez	R.L.	INTERVENTORIA	
Maria Alejandra Vega	Profesional Ambiental	Interventoria	Maria Alejandra Vega.
Yaqueline Manosalva D	Profesional Social	Interventoria	Yaqueline M.D.
Aspirino Quintero R	Residente de obra	contratista	
Jose Jose Avila	RL	Construcciones	
Felipe CARDENAS.	ASESOR OBRAS P.	MUNICIPIO	
Gil Abril	DT. INTERVENTOR	INTERVENTOR	
Omar Gómez	Sup. Interventoria.	Invias.	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN: formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vias regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Direccion territorial cesar

CONTRATO DE OBRA No. 149 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Subsanara temas pendientes del anterior comité.

Conocer avance de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Subsanación de compromisos anteriores
Avance de obra.

Balance general y programación de obra.

Bitacora.

Tramite de perimiso de cauce.

Actas de vecindad.

Plan de intervencion de cercas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/05/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 03 de mayo siendo las 9 de la mañana se realizo de forma vitual comité de seguimiento de contrato de obra No 149 de 2023. Llevandoce a cabo los temas ya mencionados anteriormente donde estuvieron presente el residente, gerente, profesional socia, ambiental del contratista, director, residente,inspector, profesional ambiental y profesional social de interventoria. Se dio a conocer el avance y programacion de la obra, se subsanaron varios compromisos pactados del ultimo comite realizado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	








FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Balance final	viernes, 3 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Programación de obra	sábado, 4 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Trámite permiso de cauce	lunes, 6 de mayo de 2024	CONTRATISTA

FECHA PROXIMA REUNION 6/05/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GILBERTO MARTINEZ	DIRECTOR	FRAILECILLO ATLANTICO	
IVETH MARTINEZ	AUXILIAR	FRAILECILLO ATLANTICO	
MARIA ALEJANDRA VEGA	PROFESIONAL AMBIENTAL	FRAILECILLO ATLANTICO	
YAQUEILEN MANOSALVA	PROFESIONAL SOCIAL	FRAILECILLO ATLANTICO	
BISSMARK PEDROZO	INSPECTOR	FRAILECILLO ATLANTICO	
JOSE AVILEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSTRUAMBIENTE	
ABELINO QUINTERO	RESIDENTE	CONSTRUAMBIENTE	
RAULITH BRITO	ESP. DISEÑO PAVIMENTO	CONSTRUAMBIENTE	
ADRIANA PALACIOS	INGENIERA AMBIENTAL	CONSTRUAMBIENTE	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vias regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Direccion territorial cesar

CONTRATO DE OBRA No. 149 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Subsanara temas pendientes del anterior comité.

Conocer avance de obra.

Realizar segumiento a la obra .

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Subsanación de compromisos anteriores

Avance de obra.

Balance general y programación de obra.

Documentos ambientales.

Tramite permiso de cauce.

Diseño hidrahulico.

Documentacion de afilicaciones y soportes de maquinaria.

Polizas.

Bitacora.

Plan de intervencion de cerca.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	16/05/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 16 de mayo siendo las 10 de la mañana se realizo de forma vitual comité de seguimiento de contrato de obra No 149 de 2023.
Llevandoce a cabo los temas mencionados anteriormente donde estuvieron presente el residente del contratista, director, residente,inspector, profesional ambiental y profesional social de interventoria.

Se dio a conocer el avance y programacion de la obra, se subsanaron varios compromisos pactados del ultimo comite realizado.

El contratista va a radicar ante la alcaldia para que lo radiquen y lo aprueben.

El contratista comenta que faltan unos arreglos en los diseños hidraulicos para radicar permiso de cauce ante CORPOCESAR.

Para el dia de hoy se envia escaneada la bitacora del mes de abril.

Se aclara que se deben presentar las afiliciaones del mes de abril.

Se pide al contratista que pase documentacion de los volqueteros con los que se esta trabajando.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)






COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reimitir a interventoaria nuevo correo electronico.	jueves, 16 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Polizas	viernes, 17 de amyo de 2024	CONTRATISTA
Documentos ambientales PAGA .	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Envio de Informe #3.	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Diseños hidraulicos.	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Enviar balance final a la alcaldia para que se aprurbn loa nuevos items	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Planillas	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Actas de vecindad (vienen con el infiorme mensual de abril)	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Radicación permiso de cauce.	lunes, 20 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Documentación minima de maquinaria y equipos.	lunes, 20 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Documentacion de volqueteros y volquetas (afilicaciones,soat, tecnio-mecanica).	martes, 21 de mayo de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ABELINO QUINTERO	RESIDENTE	CONSTRUAMBIENTE	
GILBERTO MARTINEZ	DIRECTOR	FRAILECILLO ATLANTICO	
IVETH MARTINEZ	AUXILIAR	FRAILECILLO ATLANTICO	
MARIA ALEJANDRA VEGA	PROFESIONAL AMBIENTAL	FRAILECILLO ATLANTICO	
YAQUEILEN MANOSALVA	PROFESIONAL SOCIAL	FRAILECILLO ATLANTICO	
BISSMARK PEDROZO	INSPECTOR	FRAILECILLO ATLANTICO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 / 3

FECHA 10/5/2024 (Día Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 149/ANI 23 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTE S.A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento vía Rodadura Sectores y Pitalito, Becerril

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5028/Dic 28/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Fusilecillo Atlántico

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al avance de obras
Revisión el avance de obras
Facturas con mes mayo/2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Aprobación de cinco vías para la Pavimentación de la vía
2. Aprobación del 3+720 al 8+720. con Estudios del diseño
3. Tubería Ø 36" Alcanzo 14 Ø 36" para dos Alcantarillas - K 3+660 y K 3+570.
4. Realizar plasticidad 10. Saber cómo es 13 en Compleo.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2/3

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(4) Las obras se encuentran en construcción, estando localizadas desde el PR...

(5) Zonas de depósito

Ubicación Zonas de Depósito a 30 km del centro de Cusiana del contrato.

A.O zonas sitios. CO-
A.O canteras y mantenimiento GAS.

(6) Se hizo el balance de las obras con los insumos A.P.U-

(1) Excavación en roca y préstamo - 210.1
(2) Relleno con material seleccionado - --
(3) Remoción cercas alambre - 201.16
(4) Colocación cerca alambre púas - 900.10

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3/3
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
(1) Entrega de Acta	15/08/2024	Constructor Ambiental SAS
(2) Mantenimiento periodico	14/08/2024	Constructor S. A
(3) Aprobacion polizas.	14/08/2024	Interventoria S.A
(4) Documentos pago.	09/08/2024	Contratista
(5) Retiro de Acta.	Inmediato	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNION 14/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian	Residente	Interventoria	
Abelino Cuentas	Ing Residente	contratista	
Bissmarck Pedroza	Inspector	Interventoria	
Adriana Palacios	Ing. Ambiental	Contratista	Adriana Palacios.
Andrea Parada	Topografa	Contratista	Andrea P.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3

FECHA 4/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cesar

CONTRATO DE OBRA No. 149/FCP 23/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Abierto S.A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento de la vía carretera Tocaloa / Pidiliño

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 / dic 28 / 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Fiscalizador Atlántico

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento de la obra
Entrega de compromisos anteriores mayo 10 / 2024
Fecha de corte 09 / 30 / 2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se entrega póliza de la póliza
Se adjunta el periodo del reajuste
Se entrega el balance al cabildo
Se entrega documento del pago
de regalías pendiente periodico.
Se entrega las actas A.P.U.S

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2/3

FECHA 20/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hace la A.P.O. con: la visita del comité interventoría y quedan radicados en oficios. Se callan.-

El contratista no presenta ni soportes ejecutados ni pol-

- De este despacho no solo se hacen 10 KM-
- Solicitados en obra hacen mapio a dep 20/2024
  1.1. Corte en la BANCA 3+720 AL 3+450
  1.2 Explosión TOTAL 3+720 AL 3+450
  1.3 Bloques en de TERRAZA 3+720 AL 3+450
  1.4 DESMONTE y LIMPIEZA DE TERRENO TOTAL
- El contratista tiene no solicitar ESO en obra

Se verifica cantidades generadas del 10 AL 16/

TOTAL Facturado 353 771 290 pendiente
773 884 232 Gastado

$ 419 482 943 TOTAL Ejecutado
TOTAL 45%

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3/3

FECHA 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Documentos equipo	27/08/24	contratista
Planillas Formato INVIAS.	28/08/2024	contratista
ACTA obra 29/08/2024	30/08/2024	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 27/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Andrea Parada	Topografa	Constructambiente	Andrea P.
Abelino Quintero R	Ingeniero	contratista	
Bismarck Pedroza	Inspector	Interventoria	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 149/Ago/2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUAGRO S.A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO VIA CORRALES SOCORRO / DISTRITO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 / dic 28/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO FISICILLA ST/GALTICO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la obra.
Revisar compromisos anteriores
Verificación de EE 0990/2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. COMPROMISOS, INSTRUCCIONES Y ATENCIONES EN OBRAS
2. ESPECIFICACIONES SEÑALES Y SISO
3. INFORME N° 3 FOTO X ENTREGAR MES ABRIL / 2024 A.
4. EL BUZON Y EL PERSONAL INFORMATIVO.
5. DOCUMENTOS DEL EQUIPO.
6. ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
7. EL

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) El balance fue radicado en la oficina, el día 25.- En reunión en el seguimiento de obra, el contratista e interventoría se aprobó el balance presentado con los ajustes A.P.U. - se aprobó mayo 25/2021.-

(2) Se le pide al contratista empezar las construcciones de las alcantarillas del K 3+720 al 2+720 que son: 3+660 y 3+540.-

(3) Se le solicita al contratista colocar terraplen en el sitio del K 3+720 al 2+720.-

(4) Ascenso de las obras

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INFORME TMS (Social)	ENVIADO	Residente
Seguimiento (Social y Ver)	Mayo 31/2024	Residente
Socializaciones Sobre SST	Junio 4/2024	Residente
Documentos Equipo	Junio 7/2024	Residente
Capacitaciones	Junio 7/2024	Residente

FECHA PROXIMA REUNIÓN: Junio 7/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Anarlis Rodriguez	P. Social	Constructora	Anarlis R.
Yaqueline Manotas	P. Social Interventoría	Interventoría	Yaqueline M.
Maria Algarra Vega	P. Ambiental	Interventoría	Maria Algarra Vega
Abelino Quintero	Residente	Contratista	
Adriana Palacios	Ing. Ambiental	Construambiente	Adriana P.
Gilberto Ruiz	Ing. coordinador	INCOTECNIA	
Bismarck Pedroza	Inspector	Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 6.1 EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5025 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	RENAULT CAPTUR MODELO 2019 PLACA ENN741	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	HONDA MODELO 2019 CC 150 PLACA WPW65E	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: N/A

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 y planillas de pago.

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE OBRA No.: 149 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUAMBIENTES SAS

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes																																				Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES	72311243	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 7,200,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	MT PROJECTS SAS	$ 7,200,000.00	$ 501,200	V	EPS SURA	76583124	$ 288,000	Porvenir	76583124	$ 1,152,000	$ 288,000	0.00	0.00	N/A
2	YAQUEILEN MANOSALVA DONADO	1065659382	PROFESIONAL SOCIAL	$ 4,000,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	$ 4,000,000.00	$ 278,464	V	Salud Total EPS	76811864	$ 160,071	Colpensiones	76811864	$ 640,071	$ 160,071	0.00	0.00	N/A
3	MARIA ALEJANDRA VEGA OCHOA	1062402465	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4,000,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	$ 4,000,000.00	$ 278,464	V	Famisanar EPS	76811864	$ 160,071	Porvenir	76811864	$ 640,071	$ 160,071	0.00	0.00	N/A
4	IVETH SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	1007070828	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3,300,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	MT PROJECTS SAS	$ 3,300,000.00	$ 17,262	I	EPS-S Mutual Ser	76583119	$ 132,000	Protección (ING + Pensiones)	76583119	$ 528,000	$ 132,000	0.00	0.00	N/A
5	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	77189860	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 3,250,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	$ 3,250,000.00	$ 17,000	I	Sanitas EPS	7923630958	$ 406,250	Porvenir	7923630958	$ 520,000	0.00	0.00	0.00	N/A
6	BISSMARCK ALFONSO PEDROZO FUENTES	1065658417	INSPECTOR	$ 2,200,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	$ 2,200,000.00	$ 153,214	V	Sanitas EPS	76811864	$ 88,071	Porvenir	76811864	$ 352,071	$ 88,071	0.00	0.00	N/A
7	ELKIN JAVIER PINEDA BOLAÑO	72206812	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	MT PROJECTS SAS	$ 1,300,000.00	$ 6,800	I	Sanitas EPS	76583119	$ 52,000	Porvenir	76583119	$ 208,000	$ 52,000	0.00	0.00	N/A
8	JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ	88282017	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5,500,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ	$ 5,500,000.00	$ 28,769	I	Sanitas EPS	76685743	$ 220,000	Colpensiones	76685743	$ 880,000	$ 220,000	0.00	0.00	N/A
9	JUAN PABLO ZULUAGA CHADID	79949523	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 3,250,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	JUAN PABLO ZULUAGA CHADID	$ 3,250,000.00	$ 17,000	I	ALIANSALUD EPS S.A	78028041	$ 130,000	Old Mutual	78028041	$ 520,000	$ 130,000	0.00	0.00	N/A
10	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN	1015436316	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3,250,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN	$ 3,250,000.00	$ 17,000	I	Compensar EPS	78457610	$ 130,000	Porvenir	78457610	$ 520,000	$ 130,000	0.00	0.00	N/A
11																																																	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 30,750,000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901781112-5	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	Calle 23 f No. 85 a - 31	3116066189	licitaciones@mirsla.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	11/06/2024	77661155	$3.170.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	160.000	0		0		0	5	700	0	160.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	88.000	0		0		0	5	400	0	88.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	160.000	0		0		0	5	700	0	160.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	992.000	0	0	0	0	5	4.000	0	996.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	5	2.600	0	642.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	710.000				710.000	5	2.800	712.800			7.100	712.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	408.000	5	1.700	409.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	408.000	409.800
Pensión	2	1.632.000	1.638.600
Riesgos Laborales	1	710.000	712.800
CCF	1	408.000	409.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.158.000	3.170.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901781112-5	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		Calle 23 f No. 85 a - 31	3116066189	licitaciones@mirsla.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	11/06/2024	77661155	$3.170.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1062402465	VEGA OCHOA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF07	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
2	CC	1065658417	PEDROZO FUENTES BISSMARCK ALFONSO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF07	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	1065659382	MANOSALVA DONADO YAQUEILEN	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF07	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015436316	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN	Calle 76 # 29-35	0316609097	cfeliper.93@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	78457610	$466.548	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	239.953	0		0		0	7	1.100	0	241.053	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	187.455	0	0	0	0	7	1.400	0	188.855	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	36.540				6.100	7	100	6.200			61	36.640	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	239.953	241.053
Pensión	1	187.455	188.855
Riesgos Laborales	1	36.540	36.640
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	463.948	466.548

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015436316	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN		Calle 76 # 29-35	0316609097	cfeliper.93@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	06/05/2024	78457610	$466.548	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	57	0			N																	230301	1.500.000	241.053	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	188.855	14-11	1.500.000	1	36.640		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901272031-3	MT PROJECTS SAS		CL 1A 24 86 TO 1 AP 901	3017862238	licitacionesmtprojects@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	PPAL	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77744845	$2.991.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	326.900	0		0		0	0	0	0	326.900	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	27.200	0		0		0	0	0	0	27.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.800	0		0		0	0	0	0	1.800	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	736.000	0	0	0	0	0	0		736.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	64.000				64.000	0	0	64.000			640	64.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	487.900	0	0	487.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	487.900	487.900
Pensión	2	1.951.200	1.951.200
Riesgos Laborales	1	64.000	64.000
CCF	1	487.900	487.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.991.000	2.991.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901272031-3	MT PROJECTS SAS		CL 1A 24 86 TO 1 AP 901	3017862238	licitacionesmtprojects@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	PPAL	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77744845	$2.991.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001938064	FADUL PEREZ MARIA CAMILA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF07	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002157758	BUELVAS RENGIFO VALENTINA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF07	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007070828	MARTINEZ MARTINEZ IVETH SUSANA	1	0			S							X										230201	3.300.000	528.000	0	0	0	0	ESSC07	3.300.000	132.000	14-25	3.300.000	1	17.300	CCF07	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073159282	GALINDO PERDIGON LIZETH TATIANA	1	0			S		X															230301	680.000	108.800	0	0	0	0	EPS017	680.000	27.200	14-25	680.000	1	3.600	CCF07	680.000	27.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105677330	MEDINA VASQUEZ JUAN JOSE	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF07	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	72206812	PINEDA BOLAÑO ELKIN JAVIER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF07	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	8731265	MARTINEZ CHARRIS GIL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.770.958	283.400	0	0	0	0	EPS005	1.770.958	70.900	14-25	1.770.958	1	9.300	CCF07	1.770.958	70.900	0	0	0	0	0
8	CC	1234648452	FERNANDEZ RODRIGUEZ NOEL ALBERTO	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-25	43.334	1	300	CCF07	43.334	1.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79949523	JUAN PABLO ZULUAGA CHADID	CALLE 24A N 59- 59 APTO 2-401 SALITRE ORIENTAL	6017623222	jzuluaga1978@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	20/06/2024	78028041	$380.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	9	1.200	0	163.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	9	1.500	0	209.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	9	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.700
Pensión	1	208.000	209.500
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	380.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79949523	JUAN PABLO ZULUAGA CHADID		CALLE 24A N 59- 59 APTO 2-401 SALITRE ORIENTAL	6017623222	jzuluaga1978@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	20/06/2024	78028041	$380.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79949523	ZULUAGA CHADID JUAN PABLO	59	0			N																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	88282017	JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ	Calle 151 No 13A - 50 Apto 504 Torre 1	6015890713	jrjacomeo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	24/05/2024	77270452	$1.082.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	466.400	0		0		0	0	0	0	466.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	597.000	0	0	0	0	0	0		597.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.500				19.500	0	0	19.500			195	19.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	466.400	466.400
Pensión	1	597.000	597.000
Riesgos Laborales	1	19.500	19.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.082.900	1.082.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	88282017	JESUS RAMON JACOME ORDOÑEZ	Calle 151 No 13A - 50 Apto 504 Torre 1	6015890713	jrjacomeo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	24/05/2024	77270452	$1.082.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	88282017	JACOME ORDOÑEZ JESUS RAMON	59	0			N																	25-14	3.731.000	597.000	0	0	0	0	EPS005	3.731.000	466.400	14-23	3.731.000	1	19.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77189860
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 6BIS 1 N 19A 3 06 ARIZONA 2	TELÉFONO:	5735599
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7927458580**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			703661470

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
																													FSP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	77189860	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901272031-3	MT PROJECTS SAS	CL 1A 24 86 TO 1 AP 901	3017862238	licitacionesmtprojects@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA / 03	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77743489	$1.337.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	172.800	0		0		0	0	0	0	172.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	691.200	0	0	0	0	0	0		691.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	300.700				300.700	0	0	300.700			3.007	300.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	172.800	0	0	172.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	172.800	172.800
Pensión	1	691.200	691.200
Riesgos Laborales	1	300.700	300.700
CCF	1	172.800	172.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.337.500	1.337.500

PAGADO 1090720

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901272031-3	MT PROJECTS SAS		CL 1A 24 86 TO 1 AP 901	3017862238	licitacionesmtprojects@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	03	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77743489	$1.337.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72311243	MARTINEZ ARGUELLES GILBERTO	1	0			S							X										230301	4.320.000	691.200	0	0	0	0	EPS010	4.320.000	172.800	14-25	4.320.000	5	300.700	CCF07	4.320.000	172.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 y pólizas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL

FECHA DE INICIO: 28/12/2023

PLAZO INICIAL: 7 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,065,988,709.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,065,988,709.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 106,598,870.9	20 12 2023	La liquidaciòn del
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 213,197,741.8	20 12 2023	La liquidaciòn del
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 213,197,741.8	20 12 2023	31 12 2028
Calidad del servicio	30%	$ 319,796,612.7	Vigencia igual al plazo de la garantìa de la	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100079112

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 106,598,870.90	17 2 2024	30 6 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 213,197,741.80	17 2 2024	30 6 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 213,197,741.80	17 2 2024	31 12 2027
Calidad del servicio	30%	$ 319,796,612.70	17 2 2024	31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100079112

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-098189 ATL

Firma:

Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor Contrato de Interventoìa
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0ZVN3gUplDb9tXU9zvEA/w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28358925	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	106.598.870,90	101.459,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	213.197.741,80	202.918,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	213.197.741,80	969.904,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	319.796.612,70	2.898.672,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.172.953,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.172.953,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	793.811,00
TOTAL A PAGAR	$	4.971.764,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.26 09:55:55 -05:00

Código de Seguridad: MGr+rLScuPFsns17x7BXnw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28358933	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE ACLARAN NOMBRES COMPLETOS DE LOS CONSORCIADOS MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO:

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO)
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	106.598.870,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	213.197.741,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	213.197.741,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	319.796.612,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28358933	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: hJiHMdoiczZRzIqLxGQnmQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28359219	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE ACLARA MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES NOTAS DE VIGENCIA:

1.EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
2.EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
3.EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
4. LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	106.598.870,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	213.197.741,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	213.197.741,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	319.796.612,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28359219	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO)

NOTAS DE VIGENCIA:

1.EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
2.EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
3.EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
4. LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: qRHJa8on6dFn3FMJW7SxtQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28360229	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	08/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 59 NO 26 60	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CR 59 NO 26 60	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 08/07/2024	106.598.870,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 08/07/2024	213.197.741,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 08/01/2027	213.197.741,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 08/01/2029	319.796.612,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2024

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28360229	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	08/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO)

NOTAS DE VIGENCIA:

1.EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
2.EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
3.EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
4. LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Planeas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100079112** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **15/01/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **15** días del mes **ENERO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: GMxnfx9zlcHb7HOonIbO5A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	28362218	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	30/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE SUSPENSION 01 CON FECHA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S - NIT: 901572122 (PART. 90,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 30/07/2024	106.598.870,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 30/07/2024	213.197.741,80	23.130,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 30/01/2027	213.197.741,80	19.275,41
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 30/01/2029	319.796.612,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	42.405,90
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	42.405,90
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.057,12
TOTAL A PAGAR	$	50.463,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Planeas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100079112** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **30/01/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **15** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: t1/SQcvnfE3oGJDfZRlDrg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	28364052	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	16/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - MT PROJECTS S.A.S- NIT: 901272031 (PART. 10,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/01/2024	24:00 Horas Del 16/08/2024	106.598.870,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 29/01/2024	24:00 Horas Del 16/08/2024	213.197.741,80	17.873,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/01/2024	24:00 Horas Del 16/02/2027	213.197.741,80	14.894,64
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/01/2024	24:00 Horas Del 16/02/2029	319.796.612,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	32.768,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	32.768,20
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.225,96
TOTAL A PAGAR	$	38.994,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Planeas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100079112** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **16/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **16** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XcH01JtSAz7kB4XDnBynxg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100079112	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28364476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.781.112-5
DIRECCIÓN	CALLE 23 F NO. 85 A - 31	**TELÉFONO**	8039343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5025 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORI A TE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/02/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	106.598.870,90	167.170,39
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 17/02/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	213.197.741,80	334.340,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/02/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	213.197.741,80	278.617,32
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/02/2024	24:00 Horas Del 31/12/2029	319.796.612,70	501.511,18
		TOTAL ASEGURADO	$ 852.790.967,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.281.639,68
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.281.639,68
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	243.511,54
TOTAL A PAGAR	$	1.525.151,22

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Planeas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100079112** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **21/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **21** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO 6.6.2 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INVIAS - DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.**
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5025 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

INTERVENTOR: CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
RESOLUCION No.: 4509 DE 11/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 149 DE 2023 CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTES SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 DE FEBRERO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE ENERO DE 2023 por la suspensión que corresponda con el periodo del
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $1,065,988,709 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $1,065,988,709

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): NA

	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.		2023 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
PERSONAL PROFESIONAL																																		
1	1	Director de Interventoria	$ 7,200,000.00		2.00	$ 14,400,000.00	$ 7,200,000			$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,600,000	1.00	$ 7,200,000	0.60	$ 4,320,000	1.00	$ 7,200,000	0.60	$ 4,320,000	0.60	$ 4,320,000	0.60	$ 4,320,000	0.60	$ 4,320,000	0.60	$ 4,320,000	0.60	$ 4,320,000	7.300	$ 52,560,000
2	2	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,500,000.00		2.00	$ 11,000,000.00	$ 5,500,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	9.000	$ 49,500,000
3	1	Profesional Social	$ 4,000,000.00		2.00	$ 8,000,000.00	$ 4,000,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	9.000	$ 36,000,000
4	1	Profesional Ambiental	$ 4,000,000.00		2.00	$ 8,000,000.00	$ 4,000,000				0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	1.00	$ 4,000,000	9.000	$ 36,000,000
5	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3,300,000.00		2.00	$ 6,600,000.00	$ 3,300,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	1.00	$ 3,300,000	9.000	$ 29,700,000
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman este bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)						$ 24,080,000.00	$ 36,100,000				0.00	$ -	0.13	$ 3,250,000	0.13	$ 3,250,000	0.13	$ 3,250,000	0.40	$ 9,750,000	0.22	$ 5,200,000	0.35	$ 8,450,000	0.35	$ 8,450,000	0.24	$ 5,809,089	0.19	$ 4,550,000	0.27	$ 6,500,000	2.6976	$ 64,959,089
6	1	Especialista en Pavimento ai vias	$ 6,500,000.00			$ -				$ -		$ -	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.30	$ 1,950,000	0.30	$ 1,950,000	0.30	$ 1,950,000	0.20	$ 1,318,889	0.20	$ 1,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -	2.303	$ 14,968,889
7	1	Especialista en Estructura	$ 6,500,000.00			$ -				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.000	$ -
8	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6,500,000.00			$ -				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.500	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	3.500	$ 22,750,000
9	1	Especialista Ambiental	$ 6,500,000.00			$ -						$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,250,000	0.00	$ -	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.19	$ 1,240,200	$ -	$ -	0.50	$ 3,250,000	2.691	$ 17,490,200
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00			$ -						$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,250,000	0.50	$ 3,250,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.000	$ 6,500,000
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00			$ -				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,250,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.500	$ 3,250,000
PERSONAL TECNICO																																		
12	1	Inspector	$ 2,200,000.00		2.00	$ 4,400,000.00	$ 2,200,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	9.000	$ 19,800,000
13	1	Inspector SST	$ 2,200,000.00		2.00	$ 4,400,000.00	$ 2,200,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	1.00	$ 2,200,000	7.000	$ 15,400,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO																																		
14		Tecnico administrativo	$ 1,300,000.00		2.00	$ 2,600,000.00	$ 1,300,000			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	9.000	$ 11,700,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) + (5)						**$ 83,480,000.00**				$ -		$ -		$ 6,850,000.00		$ 10,450,000.00		$ 27,870,000.00		$ 37,250,000.00		$ 32,020,000.00		$ 35,270,000.00		$ 35,270,000.00		$ 36,438,177.78		$ 35,920,000.00		$ 39,820,000.00		$ 39,820,000.00		$ 315,810,088.89
FACTOR MULTIPLICADOR (6)						2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)						**$ 197,012,800.00**				$ -		$ -		$ 16,166,000.00		$ 24,662,000.00		$ 65,773,200.00		$ 87,910,000.00		$ 75,567,200.00		$ 83,237,200.00		$ 83,237,200.00		$ 90,714,099.56		$ 84,771,200.00		$ 93,975,200.00		$ 93,975,200.00		$ 744,861,049.78

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																		
VIATICOS																																				
15		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220,000.00	Dia	5.00	$ 1,100,000.00				$ -	0.00	$ -	4.00	$ 880,000	0.00	$ -	4.00	$ 880,000	4.00	$ 880,000	5.00	$ 1,100,000	5.00	$ 1,100,000	5.00	$ 1,100,000	5.00	$ 1,100,000	5.00	$ 1,100,000	5.00	$ 1,100,000	47.000	$ 10,340,000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																				
16		Vehículo tipo camparo ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y copy modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 6,000,000.00	Mes	2.00	$ 12,000,000.00				$ -	0.00	$ -	0.50	$ 3,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	1.00	$ 6,000,000	10.500	$ 63,000,000
17		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	4.00	$ 2,800,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	2.00	$ 1,400,000	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	10.000	$ 7,000,000
18		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 6,500,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 13,000,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,500,000	1.00	$ 6,500,000	1.00	$ 6,500,000	1.00	$ 6,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -	5.000	$ 32,500,000
19		Ensayos de laboratorios	$ 700,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 1,400,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	1.00	$ 700,000	5.000	$ 3,500,000
20		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,500,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 3,000,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	9.000	$ 13,500,000
OTROS COSTOS																																				
21		Transportes aereos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible)	$ 1,500,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 3,000,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	9.000	$ 13,500,000
22		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotocopias, cd/dvd, etc	$ 600,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 1,200,000.00				$ -	0.00	$ -	0.50	$ 300,000	0.00	$ -	0.7	$ 405,800	0.68	$ 405,800	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000	8.853	$ 5,311,600
23		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 700,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 1,400,000.00				$ -	0.00	$ -	0.09	$ 60,000	0.06	$ 40,000	0.10	$ 70,000	0.10	$ 70,000	0.10	$ 70,000	0.08	$ 53,000	0.10	$ 70,000	0.45	$ 315,000	0.70	$ 490,000	0.31	$ 218,000	0.10	$ 70,000	2.18	$ 1,526,000
24		Vasculria Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 300,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	1.00	$ 150,000	0.00	$ -	0.00	$ -	5.000	$ 750,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) + (B)						**$ 39,200,000.00**			**CHEQUEO VIGENCIAS PRESUPUESTALES**	$ -		$ -		$ 4,240,000.00		$ 13,240,000.00		$ 11,795,800.00		$ 11,085,800.00		$ 11,620,000.00		$ 10,803,000.00		$ 10,120,000.00		$ 10,365,000.00		$ 19,240,000.00		$ 12,310,000.00		$ 12,170,000.00	$ -	$ 150,927,600.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C						**$ 236,212,800.00**	**TOT VIG PERMIT**		**TOT VIG USADAS**	**DIFERENCIA**	$ -	$ -		$ 20,406,000.00		$ 37,902,000.00		$ 77,568,000.00		$ 98,985,800.00		$ 87,187,200.00		$ 102,040,200.00		$ 101,357,200.00		$ 109,079,099.56		$ 104,011,200.00		$ 106,293,200.00		$ 106,145,200.00	$ -	$ 895,768,649.78
PROVISION PARA AJUSTES YIO FRENTE ADICIONAL = D)						**$ 659,574,031.00**		$ 161,646,033	$ (161,646,033)																											**181.22**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E						**$ 895,786,831.00**		$ 2,035,932,838	$ (2,035,932,838)	$ -		$ -		$ 20,406,000.00		$ 37,902,000.00		$ 77,529,000.00		$ 98,965,800.00		$ 87,187,200.00		$ 102,040,200.00		$ 101,357,200.00		$ 109,079,099.56		$ 104,011,200.00		$ 106,293,200.00		$ 106,145,200.00	$ -	$ 895,786,831.00
IVA = 19% * (E) = (F)						**$ 170,199,878.00**		$ 1,569,790,954	$ (1,569,790,954)	$ -		$ -		$ 3,877,140.00		$ 7,201,380.00		$ 14,730,510.00		$ 18,803,502.00		$ 16,565,568.00		$ 19,387,638.00		$ 19,257,868.00		$ 20,725,029.00		$ 19,762,128.00		$ 20,195,708.00		$ 20,167,588.00	$ -	$ 170,199,878.00
COSTO TOTAL = (E) + (F)						**$ 1,065,988,709.00**	**$ -**	**$ 627,787,914**	**$ (627,787,914)**	$ -		$ -		$ 24,283,140.00		$ 45,103,380.00		$ 92,259,510.00		$ 117,769,302.00		$ 103,752,768.00		$ 121,427,838.00		$ 120,615,068.00		$ 129,804,128.56		$ 123,773,328.00		$ 126,488,908.00		$ 126,312,788.00	$ -	$ 1,065,988,709.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema grafico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-058189 ATL

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 19202-209210 CAU
(Suscribe cuando su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Oficio	Asunto	Fecha
FRATLA-2024-066	Solicitud de Convenio entre el Municipio de Becerril y el INVIAS	2/05/2024
FRATLA-2024-068	Reiteración a la solicitud de información	2/05/2024
FRATLA-2024-069	Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023	2/05/2024
FRATLA-2024-070	Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023	6/05/2024
FRATLA-2024-071	Remisión comprobantes de pago por conceptos de rendimientos	9/05/2024
FRATLA-2024-072	Entrega de informe semanal No. 10	8/05/2024
FRATLA-2024-073	Próximo Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023	8/05/2024
FRATLA-2024-074	Solicitud de afiliaciones del personal de obra Cto No. 149 de 2023	9/05/2024
FRATLA-2024-075	Solicitud de documentación ambiental	9/05/2024
FRATLA-2024-076	Solicitud de mejoramiento en puntos críticos de acceso a la obra	9/05/2024
FRATLA-2024-077	Respuesta a comunicado No. O-MVPS- 0-18	10/05/2024
FRATLA-2024-078	Solicitud de aval para el ingreso de Profesional Social Interventoría	14/05/2024
FRATLA-2024-079	Reiteración a la solicitud de documentos	15/05/2024
FRATLA-2024-080	Solicitud de cambio de personal para el cargo de Residente de Interventoría	15/05/2024
FRATLA-2024-081	Citación a Reunión de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023	15/05/2024
FRATLA-2024-082	Entrega de informe semanal No. 11	16/05/2024
FRATLA-2024-083	Observaciones a las Pólizas	16/05/2024
FRATLA-2024-084	Entrega de informe semanal No. 12	16/05/2024
FRATLA-2024-085	Remisión de Pólizas Contrato de Obra No. 149 de 2023	17/05/2024
FRATLA-2024-086	Aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) Contrato de Obra	20/05/2024
FRATLA-2024-087	FRATLA-2024-087 Solicitud de Aprobación de Nuevos Precios Unitarios y Balance Económico	20/05/2024
FRATLA-2024-089	FRATLA-2024-089 Aprobación del Diseño Hidrológico e Hidráulico Contrato de Obra No. 149 de 2023	21/05/2024
FRATLA-2024-090	FRATLA-2024-090 Aval de la interventoría a la documentación de Gestión Ambiental Inicial	27/05/2024
FRATLA-2024-091	FRATLA-2024-091 Solicitud de Aprobación Acta de Modificación No.1	23/05/2024
FRATLA-2024-092	FRATLA-2024-092 Respuesta a solicitud de información	23/05/2024
FRATLA-2024-093	FRATLA-2024-093 Coordinación de Revisión Técnica de Estabilidad de Taludes	27/05/2024
FRATLA-2024-094	FRATLA-2024-094 Entrega de informe semanal No. 13 - Cto de Interventoría No. 5025 de 2023	29/05/2024
FRATLA-2024-095	FRATLA-2024-095 Solicitud de Documentación de Volquetas –Cto de Interventoría No. 5025 de 2023	29/05/2024

CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

NIT 901.781.112-5

FRATLA-2024-066

Barranquilla, 2 de mayo de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
At. Omar Edil Gómez Navia
Supervisor contrato de interventoría
oegomez@invias.gov.co

Referencia: Contrato de obra No. 149 DE 2023.
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".

Asunto**:** Solicitud de Convenio entre el Municipio de Becerril y el INVIAS - Contrato de Obra No. 149 de 2023.

En ejercicio de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia, nos permitimos solicitar formalmente una copia y/o acceso al convenio establecido entre el Municipio de Becerril y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) relacionado al contrato de obra No. 149 de 2023. Esta información es crucial para asegurar una ejecución efectiva y coordinada de las obras en el Municipio de Becerril, así como para cumplir con los requisitos legales y administrativos correspondientes.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración en este asunto. Quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

C.C. JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– jfgarcia@invias.gov.co
Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal– Consorcio FRAILECILLO ATLANTICO – gerenciamtprojects@gmail.com
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO – DIRECTORA TERRITORIAL –INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– ozuleta@invias.gov.co
Archivo digital CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO – Correspondencia Enviada

Anexos: MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL 9

Redactó: Iveth Martínez – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

NIT 901.781.112-5

FRATLA-2024-068

Barranquilla, 2 de mayo de 2024

Señores
CONSTRUAMBIENTES SAS
At. **JOSE JOSE AVILEZ PERALES**
Representante legal
jj.avilez@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. 149 DE 2023.
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".

Asunto**:** Reiteración a la solicitud de información.


En ejercicio de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia, nos dirigimos a ustedes para reiterar la solicitud de subsanación de documentos descritos a continuación. En días pasados, se enviaron los comunicados No. FRATLA-2024-028 Observaciones Programación de Obra de 13 de marzo de 2024, FRATLA-2024-052 Observaciones a las Actas de Vecindad del 12 de abril de 2024, FRATLA-2024-056 Observaciones a los Equipos Mínimos Obligatorios del 17 de abril de 2024, y FRATLA-2024-059 Observaciones a los Estudios y Diseños - Diseño hidráulico del 19 de abril de 2024. Remitiendo las observaciones a cada documento para que el contratista realice las correcciones pertinentes, sin embargo, no se han recibido dichas correcciones.

A continuación, se detalla el listado de documentos respecto a los cuales se han emitido observaciones y que, hasta la fecha, no han sido remitidos:

- Estudios y Diseños - Diseño hidráulico
- Programación de obra
- Documentación Equipo Mínimo Obligatorio
- Planillas de seguridad social mes de marzo y abril
- Formatos de gestión social
- Actas de vecindad

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos de manera urgente que se remitan todos los documentos solicitados en un **plazo máximo de (3) días hábiles** a partir de la recepción de este apremio. El cumplimiento oportuno de esta solicitud es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de la obra y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

Cordialmente,



GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

C.C. JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA – GESTOR CTO INT– INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– jfgarcia@invias.gov.co
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO – DIRECTORA TERRITORIAL –INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– ozuleta@invias.gov.co
OMAR EDIL GOMEZ NAVIA –SUPERVISOR CTO INT–INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– oegomez@invias.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BECERRIL CESAR – juridico@becerril-cesar.gov.co
ATENCION AL CIUDADANO INVIAS – Atencionciudadano@invias.gov.co
Archivo digital CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO – Correspondencia Enviada

Anexos N/A

Redactó: Iveth Martinez – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

NIT 901.781.112-5

FRATLA-2024-069

Barranquilla, 2 de mayo de 2024

Señores
CONSTRUAMBIENTES SAS
At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES
Representante Legal.
jj.avilez@gmail.com

MUNICIPIO DE BECERRIL
juridico@becerril-cesar.gov.co

Referencia: Contrato de obra No. 149 DE 2023.
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".

Asunto**:** Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023

En ejercicio de nuestras funciones como interventores del contrato en referencia, nos permitimos convocar a ustedes al Comité de Seguimiento del Contrato de Obra No. 149 de 2023, la cual se llevará a cabo en las siguientes condiciones. Cabe resaltar que es necesaria la participación de todos los profesionales pertenecientes al Contrato de Obra.

Fecha: viernes 3 de mayo de 2024
Hora: 9:00 AM
Link: https://meet.google.com/tmv-rqvn-qwc

De antemano agradecemos y esperamos contar con su presencia, quedamos atentos para cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

C.C. JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– jfgarcia@invias.gov.co
Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal– Consorcio FRAILECILLO ATLANTICO – gerenciamtprojects@gmail.com
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO – DIRECTORA TERRITORIAL –INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– ozuleta@invias.gov.co
Archivo digital CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO – Correspondencia Enviada

Anexos: N/A

Proyectó: Iveth Martínez – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

Revisó: Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

NIT 901.781.112-5

FRATLA-2024-070

Barranquilla, 6 de mayo de 2024

Señores
CONSTRUAMBIENTES SAS
At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES
Representante Legal.
jj.avilez@gmail.com

MUNICIPIO DE BECERRIL
juridico@becerril-cesar.gov.co

Referencia: Contrato de obra No. 149 DE 2023.
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".

Asunto**:** Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023.

En ejercicio de nuestras funciones como interventores del contrato en referencia, nos dirigimos a ustedes con el fin de convocar a la próxima reunión del Comité de Seguimiento del Contrato de Obra No. 149 de 2024, conforme a lo establecido en la sesión anterior realizada el día 9 de abril de 2024. En dicha reunión, se acordó que el próximo encuentro se llevará a cabo en las siguientes condiciones, se adjunta acta de comité de obra.

Fecha: martes 7 de mayo de 2024
Hora: 9:00 AM
Lugar: instalaciones del Instituto Nacional de Vías "INVIAS" sede Valledupar ubicado en la Calle 16 a Núm. 12 – 89 Edificio La Vallenata.

De antemano agradecemos y esperamos contar con su presencia, quedamos atentos para cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

C.C. JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– jfgarcia@invias.gov.co
Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal– Consorcio FRAILECILLO ATLANTICO – gerenciamtprojects@gmail.com
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO – DIRECTORA TERRITORIAL –INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– ozuleta@invias.gov.co
Archivo digital CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO – Correspondencia Enviada

Anexos: Acta de Comité de Obra No. 5

Proyectó: Iveth Martínez – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

Revisó: Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal – Consorcio FRAILECILLO ATLANTICO

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 3

FECHA 09 04 2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub. Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR.

CONTRATO DE OBRA No. CONSTRUAMBIENTE
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: 149 de 29 de Septiembre. 2023.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5025 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Frailecillo Atlantico.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura del Acta Anterior. y Se revisan Compromisos.
Entrega de Información Inicial: Cumplido Parcialmente
Se Entrega Balance General: Cumplido.
Se Programa Socialización y Volanteo.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Socialización de la Obra / Inicio
- Concidición Estudios y Diseños / Balance General.
- Inicio Desmonte y Limpieza.
- Verificación Entrega Información Inicial.
- Zonas de Borde vía: Cerca / Arbustos/

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 09 04 2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Socialización: Definición del lugar de Socialización Puede ser en el sitio o en salón de la Alcaldía. Se consultará con la con la Alcaldía para definición
- Estudios y Diseños Se informa que a la fecha Se encuentran Conciliados diseños de Pavimento, Geométrico, y Parcialmente Hidráulico. Para Lo anterior se ha priorizado 1 Km que corresponde K3+720 al K2+720. El cual cuenta con Aprobación para inicio de Obra.
- Permiso Ocupación de Cauces: El contratista presentará inventario de Obras de arte a la Alcaldía para solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces.
- Balance General: Se revisa en comité el Balance General en función de los Diseños Ajustados.
- Información Entregada por contratista con Subsanaciones Pólizas pendientes, Subsanar Programación.
- Se realizó recorrido el día 8/04/2024. con Interventoría Res. Ambiental y Res Social a tramo de Vía.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 09 04 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Se promará Solicitud Inicio Obra	16/04/2024	Interventoría Municipio / Contratista
Inicio Obra en la semana 2da Abril.	16/04/2024	Contratista
Remisión Inicio Trámite Ocupación Cauce	12/04/2024	Contratista
Entrega Subsanación PAGA, POLIZAS	12/04/2024	Contratista
Instalación PMT	16/04/2024	Contratista

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA: 07/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el interventor quien dirija los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gilberto Martinez	R.L. Interventor	Interventoría	
Yolith Ortiz	Coordinador Contractual	Contratista	
Jose Jose Ariza	RL	Constructora Ltda	
Felipe Cardenas Z.	ASESOR OBRAS PUBLICAS	MAO BECERRIL	
Yaqueline Manosalvas	Profesional Social	Rol Interventoría	Yaqueline M.D.
Maria Alejandra Vega	Profesional Ambiental	Interventoría	Maria Alejandra Vega

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

NIT 901.781.112-5

FRATLA-2024-071

Barranquilla, 9 de mayo de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
At. Omar Edil Gómez Navia
Supervisor contrato de interventoría
oegomez@invias.gov.co

Referencia: Contrato de obra No. 149 DE 2023.
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".

Asunto**:** Remisión comprobantes de pago por concepto de rendimientos.

En ejercicio de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia, nos permitimos remitir los comprobantes de pago correspondientes a los rendimientos generados en el marco del Contrato de Obra No. 149 de 2023, enviados por la Fiduciaria Bancolombia.

Adjunto a esta comunicación, se encuentran los comprobantes de pago correspondientes. A continuación, se presenta un listado detallado de dichos rendimientos:

FECHA RECEPCIÓN INTERVENTORÍA	CONCEPTO	VALOR	PROVEEDOR	NIT	No. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DE DESTINO	FECHA PAGO	ESTADO PAGO
2/04/2024	PAGO RENDIMIENTO PARA TERCERO EE	$ 1.094.936,97	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - RENDIMINETOS FINANCIEROS	900517804	300700007242	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	2/04/2024	EXITOSO
3/05/2024	PAGO RENDIMIENTO PARA TERCERO EE	$ 929.055,00	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - RENDIMINETOS FINANCIEROS	900517804	300700007242	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	3/05/2024	EXITOSO

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

C.C. JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– jfgarcia@invias.gov.co
Ing. Gilberto Martínez Arguelles – Representante Legal– Consorcio FRAILECILLO ATLANTICO – gerenciamtprojects@gmail.com
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO – DIRECTORA TERRITORIAL –INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS– ozuleta@invias.gov.co
Archivo digital CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO – Correspondencia Enviada

Anexos: COMPROBANTES RENDIMIENTOS

Redactó: Iveth Martínez – CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO

ANEXOS

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$1.094.936,97
IDENTIFICACIÓN	900517804	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
02/04/2024		*******7199	AHO	BANCOLOMBIA S.A	300700007242	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	$1.094.936,97	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- RENDIMIENTOS FINANCIERS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$929.054,96
IDENTIFICACIÓN	900517804	**PAGADOR**	16900 - P.A. ANT CONSTRUAMBIENTES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
03/05/2024		*******7199	AHO	BANCOLOMBIA	300700007242	CTE	BANCO AGRARIO	$929.054,96	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
