Villavicencio, 17 de septiembre de 2024

OF-024-2024

Señores:
CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS
Supervisor

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-379 denominado: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Entrega de informe mensual 3 de interventoría

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor de contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de ejecución del periodo No. 3 de interventoría y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.24-379, correspondiente al periodo que va desde el 14 agosto al 13 de septiembre de 2024. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

Informe de avance mensual 3 de interventoría

- Anexo 1. Cronograma de interventoría
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Planillas de seguridad social
- Anexo 4. Copia de bitácoras
- Anexo 5. correspondencia
- Anexo 6. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	ACCIONES
1) *La interventoría del proyecto será responsable ante CORMACARENA por la evaluación de las obras correspondientes a la implementación del proyecto, siendo imperativo realizar la coordinación técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera, con el contratista de obra, para el perfecto desarrollo del objeto contractual, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones de CORMACARENA. En general, la gestión de la interventoría del contrato será técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y de gestión.*	La interventoria durante el periodo No.3 comprendido desde el 14 agosto al 13 de septiembre del 2024, realizó la coordinación técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera, con el contratista de obra mediante los comités técnicos, reuniones internas realizados. Para ello, se tuvieron en cuenta las directrices establecidas por la supervisión de la Corporación. Asi mismo, se tuvieron en cuenta los estudios previos, pliegos de condiciones, contrato, anexos técnicos, entre otros.
2) *La Interventoría del Proyecto se realizará bajo los conceptos técnicos - administrativos, legales, ambientales, contables y de gestión de apoyo a CORMACARENA; deberá asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales e insumos a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución del Contrato de Obra.*	La interventoria realizó sus actividades de seguimiento bajo los conceptos técnicos - administrativos, legales, ambientales, contables y de gestión de apoyo a CORMACARENA, con el objetivo de que se cumplan con los objetivos propuestos para el proyecto, y así garantizar la calidad de los materiales e insumos a utilizar para las actividades de establecimiento, mantenimiento y aislamiento. Durante este periodo, los técnicos de la interventoría realizaron visitas de campo con el fin de vigilar el adecuado suministro del material vegetal, insumos y materiales, además para supervisar y garantizar la correcta ejecución de las obras, realizando un seguimiento detallado de la aplicación de los recursos financieros para asegurar la calidad en la ejecución del Contrato de Obra.
3) *Asegurar el estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, tanto para el caso del contrato de obra, como en el de interventoría.*	Para el tercer periodo comprendido entre el 14 de agosto al 13 de septiembre, la interventoría presentó el pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales del personal de la interventoría. Soporte - anexo 3. Planillas de seguridad social
4) *Prestar el servicio directa y personalmente de acuerdo con los términos y especificaciones dadas, Involucrando al equipo interdisciplinario ofertado.*	El equipo técnico del consorcio interventoria rehabilitación ambiental 2024, prestó el servicio directa y personalmente en todo lo relacionado con la ejecución del proyecto siguiendo los términos y especificaciones establecidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDAD	ACCIONES
1) *Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría deberá tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra denominado " IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META" de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del*	El consorcio interventoria Rehabilitación Ambiental 2024, previo al inicio de las actividades de seguimiento, realizó la lectura de los diferentes documentos asociados al contrato "*IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META*" , tales como estudios previos, contrato de obra, contrato de interventoría, pliego de condiciones, propuesta del contratista, cronograma de ejecución, entre otros.

contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.	 *Figura 1 Contrato de obra*
2) *Efectuar en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.*	Durante la ejecución del Periodo No.1, la interventoría en compañía del contratista de obra y el supervisor contrato realizó el reconocimiento de los predios. Sin embargo, en el Periodo No.3, el contratista de obra informó que en el predio de Cabuyaro (15 hectáreas) existen áreas susceptibles de inundación, lo que representa un riesgo para la siembra planificada. Ante esta situación, se convocó un comité extraordinario, en el que se programó una visita al predio con el fin de verificar el área disponible. Tras la inspección, se confirmó que solo 7 hectáreas eran viables, por lo que las 8 hectáreas restantes fueron reubicadas en el predio El Paisaje, ubicado en el municipio de Puerto Lleras. Finalmente, el día 12 de septiembre de 2024, se realizó la visita de reconocimiento a las 8 hectáreas del predio El Paisaje.  *Figura. 1. Reconocimiento de 8ha en el predio el paisaje en puerto lleras*  *Figura. 2. Reconocimiento de 8ha en el predio el paisaje en puerto lleras* *Nota: A corte del presente informe, se da por culminada las visitas de reconocimiento de las 152 hectáreas que están siendo intervenidas por el proyecto.*
3) *Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.*	Durante el Periodo No.3, que abarca del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, se realizaron las verificaciones necesarias para asegurar que el contratista esté ejecutando las actividades conforme a lo estipulado en el contrato, tanto en el cronograma como en la propuesta técnica y económica, la metodología y las especificaciones técnicas. Se llevaron a cabo visitas de campo a los diferentes predios beneficiarios del proyecto para supervisar el avance de las siembras en las 152 hectáreas y el aislamiento de 17,5 kilómetros. En dichas visitas, se constató que:

	✓ La entrega de material vegetal, insumos, postes de madera, alambre de púas, grapas y herramienta menor se ha realizado de acuerdo con los plazos y cantidades estipuladas en el contrato. ✓ Las actividades de siembra y aislamiento se están ejecutando, siguiendo las especificaciones técnicas pactadas, observándose un avance adecuado en la mayoría de los predios. ✓ No obstante, en el predio de Cabuyaro se detectaron áreas con riesgo de inundación, lo que ha afectado la disponibilidad de la totalidad del terreno planificado para la siembra. Como medida correctiva, y tras la validación en comité extraordinario, se reubicaron 8 hectáreas al predio El Paisaje en Puerto Lleras, donde se realizó la respectiva visita de reconocimiento. En cuanto a los plazos, se observa que las actividades generales se están llevando a cabo dentro del tiempo establecido, sin embargo, será necesario continuar con los seguimientos para asegurar el cumplimiento completo y oportuno de los compromisos Finalmente, la interventoría también realizó acompañamiento a los talleres de educación informal realizadas en los municipios de Puerto Lleras.  *Figura. 3. Taller 1 capacitación sobre conservación ecológica*  *Figura. 4. Taller 1 capacitación sobre conservación ecológica*  *Figura. 5. Taller 2 capacitación y practica ecológica*  *Figura. 6. Taller 2 capacitación y practica ecológica*
4) *Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.*	En el Periodo No.3 (14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se ha verificado que el contratista de obra está cumpliendo con las normas técnicas obligatorias de calidad para las actividades contratadas, conforme a lo establecido en el contrato. Durante las visitas de inspección a los predios, se ha revisado que: **Materiales**: La entrega de material vegetal, insumos, postes de madera, alambre de púas, grapas y herramientas menores ha sido consistente con las especificaciones técnicas y de calidad pactadas. No se han presentado desviaciones en cuanto a la calidad de los productos entregados.

	Proceso de Siembra y Aislamiento: Las actividades de siembra y aislamiento de los predios se están ejecutando conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el contrato, observando la correcta disposición de los elementos y el uso adecuado de los insumos. **Recomendaciones y Seguimiento**: En el caso del predio de Cabuyaro, donde se identificaron zonas con riesgo de inundación, se exigió al contratista cumplir con las medidas correctivas necesarias, reubicando las hectáreas afectadas y asegurando que la calidad de la obra no se vea comprometida. Se realizará seguimiento adicional para garantizar que las actividades en las áreas reubicadas en el predio El Paisaje también cumplan con las normas técnicas. Hasta la fecha, no se han identificado incumplimientos significativos en la calidad de las obras, sin embargo, se mantendrá un control riguroso en los periodos siguientes para garantizar que el contratista continúe respetando las normas técnicas obligatorias. Adicionalmente, en coordinación con la supervisión y contratista de obra se llevaron a cabo diferentes espacios (ej. comités técnicos), tanto presencial como de manera virtual, para verificar y validar el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas, como también para revisar la posibilidad de ajustes según lo identificado en campo o lo solicitado por los beneficiarios de los predios a intervenir.  *Figura. 7. comité N°4. virtual*  *Figura. 8. Comité N.° 5 de seguimiento*
5) *Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.*	Durante el Periodo No.3 (del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se ha realizado la toma de datos y los cálculos correspondientes para cuantificar los trabajos ejecutados y los previstos en el marco del contrato, incluyendo aquellos que pueden requerir el uso del fondo de contingencia. **Trabajos Realizados**: Se verificó el avance en la siembra de las 152 hectáreas y el aislamiento de los 17,5 kilómetros, constatando que las actividades ejecutadas a la fecha se encuentran alineadas con el cronograma y los costos establecidos en el contrato. También se ha registrado el suministro de los materiales necesarios, tales como el material vegetal, insumos, postes de madera, alambre de púas, grapas y herramientas

	menores, calculando el costo correspondiente a la entrega y uso de estos elementos. **Reubicación de Hectáreas**: Como parte del manejo de contingencias, se ha cuantificado la reubicación de 8 hectáreas del predio de Cabuyaro al predio El Paisaje en Puerto Lleras, debido al riesgo de inundación. El cálculo de los costos asociados a esta reubicación ha sido incluido para su evaluación a través del fondo de contingencia, ajustando las cantidades de trabajo y materiales necesarios para la nueva ubicación. **Cálculos para Pagos**: Se ha realizado una revisión detallada de las mediciones y los cálculos asociados a los trabajos ejecutados, lo que permitirá definir la ejecución financiera en las actividades ejecutadas hasta la fecha. Los trabajos previstos para el próximo periodo también han sido calculados, tomando en cuenta las actividades pendientes en los predios restantes, así como cualquier ajuste que surja como resultado de las observaciones técnicas o la necesidad de medidas correctivas. Los datos y cálculos han sido consolidados y serán presentados en los informes correspondientes para los efectos del pago.
6) Analizar con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.	Durante el Periodo No.3 (14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se llevó a cabo un análisis conjunto con el contratista para revisar las especificaciones del proyecto y garantizar el correcto desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: - Se revisaron nuevamente las especificaciones técnicas relacionadas con la siembra en 152 hectáreas y el aislamiento de 17,5 kilómetros, asegurando que el contratista tenga una comprensión clara de los requerimientos y las metodologías a aplicar. - Se hizo énfasis en la calidad del material vegetal, los insumos, y los elementos como postes de madera, alambre de púas y grapas, garantizando que todos cumplan con las normas establecidas en el contrato. - Se evaluó el avance del cronograma de actividades. Aunque el progreso en la mayoría de los predios es satisfactorio, se discutió la reubicación de 8 hectáreas del predio de Cabuyaro, lo cual impactó ligeramente el plan de trabajo original. Las nuevas actividades programadas en el predio El Paisaje fueron ajustadas para mantener el ritmo adecuado de ejecución. - Se realizó una revisión del equipo disponible para la ejecución del proyecto. Hasta la fecha, los recursos técnicos y operativos del contratista son adecuados para cumplir con los objetivos del contrato. - Se discutieron las medidas de seguridad industrial e higiene implementadas por el contratista para proteger al personal en el sitio de trabajo. El contratista ha adoptado protocolos de seguridad para prevenir accidentes, como el uso de equipos de protección personal (EPP), y la implementación del botiquín de primeros auxilios. - Se hizo un llamado a reforzar algunos aspectos en los predios con mayores riesgos, como aquellos expuestos a condiciones adversas (inundaciones o terrenos difíciles), asegurando que el personal esté completamente protegido y siga las medidas de seguridad. En general, el análisis confirmó que el contratista está cumpliendo con los lineamientos del contrato, aunque se insistió en la importancia de mantener una comunicación constante para gestionar de manera oportuna cualquier contingencia que pueda surgir.

7) *Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.*	Durante el Periodo No.3 (del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se ha realizado el seguimiento a los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, con el fin de garantizar que las actividades se desarrollen de acuerdo con lo estipulado en el contrato y dentro de los plazos acordados. También se ha informado a CORMACARENA por medio del supervisor sobre el estado actual de avance de las obras. Se destacan los avances en la mayoría de los predios, así como la implementación de medidas correctivas en el predio El Paisaje, con el fin de compensar el retraso derivado de la reubicación de hectáreas.
8) *Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA.*	Durante el tercer periodo de ejecución, la interventoría resolvió las consultas que realizó el contratista de obra, las cuales igualmente fueron informadas y revisadas con la supervisión de la Corporación. Así mismo, se mantuvo contacto permanente con el contratista de obra, con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato de obra, y así garantizar el óptimo desarrollo del proyecto. Por otro lado, los comités realizados mensualmente fueron un espacio en los que se trataron las diferentes inquietudes presentadas por el contratista.
9) *Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.*	Una vez suscritos los contratos de obra e interventoría, junto con la supervisión de parte de Cormacarena, se realizó la revisión de la propuesta económica que fue presentada por parte del contratista, con el propósito de verificar las cantidades de obrar y los precios unitarios, en los cuales no se encontró discrepancia.  *Figura. 9. presupuesto de obra relacionado en el contrato*
10) *Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.*	Durante el tercer mes de ejecución, que va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, no se presentaron situaciones que ameritaran la suspensión de los trabajos que hasta el momento ha ejecutado el contratista de obra, puesto que, este ha cumplido con las especificaciones previstas para la ejecución del proyecto.
11) *Dentro de los cinco primeros días de cada mes de vigencia contractual, coordinar la elaboración del comité de obra y acta mensual de la obra ejecutada por el contratista, interviniendo directamente en la misma y en el archivo de las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas*	Durante el tercer periodo de ejecución comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, se realizaron (2) dos comités técnicos a los cuales asistieron el equipo técnico del contratista, la supervisión y la interventoría. Para los comités realizados se levantó su respectiva acta de comité y listado de asistencia, soportes que están en el anexo 2. Comités técnicos del presente informe.

<table>
<tr>
<td>actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y CORMACARENA.</td>
<td>
Tabla 1. Periodos de obra e interventoria.
<table>
<tr><th colspan="2">PERIODOS DE OBRA E INTERVENTORIA</th></tr>
<tr><td>No.1</td><td>14 de junio al 13 de julio de 2024</td></tr>
<tr><td>No.2</td><td>14 de julio al 13 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>No.3</td><td>14 de agosto al 13 de septiembre de 2024</td></tr>
<tr><td>No.4</td><td>14 de septiembre al 13 de octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>No.5</td><td>14 de octubre al 13 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>No.6</td><td>14 de noviembre al 13 de diciembre de 2024</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>12) Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.</td>
<td>Durante el tercer periodo de ejecución no se presentó ninguna situación que ameritara realizar modificaciones al contrato, a las especificaciones técnicas señaladas, cambios de diseño, multas, prórrogas, ampliación del valor, entre otros.</td>
</tr>
<tr>
<td>13) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista.</td>
<td>
Durante el Periodo No.3 (del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se ha revisado y aprobado el programa de ejecución de los trabajos presentados por el contratista, incluyendo la siembra y el aislamiento de predios.

Las actividades planificadas se han ajustado conforme a las especificaciones contractuales, y se ha coordinado eficientemente la ejecución, especialmente en la reubicación de 8 hectáreas en el predio El Paisaje. Se mantendrá el control y seguimiento para asegurar que los trabajos continúen según lo previsto.

Se informa que la aprobación de la reubicación de las áreas se realizó mediante comités y realización de visita al predio de Cabuyaro para así mismo determinar el área que si era viable para el proyecto.


Figura. 10. comité N°4 virtual.

Igualmente, en los comités se revisó el avance en el cronograma de actividades presentado por el contratista con el objetivo de coordinar eficientemente el desarrollo de las actividades programadas.
</td>
</tr>
</table>

	 *Figura. 11. Comité N°5 seguimiento y avance de obra.*  *Figura. 12. Comité N°5 seguimiento y avance de obra.*
14) *Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo*	Durante el Periodo No.3 (14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se evaluó el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo utilizado por el contratista en las obras. El equipo disponible cumple con los requisitos estipulados en los documentos contractuales. Hasta la fecha, no ha sido necesario exigir cambios o adiciones de equipo, ya que este se encuentra en condiciones óptimas para el avance de las actividades.
15) *Elaborar y suscribir con el contratista y con CORMACARENA las actas de liquidación para el recibo final de las obras. Diligenciar los formatos y verificar la documentación requerida para liquidar el contrato objeto de interventoría, de acuerdo con las normas vigentes.*	El presente informe hace referencia al tercer mes de ejecución, por lo tanto, este ítem no aplica para este periodo.
16) *Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, insumos, material vegetal, así como herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.*	Durante el Periodo No.3 (14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se ha controlado el suministro oportuno de materiales, insumos, material vegetal, herramientas y equipos. Mediante las visitas del equipo técnico de la interventoria se ha verificado que los elementos entregados cumplen con las cantidades y calidades especificadas en el contrato y pliegos de condiciones. Hasta el momento, no se han detectado materiales defectuosos ni que incumplan las especificaciones técnicas.  *Figura. 13. Cargue material vegetal.*  *Figura. 14. Verificación de especificaciones técnicas (tamaño plántula).*

	 *Figura. 15. Materiales e insumos para siembra*  *Figura. 16. Materiales e insumos para siembra*
17) *Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato.*	Durante la ejecución del periodo No.3, los técnicos de la interventoría en cada una de las visitas realizan las recomendaciones y observaciones a cada usuario y también a los técnicos de campo, estas mismas quedan detalladas en las bitácoras de campo. Al finalizar el contrato, la interventoría realizara un documento en el que se indiquen las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA .
18) *Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión, reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra. Las actas a elaborar deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e interventor y en caso de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.*	Durante el tercer periodo de ejecución no se elaboraron actas de recibo parcial de obra, terminación y/o liquidación. Las actas de inicio se elaboraron en el primer periodo de ejecución. En cuanto a actas parciales de obra, terminación o liquidación aún no aplican para este periodo de ejecución.
19) *Bitácora de interventoría: Se debe llevar un registro semanal de las actividades y cantidades de obra ejecutadas en los diversos sitios, el cual deberá estar firmado por el profesional residente de interventoría y el profesional residente de obra.*	Durante el periodo No.3 comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, la interventoría llevó registro de las actividades realizadas cada semana, mediante bitácoras en las cuales se incluyeron las acciones adelantadas en el área administrativa, de carácter técnico y la realizadas en campo. En el anexo 4 del presente informe, se encuentran las copias de las bitácoras de las visitas realizadas en este periodo.  *Figura. 17. Bitácora de interventoría.*
20) *Gestión para los pagos parciales al contratista de obra: El Interventor será el encargado de aprobar las actas parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la documentación que*	El contratista de obra presento ante la interventoría la solicitud del primer cobro parcial correspondiente al 39,59% por un valor de $660.673.433,09 que va desde el 14 de junio al 13 de septiembre de 2024.

soporta la refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra.	El contratista presento el informe con los respectivos soportes, así mismo la interventoría realizó la revisión para posteriormente realizar la aprobación de este cobro parcial 1.
21) *Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte de la interventoría mediante un informe de interventoría, cuyo formato se le será entregado por la supervisión de CORMACARENA.*	Durante el periodo No.3 el cual va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, la interventoría solicitó al contratista de obra el respectivo informe mensual de actividades. Se le recomendó al contratista tener en cuenta que los periodos de corte para la recopilación y elaboración de informes se establecieron para los 13 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes de avance mensual debe llevarse a cabo en los 5 días posteriores a dicho periodo de corte. Una vez se reciba la documentación correspondiente, la interventoría revisará la información y notificará al contratista de las observaciones. Igualmente, se le indicó al contratista que, para cada uno de los cobros parciales, se le exigirá la entrega de un informe aparte del informe mensual en el cual se soporten las actividades realizadas que sustentan el cobro que haga. Sin embargo, para el presente periodo el contratista no realizó cobros parciales.
22) *Participar en todos los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se llegasen a presentar, levantando la respectiva Acta de comité, la cual con los respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la interventoría externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría.*	Durante el periodo No.3 que va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, se llevó a cabo un comité de obra extraordinario y otro comité de obra virtual. En cada comité se levanta el listado de asistencia y el acta de comité, las cuales se encuentran en el anexo 2 del presente informe.  *Figura. 18. Comité virtual.*  *Figura. 19. Comité No.5.*
23) *Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.*	Durante el tercer periodo de ejecución que va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, la interventoría mantuvo comunicación permanente con el contratista y con la supervisión asignada, por parte de la entidad contratante. Al a fecha no se presentaron situaciones en las que se determinará la necesidad inmediata de realizar comunicación directa con la Dirección General de la Corporación.
24) *Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.*	Durante el tercer periodo comprendido 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024 de ejecución del contrato de obra e interventoría, el equipo técnico de la interventoría realizó visitas periódicas de seguimiento y control en campo con el fin de corroborar el avance alcanzado por el contratista y para garantizar las condiciones de calidad del objeto contratado, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas en los documentos precontractuales y contractuales.

	 *Figura. 20. Visita de seguimiento al predio la isabela.*  *Figura. 21. Visita técnica de seguimiento al predio santa Inés.*  *Figura. 22. Revisión técnica y seguimiento al predio el paisaje*  *Figura. 23. Verificación técnica al predio bella vista*  *Figura. 24. Visita técnica y seguimiento al predio la esmeralda*  *Figura. 25. Visita técnica y seguimiento al predio san Cristóbal lote a*
25) Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.	Durante el periodo No.3 de ejecución, la interventoría realizó visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista en los predios priorizados para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de verificar que el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista de obra. Durante este periodo, la interventoría realizó el acompañamiento a las visitas técnicas a los predios beneficiados. Posteriormente se hizo el previo acompañamiento a los talleres en el municipio de Puerto Lleras en el predio al paisaje. De acuerdo con lo anterior, las observaciones realizadas durante este periodo de la ejecución del proyecto fueron informadas al contratista, para garantizar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.
26) Solicitar a la Dirección General, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran.	Durante el tercer periodo de ejecución que va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, la interventoría mantuvo comunicación permanente con el contratista y con la supervisión asignada, por parte de la entidad contratante. Al a fecha no se presentaron situaciones en las que se determinará la necesidad inmediata de realizar comunicación directa con la Dirección General de la Corporación.

27) *Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.*

Durante el Periodo No.3 (14 de agosto al 13 de septiembre de 2024), se verificó que las obras se ejecuten conforme a las condiciones estipuladas en el contrato y la propuesta del contratista. Se comprobó la calidad y estabilidad de las actividades realizadas, cumpliendo con los estándares requeridos.



Figura. 26. Seguimiento componente de aislamiento.



Figura. 27. Seguimiento componente de aislamiento (pie de amigo).



Figura. 28. seguimiento componente de aislamiento.



Figura. 29. Seguimiento componente de siembra (medidas distancia siembra)



Figura. 30. seguimiento transporte menor de material vegetal



Figura. 31. seguimiento transporte menor de material vegetal

BENEFICIARIOS CONSORCIO REHABILITACIÓN 2024				AVANCE (14 junio al 13 septiembre)	
N°	USUARIO	MUNICIPIO	PREDIO	ÁREA (HA)	CERCA (KM)
1	Abraham Castillo	Mapiripan	Bella Vista	0	1.50
2	Hermes Eliecer Alvarez Castillo		La Esmeralda	0	0.00
3	Jesús Alberto Cubillos		Hacienda La Soledad	0	1.40
4	Tiberio Mendoza		La Isabela	0	2.20
5	Henry Clavijo		Agropecuana Porvenir	10	1.41
6	Heidy Viviana Gonzalez Benavides	San Martin	La Milagrosa	18.4	1.70
7	Mabel Elena Narvaez Bergonzoli	Puerto López	Santa Inés	12.7	1.28
8	Jhon Jairo Cordoba	Puerto Lleras	El Paisaje	3.896	3.80
9	Myriam Martinez López	Cabuyaro	San Cristóbal Lote A	0	0.00
TOTAL DE HECTÁREAS				44.996	13.29

El contratista de obra pauso la siembra del material vegetal, teniendo en cuenta la época seca por la que están atravesando las diferentes zonas e implemento el sistema de riego con el fin de prevenir la mortalidad de las plantas.

28) *Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.*	Durante el tercer periodo de ejecución no se presentaron situaciones que ameritaran la imposición de multas y/o sanciones.
29) *Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.*	Durante la ejecución del contrato, no se presentaron situaciones que generen sobrecostos. No obstante, se identificó que, debido a la gran distancia y a las difíciles condiciones de acceso de algunos predios se presentaron costos adicionales en el transporte del personal. entre otros. Adicionalmente a causa de la época seca que están atravesando estas zonas, el contratista de obra implemento el riego en los predios, con el fin de disminuir la mortalidad de las pantas. Por esta razón, estos costos serán tenidos en cuenta en el capítulo de imprevistos para su posterior pago, para lo cual el contratista deberá justificar con el respectivo registro fotográfico y facturas dentro de un informe final de imprevistos que deberá ser entregado durante el proceso de liquidación del contrato. Además, en cada informe de ejecución mensual, el contratista indica si se presentaron imprevistos en la ejecución de las actividades. En consecuencia, la interventoría vigila que estos costos adicionales no sobrepasan el valor establecido en el presupuesto de obra.
30) *Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.*	Durante el tercer periodo de ejecución, comprendida entre 14 agosto al 13 septiembre de 2024, la interventoria mantuvo el seguimiento de actividades realizadas por el contratista con las visitas técnicas a campo con el fin de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de actividades con el fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades. El soporte de las actividades se puede evidenciar en el anexo 4. Bitácoras.
31) *Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.*	Durante el tercer periodo de ejecución, Se realiza seguimiento constante al contratista mediante visitas de campo, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para estimular la realización de actividades de obra. Además, se realizan comités de obra mensual para verificar el avance de obra y constatar que las actividades ejecutadas vayan en correspondencia con la programación de obra aprobada por la interventoría. Del mismo modo se enviaron oficios relacionando las observaciones halladas, con el fin de no incurrir en retrasos en las actividades. El soporte de las actividades se encuentra en el anexo 4. Bitácoras.
32) *Controlar y verificar que el contratista de obra cumpla de manera estricta con las siguientes actividades:*	A continuación, en la siguiente tabla se describe el cumplimiento de cada una de las actividades (desde el numeral "1." hasta el numeral "5") que la interventoría debe controlar y verificar al equipo de obra.

ACTIVIDAD	**ACCIONES**
1) *Realizar el establecimiento del material vegetal.*	Durante el tercer periodo del contrato, el equipo técnico de la Interventoria realizó visitas de seguimiento en cada uno de los predios con el fin de hacer el seguimiento al proceso de siembra. Mediante estas visitas se evidenció que el contratista de obra cuenta con personal de mano de obra no calificado en cada uno de los predios, los cuales se encuentran distribuidos por actividades. Inicialmente realizaron la preparación del terreno, en algunas partes mediante plateo manual y en otras áreas mediante la mecanización, posteriormente iniciaron con el ahoyado de 30x30x30. Luego en ambos casos, realizaron un repique con barra, para romper los horizontes compactados. Estas labores de ahoyado se realizaron una o dos semanas antes de la plantación y en el momento de realizar el hoyo se separaron la capa fértil de la vegetal, de cualquier otra capa interior que no se use en el relleno. Luego continuaron con la aplicación de una dosificación de 150 gramos de cal dolomita y 500 gramos de abono orgánico mezclados en cada hoyo en el momento de la siembra. Finalmente humedecen el pan de tierra de la planta, retiraran la bolsa plástica, realizaron el trasplante y finalmente aporcan.



Figura. 32. Limpieza - control de arvenses



Figura. 33. trazado



Figura. 34. Ahoyado encalado



Figura. 35. Fertilización



Figura. 36. Siembra



Figura. 37. Aislamiento

A corte del presente mes se llevan establecidas 49,99 hectáreas distribuidas así:

Nº	USUARIO	MUNICIPIO	PREDIO	ÁREA (HA)
1	Abraham Castillo	Mapripan	Bella Vista	0
2	Hermes Eliecer Alvarez Castillo		La Esmeralda	0
3	Jesús Alberto Cubillos		Hacienda La Soledad	0
4	Tiberio Mendoza		La Isabela	0
5	Henry Clavijo		Agropecuaria Porvenir	10
6	Heidy Viviana Gonzalez Benavides	San Martin	La Milagrosa	18.4
7	Mabel Elena Narvaez Bergonzoli	Puerto López	Santa Inés	12.7
8	Jhon Jairo Cordoba	Puerto Lleras	El Paisaje	3.896
9	Mynam Martinez López	Cabuyaro	San Cristobal Lote A	0
TOTAL DE HECTAREAS				44.996

Se aclara que el contratista de obra ya realizó la entrega de los insumos y material vegetal en los predios beneficiarios, pero por razones de la época seca, paro las actividades de siembra e implemento el sistema de riego para evitar la mortalidad de las plantas.

2) *Realizar el aislamiento de control de tensiónantes.*	En el tercer periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, el contratista ha desarrollado la actividad del componente de aislamiento en (9) nueve predios: Bella Vista, La Esmeralda, La Soledad, La Isabela, Porvenir, La Milagrosa, Santa Inés, El Paisaje y San Cristóbal lote A Durante las visitas técnicas realizadas por la interventoría a los predios se pudo evidenciar que en efecto el componente de aislamiento se desarrolló sin ninguna dificultad, cumpliendo con las especificaciones técnicas para dicho componente.

	<table><tr><td>Distancia entre postes (m)</td><td>3</td></tr><tr><td>Distancia entre pies de amigos (m)</td><td>30</td></tr><tr><td>Calibre de alambre de púa</td><td>12.5</td></tr><tr><td>Distancia entre hilos (cm)</td><td>40cm</td></tr></table>  *Figura. 38. Instalación de aislamiento*  *Figura. 39. Instalación de aislamiento*  *Figura. 40. Instalación de aislamiento.*  *Figura. 41. Instalación de aislamiento*
3) *Realizar el mantenimiento de las áreas en el proceso de restauración.*	Durante el tercer periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, el contratista no realizó actividades de mantenimiento de las áreas que se encuentran en proceso de restauración, puesto que, se realizarán mínimo 45 días después al establecimiento del material vegetal.  *Figura. 42. Cronograma de activades de obra.*
4) *Asistir técnicamente el proyecto y las plantaciones establecidas.*	Durante el periodo No.3 comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, el equipo de la Interventoria realizó visitas de seguimiento a los predios beneficiarios, con el fin de verificar y supervisar el proceso de la siembra del material vegetal. En cada una de estas visitas, los técnicos realizaron observaciones y recomendaciones para prevenir la mortalidad o cualquier afectación. Adicionalmente en cada visita se realiza inspecciones minuciosas al material vegetal establecido y de acuerdo a lo observado se le indica al contratista de obra las sugerencias correspondientes. Se aclara que, a las plantaciones, el contratista le realizará un mantenimiento tras pasar 30 a 45 días.



Figura. 43. Cronograma de actividades de obra.



Figura. 44. asistencia técnica de obra



Figura. 45. mano de obra en campo



Figura. 46. mano de obra en campo



Figura. 47. mano de obra en campo



Figura. 48. Asistencia técnica de obra



Figura. 49. Asistencia técnica de obra

5) *Realizar eventos de educación informal*

Durante el tercer periodo de ejecución comprendido del 14 de agosto a 13 de septiembre, se llevaron a cabo los talleres de educación informal en los municipios de Puerto Lleras, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades de obra.

TALLERES		
MUNICIPIO	**FECHA**	**LUGAR**
San Martín	1/08/2024	Vda Puerto Castro
Puerto López	13/08/2024	Predio Santa Inés
Puerto Lleras	18/08/2024	Predio El Paisaje
Puerto Lleras	12/09/2024	Predio El Paisaje

Taller No.3 (18/08/2024)
Capacitación sobre conservación, restauración y los servicios ecosistémicos que presta el bosque.


Figura. 50. Taller teórico


Figura. 51. Taller teórico

Taller No.4 (12/09/2024)
Capacitación sobre conservación, restauración y los servicios ecosistémicos que presta el bosque.


Figura. 52. Taller practico


Figura. 53. Taller practico


Figura. 54. Taller practico


Figura. 55. Taller practico

Elaborado por:

SOFIA CATHERINE ACOSTA BONILLA
PROFESIONAL DE INFORMES

Aprobado por:

GUILLERMO ANTONIO ROJAS
R/L INTERVENTORÍA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DEL MANEJO ESPECIAL LA MACARENA (CORMACARENA)

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PS-GCT.2.7.24-379



INFORME DE INTERVENTORIA No. 03

Periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.24 - 379
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de consultoría (interventoria)
OBJETO:	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato del proyecto denominado: implementación de acciones de rehabilitación de cobertura vegetal en los municipios de Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto López, San Martín y Cabuyaro jurisdicción del departamento del Meta".
CONTRATISTA:	Consorcio Interventoría Rehabilitación ambiental 2024

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 176.764.980 M/CTE Iva incluido
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Fecha acta de inicio:	14 de junio de 2024.
Fecha de terminación:	13 de diciembre de 2024.
Número de CDP:	924 y 760 del 11 de marzo de 2024
Número de RP:	1103 del 15 de abril de 2024.

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N. A		
Fecha de cesión:	N. A		
b. Adición			
Valor de adición:	N. A	Valor total del contrato:	N. A
Tiempo de adición:	N. A	Plazo total de ejecución:	N. A
Nueva fecha de terminación:	N. A		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N. A		
Fecha de reinicio:	N. A		
Nueva fecha de terminación:	N. A		

AVANCE FISICO

Avance físico del periodo 3:	11,51%
Avance físico acumulado:	39,59%

AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Seis (6) Meses
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Tres (03) Meses

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 176.764.980 M/Cte. (IVA incluido)
Adición de recursos:	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$0,00
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	0 %
Valor de ejecución del periodo:	$0,00 M/Cte. (IVA incluido)
Porcentaje de ejecución del periodo:	0%
Saldo por ejecutar:	$ 176.764.980 M/Cte. (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	100%

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. CV-100035283				
Cobertura	**Fecha Inicial**	**Fecha Vencimiento**	**Valor asegurado**	**Aseguradora**
Cumplimiento del contrato	09/04/2024	10/04/2025	17,676,498.00	Aseguradora Solidaria de Colombia
Calidad del Servicio	10/10/2024	10/10/2026	17,676,498.00	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/04/2024	10/10/202/	8,838,249.00	

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. CV-100035283				
Cobertura	**Fecha Inicial**	**Fecha Vencimiento**	**Valor asegurado**	**Aseguradora**
Cumplimiento del contrato	09/04/2024	15/06/2025	17,676,498.00	Aseguradora Solidaria de Colombia
Calidad del Servicio	10/10/2024	15/12/2026	17,676,498.00	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/04/2024	15/12/2027	8,838,249.00	

PERSONAL DE INTERVENTORIA

Tabla 1. Personal inicial ofertado por la interventoría.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Guillermo Antonio Rojas Baquero	1.121.837.552	Representante legal
Adriana Lucia Diaz Bobadilla	40.404.531	Director de interventoría
María Eugenia Baquero Castro	1.136.886.716	Profesional
Edwin Felipe Villate Torres	80.747.329	Profesional de informes
Everardo Álvarez Osorio	86.061.712	Técnico interventor
Jenderson Oswaldo Vargas Montoya	1.121.863.733	Técnico interventor

Tabla 2. Personal actualizado de la interventoría.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Guillermo Antonio Rojas Baquero	1.121.837.552	Representante legal
Adriana Lucia Diaz Bobadilla	40.404.531	Director de interventoría
María Eugenia Baquero Castro	1.136.886.716	Profesional
Sofia Catherine Acosta Bonilla	40.219.696	Profesional de informes
Everardo Álvarez Osorio	86.061.712	Técnico interventor
Ferney Alexander Montaña	3.277.334	Técnico interventor

2. DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.24 - 585
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
OBJETO:	"Implementación de acciones de rehabilitación de cobertura vegetal en los municipios de Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto López, San Martín y Cabuyaro jurisdicción del departamento del Meta".
CONTRATISTA:	Asociación para el desarrollo integral de Colombia (ASOIDECOL)

CONDICIONES INICIALES			
Valor inicial:	$ 1.668.938.719,16 M/CTE Iva incluido		
Plazo inicial:	Seis (06) meses		
Fecha acta de inicio:	14 de junio de 2024.		
Fecha de terminación:	13 de diciembre de 2024.		
MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N. A		
Fecha de cesión:	N. A		
b. Adición			
Valor de adición:	N. A	Valor total del contrato:	N. A
Tiempo de adición:	N. A	Plazo total de ejecución:	N. A
Nueva fecha de terminación:	N. A		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N. A		
Fecha de reinicio:	N. A		
Nueva fecha de terminación:	N. A		

GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
Cobertura	**No. Póliza**	**Fecha inicial**	**Fecha Vencimiento**	**Valor asegurado**	**Asegurad ora**
Cumplimiento del contrato	30-44-101058355	04/06/2024	05/04/2025	$333,787,743.83	Seguros del estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30-44-101058355	04/06/2024	06/12/2027	$83,446,935.96	
Predio labores y operaciones	30-40-101021382	04/06/2024	30/11/2024	$390,000,000.00	

BALANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR
VALOR INICIAL	$ 1.668.938.719,16
PRIMER PAGO PARCIAL	N/A
SALDO PENDIENTE	$

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Desde el contrato de obra pública N° PS-GCT.2.7.24 - 585, se realizan acciones de establecimiento de 152 hectáreas de material vegetal en los municipios de CABUYARO, PUERTO LÓPEZ, PUERTO LLERAS, MAPIRIPÁN Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DEL META. Las plántulas serán adquiridas por el contratista con el fin de establecer 106.400 plántulas nativas del ecosistema de referencia (Bosques de Galería o Ripiaros).

Como resultado, se pretende incrementar la cobertura boscosa del departamento del Meta, y reducir los efectos causados por la deforestación. Dentro de las actividades establecidas en el contrato de obra, se encuentra las actividades establecimiento de plantas y aislamiento.

Durante la ejecución del contrato el equipo de la interventoría es quien tiene a cargo el seguimiento constante a las actividades realizadas por el contratista de obra por medio de visitas técnicas a cada uno de los predios priorizados, con el fin de supervisar la correcta entrega de los insumos, herramientas y el material vegetal de los predios, y realizar el seguimiento a las actividades correspondientes de establecimiento y aislamiento en los predios de los municipios de Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto López, Cabuyaro y san Martín.

3. INFORME DE EJECUCIÓN

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024				
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La Isabela	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Tiberio Mendoza		Agosto-septiembre	2024
Vereda	La Realidad	**Coordenadas**	3°5' 24.4948" N	
Municipio	Mapiripan		71° 5' 43.482" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento actividades de aislamiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas de campo al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas visitas se observó lo siguiente:

- Al momento de la visita se encontraban realizando actividades de preparación del terreno para continuar con las actividades del aislamiento e iniciar actividades de siembra.
- Se realizó el recorrido por el área en donde ya se encuentran instalado el aislamiento en compañía del técnico de obra y se hizo el conteo de 320 postes instalados y 20 pie de amigos.
- Durante el recorrido el técnico de la interventoría verificó que la distancia entre postes fuera de 3 metros, que cada 30 metros hubiese instalado un pie de amigos, altura libre de cada poste de madera fuera de 1,50 a 1,60 metros y que las cuerdas de alambres se encontraban cada 40 centímetros y debidamente tensionadas por medio de las grapas aceradas.

El equipo técnico de la interventoría realizó una nueva visita, en la cual se evidencio lo siguiente:

- El personal de mano de obra no calificada utiliza el casco, guantes, gafas y botas durante la realización de actividades del aislamiento.
- Se realizó nuevamente el recorrido perimetral por donde se encuentra instalado el aislamiento y se evidencio la instalación de 733 postes de madera y 75 pie de amigos

IMPREVISTOS
No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.
OBSERVACIONES
Se realizó la recomendación de que la profundidad de los hoyos para el aislamiento sea de 50 cm por 20 cm como lo indica el contrato, esto con el fin de que la altura libre del poste sea de 1,50 metros y así garantizar la estabilidad del poste, ya que, al disminuirle la profundidad, el poste queda inestable.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 1. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 2. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 3. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 4. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 5. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 6. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 7. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 8. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 9. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 10. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 11. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 12. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 13. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 14. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 15. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 16. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 17. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 18. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 19. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 20. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 21. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 22. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 23. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 24. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 25. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 26. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 27. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 28. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 29. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 30. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 31. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 32. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 33. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 34. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 35. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 36. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 37. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 38. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 39. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 40. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 41. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 42. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024				
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Santa Inés	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Camilo Hernández		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Alto navajas	**Coordenadas**	3°54′ 14″ N	
Municipio	Puerto López		72° 51′ 28″ W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento avance actividades de siembra y aislamiento.*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas de seguimiento al predio, con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas visitas se evidencio lo siguiente:

- Se realizó el recorrido por el área que está siendo intervenida, se verifico la instalación de 200 postes con sus respectivos 3 hilos de alambre y pie amigos de refuerzo. Adicionalmente cumplen con las medidas que indica el contrato. También se realizó un levantamiento con el GPS para tener un aproximado del área que llevan establecidas, el cual arrojo un aproximado de 8 hectáreas, lo que equivale a la siembra de 6.160 plantas.
- Se realizó una nueva vista al predio en la cual se realizó el recorrido por el área en la que se encontraba personal de mano de obra no calificada desarrollando actividades tanto de siembra como de aislamiento, así mismo se realizó el conteo de 350 postes con sus respectivos 3 hilos de alambre y pie amigos de refuerzo. También se realizó la medición del área que llevan de siembra, la cual es de 11 hectáreas, lo que equivale a 7.700 plantas establecidas. Las plantas presentan buena adaptación y se encuentran en condiciones óptimas.
- Se realizó una nueva visita al predio, se llevó a cabo el recorrido en compañía del técnico de obra y se realizó el conteo de la instalación de 427 postes de madera y 50 pie de amigos. Durante este recorrido el técnico de la interventoría realizó la medición de la distancia entre postes, la distancia entre cada pie de amigo e hilo de alambre. En cuanto a la siembra, se realizó el levantamiento con GPS el cual arrojo el dato de 12,7 hectáreas de siembra, lo cual equivale a 9.779 plantas sembradas.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se le realizó la recomendación al contratista de obra de darle un mejor manejo al material vegetal que falta por sembrar, ya que se encuentra expuesto a la intemperie y está siendo atacado por la hormiga arriera y gusano. Para ello la interventoría le recomendó ubicarlo bajo la sombra o en su defecto poner una poli sombra y hacerle una ronda con insecticida para controlar la plaga. Adicionalmente se le recomendó al contratista implementar un sistema de riego, ya que según los trabajadores lleva más de 12 días sin llover y el terreno se encuentra demasiado seco, lo que puede generar deshidratación del material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 43. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 44. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 45. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 46. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 47. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 48. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 49. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 50. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 51. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 52. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 53. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 54. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 55. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 56. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 57. Verificación especificaciones técnicas de aislamiento.



Figura. 58. Verificación especificaciones técnicas de siembra



Figura. 59. Verificación especificaciones técnicas de siembra



Figura. 60. Verificación especificaciones técnicas de siembra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 61. Materiales e insumos para la siembra



Figura. 62. Materiales e insumos para la siembra



Figura. 63. Materiales e insumos para la siembra



Figura. 64. Materiales e insumos para la siembra



Figura. 65. Materiales y herramientas



Figura. 66. Material vegetal sin protección

REGISTRO FOTOGRÁFICO

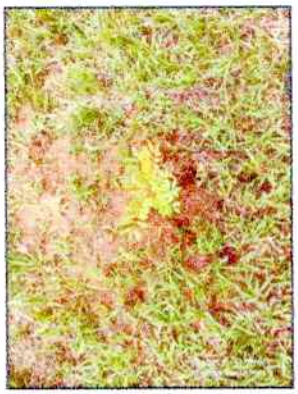


Figura. 67. Verificación de componente siembra.



Figura. 68. Verificación de componente siembra.



Figura. 69. Verificación de componente siembra.



Figura. 70. Verificación de componente siembra.



Figura. 71. Verificación de componente siembra.



Figura. 72. Verificación de componente siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 73. Verificación de componente siembra.



Figura. 74. Verificación de componente siembra



Figura. 75. Verificación de componente siembra.



Figura. 76. Verificación de componente siembra



Figura. 77. Verificación de componente siembra.



Figura. 78. Verificación de componente siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 79. Verificación de componente siembra.



Figura. 80. Verificación de componente siembra.



Figura. 81. Verificación de componente siembra.



Figura. 82. Verificación de componente siembra.



Figura. 83. Verificación de componente siembra.



Figura. 84. Verificación de componente siembra.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La Milagrosa	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Diego Ochoa		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Puerto Castro	**Coordenadas**	3°31' 12.7102" N	
Municipio	San Martin		72° 47' 51.8011" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento avance de siembra y aislamiento.*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo técnico de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas visitas se evidenciaron los siguientes avances:

- Se realizó el recorrido por el área en donde se están llevando a cabo las actividades de siembra y aislamiento, durante esta se evidenció la instalación de 300 postes instalados y el establecimiento de material vegetal en aproximadamente 12 hectáreas. En el momento de la visita se evidenció al personal realizando hoyos tanto para el aislamiento como para la siembra.
- Se realizó una nueva visita al predio para cuantificar los avances, durante esta visita se llevo a cabo el recorrido con el técnico de campo, en el cual se evidencio la instalación de 427 postes de madera y 45 pie de amigos con sus 3 hilos de alambre de púas bien tensionados. En cuanto a la siembra, se realizó la medición con el GPS, el cual arrojo un dato de 18 hectáreas aproximadamente, lo que equivale a la siembra de 13.860 plantas.
- Se observó que el personal de obra continúa realizando hoyos tanto para hincar postes (60 cm por 20 cm) como para la siembra del material vegetal (30x30x30).
- Durante los recorridos, el técnico de la interventoría selecciono un área considerable con el fin de hacerle una revisión minuciosa a la plantación, mediante esta revisión evidencio que algunas plantas presentan ataque por hormiga arriera y deshidratación.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Sele recomendó al contratista realizar control de hormiga arriera mediante la aplicación de insecticidas y adicionalmente implementar un sistema de riego, el cual le proporcione la hidratación a las plantas, ya que por la zona hace más de ocho días que no llueve, según como lo indica los trabajadores. También informaron que, si la época de la sequia continua, van a suspender actividades de siembra, ya que el material se expone a temperaturas muy altas, lo que provoca su marchitamiento y luego morir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 85. Verificación proceso de siembra



Figura. 86. Verificación proceso de siembra



Figura. 87. Verificación proceso de siembra



Figura. 88. Verificación proceso de siembra



Figura. 89. Verificación proceso de siembra



Figura. 90. Verificación proceso de siembra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 91. Verificación proceso de siembra



Figura. 92. Verificación proceso de siembra



Figura. 93. Verificación proceso de siembra



Figura. 94. Verificación proceso de siembra



Figura. 95. Verificación proceso de siembra



Figura. 96. Verificación proceso de siembra

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Bella Vista	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Abraham Castillo		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Guacamayas	**Coordenadas**	3°2' 24.472" N	
Municipio	Mapiripán		72°53' 27.8038" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas actividades se evidenció lo siguiente:

- El contratista de obra realizó una primera entrega de 7.135 plantas de las especies caño fistol, Igua, Machaco y Samán. Las plantas se encuentran en altura promedio de 30 centímetros, libres de plagas y enfermedades; algunas plantas muestran índices de estrés hídricos a causa del transporte.
- El contratista de obra realizó dos días después una segunda entrega de 9.440 plantas de las especies caños fistol, Igua, machaco, samán, búcaro, yopo y aceite. A la fecha han entregado un total de 16575 plántulas, las cuales cumplen con las condiciones aptas, follaje en buen estado, sin presencia de plagas ni enfermedades.
- Se realizó una nueva visita al predio para validar los avances correspondientes al aislamiento, durante esta visita el técnico de la interventoría realizó el recorrido perimetral por donde se encontraba instalada la cerca, levantando el track por medio del GPS, el cual le arrojo la instalación de 1,5 kilómetros. Adicionalmente verifico que la distancia entre postes fuera de 3 metros, que cada 10 postes estuviera el refuerzo con el pie de amigos y que las tres cuerdas de alambre estuvieran bien aseguradas y tensionadas por las grapas aceradas. Adicionalmente se evidenció el uso de los implementos de seguridad (casco, botas, guante y gafas). Finalmente, el personal de obra se encontraba realizando el ahoyado para hincar los postes, a los cuales se les verifico la medida de 60 cm de profundidad por 20 cm de diámetro.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

El técnico de la interventoría realizó la recomendación de darle buen manejo al material vegetal, ya que por la larga distancia de transporte presenta estrés hídrico, por lo tanto, recomendó que el material se mantenga bajo la sombra y que alrededor se le haga una ronda con insecticida para prevenir el ataque por cualquier tipo de plaga. Adicionalmente se le recomendó al usuario que le realice riegos constantes y que el material se transporte a campo cuando vaya a ser trasplantado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

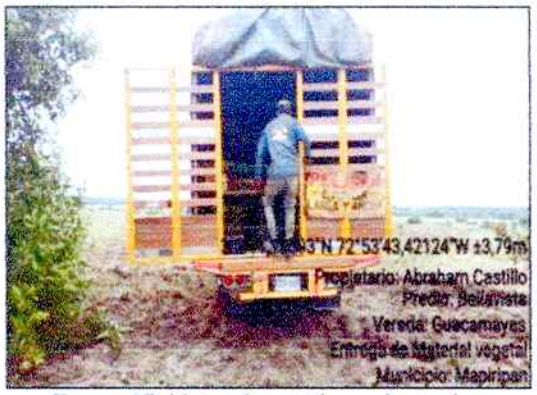


Figura. 97. Material vegetal para la siembra.



Figura. 98. Material vegetal para la siembra.



Figura. 99. Material vegetal para la siembra.



Figura. 100. Material vegetal para la siembra.



Figura. 101. Material vegetal para la siembra.



Figura. 102. Material vegetal para la siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 103. Material vegetal para la siembra.



Figura. 104. Material vegetal para la siembra.



Figura. 105. Material vegetal para la siembra.



Figura. 106. Verificación especificaciones técnicas material vegetal



Figura. 107. Verificación especificaciones técnicas material vegetal



Figura. 108. Verificación especificaciones técnicas material vegetal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 109. Verificación especificaciones técnicas material vegetal



Figura. 110. Verificación especificaciones técnicas material vegetal

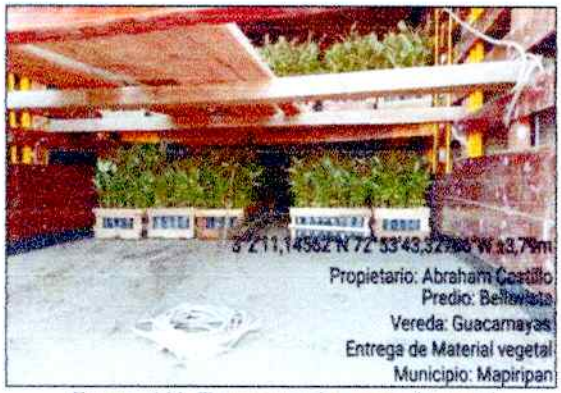


Figura. 111. Transporte de material vegetal

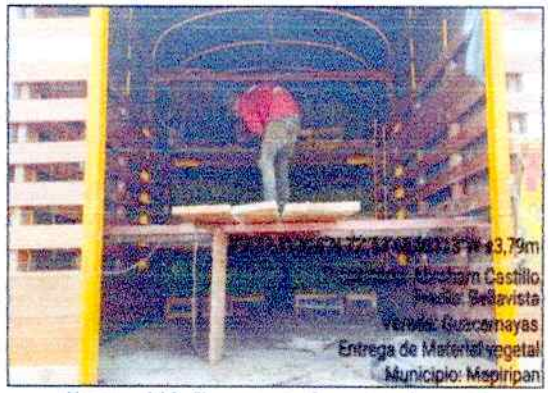


Figura. 112. Transporte de material vegetal



Figura. 113. Transporte de material vegetal



Figura. 114. Verificación especificaciones técnicas material vegetal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 115. Transporte de material vegetal en campo



Figura. 116. Transporte de material vegetal en campo



Figura. 117. Transporte de material vegetal en campo



Figura. 118. Transporte de material vegetal en campo



Figura. 119. Verificación de material vegetal.



Figura. 120. Verificación de material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 121. Verificación de material vegetal.



Figura. 122. Verificación de material vegetal.



Figura. 123. Verificación de material vegetal.



Figura. 124. Verificación de material vegetal.



Figura. 125. Verificación de material vegetal.



Figura. 126. Verificación de material vegetal.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	San Cristóbal Lote A	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Myriam Martínez		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Las delicias	**Coordenadas**	4°27' 2.346" N	
Municipio	Cabuyaro		73°4' 20.592" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo técnico de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante las visitas se evidenció lo siguiente:

- De acuerdo a la información recibida por el contratista de obra, se coordino visita al predio en compañía de la supervisión y el contratista de obra, con el fin de verificar la disponibilidad de área, ya que el área que había sido seleccionada inicialmente presentadas zonas inundables, lo cual indica un riesgo para la siembra. Durante esta visita, se realizó el recorrido por el área en compañía del esposo de la propietaria y se concluyo que el área realmente viable y disponible para el proyecto es de 7 hectáreas.
- Se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de materiales y herramientas para aislamiento, se evidencio la entrega de postes de madera en buen estado, con diámetros entre 8 a 12 centímetros y con longitud de 2,10 metros. Adicionalmente le entrega de alambre de púas calibre 12,5, grapas aceradas y como herramienta menor pala dragas.
- También se observo que el contratista de obra entrego la dotación (cascos, guantes, gafas y botas) para llevar a cabo las actividades de la instalación del aislamiento.
- En una nueva visita, se realizó el recorrido por el área en la que se observo el inicio de actividades preparación de terreno, ahoyado y trazado para el aislamiento.
- Entrega de material vegetal e insumos como cal dolomita, abono orgánico, insecticida e hidroretendor. Las plantas llegaron en buenas condiciones, el estrés hídrico fue muy poco y su lugar de acopio temporal es cerca de la vivienda.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se aclara que en este predio ya no se van a intervenir 15 hectáreas sino 7 hectáreas, también se informa que las 8 hectáreas van a ser reubicadas en el predio de Puerto Lleras. Adicionalmente el usuario manifiesta el interés de que la mayoría de las plantas que se siembre en su predio, sea de la especie de moriche.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 127. Acompañamiento y verificación de terreno



Figura. 128. Acompañamiento y verificación de terreno



Figura. 129. Acompañamiento y verificación de terreno



Figura. 130. Acompañamiento y verificación de terreno



Figura. 131. Materiales para aislamiento



Figura. 132. Materiales para aislamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 133. Descargue material vegetal.



Figura. 134. Descargue material vegetal.



Figura. 135. Descargue material vegetal.



Figura. 136. Descargue material vegetal.



Figura. 137. Descargue material vegetal.



Figura. 138. Descargue material vegetal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 139. Verificación de aislamiento



Figura. 140. Verificación de aislamiento



Figura. 141. Verificación de aislamiento



Figura. 142. Verificación de aislamiento



Figura. 143. Verificación de aislamiento



Figura. 144. Descargue material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 145. Insumos para siembra.



Figura. 146. Insumos para siembra



Figura. 147. Insumos para siembra



Figura. 148. Descargue material vegetal.



Figura. 149. Descargue material vegetal.



Figura. 150. Descargue material vegetal.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La soledad	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Alberto cubillos Caicedo		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Guacamayas	**Coordenadas**	3°6' 9.0318" N	
Municipio	Mapiripán		72°51' 37.3262" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo técnico de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas visitas se realizó lo siguiente:

- Se realizó el recorrido por el área que está siendo intervenido, primero se inicio con la marcación de los postes instalados y posteriormente se hizo el recorrido por el área que ya se encuentran plantas establecidas. Se evidenció la instalación de 320 postes de madera y 20 pie de amigos con sus respectivos 3 hilos de alambre bien tensionados y asegurados por las grapas aceradas. En el momento de la vista se evidencio la presencia de tres hombres realizando actividades de ahoyado para hincar los postes.
- Se realizó una nueva visita al predio, en la cual se continuo con la marcación de los postes instalados, a corte del día de la visita llevaban 467 postes de madera instalados y 47 pie de amigos. Así mismo se evidencio la instalación de las 3 cuerdas de alambre de púas, cada una a 40 centímetros. En algunos tramos se observó que la distancia entre los postes varia de 3,10 metros a 3,20 metros, lo que se le observó a los trabajadores, quienes mencionaron que en estos tramos se tuvo que hacer ese reajuste debido a las condiciones del terreno (presencia de rocas).
- En cuanto al componente de siembra, en este predio iniciaron actividades de preparación de terreno, ahoyado de 30x30x30, pero hasta la fecha no han indicado siembra a causa de que por la zona ya lleva mas de 8 días sin llover y el terreno se encuentra muy seco. El contratista de obra informo que por el momento van a continuar realizando ahoyados para la siembra, mientras llueve para iniciar con el trasplante de las plantas.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se le recomendó al contratista agilizar el proceso de la entrega del material vegetal, con el fin de que cuando llueva, se inicie con la siembra de las plantas, para así mismo evitar retrasos en la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 151. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 152. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 153. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 154. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 155. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 156. Seguimiento avance aislamiento.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024				
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	El paisaje	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	John Jairo Córdoba		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Chafurray	**Coordenadas**	3°37' 43.2" N	
Municipio	Puerto Lleras		73°52' 52.4" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Seguimiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó el acompañamiento al equipo de obra para llevar a cabo la visita de seguimiento al predio ubicado en el municipio de Puerto Lleras para verificar lo siguiente:

- Se realizo la visita técnica de campo, donde se verifico el avance de aislamiento para el establecimiento. Cumpliendo con las distancias entre postes es 3m, cada 30m pie de amigo, con tres hilos de alambre con distancia de 40cm entre cada hilo de alambre.
- La interventoría realizo acompañamiento al taller que contó con la participación de 15 personas de la comunidad, se explicó el contexto del proyecto, la importancia del proyecto.
- Durante la visita se observó que se han entregado en la finca 92 cajas de la especie machaco para un total de 4600 árboles, 80 bultos de abono orgánico y 60 bultos de cal dolomita.
- La interventoría realizo la visita con el fin de verificar el avance de las actividades correspondientes a la siembra, se observó personal en campo desarrollando actividades de trazado, ahoyado, plateo, resiembra y aplicación de enmiendas agrícolas. Se verifico la distancia entre planta sembrada es de 3m. el material vegetal que se encuentra resembrado presenta buenas características físicas y fitosanitarias. También se hizo recomendación de aplicar las cantidades correspondientes que son: 500gr de abono por cada planta, 150gr de cal dolomita y 5gr de hidroretendor por planta.
- Durante la visita se hizo el recorrido por el área, se verifico que los postes instalados cada 3m, el pie de amigo cada 30m, distancia entre cada hilo alambre 40cm y altura libre del poste oscila entre 1.50 y 1.55m, a la fecha de la visita se evidenció un avance de: 4426 postes hincados y pie de amigo instalados 445, equivalente a 13.29km de aislamiento.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se hizo recomendación de aplicar las cantidades correspondientes que son: 500gr de abono por cada planta, 150gr de cal dolomita y 5gr de hidroretendor por planta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 157. Verificación especificaciones de material vegetal



Figura. 158. Verificación especificaciones de material vegetal



Figura. 159. Verificación especificaciones de material vegetal



Figura. 160. Verificación especificaciones de material vegetal



Figura. 161. Verificación especificaciones de material vegetal.



Figura. 162. Materiales para aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 163. Almacenamiento material vegetal.



Figura. 164. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 165. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 166. Materiales para aislamiento.



Figura. 167. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 168. Materiales e insumos para la siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 169. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 170. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 171. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 172. Materiales e insumos para la siembra.



Figura. 173. Seguimiento avance aislamiento.



Figura. 174. Seguimiento avance aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 175. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 176. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 177. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 178. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 179. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 180. Especificaciones para aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 181. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 182. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 183. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 184. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 185. Especificaciones para aislamiento.



Figura. 186. Especificaciones para aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 187. Proceso de siembra.



Figura. 188. Proceso de siembra.



Figura. 189. Proceso de siembra.



Figura. 190. Proceso de siembra.



Figura. 191. Proceso de siembra.



Figura. 192. Proceso de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 193. Proceso de siembra.



Figura. 194. Proceso de siembra.



Figura. 195. Proceso de siembra.



Figura. 196. Proceso de siembra.



Figura. 197. Proceso de siembra.



Figura. 198. Proceso de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 199. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 200. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 201. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 202. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 203. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 204. Seguimiento avance a siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

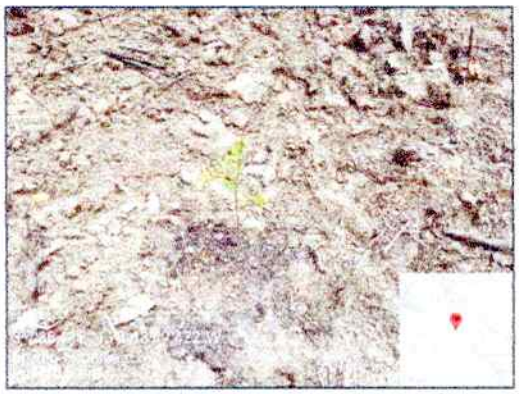


Figura. 205. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 206. Seguimiento avance a siembra



Figura. 207. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 208. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 209. Seguimiento avance a siembra.



Figura. 210. Seguimiento avance a siembra.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024				
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La Esmeralda	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Hermes Eliecer Álvarez		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Caño Evaristo	**Coordenadas**	2°54'40.44 " N	
Municipio	Mapiripan		72°7'2.83" W	
Departamento	Meta	**Actividad**	*Reconocimiento*	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo técnico de la interventoria realizó visitas al predio con el objetivo de evaluar y verificar las actividades ejecutadas por el contratista. Durante las visitas se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se realizó un recorrido por el área intervenida, donde se evidenció un avance del 90% en la preparación del terreno para el aislamiento. También se observó el transporte interno de postes mediante un remolque asegurado a un tractor. Los postes eran distribuidos en el terreno para su posterior instalación, junto con la compactación del terreno.
- En una visita posterior, se verificó la instalación de 150 postes de madera, cada uno con su respectiva cuerda de alambre de púas y los pies de amigo que garantizan su estabilidad. Además, se comprobó que la distancia entre los postes variaba entre 2,58 y 3,10 metros, y que cada 10 postes se instalaba un pie de amigo. La altura libre de los postes oscilaba entre 1,50 y 1,55 metros.
- En cuanto al componente de siembra, a la fecha no se evidencio entrega de material vegetal ni insumos.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se recomendó al contratista realizar la entrega del material vegetal y los insumos necesarios para iniciar estas actividades, con el fin de evitar posibles retrasos en la ejecución del proyecto. Cabe destacar que el material vegetal requiere mantenimiento entre los 30 y 45 días posteriores a su instalación, lo cual debe ser considerado en la planificación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 211. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 212. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 213. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 214. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 215. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 216. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 217. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 218. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 219. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 220. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 221. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.



Figura. 222. Verificación especificaciones técnicas para aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 223. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 224. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 225. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 226. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 227. Seguimiento avance de aislamiento.

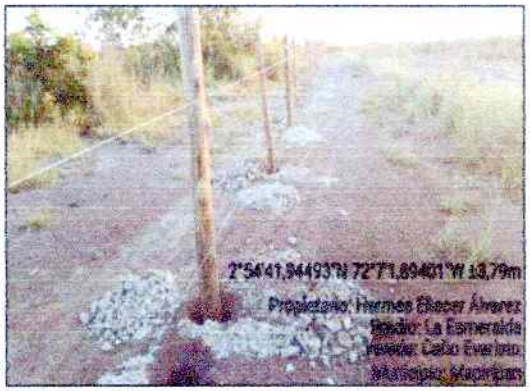


Figura. 228. Seguimiento avance de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 229. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 230. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 231. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 232. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 233. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 234. Seguimiento avance de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 235. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 236. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 237. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 238. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 239. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 240. Seguimiento avance de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 241. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 242. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 243. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 244. Seguimiento avance de aislamiento



Figura. 245. Seguimiento avance de aislamiento.



Figura. 246. Seguimiento avance de aislamiento.

3.2. SEGUIMIENTO DESPACHO DE MATERIAL DE AISLAMIENTO, INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Vivero la Bondad & el samán	**Fecha**	**Mes**	**Año**
Usuario	Arturo Gómez M.		Agosto-septiembre	2024
Vereda	Puerto López	**Actividad**	*Cargue de materiales e insumos*	
Municipio	Puerto López - Restrepo			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó el acompañamiento al equipo de obra para llevar a cabo la visita de viveros para verificar lo siguiente:

- Se realizó el acompañamiento al equipo de obra en el embarque de material vegetal con destino al municipio de puerto lleras al predio el paisaje. Se despacharon 4600 plantas, distribuido en 92 cajas (guacales) de 50 unidades y se verifico que las especies cumplieran con las especificaciones técnicas del contrato altura de 25 a 40cm desde la base hasta la punta, que no presente deficiencia nutricional y esté libre de plaga.
- Se acompaño al equipo de obra y a supervisión en el cargue de material vegetal del mayor ofrecimiento que el contratista presento para el proyecto, donde se tuve en cuenta las especificaciones técnicas para este material, la altura de las plantas de 50- 100cm, libre de plaga y sin deficiencia nutricional. Entre las especies que se embarcaron se encontró: Palo cruz 440 plántulas, Maíz tostado 525 plántulas, Arrayan blanco 57 plántulas , Gualanday 300 plántulas , Briza 200 plántulas , Copo Azu 50 plántulas . Para un total de 1500 plantas que van dirigidas a el municipio de puerto Gaitán.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se le recomendó al contratista de obra que, a la hora del descargue del material vegetal, se acopie en un lugar bajo la sombra y se le haga alrededor una ronda con insecticida para si mismo evitar el ataque por cualquier tipo de plaga.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 247. Embarque de material vegetal.



Figura. 248. Embarque de material vegetal.



Figura. 249. Embarque de material vegetal.



Figura. 250. Embarque de material vegetal.



Figura. 251. Embarque de material vegetal.



Figura. 252. Embarque de material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 253. Material vegetal vivero.



Figura. 254. Material vegetal vivero.



Figura. 255. Material vegetal vivero.



Figura. 256. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 257. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 258. Especificaciones para material vegetal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 259. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 260. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 261. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 262. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 263. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 264. Especificaciones para material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 265. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 266. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 267. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 268. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 269. Especificaciones para material vegetal.



Figura. 270. Especificaciones para material vegetal.

4. TALLERES Y/O CAPACITACIONES

TALLER No.1	
Fecha:	18 de agosto de 2024
Lugar de la socialización:	Predio El paisaje – Puerto Lleras

OBJETIVO: capacitación sobre conservación, restauración y los servicios ecosistémicos que presta el bosque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 271. Capacitación y taller



Figura. 272. Capacitación y taller



Figura. 273. Capacitación y taller



Figura. 274. Capacitación y taller



Figura. 275. Capacitación y taller



Figura. 276. Capacitación y taller

TALLER No.2	
Fecha:	12 de septiembre de 2024
Lugar de la socialización:	Predio El paisaje – Puerto Lleras

OBJETIVO: capacitación sobre conservación, restauración y los servicios ecosistémicos que presta el bosque. Experiencia aula viva

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 277. Capacitación y taller



Figura. 278. Capacitación y taller



Figura. 279. Capacitación y taller



Figura. 280. Capacitación y taller



Figura. 281. Capacitación y practica



Figura. 282. Capacitación y practica

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 283. Capacitación y practica



Figura. 284. Capacitación y practica



Figura. 285. Capacitación y practica



Figura. 286. Capacitación y practica



Figura. 287. Capacitación y practica



Figura. 288. Capacitación y practica

5. COMITES TÉCNICOS

ACTA DE COMITÉ No. 4	
Fecha del comité No.4	04 de agosto de 2024
Lugar de reunión	Virtual

OBJETIVO DEL COMITÉ: Llevar a cabo el comité técnico de seguimiento No. 04 al Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.24 – 379 y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META" y al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.24 – 585, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 a.m., se da inicio al comité de obra e interventoría correspondiente a los contratos No. PS-GCT-2.7.24-585 y PS-GCT-2.7.24-379.

Inicia la interventoria presentando las observaciones puntuales con respecto al informe de avance mensual No.2 del contratista de obra y se hace devolución de las 2 carpetas para la respectiva subsanación. Continua con las observaciones referentes a la parcial No.1 del contratista de obra, en las que se hace énfasis para que la información se plasme en los formatos adecuados que se encuentran publicados en la página de Cormacarena (acta parcial), se realice la entrega total de soportes que respaldan el aislamiento y siembra que están cobrando.

1) Ajuste áreas

Municipio	Predio	Área inicial	Área definitiva
Cabuyaro	San Cristóbal	15 Ha	7 Ha
Puerto Lleras	El Paisaje	30 Ha	38 Ha

Inicialmente se trata con la supervisión los ajustes al área que se tenía planteada inicialmente en el predio San Cristóbal ubicado en el municipio de Cabuyaro. Este ajuste se fundamenta en la disponibilidad de áreas que tiene actualmente el propietario, puesto que, no cuenta con las 15 hectáreas sino con 7 hectáreas, debido a que gran parte del predio tiene áreas inundables que dificultarían la siembra de la totalidad de las hectáreas.

Es por esto, que se realizó una visita de inspección (interventoría y obra) y se confirmó que el predio tenía estas características. Por consiguiente, se acuerda con la interventoría y la supervisión la viabilidad y aprobación del ajuste propuesto; de esta manera, una vez revisada las condiciones del predio beneficiario localizado en el municipio de Puerto Lleras, por lo tanto, se intervendrían 38 hectáreas en este predio. L
Seguido, la interventoría solicita al contratista finalizar y entregar lo más pronto posible, los polígonos (hectáreas para siembra) y líneas (longitud aislamiento) en formato .kml o .kmx , con el fin de realizar un adecuado seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra.

El contratista interviene y propone a la supervisión y la interventoría que los municipios en los que se van a implementar las tres (3) parcelas de monitoreo en los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Lleras.

2) Propuesta de adición-prórroga y justificación

La Entidad informa que esta propuesta esta basada en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Cuatrienal, y como medida preventiva para la protección y cuidado de las áreas intervenidas con la llegada de la temporada seca.
La supervisión informa que esta propuesta de adición y prórroga dos (2) meses sería para los dos contratos (obra e interventoría), y en esta se plantean dos actividades:

- Segundo mantenimiento para las áreas intervenidas inicialmente.
- Barrera cortafuegos (16,649 km aprox.)

Se ejecutaría en todos los municipios beneficiarios a excepción del municipio de Cabuyaro debido a las condiciones del suelo (humedad) en la zona en donde se instalará el aislamiento protector.

- Personal y transporte

Se tendrá en cuenta un personal mínimo pa
Habiendo abordado todos los aspectos a revisar en la reunión, se da por finalizado el comité

❖ **COMPROMISOS**

Por el contratista de obra: Entrega de observaciones del informe mensual No.2

Por la interventoría: Entrega de observaciones de la parcial 1 de obra.

ACTA DE COMITÉ No. 5	
Fecha del comité No.4	05 de septiembre de 2024
Lugar de reunión	Oficina del contratista de obra

OBJETIVO DEL COMITÉ: Llevar a cabo el comité técnico de seguimiento No. 04 al Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.24 – 379 y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META" y al Contrato de Obra No. PS-GCT.2.7.24 – 585, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 a.m., se da inicio al comité de obra e interventoría correspondiente a los contratos No. PS-GCT-2.7.24-585 y PS-GCT-2.7.24-379.

Inicia la interventoría presentando las observaciones puntuales con respecto al informe de avance mensual No.2 del contratista de obra y se hace devolución de las 2 carpetas para la respectiva subsanación. Continua con las observaciones referentes a la parcial No.1 del contratista de obra, en las que se hace énfasis para que la información se plasme en los

Habiendo abordado todos los aspectos a revisar en la reunión, se da por finalizado el comité formatos adecuados que se encuentran publicados en la página de Cormacarena (acta parcial), se realice la entrega total de soportes que respaldan el aislamiento y siembra que están cobrando.

1) **Ajuste áreas**

Municipio	Predio	Área inicial	Área definitiva	Justificación
Cabuyaro	San Cristóbal	15	7	No disponibilidad de las 15 hectáreas en el predio de Cabuyaro porque predominan áreas inundables. Después de la visita de verificación se identificó una disponibilidad de 7 hectáreas.
Puerto Lleras	El Paisaje	30	38	
Área		45	45	Se ajusta de tal manera que la totalidad de las áreas intervenidas en los cinco (5) municipios siga siendo 152 hectáreas, según lo definido en el contrato.

Inicialmente se trata con la supervisión los ajustes al área a intervenir en el predio San Cristóbal ubicado en el municipio de Cabuyaro. Este ajuste se fundamenta en la disponibilidad de áreas que tiene actualmente el propietario, puesto que, no cuenta con las 15 hectáreas sino con 7 hectáreas, debido a que gran parte del predio tiene áreas inundables que dificultarían la siembra de la totalidad de las hectáreas. Es por esto, que se realizó una visita de inspección el día 14 de agosto de 2024 (interventoría, obra y supervisión) y se confirmó que el predio tenía estas características. Por

consiguiente, la interventoría y la supervisión aprueban la viabilidad del ajuste propuesto, que consiste en intervenir las 8 hectáreas faltantes en el predio del municipio de Puerto Lleras teniendo en cuenta de la novedad presentada en el predio del municipio de Cabuyaro. De esta manera, la supervisión y la interventoría programan visita de reconocimiento (obra-interventoría y supervisión) a las ocho (8) hectáreas adicionales que se intervendrán en el predio del municipio de Puerto Lleras. Se aclara que las especies vegetales a sembrar, y demás especificaciones técnicas se deben mantener según lo que indique el contrato y los anexos técnicos del proceso.

2) Propuesta de adición-prórroga y justificación

La Entidad informa que esta propuesta esta basada en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Cuatrienal, y como medida preventiva para la protección y cuidado de las áreas intervenidas con la llegada de la temporada seca .
La supervisión informa que esta propuesta de adición y prórroga dos (2) meses sería para los dos contratos (obra e interventoría), y en esta se plantean dos actividades:

- Segundo mantenimiento para las áreas intervenidas inicialmente: Esta actividad se realizaría en las 152 hectáreas que contempla el proyecto de un principio.
- Barrera cortafuegos (16,649 km aprox: Se ejecutaría en todos los municipios beneficiarios a excepción del municipio de Cabuyaro debido a las condiciones del suelo (humedad) en la zona en donde se tiene proyectado instalar el aislamiento protector.
- Personal y transporte: Se tendrá en cuenta un personal mínimo para la ejecución de las actividades que se van a adicionar.

Nota: Los precios y especificaciones técnicas serán las mismas que las definidas en los documentos precontractuales y contractuales del proceso.

3) Avance

BENEFICIARIOS CONSORCIO REHABILITACIÓN 2024				AVANCE (14 junio al 31 de agosto)	
Nº	USUARIO	MUNICIPIO	PREDIO	ÁREA (HA)	CERCA (KM)
1	Abraham Castillo	Mapiripan	Bella Vista	0	1,50
2	Hermes Eliecer Álvarez Castillo		La Esmeralda	0	0,00
3	Jesús Alberto Cubillos		Hacienda La Soledad	0	1,40
4	Tiberio Mendoza		La Isabela	0	2,20
5	Henry Clavijo		Agropecuaria Porvenir	10	1,41
6	Heidi Viviana González Benavides	San Martin	La Milagrosa	18,4	1,70
7	Mabel Elena Narváez Bergonzoli	Puerto López	Santa Inés	12,7	1,28
8	Jhon Jairo Cordoba	Puerto Lleras	El Paisaje	3,896	3,80
9	Myriam Martinez López	Cabuyaro	San Cristóbal Lote A	0	0,00
TOTAL				44,996	13,29

4) Otros

- El contratista interviene, proponiendo a la supervisión y la interventoría la selección de los municipios en los que se van a implementar las tres (3) parcelas de monitoreo, que para este caso sería en los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Lleras.
- La interventoría solicita al contratista finalizar y entregar lo más pronto posible, los polígonos (hectáreas para siembra) y líneas (longitud aislamiento) en formato kml o kmx, con el fin de realizar un adecuado seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra.
- Supervisión solicita al contratista ajustar los formatos de entrega de insumos y materiales de acuerdo con las correcciones realizadas en el presente comité.

❖ COMPROMISOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCION DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Visita de Reconocimiento de las hectáreas que ahora se van a intervenir en Puerto Lleras	Revisión inicial de áreas que se van a intervenir	Obra interventoría y supervisión	12/09/2024
2	Solicitud escrita de propuesta de adición y prórroga	Trazabilidad del proceso	Supervisión	07/09/2024
3	Envío de caracterizaciones de los predios beneficiarios	Trazabilidad del proceso	Supervisión	07/09/2024

6. SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE	CEDULA	CARGO	PLANILLA JUNIO	PLANILLA JULIO	PLANILLA AGOSTO
Guillermo Antonio Rojas Baquero	1.121.837.552	Representante legal	1065505518	1066500468	1066500472
Adriana Lucia Diaz Bobadilla	40.404.531	Director de interventoria	1065505518	1066500468	1066500472
María Eugenia Baquero Castro	1.136.886.716	Profesional	1065505518	1066500468	1066500472
Sofia Catherine Acosta Bonilla	40.219.696	Profesional de informes	1065505518	1066500468	1066500472
Everardo Álvarez Osorio	86.061.712	Técnico interventor	1065505518	1066500468	1066500472
Ferney Alexander Montaña	3.277.334	Técnico interventor	1065505518	1066500468	1066500472

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El equipo técnico realizó visitas técnicas a los predios beneficiarios, con el fin de verificar y evaluar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante estas visitas se evidenció el siguiente avance:

Nº	USUARIO	MUNICIPIO	PREDIO	AVANCE
1	Abraham Castillo	Mapiripan	Bella Vista	Instalación de 1,5 kilómetros de aislamiento
2	Hermes Eliecer Álvarez Castillo		La Esmeralda	Instalación de postes, pie amigos e hilos de alambre
3	Jesús Alberto Cubillos		Hacienda La Soledad	Instalación de 1,4 kilómetros de aislamiento
4	Tiberio Mendoza		La Isabela	Instalación de 2,2 kilómetros de aislamiento
5	Henry Clavijo		Agropecuaria Porvenir	Actividades de siembra y asilamiento finalizadas
6	Heidi Viviana González Benavides	San Martín	La Milagrosa	Instalación de 1,70 kilómetros de aislamiento y siembra de 10 hectáreas
7	Mabel Elena Narváez Bergonzoli	Puerto López	Santa Inés	Instalación de 1,28 kilómetros de aislamiento y siembra de 12,7 hectáreas
8	Jhon Jairo Cordoba	Puerto Lleras	El Paisaje	Instalación de 3,80 kilómetros de aislamiento y siembra de 3,8 hectáreas
9	Myriam Martínez López	Cabuyaro	San Cristóbal Lote A	Preparación de terreno para aislamiento y entrega de plantas e insumos

- Se realizó el acompañamiento a los talleres del proyecto que fueron llevados a cabo por el contratista en el municipio de puerto lleras en el predio El Paisaje, lo cual contribuyó en la generación de conciencia y apoyo, por parte de la comunidad local, fortaleciendo así la base de respaldo para el desarrollo del proyecto.

- Respecto al avance porcentual por parte del contratista de obra durante el periodo de ejecución No.3, que va desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2024, el contratista de obra informó un avance físico del 11.51%. En concordancia, la interventoría ha realizado las respectivas visitas de verificación en campo, con el fin de corroborar cada una de las acciones adelantadas por el contratista. Igualmente, se notificaron las observaciones recolectadas en campo para asegurar la calidad de las obras.

- La interventoría realizó los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del equipo técnico, para el mes de agosto del año 2024.

- El contratista de obra ha suspendido temporalmente las actividades de siembra debido a la falta de lluvia y al estado extremadamente seco del terreno, lo que está causando el marchitamiento de las plantas. Para evitar la mortalidad de las plantas ya establecidas, el contratista ha implementado un sistema de riego que opera desde las 5 a.m. hasta las 9 a.m.

8. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de interventoría
Anexo 2. Actas de comités.
Anexo 3. Planillas de seguridad social
Anexo 4. Copia de bitácoras
Anexo 5. Correspondencia.
Anexo 6. CD.

Elaborado por:

Sofia Catherine Acosta

SOFIA CATHERINE ACOSTA BONILLA
PROFESIONAL DE INFORMES

Aprobado por:

ING. GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Anexo 1.
CRONOGRAMA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACION AMBIENTAL 2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNI	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
			JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Revisión completa y detallada del objeto del contrato de obra denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META", de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otre documento que haga parte del contrato.	Mes	X	X																										
2	Realizar el acompañamiento en las socializaciones programadas por el contratista en los municipios donde se ejecutaran las actividades del proyecto, dejando las respectivas constancias.	Mes	x	x	x	x																								
3	Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias.	Mes	X	X	X	X																								
4	Asistencia técnica de interventoría para realizar visitas de seguimiento a las actividades de entrega de insumos y material vegetal por parte del contratista a cada uno de los predios beneficiarios, ubicados en los 5 municipios.	Mes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Asistencia técnica de interventoría para ealizar el seguimiento a cada uno de los predios beneficiarios del proyecto para verificar el avance de las actividades de siembra, mantenimiento, instalación de 17,5 km lineales aislamiento protector.	Mes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Coordinación con la supervisión para la programación de reuniones, comites, elaboración de actas de reunión y presentación de informes mensuales.	Mes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Uso de vehiculo para llevar a cabo las visitas tecnicas de campo para realizar seguimiento a las actividades realizadas por obra y asi mismo poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
Representante Legal
Consorcio Interventoria Rehabilitacion Ambiental 2024

CAMILO AUGUSTO RAMIREZ ROJAS
Supervisor-Profesional universitario CORMACARENA

Anexo 2.
ACTAS DE COMITÉS

Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 04 de 2024

FECHA DE REUNIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2024		
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
HORA DE INICIO:	11:00 AM	**HORA FINAL:**	12:00 M
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS		
CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO		
DEPENDENCIA:	CORMACARENA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Llevar a cabo el comité técnico de seguimiento No. 04 al Contrato de Interventoría **No. PS-GCT.2.7.24 – 379** y cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META"*** y al Contrato de Obra **No. PS-GCT.2.7.24 – 585**, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".***

ORDEN DEL DÍA:

- Intervención de la supervisión para exponer la importancia de la condición óptima de los terrenos a intervenir.
- Intervención por parte del propietario del predio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 11:00 a.m., se da inicio al comité de obra e interventoría correspondiente a los contratos No. PS-GCT-2.7.24-585 y PS-GCT-2.7.24-379.

El comité comienza con la presentación de los asistentes, seguida de una intervención por parte de la supervisión, quien subraya la importancia de seleccionar terrenos con condiciones óptimas para garantizar el éxito del proyecto. Se enfatiza que los terrenos deben contar con un buen drenaje y una topografía que no favorezca la acumulación de agua en la zona

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

radicular, ya que la plantación en terrenos inundables tiende a fallar debido a la limitación de oxígeno en las raíces, lo que puede provocar la muerte de los individuos. Asimismo, se menciona que la siembra de la Palma de Moriche requiere suelos con buena capacidad de retención de agua, pero sin generar condiciones prolongadas de anegamiento, para evitar el colapso del sistema radicular.

La interventoría toma la palabra, ratificando que la presencia de inundaciones prolongadas en los terrenos podría afectar negativamente el éxito del proyecto.

Posteriormente, el señor Eduardo, propietario del Predio San Cristóbal, ubicado en la vereda Las Delicias del municipio de Cabuyaro, expresa su plena disposición para colaborar con la ejecución del proyecto en su finca. Señala que cuenta con áreas secas adecuadas para la siembra, las cuales podrían ser destinadas al proyecto, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los ecosistemas mediante el fortalecimiento de las coberturas vegetales.

El propietario estima que dispone de cinco (5) hectáreas con condiciones favorables para la siembra, aunque aclara que esta extensión podría variar. Por esta razón, se acuerda realizar una visita técnica al predio, en compañía de la supervisión, la interventoría y el equipo de obra, con el fin de determinar las áreas específicas que serán intervenidas.

La visita técnica se programa para el martes 20 de agosto.

Habiéndose revisado todos los puntos de la agenda, se da por concluido el comité.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Visita al predio San Cristóbal.	Definir la cantidad de hectáreas del predio San Cristóbal en el proyecto.	Obra, interventoría y supervisión.	20/08/2024 7:00 AM
2				
3				

Cormacarena	Código: F-GC-10
	Versión: 11
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 20/Oct/2022

REUNIÓN O EVENTO:	Comite No. 4		
LUGAR:	Predio San Cristobal - lote A de la vereda Delicias en el municipio de Cabuyaro.		
RESPONSABLE:	Supervisión		
FECHA:	14 Agosto 2024	HORA INICIO:	HORA FINAL:

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CICLO DE VIDA				GRUPO ÉTNICO							IDENTIDAD DE GÉNERO							GRUPOS EN CONDICIÓN ESPECIAL								ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Pueblos indígenas	Gitano(as) Rrom	Raizal	Palenquero(a)	Negro(a)	Afrodescendiente	Ninguno	L	G	B	T	I	OTRO	Persona con discapacidad	Habitante de calle	Migrante y refugiado	Víctima del conflicto armado	Comunidades campesinas y rurales	Personas en proceso de reincorporación	Ninguno				
1	Guillermo Rojas	X				X																							Interventoria	ingcivilrojas@gmail.com	3102754092	
2	Myriam Martínez	X				X																							Finca Agrop San Cristobal	edumyriz@gmail.com	3012265330	
3	Eduardo Gonzalez	X				X																							SN. CRUZ	eduardoyriz@gmail.com	3012265330	
4	Karen Valera Toro Pedraza		X		X																								Cormacarena	Karentoro@gmail.com	3214941711	
5	Carlos Cortés	X																											Colmedarco	correodelmvtos5327@gmail.com	3145001305	
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																

Identidad de género: (L. lesbiana, G. gay, B. bisexual, T. transgénero, I. intersexual)

ACTA No. 05 de 2024

FECHA DE REUNIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
LUGAR DE REUNIÓN:	OFICINA DEL CONTRATISTA DE OBRA		
HORA DE INICIO:	10:00 AM	**HORA FINAL:**	11:30 AM
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS		
CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO		
DEPENDENCIA:	CORMACARENA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Llevar a cabo el comité técnico de seguimiento No. 04 al Contrato de Interventoría **No. PS-GCT.2.7.24 – 379** y cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META"*** y al Contrato de Obra **No. PS-GCT.2.7.24 – 585**, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".***

ORDEN DEL DÍA:

- Observaciones del informe de avance mensual No.2 de obra.
- Observaciones del cobro parcial No.1 de obra.
- Traslado de área (8 hectáreas) de Cabuyaro para Puerto Lleras.
- Estado del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 a.m., se da inicio al comité de obra e interventoría correspondiente a los contratos No. PS-GCT-2.7.24-585 y PS-GCT-2.7.24-379.

Inicia la interventoría presentando las observaciones puntuales con respecto al informe de avance mensual No.2 del contratista de obra y se hace devolución de las 2 carpetas para la respectiva subsanación. Continua con las observaciones referentes a la parcial No.1 del contratista de obra, en las que se hace énfasis para que la información se plasme en los

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

formatos adecuados que se encuentran publicados en la página de Cormacarena (acta parcial), se realice la entrega total de soportes que respaldan el aislamiento y siembra que están cobrando.

1) **Ajuste áreas**

Municipio	Predio	Área inicial	Área definitiva	Justificación
Cabuyaro	San Cristóbal	15	7	No disponibilidad de las 15 hectáreas en el predio de Cabuyaro porque predominan áreas inundables. Después de la visita de verificación se identificó una disponibilidad de 7 hectáreas.
Puerto Lleras	El Paisaje	30	38	
Área		45	45	Se ajusta de tal manera que la totalidad de las áreas intervenidas en los cinco (5) municipios siga siendo 152 hectáreas, según lo definido en el contrato.

Inicialmente se trata con la supervisión los ajustes al área a intervenir en el predio San Cristóbal ubicado en el municipio de Cabuyaro. Este ajuste se fundamenta en la disponibilidad de áreas que tiene actualmente el propietario, puesto que, no cuenta con las 15 hectáreas sino con 7 hectáreas, debido a que gran parte del predio tiene áreas inundables que dificultarían la siembra de la totalidad de las hectáreas. Es por esto, que se realizó una visita de inspección el día 14 de agosto de 2024 (interventoría, obra y supervisión) y se confirmó que el predio tenía estas características. Por consiguiente, la interventoría y la supervisión aprueban la viabilidad del ajuste propuesto, que consiste en intervenir las 8 hectáreas faltantes en el predio del municipio de Puerto Lleras teniendo en cuenta de la novedad presentada en el predio del municipio de Cabuyaro. De esta manera, la supervisión y la interventoría programan visita de reconocimiento (obra-interventoría y supervisión) a las ocho (8) hectáreas adicionales que se intervendrán en el predio del municipio de Puerto Lleras. Se aclara que las especies vegetales a sembrar, y demás especificaciones técnicas se deben mantener según lo que indique el contrato y los anexos técnicos del proceso.

2) **Propuesta de adición-prórroga y justificación**

La Entidad informa que esta propuesta esta basada en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Cuatrienal, y como medida preventiva para la protección y

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

cuidado de las áreas intervenidas con la llegada de la temporada seca .

La supervisión informa que esta propuesta de adición y prórroga dos (2) meses sería para los dos contratos (obra e interventoria), y en esta se plantean dos actividades:

- Segundo mantenimiento para las áreas intervenidas inicialmente.

Esta actividad se realizaría en las 152 hectáreas que contempla el proyecto de un principio.

- Barrera cortafuegos (16,649 km aprox.)

Se ejecutaría en todos los municipios beneficiarios a excepción del municipio de Cabuyaro debido a las condiciones del suelo (humedad) en la zona en donde se tiene proyectado instalar el aislamiento protector.

- Personal y transporte

Se tendrá en cuenta un personal mínimo para la ejecución de las actividades que se van a adicionar.

Nota: Los precios y especificaciones técnicas serán las mismas que las definidas en los documentos precontractuales y contractuales del proceso.

3) Avance

BENEFICIARIOS CONSORCIO REHABILITACIÓN 2024				AVANCE (14 junio al 31 de agosto)	
Nº	USUARIO	MUNICIPIO	PREDIO	ÁREA (HA)	CERCA (KM)
1	Abraham Castillo	Mapiripan	Bella Vista	0	1,50
2	Hermes Eliecer Álvarez Castillo		La Esmeralda	0	0,00
3	Jesús Alberto Cubillos		Hacienda La Soledad	0	1,40
4	Tiberio Mendoza		La Isabela	0	2,20
5	Henry Clavijo		Agropecuaria Porvenir	10	1,41
6	Haidi Viviana González Benavides	San Martín	La Milagrosa	18,4	1,70
7	Mabel Elena Narváez Bergonzoli	Puerto López	Santa Inés	12,7	1,28
8	Jhon Jairo Cordoba	Puerto Lleras	El Paisaje	3,896	3,80
9	Myriam Martínez López	Cabuyaro	San Cristóbal Lote A	0	0,00
TOTAL				44,996	13,29

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

4) Otros

- El contratista interviene, proponiendo a la supervisión y la interventoría la selección de los municipios en los que se van a implementar las tres (3) parcelas de monitoreo, que para este caso sería en los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Lleras.
- La interventoría solicita al contratista finalizar y entregar lo más pronto posible, los polígonos (hectáreas para siembra) y líneas (longitud aislamiento) en formato kml o kmx, con el fin de realizar un adecuado seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra.
- Supervisión solicita al contratista ajustar los formatos de entrega de insumos y materiales de acuerdo con las correcciones realizadas en el presente comité.

Habiéndose revisado todos los puntos de la agenda, se da por concluido el comité.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Visita de Reconocimiento de las hectáreas que ahora se van a intervenir en Puerto Lleras.	Revisión inicial de áreas que se van a intervenir.	Obra, interventoría y supervisión.	12/09/2024
2	Solicitud escrita de propuesta de adición y prórroga.	Trazabilidad del proceso	Supervisión	07/09/2024
3	Envío de caracterizaciones de los predios beneficiarios	Trazabilidad del proceso	Supervisión	07/09/2024

Cormacarena	Código: F-GC-10
	Versión: 11
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 20/Oct/2022

REUNIÓN O EVENTO:	Comite No. 5		
LUGAR:	Instalaciones de obra.		
RESPONSABLE:	Supervisión		
FECHA:	05 Septiembre de 2024	HORA INICIO: 10:00am	HORA FINAL: 11:30 am.

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CICLO DE VIDA				GRUPO ETNICO							IDENTIDAD DE GENERO							GRUPOS EN CONDICIÓN ESPECIAL								ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino	Menores de 18 años	19 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Pueblos indígenas	Gitano(as) Rrom	Raizal	Palenquero(a)	Negro(a)	Afrodescendiente	Ninguno	L	G	B	T	I	OTRO	Persona con discapacidad	Habitante de calle	Migrante y refugiado	Víctima del conflicto armado	Comunidades campesinas y rurales	Personas en proceso de reincorporación	Ninguna				
1	Karen Valeria Toro R.		X		X																								Cormacarena	karentoor@gmail.com	3218417721	
2	Fredy Zarta	X				X																							Asodelcol	fredylargo(lus)@gmail.com	3115491555 26	
3	Cinto Ramirez	X																											Cormacarena	ramb.ramirez@cormacarena.gov.co	3005614268	
4	Guillermo Rojas																												Interventoria	pm.rojasvillalba@gmail.com	3102754098	
5	Maria Eugenia Baquero		X			X																							Interventoria	mariabaquero0522@gmail.com	3017205036	
6	Carlos Caldas	X				X																							Cormacarena	carlos.caldas@cormacarena.gov.co	3143500777	
7	Karina Ospita				X																								Asodelcol	karina_ospita@hotmail.com	3214609973	
8	Valentina Arango				X																								Asodelcol	circuito3067@gmail.com	5163357762	
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

Identidad de género: (L: lesbiana, G: gay, B: bisexual, T: transgénero, I: intersexual)

Anexo 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-11, 09:16:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1066500472

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 11/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACION AMBIENTAL 2024		
Documento	NI901819845	**Dirección**	CL 41B #30 - 11 OFICINA 205
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102754092
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	ROJAS BAQUERO GUILLERMO ANTONIO	**Identificación**	CC 1121837552
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORI	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1136882734	MARIA EUGENIA BAQUERO CASTRO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.327.200	$ 212.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.327.200	$ 159.900	0.068	$ 1.327.200	$ 92.400	(CCF34) COMFEM	$ 1.327.200	$ 53.100	$ 26.600	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 592.300
CC 3277324	FERNEY ALEXANDER MONTAÑA RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 182.000	0.068	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF34) COMFEM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 578.000
CC 1121837552	SOFIA CATHERINE ACOSTA BONILLA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 182.000	0.068	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF34) COMFEM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 578.000
CC 40664531	ADRIANA LUCIA DIAZ BOBADILLA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.516.800	$ 242.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.516.800	$ 189.600	0.068	$ 1.516.800	$ 105.600	(CCF34) COMFEM	$ 1.516.800	$ 60.700	$ 30.400	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 674.400
CC 86041113	EUDARDO ALVAREZ (HOPE)	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 182.000	0.068	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF34) COMFEM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 578.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.744.000	$ 6.744.000	$ 6.744.000	$ 6.744.000	$ 1.079.100	$ 843.000	$ 469.500	$ 269.800	$ 135.000	$ 202.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.998.900	$ 0	$ 2.998.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Facil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Anexo 4.
COPIA DE BITÁCORAS

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	14	08	2024.
USUARIO	Tiberio Mendoza	***ACTIVIDAD***		Aislamiento.
VEREDA	La Realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Al momento de la visita se encontraba personal realizando actividades de preparación de terreno para continuar con las siembra y aislamiento.
Se realizó el recorrido por el área en donde se encuentra instalado el aislamiento en compañía del tecnico de obra y se observó la instalación de 600 postes y 45 pie amigos.

Se verificó la distancia entre cada poste, la instalación de pie amigos, altura libre de cada poste, tensionamiento del alambre.

El personal de mano de obra no calificada contaba con casco, gafas, guantes y botas, en el área también cuentan con botiquin para primeros auxilios.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Tiberio Mendoza	NOMBRE:	Ferney Alexander	Montaña
CEDULA:	86.005.764.	CARGO:	Técnico interventor	
CELULAR:	3228100409	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Paisaje	14	08	2023
USUARIO	Jhon Jairo Cordona	**ACTIVIDAD**		Establecimiento Arboles.
VEREDA	Chafuray.			
MUNICIPIO	Puerto Lleras.	**COORDENADAS**		3° 48.69" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53,21 O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En visita realizada se Observa que aun no se han llevado los materiales para el establecimiento, el propietario manifiesta que la siembra se va realizar a 3,70 metros de distancia entre arboles y una buena parte de la siembra se realizara en cercas vivas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon jairo Cordoba.	NOMBRE:	Eucardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492.	CARGO:	Técnico Campo.	
CELULAR:	311.558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Escaneado con CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Paisaje.	14	08	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba R.	**ACTIVIDAD**		Cerca de aislamiento.
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		3°43,69. N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53.22" O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo Visita de acompañamiento al hincado y alambrado de la cerca de protección para el establecimiento de los arboles. La posteria utilizada es madera rolliza imunizada, la distancia entre postes es 3 metros, cada 30 metros encontramos un pie de amigo, con tres hilos de alambre de puas calibre 12.5" 2 Con distancia de 40 cm entre cada hilo de alambre.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492.	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	311-558 56 43	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Escaneado con CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN. PUERTO LLERAS. PUERTO LÓPEZ. SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Ines	15	08	2024
USUARIO	Mabel Narvaez	ACTIVIDAD		Verificación de avance de actividades.
VEREDA	Alto Navajas			
MUNICIPIO	Puerto Lopez.	COORDENADAS		N 3°55'12,5"
DEPARTAMENTO	Meta			W 72°51'22,6"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza mediante recorrido con el administrador del predio el avance de las actividades que se han realizado a fecha de hoy en lo referente al aislamiento de los lotes y las acciones de siembra encontrando las siguientes particularidades

- Se han hincado 200 postes entregados por el contratista cada 3 metros y cada 30 metros así como en cada esquina su respectivo pie de amigo
- Se han instalado tres cuerdas de alambre de pua con las debidas medidas de protección y con el uso por parte de la cuadrilla de la dotación entregada.
- Se realiza la siembra con un avance de 8 hectareas establecido primordialmente la especie machaco, pero tambien Maranon, algarrobo, yopo cada 3,60 metros por 3,50 en promedio.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Dairo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	cc 70579832	CARGO:	Técnico campo.	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Dairo Garcia			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Paisaje.	18	08	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba.	**ACTIVIDAD**		Socialización.
VEREDA	Chafarray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras.	**COORDENADAS**		3° 7' 43,19 N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53,22 O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo acompañamiento a la socialización realizada por ASODEICOL, con la paticipación de 15 personas de la comunidad. Se explico el contexto del proyecto, la importancia, los municipios donde se va desarrollar, las cantidades de obra y el presupuesto del contrato.

Ademas se realizo capacitacion, en la importancia de los recursos naturales.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	3145585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Escaneado con CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	18	08	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez	**ACTIVIDAD**		Verificacion de actividades de siembra
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	**COORDENADAS**		3°37'39.014
DEPARTAMENTO	Meta			08"N-72°4'50.64

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- lote mecanizado en el cual se observa actualmente avance y trabajo de 4 operarios todos hombres que se encuentran en proceso de ahoyado y aplicación de cal dolomita asi como distribución de plantas y siembra.

Se realizan recomendaciones en torno a:

- Mejorar tamaños de los hoyos que cumplan con la dimensión 30*30*30cms.
- Aplicar en cada planta hidroretenedor en la dosis y forma prevista en el contrato.
- Mejorar transporte menor de plantas y diversificación de siembra segun las especies y cantidades a sembrar.
- Utilizar continuamente la dotación suministrada por el Contratista
- Se tiene un deficit de siembra de 5000 plantas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Edwin Daniel Rodriguez	NOMBRE:	Edwin Felipe U.	Guillermo Rojas B.
CEDULA:	7028630	CARGO:		R/L interventoria
CELULAR:	3229048523	FIRMA:		
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	19	08	2024
USUARIO	Myriam Martinez	**ACTIVIDAD**		Verificación entrega de materiales
VEREDA	las delicias			para el
MUNICIPIO	Cabuyaro	**COORDENADAS**		aislamiento.
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El técnico de la interventoría realizó visita con el fin de verificar la entrega de materiales y herramientas para el aislamiento, durante esta visita se evidenció la entrega parcial de postes de madera en buen estado, con diámetros entre 8 a 12 centimetros, y con longitud de 2,10 metros. Adicionalmente se evidenció la entrega de alambre de pas de calibre 12,5 y grapas aceradas y paladragas como herramienta menor.

Finalmente, se observó la entrega de los implementos de seguridad (casco, guantes, gafas y botas).

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Myriam Martinez Lopez	NOMBRE:	Maria Eugenia B.	Guillermo Rojas.
CEDULA:	51.813.022 Bta.	CARGO:	Prof. interventoria	R/L interventoria
CELULAR:	3012265385.	FIRMA:		
CARGO:	Propietaria			
FIRMA:	Myriam Martinez Lopez			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Myriam (San Cristobal) lote A	20	08	2024
USUARIO	Myriam Martinez	***ACTIVIDAD***		
VEREDA	Las delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita al predio San Cristobal en Acompañamiento de supervicion, y el equipo de obra para la verificacion de los terrenos teniendo en cuenta que en conversaciones via Whatsapp llamada con el esposo de la Beneficiaria, porque debido a Situaciones de orden Climatico no se ha iniciado el Componente de aislamiento y de Siembra

Durante el recorrido la interventoria le sugiere al beneficiario unas zonas que se podrian aprovechar para la siembra disminuyendo los % Riesgos de mortalidad.
Se recibio aproximadamente 8ha. donde el suelo es mas seco y permite realizar el componente de Siembra

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Myriam Martinez	NOMBRE:	Guillermo Rojas	Maria Eugenia B.
CEDULA:	51817022 Bté	CARGO:	Rep Legal	Prof. interventoria
CELULAR:		FIRMA:		
CARGO:	Beneficiaria			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Inés	21	08	2024
USUARIO	Mabel Narvaez.	**ACTIVIDAD**		Seguimiento al contratista
VEREDA	Alto Navajes			
MUNICIPIO	Pto Lopez.	**COORDENADAS**		N 3° 55' 12.13" W 72° 51' 22.5"
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Se visitan los lotes establecidos en el marco de ejecución del contrato de obra encontrando en campo 3 trabajadores y un avance real de:

* Se han intervenido 11 hectareas con actividades de ahoyado, aplicación de cal dolomita, abono organico y siembra acorde a las condiciones del terreno y del contrato

- En estas 11 hectareas se evidencia una adecuada siembra de las plantas que son previamente hidratadas a capacidad de campo, y en donde predomina la especie machaco.

- A iniciado una epoca de verano de la cual se le realizan sugerencias al contratista y a los encargados y propietario del predio

- Mediante conteo se evidencian 350 postes hincados en una longitud de 1053mts.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Dairo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	70579832	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Dairo Garcia			

3 Periodo

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META "

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La esmeralda	22	08	2024
USUARIO	Hermes E. Alvarez C	ACTIVIDAD		Seguimiento.
VEREDA	Caño Guarito			
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS		2° 54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°7'2,93"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para verificar el avance de las actividades y entrega de insumos. que serán implementados en la construccion de aislamiento.
Se evidencian 320 postes en madera. como tambien. se encuentran realizando la banca corta hoyo con el fin de dar inicio a la construccion del aislamiento.

la banca tiene una medida de 3mts

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney Alexander Montaña
CEDULA:	17360057	CARGO:	Técnico interventor
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Escriba el texto aquí

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	23	08	2024
USUARIO	Alberto Cubillos	***ACTIVIDAD***		Aislamiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó el recorrido por el área en compañía del técnico de campo, durante este recorrido se hizó la marcación de postes y levantamiento del track con el GPS.

A la fecha llevan 320 postes instalados y 20 pie amigos. lo que equivale a 960 metros de aislamiento, ya tienen templado con el alambre de púas.

Se le observó que hace falta la instalación de 10 pie amigos, teniendo en cuenta que se deben instalar cada 30m y cl 10 postes.

Los postes instalados estan cada 3m a 3,10mt.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Oscar M. Abrón	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	1006777144	CARGO:	Tec. interventor	
CELULAR:	3507755576	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Oscar Abrón			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Nuevo la bondad	26	08	24
USUARIO	Arturo Gomez	**ACTIVIDAD**		Cargue de material vegetal
VEREDA				
MUNICIPIO	Puerto lopez	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo el acompañamiento al equipo de obra en el embarque de material vegetal con destino a puerto lleras al predio el paisaje.

Se verifico que el material vegetal cumpliera con las especificaciones del contrato como Altura entre 25-40cm de la base del tallo a la punta de el mismo, que no presentaran deficiencia nutricional y que este libre de plaga.

4.600 plantas, 92 Cajas de la especie machaco, 80 bultos de abono orgánico, 60 bultos de cal dolomita.

Predio Isaura S.A.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Arturo Gomez M.	NOMBRE:	María Baquero	
CEDULA:	3.273.463	CARGO:	Prof. Interventoría	
CELULAR:	302.494.1508	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje.	27	08	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba.	**ACTIVIDAD**		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chafurray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras.	**COORDENADAS**		3°7 48.69 N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13 53.21 O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Una vez realizada la visita se observa que se han entregado en la Finca 92 cajas de la especie machaco para un total de 4600 árboles; en buenas condiciones, con un tamaño aproximadamente de 30 cm con buen desarrollo y buenas condiciones fitosanitarias.

Se realiza la entrega de 80 bultos de abono Organico y 60 bultos de cal dolomita ambos productos empacados en bolsas de 50 Kilos.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba.	NOMBRE:	Eucledo Alvarez.	
CEDULA:	17.421.492.	CARGO:	Técnico Campo.	
CELULAR:	311 558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Powered by CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	la milagrosa	28	08	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez	***ACTIVIDAD***		Avance de siembra y aislamiento.
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Aislamiento: Se realizó el recorrido por el área en donde se encuentran instalados los postes, se hizó el conteo de 427 postes y 45 pie amigos, lo que equivale a 1,28 km de aislamiento. Se verificó que el aislamiento cumpliera con las medidas que indica el contrato.

Siembra: Se realizó el recorrido por el área y se hizo el levantamiendo con GPS, el cual arrojo el dato de siembra de 18 hectáreas, se hizó la medición entre plantas, la cual es de 3m a 3,5m. El sistema de nucleación, las especies son machaco, yopo, caño fistol, flor amarillo, aceite y samán.

Recomendaciones: Mejorar el manejo del material vegetal que falta por sembrar y de los residuos (plastico, guacales y cajas).

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Maria Valentina Arenas	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1121967499	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3165332702	FIRMA:		
CARGO:	Prof Residente			
FIRMA:	Valentina Arenas C			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Belbuista	28 | 08		2024
USUARIO	Abraham Castillo	ACTIVIDAD		Entrega de material vegetal.
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS		3°24'16.61"
DEPARTAMENTO	Meta			72°53'45.29"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para hacer la respectiva verificación y entrega de material vegetal, que cumpla con las medidas correctas. Gualoles por ss plantulas de los siguientes especies.

caño fistola. 550 plantulas
igua. 385 plantulas
machaco 6200 plantulas
para un total de. 7.135 plantulas

- Donde si encontro que el machaco con unas medidas de 25 a 30 cm.
- El igua y caño fistola. de 20 a 25 cm.

Arboles en buenas condiciones bien follaje bien transportados y entregados en excelentes condiciones.

Hacer control de hormiga con insecticida

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Haiman Castillo	NOMBRE:	Ferney Alexander Montaña
CEDULA:	2349593.	CARGO:	Tecnico interventoria
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Ingeniero.		
FIRMA:	Haiman Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	29	08	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***		Avance activ. de siembra
VEREDA	Chaparral			
MUNICIPIO	Puerto lleras	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La interventoria realizó la visita al predio con el fin de verificar el avance de las actividades correspondientes con la siembra adelantadas por el contratista de obra.
Durante la visita se realizó el recorrido en compañía del usuario y personal de obra, se observó personal en campo desarrollando actividades de trazado, ahoyado, plateo, resiembra y aplicación de enmiendas agricolas.
Por medio de la toma de puntos con el GPS, se logró calcular que se lleva un avance aproximado de siembra de 3,8 a 4 hectáreas de las especies: flor amarillo, caño fistol, aceite, igua, machaco, entre otros. la distancia entre cada planta es de 3m.

El material vegetal que se encuentra resembrado presenta buenas caracteristicas fisicas y fitosanitarias. Finalmente se le realizó la recomendación de aplicar las cantidades correspondientes que son:
500 gr de abono por cada planta, 150 gramos de cal dolomita y 5 gramos de hidroretenedor por planta.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17421492	CARGO:	Técnico campo	
CELULAR:	3115585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	29	08	2024
USUARIO	Hermes Alvarez C.	***ACTIVIDAD***		Alance Arslamiento
VEREDA	Caño Evaristo			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se llevó a cabo la visita al predio con el fin de verificar el inicio de actividades de aislamiento. A la fecha solo han entregado 320 postes de madera.
En este predio se encuentran adelantando actividades de preparación de terreno por mecanización, se han realizado dos pasones.
Estos pasones los estan haciendo por donde van a hincar los postes.
Se observó el inicio de actividades del ahoyado (60cm x 20cm) para instalar los postes.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	José Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	17.360.057	CARGO:	Téc. interventor	
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña	R.
CARGO:	Administrador			
FIRMA:	José Jaime Moreno			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	la isabela	29	08	2024
USUARIO	Tiberio Mendoza	***ACTIVIDAD***		Aislamiento.
VEREDA	la realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El técnico de la interventoria realizó una nueva visita, en esta se observó que:

- El personal se encuentra realizando actividades de aislamiento y utilizando casco, guantes gafas y botas.

- Se hizó el recorrido en compañia del técnico y se evidenció la instalación de 733 postes y 75 pie amigos, lo que equivale a 12,2 kilometros. Durante este recorrido se verificó el cumplimientos de las medidas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Tiberio Mendoza	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	86.005.764	CARGO:	Técnico interventi	
CELULAR:	3228100409	FIRMA:	Ferney Montaña	
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	30	08	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***		Avance de Aislamiento
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto lleras	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita al predio con el fin de realizar el conteo de los postes de madera que llevan instalados, pie de amigos y así mismo verificar los kilometros instalados a la fecha.
Durante la visita se hizó el recorrido por el area, se verificó que los postes se encuentren instalados cada 3m, los pie de amigos cada 30 metros, distancia entre cada hilo de alambre 40cm y altura libre del poste oscila entre 1,50 y 1,55m.
Adicionalmente se realizó la medición del ahoyado para el hincado de cada poste, los cuales se encuentran de (60x20 cm) y uno que otro hoyo de (62x20)cm.
Se verificó que el personal de mano de obra no calificada se encontrará desarrollando las actividades bajo el uso del casco, guantes y gafas.

A la fecha de la presente visita se evidenció el siguiente avance:
- Postes instalados 4426.
- Pie de amigos instalados 445. > Equivale a 13,29 kilometros de aislamiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everaldo Alvarez	
CEDULA:	17421492	CARGO:	Tecnico de campo.	
CELULAR:	3115585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	30	08	2024
USUARIO	Alberto Cubillos	***ACTIVIDAD***		Aislamiento.
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó una nueva visita en la que se continuo con la marcación de los postes instalados, a corte de la fecha llevan 467 postes y 47 pie amigos También se observo la instalación de las 3 cuerdas de alambre, cada una a 40cm En algunos postes la distancia varia entre 3,10m y 3,15mts. según los trabajadores es porque el terreno es rocoso. En cuanto a la siembra, iniciaron actividades de ahoyado (30X30X30) pero no han iniciado la siembra porque ya lleva varios dias (8) sin llover. y el terreno esta muy seco.

Indicaron que van a continuar con actividades de aislamiento, mientras llueve e arrancan con la siembra.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Oscar M. Abrón	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	1006777144	CARGO:	Técnico interven.	
CELULAR:	3507755576.	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Oscar Abrón			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bellavista	30 | 08	2024.
USUARIO	Abraham Castillo	ACTIVIDAD	Entrega de material V
VEREDA	Guacamayas		
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS	3°2'7,1661"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°53'45,29"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio para realizar la verificación y entrega de material vegetal, que cumplan con las medidas y buen estado.

Saman 840
Caño fistol 250
Bucaro 250
Machaco 7500
yopo 300
Aceite 300
para un total de 9440 plantulas.
encontrandose con medidas de 20 a 35 cm. en buenas condiciones.
se recomienda dejar los guaduales con medidas de 20 cm para resiembra.

Hacer control de hormiga con insecticida.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORIA	
NOMBRE:	Hailen Castillo	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	23495993	CARGO:	Técnico interventor.
CELULAR:	3124029002	FIRMA:	Ferney Montana R.
CARGO:	Hermano		
FIRMA:	Hailen Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	31	08	2024.
USUARIO	Abraham Castillo	***ACTIVIDAD***		Avance aislamiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se llevó a cabo la visita al predio para validar los avances realizados por el personal de mano de obra del contratista.
Se hizo el recorrido permetral por donde estaban hincados los postes de madera y pie amigos. Se tomaron los medidos:

- Distancia entre el poste: 3m a 3,10 mts
- Distancia pie amigos: 30 mts a 30,5 mts.

los pie amigos estan cada 10 postes.

los cuerdos de alambre se encuentran tensionados y asegurados con grapas.

Se hizo el conteo y marcación de 500 postes de madera y 37 pie amigos, lo que equivale 1,5 Kilometros de aislamiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Abraham Castillo	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	7301695	CARGO:	Técnico interventl.	
CELULAR:	3176963397	FIRMA:	Ferney Montaña R.	
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida. somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Ines	01 09	2024
USUARIO	Mabel Vanegas	**ACTIVIDAD**	Evaluacion y Seguimiento.
VEREDA	Alto Navajas		
MUNICIPIO	Puerto Lopez	**COORDENADAS**	N 3°55'17.19"
DEPARTAMENTO	Meta		W 72°51'22,7"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Con la aplicación Geotrack se toma la Medicion y en el recorrido se hace el conteo 1 a 1 de cada poste encontrado que en una longitud de 1107 (Mil doscientos ochenta y siete Metros) se tiene un total de 427 postes hincados y 50 pie de amigos.

- El aislamiento cumple en distancia, longitud, tipo de insumos y Fimeza conforme a lo estipulado en el Contrato de obra

- El productor se encuentra Conforme y Muy Satisfecho con el proyecto.

- Existe un total de 12,7 hectareas actualmente Sembradas bajo los parametros y especificaciones tecnicas del contrato.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Dairo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	70579832	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Dairo Garcia			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Mayo- ofrecmeto	06	09	2024
USUARIO	Rehabilitacion - Asodelcal	**ACTIVIDAD**		acompañamiento al cargue de l mato- ofrecimiento
VEREDA				
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo el acompañamiento al equipo de obra, para el embarque de material vegetal de Mayo ofrecimiento que presento el Contratista. Nuevo el Soma

Palo cruz - 440
maiz tostado - 525
Arrayan blanco 57
Guayaba y - 300
Bitsa - 200
Copo Azu - 50

El material vegetal Cumplio con los especificaciones tecnicas establecido en el contrato. (Altura entre 50 - 100 cm, libre de plaga Sin presencia de defisiencia nutricional

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Nonlio Vargas Yiaro	NOMBRE:	Guillermo Rojas	
CEDULA:	86039923	CARGO:	P/C interventoria	
CELULAR:	3232036696	FIRMA:		
CARGO:	Prop Predio			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	09	09	2024
USUARIO	Hermes Alvarez C.	***ACTIVIDAD***		Aislamiento
VEREDA	Caño Evaristo			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita para validar avance en las actividades de aislamiento.
La preparación del terreno ya se encuentra totalmente mecanizado 100%.
Ya realizaron el ahoyado y regado de los postes, hace falta realizar la compactación, instalación de alambre de puas

La visita fue atendida por el encargado y durante esta no se evidenció personal de mano de obra. no calificado y manifiestan que se encuentran a la espera de que el contratista realice la entrega de más postes, alambre de púas y grapas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	José Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	17.360.057	CARGO:	Tecnico interv.	
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.	
CARGO:	Administrador			
FIRMA:	José Jaime Moreno			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	11	09	2024
USUARIO	Myrram Martinez.	***ACTIVIDAD***		Avances.
VEREDA	las delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante la visita se evidenció la entrega de material vegetal, cal dolomita, abono orgánico, hidroretenedor y de insecticida. En su mayoría las especies eran de mariche, esto fue a petición del usuario.

Se evidenció el inicio de actividades de preparación de terreno, trazado y ahoyado para el aislamiento.

Se observó que el material vegetal presenta stres hídrico a causa del proceso de transporte, el lugar de acopie es cerca de la vivienda.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Miriam Martinez Lopez	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	51.817.022 Btá	CARGO:	Tecnico de campo	
CELULAR:	3012265385	FIRMA:		
CARGO:	Propietaria.			
FIRMA:	Miriam Martinez Lopez			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	la milagrosa	12	09	2024
USUARIO	Heidy viviana Gonzalez	***ACTIVIDAD***		Avance en actividades
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó visita al predio para hacer el seguimiento a las actividades realizadas por el personal operador en campo.
Al momento de la visita, el predio no contaba con personal que atendiera la visita, puesto que el beneficiario manifesto que el encargado renunció y que en estos dias llega uno nuevo, sin embargo se hizo el recorrido por el área de siembra, en donde se observan aproximadamente 500 hoyos de 30x30x30 para realizar la siembra.
El beneficiario mediante llamada telefonica informa que vuelven a reanudar actividades hasta que llege el encargado nuevo y pueda estar pendiente de todo.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Maria Valentina Arenas	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1.121967499	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3165332702	FIRMA:		
CARGO:	Prof. Residente obra			
FIRMA:	Valentina Arenas C			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	12	09	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Reconocimiento Area Nueva 8Ha
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La interventoría realizó la visita al predio con el fin de hacer el reconocimiento de las nuevas 8 hectáreas que se van a intervenir durante la ejecución del contrato.
Durante la visita se realizó el recorrido por el área, se levanto el registro fotografico, track, toma de puntos de georeferencia, también se evidencio que el terreno es plano, cuenta con pastisales nativos de la región.
En este predio inicialmente se iban a intervenir 30 hectáreas, pero por cambios y solicitudes, se van a intervenir 38 hectáreas. El usuario indica que la preparación del terreno la van a realizar por medio del proceso de mecanización con tractor.

Las vías de ingreso al predio se encuentran en buenas condiciones, el usuario indica que se le avise con un dia de antiparión cuando se vaya a realizar la visita, con el fin de tener la disposición de hacer el acompañamiento al sitio en donde se esten haciendo actividades.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Guillermo Rojas	Maria Baquero
CEDULA:	17421492	CARGO:	R/L Interventoria	Prof. Interventoria
CELULAR:	3115585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Porvenir.	12	09	2024
USUARIO	Henry Clavijo	***ACTIVIDAD***		Seguimiento
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se llevó a cabo la visita al predio con el fin de hacer el seguimiento a la siembra de las 10 hectareas.

Durante este recorrido se selecciono un área considerable con el fin de hacer la revisión minuciosa e inspección ocular al material vegetativo.

Algunas plantas presentan indices de deshidratación y otras ataque por plaga (gusano) que habita de dia en la tierra y de noche ataca,

Se le recomendó al contratista hacer la aplicación de insecticida y programar para hacer riego a las plantas, se dijo que este riego debe hacerse en horas de la mañana.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Joan Duarte	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	1006729543	CARGO:	Tecnico intervent	
CELULAR:	3163858359	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Ines	13	09	2024
USUARIO	Mabel Narvaez	***ACTIVIDAD***		Verificación actividad de establecimiento aislamiento
VEREDA	Alto Navajas			
MUNICIPIO	Puerto Lopez	***COORDENADAS***		N 3°55'12.17"
DEPARTAMENTO	Meta			W 72°51'22.5"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- En compañía con el administrador del predio se realiza recorrido por el area de siembra evidenciando un avance en campo de 10000 plantas establecidas a corde a las condiciones del contrato predominando la especie machaco, pero tambien el establecimiento de otras especies como cambulo, algarrobo, yopo, y maranon.

Con respecto al aislamiento se realizo medicion con la aplicacion Geo Tracker encontrando una longitd de 1283 metros y la instalación de 425 postes hincados y 55 pie de amigos; con postes a 1,50 metros de altura sobe el suelo y tres cuerdas de alambre de pua calibre 12,5"

Se recomienda realizar aplicación foliar en la especie machaco para control Fitosanitario.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Dairo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	70579832	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Dairo Garcia			

Anexo 5.
CORRESPONDENCIA

CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024
CONCURSO DE MERITOS No. CMA 01-2024

Villavicencio, 11 de septiembre de 2024

OF-023-2024

Señores:
CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS
Supervisor

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-379 denominado: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Entrega de informe mensual 2 de interventoría

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor de contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de ejecución del periodo No. 1 de interventoria y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.24-379, correspondiente al periodo que va desde el 14 julio al 13 de agosto de 2024. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de avance mensual 2 de interventoría

  - Anexo 1. Cronograma de interventoría
  - Anexo 2. Actas de comité.
  - Anexo 3. Planillas de seguridad social
  - Anexo 4. Copia de bitácoras
  - Anexo 5. correspondencia
  - Anexo 6. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

13/09/24.

Atentamente,

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

PROINGCOCIVILSAS@GMAIL.COM 310 275 4092 CALLE 41B No. 30-11 LA GRAMA OF. 205

CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024
CONCURSO DE MERITOS No. CMA 01-2024

Villavicencio, 11 de septiembre de 2024

OF-022-2024

Señores:
CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS
Supervisor

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-379 denominado: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Correcciones de informe mensual 1 de interventoría

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor de contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de ejecución del periodo No. 1 de interventoría y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.24-379, correspondiente al periodo que va desde el 14 julio al 13 de agosto de 2024. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de avance mensual 1 de interventoria
  - Anexo 1. Cronograma de interventoría
  - Anexo 2. Acta de comité.
  - Anexo 3. Planillas de seguridad social
  - Anexo 4. Póliza del contrato actualizada.
  - Anexo 5. Cambio de personal interventoría.
  - Anexo 6. Copia de bitácoras
  - Anexo 7. Correspondencia.
  - Anexo 8. Coordenadas de predios beneficiarios
  - Anexo 9. CD

13/09/24

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

PROINGECIVILSAS@GMAIL.COM 310 279 4092 CALLE 41B No. 30-11 LA GRAMA OF. 205

CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024
CONCURSO DE MERITOS No. CMA 01-2024

Villavicencio, 10 septiembre de 2024

OFC-021-2024

Señor:
CAMILO AUGUSTO RAMIREZ
Supervisor

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-379, denominado: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Entrega de informe mensual 2 de obra.

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de ejecución del periodo No.2 de obra y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.24-585, correspondiente al periodo que va desde el 14 de julio al 13 de agosto de 2024. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Contrainforme de la interventoría al informe mensual 2 de obra.
- Informe de avance mensual 2 de obra (11 soportes)
- Anexo 1. Diagrama de Gantt
- Anexo 2. Planillas de seguridad social
- Anexo3. Documentación beneficiarios
- Anexo 4. Informe técnico de obra
- Anexo 5. Informe de talleres de campo
- Anexo 6. Bitácoras de campo
- Anexo 7. Actas de comité
- Anexo 8. Correspondencia
- Anexo 9. Imprevistos
- Anexo 10. Uso de vehículos
- Anexo 11. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

11/09/24

Atentamente.

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024
CONCURSO DE MERITOS No. CMA 01-2024

Villavicencio, 05 de septiembre de 2024

OF-020-2024

Señores:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA
R/L John Fredy Lara Clavijo

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-585 "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Devolución de informe de cobro parcial 1 para correcciones.

Cordial saludo,

De acuerdo con la entrega del informe de cobro parcial 1, recibida el pasado 03 de septiembre de 2024, la interventoría ha realizado la revisión correspondiente del informe. Como resultado de esta revisión, se hace devolución de tres (3) carpetas que contienen las observaciones realizadas.

Es necesario que dichas observaciones sean tenidas en cuenta para realizar las correcciones pertinentes. Por lo tanto, solicitamos que se proceda a corregir y radicar nuevamente la Parcial No.1 en los términos establecidos en el contrato.

Agradecemos su pronta respuesta y colaboración en este asunto.

Atentamente,

Melisa Guherrel
Recibido
06-09-24

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Villavicencio, 02 de septiembre de 2024

OF-019-2024

Señores:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA
R/L John Fredy Lara Clavijo

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-585 "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Solicitud de respuesta sobre el informe de obra N°2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito recordarle que, el pasado 23 de agosto de 2024, le fue devuelto el informe de obra N°2, con observaciones específicas que requerían su atención y corrección.
A la fecha, no hemos recibido una versión corregida de dicho informe ni ninguna comunicación adicional que indique el estado de las correcciones solicitadas. Debido a la importancia de este informe para el avance, le solicitamos su pronta atención para resolver las novedades mencionadas y remitirnos el informe actualizado a la mayor brevedad posible.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional.

Atentamente,

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024
CONCURSO DE MERITOS No. CMA 01-2024

Villavicencio, 23 de agosto de 2024

OF-017-2024

Señores:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA
R/L John Fredy Lara Clavijo

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-585 "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Observaciones del informe 2 de obra.

Cordial saludo,

Nos dirigimos por medio de la presente para informarles que, tras revisar el informe de avance mensual No. 2 del contrato de obra, radicado el dia 22 de agosto de 2024, se hace devolución de dicho informe con las siguientes observaciones:

1. Informe del contratista: Se requiere incluir más información detallada acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista, especificando los avances en relación con cada una de las obligaciones contractuales, indicando claramente el estado actual, los logros alcanzados y cualquier desviación respecto al plan original.
2. Caracterización de Predios: Falta la caracterización de los predios beneficiarios del proyecto.
3. Cantidades de enmiendas agricolas: Revisar cantidades de cal dolomita y abono orgánico que están indicando que se aplican en el proceso de la siembra.
4. Bitácoras de campo: Incluir las bitácoras faltantes del personal de obra ofertado.

Estas observaciones deben ser subsanadas para proceder con la nueva radicación de este informe. Por lo tanto, hacemos devolución de 2 carpetas para que puedan realizar las correcciones necesarias.

Atentamente,

Melissa Gutierrez
26-Ago-24

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Villavicencio, 22 de agosto de 2024

OF-016-2024

Señores:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA
R/L John Fredy Lara Clavijo

REF: Contrato PS-GCT.2.7.24-585 "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Asunto: Retraso en la entrega del informe de avance mensual 2.

Cordial saludo,

El motivo de la presente es informarle que, como parte del proceso de la interventoría correspondiente al proyecto PS-GCT.2.7.24-585, nos encontramos a la espera del Informe Mensual No. 2 de Obra que a la fecha del presente oficio no ha sido radicado.

Es importante tener en cuenta que los periodos de corte para la recopilación de información y elaboración de informes se han establecido para los días 13 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes correspondientes debe llevarse a cabo en los cinco días posteriores a dicho periodo de corte. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido el mencionado informe, dada la importancia de contar con esta documentación para llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del avance del proyecto, le solicitamos que nos haga llegar el Informe Mensual No. 2 de obra a la brevedad posible.

Atentamente,

GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Anexo 6.
CD
