I. DATOS GENERALES

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME.	Del 07 09 2023 Al 07 12 2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	100%
INFORME PERIÓDICO: X INFORME ÚNICO:	Nro. de Informe 1 de 1	

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR DE APOYO:	Franklin Cuesta Palma
DEPENDENCIA:	**Secretaria de infraestructura**
CARGO:	Supervisor Designado
SUPERVISIÓN DELEGADA: (Si aplica, indicar nombre y cargo de quien designó la supervisión)	Evelyn Cañadas Garrido

III. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.	FICHA TECNICA DEL CONTRATO
Objeto del Contrato:	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO – CHOCO SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

1.1.	FICHA TECNICA DEL CONTRATO				
Contrato No:	0001 DEL 9 DE MAYO DE 2023				
Contratista de la obra:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO – EDUP ; NIT: 901.653.745-9				
Representante Legal:	YEFERSON MORENO MATURANA ; CC# 1.017.173.731				
Valor del Contrato:	$ 441.989.733.00				
CDP	1103	RP	2718	VALOR RP	441.989.733,00 -
Valor Transferido a la Edup:	426.754.594,00				
Fecha de terminación inicial:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
MODIFICACIONES REALIZADAS					
Adición valor del contrato:	$0.00				
Valor del Contrato + Adicional:	$ 441.989.733,00				
Plazo de ejecución inicial:	Tres (3) Meses				
Fecha de inicio:	07 Junio del 2023				
Fecha de suspensión:					
Fecha de reinicio:					
Total, días transcurridos de suspensión	Noventa (90) días				
Fecha de Prorroga:	5 Septiembre del 2023				
Adición plazo:	Tres (3) Meses				
Plazo de ejecución modificado:	Seis Meses				
Fecha de terminación actualizada:	07 de Diciembre del 2023				
Fecha de Corte del Informe:	07 de Diciembre del 2023				
Días Transcurridos:					
INFORMACION FINANCIERA					
Acta parcial 1	0.00				

1.1.	FICHA TECNICA DEL CONTRATO
Acta parcial 2	0.0
Acumulado	0.00
Valor Transferido a la Edup	426.754.594,00
Valor desembolsado:	426.754.594,00
Fecha de desembolso	0.0
Amortización Acta parcial 1	0.0
Amortización Acta parcial 2	0.0
Pendiente por amortizar	0.0

GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)
(CUADRO EJEMPLO)

1.2. ALCANCE

El proyecto pretende fortalecer la red vial que alimentan a los barrios del municipio de Quibdó y que cumplen una labor primordial en los procesos de integración de las diferentes comunas; teniendo en cuenta la deficiencia actual de la red vial urbana en su capacidad y nivel de servicio, características geométricas, geotécnicas y estructurales. En el marco de una visión de competitividad, productividad de integración de todos los sectores de la ciudad, La alcaldía municipal ha previsto ejecutar esta vía de Competitividad, en nuestra Municipio.

1.3. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio Porvenir, comuna 2 de la ciudad de Quibdó.

2. INFORME TÉCNICO

2.1. CRONOGRAMA

La obra está pactada y programada inicial mente para tres meses según el cronograma y flujo de caja presentada en la propuesta; pero según el otrosí # 01 de fecha 5 de septiembre de año 2023; se le otorga una prórroga de tres meses para un total de ejecución del proyecto de seis (6.0) meses

PROYECTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE CORTE
100%	100%	100%

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el desarrollo del Contrato de Interadministrativo por Administracion Delegada de Recursos para la Construcción de Pavimentos y Desarrollo de Obras Complementarias en Vías Urbanas del Municipio de Quibdó; se ejecutaron las siguientes actividades:

TRABAJOS PRELIMINARES

- Campamento, se ejecutó 100% de la actividad programada
- Cerramiento Perimetral con tela verde, se ejecutó 100% de la actividad programada
- Localización, trazado y replanteo, se ejecutó 100% de la actividad programada.
- Adecuacion de terreno espesor 0.10 mt, se ejecutó 100% de la actividad programada.
- Retiro de material proveniente de la escarificación, se ejecutó 100% de la actividad programada.

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3500 PIS (245KG/CM2) CON ESPESOR DE 0.18 MT LONG 150 MT ANCHO 5.0 MT

- Sub base en material seleccionado y compactado con un protor del 95%, se ejecutó 100% de la actividad programada
- Losa de 2,50x 4,0 mt E = 0,18 mt en concreto hidráulico de 3500 psi (245 Kg/cm2) con pasadores de transferencia de 37000 psi Ø 7/8" de 0,40 mt colocado cada 0,40 mt, acero de anclaje de 60000 psi Ø 5/8" de 1.0 mt cada 1.0 mt incluye formaleta, acelerante de fraguado al 1%, sello asfaltico y curado, se ejecutó 100% de la actividad programada

BORDILLOS Y ANDENES

- Suministro y colocación de Bordillo prefabricado de 0,15x0,40 mt en concreto reforzado de 3000 psi (210 Kg/cm2), se ejecutó 100% de la actividad programada
- Construcción de anden en concreto hidráulico de 3000 psi con espesor de 0.10 mt, se ejecutó 100% de la actividad programada.

SEÑALIZACION Y CONTROL AMBIENTAL

- Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de cebras pavimentos color negro y blanco de 0.20mt de ancho, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos color amarillo ancho de 0.12mt de ancho, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos con flechas de frente color blanco según especificaciones, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos con velocidades máximas color blanco según especificaciones, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos en los resaltos color amarillo, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y colocación de maletines para cerramiento provisional de vías, se ejecutó 100% de la actividad programada, se ejecutó 100% de la actividad programada

- Plan y Control de manejo ambiental de las actividades del proyecto se ejecutó 100% de la actividad programada,

OBRAS DE DRENAJE

- Construcción de caja pluvial de 0,80x 0.8,0mt en concreto hidráulico de 3000 psi con concreto reforzado de 3500 psi con acero tipo A- 60 Ø ½" colocado cada 0,20mt en ambos sentidos según diseño incluye rejilla con marco en Angulo de 1" platine de 1" y barra N° 6 colocada cada 0,05 mt según especificación, se ejecutó 100% de la actividad programada.

- Suministro y colocación de tubería novaforth de Ø 12" se ejecutó 100% de la actividad programada.

LIMPIEZA GENERAL

- Suministro de mano de obra para limpieza general ejecutó 100% de la actividad programada.

2.3. ALCANCE DE OBRAS			
	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL	AVANCE
Construcción	100%	100%	100%
Rehabilitación			
Mejoramiento			
Mantenimiento			
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA			100%

3. INFORME FINANCIERO

3.1.1. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

ACTA No.	% EJECUCION	RP	RUBRO	VALOR
final	100%		2.3.06.05.02.01.04 y 2.3.06.05.02.01.05	441.989.733.00
			TOTALES	$441.989.733.00
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL LA OBRA				**100%**

4. DETALLES DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

Como supervisor de apoyo del Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP, realice las siguientes actividades tendientes a velar por los intereses del Municipio y por la correcta ejecución del contrato:

- Verifiqué que la carpeta que se me entrego a través de un oficio de designación como supervisor de apoyo de obra tuviera la documentación requerida como: Convenio Interadministrativo Cebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa solidaria del Pacifico - EDUP

- Serializo reunión con las comunidades del sector el Triunfo del Barrio Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó, con el objetivo de socializar el proyecto.
- Presenté informe de ejecución y desarrollo de las actividades contractuales.
- Como supervisor de apoyo del contrato cite a varios comités técnicos para resolver inquietudes, hablar del avance del proyecto y del inconveniente que se están presentando en la ejecución

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista cumplió con la totalidad de las actividades del objeto contractual conforme al cronograma estipulado en este.

6. IMPACTO GENERADO CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El Municipio de Quibdó ha considerado necesario mejorar las especificaciones técnicas y las condiciones de transpirabilidad de la población, por lo cual, se plantea mejorar la red vial urbana de la ciudad.

Desde un enfoque diferencial, y atendiendo los requerimientos incoados por los habitantes del Municipio de Quibdó, con este proyecto se busca mejorar las condiciones de vida de los mismos, de tal manera que tengan unas vías seguras y confiables, con las respectivas especificaciones técnicas y con el lleno de las condiciones de transpirabilidad para la movilidad de la población, en consecuencia se plantea mejorar la red vial urbana de la ciudad, mejorar la transitabilidad por las vías que sean intervenidas, disminuir la congestión vehicular, procurar una mejor visión de visitantes y propios en el municipio de Quibdó

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se recomienda que la comunidad del sector no realice rupturas del pavimento de la vía para realizar conexiones hidrosanitaria; mezclado de concreto en la banca para la construcción de edificaciones que van afectar la textura del pavimento de la vía ya que la esta se encuentra en una etapa de garantía.


470


Informe presentado en Quibdó, a los 07 días del mes de diciembre del año 2023.

FRANKLIN CUESTA PALMA
ING.SUPERVISOR DE APOYO

EVELYN CAÑADAS GARRIDO
SUPERVISOR DE LEGADO DE LA OBRA

REGISTRO FOTOFRAFICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

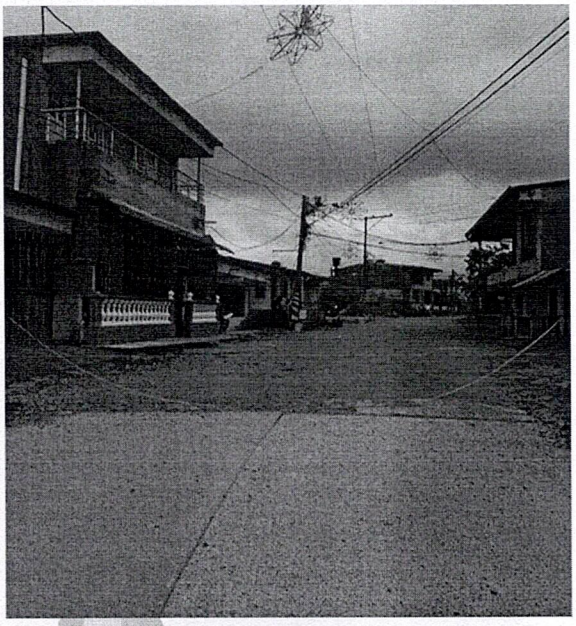

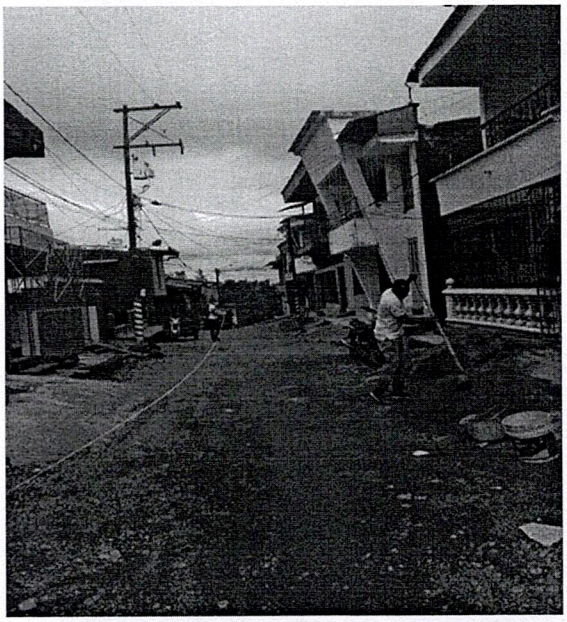



Condiciones iniciales de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio el Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP







Condiciones iniciales de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio el Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

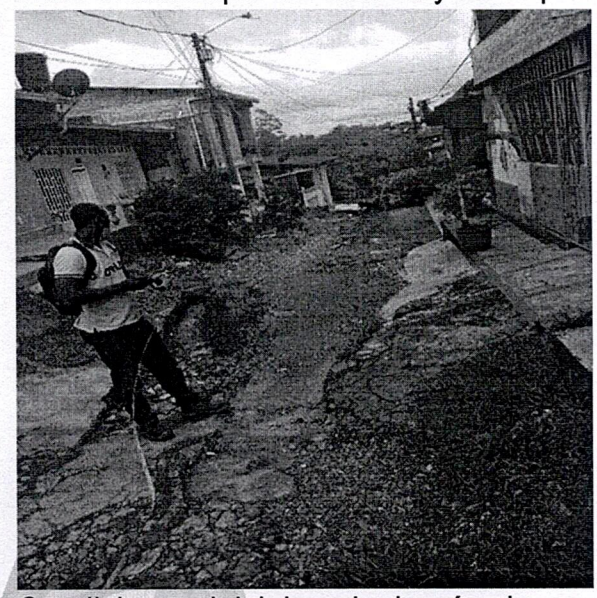

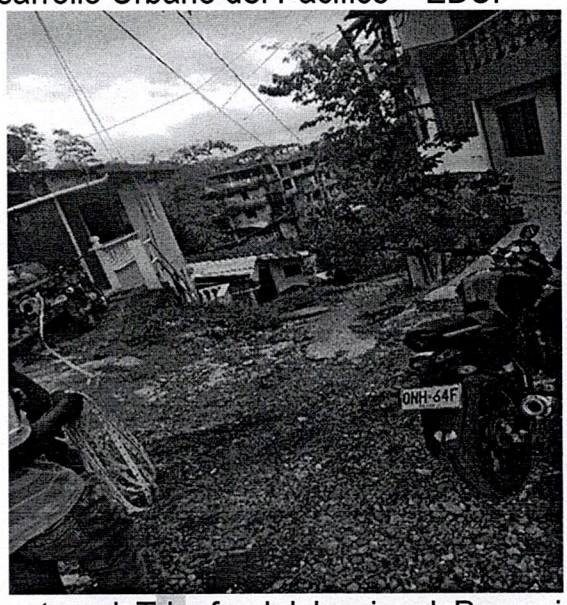



Condiciones iniciales de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio el Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

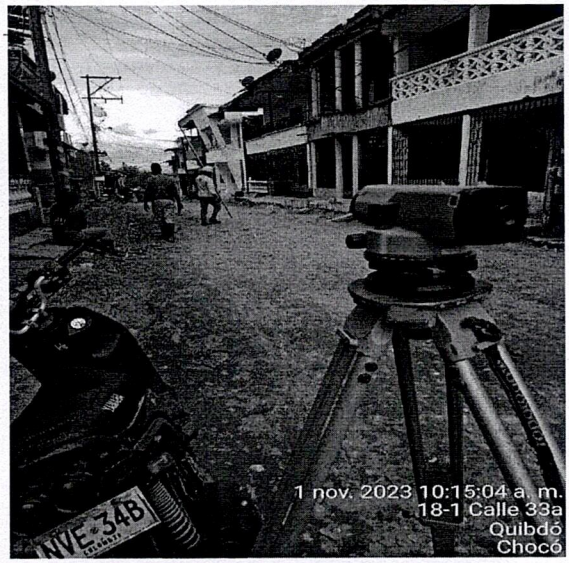

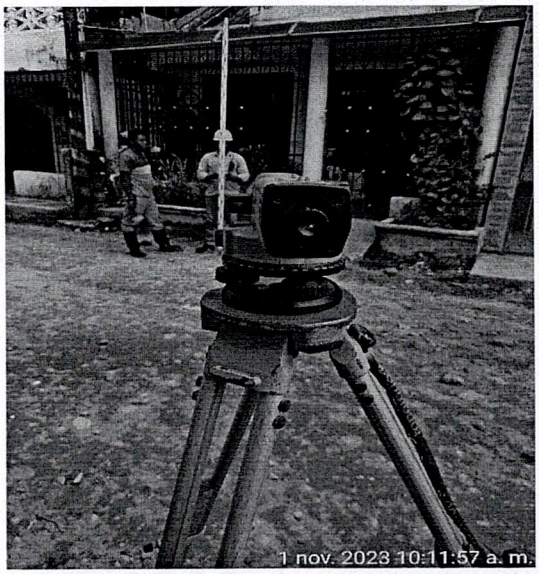



Panorama de la actividad de localización trazado y planteo del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

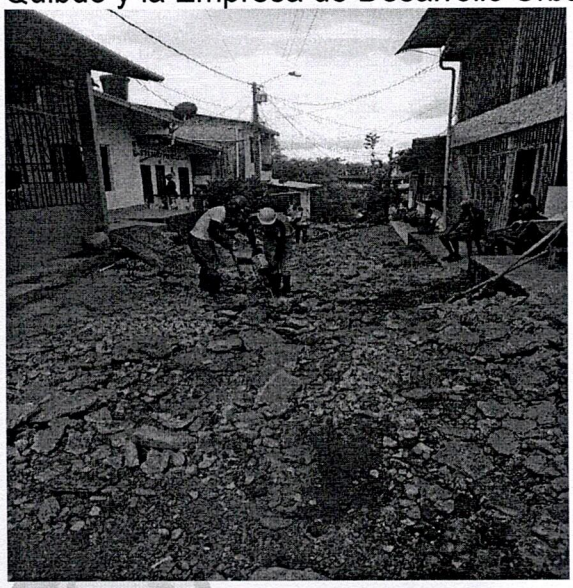

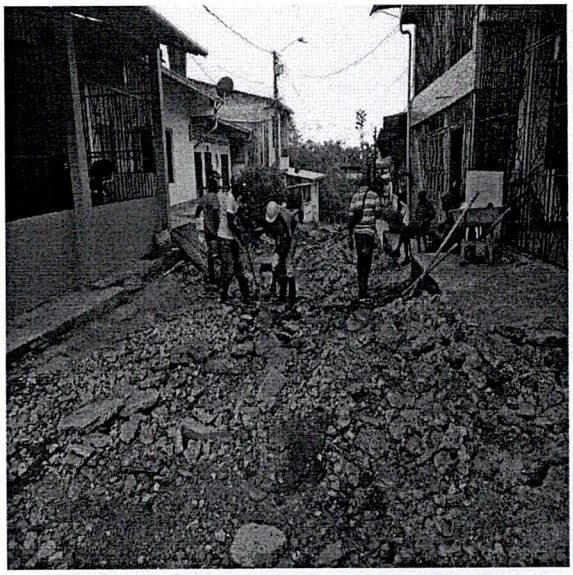



Panorama de la actividad de demolición de andenes y losas de concreto para el proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

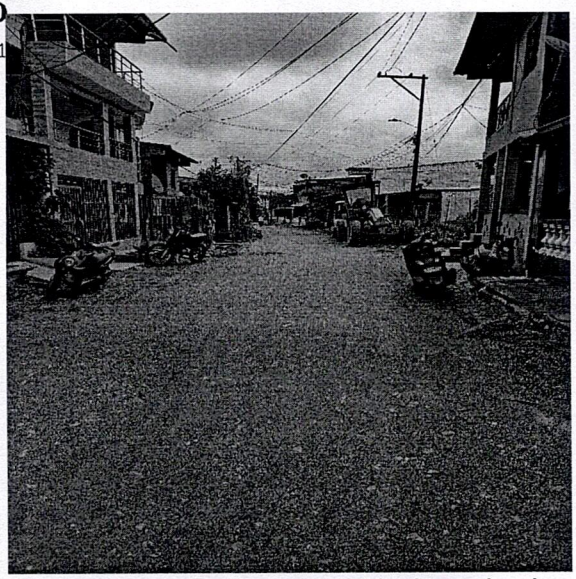

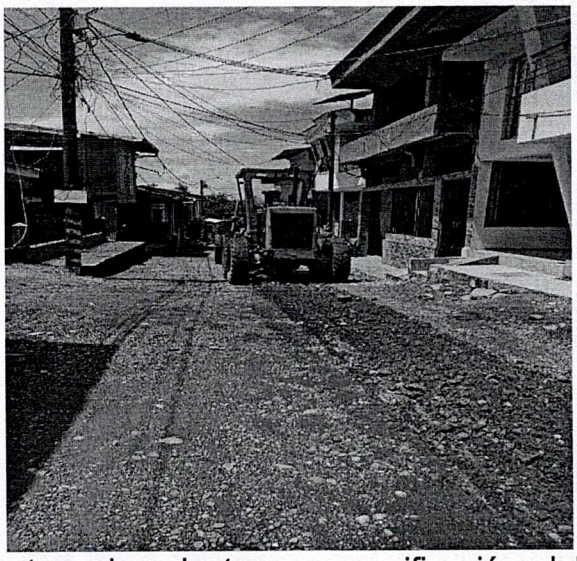



Panorama de las actividades de localización, trazado, planteo y escarificación del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

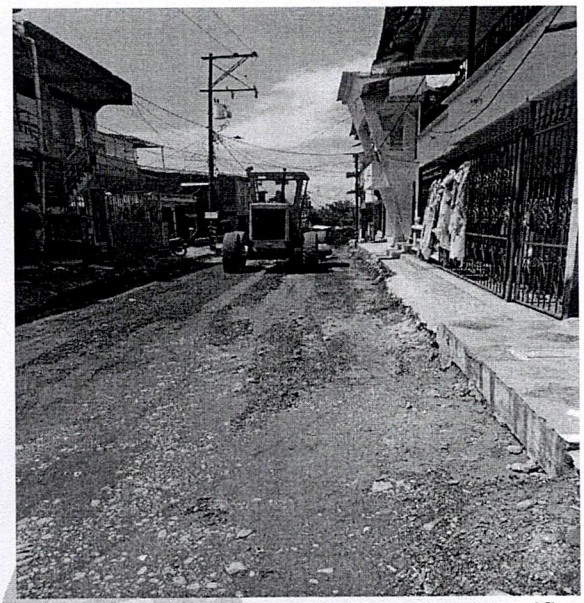

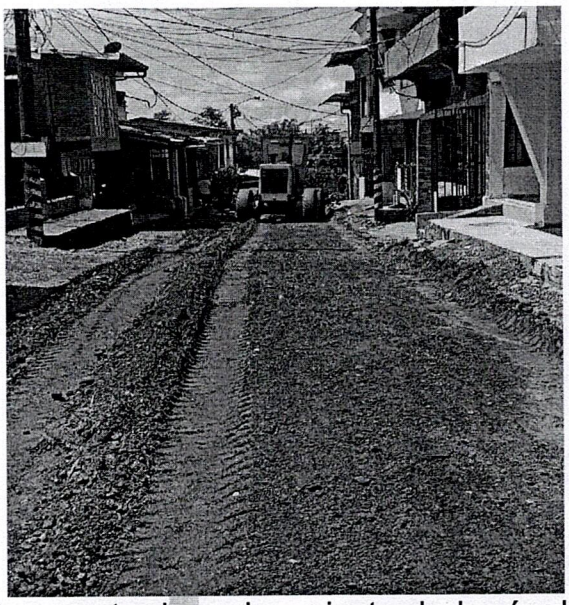



Panorama de la actividad de escarificación del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

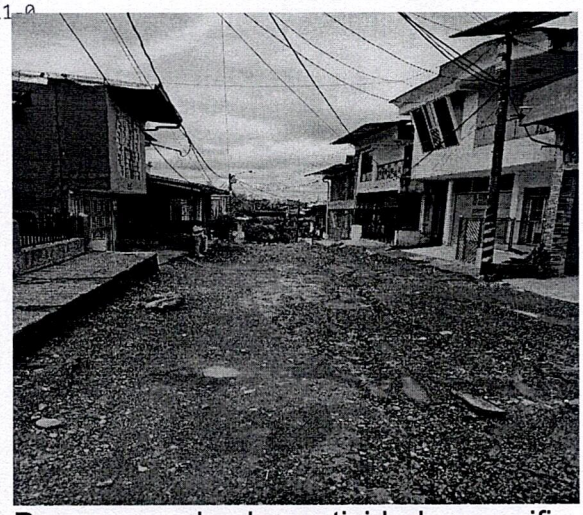

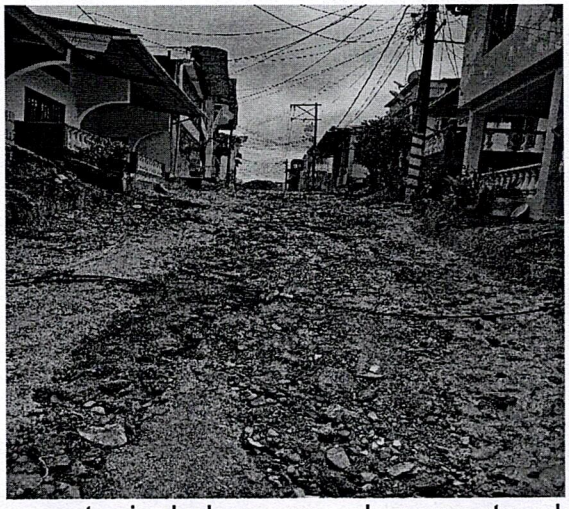


Panorama de la actividad escarificación con motoniveladora en el proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

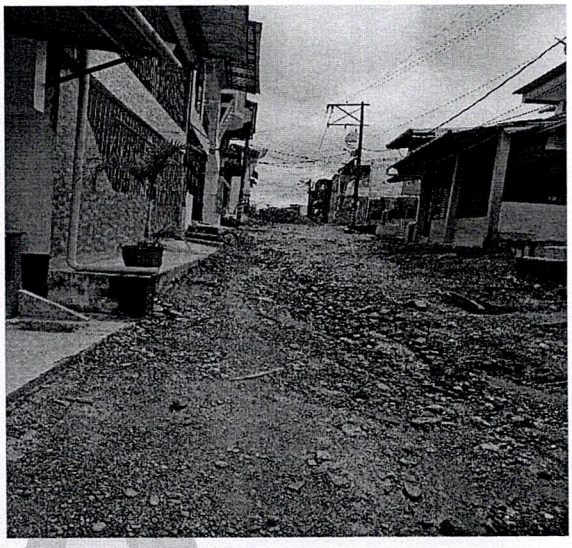

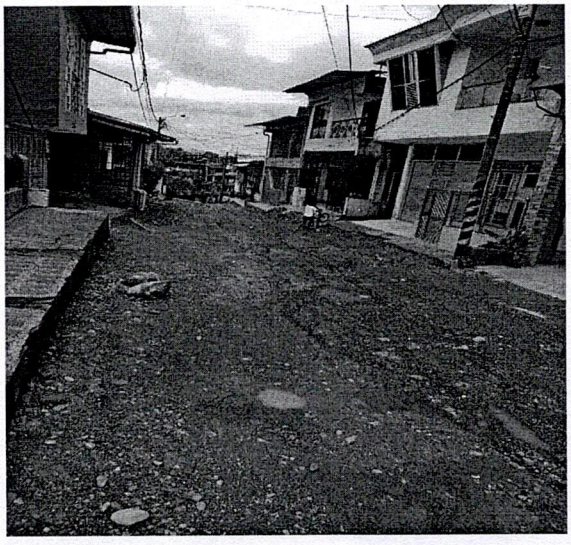



Panorama de la actividad escarificación con motoniveladora en el proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

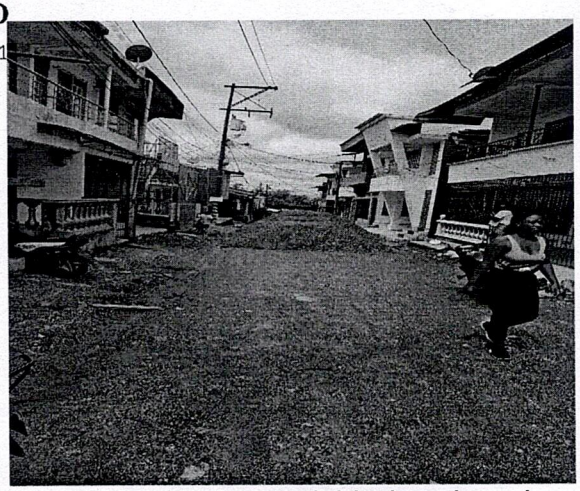




Panorama de las actividades de colocación de material de afirmado y compactación de los mismo para súb base y base de la banca de la vía en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

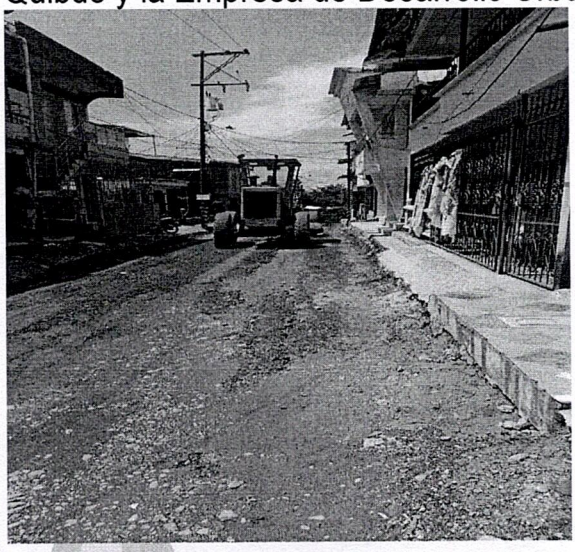

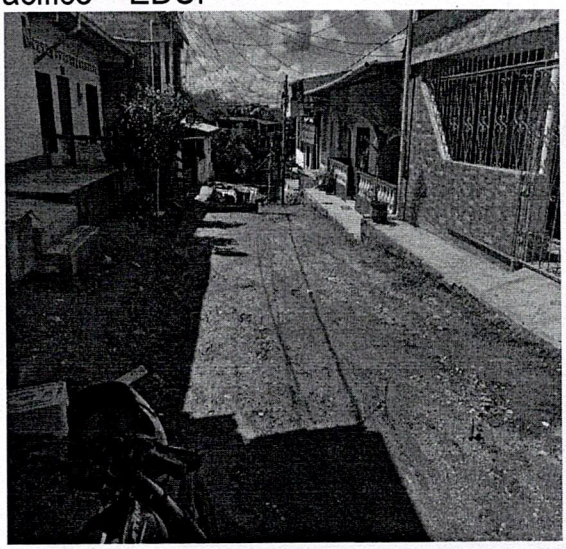


Panorama de las actividades de colocación de material de afirmado y compactación de los mismo para súb base y base de la banca de la vía en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP



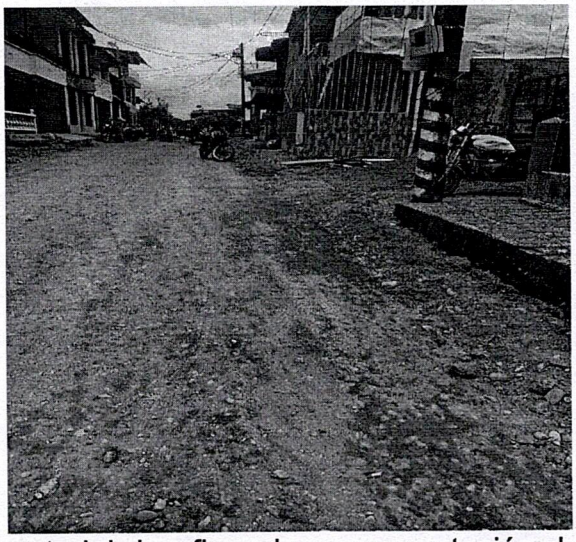


Panorama de las actividades de colocación de material de afirmado y compactación de los mismo para súb base y base de la banca de la vía en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

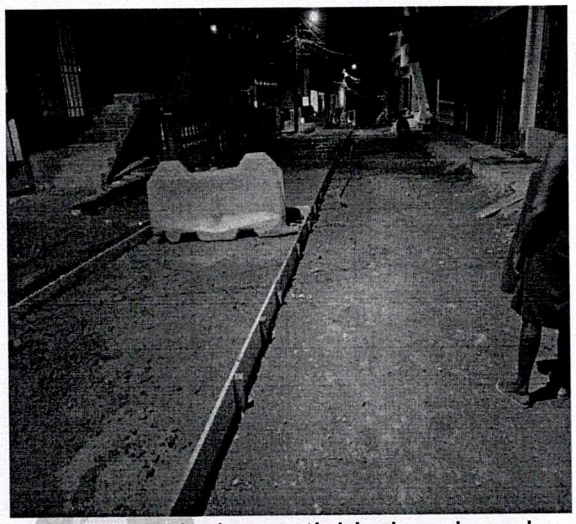




Panorama de las actividades de colocación de formaleta y fundida de losa en concreto hidráulico de con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en el proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP


477

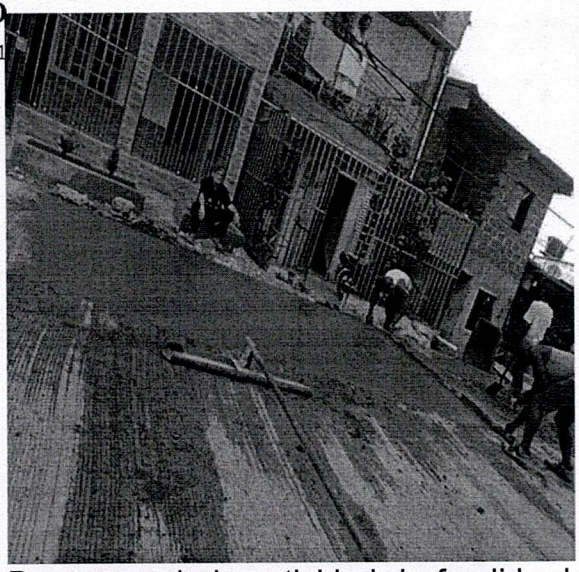

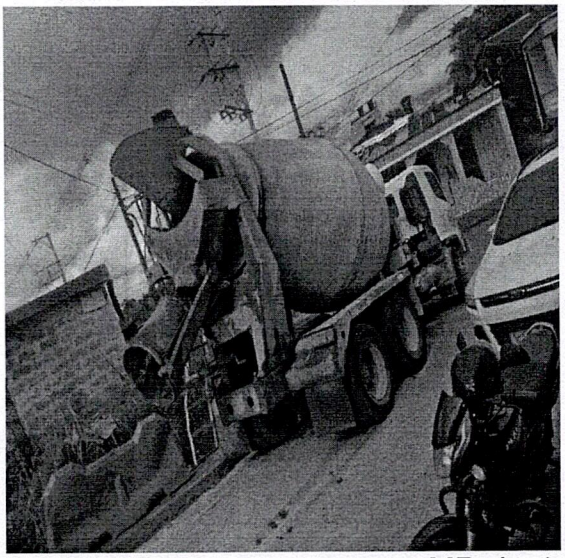


Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP



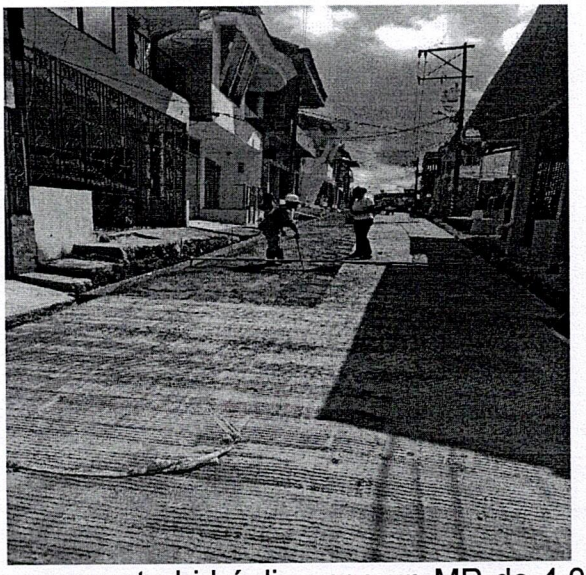



Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

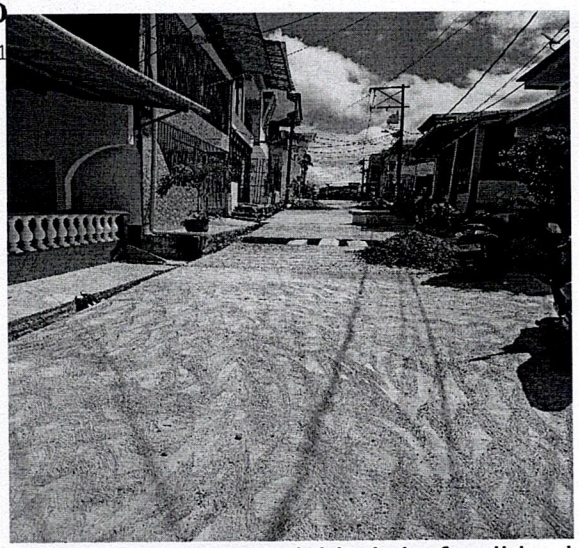





Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

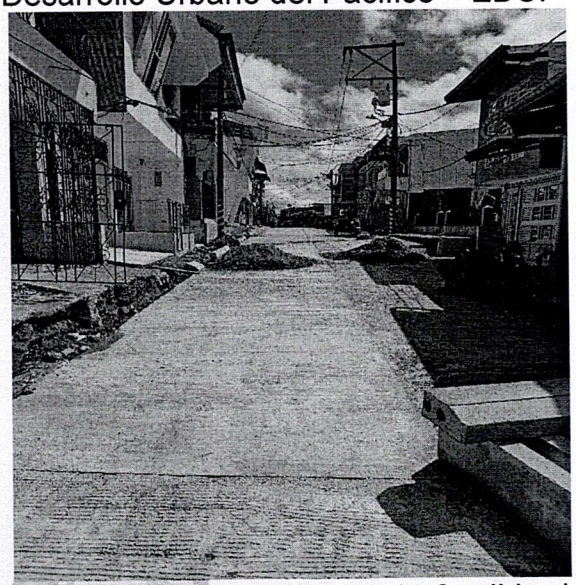

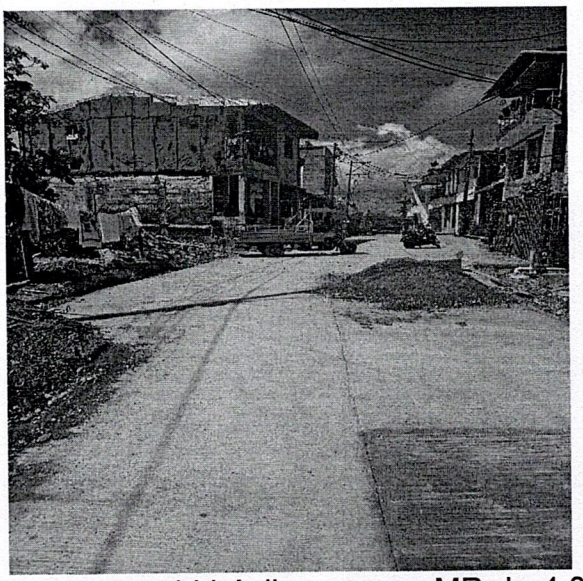



Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

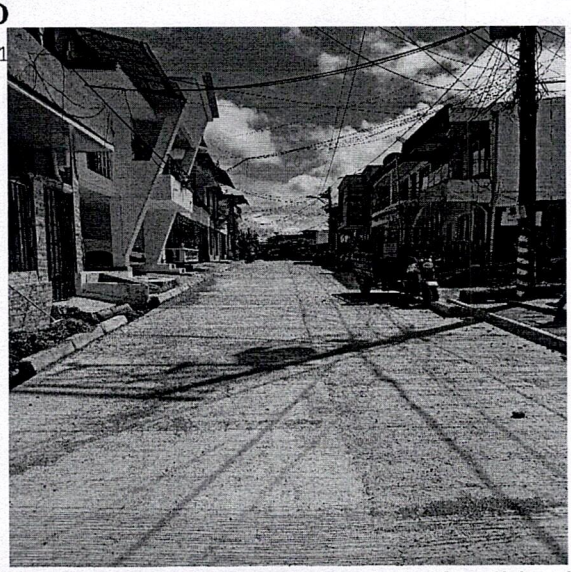

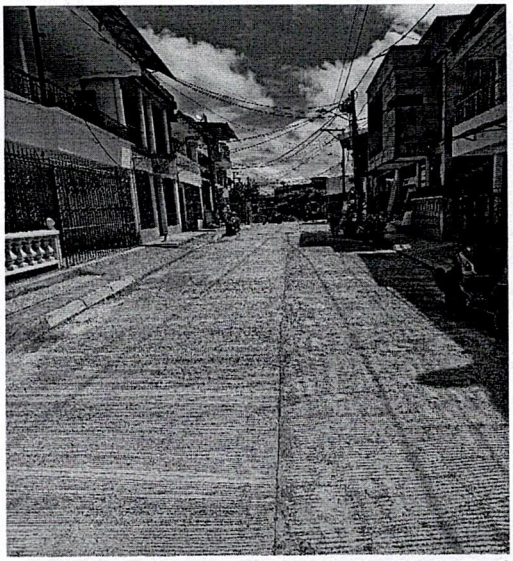

Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

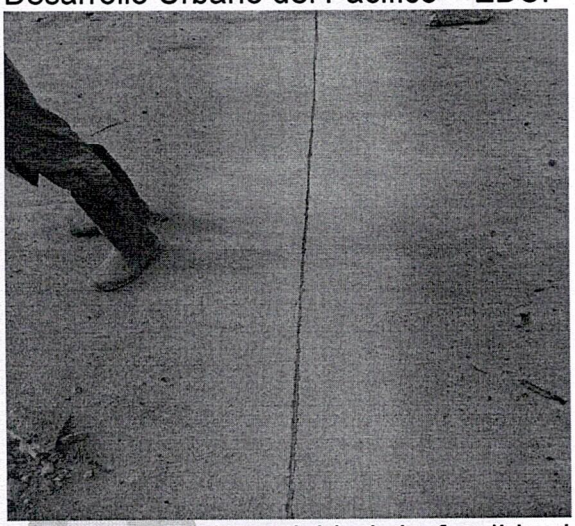

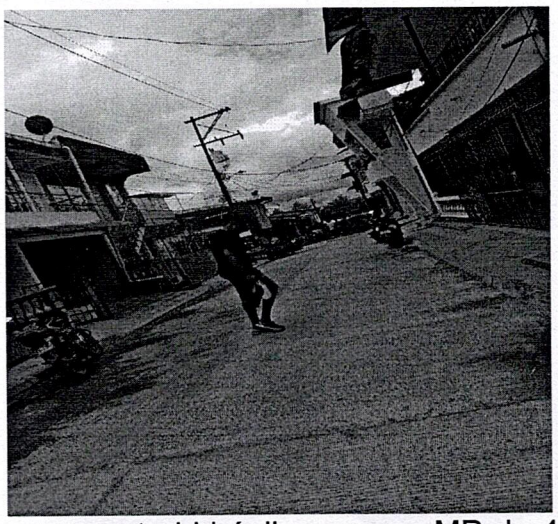


Panorama de la actividad de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP






Panorama de las actividades de fundida de placa en concreto hidráulico con un MR de 4.0 con espesor de 0.18 mt y andenes en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP



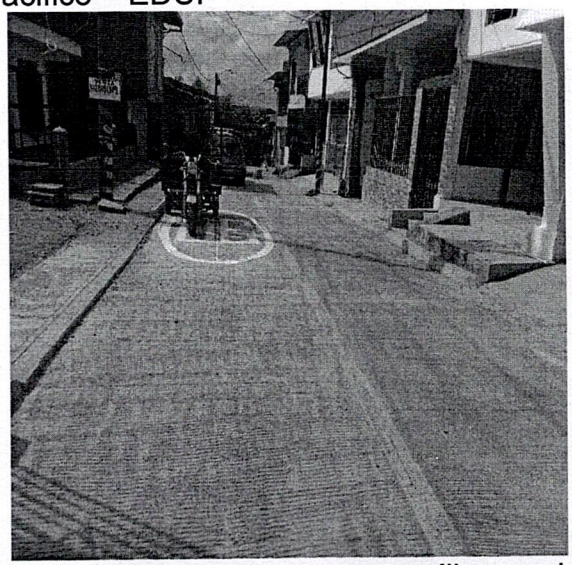

Panorama de la actividad de demarcación de pavimento con pintura en acrílico en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP

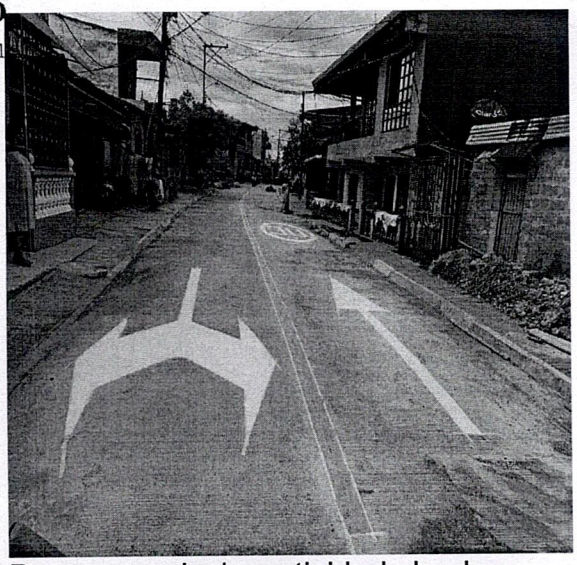



Panorama de la actividad de demarcación de pavimento con pintura en acrílico en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía de acceso al sector el Triunfo del barrio la Porvenir comuna 2 de la Ciudad de Quibdó donde se va a construir pavimento en concreto hidráulico de 3500 psi(245Kg/cm2) con espesor de 0.18 mt. según el Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP
