CONTRATO NO. 4600102167 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: JULIO 26-AGOSTO 21 DEL AÑO 2024.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	ECOFLORA S.A.S
NIT:	830.032.102-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO CESAR GÓMEZ SERNA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.367.149
OBJETO:	PP - Realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la Secretaría de Medio Ambiente
VALOR INICIAL:	Seiscientos sesenta y tres millones setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos pesos ($663.799.172) incluido AIU del 19,78 %.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES	Seiscientos sesenta y tres millones setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos pesos ($663.799.172) incluido AIU del 19,78 %.
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cuatro (4) meses sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Veinticuatro (24) de julio del dos mil veinticuatro (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102167 de 2024, se presenta el informe parcial de Supervisión y/0 Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

La empresa ECOFLORA S.A.S mediante el Contrato No. 4600102167 de 2024, ha venido ejecutando actividades de amoblamiento con la intervención de obras de paisajismo complementarias mejorando la estructura de la ciudad con la instalación de puentes, jardineras, cercos, parques infantiles en madera inmunizada, entre otros, en diferentes áreas de influencia a las Quebradas del Distrito como se reportan las actividades en la tabla N° 1.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Tabla 1. Cantidades en actividades de amoblamiento ejecutadas a 21 de agosto del 2024.

Actividad	Unidad	Cantidad proyectada por actividad	Valor total	Cantidad proyectada para todo el contrato (ml)	Agosto del 2024		Total, acumulado	% Ejecución física acumulada
					Cantidad (ml)	% ejecución física	Cantidad (ml)	%
Suministro e instalación de puentes en madera inmunizada	ml	145	$17.475.000	3608	42,6	1,181	42,6	1.18
Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada.	Ml	1166	$61.344.000		250	6,93	250	6.93
Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml	156	$2.130.125		25	0,69	25	0.69

EJECUCIÓN AGOSTO		$80.949.125		8.8	
Administración	14,78%	$11.964.280,68			
Utilidad	5%	$4.047.456,25			
Póliza		$1.464.040			
TOTAL, EJECUCIÓN + AIU AGOSTO		**$98.424.902**			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$663.799.172**			
TOTAL, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA AGOSTO				**8,8**	
TOTAL, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA AGOSTO				**14,828**	

El contrato se desarrolla de acuerdo con las especificaciones de calidad, cantidad y oportunidad estipuladas, no se han presentado novedades que afecten su normal ejecución.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

El Contrato se desarrolla cumpliendo con las obligaciones pactadas entre el contratista y el contratante, sin presentarse alguna novedad que afecte su normal ejecución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

Se verificó y aprobó el informe de avance físico y financiero presentado por el contratista para el periodo del 26 de julio hasta el 21 de agosto de 2024, y se autorizó su incorporación al expediente general del contrato. Dicho informe constituye la entrega 1 publicada en SECOP II y da origen a la autorización de pago No.1.

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

En la tabla 1. Cantidades en actividades de amoblamiento ejecutadas a 21 de agosto del 2024, se presenta el resultado de las cantidades ejecutadas en cada uno de los ítems establecidos en el contrato, con un 8.8 % de ejecución física para este mes y acumulada del 8.8 % para el contrato.

Con el fin determinar el porcentaje de ejecución de todas las actividades para el total del contrato, se calculó un valor base para cada actividad de acuerdo con la cantidad en metros lineales a intervenir, como se observa en la siguiente tabla en la columna POI FISICO.

		PRESUPUESTO ECOFLORA SAS					PP-COMUNA 13		RECURSOS ORDINARIOS		PP- COMUNA 9	
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	POI FISICO m	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $
1,01	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre JINETE (pierna - biceps)	Un	3	6	$ 5.800.000	$ 17.400.000	2	$ 11.600.000		$ -	1	$ 5.800.000
1,02	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4 USUARIOS	Un	3	6	$ 20.500.000	$ 61.500.000	2	$ 41.000.000		$ -	1	$ 20.500.000
1,03	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre FLEXIONES PECHO-TRPCES	Un	2	4	$ 2.250.000	$ 4.500.000	2	$ 4.500.000		$ -		$ -
1,04	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre CALENTADOR DE PIERNAS	Un	3	6	$ 2.250.000	$ 6.750.000	2	$ 4.500.000		$ -	1	$ 2.250.000
1,05	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre Banca ABDOMEN INCLINADA	Un	3	6	$ 3.550.000	$ 10.650.000	2	$ 7.100.000		$ -	1	$ 3.550.000
1,06	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre SKY (pierna)	Un	1	2	$ 6.900.000	$ 6.900.000		$ -		$ -	1	$ 6.900.000
1,07	Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diámetro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento- pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoria	m	1.166	1.166	$ 69.900	$ 81.503.400	696	$ 48.650.400	470	$ 32.853.000,00		$ -
1,08	Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguientes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41 • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • un (1) módulo de columpio doble con herrajes doble perno, capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm fijado a la torre con buje y esparraga de media 1/2", y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y pernada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra • Un (1)NO RED ARAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16" grado 10 con cabeza plana para . La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. En cumplimiento a la norma Técnica colombiana NTC 5600-1-No debe presentar tornillería expuesta-protección con profilan.	Un	1	5	$ 3.812.975	$ 3.812.975	1	$ 3.812.975		$ -		$ -
1,09	Desmonte y disposición final de modulo de parque infantil en madera inmuniza	Un	1	5	$ 310.289	$ 310.289	1	$ 310.289		$ -		$ -
1,1	Mantenimiento de modulo parque infantil (1)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	5	$ 3.250.000	$ 3.250.000		$ -	1	$ 3.250.000,00		$ -
1,11	Mantenimiento de modulo parque infantil (2)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	5	$ 4.650.000	$ 4.650.000		$ -	1	$ 4.650.000,00		$ -
1,12	Mantenimiento de modulo parque infantil (3)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	5	$ 9.300.000	$ 9.300.000		$ -	1	$ 9.300.000,00		$ -
1,13	Mantenimiento de modulo parque infantil (4)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	5	$ 3.020.000	$ 3.020.000		$ -	1	$ 3.020.000,00		$ -
1,14	Mantenimiento de modulo parque infantil (5)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	5	$ 3.200.000	$ 3.200.000		$ -	1	$ 3.200.000,00		$ -
1,15	Suministro e instalación de pisos en madera sintética o inmunizada para deck hasta 50cm de altura . incluye estructura, en madera inmunizada todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento. Alfarda madera inmunizada de 1,00 m x 7 cm - Carguera madera inmunizada de 4 x 8 x 3,00-Alfardado madera inmunizada de 4 x 8 x 3,01- Tabla madera plástica de 10,5 x 2,5 x 3,00 espaciado la estructura cada 30cm)	m2	30	5	$ 370.000	$ 11.100.000	30	$ 11.100.000		$ -		$ -
1,16	Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, Base Instalación	Un	5	5	$ 564.622	$ 2.823.110	5	$ 2.823.110		$ -		$ -
1,17	Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	m³	5	5	$ 29.761	$ 148.805	5	$ 148.805		$ -		$ -
1,18	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según especificaciones según especificaciones de 1,50	m	1.218	1.218	$ 69.100	$ 84.163.800	921	$ 63.641.100	170	$ 11.747.000,00	127	$ 8.775.700
1,19	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada y metálica	m	798	798	$ 7.175	$ 5.725.650	598	$ 4.290.650	80	$ 574.000,00	120	$ 861.000
1,2	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento 1,50 altura	m	15	15	$ 141.363	$ 2.120.445	15	$ 2.120.445		$ -		$ -
1,21	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tablilla baranda en bolillo en madera inmunizada	m	145	145	$ 1.440.000	$ 208.884.883	27	$ 38.880.000	113,0589465	$ 162.804.882,96	5	$ 7.200.000
1,22	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1.50ml	m	156	156	$ 85.205	$ 13.269.273	27	$ 2.300.535	123,7335072	$ 10.542.713,48	5	$ 426.025
1,23	Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm , anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	un	4	4	$ 169.532	$ 678.128		$ -		$ -	4	$ 678.128
1,24	Suministro e instalación de tornillería a piso en madera plástica en puente metálico sobre la Quebrada Ana Diaz -tornillo panel doble drywall punta broca 8x2-1/2	un	1.019		$ 500	$ 509.500	1019	$ 509.500		$ -		$ -
1,25	SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL (colorante amarillo Nubifer Ref. Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref. R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado- 21 Mpa con un espesor de 0.08 m., pendientado y escobiado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5x1.5m) juntas de madera cada 1.5 m , acabado tipo metro . Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra con un espesor de 0.15m y 0.05m de arenilla, malla en hierro Malla electrosoldada D 50-llaves laterales- con huella, y anilina, color (1600 gr de colorante por bulto de cemento de 50 kg), impresión de huella de hoja vegetal -natural sobre el vaciado, Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas curado y excavación conformación del material resultante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	50	10	$ 127.874	$ 6.393.700	10	$ 1.278.740		$ -	40	$ 5.114.960
1,26	Desmonte y disposición final de máquinas de gimnasio deterioradas	un	8	16	$ 49.467	$ 396.736	8	$ 395.736		$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO			**3.608**		**552.959.694**		**248.962.285**		**241.941.596**		**62.055.813**

El cálculo del porcentaje de ejecución se realizó tomando el total de la cantidad ejecutada por actividad sobre la cantidad total base del contrato (3608 ml) como se muestra en la tabla 1.

- Porcentaje de ejecución financiero del contrato.

A continuación, se presenta ejecución financiera del total del contrato para el mes de agosto de 2024 por valor de $98.424.902, con un avance ejecución del 14.82%

en el mes, este valor se encuentra plasmado en el informe realizado por el Contratista, el cual se encuentra debidamente publicado en SECOP II.

- Otros aspectos relevantes:

A agosto 21 de 2024, se ha realizado un comité de seguimiento el cual describe brevemente a continuación:

El día 26 de julio del 2024 con Acta N°1 se realizó comité de seguimiento enfocado en “Entrega de sitios a intervenir del contrato 4600102167 del 2024 al contratista Ecoflora S.A.S” cuyo objetivo fue, realizar recorridos por las diferentes comunas de Medellín que requieren intervención con la instalación de puentes en madera inmunizada, participaron de la reunión el supervisor, apoyo a la supervisión y el tecnólogo civil de la empresa contratista – ECOFLORA S.A.S.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, extraído del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP.

Tabla 2. Impuestos y contribuciones aplicables.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	0
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	0
Ded.Estamp.Pro Innovación 1% Acuerdo 93	0
Total, general	**0**

Durante el periodo evaluado no se realizaron pagos al Contratista, por lo que la anterior tabla no reporta valores.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

La Empresa ECOFLORA S.A.S se encuentra al día con los aportes de pago a Seguridad Social y parafiscales y pago de seguridad social al tecnólogo Civil y al personal operativo de las actividades de campo. Lo anterior se expresa en el certificado emitido por el Revisor Fiscal del contratista CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO y en las planillas de pago por concepto de Seguridad Social de todas las personas asociadas al contrato, entregados por el contratista así:

Tabla 3. Verificación de certificados de parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/08/2024	Últimos seis (06) meses	Cesar Augusto Hernández Quintero Revisor Fiscal T.P N° 64997 -T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado marcación de bienes.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

El contrato no ha sido objeto de modificaciones contractuales.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

El día 18 de julio de 2024 se recibe Designación de Supervisión especializada, formato **FO-GECO Designación de Supervisión Especializada**, con asunto: Comunicación de Designación de Supervisión Especializada al Contrato Convenio No 4600102167 de 2024.Nombrando el siguiente equipo de supervisión:

Tabla 5.Designación de Supervisión con apoyos.


Así mismo, contará con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:

SUPERVISOR DE APOYO	COMPONENTE
Santiago Bermudez Macias	Administrativo, financiero y contable
Viviana Tamayo Giraldo	Jurídico

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.

La supervisión informa que durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- Evaluación al contratista se califica directamente en SAP.

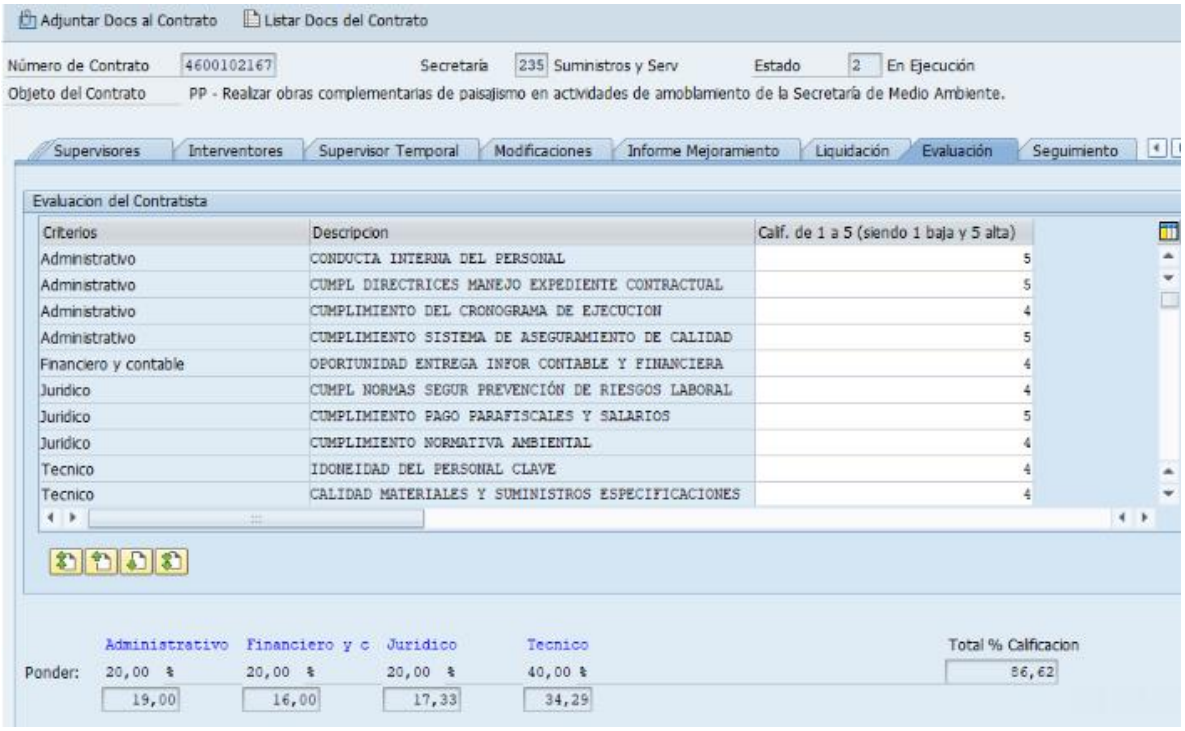

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.

La supervisión informa que durante el periodo evaluado el contrato no ha sido auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto.

Tabla 6. Relación de la Imputación del gasto inicial.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	74200000	2320202009	200344	4000117100	9015301	5100008490
110000124	74200000	232020200909	230036	4000117100	9015301	5100008490
110000124	74200000	232020200913	230036	4000117100	9015301	5100008490

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales

El contrato no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Relación de los pagos realizados.

Tabla 7. Relación de pagos realizados al 21 de agosto 2024.

Pago No.	Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
0	0	0	0	0	0
TOTAL					

De acuerdo con la ejecución alcanzada a 21 de agosto de 2024, se valida y se autoriza por parte del supervisor el pago No. 1 por valor de **$98.424.902** que se encuentran en SECOP ingresados como pagos 1 y 2.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos, información extraída de SAP mediante la transacción ZMMPUR189:

Tabla 8. Relación de pagos por proyecto.

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600102167	5100008490	218	Medio Ambiente	200344	PP - Realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la Secretaría de Medio Ambiente"	279.655.096	0	279.655.096
4600102167	5100008490	218	Medio Ambiente	230036	PP - Realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la Secretaría de Medio Ambiente"	384.144.076	0	384.144.076

- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Tabla 9. Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	$663.799.172
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$663.799.172
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de agosto 2024	$98.424.902
Porcentaje de ejecución financiera	14.82 %

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de elaboración del presente informe parcial, el contrato no fue objeto de reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes.

- A la fecha de elaboración del presente informe parcial no se ha presentado proceso sancionatorio ni incumplimientos por parte del Contratista. Por lo tanto, no se han aplicado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato:

POLIZA INICIAL DEL CONTRATO

Tabla 10 Póliza Inicial Del Contrato- Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895 47 994000008348	Cumplimiento	27/07/2024	24/05/2025	31/07/2024	$66.379.917,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/07/2024	24/11/2027	31/07/2024	$33,189,958.60
		*Estabilidad y calidad de la obra.	*Tiene vigencia de cinco años, a partir de la fecha del ata de recibo final de la obra		31/07/2024	$66.379.917,20
	895 74 994000005182	Responsabilidad civil extracontractual	12/11/2024	24/11/2024	31/07/2024	$260.000.000.00

Atentamente,

FABIO SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor

Revisó:

VIVIANA TAMAYO GIRALDO
Apoyo Jurídico a la Supervisión

SANTIAGO BERMUDEZ MACIAS
Apoyo Administrativo y Financiero a la Supervisión
