INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)


FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																				
EXPLANACIONES	$16.741.417	9,68%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,18%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,17%	0,26%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,17%	0,24%
				$ P	$0	$4.358	$4.358	$8.716	$8.716	$13.074	$303.749	$147.564	$147.564	$147.564	$147.564	$295.128	$442.692	$442.692	$147.564	$147.564	$147.564	$295.128	$147.692
				$ E	$0					$147.564													
				% E	0,00%	0,00%				0,08%													
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$35.524.436	20,54%		% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,56%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,36%	0,54%	0,54%	0,18%	0,18%	0,18%	0,36%	0,54%
				$ P	$0	$13.791	$13.791	$27.583	$27.583	$41.374	$961.279	$313.123	$313.123	$313.123	$313.123	$626.246	$939.369	$939.369	$313.123	$313.123	$313.123	$626.246	$939.369
				$ E	$0	$48.137	$0	$64.183	$127.172	$105.298													
				% E	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,07%	0,11%													
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$33.534.500	19,39%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,34%	0,34%	0,51%	0,17%	0,17%	0,34%	0,51%	0,68%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295.583	$295.583	$591.166	$591.166	$886.749	$295.583	$295.583	$591.166	$886.749	$1.182.333
				$ E	$0																		
				% E	0,00%	0,00%																	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.817.528	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$336.488	$336.488
				$ E	$0																		
				% E	0,00%	0,00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$21.074.640	12,18%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,21%	0,32%	0,32%	0,11%	0,11%	0,11%	0,21%	0,32%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.758	$185.758	$185.758	$185.758	$371.516	$557.275	$557.275	$185.758	$185.758	$185.758	$371.516	$557.275
				$ E	$0			$6.396	$4.114														
				% E	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%														
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.706.732	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.873
				$ E	$0																		
				% E	0,00%	0,00%																	
OBRAS VARIAS	$2.895.554	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,04%	0,07%	0,09%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.522	$25.522	$51.045	$51.045	$76.567	$127.611	$153.134
				$ E	$0																		
				% E	0,00%	0,00%																	
TRANSPORTES	$57.662.552	33,34%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,14%	0,26%	0,26%	0,29%	0,29%	0,59%	0,88%	1,18%	0,29%	0,29%	0,32%	0,59%	0,62%
				$ P	$0	$3.529	$3.529	$7.058	$7.058	$10.587	$245.976	$471.675	$455.075	$508.255	$508.255	$1.016.510	$1.524.765	$2.033.020	$508.255	$508.255	$560.835	$1.016.510	$1.069.090
				$ E	$0					$70.602													
				% E	0,00%	0,00%				0,00%													
ITEM NO PREVISTOS				% P																			
				$ P																			
				$ E																			
				% E																			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172.957.358	100,00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																							

Reprogramación Adicion 1

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,04%**	**0,87%**	**0,64%**	**0,64%**	**0,84%**	**0,84%**	**1,68%**	**2,36%**	**2,82%**	**0,87%**	**0,87%**	**1,08%**	**2,12%**	**2,88%**
	VALOR	**$0**	**$21.678**	**$21.678**	**$43.356**	**$43.356**	**$65.035**	**$1.511.003**	**$1.102.120**	**$1.102.120**	**$1.450.283**	**$1.450.283**	**$2.900.566**	**$4.080.789**	**$4.884.627**	**$1.501.328**	**$1.501.328**	**$1.875.013**	**$3.660.249**	**$4.981.253**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,01%**	**0,03%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,11%**	**0,99%**	**1,62%**	**2,26%**	**3,10%**	**3,94%**	**5,61%**	**7,97%**	**10,80%**	**11,67%**	**12,53%**	**13,62%**	**15,73%**	**18,62%**
	VALOR	**$0**	**$21.678**	**$43.356**	**$86.713**	**$130.069**	**$195.104**	**$1.706.107**	**$2.808.227**	**$3.910.347**	**$5.360.630**	**$6.810.914**	**$9.711.480**	**$13.792.269**	**$18.676.896**	**$20.178.224**	**$21.679.552**	**$23.554.565**	**$27.214.815**	**$32.196.068**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,08%**	**0,21%**													
	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$0**	**$72.683**	**$131.244**	**$355.547**													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,07%**	**0,15%**	**0,35%**													
	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$48.137**	**$120.820**	**$252.063**	**$607.610**													

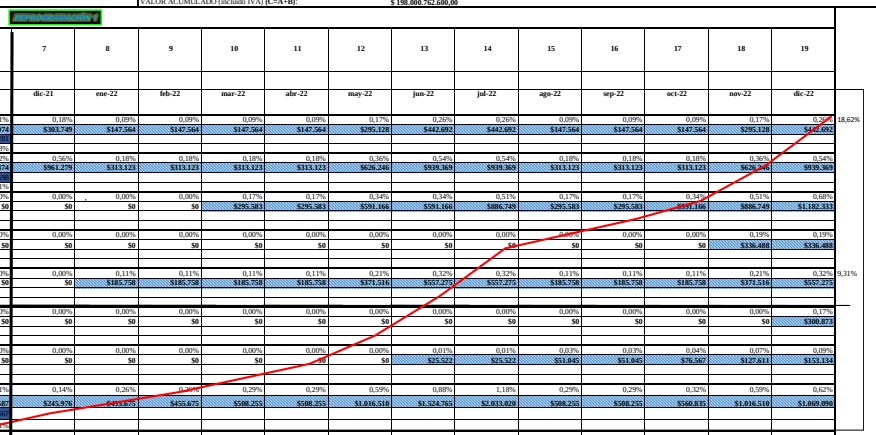

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	$73.150.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4.349.357.466
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25.043.405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198.000.763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ 198.104.174,00	$ 607.609.995,40
CURVAS		

OBSERVACIONES: 1. Corresponde a la pagina 1 de 5

2, El presente programa de inversiones se ajusta a lo establecido al titulo 3 "ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE" del anexo técnico de la licitación publica LP-DT-065-2020 así:
"(…) Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones"

3, El anexo técnico de la licitación pública LP-DT-065-2020, establece en su título 3.1. "Requerimientos especiales de ejecución":
"(…) El Contratista se obliga a adelantar las actividades de construcción de las estructuras definidas dentro del alcance del presente contrato, en una longitud de por lo menos 3.0 kilómetros, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente autorizado por INVIAS, en un plazo NO MAYOR A 6 MESES contados a partir de la orden de inicio del contrato, así mismo, se debera garantizar la continuidad en el desarrollo de las obras y un constante flujo de inversiones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto"

Las actividades correspondientes a dicha obligación se incorporarán al PROGRAMA DE INVERSIONES en el momento que el INVIAS viabilice la anticipación de vigencia y/o uso de opción.

4, Se estima que se requiere incorporar aproximadamente $17 mil millones al PROGRAMA DE INVERSIONES para cumplir con los requerimientos especiales de ejecucion, lo cual se realizara con la viabilidad ya sea por adelanto de vigencia y/o uso de opción por parte del INVIAS.

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matrícula No. : 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Revisó Firma
ANDRES RICARDO TOVAR MALAGON
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 25202117144 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segín código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.569,00 (Segín contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES	$16.741.417	9,68%		% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
				$ P	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$113.542	$113.542	$113.542	$113.542	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$113.542	$113.542	$113.542	$113.542
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$35.524.436	20,54%		% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,15%	0,18%	0,18%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,15%	0,18%	0,18%
				$ P	$43.024	$55.452	$55.452	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$178.786	$265.787	$303.073	$303.073	$43.024	$55.452	$55.452	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$178.786	$265.787	$303.073	$303.073
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$33.534.500	19,39%		% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,13%	0,18%	0,18%	0,18%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,13%	0,18%	0,18%	0,18%
				$ P	$15.162	$30.324	$45.487	$45.487	$45.487	$45.487	$75.811	$75.811	$227.434	$303.245	$303.245	$303.245	$15.162	$30.324	$45.487	$45.487	$45.487	$45.487	$75.811	$75.811	$227.434	$303.245	$303.245	$303.245
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.817.528	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.151	$43.151	$43.151	$43.151	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.151	$43.151	$43.151	$43.151
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$21.074.640	12,18%		% P	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,11%	0,12%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,11%	0,12%
				$ P	$9.529	$19.057	$28.586	$38.115	$47.643	$47.643	$57.172	$76.229	$95.287	$142.930	$190.573	$200.102	$9.529	$19.057	$28.586	$38.115	$47.643	$47.643	$57.172	$76.229	$95.287	$142.930	$190.573	$200.102
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.706.732	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.168
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2.895.554	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
				$ P	$1.309	$2.618	$3.928	$5.237	$6.546	$6.546	$7.855	$10.474	$13.092	$19.638	$26.184	$27.493	$1.309	$2.618	$3.928	$5.237	$6.546	$6.546	$7.855	$10.474	$13.092	$19.638	$26.184	$27.493
				% E																								
TRANSPORTES	$57.662.552	33,34%		% P	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,17%	0,26%	0,29%	0,29%	0,04%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,17%	0,26%	0,29%	0,29%
				$ P	$63.899	$85.153	$87.850	$124.963	$124.963	$124.963	$130.357	$130.357	$290.290	$441.671	$497.340	$497.340	$63.899	$85.153	$87.850	$124.963	$124.963	$124.963	$130.357	$130.357	$290.290	$441.673	$497.340	$497.340
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS				% P																								
				$ P																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172.957.358	100,00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,10%**	**0,13%**	**0,15%**	**0,19%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,23%**	**0,24%**	**0,56%**	**0,77%**	**0,85%**	**0,90%**	**0,10%**	**0,13%**	**0,15%**	**0,19%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,23%**	**0,24%**	**0,56%**	**0,77%**	**0,85%**	**0,90%**
	VALOR	**$170.770**	**$230.453**	**$259.150**	**$331.958**	**$342.796**	**$342.796**	**$389.353**	**$411.028**	**$969.581**	**$1.329.964**	**$1.477.108**	**$1.565.114**	**$170.770**	**$230.453**	**$259.150**	**$331.958**	**$342.796**	**$342.796**	**$389.353**	**$411.028**	**$969.581**	**$1.329.964**	**$1.477.108**	**$1.565.114**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**18,71%**	**18,85%**	**19,00%**	**19,19%**	**19,38%**	**19,59%**	**19,81%**	**20,05%**	**20,61%**	**21,38%**	**22,23%**	**23,14%**	**23,24%**	**23,37%**	**23,52%**	**23,71%**	**23,91%**	**24,11%**	**24,33%**	**24,57%**	**25,13%**	**25,90%**	**26,75%**	**27,66%**
	VALOR	**$32.366.838**	**$32.597.291**	**$32.856.441**	**$33.188.399**	**$33.531.195**	**$33.873.991**	**$34.263.344**	**$34.674.372**	**$35.643.953**	**$36.973.917**	**$38.451.025**	**$40.016.139**	**$40.186.910**	**$40.417.362**	**$40.676.512**	**$41.008.471**	**$41.351.267**	**$41.694.063**	**$42.083.416**	**$42.494.444**	**$43.464.025**	**$44.793.988**	**$46.271.097**	**$47.836.211**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73.150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4.349.357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25.043.405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198.000.763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CUCUNUBO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matrícula No. : 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Revisó Firma
ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 25202117144 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segín código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES	$16.741.417	9,68%		% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
				$ P	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$113.542	$113.542	$113.542	$113.542	$75.694	$75.694	$75.694	$75.694	$75.694	$75.694	$75.694	$75.694	$227.083	$227.083	$227.083	$227.083
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$35.524.436	20,54%		% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,15%	0,18%	0,18%	0,05%	0,06%	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,21%	0,31%	0,35%	0,35%
				$ P	$43.024	$55.452	$55.452	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$178.786	$265.787	$303.073	$303.073	$86.047	$110.905	$110.905	$160.620	$160.620	$160.620	$160.620	$160.620	$357.571	$531.574	$606.147	$606.147
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$33.534.500	19,39%		% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,13%	0,18%	0,18%	0,18%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,09%	0,09%	0,26%	0,35%	0,35%	0,35%
				$ P	$15.162	$30.324	$45.487	$45.487	$45.487	$45.487	$75.811	$75.811	$227.434	$303.245	$303.245	$303.245	$30.324	$60.649	$90.973	$90.973	$90.973	$90.973	$151.622	$151.622	$454.867	$606.490	$606.490	$606.490
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.817.528	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.151	$43.151	$43.151	$43.151	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.303	$86.303	$86.303	$86.303
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$21.074.640	12,18%		% P	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,11%	0,12%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,07%	0,09%	0,11%	0,17%	0,22%	0,23%
				$ P	$8.529	$19.057	$28.586	$38.115	$47.643	$47.643	$57.172	$76.229	$95.287	$142.930	$190.573	$200.102	$19.057	$38.115	$57.172	$76.229	$95.287	$95.287	$114.344	$152.459	$190.573	$285.868	$381.146	$400.204
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.706.732	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.336
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2.895.554	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
				$ P	$1.309	$2.618	$3.928	$5.237	$6.546	$6.546	$7.855	$10.474	$13.092	$18.638	$26.184	$27.493	$2.618	$5.237	$7.855	$10.474	$13.092	$13.092	$15.710	$20.947	$26.184	$39.276	$52.368	$54.986
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$57.662.552	33,34%		% P	0,04%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,17%	0,26%	0,29%	0,29%	0,07%	0,10%	0,10%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,34%	0,51%	0,58%	0,58%
				$ P	$63.899	$83.153	$87.850	$124.963	$124.963	$124.963	$130.357	$130.357	$290.298	$441.071	$497.340	$497.340	$127.709	$170.306	$175.700	$249.926	$249.926	$249.926	$260.715	$260.715	$596.580	$883.342	$994.680	$994.680
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS				% P																								
				$ P																								
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172.957.358	100,00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,10%	0,13%	0,15%	0,19%	0,20%	0,20%	0,23%	0,24%	0,56%	0,77%	0,85%	0,90%	0,20%	0,27%	0,30%	0,38%	0,40%	0,40%	0,45%	0,48%	1,12%	1,54%	1,71%	1,81%
	VALOR	$170.778	$230.453	$259.158	$331.958	$342.796	$342.796	$389.353	$411.028	$969.581	$1.329.964	$1.477.108	$1.565.114	$341.541	$460.905	$518.300	$663.917	$685.592	$685.592	$778.706	$822.057	$1.939.161	$2.659.927	$2.954.217	$3.130.229
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27,76%	27,89%	28,04%	28,23%	28,43%	28,63%	28,85%	29,09%	29,65%	30,42%	31,27%	32,18%	32,38%	32,64%	32,94%	33,33%	33,72%	34,12%	34,57%	35,04%	36,17%	37,70%	39,41%	41,22%
	VALOR	$48.006.981	$48.237.434	$48.496.584	$48.828.542	$49.171.338	$49.514.134	$49.903.487	$50.314.516	$51.284.096	$52.614.060	$54.091.168	$55.656.283	$55.997.823	$56.458.729	$56.977.029	$57.640.945	$58.326.537	$59.012.130	$59.790.835	$60.612.892	$62.552.054	$65.211.981	$68.166.198	$71.296.426
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73.150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4.349.357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25.043.405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198.000.763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CALDERÓN
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matricula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matricula No. : 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Revisó Firma
ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. : 25202117144 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL.: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segín código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.569,00 (Segín contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses segín las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																									
EXPLANACIONES	$16.741.417	9,68%		% P	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%
				$ P	$98.403	$98.403	$98.403	$98.403	$98.403	$98.403	$98.403	$98.403	$295.208	$295.208	$295.208	$295.208	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$37.847	$113.542	$113.542	$113.542	$113.542
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$35.524.436	20,54%		% P	0,06%	0,08%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,27%	0,40%	0,46%	0,46%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,15%	0,18%	0,18%
				$ P	$111.861	$144.176	$144.176	$208.806	$208.806	$208.806	$208.806	$208.806	$464.843	$691.847	$787.991	$787.991	$43.024	$55.452	$55.452	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$80.310	$167.706	$265.787	$303.073	$303.073
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$33.534.500	19,39%		% P	0,02%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,11%	0,11%	0,34%	0,46%	0,46%	0,46%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,13%	0,18%	0,18%
				$ P	$39.422	$78.844	$118.266	$118.266	$118.266	$118.266	$197.109	$197.109	$591.328	$788.437	$788.437	$788.437	$15.162	$30.324	$45.487	$45.487	$45.487	$45.487	$75.811	$75.811	$227.434	$303.245	$303.245	$303.245
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.817.528	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112.193	$112.193	$112.193	$112.193	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.151	$43.151	$43.151	$43.151
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$21.074.640	12,18%		% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,14%	0,21%	0,29%	0,30%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,11%	0,12%
				$ P	$24.775	$49.549	$74.324	$99.098	$123.873	$123.873	$148.647	$198.196	$247.745	$371.618	$495.490	$520.265	$9.529	$19.057	$28.586	$38.115	$47.643	$47.643	$57.172	$76.229	$95.287	$142.930	$190.573	$200.102
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.706.732	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.637	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.168
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2.895.554	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
				$ P	$3.404	$6.808	$10.212	$13.616	$17.019	$20.423	$20.423	$27.231	$34.039	$51.058	$68.078	$71.482	$1.305	$2.610	$3.928	$5.237	$6.546	$6.546	$7.855	$10.474	$13.092	$19.638	$26.184	$27.493
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$57.662.552	33,34%		% P	0,10%	0,13%	0,13%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,45%	0,66%	0,75%	0,75%	0,04%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,17%	0,26%	0,29%	0,29%
				$ P	$110.210	$223.398	$228.410	$324.904	$324.904	$324.904	$338.929	$338.929	$775.554	$1.148.344	$1.293.084	$1.293.084	$63.899	$85.153	$87.858	$124.963	$124.963	$124.963	$130.357	$130.357	$298.290	$441.673	$497.340	$497.340
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS				% P																								
				$ P																								
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172.957.358	100,00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,26%	0,35%	0,39%	0,50%	0,52%	0,52%	0,59%	0,62%	1,46%	2,00%	2,22%	2,35%	0,10%	0,13%	0,15%	0,19%	0,20%	0,20%	0,23%	0,24%	0,56%	0,77%	0,85%	0,90%
	VALOR	$444.003	$599.177	$673.798	$863.092	$891.270	$891.270	$1.012.317	$1.068.674	$2.520.910	$3.457.905	$3.840.482	$4.069.297	$170.770	$230.453	$259.150	$331.958	$342.796	$342.796	$389.353	$411.028	$969.581	$1.329.964	$1.477.108	$1.565.114
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41,48%	41,83%	42,21%	42,71%	43,23%	43,74%	44,33%	44,95%	46,41%	48,40%	50,62%	52,98%	53,08%	53,21%	53,36%	53,55%	53,75%	53,95%	54,17%	54,41%	54,97%	55,74%	56,59%	57,50%
	VALOR	$71.740.429	$72.339.606	$73.013.396	$73.876.487	$74.767.757	$75.659.027	$76.671.344	$77.740.018	$80.260.928	$83.718.833	$87.559.315	$91.628.612	$91.799.383	$92.029.835	$92.288.985	$92.620.944	$92.963.740	$93.306.536	$93.695.889	$94.106.917	$95.076.498	$96.406.461	$97.883.570	$99.448.684
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73.150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4.349.357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25.043.405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198.000.763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO OLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CALCEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-20459 CND

Aprueba Firma
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matrícula No. : 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Revisó Firma
ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 25202117144 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL.:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses segùn contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.569,00 (Segùn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses segùn las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	
				$ Valor Ejecutado																					
				% Ejecutado																					
EXPLANACIONES	$16.741.417	9,68%		% P	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	100,00%
				$ P	$128.681	$128.681	$128.681	$128.681	$128.681	$128.681	$128.681	$128.681	$386.042	$386.042	$386.042	$386.042	$218.192	$218.192	$218.192	$218.192	$872.768	$872.768	$872.768	$872.768	
				$ E																					
				% E																					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$35.524.436	20,54%		% P	0,08%	0,11%	0,11%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,35%	0,52%	0,60%	0,60%	0,12%	0,17%	0,17%	0,26%	1,03%	1,03%	1,03%	1,34%	
				$ P	$146.208	$188.538	$188.538	$273.054	$273.054	$273.054	$273.054	$273.054	$607.872	$903.676	$1.030.450	$1.030.450	$213.258	$290.542	$290.542	$445.110	$1.780.441	$1.780.441	$1.780.441	$2.321.431	
				$ E																					
				% E																					
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$33.534.500	19,39%		% P	0,03%	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,15%	0,15%	0,45%	0,60%	0,60%	0,60%	0,05%	0,11%	0,16%	0,76%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	
				$ P	$91.352	$181.103	$154.655	$154.655	$154.655	$154.655	$257.758	$257.758	$773.275	$1.031.033	$1.031.033	$1.031.033	$94.281	$188.563	$282.844	$1.319.940	$1.885.628	$1.885.628	$1.885.628	$1.885.629	
				$ E																					
				% E																					
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.817.528	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$146.714	$146.714	$146.714	$146.714	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$536.644	$536.644	
				$ E																					
				% E																					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$21.074.640	12,18%		% P	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	0,11%	0,15%	0,19%	0,28%	0,37%	0,39%	0,03%	0,07%	0,10%	0,40%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	
				$ P	$32.397	$64.795	$97.192	$129.590	$161.987	$161.987	$194.385	$259.180	$323.974	$485.962	$647.949	$680.346	$59.251	$118.502	$177.753	$829.512	$1.185.017	$1.185.017	$1.185.017	$1.185.017	
				$ E																					
				% E																					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.706.732	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$262.371	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$479.844	
				$ E																					
				% E																					
OBRAS VARIAS	$2.895.554	1,67%		% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,12%	0,12%	0,12%	
				$ P	$4.451	$8.903	$13.354	$17.805	$22.256	$22.256	$26.708	$35.610	$44.513	$66.769	$89.025	$93.476	$8.141	$16.282	$24.422	$32.563	$122.112	$203.519	$203.519	$203.519	
				$ E																					
				% E																					
TRANSPORTES	$57.662.552	33,34%		% P	0,13%	0,17%	0,17%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,59%	0,87%	0,98%	0,98%	0,22%	0,30%	0,31%	0,55%	1,84%	1,84%	1,84%	2,31%	
				$ P	$112.208	$168.320	$298.681	$424.874	$424.874	$424.874	$443.215	$443.215	$1.014.185	$1.501.681	$1.690.956	$1.690.956	$383.450	$515.609	$532.380	$947.640	$3.186.790	$3.186.790	$3.186.790	$3.994.500	
				$ E																					
				% E																					
ITEM NO PREVISTOS				% P																					
				$ P																					
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172.957.358	100,00%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																									

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,34%	0,45%	0,51%	0,65%	0,67%	0,67%	0,77%	0,81%	1,91%	2,61%	2,98%	3,08%	0,56%	0,78%	0,88%	2,19%	5,22%	5,27%	5,58%	6,64%
	VALOR	$580.619	$783.539	$881.110	$1.128.658	$1.165.507	$1.165.507	$1.323.799	$1.397.497	$3.296.574	$4.521.876	$5.022.169	$5.321.389	$976.573	$1.347.689	$1.526.133	$3.792.957	$9.032.756	$9.114.163	$9.650.808	$11.479.351
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	57,83%	58,29%	58,80%	59,45%	60,12%	60,80%	61,56%	62,37%	64,28%	66,89%	69,79%	72,87%	73,44%	74,22%	75,10%	77,29%	82,51%	87,78%	93,36%	100,00%
	VALOR	$100.029.303	$100.812.842	$101.693.952	$102.822.610	$103.988.117	$105.153.624	$106.477.423	$107.874.920	$111.171.495	$115.693.371	$120.715.539	$126.036.928	$127.013.501	$128.361.190	$129.887.323	$133.680.280	$142.713.036	$151.827.199	$161.478.007	$172.957.358
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000	
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385.000	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73.150	
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4.349.357	
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306.000	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25.043.405	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198.000.763**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO CLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matricula No. : 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-20459 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matricula No. : 25202-20459 CND

Revisó Firma
ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. : 25202117144 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
