AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547 5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	105
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 215-21 PARC N° 5 C1-3 C105**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
630	LISTA DE CHEQUEO	20142-20143
631	ACTA DE PAGO DE OBRA	20144-20148
632	MEMORIA DE CALCULO OBRA	20149-20341

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 215-21 PARC N° 5 C1-3 C105

Firma		Firma	
Nombre:	OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	Nombre:	MANUEL HUMBERTO CORREDOR
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V04
05/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	NO
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20142

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI
CARGUE A SECOP II	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335

Firma

Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 01194-0290

Firma

Nombre: VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA BPIN 2021005500215
M.P. 25202195831 CND

Firma

OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500215
M.P. 25202-78801 CND

Firma Xamira Cheediak

Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

CONSORCIO HALCÓN

ACTA PAGO DE OBRA

No. 5

20194

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500215
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	5	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	31/07/2024 a 5/09/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS KD+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+480 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 30.157.618.889,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camelingenieria.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	239- 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	06 SET. 2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 13 junio 2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**													
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	26,34	$ 2.907.481,00	$ 76.583.050,00	26,34	$ 76.583.050,00	20,00	$ 58.149.620,00	6,34	$ 18.433.430,00	26,34	$ 76.583.050,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 76.583.050,00**		**$ 76.583.050,00**		**$ 58.149.620,00**		**$ 18.433.430,00**		**$ 76.583.050,00**	
2	**EXCAVACIONES**													
2.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	12.821,17	$ 53.067,00	$ 680.381.028,00	12.957,34	$ 687.607.039,00	12.901,60	$ 684.649.207,20	0,00	$ 0,00	12.901,60	$ 684.649.207,20	99,57%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	3.738,47	$ 40.581,00	$ 151.710.851,00	3.738,47	$ 151.710.851,00	2.358,92	$ 95.727.332,52	576,37	$ 23.389.670,97	2.935,29	$ 119.117.003,49	78,52%
2.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2,00 M INCLUYE CARGUE LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	M3	119,84	$ 80.432,00	$ 9.638.971,00	30,00	$ 2.412.960,00	30,00	$ 2.412.960,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.412.960,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	11.913,91	$ 8.287,00	$ 98.730.572,00	11.913,91	$ 98.730.572,00	11.888,64	$ 98.521.159,68	0,00	$ 0,00	11.888,64	$ 98.521.159,68	99,79%
	SUBTOTAL				**$ 940.461.422,00**		**$ 940.461.422,00**		**$ 881.310.659,40**		**$ 23.389.670,97**		**$ 904.700.330,37**	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS**													
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	28.713,43	$ 151.465,00	$ 4.349.079.675,00	28.713,43	$ 4.349.079.675,00	18.530,00	$ 2.806.646.450,00	4.360,00	$ 660.387.400,00	22.890,00	$ 3.467.033.850,00	79,72%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	24.633,36	$ 42.956,00	$ 1.058.150.612,00	50.293,34	$ 2.160.400.902,00	46.042,60	$ 1.977.805.925,60	3.496,60	$ 150.199.949,60	49.539,20	$ 2.128.005.875,20	98,50%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.783.182,90	$ 1.879,00	$ 5.229.600.669,00	2.196.567,53	$ 4.127.350.379,00	1.625.657,60	$ 3.054.610.630,40	366.051,81	$ 687.811.350,99	1.991.709,41	$ 3.742.421.981,39	90,67%
	SUBTOTAL				**$ 10.636.830.956,00**		**$ 10.636.830.956,00**		**$ 7.839.063.006,00**		**$ 1.498.398.700,59**		**$ 9.337.461.706,59**	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	12.645,25	$ 948.657,00	$ 11.996.004.929,00	12.645,25	$ 11.996.004.929,00	7.195,20	$ 6.825.776.846,40	2.160,00	$ 2.049.099.120,00	9.355,20	$ 8.874.875.966,40	73,98%
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	171.237,76	$ 4.631,00	$ 793.002.067,00	171.237,76	$ 793.002.067,00	97.435,00	$ 451.221.485,00	29.250,00	$ 135.456.750,00	126.685,00	$ 586.678.235,00	73,98%
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	739.747,10	$ 2.155,00	$ 1.594.155.001,00	739.747,10	$ 1.594.155.001,00	385.451,38	$ 830.647.723,90	136.001,28	$ 293.082.758,40	521.452,66	$ 1.123.730.482,30	70,49%
	SUBTOTAL				**$ 14.383.161.997,00**		**$ 14.383.161.997,00**		**$ 8.107.646.055,30**		**$ 2.477.638.628,40**		**$ 10.585.284.683,70**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0776 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

5	**SENALIZACION**													
5.1	LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	61.389,62	$ 4.953,00	$ 304.062.788,00	61.389,62	$ 304.062.788,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.2	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) A=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.241,33	$ 17.182,00	$ 55.692.532,00	3.241,33	$ 55.692.532,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8.878,00	$ 13.385,00	$ 118.832.030,00	8.878,00	$ 118.832.030,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	232,00	$ 368.541,00	$ 85.501.512,00	232,00	$ 85.501.512,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.5	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	117,00	$ 361.403,00	$ 42.284.151,00	117,00	$ 42.284.151,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 606.373.013,00**		**$ 606.373.013,00**		**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	
6	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**													
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	2.113,56	$ 87.925,00	$ 185.834.763,00	2.113,56	$ 185.834.763,00	931,65	$ 81.915.326,25	928,47	$ 81.635.724,75	1.860,12	$ 163.551.051,00	88,01%
6.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	79,23	$ 373.501,00	$ 29.592.484,00	79,23	$ 29.592.484,00	78,82	$ 29.439.348,82	0,41	$ 153.135,18	79,23	$ 29.592.484,00	100,00%
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	68,75	$ 675.916,00	$ 46.469.225,00	94,76	$ 64.049.800,00	57,85	$ 39.101.740,60	18,93	$ 12.795.089,88	76,78	$ 51.896.830,48	81,03%
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	75.288,32	$ 8.973,00	$ 675.562.095,00	89.606,83	$ 804.042.084,00	61.440,21	$ 551.303.004,33	13.660,98	$ 122.579.973,54	75.101,19	$ 673.882.977,87	83,81%
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.063,72	$ 1.137.025,00	$ 1.209.476.233,00	925,62	$ 1.052.450.695,00	651,47	$ 740.737.676,75	157,87	$ 179.502.136,75	809,34	$ 920.239.813,50	87,44%
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	480,62	$ 81.012,00	$ 38.935.987,00	615,97	$ 49.900.961,00	414,48	$ 33.577.853,76	103,91	$ 8.417.956,92	518,39	$ 41.995.810,68	84,16%
	SUBTOTAL				**$ 2.185.870.787,00**		**$ 2.185.870.787,00**		**$ 1.476.074.950,51**		**$ 405.084.017,02**		**$ 1.881.158.967,53**	
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
7.1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1.070,00	$ 220.942,00	$ 236.407.940,00	1.070,00	$ 236.407.940,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	120,00	$ 288.616,00	$ 34.633.920,00	120,00	$ 34.633.920,00	10,00	$ 2.886.160,00	35,00	$ 10.101.560,00	45,00	$ 12.987.720,00	37,50%
	SUBTOTAL				**$ 271.041.860,00**		**$ 271.041.860,00**		**$ 2.886.160,00**		**$ 10.101.560,00**		**$ 12.987.720,00**	
8	**URBANISMO**													
	PRELIMINARES													
8.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 M	M3	201,91	$ 18.617,00	$ 3.758.958,00	201,91	$ 3.758.958,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.758.958,00**		**$ 3.758.958,00**		**$ 0,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	605,74	$ 72.389,00	$ 43.848.913,00	605,74	$ 43.848.913,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
9.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	504,78	$ 124.750,00	$ 62.971.305,00	504,78	$ 62.971.305,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 106.820.218,00**		**$ 106.820.218,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO Nº	0775 DE 2022	PROYECTO Nº	2021005500215

10	ANDENES														
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	801,30	$ 131.102,00	$ 105.052.033,00	801,30	$ 105.052.033,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	56,09	$ 747.323,00	$ 41.917.347,00	56,09	$ 41.917.347,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.3	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU.	M2	713,04	$ 147.975,00	$ 105.512.094,00	713,04	$ 105.512.094,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.4	LOSETA A-40; 600X200X800 MM.	M2	160,26	$ 152.410,00	$ 24.425.227,00	160,26	$ 24.425.227,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO	UN	8,00	$ 127.230,00	$ 1.017.840,00	8,00	$ 1.017.840,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO	ML	12,00	$ 127.230,00	$ 1.526.760,00	12,00	$ 1.526.760,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.7	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 27" CLASE II NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	110,60	$ 682.741,00	$ 75.511.155,00	110,60	$ 75.511.155,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 354.962.456,00**		**$ 354.962.456,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	MOBILIARIO														
11.1	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UN	11,00	$ 1.101.402,00	$ 12.115.422,00	11,00	$ 12.115.422,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.2	BANCA EN CONCRETRO SIN ESPALDAR TIPO M31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 720.309,00	$ 11.524.944,00	16,00	$ 11.524.944,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.3	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 150W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO 18.000 LUMENS 3000K/4000K/5000K/5700K,CON FOTO CELDA COMPLETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 2.639.429,00	$ 47.509.722,00	18,00	$ 47.509.722,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.4	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,34	$ 991.867,00	$ 2.320.969,00	2,34	$ 2.320.969,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 73.471.057,00**		**$ 73.471.057,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**	
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.1			0,00	-		0,00		-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P.2			0,00	-		0,00		-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P.3			0,00	-		0,00		-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS								**$ 0,00**		$ -		$ -	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 22.625.447.155,73		$ 22.625.447.155,73		$ 14.019.183.550,54		$ 3.384.004.585,48		$ 17.403.188.136,02	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 6.108.870.732,05		$ 6.108.870.732,05		$ 3.785.179.558,65		$ 913.681.238,08		$ 4.698.860.796,73	
	IMPREVISTOS (0%)				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ -		$ -	
	UTILIDAD (4%)				$ 905.017.886,23		$ 905.017.886,23		$ 560.767.342,02		$ 135.360.183,42		$ 696.127.525,44	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 7.013.888.618,27		$ 7.013.888.618,27		$ 4.345.946.900,67		$ 1.049.041.421,50		$ 5.394.988.322,17	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 29.639.335.774,00		$ 29.639.335.774,00		$ 18.365.130.451,21		$ 4.433.046.006,98		$ 22.798.176.458,19	
12	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 317.314.146,00	$ 317.314.146,00	1,00	$ 317.314.146,00	0,80	$ 253.851.316,80	0,11	$ 34.904.556,06	0,91	$ 288.755.872,86	91,00%
13	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 200.968.969,00	$ 200.968.969,00	1,00	$ 200.968.969,00	0,80	$ 160.775.175,20	0,11	$ 22.106.586,59	0,91	$ 182.881.761,79	91,00%
	SUBTOTAL				**$ 518.283.115,00**		**$ 518.283.115,00**		**$ 414.626.492,00**		**$ 57.011.142,65**		**$ 471.637.634,65**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 30.157.618.889,00**		**$ 30.157.618.889,00**		**$ 18.779.756.943,21**		**$ 4.490.057.149,63**		**$ 23.269.814.092,84**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	30.157.618.889,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	$	30.157.618.889,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	30.157.618.889,00
ANTICIPO	$	7.660.035.197,81
PRESENTE ACTA	$	4.490.057.149,63
	$	-
ACUMULADO	$	23.269.814.092,84

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	23.269.814.092,84	77,16%
POR EJECUTAR	$	6.887.804.796,16	22,84%
POR AMORTIZAR	$	2.889.976.934,23	37,73%
TOTALES	$	30.157.618.889,00	100,00%

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
RELACIÓN DE ACTAS			AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$	5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85
ACTA 2	$	4.815.933.409,56	$ 1.223.247.086,03	$ 3.592.686.323,53
ACTA 3	$	4.444.273.928,05	$ 1.128.845.577,72	$ 3.315.428.350,33
ACTA 4	$	4.421.816.769,34	$ 1.123.141.459,41	$ 3.298.675.309,93
PRESENTE ACTA	$	4.490.057.149,63	$ 1.140.474.516,01	$ 3.349.582.633,62
TOTALES	$	23.269.814.092,84	$ 4.770.058.263,58	$ 17.359.281.313,26

RELACION DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500215 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0600.119-00-AD de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 7.660.035.197,81			$ 7.660.035.197,81
1	PAGO PARCIAL N° 1	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	$ 11.462.943.893,66
2	PAGO PARCIAL N° 2	$ 4.815.933.409,56	$ 1.223.247.086,03	$ 3.592.686.323,53	$ 15.055.630.217,19
3	PAGO PARCIAL N° 3	$ 4.444.273.928,05	$ 1.128.845.577,72	$ 3.315.428.350,33	$ 18.371.058.567,52
4	PAGO PARCIAL N° 4	$ 4.421.816.769,34	$ 1.123.141.459,41	$ 3.298.675.309,93	$ 21.669.733.877,44
	PRESENTE ACTA	$ 4.490.057.149,63	$ 1.140.474.516,01	$ 3.349.582.633,62	$ 25.019.316.511,07
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 6.887.804.796,16			$ 30.157.618.889,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE)

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8, cumplio con la cláusula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 0775 de 2022 representado legalmente por el Consorcio HALCON, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 06 SET. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO GNECCO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA CANCHEROS
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

Nota: En la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

20 148

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIA DE CALCULO
OBRA

20149

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	PRELIMINARES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	Desde	hasta	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Conformación de la banca existente	K20+000	K22+000	2.000,00	2,00	2,00
Conformación de la banca existente	K22+000	K24+000	2.000,00	2,00	2,00
Conformación de la banca existente	K24+000	K26+000	2.000,00	2,00	2,00
Conformación de la banca existente	K26+000	K26+340	340,00	0,34	0,34
PASAN:				SUBTOTAL	6,34
				TOTAL	6,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20150

DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD KM	TOTAL KM
K 20+000	K 22+000	2000	2,00	2,00
K 22+000	K 24+000	2000	2,00	2,00
K 24+000	K 26+000	2000	2,00	2,00
K 26+000	K 26+340	340	0,34	0,34
	TOTAL			6,34

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

20151

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**EXCAVACIONES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ABSCISA	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**TOTAL**
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 4X2 No 42 (media)	K20+260	6,10	3,65	5,30	118,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 49	K22+145	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 50	K22+273	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 51	K22+485	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 52	K22+645	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 53	K23+268	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 54	K22+365	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 55	K23+790	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 56	K24+130	3,10	1,55	10,60	50,93
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 57	K24+360	3,10	1,55	10,60	50,93
PASAN:				**SUBTOTAL**	576,37
				TOTAL	576,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20152

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
K 20+260	**MEDIO CUERPO - BOX COULVERT DE 4X2 No 42**				
	6,10	3,65	5,3	1	118,00
K 22+145	**BOX COULVERT DE 1X1 No 49**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 22+273	**BOX COULVERT DE 1X1 No 50**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 22+485	**BOX COULVERT DE 1X1 No 51**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 22+645	**BOX COULVERT DE 1X1 No 52**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 23+268	**BOX COULVERT DE 4x2.5 No 53**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 23+365	**BOX COULVERT DE 1X1 No 54**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 23+790	**BOX COULVERT DE 1X1 No 55**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 24+130	**BOX COULVERT DE 1X1 No 56**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 24+360	**BOX COULVERT DE 1X1 No 57**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
	TOTAL				576,37

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K17+000	K 18+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 18+000	K 19+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 19+000	K 20+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 20+000	K 21+000	1000,00	1,09	1090,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4360,00
				TOTAL	4360,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20154

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 17+000	K 17+020	20	1,09	21,80
K 17+020	K 17+040	20	1,09	21,80
K 17+040	K 17+060	20	1,09	21,80
K 17+060	K 17+080	20	1,09	21,80
K 17+080	K 17+100	20	1,09	21,80
K 17+100	K 17+120	20	1,09	21,80
K 17+120	K 17+140	20	1,09	21,80
K 17+140	K 17+160	20	1,09	21,80
K 17+160	K 17+180	20	1,09	21,80
K 17+180	K 17+200	20	1,09	21,80
K 17+200	K 17+220	20	1,09	21,80
K 17+220	K 17+240	20	1,09	21,80
K 17+240	K 17+260	20	1,09	21,80
K 17+260	K 17+280	20	1,09	21,80
K 17+280	K 17+300	20	1,09	21,80
K 17+300	K 17+320	20	1,09	21,80
K 17+320	K 17+340	20	1,09	21,80
K 17+340	K 17+360	20	1,09	21,80
K 17+360	K 17+380	20	1,09	21,80
K 17+380	K 17+400	20	1,09	21,80
K 17+400	K 17+420	20	1,09	21,80
K 17+420	K 17+440	20	1,09	21,80
K 17+440	K 17+460	20	1,09	21,80
K 17+460	K 17+480	20	1,09	21,80
K 17+480	K 17+500	20	1,09	21,80
K 17+500	K 17+520	20	1,09	21,80
K 17+520	K 17+540	20	1,09	21,80
K 17+540	K 17+560	20	1,09	21,80
K 17+560	K 17+580	20	1,09	21,80
K 17+580	K 17+600	20	1,09	21,80
K 17+600	K 17+620	20	1,09	21,80
K 17+620	K 17+640	20	1,09	21,80
K 17+640	K 17+660	20	1,09	21,80
K 17+660	K 17+680	20	1,09	21,80
K 17+680	K 17+700	20	1,09	21,80
K 17+700	K 17+720	20	1,09	21,80
K 17+720	K 17+740	20	1,09	21,80
K 17+740	K 17+760	20	1,09	21,80
K 17+760	K 17+780	20	1,09	21,80
K 17+780	K 17+800	20	1,09	21,80
K 17+800	K 17+820	20	1,09	21,80
K 17+820	K 17+840	20	1,09	21,80
K 17+840	K 17+860	20	1,09	21,80
K 17+860	K 17+880	20	1,09	21,80
K 17+880	K 17+900	20	1,09	21,80
K 17+900	K 17+920	20	1,09	21,80
K 17+920	K 17+940	20	1,09	21,80
K 17+940	K 17+960	20	1,09	21,80
K 17+960	K 17+980	20	1,09	21,80
K 17+980	K 18+000	20	1,09	21,80
K 18+000	K 18+020	20	1,09	21,80
K 18+020	K 18+040	20	1,09	21,80
K 18+040	K 18+060	20	1,09	21,80
K 18+060	K 18+080	20	1,09	21,80
K 18+080	K 18+100	20	1,09	21,80

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 18+100	K 18+120	20	1,09	21,80
K 18+120	K 18+140	20	1,09	21,80
K 18+140	K 18+160	20	1,09	21,80
K 18+160	K 18+180	20	1,09	21,80
K 18+180	K 18+200	20	1,09	21,80
K 18+200	K 18+220	20	1,09	21,80
K 18+220	K 18+240	20	1,09	21,80
K 18+240	K 18+260	20	1,09	21,80
K 18+260	K 18+280	20	1,09	21,80
K 18+280	K 18+300	20	1,09	21,80
K 18+300	K 18+320	20	1,09	21,80
K 18+320	K 18+340	20	1,09	21,80
K 18+340	K 18+360	20	1,09	21,80
K 18+360	K 18+380	20	1,09	21,80
K 18+380	K 18+400	20	1,09	21,80
K 18+400	K 18+420	20	1,09	21,80
K 18+420	K 18+440	20	1,09	21,80
K 18+440	K 18+460	20	1,09	21,80
K 18+460	K 18+480	20	1,09	21,80
K 18+480	K 18+500	20	1,09	21,80
K 18+500	K 18+520	20	1,09	21,80
K 18+520	K 18+540	20	1,09	21,80
K 18+540	K 18+560	20	1,09	21,80
K 18+560	K 18+580	20	1,09	21,80
K 18+580	K 18+600	20	1,09	21,80
K 18+600	K 18+620	20	1,09	21,80
K 18+620	K 18+640	20	1,09	21,80
K 18+640	K 18+660	20	1,09	21,80
K 18+660	K 18+680	20	1,09	21,80
K 18+680	K 18+700	20	1,09	21,80
K 18+700	K 18+720	20	1,09	21,80
K 18+720	K 18+740	20	1,09	21,80
K 18+740	K 18+760	20	1,09	21,80
K 18+760	K 18+780	20	1,09	21,80
K 18+780	K 18+800	20	1,09	21,80
K 18+800	K 18+820	20	1,09	21,80
K 18+820	K 18+840	20	1,09	21,80
K 18+840	K 18+860	20	1,09	21,80
K 18+860	K 18+880	20	1,09	21,80
K 18+880	K 18+900	20	1,09	21,80
K 18+900	K 18+920	20	1,09	21,80
K 18+920	K 18+940	20	1,09	21,80
K 18+940	K 18+960	20	1,09	21,80
K 18+960	K 18+980	20	1,09	21,80
K 18+980	K 19+000	20	1,09	21,80
K 19+000	K 19+020	20	1,09	21,80
K 19+020	K 19+040	20	1,09	21,80
K 19+040	K 19+060	20	1,09	21,80
K 19+060	K 19+080	20	1,09	21,80
K 19+080	K 19+100	20	1,09	21,80
K 19+100	K 19+120	20	1,09	21,80
K 19+120	K 19+140	20	1,09	21,80
K 19+140	K 19+160	20	1,09	21,80
K 19+160	K 19+180	20	1,09	21,80
K 19+180	K 19+200	20	1,09	21,80
K 19+200	K 19+220	20	1,09	21,80
K 19+220	K 19+240	20	1,09	21,80
K 19+240	K 19+260	20	1,09	21,80

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 19+260	K 19+280	20	1,09	21,80
K 19+280	K 19+300	20	1,09	21,80
K 19+300	K 19+320	20	1,09	21,80
K 19+320	K 19+340	20	1,09	21,80
K 19+340	K 19+360	20	1,09	21,80
K 19+360	K 19+380	20	1,09	21,80
K 19+380	K 19+400	20	1,09	21,80
K 19+400	K 19+420	20	1,09	21,80
K 19+420	K 19+440	20	1,09	21,80
K 19+440	K 19+460	20	1,09	21,80
K 19+460	K 19+480	20	1,09	21,80
K 19+480	K 19+500	20	1,09	21,80
K 19+500	K 19+520	20	1,09	21,80
K 19+520	K 19+540	20	1,09	21,80
K 19+540	K 19+560	20	1,09	21,80
K 19+560	K 19+580	20	1,09	21,80
K 19+580	K 19+600	20	1,09	21,80
K 19+600	K 19+620	20	1,09	21,80
K 19+620	K 19+640	20	1,09	21,80
K 19+640	K 19+660	20	1,09	21,80
K 19+660	K 19+680	20	1,09	21,80
K 19+680	K 19+700	20	1,09	21,80
K 19+700	K 19+720	20	1,09	21,80
K 19+720	K 19+740	20	1,09	21,80
K 19+740	K 19+760	20	1,09	21,80
K 19+760	K 19+780	20	1,09	21,80
K 19+780	K 19+800	20	1,09	21,80
K 19+800	K 19+820	20	1,09	21,80
K 19+820	K 19+840	20	1,09	21,80
K 19+840	K 19+860	20	1,09	21,80
K 19+860	K 19+880	20	1,09	21,80
K 19+880	K 19+900	20	1,09	21,80
K 19+900	K 19+920	20	1,09	21,80
K 19+920	K 19+940	20	1,09	21,80
K 19+940	K 19+960	20	1,09	21,80
K 19+960	K 19+980	20	1,09	21,80
K 19+980	K 20+000	20	1,09	21,80
K 20+000	K 20+020	20	1,09	21,80
K 20+020	K 20+040	20	1,09	21,80
K 20+040	K 20+060	20	1,09	21,80
K 20+060	K 20+080	20	1,09	21,80
K 20+080	K 20+100	20	1,09	21,80
K 20+100	K 20+120	20	1,09	21,80
K 20+120	K 20+140	20	1,09	21,80
K 20+140	K 20+160	20	1,09	21,80
K 20+160	K 20+180	20	1,09	21,80
K 20+180	K 20+200	20	1,09	21,80
K 20+200	K 20+220	20	1,09	21,80
K 20+220	K 20+240	20	1,09	21,80
K 20+240	K 20+260	20	1,09	21,80
K 20+260	K 20+280	20	1,09	21,80
K 20+280	K 20+300	20	1,09	21,80
K 20+300	K 20+320	20	1,09	21,80
K 20+320	K 20+340	20	1,09	21,80
K 20+340	K 20+360	20	1,09	21,80
K 20+360	K 20+380	20	1,09	21,80
K 20+380	K 20+400	20	1,09	21,80
K 20+400	K 20+420	20	1,09	21,80

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 20+420	K 20+440	20	1,09	21,80
K 20+440	K 20+460	20	1,09	21,80
K 20+460	K 20+480	20	1,09	21,80
K 20+480	K 20+500	20	1,09	21,80
K 20+500	K 20+520	20	1,09	21,80
K 20+520	K 20+540	20	1,09	21,80
K 20+540	K 20+560	20	1,09	21,80
K 20+560	K 20+580	20	1,09	21,80
K 20+580	K 20+600	20	1,09	21,80
K 20+600	K 20+620	20	1,09	21,80
K 20+620	K 20+640	20	1,09	21,80
K 20+640	K 20+660	20	1,09	21,80
K 20+660	K 20+680	20	1,09	21,80
K 20+680	K 20+700	20	1,09	21,80
K 20+700	K 20+720	20	1,09	21,80
K 20+720	K 20+740	20	1,09	21,80
K 20+740	K 20+760	20	1,09	21,80
K 20+760	K 20+780	20	1,09	21,80
K 20+780	K 20+800	20	1,09	21,80
K 20+800	K 20+820	20	1,09	21,80
K 20+820	K 20+840	20	1,09	21,80
K 20+840	K 20+860	20	1,09	21,80
K 20+860	K 20+880	20	1,09	21,80
K 20+880	K 20+900	20	1,09	21,80
K 20+900	K 20+920	20	1,09	21,80
K 20+920	K 20+940	20	1,09	21,80
K 20+940	K 20+960	20	1,09	21,80
K 20+960	K 20+980	20	1,09	21,80
K 20+980	K 21+000	20	1,09	21,80
	TOTAL			4360,00

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

20158

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada para las actividades de **BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS,** proviene en una dosificación del 90% del **Río Guayuriba,** específicamente de la **Mina Las Mercedes,** perteneciente a la planta de agregados procesados de **Murcia Construcciones S.A.S.,** localizada en el municipio de Villavicencio. Esta fuente resulta ser más cercana que la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría y entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.** La fuente inicial fue la mina de **Agremet** del Río Guayuriba, situada a 79,60 km del centroide, mientras que la fuente actual y certificada en este documento se encuentra a **46 km** al inicio del proyecto en el punto **abs k0+00.**

La dosificación correspondiente al 10% restante proviene del **Río Guacavia,** específicamente de **La Cabaña,** localizada en el municipio de Cumaral, la cual se encuentra ubicada a 17,60 km del punto **abs k1+900,** de la vía en intervención sentido vía nacional 65 a Veracruz.


Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 2 Folio (Mapas fuente).


CONSORCIO INTER AIM

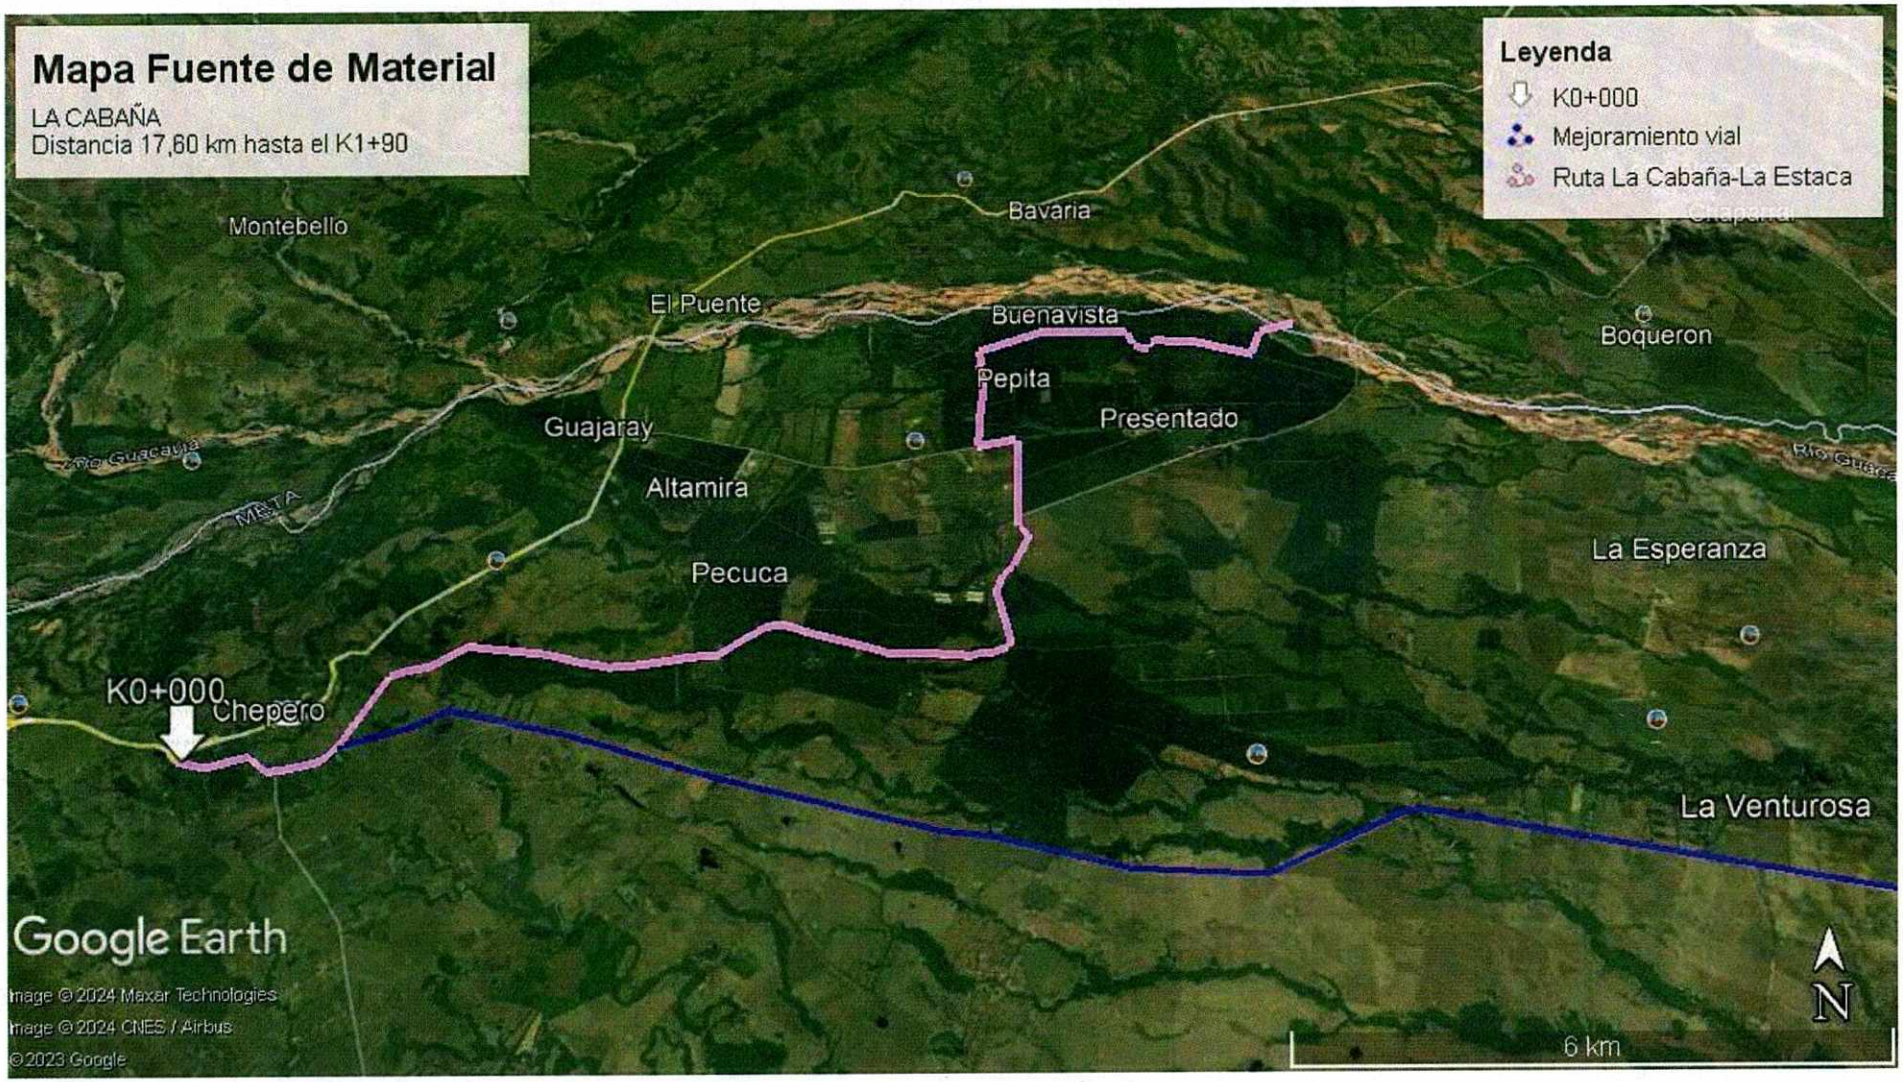

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

20160

CONSORCIO INTER AIM

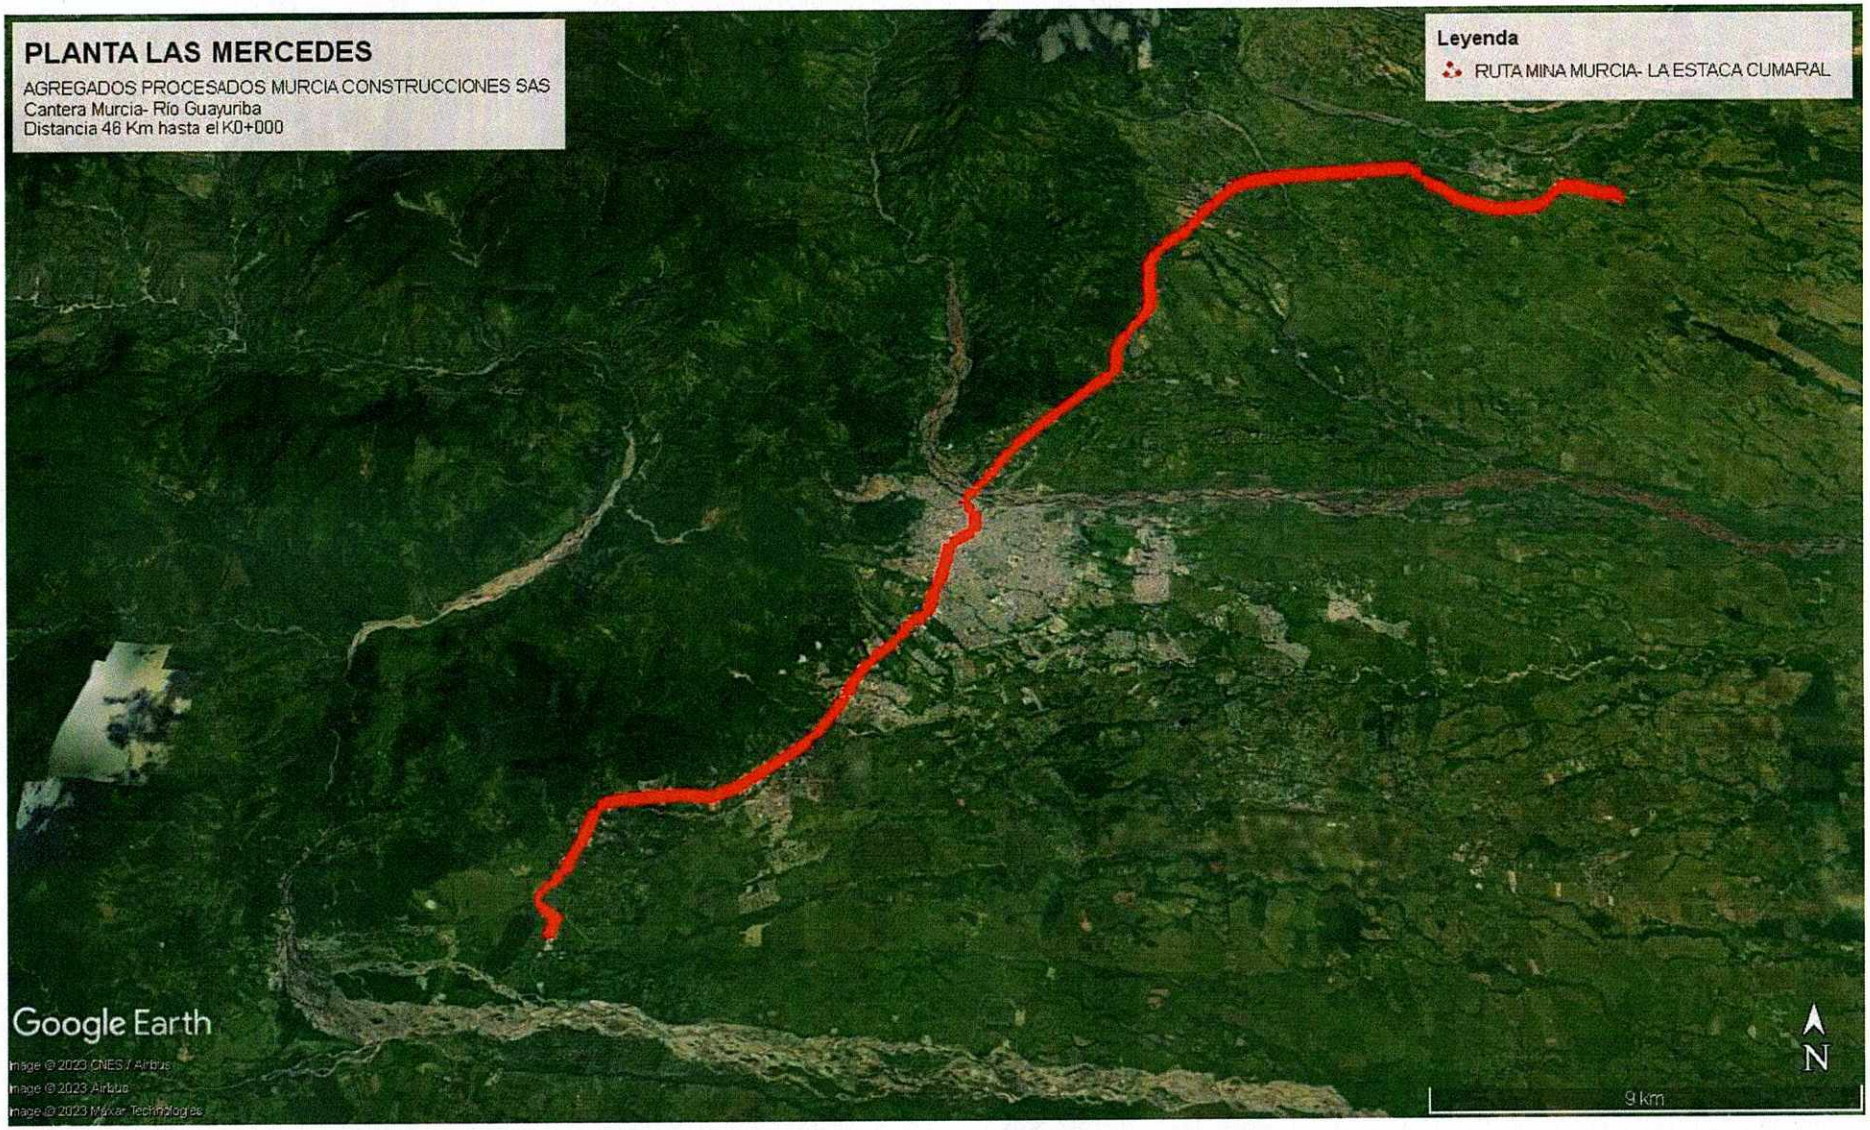

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

2016

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+420	K18+440	20,00	1,67	33,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+440	K18+460	20,00	1,79	35,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+460	K18+480	20,00	1,87	37,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+480	K18+500	20,00	1,13	22,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+500	K18+520	20,00	1,69	33,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+520	K18+540	20,00	1,37	27,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+540	K18+560	20,00	1,57	31,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+560	K18+580	20,00	1,40	28,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+580	K18+600	20,00	1,42	28,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+600	K18+620	20,00	1,17	23,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+620	K18+640	20,00	1,35	27,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+640	K18+660	20,00	1,45	29,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+660	K18+680	20,00	1,46	29,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	386,80
				TOTAL	386,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+680	K18+700	20,00	0,97	19,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+700	K18+720	20,00	0,93	18,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+720	K18+740	20,00	0,80	16,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+740	K18+760	20,00	1,02	20,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+760	K18+780	20,00	1,05	21,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+780	K18+800	20,00	1,46	29,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+800	K18+820	20,00	1,17	23,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+820	K18+840	20,00	1,41	28,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+840	K18+860	20,00	1,06	21,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+860	K18+880	20,00	3,07	61,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+880	K18+900	20,00	2,82	56,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+900	K18+920	20,00	1,98	39,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+920	K18+940	20,00	1,36	27,20
PASAN: 386,80				SUBTOTAL	382,00
				TOTAL	768,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+940	K18+960	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+960	K18+980	20,00	0,83	16,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K18+980	K19+000	20,00	1,47	29,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+000	K19+020	20,00	1,47	29,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+020	K19+040	20,00	1,26	25,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+040	K19+060	20,00	1,36	27,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+060	K19+080	20,00	1,13	22,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+080	K19+100	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+100	K19+120	20,00	0,11	2,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+120	K19+140	20,00	0,07	1,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+140	K19+160	20,00	0,09	1,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+160	K19+180	20,00	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+180	K19+200	20,00	0,10	2,00
PASAN: 768,80				SUBTOTAL	179,00
				TOTAL	947,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+200	K19+220	20,00	0,58	11,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+220	K19+240	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+240	K19+260	20,00	0,84	16,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+260	K19+280	20,00	0,72	14,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+280	K19+300	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+300	K19+320	20,00	0,13	2,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+320	K19+340	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+340	K19+360	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+360	K19+380	20,00	0,47	9,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+380	K19+400	20,00	0,16	3,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+400	K19+420	20,00	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+420	K19+440	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+440	K19+460	20,00	0,21	4,20
PASAN: **947,80**				**SUBTOTAL**	91,80
				TOTAL	1.039,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20165

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+460	K19+480	20,00	0,10	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+480	K19+500	20,00	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+500	K19+520	20,00	0,07	1,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+520	K19+540	20,00	0,15	3,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+540	K19+560	20,00	0,61	12,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+560	K19+580	20,00	0,23	4,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+580	K19+600	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+600	K19+620	20,00	0,78	15,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+620	K19+640	20,00	1,20	24,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+640	K19+660	20,00	0,54	10,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+660	K19+680	20,00	0,35	7,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+680	K19+700	20,00	0,11	2,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K19+700	K19+720	20,00	0,22	4,40
PASAN: 1.039,60				**SUBTOTAL**	91,80
				TOTAL	1.131,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+720	K 19+740	20,00	0,40	8,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+740	K 19+760	20,00	0,84	16,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+760	K 19+780	20,00	1,05	21,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+780	K 19+800	20,00	1,00	20,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+800	K 19+820	20,00	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+820	K 19+840	20,00	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+840	K 19+860	20,00	0,80	16,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+860	K 19+880	20,00	1,07	21,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+880	K 19+900	20,00	1,66	33,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+900	K 19+920	20,00	1,50	30,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+920	K 19+940	20,00	0,76	15,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+940	K 19+960	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+960	K 19+980	20,00	0,46	9,20
PASAN: 1.131,40				**SUBTOTAL**	208,80
				TOTAL	1.340,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20167

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 19+980	K 20+000	20,00	0,27	5,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+000	K 20+020	20,00	0,29	5,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+020	K 20+040	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+040	K 20+060	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+060	K 20+080	20,00	0,95	19,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+080	K 20+100	20,00	0,91	18,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+100	K 20+120	20,00	0,46	9,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+120	K 20+140	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+140	K 20+160	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+160	K 20+180	20,00	1,32	26,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+180	K 20+200	20,00	1,11	22,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+200	K 20+220	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+220	K 20+240	20,00	0,08	1,60
PASAN: 1.340,20				SUBTOTAL	151,40
				TOTAL	1.491,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+240	K 20+260	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+260	K 20+280	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+280	K 20+300	20,00	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+300	K 20+320	20,00	0,95	19,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+320	K 20+340	20,00	1,19	23,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+340	K 20+360	20,00	0,77	15,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+360	K 20+380	20,00	0,72	14,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+380	K 20+400	20,00	0,54	10,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+400	K 20+420	20,00	0,13	2,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+420	K 20+440	20,00	0,10	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+440	K 20+460	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+460	K 20+480	20,00	0,59	11,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+480	K 20+500	20,00	0,12	2,40
PASAN: 1.491,60				SUBTOTAL	116,20
				TOTAL	1.607,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+500	K 20+520	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+520	K 20+540	20,00	0,80	16,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+540	K 20+560	20,00	0,73	14,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+560	K 20+580	20,00	0,88	17,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+580	K 20+600	20,00	0,81	16,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+600	K 20+620	20,00	1,88	37,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+620	K 20+640	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+640	K 20+660	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+660	K 20+680	20,00	0,17	3,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+680	K 20+700	20,00	0,16	3,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+700	K 20+720	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+720	K 20+740	20,00	0,04	0,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+740	K 20+760	20,00	0,30	6,00
PASAN: **1.607,80**				**SUBTOTAL**	125,40
				TOTAL	1.733,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

OK

20130

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+760	K 20+780	20,00	0,48	9,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+780	K 20+800	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+800	K 20+820	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+820	K 20+840	20,00	0,04	0,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+840	K 20+860	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+860	K 20+880	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+880	K 20+900	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+900	K 20+920	20,00	0,06	1,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+920	K 20+940	20,00	0,36	7,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+940	K 20+960	20,00	0,77	15,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+960	K 20+980	20,00	0,13	2,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 20+980	K 21+000	20,00	0,29	5,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+000	K 21+020	20,00	1,24	24,80
PASAN: 1.733,20				**SUBTOTAL**	81,80
				TOTAL	1.815,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20171

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+020	K 21+040	20,00	0,29	5,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+040	K 21+060	20,00	2,78	55,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+060	K 21+080	20,00	0,35	7,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+080	K 21+100	20,00	0,57	11,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+100	K 21+120	20,00	0,66	13,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+120	K 21+140	20,00	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+140	K 21+160	20,00	0,43	8,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+160	K 21+180	20,00	0,38	7,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+180	K 21+200	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+200	K 21+220	20,00	0,11	2,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+220	K 21+240	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+240	K 21+260	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+260	K 21+280	20,00	0,00	0,00
PASAN: 1.815,00				**SUBTOTAL**	120,00
				TOTAL	1.935,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON FAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+280	K 21+300	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+300	K 21+320	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+320	K 21+340	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+340	K 21+360	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+360	K 21+380	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+380	K 21+400	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+400	K 21+420	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+420	K 21+440	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+440	K 21+460	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+460	K 21+480	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+480	K 21+500	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+500	K 21+520	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+520	K 21+540	20,00	0,01	0,20
PASAN: 1935,00				**SUBTOTAL**	10,20
				TOTAL	1.945,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+540	K 21+560	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+560	K 21+580	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+580	K 21+600	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+600	K 21+620	20,00	0,06	1,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+620	K 21+640	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+640	K 21+660	20,00	0,54	10,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+660	K 21+680	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+680	K 21+700	20,00	0,42	8,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+700	K 21+720	20,00	0,48	9,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+720	K 21+740	20,00	0,81	16,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+740	K 21+760	20,00	0,87	17,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+760	K 21+780	20,00	0,38	7,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+780	K 21+800	20,00	0,99	19,80
PASAN: 1.945,20				**SUBTOTAL**	114,40
				TOTAL	2.059,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+800	K 21+820	20,00	0,75	15,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+820	K 21+840	20,00	0,74	14,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+840	K 21+860	20,00	0,51	10,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+860	K 21+880	20,00	0,12	2,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+880	K 21+900	20,00	0,49	9,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+900	K 21+920	20,00	0,65	13,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+920	K 21+940	20,00	0,20	4,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+940	K 21+960	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+960	K 21+980	20,00	0,56	11,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 21+980	K 22+000	20,00	0,50	10,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+000	K 22+020	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+020	K 22+040	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+040	K 22+060	20,00	0,00	0,00
PASAN: **2.059,60**				**SUBTOTAL**	96,40
				TOTAL	2.156,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+060	K 22+080	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+080	K 22+100	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+100	K 22+120	20,00	0,13	2,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+120	K 22+140	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+140	K 22+160	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+160	K 22+180	20,00	0,54	10,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+180	K 22+200	20,00	0,70	14,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+200	K 22+220	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+220	K 22+240	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+240	K 22+260	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+260	K 22+280	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+280	K 22+300	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+300	K 22+320	20,00	0,04	0,80
PASAN: **2.156,00**				**SUBTOTAL**	36,60
				TOTAL	2.192,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+320	K 22+340	20,00	0,07	1,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+340	K 22+360	20,00	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+360	K 22+380	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+380	K 22+400	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+400	K 22+420	20,00	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+420	K 22+440	20,00	0,27	5,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+440	K 22+460	20,00	0,25	5,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+460	K 22+480	20,00	0,43	8,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+480	K 22+500	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+500	K 22+520	20,00	0,78	15,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+520	K 22+540	20,00	0,54	10,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+540	K 22+560	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+560	K 22+580	20,00	0,47	9,40
PASAN: 2.192,60				**SUBTOTAL**	86,80
				TOTAL	2.279,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+580	K 22+600	20,00	0,64	12,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+600	K 22+620	20,00	0,36	7,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+620	K 22+640	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+640	K 22+660	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+660	K 22+680	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+680	K 22+700	20,00	0,20	4,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+700	K 22+720	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+720	K 22+740	20,00	1,43	28,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+740	K 22+760	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+760	K 22+780	20,00	0,02	0,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+780	K 22+800	20,00	0,39	7,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+800	K 22+820	20,00	0,21	4,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+820	K 22+840	20,00	0,23	4,60
PASAN: **2.279,40**				**SUBTOTAL**	81,40
				TOTAL	2.360,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20128

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+840	K 22+860	20,00	0,10	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+860	K 22+880	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+880	K 22+900	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+900	K 22+920	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+920	K 22+940	20,00	0,17	3,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+940	K 22+960	20,00	0,23	4,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+960	K 22+980	20,00	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 22+980	K 23+000	20,00	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+000	K 23+020	20,00	0,16	3,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+020	K 23+040	20,00	0,32	6,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+040	K 23+060	20,00	0,16	3,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+060	K 23+080	20,00	0,15	3,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+080	K 23+100	20,00	0,11	2,20
PASAN: 2.360,80				**SUBTOTAL**	39,60
				TOTAL	2.400,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20129

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+100	K 23+120	20,00	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+120	K 23+140	20,00	0,04	0,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+140	K 23+160	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+160	K 23+180	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+180	K 23+200	20,00	0,04	0,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+200	K 23+220	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+220	K 23+240	20,00	0,10	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+240	K 23+260	20,00	0,64	12,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+260	K 23+280	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+280	K 23+300	20,00	0,09	1,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+300	K 23+320	20,00	0,09	1,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+320	K 23+340	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+340	K 23+360	20,00	0,05	1,00
PASAN: **2.400,40**				**SUBTOTAL**	30,60
				TOTAL	2.431,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20160

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+360	K 23+380	20,00	0,04	0,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+380	K 23+400	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+400	K 23+420	20,00	0,73	14,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+420	K 23+440	20,00	1,22	24,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+440	K 23+460	20,00	1,23	24,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+460	K 23+480	20,00	1,00	20,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+480	K 23+500	20,00	1,38	27,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+500	K 23+520	20,00	1,18	23,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+520	K 23+540	20,00	0,63	12,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+540	K 23+560	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+560	K 23+580	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+580	K 23+600	20,00	0,12	2,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+600	K 23+620	20,00	0,08	1,60
PASAN: 2431,00				**SUBTOTAL**	167,20
				TOTAL	2.598,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

20121

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+620	K 23+640	20,00	0,09	1,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+640	K 23+660	20,00	0,47	9,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+660	K 23+680	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+680	K 23+700	20,00	0,75	15,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+700	K 23+720	20,00	0,44	8,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+720	K 23+740	20,00	0,33	6,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+740	K 23+760	20,00	0,34	6,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+760	K 23+780	20,00	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+780	K 23+800	20,00	0,41	8,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+800	K 23+820	20,00	0,55	11,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+820	K 23+840	20,00	0,59	11,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+840	K 23+860	20,00	0,56	11,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+860	K 23+880	20,00	0,21	4,20
PASAN: **2.598,20**				**SUBTOTAL**	109,20
				TOTAL	2.707,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20182

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+880	K 23+900	20,00	0,20	4,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+900	K 23+920	20,00	0,51	10,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+920	K 23+940	20,00	0,50	10,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+940	K 23+960	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+960	K 23+980	20,00	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 23+980	K 24+000	20,00	0,46	9,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+000	K 24+020	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+020	K 24+040	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+040	K 24+060	20,00	0,25	5,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+060	K 24+080	20,00	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+080	K 24+100	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+100	K 24+120	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+120	K 24+140	20,00	0,00	0,00
PASAN: **2.707,40**				**SUBTOTAL**	82,60
				TOTAL	2.790,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+140	K 24+160	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+160	K 24+180	20,00	0,55	11,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+180	K 24+200	20,00	0,87	17,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+200	K 24+220	20,00	0,92	18,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+220	K 24+240	20,00	0,66	13,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+240	K 24+260	20,00	0,60	12,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+260	K 24+280	20,00	0,47	9,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+280	K 24+300	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+300	K 24+320	20,00	0,73	14,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+320	K 24+340	20,00	0,46	9,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+340	K 24+360	20,00	0,27	5,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+360	K 24+380	20,00	0,37	7,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+380	K 24+400	20,00	0,75	15,00
PASAN: 2.790,00				**SUBTOTAL**	143,40
				TOTAL	2.933,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

20189

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+400	K 24+420	20,00	1,03	20,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+420	K 24+440	20,00	0,89	17,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+440	K 24+460	20,00	0,66	13,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+460	K 24+480	20,00	0,45	9,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+480	K 24+500	20,00	0,45	9,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+500	K 24+520	20,00	0,46	9,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+520	K 24+540	20,00	0,32	6,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+540	K 24+560	20,00	0,30	6,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+560	K 24+580	20,00	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+580	K 24+600	20,00	0,01	0,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+600	K 24+620	20,00	0,17	3,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+620	K 24+640	20,00	0,08	1,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+640	K 24+660	20,00	0,29	5,80
PASAN: 2.933,40				**SUBTOTAL**	107,00
				TOTAL	3.040,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335416

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

201es

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+660	K 24+680	20,00	0,53	10,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+680	K 24+700	20,00	0,72	14,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+700	K 24+720	20,00	0,66	13,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+720	K 24+740	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+740	K 24+760	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+760	K 24+780	20,00	0,21	4,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+780	K 24+800	20,00	0,49	9,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+800	K 24+820	20,00	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+820	K 24+840	20,00	0,06	1,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+840	K 24+860	20,00	0,00	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+860	K 24+880	20,00	0,10	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+880	K 24+900	20,00	0,77	15,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+900	K 24+920	20,00	0,33	6,60
PASAN: 3.040,40				**SUBTOTAL**	95,00
				TOTAL	3.135,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20126

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+920	K 24+940	20,00	0,35	7,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+940	K 24+960	20,00	0,67	13,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+960	K 24+980	20,00	0,65	13,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 24+980	K 25+000	20,00	0,96	19,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+000	K 25+020	20,00	1,00	20,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+020	K 25+040	20,00	1,05	21,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+040	K 25+060	20,00	1,00	20,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+060	K 25+080	20,00	0,76	15,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+080	K 25+100	20,00	0,56	11,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+100	K 25+120	20,00	0,25	5,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+120	K 25+140	20,00	0,20	4,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+140	K 25+160	20,00	0,18	3,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+160	K 25+180	20,00	1,34	26,80
PASAN: **3.135,40**				**SUBTOTAL**	179,40
				TOTAL	3.314,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2087

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+180	K 25+200	20,00	1,33	26,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+200	K 25+220	20,00	1,58	31,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+220	K 25+240	20,00	1,33	26,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+240	K 25+260	20,00	1,08	21,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+260	K 25+280	20,00	0,86	17,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+280	K 25+300	20,00	0,39	7,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+300	K 25+320	20,00	0,14	2,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+320	K 25+340	20,00	0,12	2,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+340	K 25+360	20,00	0,26	5,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+360	K 25+380	20,00	0,53	10,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+380	K 25+400	20,00	0,16	3,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+400	K 25+420	20,00	0,25	5,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+420	K 25+440	20,00	0,26	5,20
PASAN: **3.314,80**				**SUBTOTAL**	165,80
				TOTAL	3.480,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+440	K 25+460	20,00	0,05	1,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+460	K 25+480	20,00	0,20	4,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+480	K 25+500	20,00	0,55	11,00
PASAN: **3.480,60**				**SUBTOTAL**	16,00
				TOTAL	3.496,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20129

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 18+420	K 18+440	20	1,67	33,40
K 18+440	K 18+460	20	1,79	35,80
K 18+460	K 18+480	20	1,87	37,40
K 18+480	K 18+500	20	1,13	22,60
K 18+500	K 18+520	20	1,69	33,80
K 18+520	K 18+540	20	1,37	27,40
K 18+540	K 18+560	20	1,57	31,40
K 18+560	K 18+580	20	1,40	28,00
K 18+580	K 18+600	20	1,42	28,40
K 18+600	K 18+620	20	1,17	23,40
K 18+620	K 18+640	20	1,35	27,00
K 18+640	K 18+660	20	1,45	29,00
K 18+660	K 18+680	20	1,46	29,20
K 18+680	K 18+700	20	0,97	19,40
K 18+700	K 18+720	20	0,93	18,60
K 18+720	K 18+740	20	0,80	16,00
K 18+740	K 18+760	20	1,02	20,40
K 18+760	K 18+780	20	1,05	21,00
K 18+780	K 18+800	20	1,46	29,20
K 18+800	K 18+820	20	1,17	23,40
K 18+820	K 18+840	20	1,41	28,20
K 18+840	K 18+860	20	1,06	21,20
K 18+860	K 18+880	20	3,07	61,40
K 18+880	K 18+900	20	2,82	56,40
K 18+900	K 18+920	20	1,98	39,60
K 18+920	K 18+940	20	1,36	27,20
K 18+940	K 18+960	20	0,60	12,00
K 18+960	K 18+980	20	0,83	16,60
K 18+980	K 19+000	20	1,47	29,40
K 19+000	K 19+020	20	1,47	29,40
K 19+020	K 19+040	20	1,26	25,20
K 19+040	K 19+060	20	1,36	27,20
K 19+060	K 19+080	20	1,13	22,60
K 19+080	K 19+100	20	0,18	3,60
K 19+100	K 19+120	20	0,11	2,20
K 19+120	K 19+140	20	0,07	1,40
K 19+140	K 19+160	20	0,09	1,80
K 19+160	K 19+180	20	0,28	5,60
K 19+180	K 19+200	20	0,10	2,00
K 19+200	K 19+220	20	0,58	11,60
K 19+220	K 19+240	20	0,60	12,00
K 19+240	K 19+260	20	0,84	16,80
K 19+260	K 19+280	20	0,72	14,40
K 19+280	K 19+300	20	0,30	6,00
K 19+300	K 19+320	20	0,13	2,60
K 19+320	K 19+340	20	0,02	0,40
K 19+340	K 19+360	20	0,30	6,00
K 19+360	K 19+380	20	0,47	9,40
K 19+380	K 19+400	20	0,16	3,20
K 19+400	K 19+420	20	0,24	4,80
K 19+420	K 19+440	20	0,02	0,40
K 19+440	K 19+460	20	0,21	4,20
K 19+460	K 19+480	20	0,10	2,00
K 19+480	K 19+500	20	0,22	4,40
K 19+500	K 19+520	20	0,07	1,40

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 19+520	K 19+540	20	0,15	3,00
K 19+540	K 19+560	20	0,61	12,20
K 19+560	K 19+580	20	0,23	4,60
K 19+580	K 19+600	20	0,01	0,20
K 19+600	K 19+620	20	0,78	15,60
K 19+620	K 19+640	20	1,20	24,00
K 19+640	K 19+660	20	0,54	10,80
K 19+660	K 19+680	20	0,35	7,00
K 19+680	K 19+700	20	0,11	2,20
K 19+700	K 19+720	20	0,22	4,40
K 19+720	K 19+740	20	0,40	8,00
K 19+740	K 19+760	20	0,84	16,80
K 19+760	K 19+780	20	1,05	21,00
K 19+780	K 19+800	20	1,00	20,00
K 19+800	K 19+820	20	0,22	4,40
K 19+820	K 19+840	20	0,24	4,80
K 19+840	K 19+860	20	0,80	16,00
K 19+860	K 19+880	20	1,07	21,40
K 19+880	K 19+900	20	1,66	33,20
K 19+900	K 19+920	20	1,50	30,00
K 19+920	K 19+940	20	0,76	15,20
K 19+940	K 19+960	20	0,44	8,80
K 19+960	K 19+980	20	0,46	9,20
K 19+980	K 20+000	20	0,27	5,40
K 20+000	K 20+020	20	0,29	5,80
K 20+020	K 20+040	20	0,52	10,40
K 20+040	K 20+060	20	0,52	10,40
K 20+060	K 20+080	20	0,95	19,00
K 20+080	K 20+100	20	0,91	18,20
K 20+100	K 20+120	20	0,46	9,20
K 20+120	K 20+140	20	0,52	10,40
K 20+140	K 20+160	20	0,18	3,60
K 20+160	K 20+180	20	1,32	26,40
K 20+180	K 20+200	20	1,11	22,20
K 20+200	K 20+220	20	0,44	8,80
K 20+220	K 20+240	20	0,08	1,60
K 20+240	K 20+260	20	0,08	1,60
K 20+260	K 20+280	20	0,00	0,00
K 20+280	K 20+300	20	0,28	5,60
K 20+300	K 20+320	20	0,95	19,00
K 20+320	K 20+340	20	1,19	23,80
K 20+340	K 20+360	20	0,77	15,40
K 20+360	K 20+380	20	0,72	14,40
K 20+380	K 20+400	20	0,54	10,80
K 20+400	K 20+420	20	0,13	2,60
K 20+420	K 20+440	20	0,10	2,00
K 20+440	K 20+460	20	0,34	6,80
K 20+460	K 20+480	20	0,59	11,80
K 20+480	K 20+500	20	0,12	2,40
K 20+500	K 20+520	20	0,34	6,80
K 20+520	K 20+540	20	0,80	16,00
K 20+540	K 20+560	20	0,73	14,60
K 20+560	K 20+580	20	0,88	17,60
K 20+580	K 20+600	20	0,81	16,20
K 20+600	K 20+620	20	1,88	37,60
K 20+620	K 20+640	20	0,01	0,20
K 20+640	K 20+660	20	0,01	0,20
K 20+660	K 20+680	20	0,17	3,40

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 20+680	K 20+700	20	0,16	3,20
K 20+700	K 20+720	20	0,14	2,80
K 20+720	K 20+740	20	0,04	0,80
K 20+740	K 20+760	20	0,30	6,00
K 20+760	K 20+780	20	0,48	9,60
K 20+780	K 20+800	20	0,34	6,80
K 20+800	K 20+820	20	0,14	2,80
K 20+820	K 20+840	20	0,04	0,80
K 20+840	K 20+860	20	0,14	2,80
K 20+860	K 20+880	20	0,02	0,40
K 20+880	K 20+900	20	0,08	1,60
K 20+900	K 20+920	20	0,06	1,20
K 20+920	K 20+940	20	0,36	7,20
K 20+940	K 20+960	20	0,77	15,40
K 20+960	K 20+980	20	0,13	2,60
K 20+980	K 21+000	20	0,29	5,80
K 21+000	K 21+020	20	1,24	24,80
K 21+020	K 21+040	20	0,29	5,80
K 21+040	K 21+060	20	2,78	55,60
K 21+060	K 21+080	20	0,35	7,00
K 21+080	K 21+100	20	0,57	11,40
K 21+100	K 21+120	20	0,66	13,20
K 21+120	K 21+140	20	0,22	4,40
K 21+140	K 21+160	20	0,43	8,60
K 21+160	K 21+180	20	0,38	7,60
K 21+180	K 21+200	20	0,18	3,60
K 21+200	K 21+220	20	0,11	2,20
K 21+220	K 21+240	20	0,03	0,60
K 21+240	K 21+260	20	0,00	0,00
K 21+260	K 21+280	20	0,00	0,00
K 21+280	K 21+300	20	0,14	2,80
K 21+300	K 21+320	20	0,03	0,60
K 21+320	K 21+340	20	0,00	0,00
K 21+340	K 21+360	20	0,08	1,60
K 21+360	K 21+380	20	0,08	1,60
K 21+380	K 21+400	20	0,03	0,60
K 21+400	K 21+420	20	0,05	1,00
K 21+420	K 21+440	20	0,01	0,20
K 21+440	K 21+460	20	0,05	1,00
K 21+460	K 21+480	20	0,02	0,40
K 21+480	K 21+500	20	0,01	0,20
K 21+500	K 21+520	20	0,00	0,00
K 21+520	K 21+540	20	0,01	0,20
K 21+540	K 21+560	20	0,03	0,60
K 21+560	K 21+580	20	0,18	3,60
K 21+580	K 21+600	20	0,34	6,80
K 21+600	K 21+620	20	0,06	1,20
K 21+620	K 21+640	20	0,02	0,40
K 21+640	K 21+660	20	0,54	10,80
K 21+660	K 21+680	20	0,60	12,00
K 21+680	K 21+700	20	0,42	8,40
K 21+700	K 21+720	20	0,48	9,60
K 21+720	K 21+740	20	0,81	16,20
K 21+740	K 21+760	20	0,87	17,40
K 21+760	K 21+780	20	0,38	7,60
K 21+780	K 21+800	20	0,99	19,80
K 21+800	K 21+820	20	0,75	15,00
K 21+820	K 21+840	20	0,74	14,80

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 21+840	K 21+860	20	0,51	10,20
K 21+860	K 21+880	20	0,12	2,40
K 21+880	K 21+900	20	0,49	9,80
K 21+900	K 21+920	20	0,65	13,00
K 21+920	K 21+940	20	0,20	4,00
K 21+940	K 21+960	20	0,30	6,00
K 21+960	K 21+980	20	0,56	11,20
K 21+980	K 22+000	20	0,50	10,00
K 22+000	K 22+020	20	0,00	0,00
K 22+020	K 22+040	20	0,00	0,00
K 22+040	K 22+060	20	0,00	0,00
K 22+060	K 22+080	20	0,00	0,00
K 22+080	K 22+100	20	0,00	0,00
K 22+100	K 22+120	20	0,13	2,60
K 22+120	K 22+140	20	0,01	0,20
K 22+140	K 22+160	20	0,02	0,40
K 22+160	K 22+180	20	0,54	10,80
K 22+180	K 22+200	20	0,70	14,00
K 22+200	K 22+220	20	0,34	6,80
K 22+220	K 22+240	20	0,03	0,60
K 22+240	K 22+260	20	0,02	0,40
K 22+260	K 22+280	20	0,00	0,00
K 22+280	K 22+300	20	0,00	0,00
K 22+300	K 22+320	20	0,04	0,80
K 22+320	K 22+340	20	0,07	1,40
K 22+340	K 22+360	20	0,28	5,60
K 22+360	K 22+380	20	0,14	2,80
K 22+380	K 22+400	20	0,05	1,00
K 22+400	K 22+420	20	0,28	5,60
K 22+420	K 22+440	20	0,27	5,40
K 22+440	K 22+460	20	0,25	5,00
K 22+460	K 22+480	20	0,43	8,60
K 22+480	K 22+500	20	0,34	6,80
K 22+500	K 22+520	20	0,78	15,60
K 22+520	K 22+540	20	0,54	10,80
K 22+540	K 22+560	20	0,44	8,80
K 22+560	K 22+580	20	0,47	9,40
K 22+580	K 22+600	20	0,64	12,80
K 22+600	K 22+620	20	0,36	7,20
K 22+620	K 22+640	20	0,30	6,00
K 22+640	K 22+660	20	0,01	0,20
K 22+660	K 22+680	20	0,05	1,00
K 22+680	K 22+700	20	0,20	4,00
K 22+700	K 22+720	20	0,05	1,00
K 22+720	K 22+740	20	1,43	28,60
K 22+740	K 22+760	20	0,18	3,60
K 22+760	K 22+780	20	0,02	0,40
K 22+780	K 22+800	20	0,39	7,80
K 22+800	K 22+820	20	0,21	4,20
K 22+820	K 22+840	20	0,23	4,60
K 22+840	K 22+860	20	0,10	2,00
K 22+860	K 22+880	20	0,00	0,00
K 22+880	K 22+900	20	0,00	0,00
K 22+900	K 22+920	20	0,14	2,80
K 22+920	K 22+940	20	0,17	3,40
K 22+940	K 22+960	20	0,23	4,60
K 22+960	K 22+980	20	0,22	4,40
K 22+980	K 23+000	20	0,22	4,40

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 23+000	K 23+020	20	0,16	3,20
K 23+020	K 23+040	20	0,32	6,40
K 23+040	K 23+060	20	0,16	3,20
K 23+060	K 23+080	20	0,15	3,00
K 23+080	K 23+100	20	0,11	2,20
K 23+100	K 23+120	20	0,03	0,60
K 23+120	K 23+140	20	0,04	0,80
K 23+140	K 23+160	20	0,08	1,60
K 23+160	K 23+180	20	0,00	0,00
K 23+180	K 23+200	20	0,04	0,80
K 23+200	K 23+220	20	0,14	2,80
K 23+220	K 23+240	20	0,10	2,00
K 23+240	K 23+260	20	0,64	12,80
K 23+260	K 23+280	20	0,18	3,60
K 23+280	K 23+300	20	0,09	1,80
K 23+300	K 23+320	20	0,09	1,80
K 23+320	K 23+340	20	0,05	1,00
K 23+340	K 23+360	20	0,05	1,00
K 23+360	K 23+380	20	0,04	0,80
K 23+380	K 23+400	20	0,44	8,80
K 23+400	K 23+420	20	0,73	14,60
K 23+420	K 23+440	20	1,22	24,40
K 23+440	K 23+460	20	1,23	24,60
K 23+460	K 23+480	20	1,00	20,00
K 23+480	K 23+500	20	1,38	27,60
K 23+500	K 23+520	20	1,18	23,60
K 23+520	K 23+540	20	0,63	12,60
K 23+540	K 23+560	20	0,30	6,00
K 23+560	K 23+580	20	0,01	0,20
K 23+580	K 23+600	20	0,12	2,40
K 23+600	K 23+620	20	0,08	1,60
K 23+620	K 23+640	20	0,09	1,80
K 23+640	K 23+660	20	0,47	9,40
K 23+660	K 23+680	20	0,44	8,80
K 23+680	K 23+700	20	0,75	15,00
K 23+700	K 23+720	20	0,44	8,80
K 23+720	K 23+740	20	0,33	6,60
K 23+740	K 23+760	20	0,34	6,80
K 23+760	K 23+780	20	0,28	5,60
K 23+780	K 23+800	20	0,41	8,20
K 23+800	K 23+820	20	0,55	11,00
K 23+820	K 23+840	20	0,59	11,80
K 23+840	K 23+860	20	0,56	11,20
K 23+860	K 23+880	20	0,21	4,20
K 23+880	K 23+900	20	0,20	4,00
K 23+900	K 23+920	20	0,51	10,20
K 23+920	K 23+940	20	0,50	10,00
K 23+940	K 23+960	20	0,52	10,40
K 23+960	K 23+980	20	0,24	4,80
K 23+980	K 24+000	20	0,46	9,20
K 24+000	K 24+020	20	0,60	12,00
K 24+020	K 24+040	20	0,60	12,00
K 24+040	K 24+060	20	0,25	5,00
K 24+060	K 24+080	20	0,24	4,80
K 24+080	K 24+100	20	0,01	0,20
K 24+100	K 24+120	20	0,00	0,00
K 24+120	K 24+140	20	0,00	0,00
K 24+140	K 24+160	20	0,00	0,00

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 24+160	K 24+180	20	0,55	11,00
K 24+180	K 24+200	20	0,87	17,40
K 24+200	K 24+220	20	0,92	18,40
K 24+220	K 24+240	20	0,66	13,20
K 24+240	K 24+260	20	0,60	12,00
K 24+260	K 24+280	20	0,47	9,40
K 24+280	K 24+300	20	0,52	10,40
K 24+300	K 24+320	20	0,73	14,60
K 24+320	K 24+340	20	0,46	9,20
K 24+340	K 24+360	20	0,27	5,40
K 24+360	K 24+380	20	0,37	7,40
K 24+380	K 24+400	20	0,75	15,00
K 24+400	K 24+420	20	1,03	20,60
K 24+420	K 24+440	20	0,89	17,80
K 24+440	K 24+460	20	0,66	13,20
K 24+460	K 24+480	20	0,45	9,00
K 24+480	K 24+500	20	0,45	9,00
K 24+500	K 24+520	20	0,46	9,20
K 24+520	K 24+540	20	0,32	6,40
K 24+540	K 24+560	20	0,30	6,00
K 24+560	K 24+580	20	0,24	4,80
K 24+580	K 24+600	20	0,01	0,20
K 24+600	K 24+620	20	0,17	3,40
K 24+620	K 24+640	20	0,08	1,60
K 24+640	K 24+660	20	0,29	5,80
K 24+660	K 24+680	20	0,53	10,60
K 24+680	K 24+700	20	0,72	14,40
K 24+700	K 24+720	20	0,66	13,20
K 24+720	K 24+740	20	0,18	3,60
K 24+740	K 24+760	20	0,18	3,60
K 24+760	K 24+780	20	0,21	4,20
K 24+780	K 24+800	20	0,49	9,80
K 24+800	K 24+820	20	0,52	10,40
K 24+820	K 24+840	20	0,06	1,20
K 24+840	K 24+860	20	0,00	0,00
K 24+860	K 24+880	20	0,10	2,00
K 24+880	K 24+900	20	0,77	15,40
K 24+900	K 24+920	20	0,33	6,60
K 24+920	K 24+940	20	0,35	7,00
K 24+940	K 24+960	20	0,67	13,40
K 24+960	K 24+980	20	0,65	13,00
K 24+980	K 25+000	20	0,96	19,20
K 25+000	K 25+020	20	1,00	20,00
K 25+020	K 25+040	20	1,05	21,00
K 25+040	K 25+060	20	1,00	20,00
K 25+060	K 25+080	20	0,76	15,20
K 25+080	K 25+100	20	0,56	11,20
K 25+100	K 25+120	20	0,25	5,00
K 25+120	K 25+140	20	0,20	4,00
K 25+140	K 25+160	20	0,18	3,60
K 25+160	K 25+180	20	1,34	26,80
K 25+180	K 25+200	20	1,33	26,60
K 25+200	K 25+220	20	1,58	31,60
K 25+220	K 25+240	20	1,33	26,60
K 25+240	K 25+260	20	1,08	21,60
K 25+260	K 25+280	20	0,86	17,20
K 25+280	K 25+300	20	0,39	7,80
K 25+300	K 25+320	20	0,14	2,80

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 25+320	K 25+340	20	0,12	2,40
K 25+340	K 25+360	20	0,26	5,20
K 25+360	K 25+380	20	0,53	10,60
K 25+380	K 25+400	20	0,16	3,20
K 25+400	K 25+420	20	0,25	5,00
K 25+420	K 25+440	20	0,26	5,20
K 25+440	K 25+460	20	0,05	1,00
K 25+460	K 25+480	20	0,20	4,00
K 25+480	K 25+500	20	0,55	11,00
	TOTAL			3.496,60

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

20196

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

18+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.67	33.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.79	35.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.87	37.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.13	22.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.69	33.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.37	27.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.57	31.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.40	28.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.42	28.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.17	23.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.35	27.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.45	29.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+660.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.46	29.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+680.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.97	19.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2019

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

18+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.93	18.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.80	16.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.02	20.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.05	21.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.46	29.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+800.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.17	23.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.41	28.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.06	21.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	3.07	61.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	2.82	56.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.98	39.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.36	27.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+940.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

18+960.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.83	16.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20192

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

18+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.47	29.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.47	29.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.26	25.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.36	27.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.13	22.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.11	2.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.07	1.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.09	1.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.28	5.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.58	11.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+220.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+240.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.84	16.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20199

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

19+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.72	14.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.13	2.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+320.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+360.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.47	9.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.16	3.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.21	4.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+500.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.07	1.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+520.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.15	3.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2020

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

19+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.61	12.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.23	4.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.78	15.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.20	24.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.54	10.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.35	7.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.11	2.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.40	8.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.84	16.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.05	21.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+780.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.00	20.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+800.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20201

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

19+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.80	16.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.07	21.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.66	33.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.50	30.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.76	15.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+960.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

19+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.27	5.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.29	5.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+060.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.95	19.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+080.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.91	18.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

20+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.32	25.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.11	22.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.28	5.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.95	19.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+320.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.19	23.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+340.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.77	15.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+360.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.72	14.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20203

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

20+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.54	10.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.13	2.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.59	11.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.12	2.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.80	16.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.73	14.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.88	17.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.81	15.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.88	37.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+620.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+640.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20204

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

20+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.17	3.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.16	3.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.48	9.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+800.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+900.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.06	1.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+920.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.36	7.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2020

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

20+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.77	15.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+960.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.13	2.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.29	5.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.24	24.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.29	5.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	2.78	55.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.35	7.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.57	11.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.66	13.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.43	8.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.38	7.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+180.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+200.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.11	2.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20206

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

21+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+320.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+360.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+460.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+480.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20207

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

21+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.06	1.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.54	10.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.42	8.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.48	9.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.81	16.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+740.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.87	17.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+760.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.38	7.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20208

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

21+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.99	19.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+800.00

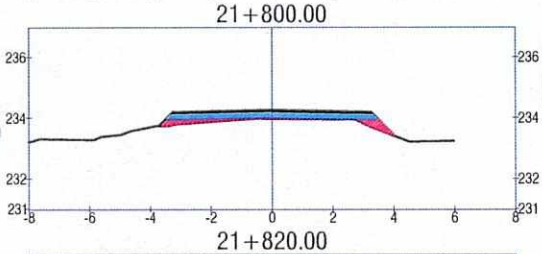


Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.75	15.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.74	14.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.51	10.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.12	2.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.49	9.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.65	13.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.20	4.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+960.00

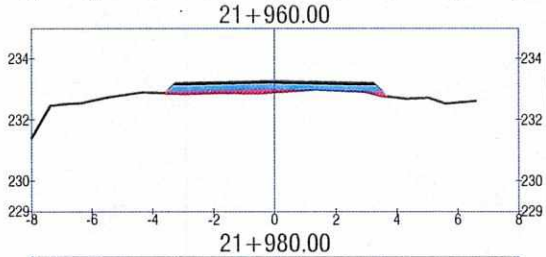


Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

21+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.50	10.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+020.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+040.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20209

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

22+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.13	2.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.54	10.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.70	14.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+300.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+320.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.07	1.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20210

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

22+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.29	5.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+360.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.28	5.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.27	5.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.25	5.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.43	8.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.78	15.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.54	10.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.47	9.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+580.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.64	12.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+600.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.36	7.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2021

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

22+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.20	4.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.43	28.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.02	0.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.39	7.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+800.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.21	4.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.23	4.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+860.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+880.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2021 2

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

22+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.17	3.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.23	4.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+960.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

22+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.22	4.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.16	3.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.32	6.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.16	3.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.15	3.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.11	2.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+140.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+160.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20213

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

23+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.64	12.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.09	1.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.09	1.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+320.00

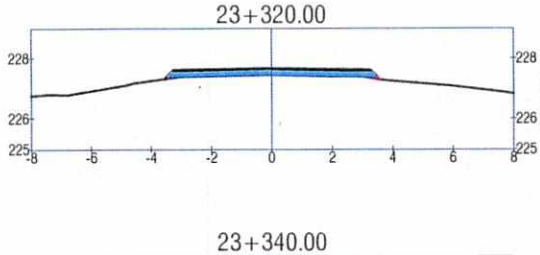


Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+360.00

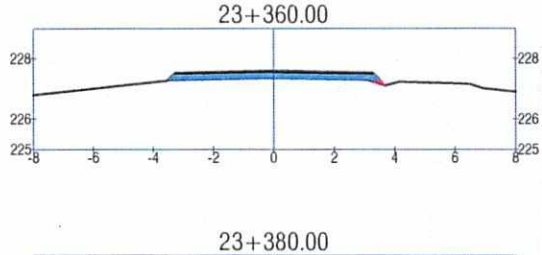


Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.04	0.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.73	14.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+420.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.22	24.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+440.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.23	24.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2021

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

23+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.00	20.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.38	27.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.18	23.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.63	12.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.12	2.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.09	1.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.47	9.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.75	15.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+700.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.44	8.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+720.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.33	6.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20215

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

23+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.34	6.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.28	5.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.41	8.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+800.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.55	11.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+820.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.59	11.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+840.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.21	4.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.20	4.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.51	10.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.50	10.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+960.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

23+980.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+000.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2016

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

24+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.25	5.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+100.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+120.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.55	11.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.87	17.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.92	18.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.66	13.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.60	12.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+260.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.47	9.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+280.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20217

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

24+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.73	14.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+320.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.27	5.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+360.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.37	7.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+380.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.75	15.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+400.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.03	20.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.89	17.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.66	13.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+460.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.45	9.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+480.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.45	9.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.32	6.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+540.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.30	6.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+560.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2018

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

24+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.01	0.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.17	3.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.08	1.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.29	5.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.53	10.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.72	14.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.66	13.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+720.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+740.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+760.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.21	4.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+780.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.49	9.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+800.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+820.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.06	1.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+840.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

24+860.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+880.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.77	15.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+900.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.33	6.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+920.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.35	7.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+940.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.67	13.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+960.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.65	13.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

24+980.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.96	19.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+000.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.00	20.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+020.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.05	21.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+040.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.00	20.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+060.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.76	15.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+080.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+100.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.25	5.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+120.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.20	4.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2020

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

25+140.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.18	3.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+160.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.34	26.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+180.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.33	26.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+200.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.58	31.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+220.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.33	26.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+240.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.08	21.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+260.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.86	17.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+280.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.39	7.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+300.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.14	2.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+320.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.12	2.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+340.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.26	5.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+360.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.53	10.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+380.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.16	3.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+400.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.25	5.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

2022

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

25+420.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.28	5.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+440.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.05	1.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+460.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.20	4.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+480.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.55	11.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

DIEGO A BECERRA

FANNY BARRERA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ	FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA	TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-14221	M.P. 01-10580
CONSORCION HALCON	CONSORCIO INTER AIM

2022

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada en las actividades de **RELLENO** corresponde al **Río Guacavía**, específicamente de la cantera **La Esmeralda,** situada en el municipio de Cumaral. Esta fuente es la más cercana al proyecto mencionado, a una distancia de 6,0 km hasta el inicio del proyecto en el punto abs K0+00 y fue la inicialmente aprobada, así como se certifica en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.**

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material en un folio.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.


Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 1 Folio (Mapa fuente)

20223

CONSORCIO INTER AIM

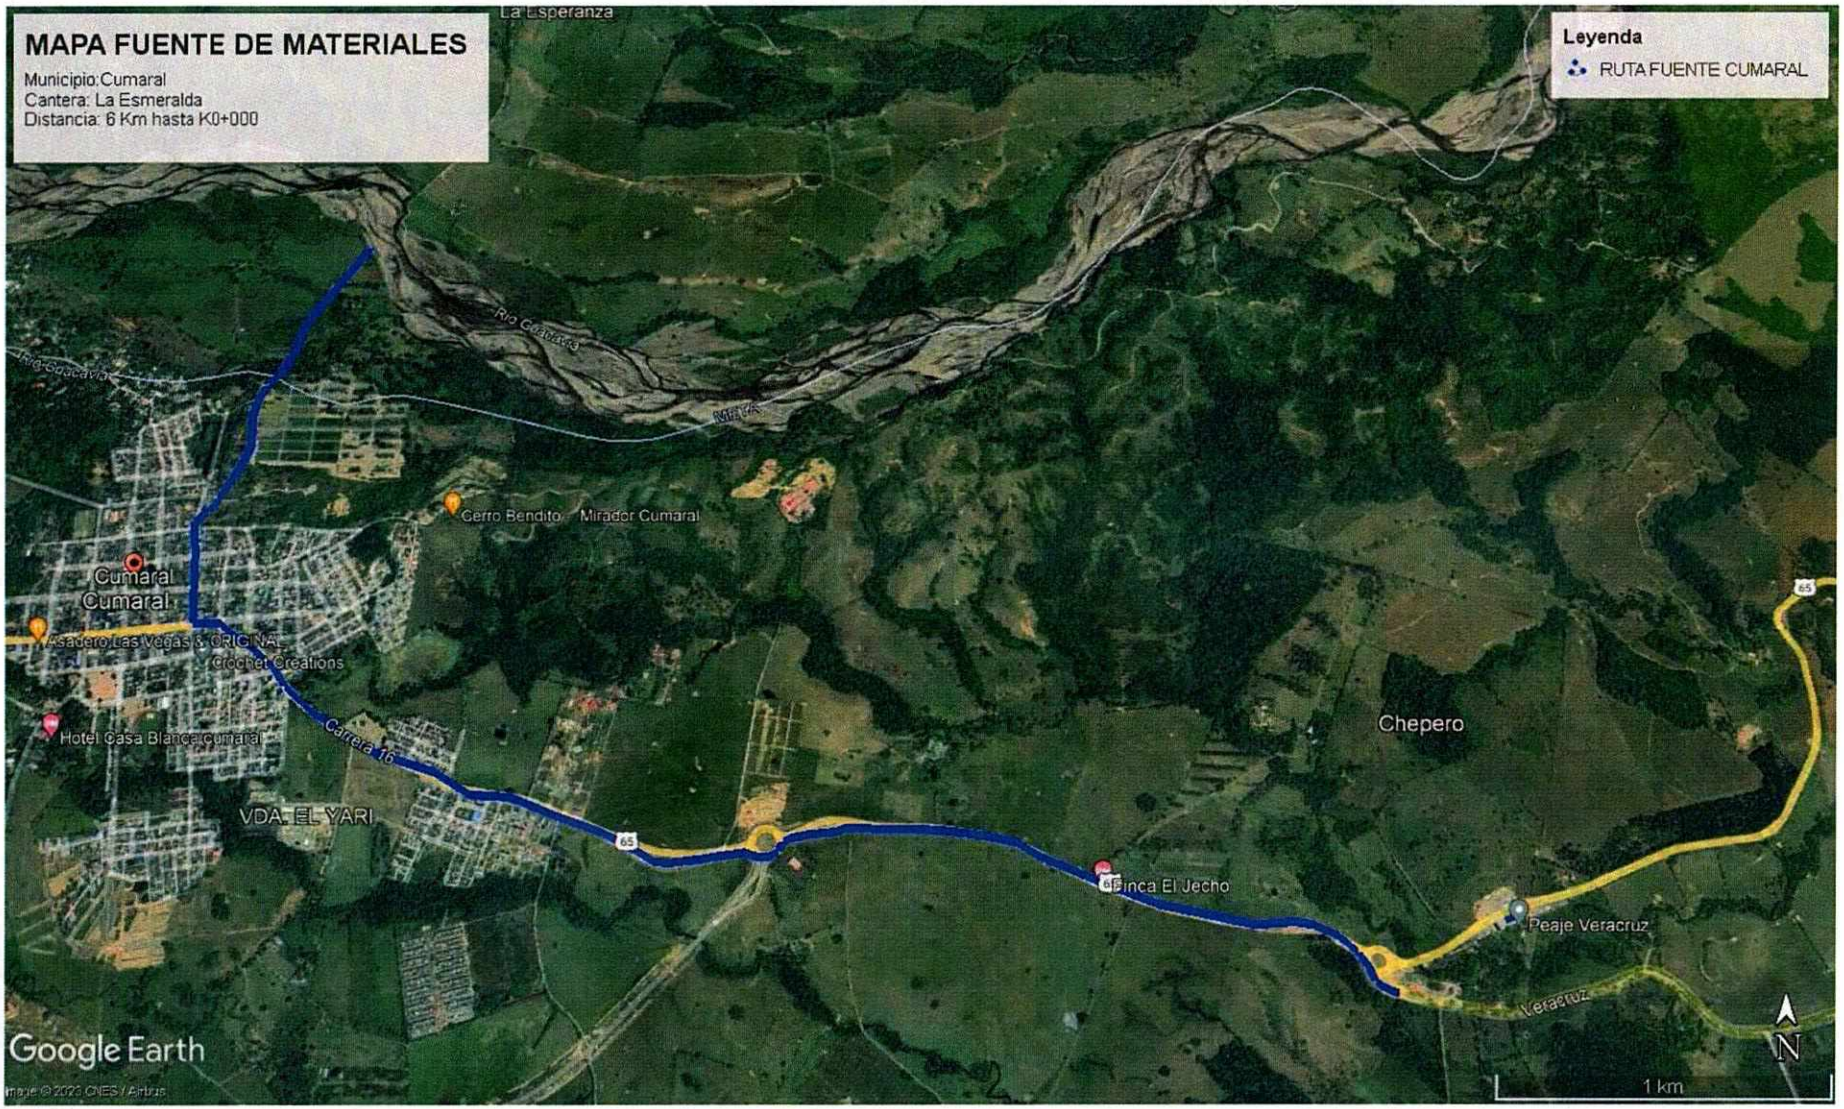

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	VOLUMEN	TOTAL
TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO					
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO	K18+420	K25+500	7.080,00	3.496,60	95.862,61
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO					
TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
	K17+000	K21+000	4.000,00	4.360,00	270.189,20
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
PASAN:				SUBTOTAL	366.051,81
				TOTAL	366.051,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20228

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 18+420	K 18+440	33,40	24,45	816,63
K 18+440	K 18+460	35,80	24,47	876,03
K 18+460	K 18+480	37,40	24,49	915,93
K 18+480	K 18+500	22,60	24,51	553,93
K 18+500	K 18+520	33,80	24,53	829,11
K 18+520	K 18+540	27,40	24,55	672,67
K 18+540	K 18+560	31,40	24,57	771,50
K 18+560	K 18+580	28,00	24,59	688,52
K 18+580	K 18+600	28,40	24,61	698,92
K 18+600	K 18+620	23,40	24,63	576,34
K 18+620	K 18+640	27,00	24,65	665,55
K 18+640	K 18+660	29,00	24,67	715,43
K 18+660	K 18+680	29,20	24,69	720,95
K 18+680	K 18+700	19,40	24,71	479,37
K 18+700	K 18+720	18,60	24,73	459,98
K 18+720	K 18+740	16,00	24,75	396,00
K 18+740	K 18+760	20,40	24,77	505,31
K 18+760	K 18+780	21,00	24,79	520,59
K 18+780	K 18+800	29,20	24,81	724,45
K 18+800	K 18+820	23,40	24,83	581,02
K 18+820	K 18+840	28,20	24,85	700,77
K 18+840	K 18+860	21,20	24,87	527,24
K 18+860	K 18+880	61,40	24,89	1528,25
K 18+880	K 18+900	56,40	24,91	1404,92
K 18+900	K 18+920	39,60	24,93	987,23
K 18+920	K 18+940	27,20	24,95	678,64
K 18+940	K 18+960	12,00	24,97	299,64
K 18+960	K 18+980	16,60	24,99	414,83
K 18+980	K 19+000	29,40	25,01	735,29
K 19+000	K 19+020	29,40	25,03	735,88
K 19+020	K 19+040	25,20	25,05	631,26
K 19+040	K 19+060	27,20	25,07	681,90
K 19+060	K 19+080	22,60	25,09	567,03
K 19+080	K 19+100	3,60	25,11	90,40
K 19+100	K 19+120	2,20	25,13	55,29
K 19+120	K 19+140	1,40	25,15	35,21
K 19+140	K 19+160	1,80	25,17	45,31
K 19+160	K 19+180	5,60	25,19	141,06
K 19+180	K 19+200	2,00	25,21	50,42
K 19+200	K 19+220	11,60	25,23	292,67
K 19+220	K 19+240	12,00	25,25	303,00
K 19+240	K 19+260	16,80	25,27	424,54
K 19+260	K 19+280	14,40	25,29	364,18
K 19+280	K 19+300	6,00	25,31	151,86
K 19+300	K 19+320	2,60	25,33	65,86
K 19+320	K 19+340	0,40	25,35	10,14
K 19+340	K 19+360	6,00	25,37	152,22
K 19+360	K 19+380	9,40	25,39	238,67
K 19+380	K 19+400	3,20	25,41	81,31
K 19+400	K 19+420	4,80	25,43	122,06
K 19+420	K 19+440	0,40	25,45	10,18
K 19+440	K 19+460	4,20	25,47	106,97
K 19+460	K 19+480	2,00	25,49	50,98
K 19+480	K 19+500	4,40	25,51	112,24
K 19+500	K 19+520	1,40	25,53	35,74
K 19+520	K 19+540	3,00	25,55	76,65
K 19+540	K 19+560	12,20	25,57	311,95
K 19+560	K 19+580	4,60	25,59	117,71
K 19+580	K 19+600	0,20	25,61	5,12
K 19+600	K 19+620	15,60	25,63	399,83
K 19+620	K 19+640	24,00	25,65	615,60
K 19+640	K 19+660	10,80	25,67	277,24

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 19+660	K 19+680	7,00	25,69	179,83
K 19+680	K 19+700	2,20	25,71	56,56
K 19+700	K 19+720	4,40	25,73	113,21
K 19+720	K 19+740	8,00	25,75	206,00
K 19+740	K 19+760	16,80	25,77	432,94
K 19+760	K 19+780	21,00	25,79	541,59
K 19+780	K 19+800	20,00	25,81	516,20
K 19+800	K 19+820	4,40	25,83	113,65
K 19+820	K 19+840	4,80	25,85	124,08
K 19+840	K 19+860	16,00	25,87	413,92
K 19+860	K 19+880	21,40	25,89	554,05
K 19+880	K 19+900	33,20	25,91	860,21
K 19+900	K 19+920	30,00	25,93	777,90
K 19+920	K 19+940	15,20	25,95	394,44
K 19+940	K 19+960	8,80	25,97	228,54
K 19+960	K 19+980	9,20	25,99	239,11
K 19+980	K 20+000	5,40	26,01	140,45
K 20+000	K 20+020	5,80	26,03	150,97
K 20+020	K 20+040	10,40	26,05	270,92
K 20+040	K 20+060	10,40	26,07	271,13
K 20+060	K 20+080	19,00	26,09	495,71
K 20+080	K 20+100	18,20	26,11	475,20
K 20+100	K 20+120	9,20	26,13	240,40
K 20+120	K 20+140	10,40	26,15	271,96
K 20+140	K 20+160	3,60	26,17	94,21
K 20+160	K 20+180	26,40	26,19	691,42
K 20+180	K 20+200	22,20	26,21	581,86
K 20+200	K 20+220	8,80	26,23	230,82
K 20+220	K 20+240	1,60	26,25	42,00
K 20+240	K 20+260	1,60	26,27	42,03
K 20+260	K 20+280	0,00	26,29	0,00
K 20+280	K 20+300	5,60	26,31	147,34
K 20+300	K 20+320	19,00	26,33	500,27
K 20+320	K 20+340	23,80	26,35	627,13
K 20+340	K 20+360	15,40	26,37	406,10
K 20+360	K 20+380	14,40	26,39	380,02
K 20+380	K 20+400	10,80	26,41	285,23
K 20+400	K 20+420	2,60	26,43	68,72
K 20+420	K 20+440	2,00	26,45	52,90
K 20+440	K 20+460	6,80	26,47	180,00
K 20+460	K 20+480	11,80	26,49	312,58
K 20+480	K 20+500	2,40	26,51	63,62
K 20+500	K 20+520	6,80	26,53	180,40
K 20+520	K 20+540	16,00	26,55	424,80
K 20+540	K 20+560	14,60	26,57	387,92
K 20+560	K 20+580	17,60	26,59	467,98
K 20+580	K 20+600	16,20	26,61	431,08
K 20+600	K 20+620	37,60	26,63	1001,29
K 20+620	K 20+640	0,20	26,65	5,33
K 20+640	K 20+660	0,20	26,67	5,33
K 20+660	K 20+680	3,40	26,69	90,75
K 20+680	K 20+700	3,20	26,71	85,47
K 20+700	K 20+720	2,80	26,73	74,84
K 20+720	K 20+740	0,80	26,75	21,40
K 20+740	K 20+760	6,00	26,77	160,62
K 20+760	K 20+780	9,60	26,79	257,18
K 20+780	K 20+800	6,80	26,81	182,31
K 20+800	K 20+820	2,80	26,83	75,12
K 20+820	K 20+840	0,80	26,85	21,48
K 20+840	K 20+860	2,80	26,87	75,24
K 20+860	K 20+880	0,40	26,89	10,76
K 20+880	K 20+900	1,60	26,91	43,06
K 20+900	K 20+920	1,20	26,93	32,32
K 20+920	K 20+940	7,20	26,95	194,04
K 20+940	K 20+960	15,40	26,97	415,34

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 20+960	K 20+980	2,60	26,99	70,17
K 20+980	K 21+000	5,80	27,01	156,66
K 21+000	K 21+020	24,80	27,03	670,34
K 21+020	K 21+040	5,80	27,05	156,89
K 21+040	K 21+060	55,60	27,07	1505,09
K 21+060	K 21+080	7,00	27,09	189,63
K 21+080	K 21+100	11,40	27,11	309,05
K 21+100	K 21+120	13,20	27,13	358,12
K 21+120	K 21+140	4,40	27,15	119,46
K 21+140	K 21+160	8,60	27,17	233,66
K 21+160	K 21+180	7,60	27,19	206,64
K 21+180	K 21+200	3,60	27,21	97,96
K 21+200	K 21+220	2,20	27,23	59,91
K 21+220	K 21+240	0,60	27,25	16,35
K 21+240	K 21+260	0,00	27,27	0,00
K 21+260	K 21+280	0,00	27,29	0,00
K 21+280	K 21+300	2,80	27,31	76,47
K 21+300	K 21+320	0,60	27,33	16,40
K 21+320	K 21+340	0,00	27,35	0,00
K 21+340	K 21+360	1,60	27,37	43,79
K 21+360	K 21+380	1,60	27,39	43,82
K 21+380	K 21+400	0,60	27,41	16,45
K 21+400	K 21+420	1,00	27,43	27,43
K 21+420	K 21+440	0,20	27,45	5,49
K 21+440	K 21+460	1,00	27,47	27,47
K 21+460	K 21+480	0,40	27,49	11,00
K 21+480	K 21+500	0,20	27,51	5,50
K 21+500	K 21+520	0,00	27,53	0,00
K 21+520	K 21+540	0,20	27,55	5,51
K 21+540	K 21+560	0,60	27,57	16,54
K 21+560	K 21+580	3,60	27,59	99,32
K 21+580	K 21+600	6,80	27,61	187,75
K 21+600	K 21+620	1,20	27,63	33,16
K 21+620	K 21+640	0,40	27,65	11,06
K 21+640	K 21+660	10,80	27,67	298,84
K 21+660	K 21+680	12,00	27,69	332,28
K 21+680	K 21+700	8,40	27,71	232,76
K 21+700	K 21+720	9,60	27,73	266,21
K 21+720	K 21+740	16,20	27,75	449,55
K 21+740	K 21+760	17,40	27,77	483,20
K 21+760	K 21+780	7,60	27,79	211,20
K 21+780	K 21+800	19,80	27,81	550,64
K 21+800	K 21+820	15,00	27,83	417,45
K 21+820	K 21+840	14,80	27,85	412,18
K 21+840	K 21+860	10,20	27,87	284,27
K 21+860	K 21+880	2,40	27,89	66,94
K 21+880	K 21+900	9,80	27,91	273,52
K 21+900	K 21+920	13,00	27,93	363,09
K 21+920	K 21+940	4,00	27,95	111,80
K 21+940	K 21+960	6,00	27,97	167,82
K 21+960	K 21+980	11,20	27,99	313,49
K 21+980	K 22+000	10,00	28,01	280,10
K 22+000	K 22+020	0,00	28,03	0,00
K 22+020	K 22+040	0,00	28,05	0,00
K 22+040	K 22+060	0,00	28,07	0,00
K 22+060	K 22+080	0,00	28,09	0,00
K 22+080	K 22+100	0,00	28,11	0,00
K 22+100	K 22+120	2,60	28,13	73,14
K 22+120	K 22+140	0,20	28,15	5,63
K 22+140	K 22+160	0,40	28,17	11,27
K 22+160	K 22+180	10,80	28,19	304,45
K 22+180	K 22+200	14,00	28,21	394,94
K 22+200	K 22+220	6,80	28,23	191,96
K 22+220	K 22+240	0,60	28,25	16,95
K 22+240	K 22+260	0,40	28,27	11,31

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 22+260	K 22+280	0,00	28,29	0,00
K 22+280	K 22+300	0,00	28,31	0,00
K 22+300	K 22+320	0,80	28,33	22,66
K 22+320	K 22+340	1,40	28,35	39,69
K 22+340	K 22+360	5,60	28,37	158,87
K 22+360	K 22+380	2,80	28,39	79,49
K 22+380	K 22+400	1,00	28,41	28,41
K 22+400	K 22+420	5,60	28,43	159,21
K 22+420	K 22+440	5,40	28,45	153,63
K 22+440	K 22+460	5,00	28,47	142,35
K 22+460	K 22+480	8,60	28,49	245,01
K 22+480	K 22+500	6,80	28,51	193,87
K 22+500	K 22+520	15,60	28,53	445,07
K 22+520	K 22+540	10,80	28,55	308,34
K 22+540	K 22+560	8,80	28,57	251,42
K 22+560	K 22+580	9,40	28,59	268,75
K 22+580	K 22+600	12,80	28,61	366,21
K 22+600	K 22+620	7,20	28,63	206,14
K 22+620	K 22+640	6,00	28,65	171,90
K 22+640	K 22+660	0,20	28,67	5,73
K 22+660	K 22+680	1,00	28,69	28,69
K 22+680	K 22+700	4,00	28,71	114,84
K 22+700	K 22+720	1,00	28,73	28,73
K 22+720	K 22+740	28,60	28,75	822,25
K 22+740	K 22+760	3,60	28,77	103,57
K 22+760	K 22+780	0,40	28,79	11,52
K 22+780	K 22+800	7,80	28,81	224,72
K 22+800	K 22+820	4,20	28,83	121,09
K 22+820	K 22+840	4,60	28,85	132,71
K 22+840	K 22+860	2,00	28,87	57,74
K 22+860	K 22+880	0,00	28,89	0,00
K 22+880	K 22+900	0,00	28,91	0,00
K 22+900	K 22+920	2,80	28,93	81,00
K 22+920	K 22+940	3,40	28,95	98,43
K 22+940	K 22+960	4,60	28,97	133,26
K 22+960	K 22+980	4,40	28,99	127,56
K 22+980	K 23+000	4,40	29,01	127,64
K 23+000	K 23+020	3,20	29,03	92,90
K 23+020	K 23+040	6,40	29,05	185,92
K 23+040	K 23+060	3,20	29,07	93,02
K 23+060	K 23+080	3,00	29,09	87,27
K 23+080	K 23+100	2,20	29,11	64,04
K 23+100	K 23+120	0,60	29,13	17,48
K 23+120	K 23+140	0,80	29,15	23,32
K 23+140	K 23+160	1,60	29,17	46,67
K 23+160	K 23+180	0,00	29,19	0,00
K 23+180	K 23+200	0,80	29,21	23,37
K 23+200	K 23+220	2,80	29,23	81,84
K 23+220	K 23+240	2,00	29,25	58,50
K 23+240	K 23+260	12,80	29,27	374,66
K 23+260	K 23+280	3,60	29,29	105,44
K 23+280	K 23+300	1,80	29,31	52,76
K 23+300	K 23+320	1,80	29,33	52,79
K 23+320	K 23+340	1,00	29,35	29,35
K 23+340	K 23+360	1,00	29,37	29,37
K 23+360	K 23+380	0,80	29,39	23,51
K 23+380	K 23+400	8,80	29,41	258,81
K 23+400	K 23+420	14,60	29,43	429,68
K 23+420	K 23+440	24,40	29,45	718,58
K 23+440	K 23+460	24,60	29,47	724,96
K 23+460	K 23+480	20,00	29,49	589,80
K 23+480	K 23+500	27,60	29,51	814,48
K 23+500	K 23+520	23,60	29,53	696,91
K 23+520	K 23+540	12,60	29,55	372,33
K 23+540	K 23+560	6,00	29,57	177,42

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 23+560	K 23+580	0,20	29,59	5,92
K 23+580	K 23+600	2,40	29,61	71,06
K 23+600	K 23+620	1,60	29,63	47,41
K 23+620	K 23+640	1,80	29,65	53,37
K 23+640	K 23+660	9,40	29,67	278,90
K 23+660	K 23+680	8,80	29,69	261,27
K 23+680	K 23+700	15,00	29,71	445,65
K 23+700	K 23+720	8,80	29,73	261,62
K 23+720	K 23+740	6,60	29,75	196,35
K 23+740	K 23+760	6,80	29,77	202,44
K 23+760	K 23+780	5,60	29,79	166,82
K 23+780	K 23+800	8,20	29,81	244,44
K 23+800	K 23+820	11,00	29,83	328,13
K 23+820	K 23+840	11,80	29,85	352,23
K 23+840	K 23+860	11,20	29,87	334,54
K 23+860	K 23+880	4,20	29,89	125,54
K 23+880	K 23+900	4,00	29,91	119,64
K 23+900	K 23+920	10,20	29,93	305,29
K 23+920	K 23+940	10,00	29,95	299,50
K 23+940	K 23+960	10,40	29,97	311,69
K 23+960	K 23+980	4,80	29,99	143,95
K 23+980	K 24+000	9,20	30,01	276,09
K 24+000	K 24+020	12,00	30,03	360,36
K 24+020	K 24+040	12,00	30,05	360,60
K 24+040	K 24+060	5,00	30,07	150,35
K 24+060	K 24+080	4,80	30,09	144,43
K 24+080	K 24+100	0,20	30,11	6,02
K 24+100	K 24+120	0,00	30,13	0,00
K 24+120	K 24+140	0,00	30,15	0,00
K 24+140	K 24+160	0,00	30,17	0,00
K 24+160	K 24+180	11,00	30,19	332,09
K 24+180	K 24+200	17,40	30,21	525,65
K 24+200	K 24+220	18,40	30,23	556,23
K 24+220	K 24+240	13,20	30,25	399,30
K 24+240	K 24+260	12,00	30,27	363,24
K 24+260	K 24+280	9,40	30,29	284,73
K 24+280	K 24+300	10,40	30,31	315,22
K 24+300	K 24+320	14,60	30,33	442,82
K 24+320	K 24+340	9,20	30,35	279,22
K 24+340	K 24+360	5,40	30,37	164,00
K 24+360	K 24+380	7,40	30,39	224,89
K 24+380	K 24+400	15,00	30,41	456,15
K 24+400	K 24+420	20,60	30,43	626,86
K 24+420	K 24+440	17,80	30,45	542,01
K 24+440	K 24+460	13,20	30,47	402,20
K 24+460	K 24+480	9,00	30,49	274,41
K 24+480	K 24+500	9,00	30,51	274,59
K 24+500	K 24+520	9,20	30,53	280,88
K 24+520	K 24+540	6,40	30,55	195,52
K 24+540	K 24+560	6,00	30,57	183,42
K 24+560	K 24+580	4,80	30,59	146,83
K 24+580	K 24+600	0,20	30,61	6,12
K 24+600	K 24+620	3,40	30,63	104,14
K 24+620	K 24+640	1,60	30,65	49,04
K 24+640	K 24+660	5,80	30,67	177,89
K 24+660	K 24+680	10,60	30,69	325,31
K 24+680	K 24+700	14,40	30,71	442,22
K 24+700	K 24+720	13,20	30,73	405,64
K 24+720	K 24+740	3,60	30,75	110,70
K 24+740	K 24+760	3,60	30,77	110,77
K 24+760	K 24+780	4,20	30,79	129,32
K 24+780	K 24+800	9,80	30,81	301,94
K 24+800	K 24+820	10,40	30,83	320,63
K 24+820	K 24+840	1,20	30,85	37,02
K 24+840	K 24+860	0,00	30,87	0,00

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO

DISTANCIA DESDE LA MINA LA ESMERALDA AL K0+000				6 KM
DESDE	DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 24+860	K 24+880	2,00	30,89	61,78
K 24+880	K 24+900	15,40	30,91	476,01
K 24+900	K 24+920	6,60	30,93	204,14
K 24+920	K 24+940	7,00	30,95	216,65
K 24+940	K 24+960	13,40	30,97	415,00
K 24+960	K 24+980	13,00	30,99	402,87
K 24+980	K 25+000	19,20	31,01	595,39
K 25+000	K 25+020	20,00	31,03	620,60
K 25+020	K 25+040	21,00	31,05	652,05
K 25+040	K 25+060	20,00	31,07	621,40
K 25+060	K 25+080	15,20	31,09	472,57
K 25+080	K 25+100	11,20	31,11	348,43
K 25+100	K 25+120	5,00	31,13	155,65
K 25+120	K 25+140	4,00	31,15	124,60
K 25+140	K 25+160	3,60	31,17	112,21
K 25+160	K 25+180	26,80	31,19	835,89
K 25+180	K 25+200	26,60	31,21	830,19
K 25+200	K 25+220	31,60	31,23	986,87
K 25+220	K 25+240	26,60	31,25	831,25
K 25+240	K 25+260	21,60	31,27	675,43
K 25+260	K 25+280	17,20	31,29	538,19
K 25+280	K 25+300	7,80	31,31	244,22
K 25+300	K 25+320	2,80	31,33	87,72
K 25+320	K 25+340	2,40	31,35	75,24
K 25+340	K 25+360	5,20	31,37	163,12
K 25+360	K 25+380	10,60	31,39	332,73
K 25+380	K 25+400	3,20	31,41	100,51
K 25+400	K 25+420	5,00	31,43	157,15
K 25+420	K 25+440	5,20	31,45	163,54
K 25+440	K 25+460	1,00	31,47	31,47
K 25+460	K 25+480	4,00	31,49	125,96
K 25+480	K 25+500	11,00	31,51	346,61
	K 25+520			
		TOTAL		95.862,61

$\Sigma V = 3496,60$

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

20231

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 17+000	21,80	19,62	2,18	63,01	32,71	1307,56
K 17+020	21,80	19,62	2,18	63,03	32,73	1308,00
K 17+040	21,80	19,62	2,18	63,05	32,75	1308,44
K 17+060	21,80	19,62	2,18	63,07	32,77	1308,87
K 17+080	21,80	19,62	2,18	63,09	32,79	1309,31
K 17+100	21,80	19,62	2,18	63,11	32,81	1309,74
K 17+120	21,80	19,62	2,18	63,13	32,83	1310,18
K 17+140	21,80	19,62	2,18	63,15	32,85	1310,62
K 17+160	21,80	19,62	2,18	63,17	32,87	1311,05
K 17+180	21,80	19,62	2,18	63,19	32,89	1311,49
K 17+200	21,80	19,62	2,18	63,21	32,91	1311,92
K 17+220	21,80	19,62	2,18	63,23	32,93	1312,36
K 17+240	21,80	19,62	2,18	63,25	32,95	1312,80
K 17+260	21,80	19,62	2,18	63,27	32,97	1313,23
K 17+280	21,80	19,62	2,18	63,29	32,99	1313,67
K 17+300	21,80	19,62	2,18	63,31	33,01	1314,10
K 17+320	21,80	19,62	2,18	63,33	33,03	1314,54
K 17+340	21,80	19,62	2,18	63,35	33,05	1314,98
K 17+360	21,80	19,62	2,18	63,37	33,07	1315,41
K 17+380	21,80	19,62	2,18	63,39	33,09	1315,85
K 17+400	21,80	19,62	2,18	63,41	33,11	1316,28
K 17+420	21,80	19,62	2,18	63,43	33,13	1316,72
K 17+440	21,80	19,62	2,18	63,45	33,15	1317,16
K 17+460	21,80	19,62	2,18	63,47	33,17	1317,59
K 17+480	21,80	19,62	2,18	63,49	33,19	1318,03
K 17+500	21,80	19,62	2,18	63,51	33,21	1318,46
K 17+520	21,80	19,62	2,18	63,53	33,23	1318,90
K 17+540	21,80	19,62	2,18	63,55	33,25	1319,34
K 17+560	21,80	19,62	2,18	63,57	33,27	1319,77
K 17+580	21,80	19,62	2,18	63,59	33,29	1320,21
K 17+600	21,80	19,62	2,18	63,61	33,31	1320,64
K 17+620	21,80	19,62	2,18	63,63	33,33	1321,08
K 17+640	21,80	19,62	2,18	63,65	33,35	1321,52
K 17+660	21,80	19,62	2,18	63,67	33,37	1321,95
K 17+680	21,80	19,62	2,18	63,69	33,39	1322,39
K 17+700	21,80	19,62	2,18	63,71	33,41	1322,82
K 17+720	21,80	19,62	2,18	63,73	33,43	1323,26
K 17+740	21,80	19,62	2,18	63,75	33,45	1323,70
K 17+760	21,80	19,62	2,18	63,77	33,47	1324,13
K 17+780	21,80	19,62	2,18	63,79	33,49	1324,57
K 17+800	21,80	19,62	2,18	63,81	33,51	1325,00
K 17+820	21,80	19,62	2,18	63,83	33,53	1325,44
K 17+840	21,80	19,62	2,18	63,85	33,55	1325,88
K 17+860	21,80	19,62	2,18	63,87	33,57	1326,31

CONSORCIO HALCÓN

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

TRANSPORTE MATERIAL DE BASE

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 17+880	21,80	19,62	2,18	63,89	33,59	1326,75
K 17+900	21,80	19,62	2,18	63,91	33,61	1327,18
K 17+920	21,80	19,62	2,18	63,93	33,63	1327,62
K 17+940	21,80	19,62	2,18	63,95	33,65	1328,06
K 17+960	21,80	19,62	2,18	63,97	33,67	1328,49
K 17+980	21,80	19,62	2,18	63,99	33,69	1328,93
K 18+000	21,80	19,62	2,18	64,01	33,71	1329,36
K 18+020	21,80	19,62	2,18	64,03	33,73	1329,80
K 18+040	21,80	19,62	2,18	64,05	33,75	1330,24
K 18+060	21,80	19,62	2,18	64,07	33,77	1330,67
K 18+080	21,80	19,62	2,18	64,09	33,79	1331,11
K 18+100	21,80	19,62	2,18	64,11	33,81	1331,54
K 18+120	21,80	19,62	2,18	64,13	33,83	1331,98
K 18+140	21,80	19,62	2,18	64,15	33,85	1332,42
K 18+160	21,80	19,62	2,18	64,17	33,87	1332,85
K 18+180	21,80	19,62	2,18	64,19	33,89	1333,29
K 18+200	21,80	19,62	2,18	64,21	33,91	1333,72
K 18+220	21,80	19,62	2,18	64,23	33,93	1334,16
K 18+240	21,80	19,62	2,18	64,25	33,95	1334,60
K 18+260	21,80	19,62	2,18	64,27	33,97	1335,03
K 18+280	21,80	19,62	2,18	64,29	33,99	1335,47
K 18+300	21,80	19,62	2,18	64,31	34,01	1335,90
K 18+320	21,80	19,62	2,18	64,33	34,03	1336,34
K 18+340	21,80	19,62	2,18	64,35	34,05	1336,78
K 18+360	21,80	19,62	2,18	64,37	34,07	1337,21
K 18+380	21,80	19,62	2,18	64,39	34,09	1337,65
K 18+400	21,80	19,62	2,18	64,41	34,11	1338,08
K 18+420	21,80	19,62	2,18	64,43	34,13	1338,52
K 18+440	21,80	19,62	2,18	64,45	34,15	1338,96
K 18+460	21,80	19,62	2,18	64,47	34,17	1339,39
K 18+480	21,80	19,62	2,18	64,49	34,19	1339,83
K 18+500	21,80	19,62	2,18	64,51	34,21	1340,26
K 18+520	21,80	19,62	2,18	64,53	34,23	1340,70
K 18+540	21,80	19,62	2,18	64,55	34,25	1341,14
K 18+560	21,80	19,62	2,18	64,57	34,27	1341,57
K 18+580	21,80	19,62	2,18	64,59	34,29	1342,01
K 18+600	21,80	19,62	2,18	64,61	34,31	1342,44
K 18+620	21,80	19,62	2,18	64,63	34,33	1342,88
K 18+640	21,80	19,62	2,18	64,65	34,35	1343,32
K 18+660	21,80	19,62	2,18	64,67	34,37	1343,75
K 18+680	21,80	19,62	2,18	64,69	34,39	1344,19
K 18+700	21,80	19,62	2,18	64,71	34,41	1344,62
K 18+720	21,80	19,62	2,18	64,73	34,43	1345,06
K 18+740	21,80	19,62	2,18	64,75	34,45	1345,50
K 18+760	21,80	19,62	2,18	64,77	34,47	1345,93
K 18+780	21,80	19,62	2,18	64,79	34,49	1346,37
K 18+800	21,80	19,62	2,18	64,81	34,51	1346,80

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 18+820	21,80	19,62	2,18	64,83	34,53	1347,24
K 18+840	21,80	19,62	2,18	64,85	34,55	1347,68
K 18+860	21,80	19,62	2,18	64,87	34,57	1348,11
K 18+880	21,80	19,62	2,18	64,89	34,59	1348,55
K 18+900	21,80	19,62	2,18	64,91	34,61	1348,98
K 18+920	21,80	19,62	2,18	64,93	34,63	1349,42
K 18+940	21,80	19,62	2,18	64,95	34,65	1349,86
K 18+960	21,80	19,62	2,18	64,97	34,67	1350,29
K 18+980	21,80	19,62	2,18	64,99	34,69	1350,73
K 19+000	21,80	19,62	2,18	65,01	34,71	1351,16
K 19+020	21,80	19,62	2,18	65,03	34,73	1351,60
K 19+040	21,80	19,62	2,18	65,05	34,75	1352,04
K 19+060	21,80	19,62	2,18	65,07	34,77	1352,47
K 19+080	21,80	19,62	2,18	65,09	34,79	1352,91
K 19+100	21,80	19,62	2,18	65,11	34,81	1353,34
K 19+120	21,80	19,62	2,18	65,13	34,83	1353,78
K 19+140	21,80	19,62	2,18	65,15	34,85	1354,22
K 19+160	21,80	19,62	2,18	65,17	34,87	1354,65
K 19+180	21,80	19,62	2,18	65,19	34,89	1355,09
K 19+200	21,80	19,62	2,18	65,21	34,91	1355,52
K 19+220	21,80	19,62	2,18	65,23	34,93	1355,96
K 19+240	21,80	19,62	2,18	65,25	34,95	1356,40
K 19+260	21,80	19,62	2,18	65,27	34,97	1356,83
K 19+280	21,80	19,62	2,18	65,29	34,99	1357,27
K 19+300	21,80	19,62	2,18	65,31	35,01	1357,70
K 19+320	21,80	19,62	2,18	65,33	35,03	1358,14
K 19+340	21,80	19,62	2,18	65,35	35,05	1358,58
K 19+360	21,80	19,62	2,18	65,37	35,07	1359,01
K 19+380	21,80	19,62	2,18	65,39	35,09	1359,45
K 19+400	21,80	19,62	2,18	65,41	35,11	1359,88
K 19+420	21,80	19,62	2,18	65,43	35,13	1360,32
K 19+440	21,80	19,62	2,18	65,45	35,15	1360,76
K 19+460	21,80	19,62	2,18	65,47	35,17	1361,19
K 19+480	21,80	19,62	2,18	65,49	35,19	1361,63
K 19+500	21,80	19,62	2,18	65,51	35,21	1362,06
K 19+520	21,80	19,62	2,18	65,53	35,23	1362,50
K 19+540	21,80	19,62	2,18	65,55	35,25	1362,94
K 19+560	21,80	19,62	2,18	65,57	35,27	1363,37
K 19+580	21,80	19,62	2,18	65,59	35,29	1363,81
K 19+600	21,80	19,62	2,18	65,61	35,31	1364,24
K 19+620	21,80	19,62	2,18	65,63	35,33	1364,68
K 19+640	21,80	19,62	2,18	65,65	35,35	1365,12
K 19+660	21,80	19,62	2,18	65,67	35,37	1365,55
K 19+680	21,80	19,62	2,18	65,69	35,39	1365,99
K 19+700	21,80	19,62	2,18	65,71	35,41	1366,42
K 19+720	21,80	19,62	2,18	65,73	35,43	1366,86
K 19+740	21,80	19,62	2,18	65,75	35,45	1367,30

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 19+760	21,80	19,62	2,18	65,77	35,47	1367,73
K 19+780	21,80	19,62	2,18	65,79	35,49	1368,17
K 19+800	21,80	19,62	2,18	65,81	35,51	1368,60
K 19+820	21,80	19,62	2,18	65,83	35,53	1369,04
K 19+840	21,80	19,62	2,18	65,85	35,55	1369,48
K 19+860	21,80	19,62	2,18	65,87	35,57	1369,91
K 19+880	21,80	19,62	2,18	65,89	35,59	1370,35
K 19+900	21,80	19,62	2,18	65,91	35,61	1370,78
K 19+920	21,80	19,62	2,18	65,93	35,63	1371,22
K 19+940	21,80	19,62	2,18	65,95	35,65	1371,66
K 19+960	21,80	19,62	2,18	65,97	35,67	1372,09
K 19+980	21,80	19,62	2,18	65,99	35,69	1372,53
K 20+000	21,80	19,62	2,18	66,01	35,71	1372,96
K 20+020	21,80	19,62	2,18	66,03	35,73	1373,40
K 20+040	21,80	19,62	2,18	66,05	35,75	1373,84
K 20+060	21,80	19,62	2,18	66,07	35,77	1374,27
K 20+080	21,80	19,62	2,18	66,09	35,79	1374,71
K 20+100	21,80	19,62	2,18	66,11	35,81	1375,14
K 20+120	21,80	19,62	2,18	66,13	35,83	1375,58
K 20+140	21,80	19,62	2,18	66,15	35,85	1376,02
K 20+160	21,80	19,62	2,18	66,17	35,87	1376,45
K 20+180	21,80	19,62	2,18	66,19	35,89	1376,89
K 20+200	21,80	19,62	2,18	66,21	35,91	1377,32
K 20+220	21,80	19,62	2,18	66,23	35,93	1377,76
K 20+240	21,80	19,62	2,18	66,25	35,95	1378,20
K 20+260	21,80	19,62	2,18	66,27	35,97	1378,63
K 20+280	21,80	19,62	2,18	66,29	35,99	1379,07
K 20+300	21,80	19,62	2,18	66,31	36,01	1379,50
K 20+320	21,80	19,62	2,18	66,33	36,03	1379,94
K 20+340	21,80	19,62	2,18	66,35	36,05	1380,38
K 20+360	21,80	19,62	2,18	66,37	36,07	1380,81
K 20+380	21,80	19,62	2,18	66,39	36,09	1381,25
K 20+400	21,80	19,62	2,18	66,41	36,11	1381,68
K 20+420	21,80	19,62	2,18	66,43	36,13	1382,12
K 20+440	21,80	19,62	2,18	66,45	36,15	1382,56
K 20+460	21,80	19,62	2,18	66,47	36,17	1382,99
K 20+480	21,80	19,62	2,18	66,49	36,19	1383,43
K 20+500	21,80	19,62	2,18	66,51	36,21	1383,86
K 20+520	21,80	19,62	2,18	66,53	36,23	1384,30
K 20+540	21,80	19,62	2,18	66,55	36,25	1384,74
K 20+560	21,80	19,62	2,18	66,57	36,27	1385,17
K 20+580	21,80	19,62	2,18	66,59	36,29	1385,61
K 20+600	21,80	19,62	2,18	66,61	36,31	1386,04
K 20+620	21,80	19,62	2,18	66,63	36,33	1386,48
K 20+640	21,80	19,62	2,18	66,65	36,35	1386,92
K 20+660	21,80	19,62	2,18	66,67	36,37	1387,35
K 20+680	21,80	19,62	2,18	66,69	36,39	1387,79

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 20+700	21,80	19,62	2,18	66,71	36,41	1388,22
K 20+720	21,80	19,62	2,18	66,73	36,43	1388,66
K 20+740	21,80	19,62	2,18	66,75	36,45	1389,10
K 20+760	21,80	19,62	2,18	66,77	36,47	1389,53
K 20+780	21,80	19,62	2,18	66,79	36,49	1389,97
K 20+800	21,80	19,62	2,18	66,81	36,51	1390,40
K 20+820	21,80	19,62	2,18	66,83	36,53	1390,84
K 20+840	21,80	19,62	2,18	66,85	36,55	1391,28
K 20+860	21,80	19,62	2,18	66,87	36,57	1391,71
K 20+880	21,80	19,62	2,18	66,89	36,59	1392,15
K 20+900	21,80	19,62	2,18	66,91	36,61	1392,58
K 20+920	21,80	19,62	2,18	66,93	36,63	1393,02
K 20+940	21,80	19,62	2,18	66,95	36,65	1393,46
K 20+960	21,80	19,62	2,18	66,97	36,67	1393,89
K 20+980	21,80	19,62	2,18	66,99	36,69	1394,33
K 21+000						
TOTAL						**270.189,20**

Ev: 4060

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	**MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 15+000	K 16+000	1000,00	0,48	480,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 16+000	K 17+000	1000,00	0,48	480,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 17+000	K 18+000	1000,00	0,48	480,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 18+000	K 19+000	1000,00	0,48	480,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 19+000	K 19+500	500,00	0,48	240,00
PASAN:				SUBTOTAL	2160,00
				TOTAL	2160,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

10237

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 15+000	K 15+020	20	0,48	9,60
K 15+020	K 15+040	20	0,48	9,60
K 15+040	K 15+060	20	0,48	9,60
K 15+060	K 15+080	20	0,48	9,60
K 15+080	K 15+100	20	0,48	9,60
K 15+100	K 15+120	20	0,48	9,60
K 15+120	K 15+140	20	0,48	9,60
K 15+140	K 15+160	20	0,48	9,60
K 15+160	K 15+180	20	0,48	9,60
K 15+180	K 15+200	20	0,48	9,60
K 15+200	K 15+220	20	0,48	9,60
K 15+220	K 15+240	20	0,48	9,60
K 15+240	K 15+260	20	0,48	9,60
K 15+260	K 15+280	20	0,48	9,60
K 15+280	K 15+300	20	0,48	9,60
K 15+300	K 15+320	20	0,48	9,60
K 15+320	K 15+340	20	0,48	9,60
K 15+340	K 15+360	20	0,48	9,60
K 15+360	K 15+380	20	0,48	9,60
K 15+380	K 15+400	20	0,48	9,60
K 15+400	K 15+420	20	0,48	9,60
K 15+420	K 15+440	20	0,48	9,60
K 15+440	K 15+460	20	0,48	9,60
K 15+460	K 15+480	20	0,48	9,60
K 15+480	K 15+500	20	0,48	9,60
K 15+500	K 15+520	20	0,48	9,60
K 15+520	K 15+540	20	0,48	9,60
K 15+540	K 15+560	20	0,48	9,60
K 15+560	K 15+580	20	0,48	9,60
K 15+580	K 15+600	20	0,48	9,60
K 15+600	K 15+620	20	0,48	9,60
K 15+620	K 15+640	20	0,48	9,60
K 15+640	K 15+660	20	0,48	9,60
K 15+660	K 15+680	20	0,48	9,60
K 15+680	K 15+700	20	0,48	9,60
K 15+700	K 15+720	20	0,48	9,60
K 15+720	K 15+740	20	0,48	9,60
K 15+740	K 15+760	20	0,48	9,60
K 15+760	K 15+780	20	0,48	9,60
K 15+780	K 15+800	20	0,48	9,60
K 15+800	K 15+820	20	0,48	9,60
K 15+820	K 15+840	20	0,48	9,60
K 15+840	K 15+860	20	0,48	9,60
K 15+860	K 15+880	20	0,48	9,60
K 15+880	K 15+900	20	0,48	9,60
K 15+900	K 15+920	20	0,48	9,60
K 15+920	K 15+940	20	0,48	9,60
K 15+940	K 15+960	20	0,48	9,60
K 15+960	K 15+980	20	0,48	9,60
K 15+980	K 16+000	20	0,48	9,60
K 16+000	K 16+020	20	0,48	9,60
K 16+020	K 16+040	20	0,48	9,60
K 16+040	K 16+060	20	0,48	9,60
K 16+060	K 16+080	20	0,48	9,60
K 16+080	K 16+100	20	0,48	9,60

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 16+100	K 16+120	20	0,48	9,60
K 16+120	K 16+140	20	0,48	9,60
K 16+140	K 16+160	20	0,48	9,60
K 16+160	K 16+180	20	0,48	9,60
K 16+180	K 16+200	20	0,48	9,60
K 16+200	K 16+220	20	0,48	9,60
K 16+220	K 16+240	20	0,48	9,60
K 16+240	K 16+260	20	0,48	9,60
K 16+260	K 16+280	20	0,48	9,60
K 16+280	K 16+300	20	0,48	9,60
K 16+300	K 16+320	20	0,48	9,60
K 16+320	K 16+340	20	0,48	9,60
K 16+340	K 16+360	20	0,48	9,60
K 16+360	K 16+380	20	0,48	9,60
K 16+380	K 16+400	20	0,48	9,60
K 16+400	K 16+420	20	0,48	9,60
K 16+420	K 16+440	20	0,48	9,60
K 16+440	K 16+460	20	0,48	9,60
K 16+460	K 16+480	20	0,48	9,60
K 16+480	K 16+500	20	0,48	9,60
K 16+500	K 16+520	20	0,48	9,60
K 16+520	K 16+540	20	0,48	9,60
K 16+540	K 16+560	20	0,48	9,60
K 16+560	K 16+580	20	0,48	9,60
K 16+580	K 16+600	20	0,48	9,60
K 16+600	K 16+620	20	0,48	9,60
K 16+620	K 16+640	20	0,48	9,60
K 16+640	K 16+660	20	0,48	9,60
K 16+660	K 16+680	20	0,48	9,60
K 16+680	K 16+700	20	0,48	9,60
K 16+700	K 16+720	20	0,48	9,60
K 16+720	K 16+740	20	0,48	9,60
K 16+740	K 16+760	20	0,48	9,60
K 16+760	K 16+780	20	0,48	9,60
K 16+780	K 16+800	20	0,48	9,60
K 16+800	K 16+820	20	0,48	9,60
K 16+820	K 16+840	20	0,48	9,60
K 16+840	K 16+860	20	0,48	9,60
K 16+860	K 16+880	20	0,48	9,60
K 16+880	K 16+900	20	0,48	9,60
K 16+900	K 16+920	20	0,48	9,60
K 16+920	K 16+940	20	0,48	9,60
K 16+940	K 16+960	20	0,48	9,60
K 16+960	K 16+980	20	0,48	9,60
K 16+980	K 17+000	20	0,48	9,60
K 17+000	K 17+020	20	0,48	9,60
K 17+020	K 17+040	20	0,48	9,60
K 17+040	K 17+060	20	0,48	9,60
K 17+060	K 17+080	20	0,48	9,60
K 17+080	K 17+100	20	0,48	9,60
K 17+100	K 17+120	20	0,48	9,60
K 17+120	K 17+140	20	0,48	9,60
K 17+140	K 17+160	20	0,48	9,60
K 17+160	K 17+180	20	0,48	9,60
K 17+180	K 17+200	20	0,48	9,60
K 17+200	K 17+220	20	0,48	9,60
K 17+220	K 17+240	20	0,48	9,60
K 17+240	K 17+260	20	0,48	9,60

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 17+260	K 17+280	20	0,48	9,60
K 17+280	K 17+300	20	0,48	9,60
K 17+300	K 17+320	20	0,48	9,60
K 17+320	K 17+340	20	0,48	9,60
K 17+340	K 17+360	20	0,48	9,60
K 17+360	K 17+380	20	0,48	9,60
K 17+380	K 17+400	20	0,48	9,60
K 17+400	K 17+420	20	0,48	9,60
K 17+420	K 17+440	20	0,48	9,60
K 17+440	K 17+460	20	0,48	9,60
K 17+460	K 17+480	20	0,48	9,60
K 17+480	K 17+500	20	0,48	9,60
K 17+500	K 17+520	20	0,48	9,60
K 17+520	K 17+540	20	0,48	9,60
K 17+540	K 17+560	20	0,48	9,60
K 17+560	K 17+580	20	0,48	9,60
K 17+580	K 17+600	20	0,48	9,60
K 17+600	K 17+620	20	0,48	9,60
K 17+620	K 17+640	20	0,48	9,60
K 17+640	K 17+660	20	0,48	9,60
K 17+660	K 17+680	20	0,48	9,60
K 17+680	K 17+700	20	0,48	9,60
K 17+700	K 17+720	20	0,48	9,60
K 17+720	K 17+740	20	0,48	9,60
K 17+740	K 17+760	20	0,48	9,60
K 17+760	K 17+780	20	0,48	9,60
K 17+780	K 17+800	20	0,48	9,60
K 17+800	K 17+820	20	0,48	9,60
K 17+820	K 17+840	20	0,48	9,60
K 17+840	K 17+860	20	0,48	9,60
K 17+860	K 17+880	20	0,48	9,60
K 17+880	K 17+900	20	0,48	9,60
K 17+900	K 17+920	20	0,48	9,60
K 17+920	K 17+940	20	0,48	9,60
K 17+940	K 17+960	20	0,48	9,60
K 17+960	K 17+980	20	0,48	9,60
K 17+980	K 18+000	20	0,48	9,60
K 18+000	K 18+020	20	0,48	9,60
K 18+020	K 18+040	20	0,48	9,60
K 18+040	K 18+060	20	0,48	9,60
K 18+060	K 18+080	20	0,48	9,60
K 18+080	K 18+100	20	0,48	9,60
K 18+100	K 18+120	20	0,48	9,60
K 18+120	K 18+140	20	0,48	9,60
K 18+140	K 18+160	20	0,48	9,60
K 18+160	K 18+180	20	0,48	9,60
K 18+180	K 18+200	20	0,48	9,60
K 18+200	K 18+220	20	0,48	9,60
K 18+220	K 18+240	20	0,48	9,60
K 18+240	K 18+260	20	0,48	9,60
K 18+260	K 18+280	20	0,48	9,60
K 18+280	K 18+300	20	0,48	9,60
K 18+300	K 18+320	20	0,48	9,60
K 18+320	K 18+340	20	0,48	9,60
K 18+340	K 18+360	20	0,48	9,60
K 18+360	K 18+380	20	0,48	9,60
K 18+380	K 18+400	20	0,48	9,60
K 18+400	K 18+420	20	0,48	9,60

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 18+420	K 18+440	20	0,48	9,60
K 18+440	K 18+460	20	0,48	9,60
K 18+460	K 18+480	20	0,48	9,60
K 18+480	K 18+500	20	0,48	9,60
K 18+500	K 18+520	20	0,48	9,60
K 18+520	K 18+540	20	0,48	9,60
K 18+540	K 18+560	20	0,48	9,60
K 18+560	K 18+580	20	0,48	9,60
K 18+580	K 18+600	20	0,48	9,60
K 18+600	K 18+620	20	0,48	9,60
K 18+620	K 18+640	20	0,48	9,60
K 18+640	K 18+660	20	0,48	9,60
K 18+660	K 18+680	20	0,48	9,60
K 18+680	K 18+700	20	0,48	9,60
K 18+700	K 18+720	20	0,48	9,60
K 18+720	K 18+740	20	0,48	9,60
K 18+740	K 18+760	20	0,48	9,60
K 18+760	K 18+780	20	0,48	9,60
K 18+780	K 18+800	20	0,48	9,60
K 18+800	K 18+820	20	0,48	9,60
K 18+820	K 18+840	20	0,48	9,60
K 18+840	K 18+860	20	0,48	9,60
K 18+860	K 18+880	20	0,48	9,60
K 18+880	K 18+900	20	0,48	9,60
K 18+900	K 18+920	20	0,48	9,60
K 18+920	K 18+940	20	0,48	9,60
K 18+940	K 18+960	20	0,48	9,60
K 18+960	K 18+980	20	0,48	9,60
K 18+980	K 19+000	20	0,48	9,60
K 19+000	K 19+020	20	0,48	9,60
K 19+020	K 19+040	20	0,48	9,60
K 19+040	K 19+060	20	0,48	9,60
K 19+060	K 19+080	20	0,48	9,60
K 19+080	K 19+100	20	0,48	9,60
K 19+100	K 19+120	20	0,48	9,60
K 19+120	K 19+140	20	0,48	9,60
K 19+140	K 19+160	20	0,48	9,60
K 19+160	K 19+180	20	0,48	9,60
K 19+180	K 19+200	20	0,48	9,60
K 19+200	K 19+220	20	0,48	9,60
K 19+220	K 19+240	20	0,48	9,60
K 19+240	K 19+260	20	0,48	9,60
K 19+260	K 19+280	20	0,48	9,60
K 19+280	K 19+300	20	0,48	9,60
K 19+300	K 19+320	20	0,48	9,60
K 19+320	K 19+340	20	0,48	9,60
K 19+340	K 19+360	20	0,48	9,60
K 19+360	K 19+380	20	0,48	9,60
K 19+380	K 19+400	20	0,48	9,60
K 19+400	K 19+420	20	0,48	9,60

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 19+420	K 19+440	20	0,48	9,60
K 19+440	K 19+460	20	0,48	9,60
K 19+460	K 19+480	20	0,48	9,60
K 19+480	K 19+500	20	0,48	9,60
	TOTAL			2.160,00

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

20242

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada para las actividades de **MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19** proviene de **Triturados & Triturados Ltda.**, localizada en el municipio de Castilla La Nueva. Esta fuente no fue la inicialmente utilizada, ni aprobada en los estudios y diseños realizados por la consultoría y entregados por la **AIM**; la fuente inicialmente aprobada fue **Murcia y Murcia**. Sin embargo, debido a la necesidad de avanzar a un ritmo mucho mayor en la obra, el contratista propuso un cambio de proveedor por los constantes problemas presentados por el proveedor inicial. Aunque la planta de Triturados & Triturados Ltda. se encuentra a una distancia mayor del punto inicial del proyecto, el contratista asumirá el costo adicional de esta distancia, por lo que se continuará calculando el transporte a una distancia de 46 km hasta el inicio del proyecto en el punto abs K0+00.

Es importante mencionar que la nueva fuente de material ha sido evaluada y cumple con las especificaciones técnicas. El cambio de proveedor ha sido una medida necesaria para garantizar la continuidad y la calidad de la obra, evitando demoras significativas que podrían afectar la programación establecida.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia en un folio.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 1 Folio (Mapa fuente)


CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

26244

obra

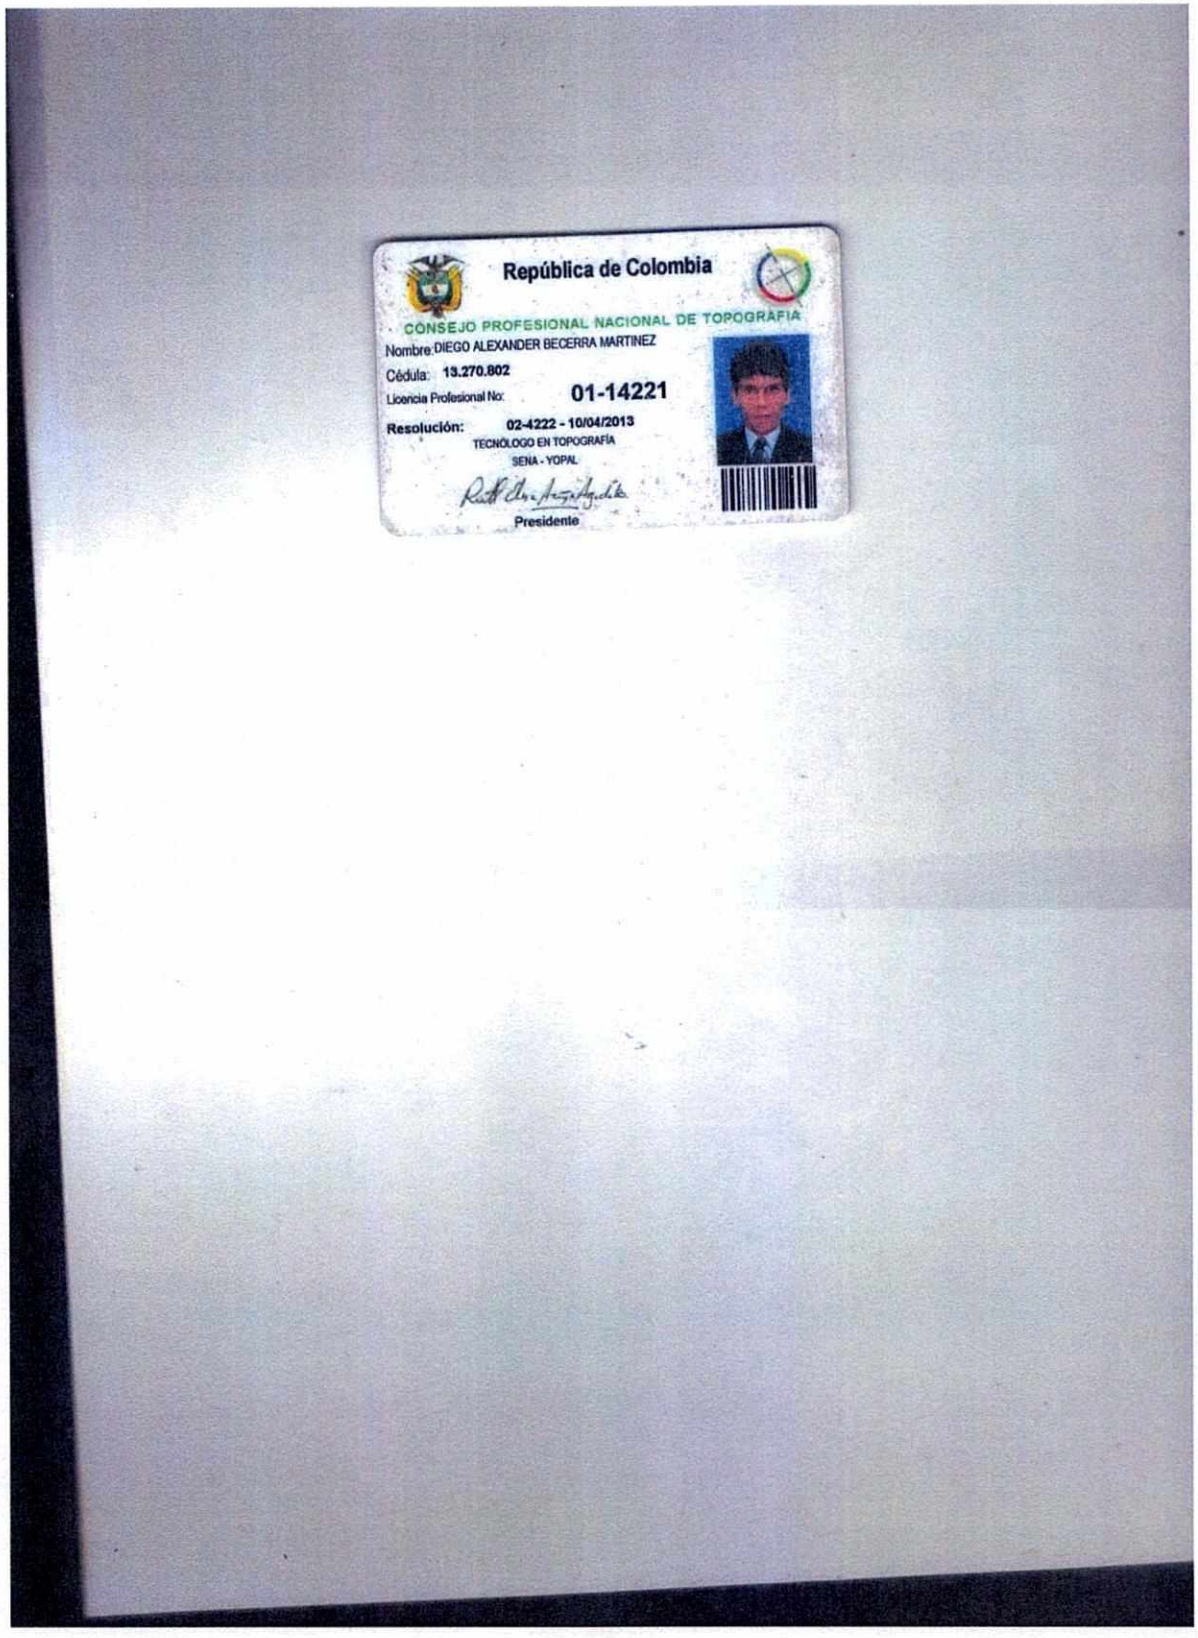
República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA
Nombre DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
Cédula: 13.270.802
Licencia Profesional No: 01-14221
Resolución: 02-4222 - 10/04/2013
TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA - YOPAL
Presidente

Obra

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 480247/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 13270802** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-14221** con fecha de expedición del **10 de Abril de 2013.**

Que el(la) Señor(a) **DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-14221** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **3 días del mes de Septiembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

DIEGO BECERRA M

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

20296

Interventoria

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: FANNY BARRERA GONZALEZ

Cédula: **46.370.853**

Licencia Profesional No.: **01-10580**

Resolución: **02-0581 - 22/02/2001**

Experiencia o fecha de grado: **18/09/1998**

TECNICO PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA DE MINAS Y OBRAS C.
SENA - SOGAMOSO



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia

la documentacion integra acredita al titular para ejercer la profesion de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO
PRESIDENTE

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia.Email:info@cpnt.org.calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

2021

Interventoria.

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 421993/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FANNY BARRERA GONZALEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 46370853** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TÉCNICO PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA DE MINAS Y OBRAS CIVILES** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-10580** con fecha de expedición del **22 de Febrero de 2001.**

Que el(la) Señor(a) **FANNY BARRERA GONZALEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-10580** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **05 días del mes de Septiembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

FANNY BARRERA G.

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

20248

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	ANCHO	TOTAL
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 15+000	K 16+000	1000,00	6,5	6.500,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 16+000	K 17+000	1000,00	6,5	6.500,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 17+000	K 18+000	1000,00	6,5	6.500,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 18+000	K 19+000	1000,00	6,5	6.500,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 19+000	K 19+500	500,00	6,5	3.250,00
PASAN:				SUBTOTAL	29.250,00
				TOTAL	29.250,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20249

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA		TOTAL
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	K15+000	K 19+500	4.500,00		136.001,28
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS					
PASAN:			SUBTOTAL		136.001,28
			TOTAL		136.001,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20250

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 15+020	9,60	61,03	585,89
K 15+040	9,60	61,05	586,08
K 15+060	9,60	61,07	586,27
K 15+080	9,60	61,09	586,46
K 15+100	9,60	61,11	586,66
K 15+120	9,60	61,13	586,85
K 15+140	9,60	61,15	587,04
K 15+160	9,60	61,17	587,23
K 15+180	9,60	61,19	587,42
K 15+200	9,60	61,21	587,62
K 15+220	9,60	61,23	587,81
K 15+240	9,60	61,25	588,00
K 15+260	9,60	61,27	588,19
K 15+280	9,60	61,29	588,38
K 15+300	9,60	61,31	588,58
K 15+320	9,60	61,33	588,77
K 15+340	9,60	61,35	588,96
K 15+360	9,60	61,37	589,15
K 15+380	9,60	61,39	589,34
K 15+400	9,60	61,41	589,54
K 15+420	9,60	61,43	589,73
K 15+440	9,60	61,45	589,92
K 15+460	9,60	61,47	590,11
K 15+480	9,60	61,49	590,30
K 15+500	9,60	61,51	590,50
K 15+520	9,60	61,53	590,69
K 15+540	9,60	61,55	590,88
K 15+560	9,60	61,57	591,07
K 15+580	9,60	61,59	591,26
K 15+600	9,60	61,61	591,46
K 15+620	9,60	61,63	591,65
K 15+640	9,60	61,65	591,84
K 15+660	9,60	61,67	592,03
K 15+680	9,60	61,69	592,22
K 15+700	9,60	61,71	592,42
K 15+720	9,60	61,73	592,61
K 15+740	9,60	61,75	592,80
K 15+760	9,60	61,77	592,99
K 15+780	9,60	61,79	593,18
K 15+800	9,60	61,81	593,38
K 15+820	9,60	61,83	593,57
K 15+840	9,60	61,85	593,76
K 15+860	9,60	61,87	593,95
K 15+880	9,60	61,89	594,14
K 15+900	9,60	61,91	594,34
K 15+920	9,60	61,93	594,53
K 15+940	9,60	61,95	594,72
K 15+960	9,60	61,97	594,91
K 15+980	9,60	61,99	595,10
K 16+000	9,60	62,01	595,30
K 16+020	9,60	62,03	595,49
K 16+040	9,60	62,05	595,68
K 16+060	9,60	62,07	595,87
K 16+080	9,60	62,09	596,06
K 16+100	9,60	62,11	596,26

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 16+120	9,60	62,13	596,45
K 16+140	9,60	62,15	596,64
K 16+160	9,60	62,17	596,83
K 16+180	9,60	62,19	597,02
K 16+200	9,60	62,21	597,22
K 16+220	9,60	62,23	597,41
K 16+240	9,60	62,25	597,60
K 16+260	9,60	62,27	597,79
K 16+280	9,60	62,29	597,98
K 16+300	9,60	62,31	598,18
K 16+320	9,60	62,33	598,37
K 16+340	9,60	62,35	598,56
K 16+360	9,60	62,37	598,75
K 16+380	9,60	62,39	598,94
K 16+400	9,60	62,41	599,14
K 16+420	9,60	62,43	599,33
K 16+440	9,60	62,45	599,52
K 16+460	9,60	62,47	599,71
K 16+480	9,60	62,49	599,90
K 16+500	9,60	62,51	600,10
K 16+520	9,60	62,53	600,29
K 16+540	9,60	62,55	600,48
K 16+560	9,60	62,57	600,67
K 16+580	9,60	62,59	600,86
K 16+600	9,60	62,61	601,06
K 16+620	9,60	62,63	601,25
K 16+640	9,60	62,65	601,44
K 16+660	9,60	62,67	601,63
K 16+680	9,60	62,69	601,82
K 16+700	9,60	62,71	602,02
K 16+720	9,60	62,73	602,21
K 16+740	9,60	62,75	602,40
K 16+760	9,60	62,77	602,59
K 16+780	9,60	62,79	602,78
K 16+800	9,60	62,81	602,98
K 16+820	9,60	62,83	603,17
K 16+840	9,60	62,85	603,36
K 16+860	9,60	62,87	603,55
K 16+880	9,60	62,89	603,74
K 16+900	9,60	62,91	603,94
K 16+920	9,60	62,93	604,13
K 16+940	9,60	62,95	604,32
K 16+960	9,60	62,97	604,51
K 16+980	9,60	62,99	604,70
K 17+000	9,60	63,01	604,90
K 17+020	9,60	63,03	605,09
K 17+040	9,60	63,05	605,28
K 17+060	9,60	63,07	605,47
K 17+080	9,60	63,09	605,66
K 17+100	9,60	63,11	605,86
K 17+120	9,60	63,13	606,05
K 17+140	9,60	63,15	606,24
K 17+160	9,60	63,17	606,43
K 17+180	9,60	63,19	606,62
K 17+200	9,60	63,21	606,82
K 17+220	9,60	63,23	607,01
K 17+240	9,60	63,25	607,20
K 17+260	9,60	63,27	607,39
K 17+280	9,60	63,29	607,58

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 17+300	9,60	63,31	607,78
K 17+320	9,60	63,33	607,97
K 17+340	9,60	63,35	608,16
K 17+360	9,60	63,37	608,35
K 17+380	9,60	63,39	608,54
K 17+400	9,60	63,41	608,74
K 17+420	9,60	63,43	608,93
K 17+440	9,60	63,45	609,12
K 17+460	9,60	63,47	609,31
K 17+480	9,60	63,49	609,50
K 17+500	9,60	63,51	609,70
K 17+520	9,60	63,53	609,89
K 17+540	9,60	63,55	610,08
K 17+560	9,60	63,57	610,27
K 17+580	9,60	63,59	610,46
K 17+600	9,60	63,61	610,66
K 17+620	9,60	63,63	610,85
K 17+640	9,60	63,65	611,04
K 17+660	9,60	63,67	611,23
K 17+680	9,60	63,69	611,42
K 17+700	9,60	63,71	611,62
K 17+720	9,60	63,73	611,81
K 17+740	9,60	63,75	612,00
K 17+760	9,60	63,77	612,19
K 17+780	9,60	63,79	612,38
K 17+800	9,60	63,81	612,58
K 17+820	9,60	63,83	612,77
K 17+840	9,60	63,85	612,96
K 17+860	9,60	63,87	613,15
K 17+880	9,60	63,89	613,34
K 17+900	9,60	63,91	613,54
K 17+920	9,60	63,93	613,73
K 17+940	9,60	63,95	613,92
K 17+960	9,60	63,97	614,11
K 17+980	9,60	63,99	614,30
K 18+000	9,60	64,01	614,50
K 18+020	9,60	64,03	614,69
K 18+040	9,60	64,05	614,88
K 18+060	9,60	64,07	615,07
K 18+080	9,60	64,09	615,26
K 18+100	9,60	64,11	615,46
K 18+120	9,60	64,13	615,65
K 18+140	9,60	64,15	615,84
K 18+160	9,60	64,17	616,03
K 18+180	9,60	64,19	616,22
K 18+200	9,60	64,21	616,42
K 18+220	9,60	64,23	616,61
K 18+240	9,60	64,25	616,80
K 18+260	9,60	64,27	616,99
K 18+280	9,60	64,29	617,18
K 18+300	9,60	64,31	617,38
K 18+320	9,60	64,33	617,57
K 18+340	9,60	64,35	617,76
K 18+360	9,60	64,37	617,95
K 18+380	9,60	64,39	618,14
K 18+400	4,80	64,41	309,17
K 18+420	9,60	64,43	618,53
K 18+440	9,60	64,45	618,72
K 18+460	9,60	64,47	618,91

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 18+480	9,60	64,49	619,10
K 18+500	9,60	64,51	619,30
K 18+520	9,60	64,53	619,49
K 18+540	9,60	64,55	619,68
K 18+560	9,60	64,57	619,87
K 18+580	9,60	64,59	620,06
K 18+600	9,60	64,61	620,26
K 18+620	9,60	64,63	620,45
K 18+640	9,60	64,65	620,64
K 18+660	9,60	64,67	620,83
K 18+680	9,60	64,69	621,02
K 18+700	9,60	64,71	621,22
K 18+720	9,60	64,73	621,41
K 18+740	9,60	64,75	621,60
K 18+760	9,60	64,77	621,79
K 18+780	9,60	64,79	621,98
K 18+800	9,60	64,81	622,18
K 18+820	9,60	64,83	622,37
K 18+840	9,60	64,85	622,56
K 18+860	9,60	64,87	622,75
K 18+880	9,60	64,89	622,94
K 18+900	9,60	64,91	623,14
K 18+920	9,60	64,93	623,33
K 18+940	9,60	64,95	623,52
K 18+960	9,60	64,97	623,71
K 18+980	9,60	64,99	623,90
K 19+000	9,60	65,01	624,10
K 19+020	9,0066	65,03	585,70
K 19+040	9,60	65,05	624,48
K 19+060	9,60	65,07	624,67
K 19+080	9,60	65,09	624,86
K 19+100	9,60	65,11	625,06
K 19+120	9,60	65,13	625,25
K 19+140	9,60	65,15	625,44
K 19+160	9,60	65,17	625,63
K 19+180	9,60	65,19	625,82
K 19+200	9,60	65,21	626,02
K 19+220	9,60	65,23	626,21
K 19+240	9,60	65,25	626,40
K 19+260	9,60	65,27	626,59
K 19+280	9,60	65,29	626,78
K 19+300	9,60	65,31	626,98
K 19+320	9,60	65,33	627,17
K 19+340	9,60	65,35	627,36
K 19+360	9,60	65,37	627,55
K 19+380	9,60	65,39	627,74
K 19+400	9,60	65,41	627,94
K 19+420	9,60	65,43	628,13
K 19+440	4,80	65,45	314,16

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 19+460	9,60	65,47	628,51
K 19+480	9,60	65,49	628,70
K 19+500	9,60	65,51	628,90
K 19+520			
	TOTAL		136.001,28

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+260 (MEDIA)						
PLACA SUPERIOR	3,50	0,25	4,00		1	3,50
PLACA INFERIOR	3,50	0,50	4,00		1	7,00
BORDILLO		0,25	4,20	0,40	1	0,42
ESTRIBO CENTRAL		0,80	5,00	2,5	1	10,00
DENTELLON		0,80	5,00	0,85	1	3,40
MUROS	2,50	0,25	4,00		2,00	5,00
ALETAS		0,25	4,00	2	2	4,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	33,32
					TOTAL	**33,32**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20286

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 22+145						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 33,32					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**67,14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**			

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 22+273						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 67,14					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**100,96**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2025B

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 22+485						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 100,96					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**134,78**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20259

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 22+645						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 134,78					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**168,60**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20260

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 23+268						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: **168,60**					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**202,42**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2021

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 23+365						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 202,42					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**236,24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2026

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 23+790						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 236,24					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**270,06**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20263

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5			

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**					
	BASE MAYOR	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**BASE MENOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 24+130						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 270,06					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**303,88**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 24+360						
ALETAS	2,55	0,20	1,31	1,60	4	2,17
BORDILLO	0,25	0,20	1,40		2	0,14
SOLERA	4,35	0,20	1,27	1,80	2	1,56
DENTELLON	0,27	0,20	3,95		2	0,43
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 303,88					**SUBTOTAL**	33,82
					TOTAL	**337,70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5			

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	VOLUMEN					TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 0+634	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 0+801	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 1+076	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 1+385	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 1+707	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 2+074	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 2+298	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 2+596	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 3+084	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 3+717	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 4+198	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 4+703	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 5+164	33,82					33,82
PASAN: **337,70**					**SUBTOTAL**	439,66
					TOTAL	**777,36**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20266

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	VOLUMEN					TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 5+690	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 5+995	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 6+964	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 7+824	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 8+101	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 8+635	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 9+034	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 9+460	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 9+562	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 9+810	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 11+360	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 11+627	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 11+890	33,82					33,82
PASAN: **777,36**					**SUBTOTAL**	439,66
					TOTAL	**1217,02**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2067

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**					
	VOLUMEN					**TOTAL**
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 12+508	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 12+810	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 13+020	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 14+297	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 14+873	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 15+520	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 15+630	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 15+862	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 16+879	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 17+448	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 17+970	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 18+955	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 19+792	33,82					33,82
PASAN: **1217,02**					**SUBTOTAL**	439,66
					TOTAL	**1656,68**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20268

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	VOLUMEN					TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 19+995	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+420	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+500	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+595	34,32					34,32
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+743	33,82					33,82
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 21+765	33,84					33,84
DESCUENTO CANTIDAD ACUMULADA PARCIAL No. 4						-931,65
PASAN: **1656,68**					**SUBTOTAL**	-728,21
					TOTAL	**928,47**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.2	**DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 22+145						
SOLADO	4,50	0,10	1,27	1,95	1	0,41
PASAN:					SUBTOTAL	0,41
					TOTAL	0,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20240

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5			

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.3	**SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 20+260						
CAJON	4,40	0,10	6,00		1	2,64
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 22+145						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 22+273						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 22+485						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
PASAN:					SUBTOTAL	8,07
					TOTAL	**8,07**



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2021

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5			
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**			
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**UNIDAD**
6.3	**SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)**			**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 22+645						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 23+268						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 23+365						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 23+790						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
PASAN: 8,07					SUBTOTAL	7,24
					TOTAL	15,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2022

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°		2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN		11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.			
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023			
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM			
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5			

CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 24+130						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 24+360						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
PASAN: 15,31					SUBTOTAL	3,62
					TOTAL	18,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE**	**KG**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	PESO POR MODULO (KG)	CANT. MODULOS	BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)	SUB TOTAL	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 20+260					
MEDIO CUERPO	902,05	1,00			902,05
ALETAS, SOLERA, DENTELLON, GUARDARUEDA (1 LADO)	594,95	1,00			594,95
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 20+595					
MEDIO CUERPO	902,05	1,00			902,05
ALETAS Y SOLERA (1 LLADO)	594,95	1,00			594,95
DESCUENTO ACERO COBRADO K20+595 PARCIAL No. 4					-1041,00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 22+145					
CUERPO	145,20	6,50		943,80	943,80
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 22+273					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
PASAN:				**SUBTOTAL**	5032,86
				TOTAL	**5032,86**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.4	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE**	**KG**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	PESO POR MODULO (KG)	CANT. MODULOS	BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)	SUB TOTAL	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 22+485					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 22+645					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 23+268					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 23+365					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
PASAN: **5032,86**				SUBTOTAL	6014,52
				TOTAL	**11047,38**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20725

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 5**

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.4	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE**	**KG**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	PESO POR MODULO (KG)	**CANT. MODULOS**	**BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)**	**SUB TOTAL**	**TOTAL**
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 23+790					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 24+130					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 24+360					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
PASAN: **11047,38**				**SUBTOTAL**	2613,60
				TOTAL	**13660,98**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2026

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO MEDIO BOX CULVERT























ELEMENTO POR ELEMENTO

K20+260









20277

DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO MEDIO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 42 K 20+260

DIAGRAMA			DESCRIPCIÓN	SECCIONES	Cantidad (Un)	LONGITUD (m)	PESO x m(Kg)	Diametro	TOTAL (Kg)
	L:	4,35	PLACA SUPERIOR C2	1,00	29,00	4,75	1,00	1/2"	137,75
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	L:	6,90	PLACA SUPERIOR C1	1,00	19,00	7,30	1,00	1/2"	138,70
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	MUROS LATERALES C1	2,00	8,00	7,30	1,00	1/2"	116,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	2,60	MUROS LATERALES C5	2,00	29,00	3,00	1,00	1/2"	174,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,35	PLACA INFERIOR C4	1,00	42,00	4,85	1,00	1/2"	203,70
	G1:	0,25							
	G2:	0,25							
L	L:	6,9	PLACA INFERIOR C3	1,00	19,00	6,90	1,00	1/2"	131,10
SUBTOTAL									902,05
G1	L:	0,17	GUARDARRUEDA	2,00	18,00	1,88	0,56	3/8	37,90
	L:	0,17							
	L:	0,67							
	L:	0,67							
	G1:	0,10							
	G2:	0,10							
	L:	4,4	GUARDARRUEDA	2,00	1,00	4,40	1,00	1/2"	8,80
	B:	4,40	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,80	1,00	1/2"	19,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,60	DENTELLON	2,00	15,00	1,00	1,00	1/2"	30,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
G1	B:	3,80	DENTELLON	2,00	2,00	4,00	1,00	1/2"	16,00
	G1:	0,20							
	B:	4,50	SOLERA (S3)	2,00	1,00	4,90	1,00	1/2"	9,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,25	1,00	1/2"	10,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,60	1,00	1/2"	11,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,95	1,00	1/2"	11,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,25	1,00	1/2"	12,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,60	1,00	1/2"	13,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,95	1,00	1/2"	13,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,30	1,00	1/2"	14,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	7,15	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,55	1,00	1/2"	15,10
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,50	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,70	1,00	1/2"	1,40
	G1:	0,20							
	B:	0,75	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,95	1,00	1/2"	1,90
	G1:	0,20							
	B:	1,00	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,20	1,00	1/2"	2,40
	G1:	0,20							
	B:	1,25	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,45	1,00	1/2"	2,90
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							

	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA	(S1)	20,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	35,00
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	B: 2,95 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,35	1,00	1/2"	6,70
	B: 3,10 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,50	1,00	1/2"	7,00
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	B: 1,00 G1: 0,60 G2: 0,20	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	1,80	1,00	1/2"	3,60
	B: 1,00 G1: 1,90 G2: 0,20	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 1,00 G1: 2,40 G2: 0,20	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 1,00 G1: 2,70 G2: 0,20	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,90	1,00	1/2"	7,80
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	B: 2,55 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 2,75 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	6,30
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	B: 2,90 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,30	1,00	1/2"	6,60
	B: 3,00 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,40	1,00	1/2"	6,80
	B: 3,05 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,45	1,00	1/2"	6,90
	B: 3,15 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,55	1,00	1/2"	7,10
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 3,30 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,70	1,00	1/2"	7,40

20299

	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	B: 1,60 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,05	1,00	1/2"	4,10
	B: 1,90 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,35	1,00	1/2"	4,70
	B: 2,20 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,65	1,00	1/2"	5,30
	B: 2,50 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	B: 2,70 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	25,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	78,75
	B: 1,10 G2: 0,20	ALETAS (A5)	2,00	12,00	1,30	1,00	1/2"	31,20

TOTAL KG	2.399,05

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 01194-0290
CONSORCIO INTER AIM

2020

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO MEDIO BOX CULVERT






























ELEMENTO POR ELEMENTO

K20+595







20281

DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO MEDIO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 45 K 20+595

DIAGRAMA			DESCRIPCIÓN	SECCIONES	Cantidad (Un)	LONGITUD (m)	PESO x m(Kg)	Diametro	TOTAL (Kg)
	L:	4,35	PLACA SUPERIOR C2	1,00	29,00	4,75	1,00	1/2"	137,75
	L:	6,90	PLACA SUPERIOR C1	1,00	19,00	7,30	1,00	1/2"	138,70
	B:	6,90	MUROS LATERALES C1	2,00	8,00	7,30	1,00	1/2"	116,80
	B:	2,60	MUROS LATERALES C5	2,00	29,00	3,00	1,00	1/2"	174,00
	B:	4,35	PLACA INFERIOR C4	1,00	42,00	4,85	1,00	1/2"	203,70
	L:	6,9	PLACA INFERIOR C3	1,00	19,00	6,90	1,00	1/2"	131,10
			SUBTOTAL						902,05
G1	L:	0,17	GUARDARRUEDA	2,00	18,00	1,88	0,56	3/8	37,90
	L:	0,17							
	L:	0,67							
	L:	0,67							
	G1:	0,10							
	G2:	0,10							
	L:	4,4	GUARDARRUEDA	2,00	1,00	4,40	1,00	1/2"	8,80
	B:	4,40	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,80	1,00	1/2"	19,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,60	DENTELLON	2,00	15,00	1,00	1,00	1/2"	30,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	3,80	DENTELLON	2,00	2,00	4,00	1,00	1/2"	16,00
	G1:	0,20							
	B:	4,50	SOLERA (S3)	2,00	1,00	4,90	1,00	1/2"	9,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,25	1,00	1/2"	10,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,60	1,00	1/2"	11,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,95	1,00	1/2"	11,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,25	1,00	1/2"	12,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,60	1,00	1/2"	13,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,95	1,00	1/2"	13,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,30	1,00	1/2"	14,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	7,15	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,55	1,00	1/2"	15,10
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,50	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,70	1,00	1/2"	1,40
	G1:	0,20							
	B:	0,75	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,95	1,00	1/2"	1,90
	G1:	0,20							
	B:	1,00	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,20	1,00	1/2"	2,40
	G1:	0,20							
	B:	1,25	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,45	1,00	1/2"	2,90
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							

	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	20,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	35,00
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	B: 2,95 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,35	1,00	1/2"	6,70
	B: 3,10 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,50	1,00	1/2"	7,00
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	B: 1,00 G1: 0,60 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	1,00	1,80	1,00	1/2"	3,60
	B: 1,00 G1: 1,90 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 1,00 G1: 2,40 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 1,00 G1: 2,70 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	1,00	3,90	1,00	1/2"	7,80
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	B: 2,55 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	B: 2,75 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	6,30
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	B: 2,90 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,30	1,00	1/2"	6,60
	B: 3,00 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,40	1,00	1/2"	6,80
	B: 3,05 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,45	1,00	1/2"	6,90
	B: 3,15 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,55	1,00	1/2"	7,10
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	B: 3,30 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,70	1,00	1/2"	7,40

20283

	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	B: 1,60 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,05	1,00	1/2"	4,10
	B: 1,90 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,35	1,00	1/2"	4,70
	B: 2,20 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,65	1,00	1/2"	5,30
	B: 2,50 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	B: 2,70 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	25,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	78,75
	B: 1,10 G2: 0,20	ALETAS (A5)	2,00	12,00	1,30	1,00	1/2"	31,20

TOTAL KG	2.399,05

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANDOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 01194-0290
CONSORCIO INTER AIM

2028

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO BOX CULVERT

ELEMENTO POR ELEMENTO

K22+145

K22+273

K22+485

K22+645

K23+268

K23+365

K23+790

K24+130

K24+360

















2025

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

ACERO BOX 1X1

	Diagramas	Cantidad	Diametro	Longitud	Peso
ALETAS					
	0,20 — 1,95 — G2 — 0,20	8	#4	2,35	18,80
	0,20 — 1,91 — G2 — 0,20	8	#4	2,31	18,48
	0,20 — 1,87 — G2 — 0,20	8	#4	2,27	18,16
	0,20 — 1,83 — G2 — 0,20	8	#4	2,23	17,84
	0,20 — 1,79 — G2 — 0,20	8	#4	2,19	17,52
	0,20 — 1,75 — G2 — 0,20	8	#4	2,15	17,20
	0,20 — 1,71 — G2 — 0,20	8	#4	2,11	16,88
	0,20 — 1,67 — G2 — 0,20	8	#4	2,07	16,56
	0,20 — 1,63 — G2 — 0,20	8	#4	2,03	16,24
	0,20 — 1,59 — G2 — 0,20	8	#4	1,99	15,92
	0,20 — 1,55 — G2 — 0,20	8	#4	1,95	15,60
	0,20 — 1,51 — G2 — 0,20	8	#4	1,91	15,28
	0,20 — 1,47 — G2 — 0,20	8	#4	1,87	14,96
	2	48	#4	2	96,00
	1,40	8	#4	1,4	11,20
	Sub total	**160**			**326,64**
BORDILLOS					
B1	0,20 — 1,3 — 0,20	12	#4	1,7	20,40
	0,70 / 0,20 / 0,70	12	#3	1,6	10,75
	Sub total	**24**			**31,15**

20286



ZARPA Y DENTELLON				
	12	#4	4,6	55,20
	4	#4	4,33	17,32
	4	#4	3,85	15,40
	4	#4	3,37	13,48
	4	#4	2,89	11,56
	4	#4	2,41	9,64
	4	#4	1,94	7,76
	24	#4	1,7	40,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	26	#4	1,05	27,30
	26	#4	1,05	27,30
Sub total	**152**			**274,64**

TOTAL ALETAS, BORDILLOS, DENTELLON		
Cantidad de elementos		**Peso**
336		632,43

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

BOX 1 X 1

Cantidad de acero elemento por elemento Box Culvert Proyecto. BPIN 2021005500215 - La Estaca - Veracruz

Diagrama	DIAMETRO	PESO ACERO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	PESO TOTAL
ACERO POR MODULO					
ANILLO INTERNO					
	#4	1	4,8	2	9,6
	#4	1	1,67	8	13,36
	#4	1	1,72	8	13,76
	#4	1	1,315	20	26,3
ANILLO EXTERNO					
	#4	1	5,58	6	33,48
	#4	1	1,315	20	26,3
	#4	1	0,8	28	22,4

PESO TOTAL POR MODULO	145,20

TOTAL BOX CULVERT			
CANTIDAD DE MODULOS	PESO POR MODULO	PESO ALETAS/BORDILLO/DENTELLON	PESO TOTAL BOX (KG)
5	145,20	632,43	1358,43
5,5	145,20	632,43	1431,03
6	145,20	632,43	1503,63
6,5	145,20	632,43	1576,23

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 01194-0290
CONSORCIO INTER AIM

20288

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.5	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN POR MODULO	CANTIDAD DE MODULOS	VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA	SUB TOTAL	TOTAL
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 20+260	**LONGITUD**	**ANCHO / ALTO**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	
PLACA SUPERIOR E INFERIOR (MEDIO CUERPO)	4,5	3,5	0,35	2	11,03
MUROS (MEDIO CUERPO)	3,5	2	0,25	2	3,50
SOLERA DEL ENCOLE	5,78	1,6	0,25	1	2,31
DENTELLON DEL ENCOLE	4,5	0,45	0,3	1	0,61
ALETAS DEL ENCOLE	2,5	2,05	0,2	2	2,05
GUARDARRUEDA IZQUIERDO	4,5	0,4	0,28	1	0,50
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 20+595					
SOLERA DEL ENCOLE	5,78	1,6	0,25	1	2,31
DENTELLON DEL ENCOLE	4,5	0,45	0,3	1	0,61
ALETAS DEL ENCOLE	2,5	2,05	0,2	1	1,03
GUARDARRUEDA IZQUIERDO	4,5	0,4	0,28	1	0,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	24,45
				TOTAL	**24,45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

202 891

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.5	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN POR MODULO	CANTIDAD DE MODULOS	VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA	SUB TOTAL	TOTAL
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 22+145					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6,5	6,72	15,42	15,42
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 22+273					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 22+485					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 22+645					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
PASAN: 24,45				**SUBTOTAL**	59,67
				TOTAL	**84,12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

10290


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.5	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN POR MODULO	CANTIDAD DE MODULOS	VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA	SUB TOTAL	TOTAL
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 23+268					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 23+365					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 23+790					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 24+130					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 24+360					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	6,72	14,75	14,75
PASAN: 84,12				SUBTOTAL	73,75
				TOTAL	**157,87**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

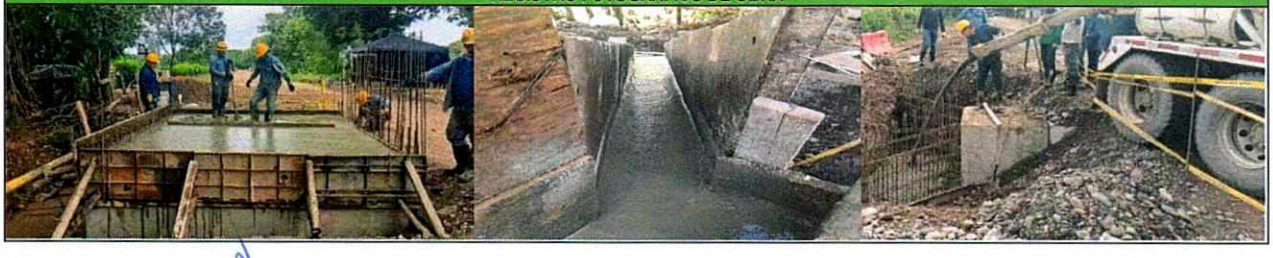

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20291

CONSORCIO HALCÓN

CONCRETO BOX CULVERT

K22+145

K22+273

K22+485

K22+645

K23+268

K23+365

K23+790

K24+130

K24+360

20292

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

LOSA SUPERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,2	0,4	1	0,36
LOSA INFERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,25	0,5	1	0,46
PAREDES LATERALES					
LONGITUD	ALTO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1	0,2	0,26	2	0,52

VOLUMEN TOTAL POR MODULO	1,339

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 01194-0290
CONSORCIO INTER AIM

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONCRETO ZARPA, DENTELLON, BORDILLO Y ALETAS BOX CULVERT 1 X 1

DIAGRAMA	DESCRIPCION	BASE MAYOR	BASE MENOR	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN m3
1.60 m, 2.15 m, e = 0.25 m, 4.20 m	ZARPA	4,20	1,60	2,15	0,25	2,00	3,118
e = 0.25 m, 0.45m, 4.20 m	DENTELLON	4,20		0,45	0,25	2,00	0,945
0.25 m, e = 0.20 m, 0.72 m, 0.30 m	BORDILLO	0,30	0,25	0,72	0,20	2,00	0,079
1.92 m, e = 0.20 m, 1.92 m, 2.0 m	ALETAS	1,92	1,30	2,00	0,20	4,00	2,576

TOTAL m3	6,718

TOTAL BOX CULVERT 1X1			
CANTIDAD DE MODULOS	VOLUMEN POR MODULO	VOLUMEN ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARD ARUEDA	VOL. TOTAL BOX (KG)
5	1,339	6,718	13,41
5,5	1,339	6,718	14,08
6	1,339	6,718	14,75
6,5	1,339	6,718	15,42

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 01194-0290
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5		

CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K20+595 (MEDIO)	1,00	3,65	3,80		13,87
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K20+260 (MEDIO)	1,00	3,65	3,80		13,87
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K22+273	0,80	1,55	8,25		10,23
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K22+485	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K22+645	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K23+268	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K23+365	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K23+790	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K24+130	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K24+360	0,80	1,55	7,60		9,42
PASAN:				SUBTOTAL	103,91
				TOTAL	103,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20245

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DIAS			CANTIDAD	TOTAL
MANEJO DE AGUA DE EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLAS	35,00			1	35
PASAN: .				SUBTOTAL	35,00
				TOTAL	35,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

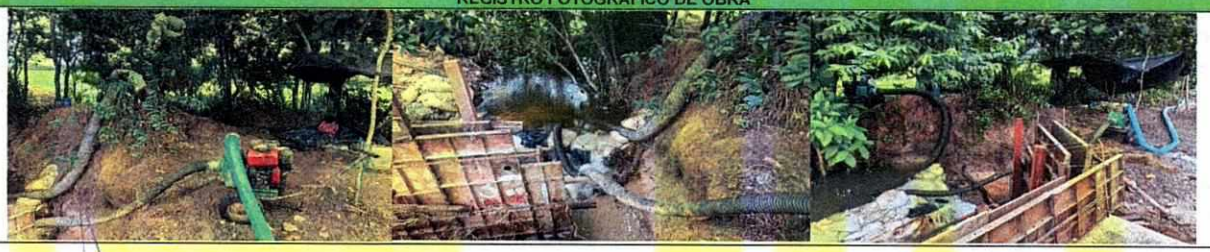

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2026

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500215
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	5	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	31/07/2024 a 5/09/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 30.157.618.889,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camelingenieria.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	239- 2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
PAGA 1	PERSONAL												
PAGA 1.1	CONDUCTOR CARROTANQUE	MES	$ 1.907.575,00	$ 19.396.550,00	0,00	$ -	0,80	$ 15.488.975,00	0,19	$ 3.688.501,00	0,99	$ 19.177.476,00	99%
PAGA 1.2	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00	$ 60.354.504,00	0,00	$ -	0,59	$ 35.818.586,68	0,00	$ -	0,59	$ 35.818.586,68	59%
PAGA 1.3	RESIDENTE AMBIENTAL	MES	$ 6.424.083,00	$ 22.814.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 22.814.800,00	0,00		1,00	$ 22.814.800,00	100%
PAGA 1.4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MES	$ 2.818.532,00	$ 3.306.361,24	0,00	$ -	1,00	$ 3.306.361,24	0,00		1,00	$ 3.306.361,24	100%
	SUBTOTAL			**$ 105.872.215,24**		**$ -**		**$ 77.428.722,92**		**$ 3.688.501,00**		**$ 81.117.223,92**	
PAGA 2	MATERIALES												
PAGA 2.1	COMBUSTIBLE CARROTANQUE	GLN		$ 6.619.000,00	0,00	$ -	0,61	$ 4.009.923,00	0,00		0,61	$ 4.009.923,00	61%
PAGA 2.2	SUMINISTRO DE AGUA	LTR	$ 21,02	$ 17.626.023,40	0,00	$ -	0,84	$ 14.867.425,60	0,00		0,84	$ 14.867.425,60	84%
	SUBTOTAL			**$ 24.245.023,40**		**$ -**		**$ 18.877.348,60**		**$ -**		**$ 18.877.348,60**	
PAGA 3	MAQUINARIA												
PAGA 3.1	ALQUILER CARROTANQUE	MES	$ 11.980.698,16	$ 117.200.263,68	0,00	$ -	0,82	$ 96.060.803,76	0,16	$ 18.376.056,06	0,98	$ 114.436.859,82	98%
	SUBTOTAL			**$ 117.200.263,68**		**$ -**		**$ 96.060.803,76**		**$ 18.376.056,06**		**$ 114.436.859,82**	
PAGA 4	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES												
PAGA 4.1	SERVICIO DE BAÑOS	UND	$ 1.190.000,00	$ 33.923.143,68	0,00	$ -	0,64	$ 21.781.000,00	0,21	$ 7.140.000,00	0,85	$ 28.921.000,00	85%
	SUBTOTAL			**$ 33.923.143,68**		**$ -**		**$ 21.781.000,00**		**$ 7.140.000,00**		**$ 28.921.000,00**	
PAGA 5	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES												
PAGA 5.1	PUNTO ECOLOGICO	UND	$ 330.000,00	$ 330.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 330.000,00	0,00		1,00	$ 330.000,00	100%
	SUBTOTAL			**$ 330.000,00**		**$ -**		**$ 330.000,00**		**$ -**		**$ 330.000,00**	
PAGA 6	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS												
PAGA 6.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	$ 7.944.000,00	$ 7.944.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.944.000,00	0,00		1,00	$ 7.944.000,00	100%
	SUBTOTAL			**$ 7.944.000,00**		**$ -**		**$ 7.944.000,00**		**$ -**		**$ 7.944.000,00**	
PAGA 7	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES												
PAGA 7.1	OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	MES	$ 2.500.000,00	$ 27.729.500,00	0,00	$ -	0,79	$ 21.799.064,52	0,18	$ 4.999.999,00	0,97	$ 26.799.063,52	97%
	SUBTOTAL			**$ 27.729.500,00**		**$ -**		**$ 21.799.064,52**		**$ 4.999.999,00**		**$ 26.799.063,52**	
PAGA 8	ATENCION A LA COMUNIDAD												
PAGA 8.1	BUZON SATELITAL	UND	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 70.000,00	0,00		1,00	$ 70.000,00	100%
	SUBTOTAL			**$ 70.000,00**		**$ -**		**$ 70.000,00**		**$ -**		**$ 70.000**	
	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	VISITA DE EVALUACIÓN - PERMISO DE CONSESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES	UND	$ 6.971.794,00	$ 7.671.794,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.971.794	0,09	$ 700.000,00	1,09	$ 7.671.794,00	100%
N.P.1	PODA DE ARBOLES	UND	$ 2.588.583,00		0,00	$ -	1,00	$ 2.588.583	0,00	$ -	1,00	$ 2.588.583,00	100%
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 317.314.146,00**		**$ -**		**$ 253.851.316,80**		**$ 34.904.556,06**		**$ 288.755.872,86**	
	VALOR TOTAL PAGA			**$ 317.314.146,00**		**$ -**		**$ 253.851.316,80**		**$ 34.904.556,06**		**$ 288.755.872,86**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500215

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	317.314.146,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	$	317.314.146,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	317.314.146,00
ANTICIPO 0%	$	-
PRESENTE ACTA	$	34.904.556,06
ACUMULADO	$	288.755.872,86

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
RELACIÓN DE ACTAS			NETO PARCIAL	
ACTA 1	$	114.233.092,56	$	114.233.092,56
ACTA 2	$	76.155.395,04	$	76.155.395,04
ACTA 3	$	47.597.121,90	$	47.597.121,90
ACTA 4	$	15.865.707,30	$	15.865.707,30
PRESENTE ACTA	$	34.904.556,06	$	34.904.556,06
TOTALES	$	288.755.872,86	$	288.755.872,86

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	288.755.872,86	91,00
POR EJECUTAR	$	28.558.273,14	9,00
TOTALES	$	317.314.146,00	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 20211301010978 (Registro Presupuestal No. 1002-2,3,24,02,0600,134,00 AR de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PARCIAL N°1	$ 114.233.092,56	$ 114.233.092,56	$ 114.233.092,56
2	PARCIAL N°2	$ 76.155.395,04	$ 76.155.395,04	$ 190.388.487,60
3	PARCIAL N°3	$ 47.597.121,90	$ 47.597.121,90	$ 237.985.609,50
4	PARCIAL N° 4	$ 15.865.707,30	$ 15.865.707,30	$ 253.851.316,80
5	PRESENTE ACTA	$ 34.904.556,06	$ 34.904.556,06	$ 288.755.872,86
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 28.558.273,14		$ 317.314.146,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha ____: NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 06 SET. 2024

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Paola Andrea
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0119[illegible]290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 185521-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20208

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05

CAPITULO:	**PAGA 1 - PERSONAL**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PAGA 1.1	**CONDUCTOR CARROTANQUE**	**MES**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	MES	**VALOR MES**	**%**		**TOTAL**
CONDUCTOR CARROTANQUE	JULIO 2024	$ 1.907.575,00	93,36%		$ 1.780.926,00
CONDUCTOR CARROTANQUE	AGOSTO 2024	$ 1.907.575,00	100,00%		$ 1.907.575,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 3.688.501,00
				TOTAL	$ 3.688.501,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20249

JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CARROTANQUE	CAMPO ELIAS BOHORQUEZ CASTAÑEDA	119887357	$ 1.780.926,00	$ 1.780.926,00
AGOSTO 2024					
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CARROTANQUE	CAMPO ELIAS BOHORQUEZ CASTAÑEDA	119887357	$ 2.106.744,00	$ 1.907.575,00
TOTAL					**$ 3.688.501,00**

FIRMA:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

20300

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3580**

Nombre: **CAMPO ELIAS BOHORQUEZ CASTANEDA**
Identificación: **1119887357**
Cargo: **CONDUCTOR DE CARROTANQUE**
Salario básico: **$1,609,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	20.00	$ 1,072,667.00	Fondo de salud	0	$ 72,736.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	20.00	$ 108,000.00	Fondo de pensión	0	$ 72,736.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 53,633.00			
Horas extras diurnas 125%	7.00	$ 59,910.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 95,855.00			
Incapacidad por enfermedad general al 100%	10.00	$ 536,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,926,398.00**	**Total Deducciones**		**$ 145,472.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,780,926.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20301

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4083**

Nombre: **CAMPO ELIAS BOHORQUEZ CASTANEDA**
Identificación: **1119887357**
Cargo: **CONDUCTOR DE CARROTANQUE**
Salario básico: **$1,609,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,609,000.00	Fondo de salud	0	$ 84,554.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 84,554.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 53,633.00			
Horas extras diurnas 125%	18.00	$ 157,402.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	24.00	$ 293,817.00			
Total Ingresos		**$ 2,275,852.00**	**Total Deducciones**		**$ 169,108.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,106,744.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20302

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 05**
CAPITULO:	**PAGA 3 - MAQUINARIA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PAGA 3.1	**ALQUILER CARROTANQUE**	**MES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES	VALOR MES	%		TOTAL
ALQUILER CARROTANQUE	JULIO 2024	$ 11.980.698,16	66,90%		$ 8.014.781,30
ALQUILER CARROTANQUE	AGOSTO 2024	$ 11.980.698,16	86,48%		$ 10.361.274,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 18.376.056,06
				TOTAL	$ 18.376.056,06

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

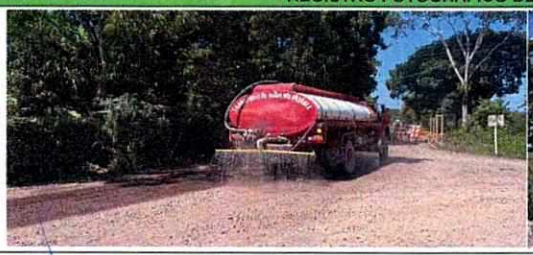



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20303

MES	DESCRIPCIÓN	PLACA	No. TRANSACCION	VALOR MES	VALOR DESCUENTO PMA
JULIO 2024	ALQUILER CARROTANQUE	TPX 671	710A3212422900EZ	$ 9.839.990,00	$ 8.014.781,30
AGOSTO 2024	ALQUILER CARROTANQUE	TPX 671	710A3212422900F6	$ 13.284.000,00	$ 10.361.274,76
TOTAL DESCUENTO PMA					$ 18.376.056,06

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

20304

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/08/16	2024/08/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CALDERON S.A.S	**No. Producto**	84155856849
No. Identificación	9003273075	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	23
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/08/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/08/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$9,839,990.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A3212422900EZ
Estado	DEB	**Información**	SERV TRANSPORTE CARROTANQUE
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OHP004KIJN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20305

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/08/16	2024/08/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LIBARDO ROJAS MEDINA	**No. Producto**	03111480361
No. Identificación	9532241	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	30
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/08/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/08/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$13,284,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A3212422900F6
Estado	DEB	**Información**	SERV CARROTANQUE SENCILLO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OHP004KIJN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20306

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05

CAPITULO:	**PMA 4 - MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 4.1	**SERVICIO DE BAÑOS**	**MES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES TRANSACCIÓN	MES COBRADO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO DE BAÑOS	JULIO 2024	JUNIO 2024	$ 1.190.000,00	3	$ 3.570.000,00
SERVICIO DE BAÑOS	JULIO 2024	MAYO 2024	$ 1.190.000,00	3	$ 3.570.000,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 7.140.000,00
				TOTAL	$ 7.140.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20307

MES TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	DISTRIBUIDOR	No. TRANSACCION	VALOR TOTAL COBRAR
JULIO 2024	SERVICIO DE BAÑOS JUNIO 2024	SOLUCIONES INTEGRALES DE AMERICA	710A32124192018W	$ 3.570.000,00
JULIO 2024	SERVICIO DE BAÑOS MAYO 2024	SOLUCIONES INTEGRALES DE AMERICA	710A3212413100SV	$ 3.570.000,00
TOTAL				$ 7.140.000,00

FIRMA:

ROQUE ELIECER ALBA GONZALES
ASESOR AMBIENTAL
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON
ASESOR AMBIENTAL
Consorcio Inter AIM

2030

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/07/10	2024/07/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SOLUCIONESINTEGRALES DE AMERIC	**No. Producto**	108969957472
No. Identificación	9011083016	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	60
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,073,643.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32124192018W
Estado	DEB	**Información**	ALQ DE BAÑOS JUNIO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGJ004N4KO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20309

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/07/10	2024/07/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SOLUCIONESINTEGRALES DE AMERIC	**No. Producto**	108969957472
No. Identificación	9011083016	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	61
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,073,643.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32124192018X
Estado	DEB	**Información**	ALQ DE BANOS MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGJ004N4KO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20310

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05
CAPITULO:	**PMA 7 - MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 7.1	**OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD**	**MES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES	VALOR MES	%		TOTAL
OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	JULIO 2024	$ 2.500.000,00	100,00%		$ 2.500.000,00
OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	AGOSTO 2024	$ 2.500.000,00	100,00%		$ 2.499.999,00
PASAN:				SUBTOTAL	$ 4.999.999,00
				TOTAL	$ 4.999.999,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20311

MES	DESCRIPCIÓN	No. TRANSACCION	VALOR MES	VALOR DESCUENTO PMT
JULIO 2024	OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A321241920199	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
AGOSTO 2024	OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A3212422900ES	$ 2.500.000,00	$ 2.499.999,00
TOTAL				$ 4.999.999,00

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

20312

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/08/16	2024/08/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FARIDE PEREZ LOPEZ	No. Producto	05751313294
No. Identificación	21181193	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	16
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/08/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/08/16	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$2,499,999.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	710A3212422900ES
Estado	DEB	Información	ARREND LOTE VDA CHEPERO
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OHP004KIJN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20313

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/07/10	2024/07/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FARIDE PEREZ LOPEZ	**No. Producto**	05751313294
No. Identificación	21181193	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	77
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,500,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A321241920199
Estado	DEB	**Información**	ARRIENDO LOTE CHEPERO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGJ004N4KO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

20314

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 05**
CAPITULO:	**N.P.1 - ÍTEMS NO PREVISTOS**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.1	**PAGO VISITA DE EVALUACIÓN DEL PERMISO DE CONSESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES**	**UNIDAD**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	MES	**VALOR TRAMITE**	**%**		**TOTAL**
PUBLICACIÓN DEL PERMISO DE CONSESIÓN DE AGUAS EN EL PERIODICO DEL META	AGOSTO 2024	$ 700.000,00	100,00%		$ 700.000,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 700.000,00
				TOTAL	$ 700.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2031S

MES	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA	DISTRIBUIDOR	VALOR MES	VALOR DESCUENTO PMT
AGOSTO 2024	PUBLICACIÓN DEL PERMISO DE CONSESIÓN DE AGUAS EN EL PERIODICO DEL META	PMFE 934	GRUPO EDITORIAL PERIODICO DEL META SAS	$ 700.000,00	$ 700.000,00
TOTAL					$ 700.000,00

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

20316

PERIÓDICO del Meta

GRUPO EDITORIAL PERIODICO DEL META SAS
NIT 900.563.768-8
Calle 41 N° 25-31 Barrio Emporio
Tel: 6741032
Villavicencio - Colombia
gerencia@periodicodelmeta.com
periodicodelmeta.com

Factura electrónica de venta
No. PMFE 934

Señores	CONSORCIO HALCÓN		
NIT	901.666.148-8	**Teléfono**	(608) 3106965106 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 #24-50	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2024, 09:16
Expedición	13/08/2024, 09:16
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESOLUCION CORMACARENA 0745 - Expediente No. 3.37.2.8.024.005	1.00	700,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 700,000.00

Total Bruto	700,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	700,000.00

Observaciones:
Pertenecemos al regimen simple de tributación

Publicación - RESOLUCION CORMACARENA 0745 - Expediente No. 3.37.2.8.024.005
Edición 462

Consígnese Unicamente a favor de :GRUPO EDITORIAL PERIODICO DEL META S.A.S.
A LA CUENTA CORRIENTE No. 601439979 DEL BANCO AV VILLAS.
Favor enviar el comprobante de pago a los correos:
GERENCIA@PERIODICODELMETA.COM y
CONTABILIDAD@PERIODICODELMETA.COM


Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056027126 aprobado en 20230913 prefijo PMFE desde el número 703 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas Tarifa 6x1000
CUFE: fec051baf69cd2a71bf014bcd52f1a1f1281732348ba6aaff6ca5ef7e7d657389ef1cab48f65057846795a985777cc22

2031A

EL EVENTO

En Acacías, condecoran a presidente de Hocol

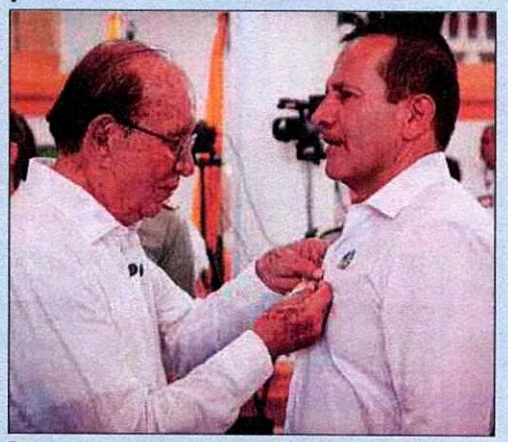

Por su contribución al desarrollo y progreso de Acacías, el alcalde Carlos Plata otorgó la condecoración Orden Cruz de los Fundadores a Luis Enrique Rojas Cuéllar, presidente de Hocol. La ceremonia de reconocimiento se realizó el miércoles 7 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Celebraron los cumpleaños de Ian Jiménez



Recientemente cumplió cuatro años de edad Ian Jiménez Alcántara. Sus papitos Edwin y Zulma, familiares y amigos lo felicitaron ese día y piden que la vida lo siga bendiciendo.

SE VENDE

Apartamento en Multifamiliares Los Centauros, segundo piso bloque B

Informe 3103319072

SE ARRIENDA

Barrio La Grama en Villavicencio, se arrienda casa para empresa. 300 metros cuadrados. Con garaje, tanque subterraneo de cinco mil litros, amplio salón, cuatro oficinas, dos patios, cuatro baños.

Informe 3103319072

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA RECLAMAR LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

AGROINDUSTRIALES Y CARNICOS EL GOURMET SAS, con domicilio en la **AUTOPISTA SUR No. 66 – 78 en la ciudad de Bogotá**. Se permite informar: Que el día 25 de julio de 2024, falleció el señor **DUVERNEY NOVOA DOMÍNGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1122.918.440

Se da el presente aviso con el fin de que aquellas personas que se consideren con el derecho de reclamar la liquidación de las prestaciones sociales, puedan acercarse a la **AUTOPISTA SUR No. 66 – 78 en la ciudad de Bogotá**, en el horario de lunes a viernes 07:40 am a 5:30 pm y Sábados 07:40am a 12:30 mm, o al correo carneselgourmetltda@gmail.com y recursoshumanos@inverganaderas.com.co, o comunicarse al número 323 220 0660 para validar y seguir el proceso, lo anterior dando cumplimiento al artículo 212 del código sustantivo del trabajo.

PRIMER AVISO

DISCUL.PAS PUBLICAS

Yo, Yeison Stiven Hortua Hernandez, identificado con cédula de Ciudadania No.1.121.888.719, pido perdón y excusas públicas a Siluith Rocio Cardenas Mendoza, identificada con cédula de ciudadania No:1.121.915.104, por los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, los cuales generaron el proceso penal por violencia intrafamiliar con radicado: 500016000564-2024-03091
Como ciudadano me comprometo a no volver a cometer ningún acto de violencia en contra de cualquier persona.
Pido disculpas a mis padres e hijos por haber cometido estos actos los cuales van en contra de los principios y valores inculcados y sobre los cuales debo ser ejemplo.

COMUNICACIÓN EXTERNA
PRIMER AVISO

CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S., domiciliada en la ciudad de Bogotá, en la Avenida Calle 26 No. 57-83 oficina 1001 T7, de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que:

El señor **JORGE ENRIQUE SEVILLA SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía **3.210.979 de Tocancipá**, falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día 01 del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Por lo cual, las personas que se crean con derecho a reclamar salarios pendientes de pago, prestaciones sociales y demás acreencias laborales, en calidad de beneficiarios, deberán presentarse en nuestras oficinas ubicadas en la sede de Boquerón dirección K3+330 Vía Bogotá Villavicencio, con el fin de acreditar su derecho anexando carta formal de reclamación y documentos pertinentes que acrediten dicha calidad.

9 de agosto de 2024.

CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S.
900.848.064 - 6

LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META

HACE SABER:

Que el día 6 de mayo de 2024 falleció la señora **UZZIELY AYCHEL GARCIA LEITON** (q.e.p.d) quién en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No 40.445.907 expedida en Villavicencio -Meta.

Que a reclamar la **PENSIÓN SOBREVIVIENTE** se presentó ante esta dependencia el señor **WILLIAM BAUTISTA CRUZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 86.060.421** expedida en Villavicencio - Meta en calidad de Cónyuge supérstite.

Que quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar el respectivo reclamo en la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, ubicada en la Carrera 33 No 38 - 45, Centro, Piso 2, Gobernación del Meta, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

ASTRID AMPUDIA VASQUEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SEGUNDO AVISO

Minambiente

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA -

Cormacarena

RESOLUCION NÚ PS-GJ.1.2.6.24. 0745
EXPEDIENTE No. 3.37.2.8.024.005

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, SE ESTABLECE UNA MEDIDA DE COMPENSACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", en encargo de las funciones de Director General de esta Autoridad Ambiental, en ejercicio de sus funciones legales y las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, y Decreto 1076 de 2015 y,

Tipo de trámite administrativo	Concesión de aguas superficiales
Titular	Agencia para la Infraestructura del Meta- AIM
Nombre del predio	Vía nacional Ruta 65 (abscisa K13 + 295 y abscisa K16 + 820)
Nombre de la fuente de captación	Caño Curimaje
Caudal en época de lluvias	12716 L/s
Caudal en época de estaje	-
Caudal ambiental	-
Periodo de captación	Todo el año
Uso	Uso industrial
Total caudal concesionado	1.97 L/s

RESUELVE

Artículo 1°. - Acoger el concepto técnico No. PM-GA.3.44.24.933 del 2° de julio de 2024, emitido por el grupo Agua adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, el cual hará parte integral del presente acto administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones y condiciones entradas de los mismos y del presente acto administrativo.
Artículo 2°. - Otorgar concesión de aguas superficiales a captar sobre la fuente hídrica caño Curimaje, en la Vía nacional Ruta 65 (abscisa K13 + 295 y abscisa K16 + 820), en las coordenadas geográficas N 2028660 746 E 4962593 054 en la vereda La Venturosa y N2025450 569 E 4965704 155 en la vereda Cuarteles, por todo el año, por un caudal total de 1,97 L/s para uso industrial, a favor de la Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT. 900.220.547-5, en adelante el titular, en beneficio del proyecto BPIN 2021005500215 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN LE MUNICIPIO DE CUMARAL, META".
Parágrafo 1. - Se tendrá en cuenta las siguientes características de la captación:

DATOS DEL PREDIO	
Nombre del predio	Vía nacional Ruta 65 (abscisa K13 + 295 y abscisa K16 + 820)
Coordenadas del predio	N 2028660 746 E 4962593 054 N 2025450 569 E 4965704 155
Altura (msnm)	290
FUENTE HIDRICA SUPERFICIAL - CAPTACION 1	
Nombre fuente de captación	Caño Curimaje
Coordenadas punto de captación	N 2028660 746 E 4962593 054 N 2025450 569 E 4965704 155
Altura (msnm)	290
Caudal en época de lluvias (L/s)	12716 L/s
Caudal en época de estaje (L/s)	-
Caudal medio anual (L/s)	-
Caudal concesionado otros usuarios (L/s)	85 L/s
Caudal ambiental (L/s)	-
CONDICIONES DE LA CONCESIÓN	
Periodo de captación	Todo el año
Uso	Industrial
Termino (meses)	15
PUEAA Cumple Res 1257/18	SI
Compensación (Plantas)	621
Caudal a captar Caño Curimaje (L/s)	1.97
TOTAL CAUDAL CONCESIONADO	1.97

Parágrafo 2°. - De conformidad con la codificación del IDEAM, la cuenca no Guayuriba corresponde a la establecida en la Tabla 17 denominada "Codificación de la fuente hídrica", del CT PM-GA.3.44.24.933 del 2° de julio de 2024.
Artículo 3°. - El término por el cual se otorga la concesión de aguas superficiales en beneficio de la Vía nacional Ruta 65 (abscisa K13 + 295 y abscisa K16 + 820), corresponde a quince (15) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Parágrafo. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.4 Decreto 1076 de 2015, la solicitud de prorroga de la concesión deberá ser presentada durante el último año del periodo para el cual se haya otorgado.
Artículo 4°. - El titular de la concesión en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los autorizados, para lo cual deberá instalar en un término no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un sistema de medición de caudal (coordenadas N 2028660 746 E 4962593 054 en la vereda La Venturosa y N2025450 569 E 4965704 155 en la vereda Cuarteles) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015.
Parágrafo. - Para lo anterior, deberá dar cumplimiento al sistema de medición y control de caudal propuesto, de manera que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal derivado de la captación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015, para este caso en particular deberá dar cumplimiento al registro diario de las planillas de control de viajes donde se registre el volumen, fecha, uso y punto de captación.
Artículo 5°. El titular de la concesión otorgada deberá realizar y presentar ante CORMACARENA dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su realización, dos (2) aforos de la fuente hídrica caño Curimaje, durante los meses correspondientes al periodo seco, esto es, diciembre a marzo, y por el tiempo que se otorga esta concesión, con el respectivo registro fotográfico y la cartera de aforo.
Artículo 6°. El titular deberá actualizar la valla informativa en un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en el concepto técnico No. PM-GA.3.44.24.933 del 2 de julio de 2024. CORMACARENA cuenta con un diseño establecido (editable), el cual se encuentra disponible en la página web, en el link https://www.cormacarena.gov.co/centro-de-documentacion/piezas-de-diseño/
Artículo 7°. - Como medida de compensación correspondiente a la concesión otorgada a través de este acto administrativo, el titular, deberá realizar la entrega total de 621 árboles, plenamente justificados y aprobados por CORMACARENA.
Parágrafo. El titular deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de la medida de compensación, las cuales se encuentran dispuestas en el concepto técnico No. PM-GA.3.44.24.933 del 2° de julio de 2024.
Artículo 8°. – El titular deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones, recomendaciones y prohibiciones, que le son comunes a cada una de las disposiciones del resuelve del presente acto administrativo:
1. El titular deberá publicar el encabezado y parte resolutiva del presente acto administrativo, en un periódico de amplia circulación nacional o regional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de una copia legible del ejemplar respectivo, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de referencia, lo anterior para dar cumplimiento al principio de publicidad de los actos administrativos.
2. El titular para ceder o traspasar la concesión otorgada, necesita autorización previa por parte de esta Autoridad Ambiental Cormacarena podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante acto administrativo fundamentado y motivado.
3. El titular de la concesión deberá velar por la protección de los nacimientos y rondas de las corrientes inmersas en el predio y especialmente de sus cauddales ecológicos, los cuales garantizan la continuidad de la flora y fauna acuáticas y la disponibilidad para otros usuarios; por lo tanto, en caso de extrema sequía siempre se deberá dejar como por el cauce natural el cincuenta por ciento (50%) del caudal total en llegada al sistema de captación y en caso de ser necesario se suspenderá la captación.
4. El titular de la concesión, en caso de extrema sequía deberá suspender la captación de agua de la fuente hídrica caño Curimaje, de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. PM-GA.3.44.24.933 del 2° de julio de 2024.
5. El uso de la ronda de la fuente hídrica debe ser netamente de carácter protector y los dueños de los predios inmersos deberan velar por la seguridad y persistencia de esta y reportar a CORMACARENA las anomalías, daños y perjuicios que terceros puedan ocasionar en ellas.
6. El titular de la concesión deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes siguiente al vencimiento de cada año. Para ello deberá hacer uso del formulario de auto declaración de agua captada, disponible en la página de CORMACARENA http://www.cormacarena.gov.co/descargarpdf.php?-libro=1146. enlace
7. El titular de la presente concesión deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.20.1546 del 18 de diciembre de 2020 o la que la modifique, sustituya, en donde se establece el régimen de tarifas para el cobro de los servicios de control y seguimiento anual, las cuales variaran de acuerdo a las características propias de cada proyecto.
8. El titular deberá dar estricto cumplimiento a las prohibiciones dispuestas en el concepto tecnico N°. PM-GA.3.44.24.933 del 2 de julio de 2024 y a las contempladas en los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015.
Artículo 9°. - Será causal de caducidad del presente permiso el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresamente señaladas en este acto administrativo, así como las previstas en el Decreto Único 1076 de 2015 y demás normas concordantes.
Parágrafo. CORMACARENA podrá revocar o suspender los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en este acto administrativo; lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, so pena de iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 2009 por el incumplimiento de los termanos, condiciones y obligaciones previstos en el presente acto administrativo, y sin perjuicio de la revocatoria del permiso si fuere necesario, segun el artculo 2.2.3.2.24.5 del Decreto 1076 de 2015.
Artículo 10°. - Para todos los efectos de comunicaciones, presentación de informes, cumplimiento de obligaciones, PODRÁ cualquier documento o acción relacionada con el presente permiso menor, el titular deberá dirigirlas a CORMACARENA señalando en el documento el número del expediente N° PM-GA. 3.37.2.8.024.005.
Artículo 11°. - Notificar el presente acto administrativo a la Agencia para la Infraestructura del Meta, identificada con Nit. 900.220.547-5, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, al correo electrónico contactenos@aim-meta.gov.co o en la direccion Calle 15 No. 40-01 Primavera Urbana Lobby 1 Piso 6 en la ciudad de Villavicencio, conforme con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo. Al momento de surtirse la etapa de notificación se deberá remitir copia del concepto tecnico al titular.
Artículo 12°. - El grupo TIC'S y servicio al ciudadano adscrito a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, deberá publicar el presente acto administrativo en la página web de CORMACARENA.
Artículo 13°. - Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia a la Subdirección Administrativa Y Financiera, y al grupo Rentas de la Oficina Asesora Jurídica de CORMACARENA, para lo de su competencia.
Artículo 14°. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o la publicación, según sea el caso ante la Dirección General de CORMACARENA, de conformidad con el art. 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

05 AGOSTO 2024

WILSON LOPEZ BOGOTÁ
Encargado de las Funciones de Director General Cormacarena

20318

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.320.567-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500215
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	5	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL**	31/07/2024 a 5/09/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CANO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 30.157.618.889,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camplingeniería.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciohalcon@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	239-2023
FECHA DE INICIACION:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA								
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
PMT 1	**PERSONAL**												
PMT 1.1	CONDUCTOR DE NPR	MES	$ 1.907.575,00	$ 28.434.087,00	0,00	$ -	0,87	$ 24.618.937,00	0,13	$ 3.815.150,00	1,00	$ 28.434.087,00	100%
PMT 1.2	INSPECTORA SISO	MES	$ 3.085.968,00	$ 18.556.649,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.556.649,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.556.649,00	100%
PMT 1.3	CONTROLADOR VIAL	MES	$ 1.335.094,00	$ 26.701.880,00	0,00	$ -	0,60	$ 16.021.128,00	0,30	$ 8.010.564,00	0,90	$ 24.031.692,00	90%
PMT 1.4	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00	$ 27.072.068,00	0,00	$ -	0,41	$ 11.173.263,35	0,20	$ 5.340.376,00	0,61	$ 16.513.639,35	61%
	SUBTOTAL			**$ 100.764.684,00**		**$ -**		**$ 70.369.977,35**		**$ 17.166.090,00**		**$ 87.536.067,35**	
PMT 2	**MATERIALES**												
PMT 2.1	COMBUSTIBLE NPR	GLN	$ 9.550,00	$ 16.233.499,54	0,00	$ -	0,60	$ 9.714.250,54	0,30	$ 4.940.497,59	0,90	$ 14.654.747,13	90%
	SUBTOTAL			**$ 16.233.499,54**		**$ -**		**$ 9.714.250,54**		**$ 4.940.497,59**		**$ 14.654.747,13**	
PMT 3	**MAQUINARIA**												
PMT 3.1	ALQUILER NPR	MES	$ 9.706.969,30	$ 70.225.380,18	0,00	$ -	0,98	$ 68.713.396,45	0,00	$ -	0,98	$ 68.713.396,45	98%
	SUBTOTAL			**$ 70.225.380,18**		**$ -**		**$ 68.713.396,45**		**$ -**		**$ 68.713.396,45**	
PMT 4	**SENALIZACION**												
PMT 4.1	SEÑAL INFORMATIVA, PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UND	$ 100.000,00	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,96	$ 5.740.688,66	0,00	$ -	0,96	$ 5.740.688,66	96%
PMT 4.2	CINTA DE DEMARCACIÓN "PELIGRO NO PASE"	UND	$ 20.000,00	$ 1.228.862,20	0,00	$ -	0,07	$ 88.862,20	0,00	$ -	0,07	$ 88.862,20	7%
PMT 4.3	BARRICADAS	UND	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.400.000,00	100%
PMT 4.4	MALETINES	UND	$ 200.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 800.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 800.000,00	100%
PMT 4.5	SEÑALIZACION VIAL TUBULAR	UND	$ 38.000,00	$ 3.256.543,08	0,00	$ -	0,89	$ 2.888.000,00	0,00	$ -	0,89	$ 2.888.000,00	89%
PMT 4.6	PALETAS PARE Y SIGA	UND	$ 15.000,00	$ 60.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.000,00	100%
	SUBTOTAL			**$ 13.745.405,28**		**$ -**		**$ 11.977.550,86**		**$ -**		**$ 11.977.550,86**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 200.968.969,00**		**$ -**		**$ 160.775.175,20**		**$ 22.106.587,59**		**$ 182.881.761,79**	
	VALOR TOTAL OBRA			**$ 200.968.969,00**		**$ -**		**$ 160.775.175,20**		**$ 22.106.587,59**		**$ 182.881.761,79**	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	200.968.969,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	$	200.968.969,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	200.968.969,00
ANTICIPO 0%	$	-
PRESENTE ACTA	$	22.106.587,59
ACUMULADO	$	182.881.761,79

CONDICIONES ACTUALIZADAS				NETO PARCIAL
RELACION DE ACTAS				
ACTA 1	$ 72.348.827,84	$ -	$	72.348.827,84
ACTA 2	$ 48.232.552,56	$ -	$	48.232.552,56
ACTA 3	$ 30.145.345,35	$ -	$	30.145.345,35
ACTA 4	$ 10.048.448,45	$ -	$	10.048.448,45
PRESENTE ACTA	$ 22.106.587,59	$ -	$	22.106.587,59
TOTALES	$ 182.881.761,79	$ -	$	182.881.761,79

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 182.881.761,79	91,00
POR EJECUTAR	$ 18.087.207,21	9,00
POR AMORTIZAR	$ -	0%
TOTALES	$ 200.968.969,00	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500214 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0600.115-00AD / 1003.2.3.24.020600.117.2.02.05.310 de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO PARCIAL N°1	$ 72.348.827,84		$ 72.348.827,84
2	PAGO PARCIAL N°2	$ 48.232.552,56	$ 48.232.552,56	$ 120.581.380,40
3	PAGO PARCIAL N°3	$ 30.145.345,35	$ 30.145.345,35	$ 150.726.725,75
4	PAGO PARCIAL N°4	$ 10.048.448,45	$ 10.048.448,45	$ 160.775.174,20
5	PRESENTE ACTA	$ 22.106.587,59	$ 22.106.587,59	$ 182.881.761,79
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 18.087.207,21		$ 200.968.969,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: VEINTI DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 9 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados SI ___ de fecha ____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 06 SET. 2024

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0280

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA CANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 199521-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 05**

CAPITULO:	**PMT 1 - PERSONAL**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMT 1.1	**CONDUCTOR NPR**	**MES**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	MES	**VALOR MES**	**%**		**TOTAL**
CONDUCTOR NPR	JULIO 2024	$ 1.907.575,00	100,00%		$ 1.907.575,00
CONDUCTOR NPR	AGOSTO 2024	$ 1.907.575,00	100,00%		$ 1.907.575,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 3.815.150,00
				TOTAL	$ 3.815.150,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20320

JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR NPR	NELSON LUIS BERNAL BARRETO	86048283	$ 1.952.019,00	$ 1.907.575,00
SUBTOTAL					**$ 1.907.575,00**
AGOSTO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR NPR	NELSON LUIS BERNAL BARRETO	86048283	$ 2.056.666,00	$ 1.907.575,00
SUBTOTAL					**$ 1.907.575,00**
TOTAL					**$ 3.815.150,00**

FIRMA:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

20324

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3591**

Nombre: **NELSON LUIS BERNAL BARRETO**
Identificación: **86048283**
Cargo: **CONDUCTOR DE NPR**
Salario básico: **$1,450,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,450,000.00	Fondo de salud	0	$ 77,827.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 77,827.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 48,333.00			
Horas extras diurnas 125%	34.00	$ 262,234.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	16.00	$ 172,766.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	1.00	$ 12,340.00			
Total Ingresos		**$ 2,107,673.00**	**Total Deducciones**		**$ 155,654.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,952,019.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20322

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4092**

Nombre: **NELSON LUIS BERNAL BARRETO**
Identificación: **86048283**
Cargo: **CONDUCTOR DE NPR**
Salario básico: **$1,450,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,450,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 48,333.00
Horas extras diurnas 125%	44.00	$ 346,739.00
Hora extra recargo dominical o festivo	16.00	$ 176,522.00
Hora extra diurna dominical o festiva	3.00	$ 37,826.00
Total Ingresos		**$ 2,221,420.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 82,377.00
Fondo de pensión	0	$ 82,377.00
Total Deducciones		**$ 164,754.00**

NETO A PAGAR	$ 2,056,666.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20328

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1.3	CONTROLADOR VIAL	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES	VALOR MES		CANTIDAD	TOTAL
CONTROLADOR VIAL 1	JULIO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
CONTROLADOR VIAL 2	JULIO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
CONTROLADOR VIAL 3	JULIO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
CONTROLADOR VIAL 1	AGOSTO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
CONTROLADOR VIAL 2	AGOSTO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
CONTROLADOR VIAL 3	AGOSTO 2024	$ 1.335.094,00		1	$ 1.335.094,00
PASAN:				SUBTOTAL	$ 8.010.564,00
				TOTAL	$ 8.010.564,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20324

JULIO 2024					
DESCRIPCION	CARGO	NOMBRE	CEDULA	VALOR TOTAL	VALOR COBRADO
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	FLORINDA BOHORQUEZ CASTAÑEDA	21183711	$ 1.616.710,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	KAROL XIOMARA VARGAS BARRIOS	1119889027	$ 1.493.831,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	JOHANA RAMIIREZ BOLAÑOS	1121880850	$ 1.397.867,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					$ 4.005.282,00
AGOSTO 2024					
DESCRIPCION	CARGO	NOMBRE	CEDULA	VALOR TOTAL	VALOR COBRADO
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	FLORINDA BOHORQUEZ CASTAÑEDA	21183711	$ 1.698.166,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	KAROL XIOMARA VARGAS BARRIOS	1119889027	$ 1.470.665,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	JOHANA RAMIIREZ BOLAÑOS	1121880850	$ 1.535.899,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					$ 4.005.282,00
TOTAL					$ 8.010.564,00

FIRMA:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

2032-3

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3605**

Nombre: **FLORINDA BOHORQUEZ CASTAÑEDA**
Identificación: **21183711**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 63,248.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 63,248.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	12.00	$ 82,979.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	16.00	$ 154,894.00			
Total Ingresos		**$ 1,743,206.00**	**Total Deducciones**		**$ 126,496.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,616,710.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20326

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3604**

Nombre: **KAROL XIOMARA VARGAS BARRIOS**
Identificación: **1119889027**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 58,140.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 58,140.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	11.00	$ 76,064.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Total Ingresos		**$ 1,610,111.00**	**Total Deducciones**		**$ 116,280.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,493,831.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20327

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3579**

Nombre: **JOHANA RAMIREZ BOLAÑOS**
Identificación: **1121880850**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 53,733.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 53,733.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,505,333.00**	**Total Deducciones**		**$ 107,466.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,397,867.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

2032

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4105**

Nombre: **FLORINDA BOHORQUEZ CASTAÑEDA**
Identificación: **21183711**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 66,790.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 66,790.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	35.00	$ 247,283.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 79,130.00			
Total Ingresos		**$ 1,831,746.00**	**Total Deducciones**		**$ 133,580.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,698,166.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20329

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4104**

Nombre: **KAROL XIOMARA VARGAS BARRIOS**
Identificación: **1119889027**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 56,899.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,899.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 79,130.00			
Total Ingresos		**$ 1,584,463.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,798.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,470,665.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

2033

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4082**

Nombre: **JOHANA RAMIREZ BOLAÑOS**
Identificación: **1121880850**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 59,970.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 59,970.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	17.00	$ 120,109.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 79,130.00			
Total Ingresos		**$ 1,655,839.00**	**Total Deducciones**		**$ 119,940.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,535,899.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20331

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1.3	AYUDANTE	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES	VALOR MES	%	CANTIDAD	TOTAL
AYUDANTE 1	JULIO 2024	$ 1.335.094,00	100%	1	$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	JULIO 2024	$ 1.335.094,00	100%	1	$ 1.335.094,00
AYUDANTE 1	AGOSTO 2024	$ 1.335.094,00	100%	1	$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	AGOSTO 2024	$ 1.335.094,00	100%	1	$ 1.335.094,00
PASAN:				SUBTOTAL	$ 5.340.376,00
				TOTAL	$ 5.340.376,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20332

JULIO 2024					
DESCRIPCION	CARGO	NOMBRE	CEDULA	VALOR TOTAL	VALOR COBRADO
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	ARNEY YESID AVELLA LIZARAZO	1005507644	$ 1.564.543,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MICHAEL CAMILO MONTAÑA URREA	1001327133	$ 1.545.459,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					$ 2.670.188,00
AGOSTO 2024					
DESCRIPCION	CARGO	NOMBRE	CEDULA	VALOR TOTAL	VALOR COBRADO
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	ARNEY YESID AVELLA LIZARAZO	1005507644	$ 1.951.665,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MICHAEL CAMILO MONTAÑA URREA	1001327133	$ 1.607.167,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					$ 2.670.188,00
TOTAL					$ 5.340.376,00

FIRMA:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoria
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

20333

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3616**

Nombre: **ARNEY YESID AVELLA LIZARAZO**
Identificación: **1005507644**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,980.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 60,980.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	15.00	$ 103,723.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Total Ingresos		**$ 1,686,503.00**	**Total Deducciones**		**$ 121,960.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,564,543.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20334

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3610**

Nombre: **MICHAEL CAMILO MONTAÑA URREA**
Identificación: **1001327133**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,150.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 60,150.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	12.00	$ 82,979.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Total Ingresos		**$ 1,665,759.00**	**Total Deducciones**		**$ 120,300.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,545,459.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20335

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4115**

Nombre: **ARNEY YESID AVELLA LIZARAZO**
Identificación: **1005507644**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 77,812.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 77,812.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	34.00	$ 240,217.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	32.00	$ 316,522.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	4.00	$ 45,217.00			
Total Ingresos		**$ 2,107,289.00**	**Total Deducciones**		**$ 155,624.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,951,665.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20336

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**4110**

Nombre: **MICHAEL CAMILO MONTAÑA URREA**
Identificación: **1001327133**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 62,833.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 62,833.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	21.00	$ 148,370.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 79,130.00			
Total Ingresos		**$ 1,732,833.00**	**Total Deducciones**		**$ 125,666.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,607,167.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

20337

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 05	
CAPITULO:	PMT 2 - MATERIALES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 2.1	COMBUSTIBLE NPR	GALON

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VALOR GALON	CANTIDAD	%	VALOR MES	TOTAL
COMBUSTIBLE NPR JULIO 2024	$ 9.409,00	155,7449729	0,79%	$ 1.465.404,45	$ 1.465.404,45
COMBUSTIBLE NPR AGOSTO 2024	$ 9.409,00	369,3371389	1,87%	$ 3.475.093,14	$ 3.475.093,14
PASAN:				SUBTOTAL	$ 4.940.497,59
				TOTAL	$ 4.940.497,59

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

20338

MES	DESCRIPCIÓN	PLACA	ORDEN DE VENTA	CANTIDAD	VALOR GALON	VALOR TOTAL	VALOR DESCUENTO PMT
JULIO 2024	COMBUSTIBLE NPR	SPS 989	ELMA 142	2772,2685301	$ 9.409,00	$ 26.084.274,60	$ 1.465.404,45
AGOSTO 2024	COMBUSTIBLE NPR	SPS 989	ELMA 166	3411,6329684	$ 9.409,00	$ 32.100.054,60	$ 3.475.093,14
TOTAL DESCUENTO PMT							$ 4.940.497,59

FIRMA:

NELSON HERNANDO CANO MESA
Residente de obra
MP. 25202-75964
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

JHON JAIRO ROMERO VACA
Residente de interventoría
MP. 25202-335410
Consorcio Inter AIM

20339

PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S
NIT No. 900.497.906-5 Tel No. (+57) 3183516216
Cra 11 # 82-01 Piso 7 Centro
Empresarial Andino
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ELMA142

CUFE
9c5aa28da54fd731187f3b709d9818bb83e0d804858ad01c79aa079e1d9b8e2390ecc8c1024dcae5b14d5971b96523b9

Fecha de Carga	28. jul 2024
Fecha Validación	29. jul 2024 09:53:03
Fecha Factura	29. jul 2024 09:51:39
Fecha Vencimiento	28. jul 2024
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	En Efectivo

Impuesto sobre las ventas - IVA.
Somos agentes retenedores de IVA. Somos Autorretenedores Resolución 012443 del 10 de Diciembre de 2018.
Somos grandes contribuyentes: Resolución N° 012220 del 26 de diciembre del 2022.
Res. DIAN No. 18764059661136 del 2023-11-09 al 2025-05-09.
Rango ELMA de la FACTURA DE VENTA ELMA1 a la ELMA1000000.

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CONSORCIO HALCON FUELS FUELS C.C./NIT NO.: 901666148 Vía Cumaral - Veracruz, a 1.4 km margen derecha Vía Cumaral - Veracruz, a 1.4 km margen derecha TEL(S).: 3208396424	Campamento Cumaral C.C./NIT NO.: 901666148 ZONA: Cumaral, Meta, Colombia

TRANSPORTADOR	CEDULA	PLACA	
JOSE SANDOVAL	79946837	UPT-224	MEDIDO Y SELLADO

CODIGO SICOM No. 620338	ASESOR: JPP
Guía No. 35200167162-7	AUTORIZ. SICOM No. 694151261062911
No. Orden 45015751 / No. Cliente: 592164994	

Item-Código-Descripción	Cantidad-Unidad	Precio unit.	Base IVA	Tarifa	IVA (COP)	VALOR TOTAL (COP)
1 31015 BIOACEM al 10%	3.000 GLL	7.430,79	1.670.910,00 13.108.824,00 7.512.626,70	19% 5% 0%	317.472,90 655.441,20 0,00	23.265.274,80
2 42358001 FLETES	3.000 C62	566,67	1.699.999,80	0%	0,00	1.699.999,80

Total Lineas: 2

VALOR EN LETRAS
VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 60/100 M.L

SUBTOTAL	23.992.360,50 COP
(+) SOBRETASA	1.119.000,00 COP
(+) SOLDICOM	0,00 COP
(+) VALOR IVA 19%	317.472,90 COP
(+) VALOR IVA 5%	655.441,20 COP
(-) RETEFUENTE	- 0,00 COP
VALOR A PAGAR	26.084.274,60 COP

Por cheques devueltos por fondos insuficientes, incurrirán en sanción según lo establecido en el art. 731 del Código de Comercio Colombiano. La presente FACTURA DE VENTA se asimilará en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO, según artículo 779 del Código de Comercio y tiene carácter de título de valor que se rige por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

Nombre de quien recibe:
Fecha:
Firma:

Aceptación del comprador o beneficiario del servicio
Nombre:
Fecha:
Firma:

Firma del vendedor o prestador del servicio

20340

PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S
NIT No. 900.497.906-5 Tel No. (+57) 3183516216
Cra 11 # 82-01 Piso 7 Centro Empresarial Andino
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ELMA166

CUFE
96304a84816b2b6e5b0edd459eca47a4295f562ab75a8d6df1fbcda2c419288e61cbe659e21ca10d27f474ada2c17789

Fecha de Carga	31. ago 2024
Fecha Validación	31. ago 2024 19:49:17
Fecha Factura	31. ago 2024 19:11:45
Fecha Vencimiento	31. ago 2024
Forma de Pago	CONTADO
Medio de Pago	En Efectivo

Impuesto sobre las ventas - IVA.
Somos agentes retenedores de IVA. Somos Autorretenedores Resolución 012443 del 10 de Diciembre de 2018.
Somos grandes contribuyentes: Resolución N° 012220 del 26 de diciembre del 2022.
Res. DIAN No. 18764059661136 del 2023-11-09 al 2025-05-09.
Rango ELMA de la FACTURA DE VENTA ELMA1 a la ELMA1000000.

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CONSORCIO HALCON FUELS FUELS C.C./NIT NO.: 901666148 Vía Cumaral - Veracruz, a 1.4 km margen derecha Vía Cumaral - Veracruz, a 1.4 km margen derecha TEL(S).: 3208396424	Campamento Cumaral C.C./NIT NO.: 901666148 ZONA: Cumaral, Meta, Colombia

TRANSPORTADOR	CEDULA	PLACA	
GERARDO REYNA	79114480	SWP-080	MEDIDO Y SELLADO

CODIGO SICOM No. 620338 — ASESOR: JPP
Guía No. 35200167190-5 — AUTORIZ. SICOM No. 624151458002610
No. Orden 45017534 — No. Cliente: 592164994

Item-Código-Descripción	Cantidad-Unidad	Precio unit.	Base IVA	Tarifa	IVA (COP)	VALOR TOTAL (COP)
1 31015 BIOACEM al 10%	3.000 GLL	9.346,05	1.670.910,00 18.508.824,00 7.858.406,70	19% 5% 0%	317.472,90 925.441,20 0,00	29.281.054,80
2 42358001 FLETES	3.000 C62	566,67	1.699.999,80	0%	0,00	1.699.999,80

Total Lineas: 2

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL CINCUENTA Y CUATRO 60/100 M.L

SUBTOTAL	29.738.140,50 COP
(+) SOBRETASA	1.119.000,00 COP
(+) SOLDICOM	0,00 COP
(+) VALOR IVA 19%	317.472,90 COP
(+) VALOR IVA 5%	925.441,20 COP
(-) RETEFUENTE	- 0,00 COP
VALOR A PAGAR	32.100.054,60 COP

Por cheques devueltos por fondos insuficientes, incurrirán en sanción según lo establecido en el art. 731 del Código de Comercio Colombiano. La presente FACTURA DE VENTA se asimilará en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO, según artículo 779 del Código de Comercio y tiene carácter de título de valor que se rige por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

Nombre de quien recibe:
Fecha:
Firma:

Aceptación del comprador o beneficiario del servicio
Nombre:
Fecha:
Firma:

Firma del vendedor o prestador del servicio

Software e-FACTURA®, Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios de Colombia S.A.S NIT 900379787-1 Av. Cra. 9 # 127C-56 Edif. Suisse Centre, oficina 506 Bogotá C.P. 110131 - www.co.groupseres.com

20341
