REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

CANCHA NORTE

Suministro, transporte y colocación de base granular clase A , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del próctor modificado, según normas según normas INVIAS para la construcción de pavimentos





Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada TIPO D 84, Incluye Armado, amarres, elementos de nivelación para garantizar recubrimiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.





REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

Suministro, transporte e instalación de Malla mosquitera en marco metálico.





Suministro, transporte e instalación de reja superior a 2,5 metros de Altura y/o (5 m2); Incluye puerta metálica según esquemas suministrados por Interventoría ó Supervisión, Incluye Chapa de Seguridad Tipo Yale o Similar.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

Suministro, transporte e instalación de rejas para protección de puertas, ventanas o similar, Según diseños suministrados por interventoría o supervisor. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.





Mantenimiento y pintura de pasamanos en tubería metálica, Incluye retiro de pintura existente y aplicación de anticorrosivo y esmalte apto para intemperie, color según indicaciones de la supervisión.





REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

Aplicación de PINTURA TIPO EXTERIOR en superficies de concreto a la vista, 3 manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada, limpieza y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría





REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Suministro e Instalación de Espejo biselado 6 mm. Incluye anclajes y todos los elementos para su correcta instalación.







CONSTRUCTORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

CANCHA AGUAS CLARAS

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³, su medida será en el sitio. No incluye entibado





Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.





REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

Suministro, figurado, transporte e instalación de acero de refuerzo FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.





Cerramiento en malla eslabonada para zonas frontales calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 2,00 m, tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16; horizontalmente en parte superior y nivel intermedio, se instalará tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 igualmente se instalará el contrafuerte cada 8 metros.






REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

PISTA BMX

Cerramiento en malla eslabonada para zonas frontales calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 2,00 m, tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16; horizontalmente en parte superior y nivel intermedio, se instalará tubería galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 igualmente se instalará el contrafuerte cada 8 metros.



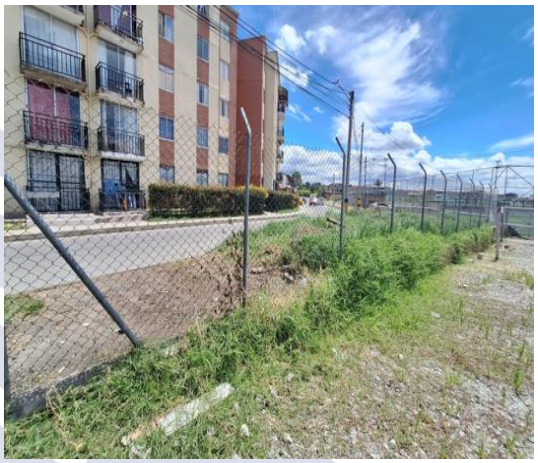

S.T.I de puerta en tuberia de 2" x 1,91 mm de 2 metros de alto x 4,00 m ancho en malla eslabonada de 2 1/4" x 21/4" de dos marcos (cuadrados) de 1.00 x 1.00 m, con poste diagonal en cada uno de los cuadros que conforman el marco. Doble ALA, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO COP 019-2023
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
Período del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024

S.T.I de puerta en tuberia de 2" x 1,91 mm de 2 metros de alto x 1,50 m ancho en malla eslabonada de 2 1/4" x 21/4", Dos marcos (cuadrados) de 1.00 x 1.50 m, con poste diagonal en cada uno de los cuadros que conforman el marco. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



Suministro, transporte e instalación de protección de taludes en grama tipo macana o similar. Incluye grama y todos los elementos necesarios para su correcta instalación



