CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA

30 DE ABRIL DEL 2024

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual de Obra No. 5
Etapa:	Ejecución de obra
Versión No.	01
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Cargo:	Representante Legal CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
Fecha:	30/04/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 9
1.1 AVANCE EN TIEMPO 9
1.2 ACTAS GENERADAS 10
1.3 FORMA DE PAGO 10
1.4 CONTROL DE PÓLIZAS 13
1.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO 13
1.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 13
5 ALCANCE DEL PROYECTO 14
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA 17
1.6 CRONOGRAMA DE OBRA 17
1.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL 18
1.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
1.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS 18
6 AVANCE DE OBRA 19
6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS 20
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 46
7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA 52
7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO 52
7.2 PERSONAL OPERATIVO 52
8 ASPECTOS LOGÍSTICOS 54
8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO 54
8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 55
9 CONCLUSIONES 56
10 ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO 57

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia 7

Tabla 2 Condiciones actualizadas del contrato. Fuente: Propia.....8

Tabla 3 Actas generadas. Fuente: Propia..... 10

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia..... 13

Tabla 5 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia 13

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia 14

Tabla 7 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia..... 14

Tabla 8 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia..... 25

Tabla 9 Avance programado mensual. Fuente: Propia 49

Tabla 10 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia..... 49

Tabla 11 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia 50

Tabla 12 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia 50

Tabla 13 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia..... 50

Tabla 14 Flujo de desembolsos Orden 19 al 20 - Anticipo. Fuente: Propia..... 51

Tabla 15 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia..... 51

Tabla 16 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia..... 52

Tabla 17 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia 54

Tabla 18 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia 55

Tabla 19 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes Marzo - 2024). Fuente: Propia 57

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia 8

Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia 9

Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia 16

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia 17

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No. 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 14 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha del 1 de abril hasta el 30 de abril del 2024, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL No. 5** que hace parte de la ejecución de la Etapa II correspondiente a la Ejecución de Obra, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta segunda etapa a la presente fecha tiene un valor inicial contratado de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (**$11.912.622.964**).

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.546.216,00
VALOR ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO INICIAL ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia

A continuación, se relacionan las condiciones actualizadas a la presente fecha, teniendo en cuenta el acta de modificación No.1 al contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.546.216,00
VALOR INICIAL - ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA – SEGÚN PRORROGA ACTA MODIFICATORIA No. 1	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO – SEGÚN PRORROGA ACTA MODIFICATORIA No. 1	DIECINUEVE (19) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA	25.75%

Tabla 2 Condiciones actualizadas del contrato. Fuente: Propia

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias, departamento del Meta, el cual está ubicado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.

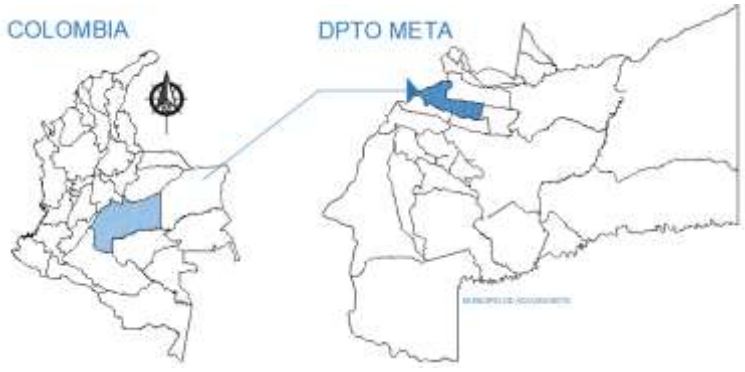


Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamente frente a la plaza de mercado acacias centenaria sobre la carrera 41, en el predio denominado Lote A Escuela Carabineros, en el barrio San Isidro.

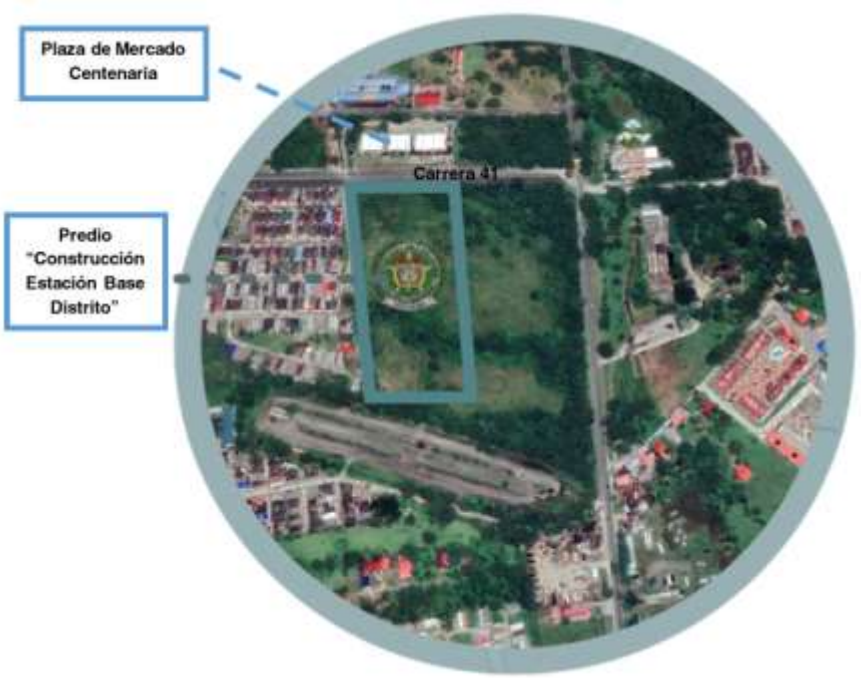


Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia

4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 AVANCE EN TIEMPO

Se relacionan los avances en tiempo teniendo en cuenta el plazo de ejecución para la etapa en la que se encuentra el proyecto ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA:

PLAZO ACTUALIZADO – PRORROGA No. 1	FECHA DE INICIO[1]	FECHA INFORME MENSUAL No. 5	DIAS DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
DIECISIETE MESES (17) Y (18) DIECIOCHO DIAS	11-12-2023	30-04-2024	141 DIAS	41.84%

[1] La fecha de inicio relacionada se establece teniendo en cuenta el oficio No. 0622 remitido por la Secretaría de Infraestructura en el ejercicio de sus funciones como supervisión del contrato, mediante el cual autoriza el inicio las actividades de obra; luego del cumplimiento de los requisitos establecidos para dar inicio y previa acta de aprobación por parte del Ministerio del Interior, con fecha del 11 de diciembre del 2023, documento que hace parte del informe mensual No. 1 como anexo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

4.2 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista, la interventoría y la supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ANEXO 22 – ACTA DE ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS MINISTERIO DEL INTERIOR	20/11/2023
OFICIO No. 0622 – AUTORIZACIÓN INICIO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	29/11/2023
VISITA PREVIA – INICIO DE OBRA	7/12/2023
INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 1	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 2	18/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 3	26/12/2023
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE OBRA No. 1	15/01/2024
ACTA – COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 4	18/01/2024
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO No. 5	24/01/2024
ACTA - VISITA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL	8/02/2024
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 5	20/02/2024
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 6	15/03/2024
ACTA - VISITA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL	21/03/2024
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023	22/03/2024
ACTA - VISITA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL	22/04/2024

Tabla 3 Actas generadas. Fuente: Propia

4.3 FORMA DE PAGO

ETAPA II – EJECUCIÓN DE LA OBRA:

UN ANTICIPO: Un anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, el anticipo que se concederá al CONTRATISTA, será para cubrir aquellas obligaciones que tienen relación directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, es decir con la cabal ejecución del objeto contractual; La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato Llave en mano, la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación, suscripción del acta de inicio de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Acacias - Meta, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Llave en mano, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.

A. PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES:

El Municipio pagará al CONTRATISTA hasta acumular el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoría, previa presentación de los siguientes documentos:

- Reconocimiento y pago
- Certificación de cumplimiento a satisfacción por la interventoría
- Informe de interventoría

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

- Informe del contratista con sus respectivos soportes:
  - ✓ Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas
  - ✓ Cantidades de obra ejecutadas,
  - ✓ Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas
  - ✓ Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones.
  - ✓ Registro fotográfico con fecha y descripción
  - ✓ Copia de la bitácora de obra firmada
  - ✓ Resumen de las actividades realizadas
  - ✓ Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad
  - ✓ social y riesgos profesionales de todo el personal.
  - ✓ Ensayos de laboratorios
  - ✓ Informe del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, registro de capacitaciones, inducciones,
  - ✓ entrega de elementos de protección personal, informe y demás gestión relacionada con la
  - ✓ seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores
  - ✓ Informe de inversión del anticipo y sus soportes
  - ✓ Informe Plan de Manejo Ambiental
  - ✓ Así como todos los demás determinados por la secretaria de Infraestructura
- Factura original o documento equivalente.

B. PAGO FINAL

La Entidad realizará al Contratista el último pago, equivalente como mínimo al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción por parte de la Entidad, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor designado y actualización de las pólizas correspondientes; no obstante, además se requerirán los mismos documentos actualizados y solicitados para las actas parciales.

Parágrafo 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Parágrafo 2. Los desembolsos antes señalados en la forma de pago se realizarán con sujeción a los giros que realice al Municipio el Ministerio del Interior.

4.4 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra No. 377 de 2023:

4.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	25/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Cumplimiento	24/03/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	24/03/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	24/03/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	24/03/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	24/03/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	24/03/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	24/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00

Tabla 5 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia

4.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	29/05/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Cumplimiento	27/04/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	27/04/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	27/04/2023	24/03/2027	$628.77.310,80

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Calidad del servicio	27/04/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	27/04/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	27/05/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	25/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	25/03/2024	
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	25/03/2024	
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	25/03/2024	

Tabla 7 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia

4.4.3 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	03/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Cumplimiento	22/03/2024	12/05/2026	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	22/03/2024	12/05/2026	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	22/03/2024	12/11/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	12/11/2024	12/11/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	12/11/2024	12/11/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 8 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	03/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	12/11/2024	$628.782.310,80
Patronal	24/03/2023	12/11/2024	
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	12/11/2024	
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	12/11/2024	

Tabla 9 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 377 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", tiene como alcance de acuerdo a lo contemplado durante la ejecución de la Etapa I – Estudios y Diseños, la construcción de una infraestructura policial categorizada como Distrito de Policía Tipo A con capacidad para 115 funcionarios (103 hombres + 12 mujeres), la cual a su vez se dispuso de conformidad con el "programa arquitectónico y cuadro de áreas mínimas de acuerdo a las instalaciones policiales" estipulado por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, resultando así las siguientes zonas:

Zona Administrativa: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrarán las diferencias oficinas o dependencias que se requieren para el funcionamiento y operación del Distrito de Policía, así como también se dispondrá de una sala múltiple y zona de oratorio.

Zona Servicios y Celdas: Es una estructura de un nivel en la cual se encuentra las celdas para retenidos, zona de seguridad, bodega de intendencia, cuarto de máquinas y técnico para el componente eléctrico y RCI.

Zona Social: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrará la cocina, comedor, despensas, lavado de vajillas, zona de ropas, zona de residuos cuarto de aseo, baños sociales para hombres y mujeres, zonas de tv y descanso, sala poli café y cafetería.

Zona Armerillo: Es una estructura de un nivel en la cual se encontrará el almacenamiento del armamento, como también el puesto de trabajo y habitación con baño para el armero.

Zona Alojamientos: Se proyectan 3 bloques para alojamientos colectivos, el primero de ellos para mujeres de un nivel con sus respectivos aparatos sanitarios, los dos restantes contarán con dos niveles y estos son destinados para hombres, de acuerdo a la capacidad para el tipo de instalación policial categorizada.

Zona Apartamento Fiscal: Es una estructura de un nivel con destinación para alojamiento del comandante y familiares al interior del Distrito de Policía.

Garitas y shut de basuras: Se proyecta una estructura de un nivel para la disposición final de los diferentes residuos que se generen en las instalaciones. Por otra parte, se disponen garitas de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes al tipo de instalación policial categorizada.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Urbanismo y Paisajismo[2]: Se contemplan las áreas construidas descubiertas y obras exteriores tales como andenes, la plaza de formación, parqueadero para vehículos institucionales, visitantes, C.A.I. móvil, camión tipo NPR, motocicletas institucionales y de funcionarios, acceso vehicular, peatonal así mismo se tienen en cuentan las demás circulaciones internas y externas que integran según el diseño arquitectónico y paisajístico del proyecto.

Cerramiento Perimetral: Se contemplan dos tipos de construcciones siguiendo las recomendaciones generales para el diseño respecto a los niveles de seguridad para la instalación policial correspondiente donde se indica que deberá ser en ladrillo tolete o bloque macizo espesor de 20 a 25 cm altura 2 metros hasta longitud que se considere o recomiende y el restante se encerrará en cerca viva, donde su principal característica es brindar seguridad a la infraestructura total.



Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia

[2] Teniendo en cuenta el valor total inicial para la Etapa II – Ejecución de obra, este componente y el cerramiento perimetral no pueden ser ejecutados en su totalidad, puesto que este no contemplaba dichas actividades.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

4.5 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra detallado se conforma de los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

Como también, dentro de este componente se relacionarán la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

Una vez obtenida el acta de aprobación emitida el 28 de agosto del 2023 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, y el acta de aprobación emitida por el Ministerio del Interior el día 20 de noviembre del 2023, los cuales realizan la correspondiente verificación del Anexo 24 B – Entregables mínimos Estudios, Diseños y Construcción Estación de Policía, se obtiene el presupuesto de obra definitivo:

(4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.I.U. DEL 35 %	$15.823.148.516,13
(5). VALOR TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA	$1.208.099.229,61
(6). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO	$44.230.989,72
(7). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$76.502.537,38
(8). COSTO CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	$44.589.391,01
(9). COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS	$10.580.523,87
(10). VALOR TOTAL PROYECTO.	$17.207.151.187,72

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia

4.6 CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

Como resultado de dicho cronograma y de conformidad con el acta de modificación No. 1 al contrato de obra, se tiene una prórroga que establece el plazo de ejecución de obra

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

correspondiente a diecisiete (17) meses y dieciocho (18) días con fecha de terminación al 12 de noviembre del 2024.

4.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

En este informe se establecen de manera detallada, las acciones que se implementaron para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

4.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

4.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS

En cumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en la minuta del contrato, se presenta un informe en donde se hace la relación de permisos y licencias requeridas y/o aplicables para el desarrollo y ejecución del proyecto, las cuales se tramitaron ante las entidades competentes respectivamente:

Certificación para disposición final de escombros y material sobrante: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacías, Meta con el fin de conocer el sitio autorizado para llevar a cabo el transporte de material sobrantes y/o escombros que resulten de las actividades de obra.

Dicha solicitud fue respondida con fecha del 28 de junio del 2023 mediante concepto técnico de relleno y nivelación, anexando a su vez el permiso para disposición de escombros y sobrantes en predio autorizado, como se evidencia en los anexos del presente informe mensual.

Licencia de construcción: El proyecto cuenta con **licencia de construcción** bajo la Resolución No. 377 del 29 de agosto del 2023 expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, la cual se anexa como parte integral del presente informe.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6 AVANCE DE OBRA

El avance obtenido en el mes de abril del 2024 se refiere a la ejecución de actividades tales como fundida de la totalidad de las diferentes estructuras en concreto tales como muros estructurales o columnas de los bloques de un solo nivel y hasta primer nivel de los bloques que se componen de dos niveles. Para la zona administrativa, se culmina con el respectivo armado y amarre del acero de refuerzo de las vigas aéreas en la mayoría de los bloques, así mismo inicia con la instalación de la perfilería estructural (viguetas) para la posterior fundida de las vigas aéreas a nivel +3.10, se inicia con la colocación de lámina metaldeck correspondiente a la placa entrepiso, se finaliza con las instalaciones de la red sanitaria e inicia con la red hidráulica (tubería y accesorios). Por su parte, en la zona de servicios generales y celdas se realiza la fundida de las columnas o muros estructurales y placa de contrapiso con su correspondiente colocación, armado y amarre del acero de refuerzo y malla electrosoldada respectivamente, se inicia con las instalaciones de la red sanitaria e hidráulica (tubería y accesorios).

Por otra parte, se inicia con la localización y replanteo de la red eléctrica externa para el proyecto e inicia la instalación de tubería PVC requerida para acometida eléctrica. En la zona social, se realiza la fundida de la placa de contrapiso con su respectivo colocación, amarre y armado de la malla electrosoldada e inicia con el armado y colocación del acero de refuerzo para las vigas aéreas, instalación de perfilería estructural (viguetas) y posterior colocación de lámina metaldeck requerida para la fundida de la placa entrepiso, como también se inicia con las actividades correspondiente a las instalaciones hidráulicas con sus respectivos accesorios. Aunado a esto, en la zona del armerillo se realiza la fundida de la placa de contrapiso con su respectiva colocación, armado de la malla electrosoldada y extendido del plástico negro para estos elementos de cimentación, se inicia con el amarre del acero de refuerzo para posterior fundida de los vigas aéreas y placa de entrepiso en concreto, como también se inicia con las instalaciones sanitarias.

Al mismo tiempo, en la zona de alojamientos se culmina con la fundida de las columnas o muros estructurales hasta primer nivel, adicionalmente se termina con la placa de contrapiso en los alojamientos de un dos niveles, se inicia con el armado y amarre del acero de refuerzo para vigas aéreas e instalación de perfilería estructural y lamina metaldeck así como la colocación de la malla electrosoldada para placas de entrepiso, así mismo se culmina con las instalaciones hidráulicas de los alojamientos de un solo nivel y solo las de primer piso para el de dos niveles cada una de estas con sus respectivas tuberías y accesorios, de conformidad con el diseño. Finalmente, en la zona del apartamento fiscal se finaliza con las instalaciones de redes hidráulicas y sanitarias como también se continua con el amarre, armado del acero de refuerzo correspondiente a estos elementos en concreto que conforman las vigas aéreas.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

De esta manera, el porcentaje mensual de avance obtenido para el periodo del presente informe alcanza un 6.81% y el avance mensual acumulado corresponde a 25.75% del presupuesto actual del proyecto.

Nota: *El porcentaje (%) de avance se establece con base al valor total inicial del proyecto para la Etapa II – Ejecución de obra, es decir sobre $11.912.622.964. Por otra parte, aunque de conformidad con los resultados obtenidos de la Etapa I – Estudios y Diseños el presupuesto de obra indica que el valor total requerido para la ejecución de obra es de $15.999.051.958,11, el cual no puede ser tomado como referencia puesto que dichos recursos adicionales no han sido apropiados por parte del Municipio a los contratos.*

6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRACTUAL	VALOR UNIT. INC. AIU	VALOR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINISTRATIVA							
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	419.22	$ 6,620.62	$ 2,775,496.32	419.22	$ 2,775,496.32	100%
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	$ 113,807.32	$ 53,250,445.03	233.95	$ 53,250,445.03	100%
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	395.06	$ 48,905.05	$ 19,320,429.05	59.259	$ 19,320,429.05	100%
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3674.06	$ 2,028.72	$ 7,453,639.00	1837.03	$ 7,453,639.00	100%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1684.44	$ 2,028.72	$ 3,417,257.12	842.22	$ 3,417,257.12	100%
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
1.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	12.40	$ 800,447.03	$ 9,925,543.17	12.40	$ 9,925,543.17	100%
1.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64.74	$ 1,375,792.04	$ 89,068,776.67	64.74	$ 89,068,776.67	100%
1.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.33	$3,129,144.81	$22,936,631.46	7.33	$22,936,631.46	100%
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30.04	$1,461,468.24	$ 43,902,505.93	15.02	$ 21,951,252.96	100%
1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	63.98	$ 1,944,132.62	$ 124,385,605.03	63.98	$ 124,385,605.03	100%
1.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	81.49	$ 1,901,669.30	$ 154,967,031.26	40.745	$ 77,483,515.63	50%
1.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	84.43	$ 1,507,757.43	$ 127,299,959.81	37.994	$57,284,981.91	45%
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	$ 11,120.63	$ 486,005,115.30	14,421.996	$291,603,609.18	80%
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4256.38	$ 30,075.87	$ 128,014,331.55	2128.19	$64,007,165.78	50%
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	844.32	$ 79,462.54	$ 67,091,811.77	379.944	$30,191,315.30	45%
1.9	RED HIDRÁULICA							
1.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	217.23	$ 15,380.00	$ 3,340,997.40	108.615	$1,670,498.70	50%
1.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	54.00	$ 3,142.03	$ 169,669.62	43.00	$135,735.70	80%
1.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30.03	$ 18,697.31	$ 561,480.22	18.02	$336,888.13	60%
1.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	$ 4,429.50	$ 186,039.00	25.00	$111,623.40	60%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	2.00	$69,853.41	60%
1.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 10,381.65	$ 176,488.05	10.00	$105,892.83	60%
1.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 12,890.76	$ 103,126.08	6.00	$77,344.56	75%
1.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 24,273.15	$ 242,731.50	6.00	$145,638.90	60%
1.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 56,740.10	$ 283,700.50	3.00	$170,220.30	60%
1.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
1.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54.17	$ 29,977.33	$ 1,623,871.97	54.17	$ 1,623,871.97	100%
1.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	77.00	$ 14,062.80	$ 1,082,835.60	77.00	$ 1,082,835.60	100%
1.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45.26	$ 60,418.42	$ 2,734,537.69	45.26	$ 2,734,537.69	100%
1.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	57.00	$ 43,221.47	$ 2,463,623.79	57.00	$ 2,463,623.79	100%
1.10.5	TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.12	$22,375.92	$ 808,218.23	36.12	$ 808,218.23	100%
1.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	1.00	$ 28,809.14	100%
1.10.7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4.00	$ 76,309.56	$ 305,238.24	4.00	$ 305,238.24	100%
1.10.8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	7.00	$ 105,537.31	$ 738,761.17	7.00	$ 738,761.17	100%
1.10.9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	1.00	$ 44,074.51	100%
1.10.10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	13.00	$ 34,548.91	$ 449,135.83	13.00	$ 449,135.83	100%
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	19.00	$ 88,484.78	$ 1,681,210.82	19.00	$ 1,681,210.82	100%
2.0	**ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS**							
2.1	**PRELIMINARES**							
2.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	186.94	$ 6,620.62	$ 1,237,658.70	186.94	$ 1,237,658.70	100%
2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	149.63	$ 113,807.32	$ 17,028,989.29	149.63	$ 17,028,989.29	100%
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	125.79	$ 48,905.05	$ 6,151,766.24	125.79	$ 6,151,766.24	100%
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1169.85	$ 2,028.72	$ 2,373,298.09	1169.85	$ 2,373,298.09	100%
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	538.67	$ 2,028.72	$ 1,092,810.60	538.67	$ 1,092,810.60	100%
2.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.04	$ 800,447.03	$ 1,632,911.94	2.04	$ 1,632,911.94	100%
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.43	$ 1,461,468.24	$ 29,857,796.14	20.43	$ 29,857,796.14	100%
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.86	$ 1,944,132.62	$ 40,554,606.45	20.86	$ 40,554,606.45	100%
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.53	$ 1,349,337.03	$ 23,653,878.14	17.53	$ 23,653,878.14	100%
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	146.10	$ 8,223.01	$ 1,201,381.76	146.10	$ 1,201,381.76	100%
2.4	**ACEROS Y ESTRUCUTRAS METÁLICAS**							
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8338.00	$ 11,120.63	$ 92,723,812.94	4585.90	$ 50,998.097.12	80%
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1955.40	$ 11,967.06	$ 23,400,389.12	1505.658	$18,018,299.62	77%
2.9	**RED HIDRÁULICA**							
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.45	$ 15,380.00	$ 53,061.00	3.45	$ 53,061.00	100%
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,142.03	$ 12,568.12	4.00	$ 12,568.12	100%
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.65	$ 18,697.31	$ 105,639.80	5.65	$ 105,639.80	100%
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	8.00	$ 35,436.00	100%
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 10,381.65	$ 31,144.95	3.00	$ 31,144.95	100%
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	2.00	$ 48,546.30	100%
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	1.00	$ 56,740.10	100%
2.10	**RED SANITARIA. PLUVIAL Y APARATOS**							
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.60	$ 29,977.33	$ 107,918.39	3.60	$ 107,918.39	100%
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 14,062.80	$ 70,314.00	5.00	$ 70,314.00	100%
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.85	$ 60,418.42	$ 232,610.92	3.85	$ 232,610.92	100%
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	2.00	$ 86,442.94	100%
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	1.00	$ 28,809.14	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	1.00	$ 76,309.56	100%
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	1.00	$ 105,537.31	100%
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	1.00	$ 44,074.51	100%
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	2.00	$ 69,097.82	100%
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	3.00	$ 265,454.34	100%
2.12	**MEDIA TENSIÓN**							
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	324.00	$ 6,648.51	$ 2,154,117.24	162.00	$1,077,058.62	50%
2.13	**BAJA TENSIÓN**							
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	112.00	$ 402,920.12	$ 45,127,053.44	16.80	$6,769,058.02	15%
3.0	**ZONA SOCIAL**							
3.1	**PRELIMINARES**							
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	186.81	$ 6,620.62	$ 1,236,798.02	186.81	$ 1,236,798.02	100%
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	180.00	$ 113,807.32	$ 20,485,317.60	180.00	$ 20,485,317.60	100%
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	156.36	$ 48,905.05	$ 7,646,793.62	156.36	$ 7,646,793.62	100%
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1454.15	$ 2,028.72	$ 2,950,063.19	1454.15	$ 2,950,063.19	100%
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	648.00	$ 2,028.72	$ 1,314,610.56	648.00	$ 1,314,610.56	100%
3.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.19	$ 800,447.03	$ 2,553,426.03	3.19	$ 2,553,426.03	100%
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16.25	$ 1,375,792.04	$ 22,351,117.48	16.25	$ 22,351,117.48	100%
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	$ 3,129,144.81	$ 6,477,329.76	2.07	$ 6,477,329.76	100%
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.38	$ 1,461,468.24	$ 19,554,445.05	13.38	$ 19,554,445.05	100%
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.56	$ 1,944,132.62	$ 22,474,173.09	11.56	$ 22,474,173.09	100%
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.34	$ 1,349,337.03	$ 20,698,830.04	15.34	$ 20,698,830.04	100%
3.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	18214.68	$ 11,120.63	$202,558,716.85	15482.478	$172,174,909.32	85%
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1562.84	$ 11,967.06	$ 18,702,600.05	781.42	$9,351,300.03	50%
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1285.15	$ 30,075.87	$ 38,652,004.33	642.575	$19,326,002.17	50%
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	273.65	$ 79,462.54	$ 21,744,924.07	136.825	$10,872,462.04	50%
3.9	**RED HIDRÁULICA**							
3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.62	$ 15,380.00	$ 409,415.60	26.62	$ 409,415.60	100%
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	29.00	$ 3,142.03	$ 91,118.87	29.00	$ 91,118.87	100%
3.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.10	$ 18,697.31	$ 226,237.45	12.10	$ 226,237.45	100%
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 4,429.50	$ 88,590.00	20.00	$ 88,590.00	100%
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	3.00	$ 116,422.35	100%
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 10,381.65	$ 72,671.55	7.00	$ 72,671.55	100%
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 12,890.76	$ 77,344.56	6.00	$ 77,344.56	100%
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 24,273.15	$ 72,819.45	3.00	$ 72,819.45	100%
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 56,740.10	$ 170,220.30	3.00	$ 170,220.30	100%
3.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	41.10	$ 29,977.33	$ 1,232,068.26	41.10	$ 1,232,068.26	100%
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	42.00	$ 14,062.80	$ 590,637.60	42.00	$ 590,637.60	100%
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.40	$ 60,418.42	$ 1,232,535.77	20.40	$ 1,232,535.77	100%
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	21.00	$ 43,221.47	$ 907,650.87	21.00	$ 907,650.87	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	2.00	$ 152,619.12	100%
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 105,537.31	$ 211,074.62	2.00	$ 211,074.62	100%
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	17.00	$ 44,074.51	$ 749,266.67	17.00	$ 749,266.67	100%
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8.00	$ 34,548.91	$ 276,391.28	8.00	$ 276,391.28	100%
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16.00	$ 88,484.78	$ 1,415,756.48	16.00	$ 1,415,756.48	100%
4.0	**ZONA ARMERILLO**							
4.1	**PRELIMINARES**							
4.1.1.	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	55.12	$ 6,620.62	$ 364,928.57	55.12	$ 364,928.57	100%
4.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	46.43	$ 113,807.32	$ 5,284.073.87	46.43	$ 5,284,073.87	100%
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	38.41	$ 48,905.05	$ 1,878,442.97	38.41	$ 1,878,442.97	100%
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	357.21	$ 2,028.72	$ 724,679.07	357.21	$ 724,679.07	100%
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	167.15	$ 2,028.72	$ 339,100.55	167.15	$ 339,100.55	100%
4.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.73	$ 800,447.03	$ 584,326.33	0.73	$ 584,326.33	100%
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.28	$ 1,461,468.24	$ 10,639,488.79	7.28	$ 10,639,488.79	100%
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.90	$ 1,944,132.62	$ 25,079,310.80	12.90	$ 25,079,310.80	100%
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.05	$ 1,349,337.03	$ 6,814,152.00	5.05	$ 6,814,152.00	100%
4.3.8	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	42.07	$ 8,223.01	$ 345,942.03	42.07	$ 345,942.03	100%
4.4	**ACERO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5220.00	$ 11,120.63	$ 58,049,688.60	4698.00	$52,244,719.74	90%
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	506.70	$ 11,967.06	$ 6,063,709.30	304.02	$3,638,225.58	60%
4.8	**RED HIDRÁULICA**							
4.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.17	$ 15,380.00	$ 79,514.60	5.17	$ 79,514.60	100%
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 3,142.03	$ 28,278.27	9.00	$ 28,278.27	100%
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	1.00	$ 38,807.45	100%
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 68,128.10	$ 136,256.20	2.00	$ 136,256.20	100%
4.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.60	$ 29,977.33	$ 257,805.04	8.60	$ 257,805.04	100%
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 14,062.80	$ 140,628.00	10.00	$ 140,628.00	100%
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6.00	$ 60,418.42	$ 362,510.52	6.00	$ 362,510.52	100%
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	2.00	$ 86,442.94	100%
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	1.00	$ 76,309.56	100%
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	1.00	$ 105,537.31	100%
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	2.00	$ 69,097.82	100%
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	3.00	$ 265,454.34	100%
5.0	**ZONA ALOJAMIENTOS**							
5.1	**PRELIMINARES**							
5.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	786.13	$ 6,620.62	$ 5,204,668.00	786.13	$ 5,204,668.00	100%
5.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	1016.88	$ 113,807.32	$ 115,728,387.56	508.44	$ 115,728,387.56	100%
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	779.54	$ 48,905.05	$ 38,123,442.68	389.77	$ 38,123,442.68	100%
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7249.72	$ 2,028.72	$ 14,707,651.96	3624.86	$ 14,707,651.96	100%
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	3660.77	$ 2,028.72	$ 7,426,677.31	1830.385	$ 7,426,677.31	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	23.32	$ 800,447.03	$ 18,666,424.74	23.32	$ 18,666,424.74	100%
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	123.25	$ 1,375,792.04	$ 169,566,368.93	123.25	$ 169,566,368.93	100%
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.55	$ 3,129,144.81	$ 42,399,912.18	13.55	$ 42,399,912.18	100%
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54.63	$ 1,461,468.24	$ 79,840,009.95	54.63	$ 79,840,009.95	100%
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	93.67	$ 1,944,132.62	$ 182,106,902.52	56.202	$109,264,141.51	60%
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	$ 1,349,337.03	$ 75,589,860.42	56.02	$ 75,589,860.42	100%
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	531.19	$ 8,223.01	$ 4,367,980.68	159.357	$1,310,394.20	30%
5.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47301.57	$ 11,120.63	$ 526,023,258.39	40206.3345	$447,119,769.63	85%
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4898.53	$ 11,967.06	$ 58,621,002.42	1959.412	$23,448,400.97	40%
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4272.91	$ 30,075.87	$ 128,511,485.68	854.582	$25,702,297.14	20%
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	1079.18	$ 79,462.54	$ 85,754,383.92	215.836	$17,150,876.78	20%
5.8	**RED HIDRÁULICA**							
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84.30	$ 15,380.00	$ 1,296,534.00	84.30	$ 1,296,534.00	100%
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80.00	$ 3,142.03	$ 251,362.40	80.00	$ 251,362.40	100%
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	331.35	$ 18,697.31	$ 6,195,353.67	49.7025	$929,303.05	15%
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	226.00	$ 4,429.50	$ 1,001,067.00	45.20	$200,213.40	20%
5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.70	$ 22,034.37	$ 478,145.83	21.70	$ 478,145.83	100%
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 7,072.81	$ 35,364.05	5.00	$ 35,364.05	100%
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	1.00	$ 38,807.45	100%
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	138.00	$ 68,128.10	$ 9,401,677.80	27.60	$1,880,335.56	20%
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	136.00	$ 10,381.65	$ 1,411,904.40	20.40	$211,785.66	15%
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 12,941.64	$ 64,708.20	5.00	$ 64,708.20	100%
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 12,890.76	$ 25,781.52	2.00	$ 25,781.52	100%
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 24,273.15	$ 970,926.00	8.00	$194,185.20	20%
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 56,740.10	$ 1,134,802.00	4.00	$226,960.40	20%
5.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	164.10	$ 29,977.33	$ 4,919,279.85	164.10	$ 4,919,279.85	100%
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	$ 14,062.80	$ 928,144.80	66.00	$ 928,144.80	100%
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.50	$ 60,418.42	$ 4,984,519.65	82.50	$ 4,984,519.65	100%
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	$ 43,221.47	$ 2,852,617.02	66.00	$ 2,852,617.02	100%
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 76,309.56	$ 763,095.60	10.00	$ 763,095.60	100%
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 105,537.31	$ 1,055,373.10	10.00	$ 1,055,373.10	100%
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	40.00	$ 34,548.91	$ 1,381,956.40	40.00	$ 1,381,956.40	100%
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	50.00	$ 88,484.78	$ 4,424,239.00	50.00	$ 4,424,239.00	100%
6.0	**APARTAMENTO FISCAL**							
6.1	**PRELIMINARES**							
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	116.33	$ 6,620.62	$ 770,176.72	116.33	$ 770,176.72	100%
6.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	91.73	$ 113,807.32	$ 10,439,545.46	91.73	$ 10,439,545.46	100%
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	78.44	$ 48,905.05	$ 3,836,112.12	78.44	$ 3,836,112.12	100%
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	729.49	$ 2,028.72	$ 1,479,930.95	729.49	$ 1,479,930.95	100%
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	330.23	$ 2,028.72	$ 669,944.21	330.23	$ 669,944.21	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1.26	$ 800,447.03	$ 1,008,563.26	1.26	$ 1,008,563.26	100%
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.29	$ 1,461,468.24	$ 19,422,912.91	13.29	$ 19,422,912.91	100%
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.68	$ 1,944,132.62	$ 16,875,071.14	8.68	$ 16,875,071.14	100%
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.92	$ 1,349,337.03	$ 9,337,412.25	6.92	$ 9,337,412.25	100%
6.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	57.68	$ 8,223.01	$ 474,303.22	57.68	$ 474,303.22	100%
6.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4221.20	$ 11,120.63	$ 46,942,403.36	3588.02	$39,901,042.86	85%
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	692.70	$ 11,967.06	$ 8,289,582.46	277.08	$3,315,832.98	40%
6.9	**RED HIDRÁULICA**							
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.09	$ 15,380.00	$ 216,704.20	14.09	$ 216,704.20	100%
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	$ 3,142.03	$ 56,556.54	18.00	$ 56,556.54	100%
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 38,807.45	$ 77,614.90	2.00	$ 77,614.90	100%
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 10,381.65	$ 41,526.60	4.00	$ 41,526.60	100%
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 12,890.76	$ 51,563.04	4.00	$ 51,563.04	100%
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	2.00	$ 48,546.30	100%
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	1.00	$ 56,740.10	100%
6.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.43	$ 29,977.33	$ 462,550.20	15.43	$ 462,550.20	100%
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	23.00	$ 14,062.80	$ 323,444.40	23.00	$ 323,444.40	100%
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.52	$ 60,418.42	$ 514,764.94	8.52	$ 514,764.94	100%
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 43,221.47	$ 129,664.41	3.00	$ 129,664.41	100%
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	2.00	$ 152,619.12	100%
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	1.00	$ 105,537.31	100%
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 34,548.91	$ 138,195.64	4.00	$ 138,195.64	100%
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 88,484.78	$ 442,423.90	5.00	$ 442,423.90	100%
7.0	**GARITAS Y SHUT DE BASURAS**							
7.1	**PRELIMINARES**							
7.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	40.60	$ 6,620.62	$ 268,797.17	40.60	$ 268,797.17	100%
8.0	**URBANISMO Y PAISAJISMO**							
8.1	**PRELIMINARES**							
8.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2843.66	$ 6,620.62	$ 18,826,792.27	1564.013	$10,354,735.75	55%
8.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
8.2.1.	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE.	M3	1308.72	$ 113,807.32	$ 148,941,915.83	65.436	$7,447,095.79	5%
8.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	$ 107,621.85	$ 12,956,594.52	120.39	$12,956,594.52	100%

Tabla 10 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia

6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades de obra ejecutadas para el periodo del presente informe:

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINISTRATIVA							
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
1.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	84.43	0.00	37.99	$57,284,981.91	$57,284,981.91	45%





Las cantidades de concreto elaborados referentes en la zona administrativa, en el mes de abril permiten evidenciar la ejecución del concreto correspondiente a la placa de entrepiso nivel +3.50 el cual alcanza un 45% con respecto a la totalidad del ítem contractual.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINSTRATIVA							
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	26,221.812	8740.61	$97,201,023.06	$388,804,092.24	80%
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4256.38	0.00	2128.19	$64,007,165.78	$64,007,165.78	50%
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	844.32	0.00	379.944	$30,191,315.30	$30,191,315.30	45%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320








Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320





Las cantidades correspondientes al armado, colocación y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras de la zona administrativa, tales como vigas aéreas y arranques de muros estructurales, permiten alcanzar un acumulado aproximado al 80% del total de kg proyectado para esta zona en el contrato, cumpliendo con la programación mensual de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINSTRATIVA							
1.9	RED HIDRÁULICA							
1.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	217.23	0.00	108.615	$1,670,498.70	$1,670,498.70	50%
1.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	54.00	0.00	43.00	$135,735.70	$135,735.70	80%
1.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30.03	0.00	18.018	$336,888.13	$336,888.13	60%
1.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	0.00	25.00	$111,623.40	$111,623.40	60%
1.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	2.00	$69,853.41	$69,853.41	60%
1.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	0.00	10.00	$105,892.83	$105,892.83	60%
1.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	0.00	6.00	$77,344.56	$77,344.56	75%
1.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	0.00	6.00	$145,638.90	$145,638.90	60%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	0.00	3.00	$170,220.30	$170,220.30	60%






Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona administrativa, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.86	0.00	20.86	$40,554,606.45	$40,554,606.45	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.53	0.00	17.53	$23,653,878.14	$23,653,878.14	100%
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	146.10	0.00	146.10	$1,201,381.76	$1,201,381.76	100%









Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320





Se adelantaron el 100% de las cantidades de concreto ejecutados referentes a los muros estructurales o columnas y placa de contrapiso en la zona de servicios y celdas para el mes de abril. Como también la instalación del plástico PQA polietileno con antelación a la fundida de la placa de contrapiso.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8338.00	4585.90	2084.5	$23,180,953.24	$74,179,050.35	80%
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1955.40	0.00	1055.658	$18,018,299.62	$18,018,299.62	77%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320






Las cantidades correspondientes al armado, colocación y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras de la zona de servicios y celdas retenidos, tales como vigas aéreas, con lo cual se permiten alcanzar un acumulado aproximado al 80% del total de kg proyectado para el contrato, cumpliendo con la programación de obra. Así mismo, se realiza la colocación y armado de la malla electrosoldada correspondiente a la placa de contrapiso.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.9	RED HIDRÁULICA							
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.45	0.00	3.45	$53,061.00	$53,061.00	100%
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	0.00	4.00	$12,568.12	$12,568.12	100%
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.65	0.00	5.65	$105,639.80	$105,639.80	100%
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	0.00	8.00	$35,436.00	$35,436.00	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	0.00	4.00	$31,144.95	$31,144.95	100%
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$48,546.30	$48,546.30	100%
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$56,740.10	$56,740.10	100%





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona de servicios generales y celdas, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.60	0.00	3.60	$107,918.39	$107,918.39	100%
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	0.00	5.00	$70,314.00	$70,314.00	100%
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.85	0.00	3.85	$232,610.92	$232,610.92	100%
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$86,442.94	$86,442.94	100%
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$28,809.14	$28,809.14	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$76,309.56	$76,309.56	100%
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$105,537.31	$105,537.31	100%
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$44,074.51	$44,074.51	100%
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$69,097.82	$69,097.82	100%
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$265,454.34	$265,454.34	100%









Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en la zona de servicios generales y celdas, cumpliendo con la programación de obra.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.12	MEDIA TENSIÓN							
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	324.00	0.00	162.00	$1,077,058.62	$1,077,058.62	50%



De acuerdo con el levantamiento topográfico del predio, se determina la nivelación para así limitar las áreas donde se deberán trazar las redes eléctricas en el proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.13	BAJA TENSIÓN							
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	112.00	0.00	162.00	$1,077,058.62	$1,077,058.62	15%



Se inician las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería PVC conforme a la red eléctrica interna proyectada.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.34	0.00	15.34	$20,698,830.04	$20,698,830.04	100%





Se interviene de manera simultánea la zona social, en la cual se funde todo el concreto de placa de contrapiso, con su respectivo amarre y colocación de la malla electrosoldada ejecutando un 100% estas actividades.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	18214.68	10018.074	5464.404	$60,767,615.06	$172,174,909.32	85%
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1562.84	0.00	781.42	$9,351,300.03	$9,351,300.03	50%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1265.15	0.00	632.575	$19,326,002.17	$19,326,002.17	50%
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	273.65	0.00	136.825	$10,872,462.04	$10,872,462.04	50%








Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras correspondientes a las vigas aéreas del módulo zona social ejecutando así un 85% acumulado del ítem, como también la colocación de malla electrosoldada para la placa de contrapiso, perfilería estructural para primer nivel y colocación de lámina metaldeck.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.9	RED HIDRÁULICA							
3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.62	0.00	26.62	$409,415.60	$409,415.60	100%
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	29.00	0.00	29.00	$91,118.87	$91,118.87	100%
3.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.10	0.00	12.10	$226,237.45	$226,237.45	100%
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	0.00	20.00	$88,590.00	$88,590.00	100%
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$116,422.35	$116,422.35	100%
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	0.00	7.00	$72,671.55	$72,671.55	100%
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	0.00	6.00	$77,344.56	$77,344.56	100%
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$72,819.45	$72,819.45	100%
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$170,220.30	$170,220.30	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona social, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.05	0.00	5.05	$6,814,152.00	$6,814,152.00	100%
4.3.8	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	42.07	0.00	42.07	$345,942.03	$345,942.03	100%





Se interviene de manera simultánea en la zona del armerillo, en la cual se funde placa de contrapiso con su respectivo extendido del plástico negro, ejecutando un 100% de estas actividades.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5220.00	3393.00	1305.00	$14,512,422.15	$52,244,719.74	90%
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	506.70	0.00	304.20	$3,638,225.58	$3,638,225.58	60%





Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras correspondientes a viga área y malla electrosoldada para la placa de contrapiso del módulo ejecutando así en general gran parte de este capítulo.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.8	RED HIDRÁULICA							
4.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.17	0.00	5.17	$79,514.60	$79,514.60	100%
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	0.00	9.00	$28,278.27	$28,278.27	100%
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$38,807.45	$38,807.45	100%
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$25,781.52	$25,781.52	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN							



Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en el armerillo, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.60	0.00	8.60	$257,805.04	$257,805.04	100%
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	0.00	10.00	$140,628.00	$140,628.00	100%
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6.00	0.00	6.00	$362,510.52	$362,510.52	100%
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$86,442.94	$86,442.94	100%
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$76,309.56	$76,309.56	100%
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$105,537.31	$105,537.31	100%
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$69,097.82	$69,097.82	100%
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2"	UN	3.00	0.00	3.00	$265,454.34	$265,454.34	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN							





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en el armerillo, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	93.67	46.835	9.367	$18,210,690.25	$109,264,141.51	60%
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	16.806	39.214	$52,912,902.29	$22,676,958.13	100%
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	531.19	0.00	159.357	$1,310,394.20	$1,310,394.20	30%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320






Se interviene de manera simultánea en la zona alojamientos A y B; estructuras que constan de un solo nivel, en las cuales se funden todo el concreto correspondiente a los muros de concreto y/o columnas. En la zona de alojamientos C; estructura que consta de dos niveles se funde placa de contrapiso, con su respectiva colocación de plástico negro, amarre y armado del acero de refuerzo.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47301.57	28,380.942	11,825.392	$131,505,814.60	$447,119,769.63	85%
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4898.53	489.853	1469.559	$17,586,300.73	$23,448,400.97	40%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4272.91	0.00	854.582	$25,702,297.14	$25,702,297.14	20%
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	1079.18	0.00	215.836	$17,150,876.78	$17,150,876.78	20%






Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras en concreto tales como pedestales, vigas de cimentación y muros o columnas del módulo, ejecutando así un 60% del ítem.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.8	RED HIDRÁULICA							
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	331.35	0.00	49.7025	$929,303.05	$929,303.05	15%
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	226.00	0.00	45.20	$200,213.40	$200,213.40	20%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.70	0.00	21.70	$478,145.83	$478,145.83	100%
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	0.00	5.00	$35,364.05	$35,364.05	100%
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$38,807.45	$38,807.45	100%
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	138.00	0.00	138.00	$1,880,335.56	$1,880,335.56	20%
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	136.00	0.00	136.00	$211,785.66	$211,785.66	15%
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	0.00	5.00	$64,708.20	$64,708.20	100%
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$25,781.52	$25,781.52	100%
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	0.00	40.00	$194,185.20	$194,185.20	20%
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	0.00	20.00	$226,960.40	$226,960.40	20%





Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320




Se inicia las actividades correspondientes a la instalación de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona de alojamientos C que son estructuras de dos niveles.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	APARTAMENTO FISCAL							
6.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
6.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M3	57.68	0.00	57.68	$474,303.22	$474,303.22	100%




Se interviene de manera simultánea la zona del apartamento fiscal, en la cual se funde placa de contrapiso y con antelación a ello se realiza la colocación del plástico negro de este módulo ejecutando un 100% de estas actividades.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	APARTAMENTO FISCAL							
6.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
6.4.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,	KG	4221.20	2532.72	1266.36	$14,082,721.01	$42,248,163.02	90%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	COLOCACIÓN Y AMARRE.							
6.4.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	692.70	0.00	415.62	$4,973,749.48	$4,973,749.48	60%



Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras en concreto tales como pedestales, vigas de cimentación y muros o columnas del módulo, ejecutando así un 60% del ítem.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	APARTAMENTO FISCAL							
6.9	RED HIDRÁULICA							
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.09	0.00	14.09	$216,704.20	$216,704.20	100%
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	0.00	18.00	$56,556.54	$56,556.54	100%
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$77,614.90	$77,614.90	100%
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	0.00	4.00	$41,526.60	$41,526.60	100%
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	0.00	4.00	$51,563.04	$51,563.04	100%
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$48,546.30	$48,546.30	100%
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$56,740.10	$56,740.10	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona del apartamento fiscal.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	APARTAMENTO FISCAL							
6.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.43	0.00	15.43	$462,550.20	$462,550.20	100%
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	23.00	0.00	23.00	$323,444.40	$323,444.40	100%
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.52	0.00	8.52	$514,764.94	$514,764.94	100%
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	0.00	3.00	$129,664.41	$129,664.41	100%
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	0.00	2.00	$152,619.12	$152,619.12	100%
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	0.00	1.00	$105,537.31	$105,537.31	100%
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	0.00	4.00	$138,195.64	$138,195.64	100%
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	0.00	5.00	$442,423.90	$442,423.90	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320






Se inicia las actividades correspondientes a la instalación de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en la zona del apartamento fiscal.

6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Se relacionan los avances en físico teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas para la Etapa II – Ejecución de obra y las programaciones semanales:

- ABRIL 2024:

% PROGRAMADO MENSUAL	% EJECUTADO MENSUAL	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
5.00%	6.81%	+1.81%

Tabla 11 Avance programado mensual. Fuente: Propia

% PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
29.00%	25.75%	-3.25%

Tabla 12 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

RESUMEN DE AVANCE O RETRASO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor total inicial – Etapa II Ejecución de obra	$11.912.622.964,00
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) Meses
Valor total ajustado[3] – Etapa II Ejecución de obra	$15.999.051.958,11
Plazo de ejecución actualizado según prórroga mediante acta modificatoria No. 1	Diecisiete (17) meses y dieciocho (18) días
Valor ejecutado – Etapa II Ejecución de obra	$2,256,533,895.55
Porcentaje mensual ejecutado	6.81%
Porcentaje mensual acumulado ejecutado	25.75%

Tabla 13 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia

Para el mes de diciembre de 2023 se adelantó la elaboración y presentación del cobro correspondiente al anticipo destinado para la Etapa II – Ejecución de obra, en consecuencia, el único cobro realizado a la fecha es el correspondiente al cobro del anticipo por un valor de $4.765.049.185,60 equivalente al 40% del valor inicial del contrato.

VALOR PROYECTO INICIAL		$11.912.622.964,00	
VALOR PROYECTO AJUSTADO[1]		$15.999.051.958,11	
PAGOS REALIZADOS	VALOR	ACUMULADOS PAGOS REALIZADOS	
		$	%
ANTICIPO	$4.765.049.185,60	$4.765.049.185,60	40%

Tabla 14 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia

CONTRATO No. 377 DE 2023	VALOR	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.912.622.964,00	100%
VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO[1]	$15.999.051.958,11	100%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.009.279.030,13	6.31%
VALOR POR EJECUTAR	$10.903.343.933,87	91.53%

Tabla 15 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia

[3] *Nota: El valor del proyecto ajustado es resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños, donde se evidenció que el valor inicial contratado no sería suficiente para contemplar componentes necesarios para la entrega integral y funcional de la instalación policial tales como el cerramiento perimetral, obras exteriores de urbanismo, aires acondicionados, dotación de closets para alojamientos colectivos, muebles altos y bajos para cocina del apartamento fiscal.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Por otra parte, se relacionan las ordenes de desembolsos y/o reembolsos gestionados ante la Fiduciaria para el periodo del presente informe, mediante las siguientes tablas de flujo:

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	ORDEN No. 21	ORDEN No. 22	ORDEN No. 23
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.713.405.564,96	37.85%	-	-	$129,026,900.00
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$282.769.159,80	6.25%	-	-	$28,819,159.80
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.530.621.460,84	55.90%	$132,609,600.00	$19,047,509.45	$70,032,200.00
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%			

Tabla 16 Flujo de desembolsos Orden 21 al 23 - Anticipo. Fuente: Propia

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	TOTAL DESEMBOLSO	SALDO	PORCENTAJE %
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.713.405.564,96	37.85%	$1.713.405.564,96	$0	37.85%
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$282.769.159,80	6.25%	$282.769.159,80	$0	6.25%
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.530.621.460,84	55.90%	$2.152.224.302,86	$378.397.157,98	47.54%
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%	$ 4.148.399.027,62	$378.397.157,98	91.64%

Tabla 17 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia

De esta manera, se evidencia que se ha manejado al 91.64% del desembolso correspondiente al valor total del anticipo para el contrato No. 377 de 2023, según la actualización de Apropiación Presupuestal que presentó para el desarrollo de las actividades contractuales, el presente flujo de desembolsos del anticipo se proporciona con el propósito de conservar una transparencia y claridad en la gestión de los recursos financieros relacionados, puesto que estos permiten contar con un musculo financiero y por consiguiente mantener en progreso las actividades de obra.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** garantizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal profesional directivo, técnico administrativo y operativo, el cual describimos a continuación y se adjunta soporte de planillas del periodo de tiempo para el presente informe.

7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	86.050.324	Director de obra	Sanitas	Protección	Positiva
2	Joe Andres Martino Pérez Díaz	86.082.603	Residente de obra	Sanitas	Porvenir	Positiva
3	Silvestre Ariza Angulo	9.527.938	Profesional en SST	Compensar	Colpensiones	Sura
4	Manuel Santiago Diaz Orjuela	1.122.134.140	Ingeniero ambiental	Sanitas	Porvenir	Positiva
5	Juan Pablo Rodríguez Coronado	74.080.400	Especialista estructural	Sanitas	Porvenir	Sura
6	Jefferson Parra Capera	1.032.398.799	Ingeniero electricista	Sanitas	Colpensiones	Positiva
7	Jorge Eduardo Acosta Acosta	79.248.930	Especialista bioclimático	Compensar	Colpensiones	Sura

Tabla 18 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia

7.2 PERSONAL OPERATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Luis Antonio Piñeros Pino	PPT5471061	Almacenista de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
2	Harol David Cuesta Riveros	1.122.125.571	Operario Retroexcavadora	Capital Salud	Porvenir	Sura
3	Eduar Arbey Ortiz Parrado	86.078.482	Ingeniero Civil - Apoyo	Sanitas	Colpensiones	Sura
4	Robinson Escobar Daza	1.123.512.948	Auxiliar de Topografía	Nueva EPS	Colfondos	Sura
5	Luis Eduardo Benavides Beltrán	19.416.407	Nivelador - Topografía	Sanitas	Colpensiones	Sura
6	Brayan Stiven Redondo Ocampo	1.006.779.799	Auxiliar almacenista	Nueva EPS	Porvenir	Sura
7	Daniel Felipe Méndez Santos	1006558861	Auxiliar SST	Sanitas	Porvenir	Sura
8	Karol Valentina Vanegas Patiño	1112139691	Auxiliar Administrativo	Nueva EPS	Porvenir	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

9	Cristian David Posso Martínez	1.070.816.550	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
10	Daniel Jose Posso Martínez	1.070.810.587	Ayudante de obra	Nueva EPS	Protección	Sura
11	Daimer Darío Ávila Arroyo	1.003.065.274	Oficial de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
12	Jesús Emilio Ruiz Meneses	76.308.812	Ayudante de obra	Sanitas	Colpensiones	Sura
13	Yancarlos Campos Genes	1.003.841.152	Ayudante de obra	Cajacopi	Porvenir	Sura
14	Jamis Deys Miranda Cruz	1.063.303.655	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
15	William Darío Valdés Álvarez	1.112.763.604	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
16	Jairyth Jeovanny Lizcano Cruz	86.058.910	Ayudante de obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura
17	Jhonatan Sánchez Cárdenas	1.121.828.478	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
18	Orlando Barrera	4.272.180	Ayudante de obra	Famisanar	Colpensiones	Sura
19	Fabian Andres Rey Niño	1.122.118.780	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
20	Richard Moreno Guiza	17.418.711	Ayudante de obra	Capital Salud	Colfondos	Sura
21	Luis Fernando Daza Cubillos	93.461.815	Ayudante de obra	Salud Total	Protección	Sura
22	Aldemar Alonso Huertas	1.022.931.193	Ayudante de obra	Sanitas	Colfondos	Sura
23	Jose Santa Hermes	17.410.829	Ayudante de obra	Salud total	Porvenir	Sura
24	Dilmer Santiago López	1.071.252.050	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
25	Roque David Argel Urrutia	78.106.815	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
26	Ferney Ruiz Fonseca	86.045.693	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
27	Hernán Romero Muñoz	4.582.33	Ayudante de obra	Nueva EPS	Protección	Sura
28	Dairon Over Camargo Pineda	15.363.920	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
29	Eduis Enrique Flórez Flórez	1.072.254.162	Ayudante de obra	Cajacopi	Colfondos	Sura
30	Carlos Arturo Heredia	86.008.884	Ayudante de obra	Famisanar	Colfondos	Sura
31	Rubén Casallas Pachón	7.843.636	Ayudante de obra	Capital Salud	Porvenir	Sura
32	Juan David Suarez	1.117.519.256	Ayudante de obra	Salud Total	Colfondos	Sura
33	Jhonatan David López García	1.192.719.989	Ingeniero eléctrico	Famisanar	Protección	Sura
34	Enoc Espejo Campo	1.048.554.558	Ayudante de obra	Compensar	Porvenir	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

35	Andres Álvaro Alencar Lana	1.122.142.523	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
36	Jose Alfonso Murcia Méndez	1.125.878.909	Ayudante de obra	Salud Total	Colpensiones	Sura
37	Andres Hernando Ordoñez Alarcón	7.247.119	Soldador	Salud Total	Colpensiones	Sura
38	Jose Domingo Forero Ávila	86.078.089	Ayudante soldadura	Salud Total	Porvenir	Sura
39	Alberney Ávila Arroyo	1.003065.221	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
40	Juan Pablo Beltrán	1.006.837.762	Ayudante de obra	Capital Salud	Protección	Sura
41	Jhoam Sebastián Velandia Restrepo	1.006.863.758	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
42	Julián Camilo López Pinilla	1122507158	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
43	Jeison Ferney Urueña Vargas	1.006.780.233	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
44	Jose Alejandro Morales Ardila	1.120.558.199	Ayudante de obra	Nueva EPS	Colpensiones	Sura
45	Brayan Stiven Herrera Castillo	1.000.671.251	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
46	Jose Daniel Vargas López	17.220.387	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
47	Deivy Jose Cárdenas	1.063.688.337	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
48	Luis Eduardo Garces Espejo	1.007.688.337	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
49	Maicol Fabian Araque	1.007.033.351	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
50	Luis Antonio Molina Castro	17.312.984	Maestro de obra	Cajacopi	Colpensiones	Sura
51	Patrocinio Vásquez Ruiz	17.312.984	Ejero	Salud Total	Colpensiones	Sura

Tabla 19 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS

8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO

NOMBRE DEL PROESIONAL	CARGO	CANT.	DEDICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	Director de obra	1	50%	63202-82799 QND
Joe Andres Martino Pérez Díaz	Residente de obra	1	100%	25202-181971 CND
Silvestre Ariza Angulo	Profesional en SST	1	100%	25228-77268 CND
Manuel Santiago Díaz Orjuela	Ingeniero Ambiental	1	100%	25260-369062 CND

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Juan Pablo Rodríguez Coronado	Especialista estructural	1	20%	25202-262270 CND
Jefferson Parra Capera	Ingeniero Electricista	1	20%	CN205-68996
Jorge Eduardo Acosta Acosta	Arquitecto Bioclimático	1	30%	25700-63290 CND

Tabla 20 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia

8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

La sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 14 No. 13 – 76 Barrio Centro del Municipio de Acacias - Meta. Es desde allí que se realiza la coordinación general del proyecto.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

9 CONCLUSIONES

- El avance de ejecución de obra alcanzado para el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de abril al día 31 de abril del 2024, con las actividades ejecutadas permiten evidenciar un avance mensual del 6.81% y un acumulado correspondiente a 25.75% mensual que representa un total ejecutado a la fecha de $3,067,852,432.00 del valor total inicial del presupuesto para la Etapa II – Ejecución de obra.

Dicho avance en general corresponde a las siguientes: continuación de fundida de estructuras en concreto de manera simultánea en los diferentes bloques o zonas tales como muros o columnas, placas de contrapiso y vigas aéreas, con su respectivo armado y amarre del acero de refuerzo correspondiente de cada estructura de concreto. Además, se continúa avanzando en la mayoría de los módulos con las instalaciones que conforman la red sanitaria e hidráulica. Así las cosas, se avanza de gran manera en la construcción de los elementos estructurales para la cimentación que hace parte fundamental del proceso constructivo para la ejecución eficiente de los diferentes bloques o zonas de conformidad con los diseños del proyecto en general.

Por otra parte, se presentaron varios días de precipitaciones de manera considerables durante el mes las cuales dificultan la continuidad durante la ejecución de las actividades de obra, de las mismas se deja constancia en bitácora de obra. Así mismo, para el siguiente como medida de acción ingresará otro frente de trabajo que permita alcanzar el avance programado.

- Cabe resaltar que hasta la fecha del presente informe el porcentaje (%) de avance al cierre del mes de abril debe ser establecido con base al valor total inicial del proyecto para la Etapa II – Ejecución de obra, es decir sobre $11.912.622.964. Por otra parte, aunque de conformidad con los resultados obtenidos de la Etapa I – Estudios y Diseños el presupuesto de obra indica que el valor total requerido para la ejecución de obra es de $15.999.051.958,11, el cual no puede ser tomado como referencia puesto que dichos recursos adicionales no han sido apropiados por parte del Municipio a los contratos.

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

10 ANEXOS - REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Proceso de fundida con autobomba – Muros o columnas en concreto	Visita de seguimiento – Ministerio del Interior
	
Proceso de instalación – Cajas redes	Taller de ornamentación – Fabricación y adecuación de viguetas
	
Evidencia – Clima lluvioso/Altas precipitaciones en sitio de obra	Transporte material granular de relleno

Tabla 21 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes abril - 2024). Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320
