	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 976 de 2021 **Contratista:** Consorcio DSC

Contrato de Interventoría No. 1000 de 2021 **Interventoría:** Consorcio Ecovisión-190

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INFORME MENSUAL No. 38 **MES O PERIODO:** 01/07/2024 al 31/07/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	Anexo 1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCION**		
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		Anexo 2
2.4	Características técnicas del proyecto		Anexo 1
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Anexos 3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Anexos 4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Anexos 5
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Anexos 6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Anexos 7
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Anexos 8
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Anexos 9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Anexos 10
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Anexos 11
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	Anexos 12
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Anexos 13
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Anexos 14
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Anexos 15
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Anexos 16
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		Anexo 1
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		Anexos al informe
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		Anexo 1
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Anexos 17
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Anexos 18
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Anexos 19
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Anexos 20
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Anexos 21
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Anexos 22
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	Anexos 23
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Anexo 1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		Anexo 1
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Anexos al informe
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Anexo 1
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Anexos al informe

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 179 DE 26 DE ENERO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO CENTRO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 01/07/2024 al 31/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 976 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL , SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA CAÑO JOSE - EL PETROLERO - CALAMBEO EN EL DEPARTAMENTO DEL CUNAVARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

PLAZO INICIAL: 111 meses
FECHA DE INICIO: 4/08/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 31 de agosto 2030
PLAZO ACUMULADO: 111 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 179,889,019,968.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 18,311,743,031.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,000,762,999.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1000 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Carlos Daniel Cerra Urrea

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	26
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	176
	Arcos	Und	42
	Puentes	Und	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0.1	11.17
	Mejoramiento	Km	0	0
	Rehabilitación	Km	0	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	0	42
	Arcos	Und	0	3
	Puentes	Und	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 172,957,357,905.05	$ 1,263,919,154.00	$ 174,221,277,059.05
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 17,560,562,427.00	$ 128,327,187.00	$ 17,688,889,614.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 970,000,000.00	$ 7,088,462.00	$ 977,088,462.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 385,000,000.00	$ 73,150,000.00	$ 458,150,000.00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 257,142,857.40	$ 48,857,142.60	$ 306,000,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 3,654,922,240.30	$ 694,435,225.70	$ 4,349,357,466.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 195,784,985,429.70	$ 2,215,777,171.30	$ 198,000,762,600.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 77,681,566,062.37	$ 567,672,982.22	$ 78,249,239,044.59	$ 78,249,239,044.59
AJUSTES	$ 6,808,938,961.00	$ 49,757,633.00	$ 6,858,696,594.00	$ 6,858,696,594.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36		$ 3,399,277.36	$ 3,399,277.36
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 41,173,002.00	$ 190,802.05	$ 41,363,804.00	$ 41,363,804.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
VALOR EJECUTADO				**$ 85,152,698,719.95**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 72,121,732,997.12
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 77,681,566,063.40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 107.71%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 57
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 21
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 583
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 661

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizó el colocado, riego y compactacion de la Base Granular PR34+500 al PR34+000



Se realizó el colocado de acero y vaciado de Caissón 3,4 y 6 para puente Caño Canoa PR43+190 LD.



Se realizó el colocado, riego y compactacion de la Subbase Granular PR34+500 al PR34+000



Se realizó el mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo para vigas de amarre de arco metálico PR34+285

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica para el periodo actual del contrato.

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 15202-172889 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1000 DE 2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INFORME No 38:

DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

INTERVENTOR
CONSORCIO ECOVISION-190
ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1000 DE 2021

MES 31. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 5

OBJETO INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INTERVENTORIA:
CONSORCIO ECOVISION-190

SEGUIMIENTO AL INFORME

COPIAS DIGITALES

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
COPIA 1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. BOGOTÁ	1
COPIA 2 - OFICINA INTERVENTORÍA. ARCHIVO	1

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Elaboración: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: junio de 2024.	 Firma
Aprobó: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: junio de 2024.	 Firma

1. INTRODUCCIÓN

El CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Así, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, del cual se desprenden los contratos de obra 976 de 2021 *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5" e interventoría 1000 de 2019* "*INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*"

El presente documento se elabora bajo los estándares establecidos por el Manual de Interventoría del INVIAS para la elaboración de informes mensuales y corresponde al período comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024 como el trigésimo octavó periodo del mensual de ejecución del contrato.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización.

El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guavire hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento (Ver Imagen 1).



Imagen 1. Localización corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare – El retorno – Calamar)

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La vía comunica a los municipios de Calamar - El Retorno, con una longitud de 45.5 Km, los cuales se recorrer con una velocidad promedio de 25km/h en un tiempo aproximado de 01 hora con 48 minutos, gracias a la ejecución del proyecto se obtendrá como beneficio minimizará el tiempo del recorrido a un 36%.

Con la ejecución del proyecto se beneficia de manera directa 83.011 habitantes, en tres municipios del Departamento del Guaviare (Ver Tabla 2)

Población Municipios de Influencia			
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**	**Total de Población**
Calamar	5.823	4.676	10.499 hab.
El Retorno	7.653	6.653	14.306 hab.
San José del Guaviare	29.473	28.733	58.206 hab.

Tabla 1: Población municipios de influencia
(https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/95015)

Relación de empleos generados

EMPLEOS GENERADOS				
Contrato	**Empleos Directos Generados**	**Empleos Indirectos Generados**	**Total, Empleos Generados**	**Empleo de la Zona de Influencia**
Interventoría	14	84	98	6
Obra	72	646	540	28

Tabla 2: Empleos Generados

2.3. Inventario y Estado inicial de la vía

La vía actualmente comunica los municipios de Calamar – El Retorno – San José del Guaviare, con una longitud de 73.46 Km con presencia de diferentes tipos de capas de rodadura como lo son material de afirmado, pavimento en concreto y mezcla asfáltica (Ver tabla 3).

Pr de inicio	Pr Finalización	Longitud en Km	Tipo Rodadura	Observación
Pr0+000	Pr0+800	0.8	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+800	Pr0+895	0.95	Afirmado	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+895	Pr0+930	0.35	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+930	Pr26+710	25.78	Afirmado	Calamar - Inspección La Libertad

Pr26+710	Pr27+100	0.39	Pavimento Rígido	Paso por Inspección La Libertad
Pr27+100	Pr45+300	18.20	Afirmado	
Pr45+300	Pr46+180	0.88	Pavimento Rígido	Paso por el Municipio de El Retorno
Pr46+180	Pr55+085	8.90	Afirmado	Municipio de El Retronó - Pavimento en Ejecución
Pr55+085	Pr69+080	13.99	Pavimento Flexible	Contrato de pavimentación en ejecución
Pr69+080	Pr73+460	4.38	Pavimento Flexible	Pavimento Flexible
TOTAL				73.46
TOTAL, EN AFIRMADO				53.03
TOTAL, EN PAVIEMENTO FLEXIBLE				18.38
TOTAL EN PAVIMENTO RIGIDO				1.97

Tabla 3. Estado inicial del corredor 7506.

En el tramo comprendido entre el PR 60+080 al PR 69+080 se ejecutó el convenio interadministrativo N° 1217 /2020 suscrito entre el Instituto Nacional de vías y el departamento del Guaviare, mediante el cual se realizó la construcción de estructura de pavimento asfaltico, obras de drenaje transversales y el Puente Agua Bonita II. Así mismo mediante el convenio interadministrativo N° 1818 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, se pavimenta en concreto flexible el sector entre el PR 55+585 al PR 60+080 de la ruta. Posteriormente se celebró el convenio interadministrativo N° 2084/2021 entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, con el cual se pavimentó en concreto asfaltico el tramo comprendido entre PR 46+585 al PR 55+585 con las obras de drenaje transversal y el puente Caño Trueno.

2.4. Características Técnicas del Proyecto

El alcance priorizado para el corredor vial corresponde a las siguientes intervenciones:

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion en los sectores del corredor vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que **se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados**, incluyendo las obras necesarias que aseguren el

correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**



Imagen 2. Vía a nivel de afirmado K34 + 800



Imagen 3. Vía el sector El retorno - Libertad

Dentro de las acciones a emprender en el marco del contrato 976 de 2021, se ha priorizado la pavimentación del tramo Calamar- El Retorno en el departamento del Guaviare, en el sentido El Retorno – Calamar, cuyas características generales son las siguientes:

- Terraplenes

Con el fin de dar cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS en lo referente a la construcción de terraplenes y aprovechar los materiales de calidad provenientes de la excavación, se realiza mejoramiento de estos con CAL VIVA y se incorporan en la construcción a dichas estructuras (Ver Imagen 4).

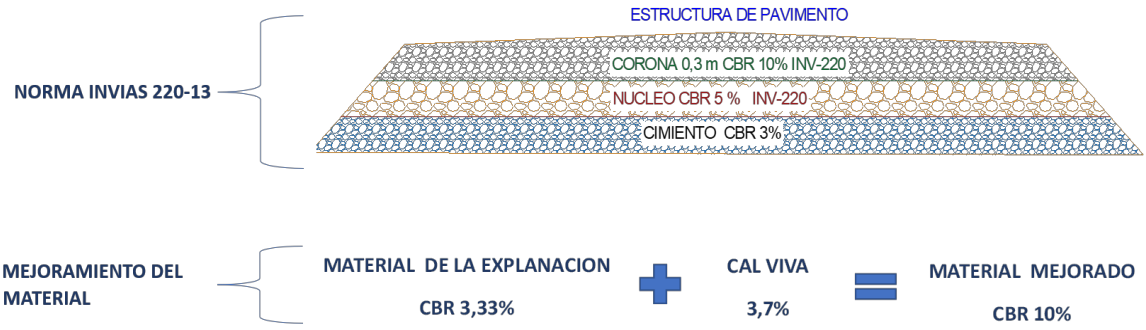


Imagen 4. Terraplén mejorado con Cal.

- Sección tipo

Aplicando la resolución 20213049941135 del 13 de septiembre de 2021 del Ministerio de Transporte, la cual permite ajustar parámetros de diseño, se implementó la sección tipo indicada en la imagen 2. Esto con el fin de aumentar la meta física propuesta en el anexo técnico del contrato 976 de 2021 (Ver Imagen 5).

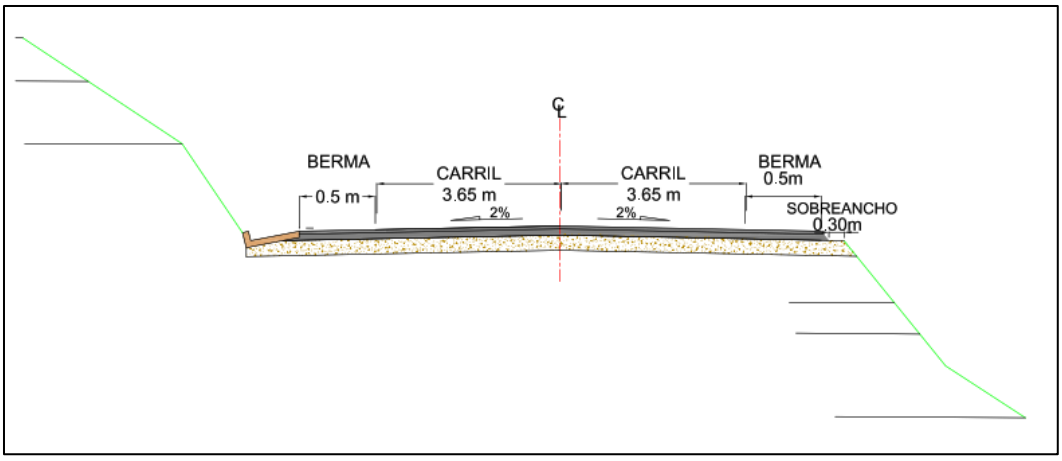


Imagen 5. Sección Típica Transversal.

- **Estructuras de pavimento:**

Se esta ejecutando una estructura de pavimento optimizada con el mejoramiento de la subrasante con CAL VIVA (Ver Imagen 6).

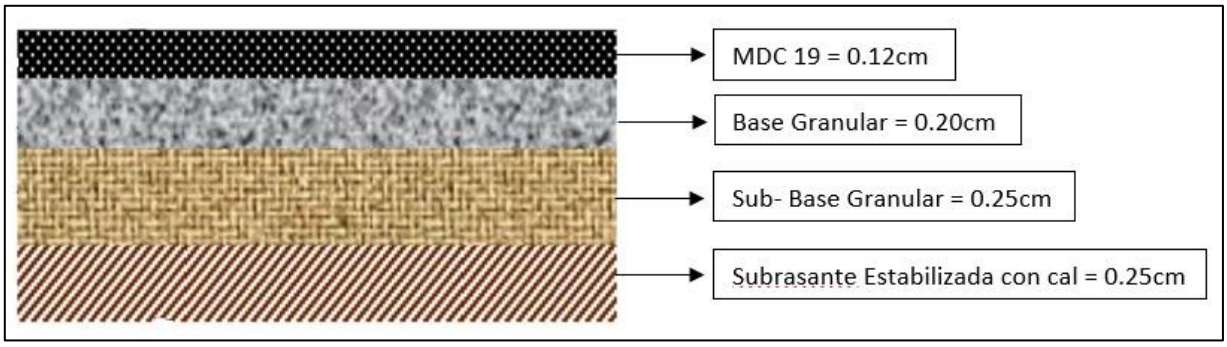
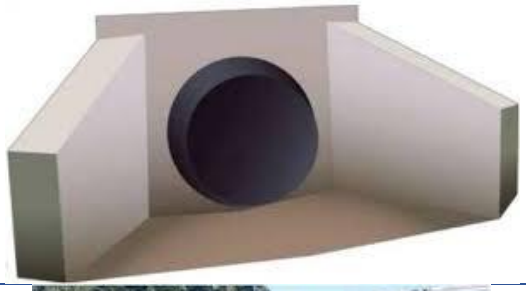


Imagen 6. Estructura de pavimento.

- **Obras transversales**

Se realiza la construcción de obras transversales con diferentes características (Ver Tabla 4), tanto para uso de drenaje como para pasos en fauna en 199 sitios.

N°	TIPO	IMAGEN	USO
1	Alcantarillas de drenaje redondas diámetro de 900 mm a 1200 mm		Uso drenaje
2	Arco metálico de drenaje con base entre 2,74 y 9,45		Uso drenaje


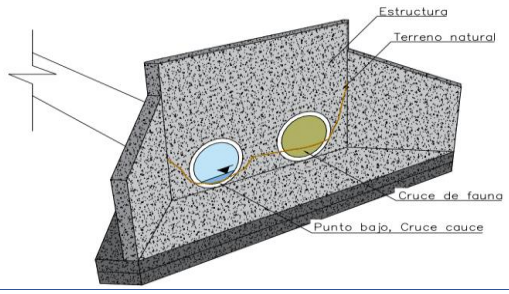



3	Alcantarilla de 900 mm, acondicionada		Uso drenaje y paso de fauna
3	Alcantarillas de drenaje con un paso de fauna, con diámetros entre 900 mm y 1800 mm		Uso hidráulico un ducto y paso de fauna el segundo ducto
4	Alcantarillas con dos pasos de fauna con diámetros de 1800 mm		Uso hidráulico ducto central y 2 ductos paralelos para paso de fauna
5	Arco con dos pasos de fauna con bases entre 2,74 m y 5,94		Uso hidráulico arco central y 2 arcos paralelos para paso de fauna
6	Puentes con luces de 20 m		Uso hidráulico y zona seca para paso de fauna

Tabla 4 Obras trasversales contrato 976 de 2021

- Obras de drenaje longitudinal

Con el fin de drenar la calzada de la vía de manera adecuada y proteger los predios aledaños, se esta ejecutando obras hidráulicas tipo cunetas. (Ver Tabla 5):

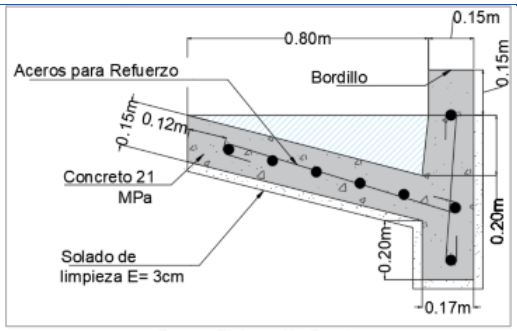
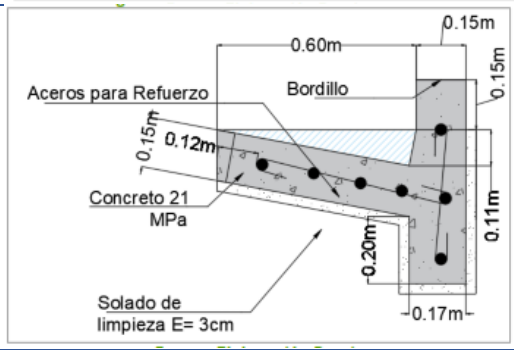

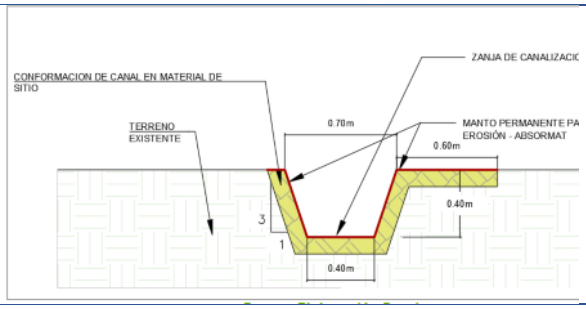
N°	TIPO	IMAGEN	USO
1	Cuneta de base 0,8 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo medio
2	Cuneta de base 0,6 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo bajo
3	Cuneta de base 0,6 m		Paralela a la vía, Uso berma – cuneta en zonas de alto flujo
4	Zanja de drenaje		En la base del terraplén en sectores sin cuneta, con alto flujo.

Tabla 5 Obras longitudinales contrato 976 de 2021

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare– El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO DSC
Contrato	976 DE 2021
Objeto	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 5”.
Iniciación	29 de junio de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	Hasta 31 de agosto de 2030
Valor Básico + IVA	$179.689.019.569,00
Adición 1	$18.311.743.031,00
Valor Actualizado	$198.000.762.600,00
Director de Obra	Edwin Bustos Ibarra
Resiente de Obra	Cesar Lancheros

Tabla 6. Información general del contrato de obra.

Seguimiento de Garantías Contractuales

El contratista mediante Póliza de Cumplimiento No 400033691 y la Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708 de la Compañía nacional de seguros

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2021	31/12/2025	$ 7’971.504.831,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	13/05/2021	31/12/2025	$27’011.743.031,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$23’914.514.493,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/05/2021	31/12/2028	$15’943.009.662,60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 7. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$3’985.752.415,00

Tabla 8. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021.

Seguimiento al estado actual de las Garantías Contractuales

se realizó una modifica y la compañía conoce el contenido de la modificación número cuatro (4) de 2024, por lo tanto, los demás términos y condiciones sin modificar continúan iguales y vigentes de acuerdo al Anexo N° 9 del 03 de julio de 2024.

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2023	31/12/2025	$ 9.125.743.101.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	26/07/2023	31/12/2025	$ 27.011.743.031.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$ 27.377.229.305.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/07/2023	31/12/2028	$ 18.251.486.203.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 9. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

se realizó una modifica del contenido número cuatro (4) de 2024, por lo tanto, los demás términos y condiciones sin modificar continúan iguales y vigentes de acuerdo al Anexo N° 8 del 03 de julio de 2024.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 4.562.871.550.75

Tabla 10. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes de julio de 2024

- **Trabajo de mejoramiento de puente.**

Durante este periodo se realizó la adecuación del puente Caño canoa, se realizó el vaciado y colocado de acero de los caisson 3,4 y 6, se continuó con la excavación del caisson N° 8:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR43+190		Se realizó trabajo de Excavación, colocado de formaleta y vaciado de concreto de los Caisson N° 6,3,4 y 8, se realizó el vaciado de los caisson N° 3,4 y 6 para el puente Caño Canoa.

Tabla 11. Abscisas de trabajo de mejoramiento de puente.



Imagen 07. Extracción de material de excavación de Caissón para puente Caño Canoa PR43+190 LD



Imagen 08. Colocado de acero y vaciado de Caiissón para puente Caño Canoa PR43+190 LD.

- **Excavaciones en material común de la explanación y canales**

Durante este periodo se realizó excavación en material común de la explanación y canales en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+060	PR34+150	Excavación para conformación de vía, Margen derecha
PR34+050	PR34+090	Retiro de material existente, Margen derecho
PR34+020		Excavación de descoles de obra transversal, Margen derecho

Tabla 12. Abscisas de excavación en material común.



Imagen 09. Retiro de material existente PR34+050 al PR34+090



Imagen 10. Excavación en material común PR34+060 al PR34+150

- **Afirmado**

Durante este periodo se realizó instalación de afirmado en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+060	PR34+150	Mejoramiento de subrasante
PR34+000	PR34+280	Mejoramiento de subrasante
PR34+710		Se instaló afirmado en acceso de vivienda, margen izquierdo.

Tabla 13. Abscisas de Material de afirmado.



Imagen 11. Instalación de afirmado para lleno de terraplén PR34+060 al PR34+150 LD.



Imagen 12. Instalación de afirmado para lleno de terraplén PR*34+000 al PR34+270 C.C.*

- **Subbase Granular clase A (No incluye transporte)**

Durante este periodo se realizó céreo e instalación de subbase granular clase A en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+090	PR34+030	Subbase Granular Calzada completa
PR34+090	PR34+150	Subbase Granular Calzada completa
PR34+150	PR34+270	Subbase Granular Calzada completa
PR34+290	PR34+500	Se realizo el céreo de Subbase Granular Calzada completa
PR34+020	PR34+270	Se realizo el céreo de Subbase Granular Calzada completa

Tabla 14. Abscisas de colocado de Subbase Granular clase A.



Imagen 13. Extendido de subbase Granular PR*34+150 al PR34+270.*



Imagen 14. Extendido de subbase Granular PR*34+150 al PR34+270.*

- **Base Granular clase A (No incluye transporte)**

Durante este periodo se realizó céreo e instalación de base granular clase A en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+500	PR34+300	Instalación Base Granular Calzada completa
PR34+270	PR34+020	Instalación Base Granular Calzada completa

Tabla 15. Abscisas de colocado de Base Granular clase A.



Imagen 15. Colocado de Base Granular PR*34+500 alPR34+300*



Imagen 16. Instalación de Base Granular PR*34+380 al PR34+500*

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Durante este periodo se realizaron excavaciones varias sin clasificar en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		LOBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	
PR35+080	PR34+860	Perfila y adecuación detrás de cunetas, Margen izquierdo
PR35+013	PR35+080	Perfila y adecuación detrás de cunetas, Margen izquierdo
PR35+020	PR35+280	Perfila y adecuación detrás de cunetas, Margen izquierdo
PR34+270	PR34+485	Excavación para filtro longitudinal margen derecha.
PR34+100	PR34+270	Adecuación y perfilado para paisajismos detrás de cunetas margen derecha.

PR34+040	PR34+100	Adecuación y perfilado para paisajismos detrás de cunetas margen derecha.
PR34+150	PR34+210	Excavación de material de afirmado y mejoramiento de subrasante del fallo.
PR36+020	PR36+500	Adecuación y perfilado de talud, margen derecha.
PR34+220	PR34+260	Adecuación de descole y perfilado de talud.
PR34+280		Excavación de tubería 1200 para ampliación de carril de arco
PR34+280		Excavación para mejoramiento de suelo de arco metálico.

Tabla 16. Abscisas de excavaciones varias sin clasificar.



Imagen 17. Lleno y perfilado detrás de cuneta PR35+080 al PR34+860.



Imagen 18. Excavación para filtro en el PR34+000 al PR34+150 LD.

- **Obra transversal**

Durante este periodo Se realizo la excavación, instalación y vaciado de placa de tubería de 32” de obra transversal en la siguiente abscisa:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+020		Se realizó el replanteo, excavación e instalación de tubería de obra transversal, margen derecho.

Tabla 17. Abscisas de obra transversal.



Imagen 19. Se realizó replanteo y excavación en el PR34+020.



Imagen 20. Se realizó el vaciado de recubrimiento de tubería y cabezal de obra transversal en el PR34+020.

- **Arco metálico**

Durante este periodo se realizo la excavación de mejoramiento de suelo para vigas de cimentación y demolición de obra transversal existente en la siguiente abscisa:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR34+285		Se realizo la excavación de mejoramiento de suelo para vigas de cimentación.

Tabla 18. Abscisas de Arco metálico.



Imagen 21. Se realizó replanteo y excavación para arco metálico en el PR34+285.



Imagen 22. Mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo para vigas de amarre de arco metálico PR34+285

- **Transporte de materiales**

Durante este periodo se realizó transporte de materiales en las siguientes abscisas:

TRANSPORTE DE MATERIALES		
PR34+500	PR34+300	Transporte de materiales de subbase y base granular.
PR34+040	PR34+270	Transporte de materiales de subbase y base granular.
PR34+710		Transporte de afirmado en acceso de vivienda, margen izquierdo.
PR34+000	PR34+150	Transporte de materiales filtrante.
PR34+000	PR34+150	Transporte de materiales filtrante.
PR34+150		Transporte de materiales filtrante.

Tabla 19. Abscisas de terraplén transporte de materiales



Imagen 23. Transporte de material (SBG) en el PR34+500 – *PR 34+300.*



Imagen 24. Transporte de material (BG) en el PR34+500 – *PR 34+300.*

- **Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)**

Durante este periodo se realizó el escarificado para nivelación del mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio) en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR34+210		Se realizó la escarificación para nivelación.
PR34+090	PR34+150	Se realizó la escarificación para nivelación.
PR34+150	PR34+210	Se realizo el mejoramiento de subrasante del fallo.

Tabla 20. Abscisas del mejoramiento subrasante.



Imagen 25. Se realizó escarificado del mejoramiento subrasante *en el PR34+210.*



Imagen 26. Se realizó escarificado del mejoramiento subrasante *en el PR34+210.*

- **Se realizó la revegtalizacion lateral de la vía.**

Durante este periodo se realizó la revegtalizacion lateral y detrás de cuneta de la vía para la protección del talud.

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR35+250		Se realizó revegtalizacion ZODME.
PR34+020		Se realizó revegtalizacion de canal de descole, margen derecho.
PR34+050	PR34+230	Se realizó revegtalizacion y protección de talud, margen derecho.
PR35+020	PR35+080	Se realizó revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud.
PR36+020	PR36+550	Se realizó revegtalizacion de protección de talud.
PR34+000	PR34+220	Se realizó revegtalizacion de protección de talud.

Tabla 21. Abscisas del revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud,



Imagen 27. Revegtalizacion latera de la vía para protección del talud PR35+020 - PR35+080 LD.



Imagen 28. Revegtalizacion latera de la vía para protección del talud PR36+020 - PR36+550 LI.

- **Material Granular drenante**

Durante este periodo se realizó instalación de material granular drenante en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR34+000	PR34+150	Filtro, margen derecho
PR34+000	PR34+150	Filtro, margen izquierdo
PR34+150		Filtro transversal, margen izquierdo

Tabla 22. Abscisas del material Granular drenante.



Imagen 29. Instalación de material granular drenante en el PR34+000 al PR34+150 *LD.*



Imagen 30. Instalación de material granular drenante PR34+000 al PR34+150 *LI.*

- **Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.**

Durante este periodo se realizó instalación de tubería de plástico tipo corrugada de diámetro 100mm en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR34+000	PR34+150	Elaboración de filtro, margen derecho
PR34+000	PR34+150	Elaboración de filtro, margen izquierdo
PR34+150		Elaboración de filtro transversal, margen izquierdo

Tabla 23. Abscisas de la tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.



Imagen 31. Instalación de tubería en el PR34+000 al PR34+150 *LD.*



Imagen 32. Instalación de tubería en el PR34+000 al PR34+150 *LI.*

- **Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.**

Durante este periodo se realizó instalación de geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR34+000	PR34+150	filtro longitudinal, margen derecho
PR34+000	PR34+150	filtro longitudinal, margen izquierdo
PR34+150		Filtro transversal, margen izquierdo

Tabla 24. Abscisas de la tubería de geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.



Imagen 33. Instalación de geotextil en el PR34+000 al PR34+150 *LD.*



Imagen 34. Instalación de geotextil en el PR34+000 al PR34+150 *LI.*

- **Provisiones ejecutadas**

Durante el periodo del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 se realizaron provisiones del contrato 976 de 2021.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 5,097,518.00	$ 1,426,735,916.00
2 Sub-bases y bases	$ 522,256,101.00	$ 16,869,376,507.00
3 Transporte de materiales	$ 543,241,600.00	$ 34,918,939,632.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 5,908,707.00	$ 2,491,949,234.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 158,028,104.00	$ 13,207,256,208.37
6 Concreto para superestructuras	$ 144,059,139.00	$ 288,118,278.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 8,490,100.00	$ 8,479,190,287.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1,387,081,269.00**	**$ 77,681,566,062.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 5,097,518.00	$ 1,591,641,380.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 522,256,101.00	$ 20,677,282,545.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 1,120,000.00	$ 8,285,071,495.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 254,858,642.00	$ 10,888,403,427.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 60,507,408.00	$ 1,286,433,183.00
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 33,794,400.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 543,241,600.00	$ 34,918,939,632.00
TOTAL	**$ 1,387,081,269.00**	**$ 77,681,566,062.37**

Tabla 25. Provisiones ejecutadas

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades con el acompañamiento y supervisión de la interventoría.

- **Actividades ambientales:**

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades con el acompañamiento y supervisión de la interventoría.

Se realizó verificación del cumplimiento de las medidas ambientales de los permisos obtenidos por el contratista los cuales se describen a continuación:

Permisos Ambientales obtenidos:

1. **Ocupación de cauces de 6 km:** Resolución DSGV-023-22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha se ha intervenido cuatro (4) obras. Se obtiene en el periodo prórroga del permiso por un tiempo de dos años DSGV-034-24 de marzo de 2024. Se tiene cumplimiento del 100% de la medida de compensación con el suministro de 2000 plántulas y la instalación de una valla metálica.

2. **Ocupación de cauces de 4 km:** Resolución DSGV-328- 22 del 9 de septiembre de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha de las 7 obras hidráulicas autorizadas. Se cuenta en el periodo

con la resolución modificatoria DSGV-127- 22 del 5 de mayo de 2023, por medio de la cual se autoriza las modificaciones de intervención de 4 puentes para el reemplazo total de los mismos. Al periodo se tiene intervenidas tres (3) obras: PR38+770, PR36+860 y PR35+550. Se continua con la intervención de una cuarta (4) obra autorizada en el PR43+190, con la construcción de caisson en el Puente Caño Canoa. El contratista cuenta con la Resolución DSGV-117-24 por medio de la cual se prorroga el permiso 6 años hasta el 10 de mayo de 2030, el mismo periodo para el cumplimiento de la medida de compensación de 2000 plántulas y la instalación de una valla metálica.

3. **Ocupación de cauces de 6 km Sector del PR35+600 al PR28+900:** Resolución DSGV-524-22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. Se autoriza la intervención de 9 obras, de las cuales al corte del presente reporte no se ha intervenido ninguna de las obras. Se obtuvo en el periodo prórroga de 60 días para el cumplimiento de la medida de compensación DSGV-036-24 de marzo de 2024. Para el suministro de 2700 plántulas e instalación de 4 vallas metálicas. Al corte del presente informe se tiene el cumplimiento del 100% de la medida de compensación.

4. **Concesión de aguas: Resolución DSGV-024-22 del 1 de marzo de 2022,** para dos puntos en Caño Canoa y Caño Potosí. En el mes de julio de 2024 no se realiza la captación e intervención del cauce en Caño Canoa en el PR43+090. El contratista realiza aprovechamiento de aguas lluvias. Se cuenta con prórroga concesión de aguas con la Resolución DSGV-088-22 del 24 de marzo de 2022 con una vigencia de 6 años y 6 meses.

5. **Permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas:** Resolución DSGV-105-22 del 24 de mayo de 2022, para planta de Trituración y Asfalto, por una vigencia de 5 años. El contratista radica pre-informe de los monitoreos isocinéticos para elaborar en la Planta de Asfalto, para el periodo entre el 10 al 22 de julio de 2024, en este sentido se daría cumplimiento a los monitoreos anuales de esta resolución.

6. **Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados:** Resolución DSGV-312-2022 del 5 de septiembre 2022, el contratista cumplió con las obligaciones impuestas en las actividades de tala y de igual forma con la medida de compensación con la entrega de 500 plántulas a la Corporación Ambiental CDA. Se cuenta con el cierre del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados mediante la Resolución DSGV-549-2022 del 21 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta que se cumplió con las obligaciones y medida de compensación a la corporación CDA.

7. **Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados,** sector del PR37+580 al PR28+900: Resolución DSGV-191-2023 del 6 de junio de 2023, este permiso se encuentra vigente, tiene una medida compensatoria de suministro de 2000 plántulas forestales nativas de 60 cm y la siembra y establecimiento de 20 cedros en el sector de intervención. Se cuenta con

prórroga del permiso aprovechamiento forestal de árboles aislados: Resolución DSGV-549-2023 del 28 de noviembre de 2023, por un término de dos (2) años. En este sentido la medida de compensación tiene el mismo plazo de la fecha de vigencia del acto administrativo. En el mes de mayo de 2024, no se tienen obras que se hayan intervenido en este sector, de igual forma se realiza acompañamiento a funcionario de la CDA para la visita de la primera visita de seguimiento anual del permiso.

8. Actividades generales ambientales:

- ✓ Se realizó confirmación de material sobrante de excavación en el predio Las Brisas ubicado en el PR38+900.

1. Se realizó suministro de combustible a la maquinaria y equipos en los frentes de obra por medio de carrotanque, cuenta con kit antiderrames y documentación vigente.
2. El contratista desarrolla temas de capacitación con el personal de obra en aspectos ambientales del proyecto.
3. Se uso unidades sanitarias en el frente de obra PR43+190 y PR33+000, se realiza mantenimiento y disposición de aguas residuales domesticas con EMPOAGUAS en el municipio de San José del Guaviare.
4. El contratista implementa medidas para control de material sedimentable en las fuentes hídricas que cuentan con permisos de ocupación de cauces.
5. El contratista adelantó actividades para tramitar el cierre con el propietario del predio La Cabaña ubicado en el PR 35+100 usado como sitio de disposición de material sobrante de excavación, con la reposición de cerco en el área intervenida, de igual forma la adecuación y revegetalización del acceso al predio.
6. Se realiza manejo de los residuos por medio de puntos ecológicos instalados en PR43+190 y PR 33+00, en la Zona Industrial y oficinas en El Retorno.
7. Se realiza recolección de los residuos en obra, son clasificados por aprovechables, no aprovechables y peligros o RESPEL; los residuos aprovechables son acopiados y entregados a los recicladores de la zona de influencia del proyecto, los residuos no aprovechables son entregados a la empresa de recolección de residuos municipal APC Servir de El Retorno y los RESPEL son entregados con periodicidad anual a los gestores ambientales autorizados.
8. Recorridos entre Profesional de la Interventoría y Residente Ambiental del contratista para seguimiento de las medidas ambientales descritas en el documento PAGA aprobado para el contrato de obra en su versión No 2.
9. La Interventoría remite observaciones de la actualización del documento PAGA en su versión No 2 y Plan de Inversión Ambiental (PIA) No 3.



Imagen 35. Estado actual del sitio de disposición de materiales La Cabaña (en cierre)



Imagen 36. Implementación de medidas para control de material sedimentable en obras con ocupación de cauces

- **Actividades Componente de sostenibilidad:**

Para el mes de julio de 2024, se avanzaron con las actividades del componente de sostenibilidad con las gestiones realizadas por la Interventoría, las cuales se describen a continuación:

- ✓ Participación el día 02 de julio de 2024 en comité de obra contratista e interventoría con el fin de socializar las actividades ejecutadas en la ultima semana y pendientes. ***Anexo 1. (Invitación reunión virtual del 02-07-2024).***

- ✓ Reunión virtual interna el día 02 de julio de 2024 con el apoyo de sostenibilidad de interventoría, con el fin de revisar el documento de sostenibilidad V20 entregado por el contratista. ***Anexo 2. (Invitación reunión interna virtual del 02-07-2024).***

- ✓ Revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de aprobar de manera parcial el documento de sostenibilidad V20. ***Anexo 3. (Revisión de comunicado correo electrónico 03-07-2024).***

- ✓ Participación el día 4 de julio de 2024 de reunión virtual con las Gestoras de Sostenibilidad del INVIAS e interventoría con el fin de aclarar inquietudes por parte de la SS de INVÍAS, después de la Mesa Territorial para la implementación de los LIVV, la cual fue realizada entre los días 24 y 26 de junio de 2024. ***Anexo 4. (Invitación reunión virtual del 04-07-2024).***

- ✓ El día 4 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de dar respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0154: Oficio 056-0-1324-2024, Informe trimestral No 9 v3, período septiembre 21 a diciembre 21 de 2023 y anexos. ***Anexo 5. (Revisión de comunicado correo electrónico 04-07-2024).***

- ✓ El día 4 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de remitir el documento de sostenibilidad V20 aprobado de manera parcial a la SS de INVIAS. ***Anexo 6. (Revisión de comunicado correo electrónico 04-07-2024).***

- ✓ El día 4 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de remitir respuesta a la SS de INVIAS de oficio 2024S-VBOG-028442 del 09 de mayo del 2024 relacionado con la entrega del documento de sostenibilidad V20, plan de inversión y cronograma entre otros temas. ***Anexo 7. (Revisión de comunicado correo electrónico 04-07-2024).***

- ✓ El día 5 de julio de 2024 se proyectó comunicado para el INVIAS con el fin de realizar solicitud de lineamientos de gestión de riesgo y mesa de trabajo. ***Anexo 8. (Revisión de comunicado correo electrónico 05-07-2024).***

- ✓ El día 5 de julio de 2024 se realizó revisión de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría en conjunto con la profesional social con el fin de remitir respuesta a la SS de INVIAS del oficio 2024S-VBOG-031914. Atención de observaciones programación de actividades implementación del código de conducta ***Anexo 9. (Revisión de comunicado correo electrónico 05-07-2024).***

- ✓ Se realizó revisión el día 5 de julio de 2024 el acta N°61 -Revisión ajustes DSV19 (25 y 28 de junio de 2024). ***Anexo 10. (Revisión de comunicado correo electrónico 05-07-2024).***

- ✓ Reunión virtual interna el día 06 de julio de 2024 con el apoyo de sostenibilidad de interventoría, con el fin de revisar el informe mensual del contratista N°30. ***Anexo 11. (Invitación reunión interna virtual del 06-07-2024).***

- ✓ El día 9 de julio de 2024 se participó de comité técnico de obra donde se socializó los pendientes de componente. ***Anexo 12. (Invitación reunión virtual del 09-07-2024).***

- ✓ El día 9 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de dar respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0156 del contratista a observaciones a informe mensual N°31. ***Anexo 13. (Revisión de comunicado correo electrónico 09-07-2024).***

- ✓ El día 9 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de dar respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0169 del contratista a observaciones a informe mensual N°32. ***Anexo 14. (Revisión de comunicado correo electrónico 09-07-2024).***

- ✓ El día 9 de julio de 2024 se revisó y ajustó comunicado de respuesta a comunicado del contratista N°2024-DSC-CENV-0165 con asunto: Oficio 056-0-1237-2024, Informe trimestral No 10 v1, componente Sostenibilidad, periodo diciembre 21 de 2023 a marzo 21 de 2024 y anexos. Componente Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021. ***Anexo 15. (Revisión de comunicado 056-0-1449-2024 de fecha 09-07-2024).***

- ✓ El día 10 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de solicitarle al contratista el informe mensual N°33. ***Anexo 16. (Revisión de comunicado 056-0-1454-2024 10-07-2024).***

- ✓ Reunión virtual interna el día 11 de julio de 2024 con el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría, con el fin de revisar la estrategia de formación remitida por el contratista. ***Anexo 17. (Invitación reunión interna virtual del 11-07-2024).***

- ✓ El día 11 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de solicitarle al contratista el informe trimestral N°11. ***Anexo 18. (Revisión de comunicado 056-0-1455-2024 11-07-2024).***

- ✓ El día 11 de julio de 2024 se revisó y ajustó comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría con el objetivo de informar el estado de la Estrategia estructurada de formación dirigida a empleados y comunidad a la SS de INVIAS. ***Anexo 19. (Revisión de comunicado 056-0-1458-2024 de fecha 11-07-2024).***

- ✓ El día 11 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría con el fin de dar respuesta al oficio SS 49446. Metodología para identificación de partes afectadas. ***Anexo 20. (Revisión de comunicado correo electrónico 11-07-2024).***

- ✓ El día 12 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría con el fin de solicitarle al contratista la propuesta de sitios turísticos para implementar la acción 23 (DSV20): " Fortalecimiento de iniciativas y/o emprendimientos turísticos con adecuación y señalización de accesos a predios para fortalecimiento de iniciativas y/o emprendimientos turísticos de naturaleza sostenible y/o turismo regenerativo ubicados en el corredor vial y/o AID", de acuerdo a los acercamientos realizados los días 9 y 22 de mayo de 2024, con la Secretaria de cultura y turismo del departamento del Guaviare. ***Anexo 21. (Revisión de comunicado correo electrónico 12-07-2024).***

- ✓ El día 12 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría con el fin de solicitarle al contratista definición de visita al predio La Cabaña con el fin de avanzar en la implementación de la acción 11 (DSV20). ***Anexo 22. (Revisión de comunicado correo electrónico 12-07-2024).***

- ✓ El día 12 de julio de 2024 se realizó revisión y ajuste de comunicado proyectado por el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría con el fin de dar respuesta al comunicado del contratista 2024-DSC-CENV-0202. Implementación medidas atropellamiento de fauna. ***Anexo 23. (Revisión de comunicado correo electrónico 12-07-2024).***

- ✓ Mesa de trabajo virtual el día 12 de julio de 2024 con las Gestoras de Sostenibilidad del INVIAS, Gestor Técnico, contratista e interventoría con el fin de revisar los términos de referencia para el plan de inversión V2 a ser implementado en la vigencia 2024. ***Anexo 24. (Invitación reunión interna virtual del 12-07-2024).***

- ✓ Reunión virtual interna el día 12 de julio de 2024 con el apoyo de sostenibilidad y profesional social de interventoría, con el fin de revisar la presentación para el comité técnico de obra. ***Anexo 25. (Invitación reunión interna virtual del 12-07-2024).***

- ✓ Mesa de trabajo virtual con el contratista el día 15 de julio de 2024, con el fin de aclarar dudas respecto a los informes mensuales de obra que se encuentran pendientes por presentar a la interventoría. ***Anexo 26. (Invitación reunión interna virtual del 15-07-2024).***

- ✓ Se realizó revisión el día 15 de julio de 2024 el acta N°62 -Revisión de términos de referencia. ***Anexo 27. (Revisión de comunicado correo electrónico 15-07-2024).***

- ✓ El día 16 de julio de 2024 se participó de comité técnico de obra donde se socializó los pendientes de componente. ***Anexo 28. (Invitación reunión virtual del 16-07-2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado y remisión el día 19 de julio de 2024 para el contratista el Oficio allegado por la SS de INVIAS con radicado 2024S-VBOG-047370 donde allega las observaciones al Documento de Sostenibilidad. ***Anexo 29. (comunicado 056-0-1468-2023 del 19-07-2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado y remisión el día 25 de julio de 2024 al contratista del oficio allegado por la SS de Remisión Oficio 2024S-VBOG-048558. Mesa de Socialización monitor Wayra-Inventario de Emisiones. ***Anexo 30. (comunicado 056-0-1470-2023 del 25-07-2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado y remisión el día 25 de julio de 2024 a la SS de INVIAS de respuesta a la atención y/o respuesta del Consorcio DSC a cada una de las observaciones realizadas mediante oficio 2024S-VBOG-047000 por la Subdirección de sostenibilidad del INVIAS el día 16 de julio de 2024, con respecto a la programación de actividades de implementación del Código de Conducta adoptado por el Contratista para el año 2024. ***Anexo 31. (comunicado 056-0-1471-2023 del 25-07-2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado y remisión el día 30 de julio de 2024 a la SS de INVIAS de respuesta a oficio 2024S-VBOG-048573. Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-061013. Solicitud de información con respecto al Plan de Gestión del Riesgo teniendo en cuenta el Apéndice G de Sostenibilidad. ***Anexo 32. (comunicado 056-0-1474-2023 del 30-07-2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado y remisión el día 30 de julio de 2024 al contratista de respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0210 - Términos de referencia Sostenibilidad, vigencia 2024. ***Anexo 33. (comunicado 056-0-1475-2023 del 30-07-2024).***

- ✓ Participación de la socialización Monitor wayra el día 30 de julio de 2024 por la SS de INVIAS. ***Anexo 34. (Invitación virtual de fecha 30-07-2024).***

- ✓ Los días 26 y 31 de julio de 2024 se llevó a cabo mesa de trabajo con el contratista con el fin de aclarar dudas a observaciones realizadas por la SS de INVIAS al documento de sostenibilidad aprobado parcialmente por la Interventoría. ***Anexo 35. (Invitaciones virtuales de fechas 26 y 31 de julio 2024).***

- ✓ Elaboración de comunicado al contratista solicitándole el informe mensual N°34 correspondiente al periodo entre el 21 de junio al 21 de julio de 2024. ***Anexo 36. (correo electrónico del 31-07-2024).***

- **Actividades Componente social:**

Durante el presente período, el contratista llevó a cabo diversas actividades en el componente social, con el acompañamiento y la supervisión de la interventoría:

- ✓ Durante este período, la interventoría llevó a cabo seguimiento del funcionamiento de las oficinas SAU, ubicadas en los municipios de El Retorno y Calamar, garantizando la prestación oportuna del servicio por parte del contratista.

- ✓ El contratista ha establecido tres buzones satélites en distintas ubicaciones: uno en la Inspección de Policía de La Libertad, otro en la residencia de la presidenta del comité de participación comunitaria en la vereda La Marina y el último en la Alcaldía del municipio de Calamar. Estos buzones están destinados a la recepción de PQRS.

- ✓ La interventoría efectuó acompañamiento a la aplicación de encuestas de sastifacción y caracterización a usuarios y trabajadores de la vía.

- ✓ La interventoría llevo a cabo seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados con los propietarios, en relación a las 39 actas de compromisos sociales establecidos con propietarios en relación a la adecuación de entradas/accesos, reposición de cercas, entre otros, que pudieron verse afectados por el desarrollo de las actividades constructivas.De las cuales 25 se encuentran cerradas mientras que 14 están en atención por parte del contratista y pendientes de cierre. Se ha reiterado al contratista dar celeridad con el cumplimiento de estos compromisos. Así como, se solicito remitir la matriz actualizada con las últimas intervenciones ejecutadas, tanto el formato excel o el registro fotográfico.

- ✓ El contratista cuenta con el levantamiento de 148 actas de vecindad de inicio, 2 actas de vecindad de seguimiento y 21 actas de vecindad de cierre, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas por la interventoría.

- ✓ La interventoría desarrolló reunión mensual virtual entre las profesionales sociales del contratista e interventoría, a fin de revisar el estado y avance de implementación de las fichas de gestión social aprobadas en el PAGA V No1.

- ✓ La interventoría efectuó reunión virtual con la Gestora Social Dra. Luisa Fernanda Portela de la Subdirección de Sostenibilidad, el día viernes 12 de julio de 2024, con el fin de dar a conocer el estado del componente de Gestión Social concerniente al Contrato de Obra, en lo que respecta al periodo comprendido entre los meses de abril y julio de 2024.

- ✓ La interventoría remitió el Informe Trimestral Social No 11, correspondiente al periodo 22 de marzo al 21 junio de 2024, para revisión y concepto de la Subdirección de Sostenibilidad.

- ✓ La interventoría reitero al contratista la entrega del Informe final de la OPC, en el cual se incluyan los soportes de entrega del Manual de uso y el Manual de mantenimiento y el acta de entrega a la comunidad, así como el recibo contractual a la interventoría.

- ✓ La interventoría remitió a la veeduría de Calamar, información sobre las acciones de mantenimiento emprendidas en el marco del contrato No 976 de 2021, específicamente en el sector con rodadura en afirmado de la ruta 7506, en el tramo entre Calamar y El Retorno, esto en atención a los compromisos adquiridos ante la Contraloría General de la República durante la visita de campo realizada al contrato el día 6 de junio de 2021.

- ✓ La interventoría remitió a la veeduría de El Retorno, información técnica del contrato de obra No 976, esto en atención a los compromisos realizados ante la Contraloría General de la República en la visita de campo realizada al contrato de obra, el día 06 de junio de 2021.



Imagen No. 37. Atención de los compromisos con propietarios. 02-07-2024.



Imagen No 38. Buzones satelites habilitados para la recepción de PQRS- Municipio de Calamar. 04-07-2024



Imagen No. 19. Seguimiento Oficina de atención al usuario Municipio El Retorno. 09-07-2024.



Imagen No 20. Atención a las actas de compromisos establecidas con propietarios. 11-07-2024.

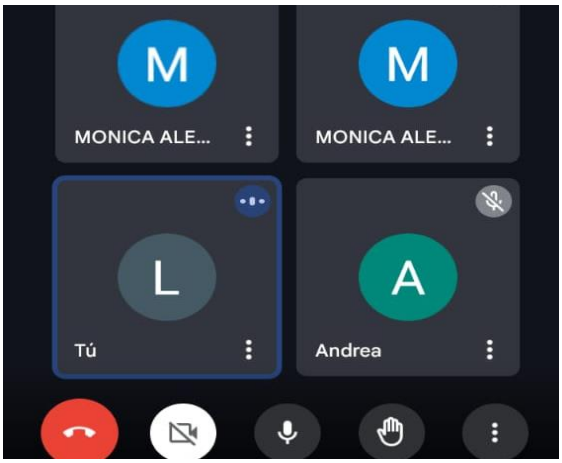


Imagen No.41. Reunión mensual social entre las profesionales del componente. 11-07-2024.



Imagen No 42. Reunión trimestral con gestora social de la Subdirección de Sostenibilidad. 11-07-2024.

- **Actividades Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):**

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades en el componente SST con el acompañamiento y supervisión de la interventoría:

- ✓ Se realizó seguimiento al mantenimiento de dispositivos de señalización como cinta de peligro, delineadores tubulares compuestos, maletines, barricadas de desvió,

señales informativas en los PR 01+930, PR 34+020, PR34+280, 36+200 al 36+410, 37+470 al 37+870, 43+050 al 43+270, 45+00 al 45+320, de El Retorno – Calamar.

- ✓ Se realizó seguimiento a las entregas de dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP) y del uso adecuado por parte del personal del Consorcio DSC.

- ✓ Se realizó seguimiento del control vial en los diferentes sitios de intervención del corredor vial de El Retorno - Calamar.

- ✓ Se realizó un recorrido en la obra junto al contratista y la interventoría para dar seguimiento a las medidas implementadas en seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ Se realizo seguimiento a la actividad del puente caño canoa, PR43+190, en la construcción de caisson, en la implementación de las medidas de protección y prevención contra caídas, con el fin de garantizar la seguridad a los trabajadores.

- ✓ Se realizó un recorrido en la obra junto al contratista y la interventoría para inspeccionar los equipos de emergencia, específicamente el botiquín y la camilla. El objetivo era verificar que ambos estén en buen estado y que el botiquín contenga a todos lo necesario.

- ✓ Se radico al contratista comunicado 056-0-1462-2024 del 13 de julio del 2024, asunto Rta 2024-DSC-CENV-0203 Presentación Capacitación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres

- ✓ Se radico al contratista comunicado 056-0-1466-2024 del 18 de julio del 2024, asunto Rta 2024-DSC-CENV-0207 Revisión presentación, Capacitación P.G.R.D.

- ✓ Se radico al contratista comunicado 056-0-1467-2024 del 18 de julio del 2024, asunto Solicitud de planilla de seguridad social y parafiscales

- ✓ Se radico al contratista comunicado 056-0-1472-2024 del 18 de julio del 2024, asunto Rta 2024-DSC-CENV-0215 con asunto Revisión presentación, Capacitación (P.G.R.D.)

- ✓ seguridad social y parafiscales de planilla de seguridad social y parafiscales del Contrato de obra 976 de 2021.



Imagen 43. Señalización vial en el PR34+280.



Imagen 44: Seguimiento a equipos de emergencia botiquín y camilla.

- **Actividades Topográficas:**

Se realiza seguimiento y control topográfico a las siguientes excavaciones:

✓ Se realiza liberaciones de los niveles de capas de subrasante, conformados durante el mes, según carteras de rasante de diseño entregados por el contratista, y con el debido cumplimiento de la norma INVIAS para la capa en los siguientes tramos:

CAPA	TRAMO
Sub base	PR 34+000 – PR 34+250 PR 34+300 – PR 34+500
Base	PR 34+000 – PR 34+250 PR 34+300 – PR 34+500

Tabla 26. Seguimiento ítems no previstos.

✓ Se realiza seguimiento y control topográfico a las siguientes excavaciones:

DETALLE	ABSCISA	COSTADO
Excavación para caisson número 3,4 y 6 de puente.	PR 43+180	Der e Izq.
Excavación filtro longitudinal.	PR 34+025 – PR 34+150	Der e Izq.
Excavación encole arco.	PR 34+280	Der.
Excavación canal descole y alcantarilla.	PR 34+020	Der e Izq.

Tabla 27. Seguimiento ítems no previstos.

✓ Se realiza mantenimiento en los siguientes sectores de la vía existente:

PR 32+450 – PR 32+400
PR 32+350 – PR 32+300
PR 32+270 – PR 32+230
PR 31+900 – PR 31+850
PR 32+900 – PR 32+650
PR 31+070 – PR 31+000
PR 31+000 – PR 30+880
PR 30+800 – PR 30+690
PR 30+300 – PR 30+180
PR 30+120 – PR 30+040

- ✓ Se realiza medición en conjunto con contratista de cercas de alambre instaladas en distintos predios entre PR34+040 a PR35+710, a derecha e izquierda de la vía respectivamente.

- ✓ Se realiza reparación de fallo presente en eje de subrasante de PR34+150 a PR34+215.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Imagen 45: Chequeo niveles sub base, PR34+300.



Imagen 46: Instalación de sub base, PR34+150.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Para el periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 28 de enero de 2022;

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-1	(11606)	Tablestacado Metálico	kg
NP-2	(6-11602)	Suministro de Cal Viva	kg
NP-3	(2-11602)	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte	m3
NP-4	(5-11602)	Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3
NP-5	(5-11602)	Cemento hidráulico para suelo cemento	kg
NP-6	(3-11608)	Transporte de materiales provenientes de la excavación, canales y prestamos entre 100metros y 1000metros de distancia.	m3-E

Tabla 28. Seguimiento ítems no previstos.

Para el periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 06 de junio de 2022;

ITEM	GRUP O DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-7	(5-11604)	Rellenos con Material Filtrante	m3
NP-8	(5-11604)	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m
NP-9	(7-11604)	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2
NP-10	(4-11604)	Tubería Metálica Corrugada.	kg
NP-11	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior.	m
NP-13	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800mm de diámetro interior.	m

Tabla 29. Seguimiento ítems no previstos grupo 2.

Igualmente se realizó la modificación a los grupos adoptada mediante Resolución No. 2845 de 3 de agosto de 2022, motivada por lo expuesto en el Manual de interventoría de Obra pública vigente, y por la Resolución No. 320 de 26 de enero de 2022; documentos de donde incorpora el índice ICOCIV a los procedimientos de la entidad a causa de la suspensión en la publicación del índice ICCP con el cual se efectuaban los ajustes de los contratos de obra susceptibles a este procedimiento.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.4.1 Estado de avance

Para el periodo 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 se realizó seguimiento al contrato de obra 976 de 2021, presentado una inversión de obra programada acumulada de $ 72413574233.62 el cual corresponde al 41.87%, así mismo el estado de avance real es del 49.04% que representa $ 84815203789.98 en inversión ejecutada acumulada (ver grafica 1).


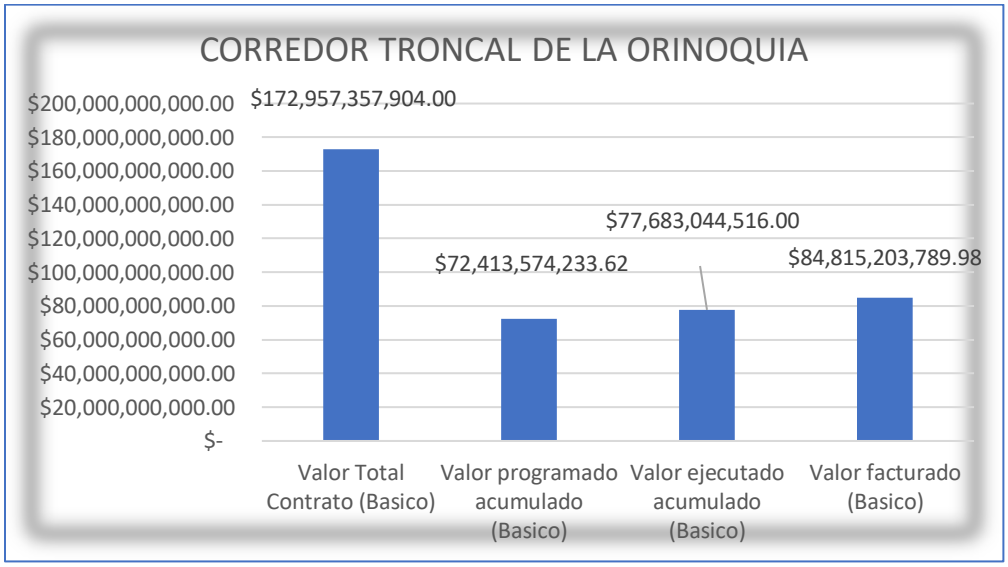


Gráfico 1 Grafico valor programado Vs valor ejecutado acumulado

3.4.2 Acciones a seguir por la interventoría

A la fecha contratista no presenta atraso en la ejecución financiera del contrato, igualmente ya se aprobó la vigencia 2024 para el contrato 976 de 2021.

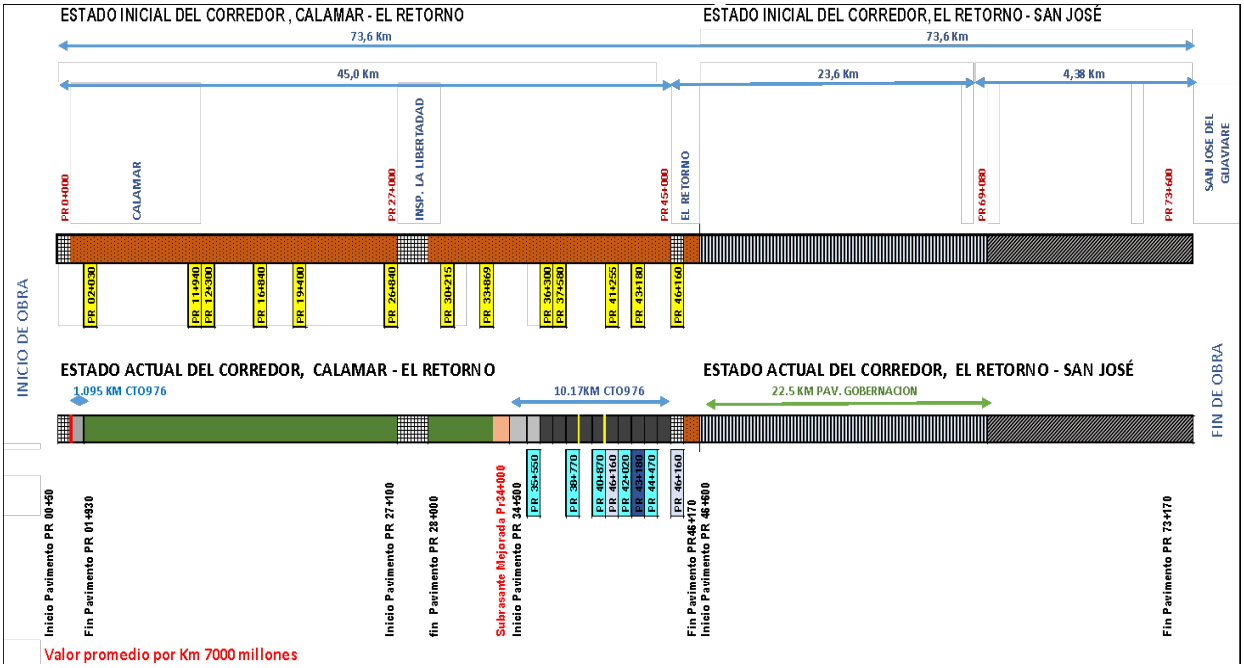

ESTADO INICIAL
PAVIMENTO MAL ESTADO
PAVIMENTO FLEXIBLE BUEN ESTADO
AFIRMADO
PAVIMENTACION POR GOBERNACIÓN
PAVIMENTO RIGIDO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNID	CANT. EJEC	PROG.	AVACE. %
MANTENIMIENTO	Km	21.00	34.00	62%
REHABILITACIÓN	Km	0.00	0.00	0%
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE CAPA 1° CAPA	Km	11.17	25.00	45%
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE SEGUNDA 2° CAP	Km	9.99	25.00	40%
PAVIMENTO RIGIDO	Km	0.103	0.103	100%
BASE GRANULAR	Km	11.60	25.00	46%
SUBBASE GRANULAR	Km	11.83	25.00	47%
SUBRASANTE MEJORADA	Km	12.19	25.00	49%
PASO DE FAUNAS	Und	5.00	15.00	33%
PUENTES PROGRAMADOS	Und	0.49	5.00	10%
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL	Und	42.00	230.00	18%

Gráfico 2 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal

(MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

Anexo 3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
(MEPI-MN1-IN-15-FR-4)
Anexo 4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

Anexo 5

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

Anexo 6

4.5 Estado General del Tiempo
(MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

Anexo 7

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
(MEPI-MN1-IN-15-FR-11)

Anexo 8

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

Anexo 9

4.8 **Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra**

(MEPI-MN-1IN-15-FR-14)

Anexo 10

4.9 Otros documentos seguimiento
a. Seguimiento a la inversión del Anticipo
(MEPI-MN-IN-2-FR-1)
Anexo 11

b. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-2-FR-2)
Anexo 12

c. Seguimiento programa de obra.

(MEPI-MN-IN-6-FR-1)

Anexo 13

d. Seguimiento al programa de inversiones

(MEPI-MN-IN-6-FR-2)

Anexo 14

e. Actas de comité de obra

(MEPI-MN-IN-14-FR-1)

Anexo 15

.

f. Actas de reunión

(MEPI-MN-IN-14-FR-2)

Anexo 16

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José – El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO ECOVISION-190
Contrato	1000 DE 2021
Objeto	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
Iniciación	Junio 29 de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	31 DE AGOSTO DE 2030
Valor Básico + IVA	$ 21.999.237.400,00
Valor Actualizado	$ 21.999.237.400,00
Director de Interventoría	Oscar Fernando Alvarado Díaz

Tabla 30. Información general contrato 1000 de 2021.

Seguimiento de Garantías Contractuales

La interventoría, mediante Póliza No NB-100164311 de compañía mundial de seguros S.A:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/07/2023	31/12/2025	$824.256.899,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	07/07/2023	31/12/2025	$755.300.879,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2023	31/12/2028	$1.648.513.797,00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2023	13/05/2026	$6.599.771.220,00

Tabla 31. Pólizas de cumplimiento contrato 1000 de 2021.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA MES JULIO 2024

ÍTEM	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	No DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	JESUS ARMANDO TORO CONTRALOR PROVINCIAL	San José del Guaviare	056-0-1430-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021

2	DELMO FERÍN MONDRAGÓN MENDOZA VEEDURIA CIUDADANA	El Retorno, Guaviare	056-0-1431-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
3	CONSTANTINO RODRÍGUEZ CALVO VEEDURIA CIUDADANA	El Retorno, Guaviare	056-0-1432-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
4	SEGUNDO CASIMIRO OSMAN VEEDURIA CIUDADANA	El Retorno, Guaviare	056-0-1433-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA	Contrato 1000 de 2021

					LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
5	JHON JAIRO ROMERO VEEDURIA RECIPAZ	San José del Guaviare	056-0-1434-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
6	FERNEY ROMERO MORENO VEEDURIA CIUDADANA	El Retorno, Guaviare	056-0-1435-2024	02/07/2024	Remisión de información técnica del contrato de obra- Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
7	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA	Bogotá D.C	056-0-1436-2024	02/07/2024	Reiteración trámite y gestiones ambientales del Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV 023-22. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA	Contrato 1000 de 2021

	CONSORCIO DSC				REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	
8	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI SUPERVISOR TERRITORIAL INVIAS META	Villavicencio, Meta	056-0-1437-2024	02/07/2024	Actualización estado del Informe de Presunto Incumplimiento del TITULO 8 “INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PAGA, E INFORME FINAL” del Apéndice D "APÉNDICE AMBIENTAL del Contrato No. 976 de 2021, remitido mediante el comunicado 056-1-262-2024 del 5 de febrero de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
9	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1438-2024	02/07/2024	Aprobación de Informe Mensual No 33. Área de Gestión Social-Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA	Contrato 1000 de 2021

					LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
10	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1439-2024	03/07/2024	Respuesta a comunicados 2024-DSC-CENV-0186 y 2024-DSC-CENV-0195. Documento de sostenibilidad V19 y V20. Aprobación parcial. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
11	JORGE ENRIQUE MARTINEZ AVENDAÑO VEEDURIA CIUDADANA	Calamar Guaviare	056-0-1440-2024	04/07/2024	Remisión de información acciones de mantenimiento. - Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
	JAIRO ARGUELLO URREGO				Aprobación parcial de Documento de Sostenibilidad V20. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	

12	SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1441-2024	04/07/2024	SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
13	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1442-2024	04/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0154: Oficio 056-0-1324-2024, Informe trimestral No 9 v3, período septiembre 21 a diciembre 21 de 2023 y anexos. Componente Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
14	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1443-2024	04/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0188 con asunto: 056-0-1401-2024; Actualización del documento PAGA versión 2 del contrato de la referencia con respecto al Componente Ambiental – JUNIO 2024. Contrato No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,	Contrato 1000 de 2021

					MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	
15	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1444-2024	05/07/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0170, con asunto “Carta de Presentación Profesional del Área de Aseguramiento o Gestión de la Calidad, “Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
16	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1445-2024	05/07/2024	Solicitud de lineamientos de gestión del riesgo y mesa de trabajo. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
	JAIRO ARGUELLO URREGO				Respuesta de oficio 2024S-VBOG-028442. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE	

17	SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1446-2024	05/07/2024	LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
18	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1447-2024	05/07/2024	Respuesta a oficio 2024S-VBOG-031914. Atención de observaciones programación de actividades implementación del código de conducta. Contrato de obra 976 de 2021 **“**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
19	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1448-2024	06/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0155 con asunto: Oficio 056-0-1335-2024, ajustes Informe 30 componente Sostenibilidad v1, período Febrero 21 a Marzo 21 de 2024 y anexos. Contrato de Obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA	Contrato 1000 de 2021

					LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
20	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1449-2024	09/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0165 con asunto: Oficio 056-0-1237-2024, Informe trimestral No 10 v1, componente Sostenibilidad, periodo diciembre 21 de 2023 a marzo 21 de 2024 y anexos. Componente Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
21	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1450-2024	09/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0156 con asunto: Oficio 056-0-1372-2024, Informe mensual No 31 v1, componente Sostenibilidad, período Marzo 21 - abril 21 de 2024 y anexos.., CONTRATO DE OBRA NO 976 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

22	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1451-2024	09/07/2024	Seguimiento a solicitud de atención de pendientes de la Obra con Participación Comunitaria (OPC) e informe final. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
23	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1452-2024	09/07/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0169 con asunto: Oficio 056-0-1393-2024, Informe mensual No 32 v1, periodo abril 21 a mayo 21 de 2024 y anexos. Contrato de Obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
24	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA	Bogotá D.C	056-0-1453-2024	10/07/2024	Estado de atención yo cumplimento de compromisos con la comunidad-Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL	Contrato 1000 de 2021

	CONSORCIO DSC				GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
25	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1454-2024	10/07/2024	Solicitud de Informe mensual de Sostenibilidad No 33 correspondiente al periodo 21 de mayo 2024 al 21 de junio 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
26	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1455-2024	11/07/2024	Solicitud de Informe Trimestral de Sostenibilidad No 11 correspondiente al periodo 21 de marzo 2024 al 21 de junio 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Reiteración comunicado 056-0-1427-2024 con asunto: Tramite al	

27	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1456-2024	11/07/2024	correo electrónico del 20 de junio de 2024 – “Ficha PAGA PAC-2.4-07 Manejo y Disposición Final de Escombros y Lodos”. Contrato de obra No 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
28	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1457-2024	11/07/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0199 con asunto: Estrategia Estructurada de Formación a empleados y comunidad V2. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
29	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBIL	Bogotá D.C	056-0-1458-2024	11/07/2024	Información del estado de la Estrategia estructurada de formación dirigida a empleados y comunidad. Contrato de obra 976 de 2021 **“**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL	

	IDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
30	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1459-2024	12/07/2024	Solicitud de presentación propuesta acción 23 “Fortalecimiento de iniciativas y/o emprendimientos turísticos”. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
31	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1460-2024	12/07/2024	Solicitud de respuesta a correo electrónico de fecha 3 de julio de 2024. Solicitud visita al propietario del predio ubicado en el PR 35+100 (Sitio de disposición LA CABAÑA) – Gestión para la implementación de la Acción 11 del Documento de Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021

32	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1461-2024	12/07/2024	Respuesta 2024-DSC-CENV-0202. Implementación medidas atropellamiento de fauna. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
33	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1462-2024	13/07/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0203 con asunto Revisión presentación, Capacitación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (P.G.R.D.) Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECT				Remisión Informe Trimestral del área de Gestión Social No 11. Periodo 22 de marzo de 2023 al periodo 21 junio de 2024 del Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN	

34	OR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1463-2024	13/07/2024	PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
35	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1464-2024	13/07/2024	Solicitud de atención sector entre el Pr33+030 al Pr33+300 Ruta 7506 - Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
36	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1465-2024	16/07/2024	Remisión Informe Trimestral Ambiental No 11, contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0207 con asunto oficio	

37	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1466-2024	18/07/2024	056-0-1462-2024 comentarios presentación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (P.G.R.D.). Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
38	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1467-2024	18/07/2024	Solicitud de planilla de seguridad social y parafiscales del Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
39	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1468-2024	19/07/2024	Remisión Oficio 2024S-VBOG-047370 – Observaciones al Documento de Sostenibilidad. Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA	Contrato 1000 de 2021

					REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
40	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1469-2024	19/07/2024	Remisión Oficio 2024S-VBOG-047000. Observaciones al Código de conducta. - Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
41	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1470-2024	25/07/2024	Remisión Oficio 2024S-VBOG-048558. Mesa de Socialización monitor Wayra-Inventario de Emisiones. Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
	JAIRO ARGUELLO				Respuesta a oficio 2024S-VBOG-047000. Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-061070. Atención de observaciones programación de actividades implementación del código de conducta. Contrato de	

42	URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1471-2024	25/07/2024	obra 976 de 2021 **“**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
43	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1472-2024	25/07/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0215 con asunto respuesta comunicado 056-0-1466-2024, ajustes 2 presentación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (P.G.R.D.). Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
44	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO	Bogotá D.C	056-0-1473-2024	30/07/2024	Remisión de términos de referencia del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la Restauración. Contrato de obra 976 de 2021 **“**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA	Contrato 1000 de 2021

	NACIONAL DE VIAS				REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
45	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1474-2024	30/07/2024	Respuesta a oficio 2024S-VBOG-048573. Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-061013. Solicitud de información con respecto al Plan de Gestión del Riesgo teniendo en cuenta el Apéndice G de Sostenibilidad. Contrato de obra 976 de 2021 **"**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
46	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1475-2024	30/07/2024	2024-DSC-CENV-0210 - Términos de referencia Sostenibilidad, vigencia 2024. Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

Tabla 32. correspondencia enviada mes de mayo 2024.

- *Se realizo elaboración de informes semanales de obra y actualización de la plataforma CIFRA.*
- *La interventoría realizó control y calidad de equipos en obra.*
- *La interventoría realizó control de cantidades en obra para dar cumplimiento con las especificaciones técnica.*
- *La interventoría realizó el seguimiento de las actividades diarias, evidenciado en el libro de Bitácora de obra.*
- *La interventoría realizó verificación de los planos definitivos, así mismo verificar que se están ejecutando los aprobados.*
- *La interventoría realizó durante el mes ejecutado el estado, calidad y cantidad de los equipos mínimos requeridos.*
- *La interventoría realizó seguimiento al avance físico y financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión.*
- *La interventoría realizó comité técnico semanal acompañado por el contratista e INVIAS, para mostrar los avances de obra.*
- *La interventoría elaboración de informes mensuales.*

5.3. Informes especialistas y profesionales

Se presenta informe de los siguientes especialistas, igualmente se encuentran anexos en la carpeta del informe.

Especialista en Sostenibilidad	Profesional Ambiental
Profesional Social	Profesional SST
Topografía	

. *Tabla 33. Informes especialistas y profesionales*

5.4. Informe del programa anual de caja – PAC

ACTA No.	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
Registro Presupuestal No.420421 De 2021			
Valor del Registro 2021:			$ 1.046.856.448,00

1	$ 0,00	$ 0	$ 1.046.856.448,00
2	$ 16.245.642,00	$ 16.245.642,00	$ 598.877.977,00
3	$ 53.775.264,00	$ 70.021.266,00	$ 567.697.153,00
4	$ 68.842.833,00	$ 138.864.099,00	$ 527.779.880,00
5	$ 111.045.088,00	$ 249.909.187,00	$ 463.392.392,00
6	$ 129.168.239,00	$ 379.077.426,00	$ 388.496.523,00
7	$ 126.021.524,00	$ 505.098.950,00	$ 315.445.229,00
Registro Presupuestal No.136422 De 2022			
Valor del Registro 2022:			$2.095.218.085,00
8	$ 144.993.170,00	$ 650.092.120,00	$ 2.011.166.425,00
9	$ 168.065.628,00	$818.157.748,00	$ 1.913.716.607,00
10	$ 161.311.212,00	$979.468.960,00	$ 1.820.183.215,00
11	$ 185.541.968,00	$1.165.010.928,00	$1.712.580.047,00
12	$ 198.933.085,00	$1.363.944.013,00	$1.597.232.292,00
13	$ 194.142.264,00	$1.558.086.277,00	$1.484.662.408,00
14	$ 232.250.834,00	$1.790.332.111,00	$1.310.962.204,00
15	$ 235.811.012,00	$2.026.148.123,00	$1.115.946.192,00
16	$ 232.470.384,00	$2.258.618.507,00	$883.475.808,00
17	$ 235.477.048,00	$2.494.095.555,00	$647.998.760,00
18	$ 230.652.314,00	$2.724.747.869,00	$417.346.446,00
19	$250.267.860,00	$2.975.015.729,00	$167.078.586,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 136422 De 2022			$0.00
Registro Presupuestal No. 126523 De 2023			$1.047.619.048,00
20	$226.663.842,00	$3.201.679.571,00	$998.033.792,00
21	$216.854.481,00	$3.418.534.052,00	$771.179.311,00
22	$239.954.857,00	$3.658.488.909,00	$531.224.454,00
23	$237.133.604,00	$3.895.622.513,00	$294.090.850,00

24	$227.617.229,00	$4.123.239.742,00	$66.473.621,00
25	$66.406.355,00	$4.189.646.097,00	$67.266,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 1422 De 2022			$0,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1.957.617.298,00
26	$216.684.237,00	$4.399.400.551,00	$1.747.930.110,00
27	$245.353.526,00	$4.651.683.860,00	$1.741.000.555,00
28	$255133812,00	$4.906.817.672,00	$1.240.512.989,00
29	$261.974.918,00	$5.168.792.590,00	$978.538.071.00
30	$288.073.755,00	$5.456.866.345,00	$690.464.316,00
31	$258.968.662,00	$5.715.835.007,00	$431.495.654,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$431.495.654,00
32	$222.803.305,00	$5.938.638.312,00	$208.692.349,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1,047,619,048.00
33	$ 248.276.999,00	$ 6.186.915.311,00	$ 1.008.034.398,00
34	$ 232.269.584,00	$ 6.419.184.895,00	$ 775.764.814,00
35	$ 197.744.334,00	$ 6.616.929.229,00	$ 578.020.480,00
36	$ 196.237.524,00	$ 6.813.166.753,00	$ 381.782.956,00
37	$ 177.587.253,00	$ 6.990.754.006,00	$ 204.195.703,00
38	$ 125.274.784,00	$ 7.116.028.790,00	$ 78.920.919,00


Tabla 34. Información financiera contrato 1000 de 2021

5.5 Informe matriz de riesgos

Se adjunta como anexo al documento informe mensual matriz de riego del contrato de obra 976 de 2021 y contrato 1000 de 2021.

5.6 Informe otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se realizo el diligenciamiento del programa aplicativo CIFRA, donde se lleva a cabo el reporte semanal del proyecto de obra 976 de 2021.

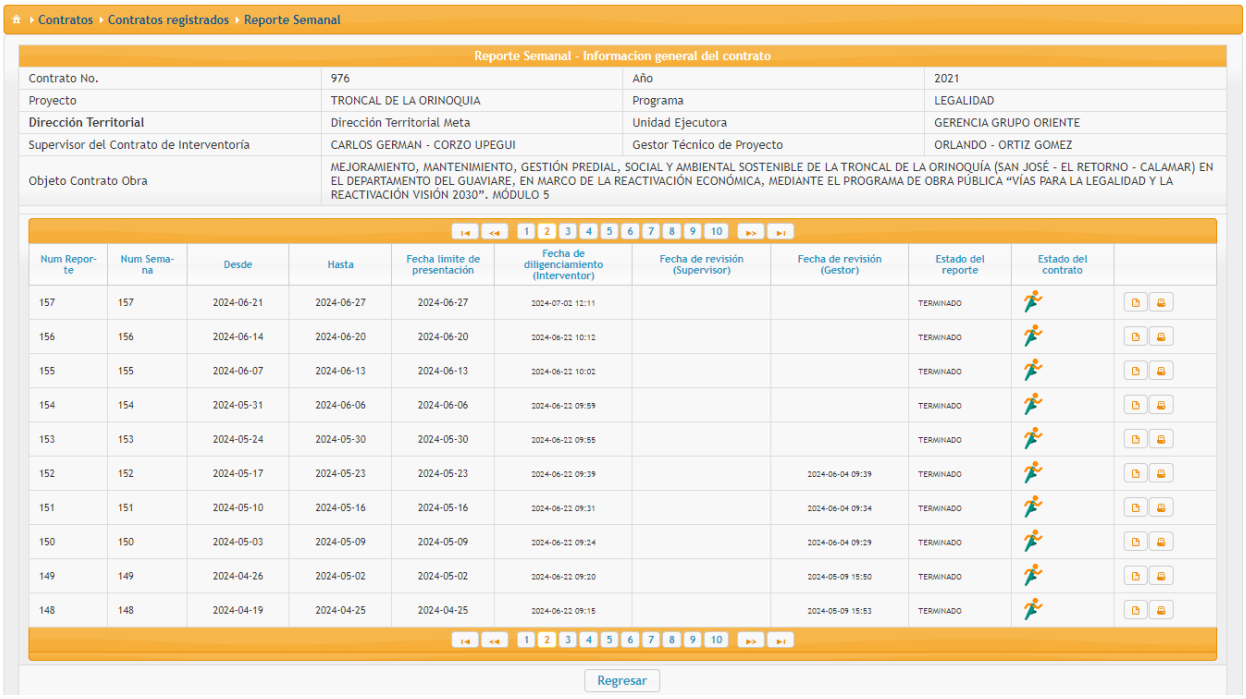

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	976	Año	2021
Proyecto	TRONCAL DE LA ORINOQUIA	Programa	LEGALIDAD
Dirección Territorial	Dirección Territorial Meta	Unidad Ejecutora	GERENCIA GRUPO ORIENTE
Supervisor del Contrato de Interventoría	CARLOS GERMAN - CORZO UPEGUI	Gestor Técnico de Proyecto	ORLANDO - ORTIZ GOMEZ
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
157	157	2024-06-21	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01 12:11			TERMINADO		
156	156	2024-06-14	2024-06-20	2024-06-20	2024-06-22 10:12			TERMINADO		
155	155	2024-06-07	2024-06-13	2024-06-13	2024-06-22 10:02			TERMINADO		
154	154	2024-05-31	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-22 09:59			TERMINADO		
153	153	2024-05-24	2024-05-30	2024-05-30	2024-06-22 09:55			TERMINADO		
152	152	2024-05-17	2024-05-23	2024-05-23	2024-06-22 09:39		2024-06-04 09:39	TERMINADO		
151	151	2024-05-10	2024-05-16	2024-05-16	2024-06-22 09:31		2024-06-04 09:34	TERMINADO		
150	150	2024-05-03	2024-05-09	2024-05-09	2024-06-22 09:24		2024-06-04 09:29	TERMINADO		
149	149	2024-04-26	2024-05-02	2024-05-02	2024-06-22 09:20		2024-05-09 15:50	TERMINADO		
148	148	2024-04-19	2024-04-25	2024-04-25	2024-06-22 09:15		2024-05-09 15:53	TERMINADO		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regresar

Imagen 35. Informe de programa CIFRA

a. Seguimiento estado del trámite certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

A la fecha no se han realizado tramites.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

Anexo 17

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría (MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

Anexo 18

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-9)

Anexo 19

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-13)

Anexo 20

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-15)

Anexo 21

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-1)

Anexo 22

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-2)

Anexo 23

b. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

(MEPI-MN-IN-9-FR-2)

Anexo 24

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se generaron los siguientes requerimientos y recomendaciones, las cuales, fueron citadas mediante comunicados y en las actas de control y seguimiento de obra:

- ✓ En el periodo informado contamos con carpeta asfáltica en primera capa acumulado de 11.17 ml y en segunda capa 9.99 ml.
- ✓ Para el periodo el contratista no presente atraso en la ejecución física, con una inversión ejecutada acumulada del 44.91%, frente a una inversión programada 41.87 %.
- ✓ El contratista cuenta con siete (7) permisos ambientales obtenidos para el desarrollo de las obras, entre los cuales se tiene los permisos de: tres (3) ocupación de cauces, una (1) concesión de aguas, dos (2) aprovechamiento forestal (1 vigente y 1 cerrado con la corporación ambiental CDA) y uno (1) de emisiones atmosféricas. De los siete permisos ambientales, se tienen medidas de compensación por cinco permisos ambientales , de los cuales al mes de junio de 2024 se han cumplido de acuerdo a los tiempos de la corporación ambiental para 3 permisos (2 ocupaciones de cauces y 1 permiso de aprovechamiento). Se tiene pendiente el cumplimiento de las medidas de compensación por dos permisos (1 ocupación de cauces y 1 permiso de aprovechamiento forestal) que aún cuentan con el tiempo para realizar estas compensaciones ante la autoridad ambiental.
- ✓ La interventoría llevo a cabo seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados con los propietarios, especialmente en lo concerniente con la adecuación de accesos, entradas, reposición de cercas y perfilación de taludes. Se establecieron un total de 39 actas de compromiso, de las cuales 22 han sido cerradas y 17 permanecen abiertas y están siendo atendidas por el contratista.
- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio Ecovisión-190 $755 millones por concepto de anticipo, de un total de $9.243 millones a girar según lo establecido por el contrato 1000 de 2021, lo que indica que se ha girado el 8.17% del anticipo.
- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio DSC $27.011 millones por concepto de anticipo, de un total de $86.654 millones a girar según lo establecido por el contrato 976 de 2021, lo que indica que se ha girado el 38.17% del anticipo

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha recibo

Anexos en la carpeta del informe

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

8.4 Bitácora

Se encuentran anexos en la carpeta del informe
