INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 7 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: (Según contrato principal) $ 198,000,762,600.00


PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / jun-21	2 / jul-21	3 / ago-21	4 / sep-21	5 / oct-21	6 / nov-21	7 / dic-21	8 / ene-22	9 / feb-22	10 / mar-22	11 / abr-22	12 / may-22	13 / jun-22	14 / jul-22	15 / ago-22	16 / sep-22	17 / oct-22	18 / nov-22	19 / dic-22
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	0.98%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$4,148,477	2.68%	$1,521,016	$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$34,297	$51,445	$188,633	$110,140	$120,125	$130,110	$271,022	$331,578	$41,932	$66,573	$66,573	$68,515	$68,515	$68,515	$296,939
				$ E	$0					108,018.77	513,724.50	$13,497	$7,022	$136,662	$14,964	$54,320	$82,529	$39,343	$95,910	$4,062			$135,013
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.33%	0.01%	0.00%	0.09%	0.01%	0.04%	0.05%	0.03%	0.06%	0.00%			0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.13%	% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%
	$20,009,842	12.93%	$12,584,713	$ P	$0	$54,270	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$942,585	$674,808	$251,541	$224,787	$157,614	$252,881	$335,483	$646,389
				$ E	$0	$48,137	$0	66,103.25	$127,122	$155,698	760,730.47	$85,750	$306,870	$564,310	$408,860	$815,030	$824,270	$1,254,022	$1,110,634	$107,660			$1,123,682
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.26%	0.36%	0.56%	0.53%	0.53%	0.81%	1.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.47%	0.67%	0.97%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.36%	0.40%
	$14,470,538	9.35%	$8,057,708	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,655	$51,655	$723,165	$1,033,093	$1,496,757	$299,351	$299,351	$308,080	$308,080	$554,545	$616,161
				$ E	$0								$347,303	$580,033	$297,877	$818,007	$890,146	$456,718		$127,646			$211,025
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.53%	0.58%	0.30%	0.00%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$29,496	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.67%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.35%
	$15,955,752	10.31%	$7,234,064	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$347,976	$438,832	$863,825	$1,199,244	$39,826	$179,964	$218,851	$374,082	$411,578	$326,345	$546,831
				$ E	$0			$6,580	$4,122			$14,273	$62,154	$164,170	$121,586	$55,918	$185,803	$206,710	$208,607	$24,208			$1,674,135
				% E	0.00%	0.00%		0.0043%	0.0027%			0.02%	0.04%	0.11%	0.08%	0.04%	0.09%	0.13%	0.13%	0.02%			1.08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	[illegible]		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%	$3,605	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236,216	$0	$0	$0	$162,069
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	[illegible]	0.00%	[illegible]	0.01%	[illegible]	0.02%	0.05%		
	$3,737,430	2.41%	$1,091,978	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	[illegible]	$72,564	$72,564	$72,564	$3,669	$10,707	$10,707	$11,019	$11,019	$29,384	$69,786
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	21.97%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.35%	1.14%	1.40%	0.03%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$49,687,661	32.10%	$34,011,774	$ P	$0	$13,887	$13,887	$27,774	$27,774	$41,661	$152,755	$243,565	$460,806	$541,994	$1,762,034	$2,167,975	$140,138	$430,415	$1,121,105	$1,071,513	$1,040,809	$1,028,469	$2,266,313
				$ E	$0					12,097.92	56,294.13	393,571	$1,381,639	$2,424,212	$1,757,207	$3,882,570	$3,987,466	$2,674,040	$2,706,985				$3,888,614
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.25%	0.89%	1.57%	1.14%	2.51%	2.58%	1.73%	1.75%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	6.74%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.49%	0.72%	0.98%	1.14%	0.04%	0.38%	0.38%	0.45%	0.41%	0.52%	0.90%
	$62,952,134	40.67%	$10,425,993	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$288,750	$758,786	$1,110,690	$1,512,044	$1,761,286	$63,435	$591,734	$587,719	$703,944	$637,509	$810,329	$1,395,513
				$ E								$ 1,045,035	$777,376	$1,471,324	$278,476	$316,674	$9,724	$716,470	$464,495	$33,557			$366,234
				% E								0.68%	0.50%	0.82%	0.18%	0.20%	0.01%	0.46%	0.30%	0.02%			0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	48.56%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 75,157,094.46																				

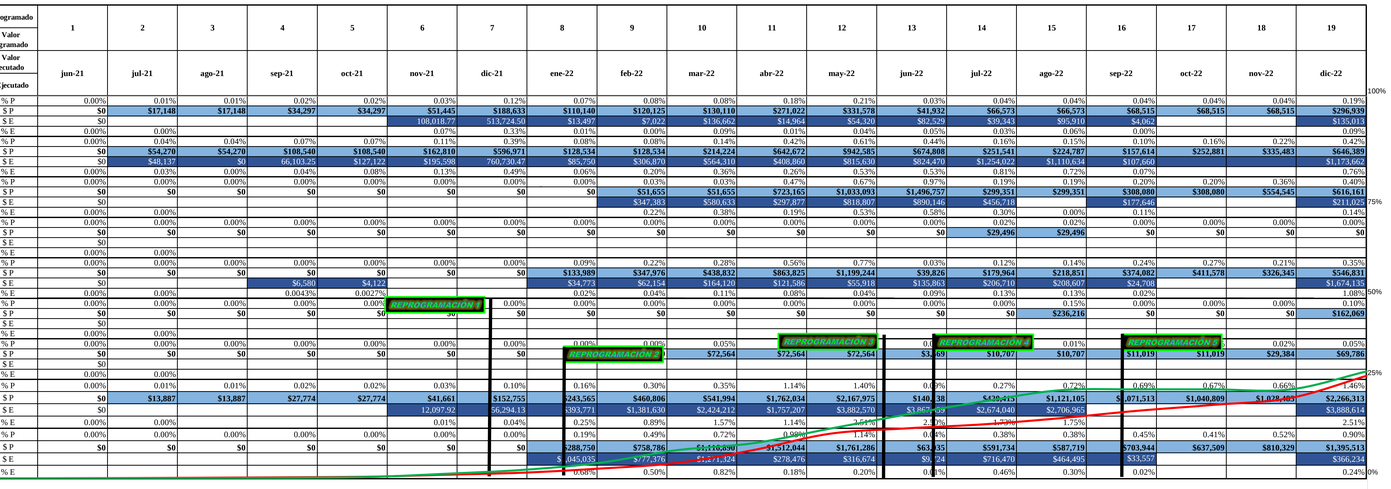

	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.07%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES VALOR	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,847,324	$7,508,325	$2,460,066	$1,849,782	$2,794,805	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.29%	15.90%	17.86%	19.44%	21.26%	27.18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA VALOR	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$24,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.08%	0.20%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,878,969	$5,943,920	$5,810,070	$5,347,303	$4,586,610	$347,633	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.24%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.88%	20.34%	23.30%	23.52%	23.52%	23.52%	28.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,779	$1,898,528	$3,471,353	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,018	$20,317,937	$26,128,008	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,858,236

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562.4 / $17,560,562.4
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000.0 / $970,000.0
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489.015 / $1,399,334.802
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000.0 / $385,000.0
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0 / $73,150.0
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357.5 / $4,349,357.5
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0 / $306,000.0
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,559**
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 179,689,020**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al programa de inversiones se debe a la Modificación 04 del contrato 976 de 2021, mediante la cual se reprograman CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) de la vigencia 2030 a la vigencia 2024, incluido IVA.

Los recursos reprogramados se destinarán a la ejecución de las actividades justificadas en la Modificación 4, las cuales están incluidas en el alcance del Contrato 976 de 2021. A continuación se detallan las actividades a realizar:
Entre junio y septiembre de 2024:
Construcción de la estructura para pavimento, obras de drenaje y actividades complementarias en los tramos PR34+500 a PR33+980.
En septiembre de 2024:
Construcción de la segunda capa de concreto asfáltico en los tramos PR35+540 a PR35+340.
Entre junio y diciembre de 2024:
Mantenimiento periódico del corredor vial Calamar - El Retorno en los tramos PR1+935 a PR33+980.
Estas actividades complementarán las programadas inicialmente para el año 2024, que incluyen:
Entre abril y septiembre de 2024:
Construcción del puente en el P43+180.
Entre mayo y junio de 2024:
Señalización del corredor.
Entre febrero y abril de 2024:

Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Fecha: 2024.08.16 15:19:21 -05'00'
JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
Matricula CPITVC 01108-0943
Ordenador del Pago

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por KAROL ROCA PACHECO
Nombre: **KAROL ROCA PACHECO**
Matricula Profesional No.: 13202-115547
Jefe de la Unidad Ejecutora
Subdirección de Modernización

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matricula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Matricula No. : 2520220459 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 5

FECHA: 7 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Pregamado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	0.98%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$4,148,477	2.68%	$1,521,016	$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$42,631	$42,631	$130,421	$130,421	$130,421	$130,421	$4,345	$4,345	$4,345	$3,235	$449	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$41,562	$14,104	$ 34.52			$ 9,101.75		$ 65,828.29	$36,493	$46,536	$1,830			$12,068	$ 3,531.59	$ 19,943.11	$64,417							
				% E	0.03%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.04%	0.02%	0.03%	0.00%			0.008%	0.002%	0.013%	0.042%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.13%	% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.28%	0.25%	0.33%	0.36%	0.20%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.33%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	$20,009,842	12.93%	$12,584,713	$ P	$54,992	$62,519	$62,519	$77,573	$77,573	$77,573	$88,123	$440,616	$380,677	$506,323	$560,171	$309,278	$20,619	$20,619	$20,619	$20,619	$20,619	$512,096	$0	$24,338	$24,338	$24,338	$24,338	$24,338
				$ E	$867,570	$881,235	$382,264			$135,492	$662,253	$ 478,106.760	$348,199	$108,420	$357,876	$11,495		$154,902	$ 105,046.50	$117,178	$125,080							
				% E	0.56%	0.57%	0.25%	0.00%	0.00%	0.09%	0.43%	0.31%	0.22%	0.07%	0.23%	0.01%		0.10%	0.07%	0.08%	0.08%		0.20%					
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.35%	0.31%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	$14,470,538	9.35%	$8,057,708	$ P	$19,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$73,042	$547,812	$475,454	$633,939	$633,939	$412,060	$0	$26,895	$380,009	$48,228	$0	$0	$0	$0	$133,954	$0	$0	$0
				$ E			$668,839			$345,838			$310,576	$959,745	$1,000,324	$516,692		$472,831		$1,400								
				% E	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.20%	0.62%	0.65%	0.33%		0.31%		0.00%								
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,996	$8,996	$8,996	$8,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$189,839										$36,407													
				% E	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.67%	% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.01%	0.01%	0.20%	1.67%	0.18%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$15,955,752	10.31%	$7,234,064	$ P	$12,831	$25,663	$38,494	$51,325	$64,156	$64,156	$72,882	$291,529	$212,825	$319,238	$425,651	$425,651	$19,352	$20,128	$316,547	$2,578,590	$272,254	$958,514	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$744,902	$640,974	$322,520		$ 34,212.23	$660,030		$370,752.47	$337,352.12	$426,064.08	$235,292.47	$395,109.28		$167,921	$162,527	$3,000	$7,015							
				% E	0.48%	0.42%	0.21%	0.00%	0.02%	0.43%	0.00%	0.24%	0.22%	0.28%	0.15%	0.26%		0.12%	0.11%	0.00%	0.01%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,735,474	1.12%	$3,605	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240,152	$0	$0	$0	$0	$316,220	$205,244	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E			$3,605																					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%												
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	REPROGRAMACIÓN	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	REPROGRAMADA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$3,737,430	2.41%	$1,091,978	$ P	$1,150	$2,300	$3,449	$4,599	$5,749	$5,749	$10,885	$19,593	$24,225	$32,655	$43,540	$45,717	$	REPROGRAMADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E														$576,369.84	$113,819.91	$66,883.09	$117,360.89							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	REPROGRAMACIÓN	0.00%	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%		0.37%	0.07%	0.04%	0.08%							
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	21.97%	% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.07%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.00%	0.01%	0.11%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
	$49,687,661	32.10%	$34,011,774	$ P	$91,774	$133,337	$142,623	$207,175	$207,175	$207,175	$629,239	$1,655,049	$1,457,722	$2,109,828	$2,365,062	$1,582,152	$0	$12,234	$171,276	$9,164	$0	$0	$0	$0	$433,869	$0	$0	$0
				$ E	$2,419,649	$1,386,901	$984,643			$593,170		$1,494,834	$1,513,105	$577,644	$1,250,795	$280,547		$380,354	$53,287	$4,674	$27,433							
				% E	1.56%	0.90%	0.64%	0.00%	0.00%	0.38%	0.00%	0.97%	0.98%	0.37%	0.81%	0.18%		0.25%	0.03%	0.00%	0.02%							
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	6.74%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.27%	0.54%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	$62,952,134	40.67%	$10,425,993	$ P	$26,513	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$150,593	$351,383	$652,465	$869,953	$869,953	$869,953	$0	$0	$0	$10,105	$10,105	$0	$417,887	$835,773	$146,260	$0	$0	$0
				$ E	$898,992	$471,189	$381,747			$87,138		$415,021	$481,004	$369,319	$374,795	$105,813		$259,501	$7,824	$80,832	$1,207,455							
				% E	0.58%	0.30%	0.25%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.27%	0.31%	0.24%	0.24%	0.07%		0.17%	0.01%	0.06%	0.78%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**48.56%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 75,157,094.46**																									

100%
75%
50%
25%
0%

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.15%**	**0.22%**	**0.26%**	**0.32%**	**0.33%**	**0.33%**	**0.69%**	**2.16%**	**2.16%**	**2.98%**	**3.25%**	**2.60%**	**0.03%**	**0.05%**	**0.33%**	**1.73%**	**0.40%**	**1.08%**	**0.27%**	**0.56%**	**0.48%**	**0.02%**	**0.02%**	**0.02%**
	VALOR	**$229,065**	**$337,937**	**$407,006**	**$500,593**	**$514,574**	**$514,574**	**$1,067,395**	**$3,348,613**	**$3,340,331**	**$4,611,353**	**$5,037,733**	**$4,024,381**	**$44,316**	**$84,221**	**$892,796**	**$2,669,941**	**$619,647**	**$1,675,854**	**$417,887**	**$860,111**	**$738,421**	**$24,338**	**$24,338**	**$24,338**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**27.33%**	27.55%	**27.81%**	**28.14%**	**28.47%**	**28.80%**	**29.49%**	**31.65%**	**33.81%**	**36.79%**	**40.05%**	**42.65%**	**42.68%**	**42.73%**	**43.06%**	**44.79%**	**45.19%**	**46.27%**	**46.54%**	**47.10%**	**47.57%**	**47.59%**	**47.60%**	**47.62%**
	VALOR	**$42,312,844**	**$42,650,781**	**$43,057,787**	**$43,558,381**	**$44,072,955**	**$44,587,529**	**$45,654,924**	**$49,003,537**	**$52,343,868**	**$56,955,221**	**$61,984,531**	**$66,008,912**	**$66,053,228**	**$66,137,449**	**$67,030,245**	**$69,700,186**	**$70,319,834**	**$71,995,688**	**$72,413,574**	**$73,273,686**	**$74,012,107**	**$74,036,445**	**$74,060,783**	**$74,085,121**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**3.34%**	**2.20%**	**1.77%**	**0.00%**	**0.02%**	**1.18%**	**0.43%**	**1.82%**	**1.96%**	**1.75%**	**2.10%**	**0.85%**	**0.00%**	**1.32%**	**0.29%**	**0.19%**	**1.00%**							
	VALOR	**$5,162,591**	**$3,400,404**	**$2,743,950**	**$0**	**$34,212**	**$1,832,267**	**$662,253**	**$2,824,542.4**	**$3,026,729.7**	**$2,705,262.6**	**$3,257,349.1**	**$1,309,685.7**	**$0.0**	**$2,043,966.6**	**$446,084.8**	**$299,989.4**	**$1,549,571.1**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**31.67%**	**33.87%**	**35.64%**	**35.64%**	**35.66%**	**36.85%**	**37.28%**	**39.10%**	**41.06%**	**42.80%**	**44.91%**	**45.75%**	**45.75%**	**47.07%**	**47.36%**	**47.56%**	**48.56%**							
	VALOR	**$49,020,827**	**$52,421,231**	**$55,165,181**	**$55,165,181**	**$55,199,394**	**$57,031,660**	**$57,693,913**	**$60,518,456**	**$63,545,185**	**$66,250,448**	**$69,507,797**	**$70,817,483**	**$70,817,483**	**$72,861,449**	**$73,307,534**	**$73,607,523**	**$75,157,094**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$73,150 / $73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al programa de inversiones se debe a la Modificación 04 del contrato 976 de 2021, mediante la cual se reprograman CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) de la vigencia 2030 a la vigencia 2024, incluido IVA.

Los recursos reprogramados se destinarán a la ejecución de las actividades justificadas en la Modificación 4, las cuales están incluidas en el alcance del Contrato 976 de 2021. A continuación se detallan las actividades a realizar:
Entre junio y septiembre de 2024:
Construcción de la estructura para pavimento, obras de drenaje y actividades complementarias en los tramos PR34+500 a PR33+980.
En septiembre de 2024:
Construcción de la segunda capa de concreto asfáltico en los tramos PR35+540 a PR35+340.
Entre junio y diciembre de 2024:
Mantenimiento periódico del corredor vial Calamar - El Retorno en los tramos PR1+935 a PR33+980.
Estas actividades complementarán las programadas inicialmente para el año 2024, que incluyen:
Entre abril y septiembre de 2024:
Construcción del puente en el P43+180.
Entre mayo y junio de 2024:
Señalización del corredor.
Entre febrero y abril de 2024:
Construcción de la Capa 2 en los tramos PR37+350 a PR36+060 y PR36+540 a PR35+340

Firma
GABRIEL DAVID SOLANO VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Fecha: 2024.08.16 15:20:14 -05'00'
JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
Matrícula CPITVC 01108-0943
Ordenador del Pago

Aprueba
Firmado digitalmente por KAROL ROCA PACHECO
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matrícula Profesional No.: 13202-115547
Jefe de la Unidad Ejecutora
Subdirección de Modernización

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 2520220459 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 7 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	0.98%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%
	$4,148,477	2.68%	$1,521,016	$ P	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$28,135	$28,135	$28,135	$28,135	$18,757	$18,757	$18,757	$18,757	$18,757	$18,757	$18,757	$18,757	$56,271	$56,271	$56,271	$56,271
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.13%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.19%	0.20%	0.20%
	$20,009,842	12.93%	$12,584,713	$ P	$31,806	$36,283	$36,283	$45,236	$45,236	$45,236	$45,236	$45,236	$113,325	$144,662	$158,092	$158,092	$63,612	$72,565	$72,565	$90,472	$90,472	$90,472	$90,472	$90,472	$226,649	$289,324	$316,184	$316,184
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.13%	0.17%	0.17%	0.17%
	$14,470,538	9.35%	$8,057,708	$ P	$6,543	$13,085	$19,628	$19,628	$19,628	$19,628	$32,713	$32,713	$98,140	$130,854	$130,854	$130,854	$13,085	$26,171	$39,256	$39,256	$39,256	$39,256	$65,427	$65,427	$196,281	$261,708	$261,708	$261,708
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,879	$5,879	$5,879	$5,879
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.67%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.10%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.07%	0.09%	0.14%	0.19%	0.20%
	$15,955,752	10.31%	$7,234,064	$ P	$7,214	$14,428	$21,643	$28,857	$36,071	$36,071	$43,285	$57,714	$72,142	$108,213	$144,284	$151,498	$14,478	$28,857	$43,285	$57,714	$72,142	$72,142	$86,571	$115,427	$144,284	$216,426	$288,569	$302,997
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%	$3,605	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%
	$3,737,430	2.41%	$1,091,978	$ P	$1,690	$3,380	$5,070	$6,759	$8,449	$8,449	$10,139	$13,519	$16,898	$25,348	$33,797	$35,487	$3,380	$6,759	$10,139	$13,519	$16,898	$16,898	$20,278	$27,037	$33,797	$50,695	$67,593	$70,973
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	21.97%	% P	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%	0.06%	0.08%	0.09%	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.31%	0.50%	0.58%	0.58%
	$49,687,661	32.10%	$34,011,774	$ P	$43,599	$65,601	$68,325	$106,881	$106,881	$106,881	$112,329	$112,329	$240,595	$389,162	$446,996	$446,996	$87,197	$131,201	$136,649	$213,761	$213,761	$213,761	$224,657	$224,657	$481,191	$778,323	$893,992	$893,992
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13, NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,N P25)	$0	0.00%	6.74%	% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.55%	0.74%	0.74%	0.74%
	$62,952,134	40.67%	$10,425,993	$ P	$28,463	$56,926	$85,389	$85,389	$85,389	$85,389	$142,315	$142,315	$426,946	$569,262	$569,262	$569,262	$56,926	$113,852	$170,779	$170,779	$170,779	$170,779	$284,631	$284,631	$853,893	$1,138,524	$1,138,524	$1,138,524
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**48.56%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 75,157,094.46**																									

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.08%**	**0.13%**	**0.16%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.26%**	**0.27%**	**0.65%**	**0.90%**	**0.98%**	**1.03%**	**0.17%**	**0.26%**	**0.32%**	**0.39%**	**0.40%**	**0.40%**	**0.51%**	**0.53%**	**1.29%**	**1.81%**	**1.96%**	**2.07%**
	VALOR	**$128,692,722**	**$199,081,324**	**$245,715,112**	**$302,128,792**	**$311,032,842**	**$311,032,842**	**$395,396,366**	**$413,204,466**	**$999,122,084**	**$1,398,574,724**	**$1,514,359,420**	**$1,601,730,986**	**$257,385,445**	**$398,162,649**	**$491,430,223**	**$604,257,583**	**$622,065,684**	**$622,065,684**	**$790,792,732**	**$826,408,933**	**$1,998,244,168**	**$2,797,149,449**	**$3,028,718,840**	**$3,203,461,973**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**47.70%**	**47.83%**	**47.99%**	**48.19%**	**48.39%**	**48.59%**	**48.84%**	**49.11%**	**49.76%**	**50.66%**	**51.64%**	**52.67%**	**52.84%**	**53.10%**	**53.41%**	**53.80%**	**54.21%**	**54.61%**	**55.12%**	**55.65%**	**56.94%**	**58.75%**	**60.71%**	**62.78%**
	VALOR	**$74,213,814**	**$74,412,895**	**$74,658,610**	**$74,960,739**	**$75,271,772**	**$75,582,805**	**$75,978,201**	**$76,391,406**	**$77,390,528**	**$78,789,102**	**$80,303,462**	**$81,905,193**	**$82,162,578**	**$82,560,741**	**$83,052,171**	**$83,656,429**	**$84,278,494**	**$84,900,560**	**$85,691,353**	**$86,517,762**	**$88,516,006**	**$91,313,155**	**$94,341,874**	**$97,545,336**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								



NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 $17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 $970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 $1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 $385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 $73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 $4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 $306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al programa de inversiones se debe a la Modificación 04 del contrato 976 de 2021, mediante la cual se reprograman CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) de la vigencia 2030 a la vigencia 2024, incluido IVA.
Los recursos reprogramados se destinarán a la ejecución de las actividades justificadas en la Modificación 4, las cuales están incluidas en el alcance del Contrato 976 de 2021. A continuación se detallan las actividades a realizar:
Entre junio y septiembre de 2024:
Construcción de la estructura para pavimento, obras de drenaje y actividades complementarias en los tramos PR34+500 a PR33+980.
En septiembre de 2024:
Construcción de la segunda capa de concreto asfáltico en los tramos PR35+540 a PR35+340.
Entre junio y diciembre de 2024:
Mantenimiento periódico del corredor vial Calamar - El Retorno en los tramos PR1+935 a PR33+980.
Estas actividades complementarán las programadas inicialmente para el año 2024, que incluyen:
Entre abril y septiembre de 2024:
Construcción del puente en el P43+180.
Entre mayo y junio de 2024:
Señalización del corredor.
Entre febrero y abril de 2024:
[illegible] PR33+980 a PR33+650 y PR35+540 a PR35+340.

Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Fecha: 2024.08.16 15:18:38 -05'00'
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matricula CPITVC 01108-0943
ORDENADOR DEL PAGO

Aprueba
Firmado digitalmente por KAROL ROCA PACHECO
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula Profesional No.: 13202-115547
Jefe de la Unidad Ejecutora
Subdirección de Modernización

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matricula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. : 2520220459 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 5

FECHA: 7 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	0.98%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	$4,148,477	2.68%	$1,521,016	$ P	$24,384	$24,384	$24,384	$24,384	$24,384	$24,384	$24,384	$24,384	$73,152	$73,152	$73,152	$73,152	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$28,135	$28,135	$28,135	$28,135
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.13%	% P	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.19%	0.24%	0.27%	0.27%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%
	$20,009,842	12.93%	$12,584,713	$ P	$82,695	$94,335	$94,335	$117,614	$117,614	$117,614	$117,614	$117,614	$294,644	$376,121	$411,039	$411,039	$31,806	$36,283	$36,283	$45,236	$45,236	$45,236	$45,236	$45,236	$113,325	$144,662	$158,092	$158,092
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.22%	0.22%	0.22%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%
	$14,470,538	9.35%	$8,057,708	$ P	$17,011	$34,022	$51,033	$51,033	$51,033	$51,033	$85,055	$85,055	$255,165	$340,220	$340,220	$340,220	$6,543	$13,085	$19,628	$19,628	$19,628	$19,628	$32,713	$32,713	$98,140	$130,854	$130,854	$130,854
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.67%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.12%	0.18%	0.24%	0.25%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.10%
	$15,955,752	10.31%	$7,234,064	$ P	$18,757	$37,514	$56,271	$75,028	$93,785	$93,785	$112,542	$150,056	$187,570	$281,354	$375,139	$393,896	$7,214	$14,428	$21,643	$28,857	$36,071	$36,071	$43,285	$57,714	$72,142	$108,213	$144,284	$151,498
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%	$3,605	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.71%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%
	$3,737,430	2.41%	$1,091,978	$ P	$4,394	$8,787	$13,181	$17,574	$21,968	$21,968	$26,361	$35,149	$43,936	$65,904	$87,872	$92,265	$1,690	$3,380	$5,070	$6,759	$8,449	$8,449	$10,139	$13,519	$16,898	$25,348	$33,797	$35,487
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	21.97%	% P	0.07%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.40%	0.65%	0.75%	0.75%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%
	$49,687,661	32.10%	$34,011,774	$ P	$113,356	$170,561	$177,644	$277,890	$277,890	$277,890	$292,054	$292,054	$625,548	$1,011,820	$1,162,189	$1,162,189	$43,599	$65,601	$68,325	$106,881	$106,881	$106,881	$112,329	$112,329	$240,595	$389,162	$446,996	$446,996
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13, NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,N P25)	$0	0.00%	6.74%	% P	0.05%	0.10%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.24%	0.24%	0.72%	0.96%	0.96%	0.96%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%
	$62,952,134	40.67%	$10,425,993	$ P	$74,004	$148,008	$222,012	$222,012	$222,012	$222,012	$370,020	$370,020	$1,110,061	$1,480,081	$1,480,081	$1,480,081	$28,463	$56,926	$85,389	$85,389	$85,389	$85,389	$142,315	$142,315	$426,946	$569,262	$569,262	$569,262
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	48.56%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 75,157,094.46																									

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.22%	0.33%	0.41%	0.51%	0.52%	0.52%	0.66%	0.69%	1.68%	2.35%	2.54%	2.69%	0.08%	0.13%	0.16%	0.20%	0.20%	0.20%	0.26%	0.27%	0.65%	0.90%	0.98%	1.03%
	VALOR	$334,601,078	$517,611,444	$638,859,290	$785,534,858	$808,685,389	$808,685,389	$1,028,030,552	$1,074,331,613	$2,597,717,419	$3,636,294,284	$3,937,334,492	$4,164,500,565	$128,692,722	$199,081,324	$245,715,112	$302,128,792	$311,032,842	$311,032,842	$395,396,366	$413,204,466	$999,122,084	$1,398,574,724	$1,514,359,420	$1,601,730,986
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62.99%	63.33%	63.74%	64.25%	64.77%	65.29%	65.96%	66.65%	68.33%	70.68%	73.22%	75.91%	76.00%	76.13%	76.28%	76.48%	76.68%	76.88%	77.14%	77.40%	78.05%	78.95%	79.93%	80.97%
	VALOR	$97,879,937	$98,397,549	$99,036,408	$99,821,943	$100,630,628	$101,439,314	$102,467,344	$103,541,676	$106,139,393	$109,775,687	$113,713,022	$117,877,522	$118,006,215	$118,205,297	$118,451,012	$118,753,140	$119,064,173	$119,375,206	$119,770,602	$120,183,807	$121,182,929	$122,581,504	$124,095,863	$125,697,594
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000
	$970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489
	$1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000
	$385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150
	$73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357
	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000
	$306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 172,957,358**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al programa de inversiones se debe a la Modificación 04 del contrato 976 de 2021, mediante la cual se reprograman CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) de la vigencia 2030 a la vigencia 2024, incluido IVA.

Los recursos reprogramados se destinarán a la ejecución de las actividades justificadas en la Modificación 4, las cuales están incluidas en el alcance del Contrato 976 de 2021. A continuación se detallan las actividades a realizar:
Entre junio y septiembre de 2024:
Construcción de la estructura para pavimento, obras de drenaje y actividades complementarias en los tramos PR34+500 a PR33+980.
En septiembre de 2024:
Construcción de la segunda capa de concreto asfáltico en los tramos PR35+540 a PR35+340.
Entre junio y diciembre de 2024:
Mantenimiento periódico del corredor vial Calamar - El Retorno en los tramos PR1+935 a PR33+980.
Estas actividades complementarán las programadas inicialmente para el año 2024, que incluyen:
Entre abril y septiembre de 2024:
Construcción del puente en el P43+180.
Entre mayo y junio de 2024:
Señalización del corredor.
Entre febrero y abril de 2024:

Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Fecha: 2024.08.16 15:20:36 -05'00'
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matrícula CPITVC 01108-0943
ORDENADOR DEL PAGO

Aprueba
Firmado digitalmente por KAROL ROCA PACHECO
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matrícula Profesional No.: 13202-115547
Jefe de la Unidad Ejecutora
Subdirección de Modernización

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 2520220459 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 7 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	0.98%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$4,148,477	2.68%	$1,521,016	$ P	$31,887	$31,887	$31,887	$31,887	$31,887	$31,887	$31,887	$31,887	$95,660	$95,660	$95,660	$95,660	$9,779	$9,779	$9,779	$9,779	$39,117	$39,117	$39,117	$39,117
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.13%	% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.25%	0.32%	0.35%	0.25%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.19%	0.19%	0.19%	0.25%
	$20,009,842	12.93%	$12,584,713	$ P	$108,140	$123,361	$123,361	$153,803	$153,803	$153,803	$153,803	$153,803	$385,304	$491,850	$537,513	$537,513	$37,029	$49,834	$49,834	$75,443	$301,772	$301,772	$301,772	$391,404
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.22%	0.29%	0.29%	0.29%	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
	$14,470,538	9.35%	$8,057,708	$ P	$22,245	$44,490	$66,735	$66,735	$66,735	$66,735	$111,226	$111,226	$333,677	$444,903	$444,903	$444,903	$18,714	$37,427	$56,141	$261,992	$374,275	$374,275	$374,275	$374,275
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,815	$16,815
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.67%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.10%	0.13%	0.16%	0.24%	0.32%	0.33%	0.01%	0.03%	0.04%	0.19%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
	$15,955,752	10.31%	$7,234,064	$ P	$24,528	$49,057	$73,585	$98,113	$122,642	$122,642	$147,170	$196,227	$245,283	$367,925	$490,567	$515,095	$20,634	$41,269	$61,903	$288,882	$412,689	$412,689	$412,689	$412,689
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%
	$1,735,474	1.12%	$3,605	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224,437
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.71%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.07%	0.08%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%
	$3,737,430	2.41%	$1,091,978	$ P	$5,745	$11,491	$17,236	$22,982	$28,727	$28,727	$34,473	$45,964	$57,454	$86,182	$114,909	$120,654	$4,833	$9,667	$14,500	$19,333	$72,500	$120,834	$120,834	$120,834
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	21.97%	% P	0.10%	0.14%	0.15%	0.23%	0.23%	0.23%	0.25%	0.25%	0.53%	0.85%	0.98%	0.98%	0.07%	0.11%	0.12%	0.24%	0.79%	0.79%	0.79%	1.04%
	$49,687,661	32.10%	$34,011,774	$ P	$148,235	$223,042	$232,303	$363,394	$363,394	$363,394	$381,917	$381,917	$818,024	$1,323,150	$1,519,786	$1,519,786	$110,899	$173,831	$181,622	$377,605	$1,229,938	$1,229,938	$1,229,938	$1,615,919
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13, NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,N P25)	$0	0.00%	6.74%	% P	0.06%	0.13%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.31%	0.31%	0.94%	1.25%	1.25%	1.25%	0.05%	0.26%	0.37%	0.37%	0.79%	0.79%	1.31%	1.31%
	$62,952,134	40.67%	$10,425,993	$ P	$96,775	$193,549	$290,324	$290,324	$290,324	$290,324	$483,873	$483,873	$1,451,618	$1,935,491	$1,935,491	$1,935,491	$81,412	$407,058	$569,881	$569,881	$1,221,174	$1,221,174	$2,035,290	$2,035,290
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**48.56%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 75,157,094.46**																					

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.28%	0.44%	0.54%	0.66%	0.68%	0.68%	0.87%	0.91%	2.19%	3.07%	3.33%	3.52%	0.18%	0.47%	0.61%	1.04%	2.36%	2.39%	2.93%	3.38%
	VALOR	$437,555.256	$676,876.503	$835,431.379	$1,027,237.892	$1,057,511.662	$1,057,511.662	$1,344,347.644	$1,404,895.186	$3,397,015.086	$4,755,154.063	$5,148,822.029	$5,445,885.354	$283,301.039	$728,864.944	$943,660.897	$1,602,916.936	$3,651,465.743	$3,699,799.323	$4,530,730.590	$5,230,780.569
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	81.25%	81.69%	82.23%	82.89%	83.57%	84.26%	85.12%	86.03%	88.23%	91.30%	94.63%	98.14%	98.33%	98.80%	99.41%	100.44%	102.80%	105.19%	108.12%	111.50%
	VALOR	$126,135,149	$126,812,026	$127,647,457	$128,674,695	$129,732,207	$130,789,718	$132,134,066	$133,538,961	$136,935,976	$141,691,130	$146,839,952	$152,285,838	$152,569,139	$153,298,004	$154,241,665	$155,844,582	$159,496,047	$163,195,847	$167,726,577	$172,957,358
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

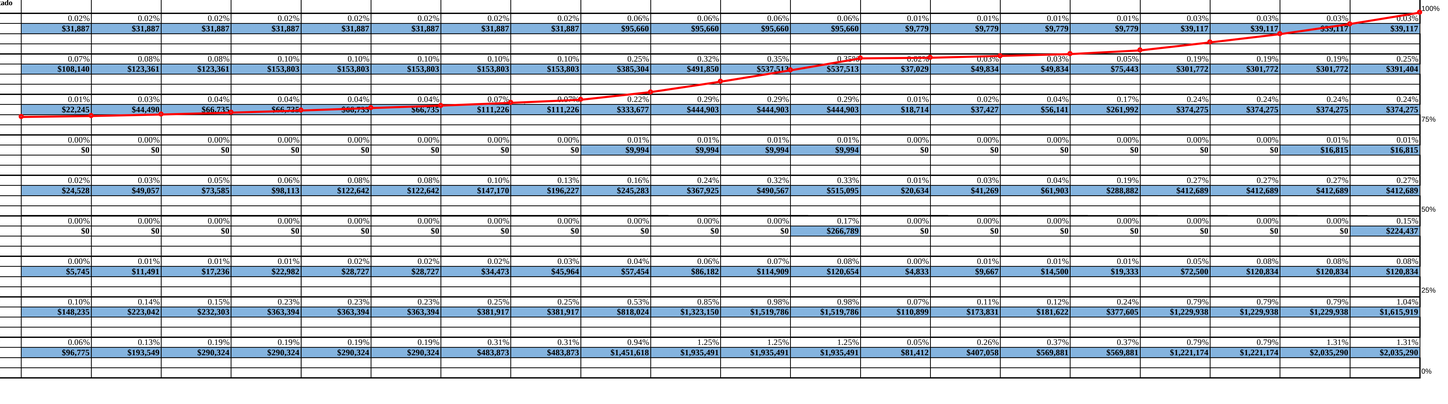

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 / $73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al programa de inversiones se debe a la Modificación 04 del contrato 976 de 2021, mediante la cual se reprograman CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) de la vigencia 2030 a la vigencia 2024, incluido IVA.

Los recursos reprogramados se destinarán a la ejecución de las actividades justificadas en la Modificación 4, las cuales están incluidas en el alcance del Contrato 976 de 2021. A continuación se detallan las actividades a realizar:
Entre junio y septiembre de 2024:
Construcción de la estructura para pavimento, obras de drenaje y actividades complementarias en los tramos PR34+500 a PR33+980.
En septiembre de 2024:
Construcción de la segunda capa de concreto asfáltico en los tramos PR35+540 a PR35+340.
Entre junio y diciembre de 2024:
Mantenimiento periódico del corredor vial Calamar - El Retorno en los tramos PR1+935 a PR33+980.
Estas actividades complementarán las programadas inicialmente para el año 2024, que incluyen:
Entre abril y septiembre de 2024:
Construcción del puente en el P43+180.
Entre mayo y junio de 2024:
Señalización del corredor.
Entre febrero y abril de 2024:

Firma
GABRIEL DAVID SOLORTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma
MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Fecha: 2024.08.16 15:28:57 -05'00'
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matrícula CPITVC 01108-0943
ORDENADOR DEL PAGO

Aprueba
Firmado digitalmente por KAROL ROCA PACHECO
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matrícula Profesional No.: 13202-115547
Jefe de la Unidad Ejecutora
Subdirección de Modernización

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-250038 CND

Revisó Firma
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 2520220459 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
