
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR. 5464777 – OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."

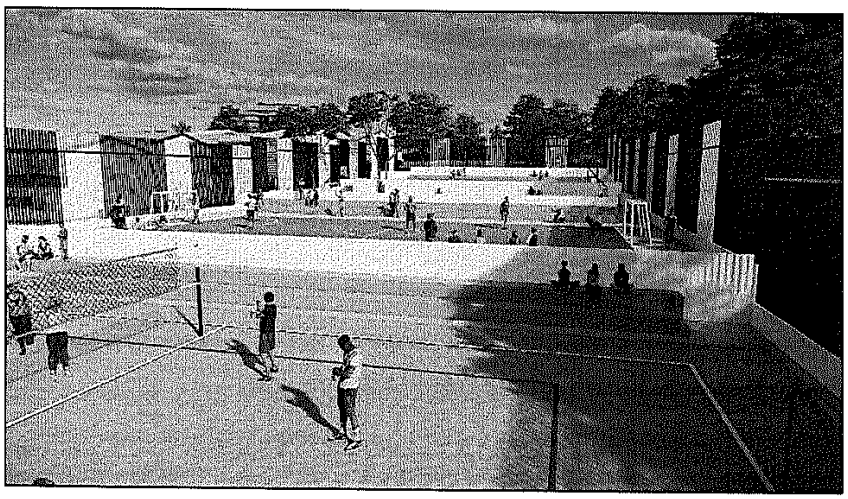

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA No 4

PERIODO DE EJECUCIÓN; 15 DE MAYO 2024 AL 29 DE MAYO 2024 Y 24 DE JULIO 2024 AL 08 DE AGOSTO 2024.

CONTRATISTA: GRUCOING SAS

R/L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ

CONTENIDO

INTRODUCCION 3

LOCALIZACION 4

INFORMACION TÉCNICA CAMBIOS Y /O MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 5

1. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CO1.PCCNTR.5450603 14

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 14

1.1.1 ACTIVIDADES TECNICAS 25
1.1.2 AVANCE FINANCIERO 54
1.1.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES 55
1.1.4 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 55

1.2 AVANCE EN TIEMPO 56

1.3 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 56

1.4 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 57

1.5 Curva de S avance ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.6 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 57

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 58

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 58

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 59

2.2.1 ACTIVIDADES TECNICAS: 60
2.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 64
2.2.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 65
2.2.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 67

2.3 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA 67

2.3.1 PERSONAL 67

2.4 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 67

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES..... 68

INTRODUCCION

La construcción y remodelación de los escenarios deportivos Paseo del Puente y Cabecera en el municipio de Piedecuesta, Santander, constituye un proyecto de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva local. Este informe detallado aborda de manera integral los diversos aspectos involucrados en la ejecución de este proyecto.

En el contexto actual, donde la promoción de un estilo de vida activo y saludable cobra cada vez mayor relevancia, la mejora de las instalaciones deportivas se presenta como una necesidad inaplazable. El Paseo del Puente y Cabecera, como centros neurálgicos para la actividad física y el encuentro comunitario, requieren una intervención técnica precisa que garantice no solo la calidad de las construcciones, sino también su adecuada gestión administrativa y el uso eficiente de los recursos financieros asignados.

Este informe explorará minuciosamente los aspectos técnicos de la intervención, desde la planificación arquitectónica hasta la implementación de tecnologías modernas que optimicen el rendimiento de los escenarios deportivos. Asimismo, se examinará la gestión administrativa para asegurar que los procesos sean transparentes, eficaces y acordes con la normativa.

En resumen, la intervención técnica, administrativa y financiera propuesta para los escenarios deportivos en Piedecuesta representa una oportunidad única para potenciar el bienestar de la comunidad, promoviendo la práctica deportiva y fomentando la cohesión social. Este informe ofrece una visión integral de los esfuerzos desplegados, delineando un camino claro hacia la construcción de instalaciones deportivas de calidad y sostenibles en el tiempo.

LOCALIZACION

El proyecto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.", se encuentra localizado en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 19 km. Ubicada en el casco urbano del municipio. La ubicación del proyecto se ilustra en la imagen 1.

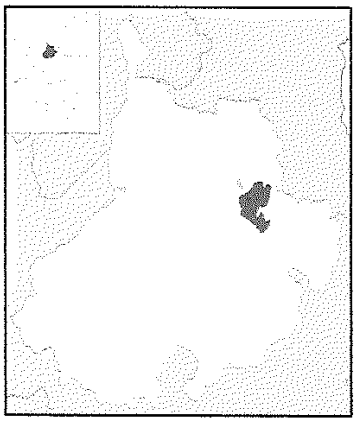


Imagen 1Localización de Piedecuesta-Santander (fuente Wikipedia archivo Colombia).

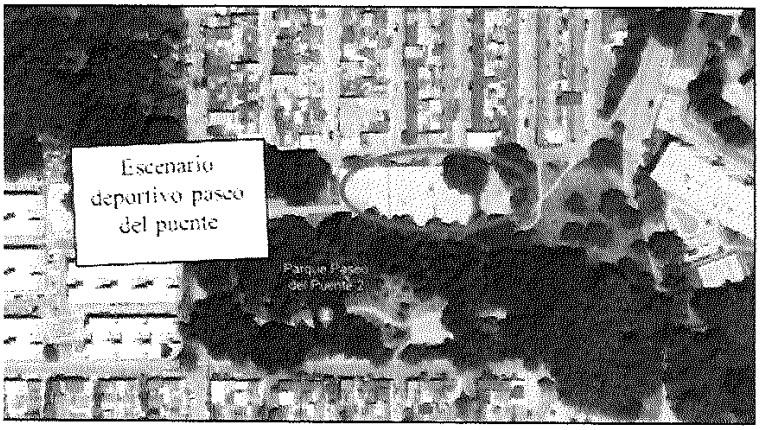


Imagen 2 Localización frente Paseo del Puente (fuente Google Earth).

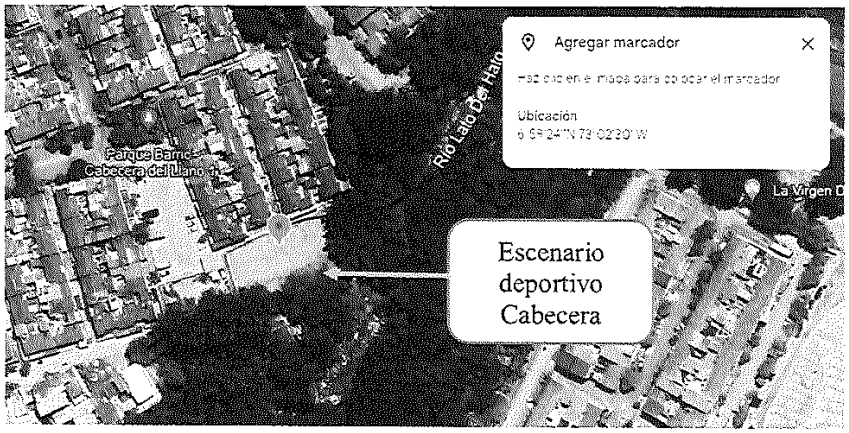


Imagen 3 Localización frente Cabecera (fuente Google Earth).

INFORMACION TÉCNICA CAMBIOS Y /O MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Inicialmente el proyecto de la CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ha tenido una etapa de inicio de obra y logística, los cuales se han venido realizando en la etapa inicial del proyecto.

En el primer mes de ejecución del proyecto objeto del presente informe, se firmó el acta de inicio del contrato de interventoría, la cual realiza el seguimiento correspondiente a ejecución de las actividades contractuales y velará por la calidad de los trabajos ejecutados.

Se hace entrega a la interventoría los diferentes planes de acuerdo a las obligaciones contractuales tales como:

- Plan socio ambiental
- Plan de gerencia

- Plan de calidad
- Plan Sst

Se presentan las actas de vecindad.
Se realiza entrega de la respectiva programación de obra de acuerdo a la organización interna definida por el Consorcio Deportivos PTA.
Se entregan los análisis de precios unitarios de los ítems realizados en la propuesta para revisión y aprobación de la interventoría, los cuales fueron debidamente revisados, se les hicieron las respectivas subsanaciones y se aprobaron para dar inicio a la ejecución del contrato.

Existe una solicitud de la comunidad del sector de Cabecera a la entidad, para postergar el inicio de las obras en la cancha de cabecera, por un evento programado con varios meses de anticipación, el cual se realizará durante el mes de diciembre del presente año, por tal motivo no se han iniciado los trabajos en este frente de obra.
Se realiza solicitud a la interventoría de suspensión al contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
El Consorcio Deportivo PTA comunica que, el consejo comunal de la urbanización Paseo del Puente, presentó un requerimiento de fecha de noviembre 28 de 2023, mediante el cual solicita al contratista de obra, el cese de actividades de obra civil, en los escenarios deportivos del sector, debido a que por tradición en época decembrina y/o de receso estudiantil, en las canchas se realizan campeonatos por categorías de futbol, los cuales involucran a hombres y mujeres de todas las edades, convirtiéndose este

espacio en lugar de integración familiar, vecinal y municipal, permitiendo el sano esparcimiento de los Piedecuestanos.

Por tal razón, la comunidad solicita, no solo que no sean intervenidas las canchas 1 y 2 del proyecto, sino que las canchas 3 y 4 que ya iniciaron sus obras, sean suspendidas, teniendo en cuenta que la afluencia de gente que atrae el evento anteriormente mencionado es tan considerable, que podrían correr peligro con el ingreso de vehículos pesados como volquetas y camiones, además de la contaminación auditiva y por material particulado que se presenta para estas personas, al estar en actividad tan cercana tanto en obra como en el evento deportivo al mismo tiempo.

En cuanto a la comunidad del sector de Cabecera, existe una circunstancia muy similar a la anteriormente mencionada, existe una solicitud de fecha de 30 de noviembre del presente año, para postergar el inicio de las obras en la cancha de cabecera, por un evento programado con varios meses de anticipación, el cual se realizará durante el mes de diciembre del presente año, razón por la cual no se ha podido iniciar actividades en este frente de obra.

Por otra parte, es importante resaltar, que igualmente por tratarse de la época del año en la cual las compañías proveedoras de materiales y/o equipos hacen sus balances, inventarios, festejos y vacaciones por fin de año, el flujo de materiales y volquetas no ha sido constante, situación que ha obligado al contratista de obra a trabajar en condiciones desfavorecidas, por causas no imputables al mismo, castigando fuertemente la programación de obra proyectada, aun cuando cuenta con la capacidad económica, técnica y administrativa para cumplir con el

objeto contractual según lo estipulado en la minuta del contrato en referencia y en los tiempos establecidos para tal fin.

Una vez iniciados los trabajos relacionados con el contrato en referencia, se identifican factores externos que no han sido consignados en el presupuesto contractual, tales como las adecuaciones relacionadas con la iluminación del proyecto. Por lo cual, se solicita a la interventoría, claridad acerca de la actualización de los estudios y diseños correspondientes a este componente, teniendo en cuenta que los escenarios están siendo reconstruidos en su totalidad sin ningún tipo de modernización lumínica, lo cual se torna inconveniente a la hora de dar cumplimiento a las normas establecidas para este tipo de escenarios deportivos.

Es importante resaltar que, por estar en la etapa inicial del proyecto, es el momento de definir si se realiza actualización al mismo y/o la posible incorporación de actividades y con esto evitar futuros reprocesos.

La interventoría aprueba la solicitud y se firma acta de suspensión del día 18 de diciembre de 2023, por un mes de plazo o hasta que se solucionen las variables consideradas.

Por otra parte, se radicó ante la interventoría y la supervisión el acta parcial de cobro No. 1 con fecha de 18 de diciembre, en donde se incluyeron cantidades de obra realizadas desde el principio del proyecto a fecha de 14 de diciembre de 2023, por un valor de $ 93.844.935 y un acumulado de aproximadamente el 3% de avance financiero.

Se presenta solicitud de adición en tiempo con fecha del 22 de enero, teniendo en cuenta las siguientes variables:

Una vez iniciado el proyecto (15 de noviembre de 2023), se presenta una programación para la ejecución de las actividades contractuales en los frentes de obra existentes, programación que se ha visto afectada debido a factores externos que impidieron el inicio de actividades en algunos de los escenarios deportivos del proyecto. En el caso del Frente de Cabecera, no se ha realizado intervención alguna hasta el momento, debido a que, por solicitud de la comunidad para la época decembrina, por tradición cultural se mantiene ocupado el escenario a tiempo completo, siendo esta una de las razones por la que se propuso una suspensión al proyecto.

Algo similar sucede con los escenarios de paseo del puente. Una vez iniciado el proyecto, solo se intervinieron 2 canchas de las 4 posibles, debido a la alta demanda de los escenarios en el sector en época decembrina y/o de receso escolar, al igual que el frente de cabecera, también fue una de las razones por la que se propuso una suspensión al proyecto.

Una vez reiniciado el proyecto, se continua con la ejecución de actividades en 3 canchas de paseo del puente, dejando sin intervenir 1 de las canchas, por los motivos anteriormente mencionados.

Así mismo, pasados aproximadamente 45 días de ejecución contractual, existen actividades que continúan sin poder ejecutarse en 2 de los escenarios del proyecto, tales como las demoliciones, desmontes, e inicio de actividades para la construcción de la cancha No.1 del frente de obra de paseo del puente, y de la cancha del frente de obra de Cabecera, situación que impide que el avance general del proyecto se ejecute en el tiempo contractual inicialmente estipulado.

En concertación con la comunidad de paseo del puente, se precisaron acuerdos, teniendo en cuenta la importancia del uso de los escenarios deportivos para el desarrollo de sus actividades cotidianas, que van desde la ocupación de las diferentes escuelas deportivas para niños y jóvenes, hasta actividades de adulto mayor entre otras, por lo cual se definió que el inicio de actividades en la cancha 1 de este frente, se postergara un periodo de manera tal que la comunidad pueda reorganizar sus actividades y general el menor impacto social posible.

Por otra parte, se hace entrega de un diseño de iluminación de cada uno de los escenarios deportivos, para su respectiva revisión, teniendo en cuenta que no existen actividades de estos capítulos contractualmente y que han sido solicitud de la comunidad y la administración municipal, con el fin de definir si se asignan recursos al proyecto para ejecutar la obra eléctrica o si se ejecuta por parte del operador encargado de alumbrado público en el municipio.

Por tanto, mediante este documento y teniendo en cuenta los atrasos presentados para el inicio de actividades y en conciliación con la comunidad y la administración municipal en la ejecución de las obras, se expone la necesidad de una adición en tiempo de 5 meses calendario, para adelantar la ejecución de la asignación presupuestal actual, para lo cual se adjunta programación de obra actualizada.

A pesar de haber solicitado 5 meses de prórroga para la culminación del proyecto, el municipio aprobó 2 meses inicialmente, debido a que no existían recursos para adicionar la interventoría en el momento, por tanto, se expide otrosí por 2 meses de adición, quedando pendiente el restante de

tiempo para cuando se surtan internamente los trámites administrativos correspondientes.

Por otra parte, se suscribió ante la interventoría y la supervisión, un acta modificatoria No. 1 con fecha de 15 de Febrero, en donde se realizó un balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, ajustando el proyecto a un alcance ceñido al presupuesto oficial (es decir al valor contratado), dejando claro que para terminar el proyecto, es necesaria una adición en recursos además de la adición del tiempo restante ya solicitada en enero del presente año, es decir, se solicitaron 5 meses para terminar el proyecto, de los cuales solo se han adicionado 2, esto debido a que en la propuesta inicial no se contemplaron todas las actividades requeridas y no se tuvo en cuenta que algunos de los diseños contractuales estaban desactualizados, por lo cual se debieron actualizar e incluir ítems no previstos.

Por otra parte, se radicó ante la interventoría y la supervisión el acta parcial de cobro No. 2 con fecha de 22 de febrero, en donde se incluyeron cantidades de obra realizadas desde 15 al 18 de diciembre de 2023 y del 17 de enero al 14 de febrero 2024, por un valor de $121.660.305 y un acumulado de aproximadamente el 6.1% de avance financiero.

En comités realizados con la interventoría y la supervisión, se ha informado acerca de una solicitud informal realizada por la comunidad de paseo del puente, en donde requieren la cancha No. 1 para desarrollar actividades en los días de semana santa.

Se radicó ante la interventoría y la supervisión el acta parcial de cobro No. 3 con fecha de 22 de marzo, en donde se incluyeron cantidades de obra

realizadas desde 15 de febrero al 14 de marzo 2024, por un valor de $ 312.258.763,00 y un acumulado de aproximadamente el 15% de avance financiero.

Teniendo en cuenta las áreas localizadas durante la ejecución del proyecto, se identificó un espacio adyacente a las canchas del sector de Paseo del Puente, donde la comunidad solicita se adecue un área que pueda ser utilizada para recreación y esparcimiento de los niños más pequeños y de esta manera el escenario ofrezca el goce de todo el grupo familiar.

En este lugar se requiere implantar la zona recreativa infantil de acuerdo con la arquitectura del proyecto y espacios adyacentes al mismo, así como evaluar la necesidad de incluir actividades para el manejo de aguas en esta área.

Que por lo anteriormente expuesto se identifica una afectación presupuestal para dar cumplimiento al alcance del objeto contractual, la cual debe ser definida y cuantificada, para una posible disponibilidad y asignación de recursos y/o el balance del proyecto, esto teniendo como premisa las intervenciones a la fecha realizadas y el cumplimiento del objeto inicialmente propuesto, así como la necesidad de entregar una construcción totalmente funcional.

Es decir, que el Consorcio Deportivos PTA mediante un nuevo balance presupuestal, ha incluido dentro de las cantidades y actividades a desarrollar, las actividades de zona recreativa infantil en cada uno de los barrios intervenidos por el presente contrato, el cual se realizará con su respectivo cerramiento en tubería metálica con antepecho en concreto,

placa de piso en concreto y grama sintética para el esparcimiento y disfrute de los más pequeños de estas comunidades.

Se hizo necesario realizar una suspensión al proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de incorporar los recursos al proyecto, para desarrollar las actividades anteriormente mencionadas, por tanto, se suscribió el acta de suspensión No. 3 con fecha de 29 de mayo.

Una vez realizado el trámite administrativo correspondiente, se reinició el contrato con fecha de 24 de julio de 2024 y a su vez se realizó una adición en valor de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 569.889.572) y tiempo de 45 días de prórroga para ejecutar las actividades correspondientes a este adicional.

1. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CO1.PCCNTR.5450603

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NO.:	CO1.PCCNTR.5450603
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR INICIAL:	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 3.560.135.034).
VALOR ADICIONAL:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 569.889.572)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL:	3.5 MESES
FEHCA DE SUSPENSIÓN 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1	17 DE ENERO DE 2024
FEHCA DE SUSPENSIÓN 2	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO 2	15 DE MAYO DE 2024
FEHCA DE SUSPENSIÓN 3	29 DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 3	24 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVOS PTA – NIT 901763443-1 R/L EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
SUPERVISOR:	ING CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON
APOYO A LA SUPERVISION:	LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
INTERVENTOR CONTRATO:	GRUCODING S.A.S – NIT 830509427-9 R/L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
ANTICIPO:	N/A

FECHA DE INICIACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE ACTAS

Fecha	Descripción	Lugar	Temas a tratar	Participantes	Dependencia
10/11/2023	Comité técnico de obra No. 01	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a) Fecha de iniciación b) Obras a realizar c) Hojas de vida	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Álvaro Solano Aguilar	Interventoría
				Faher Edwart Solano	Interventoría
				Perla Johanna Orejuela	Obra
				Mateo Rondón	Obra
15/11/2023	ACTA DE INICIO	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Inicio de actividades	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Edgar Leonardo Gómez	obra
23/11/2023	Comité técnico de obra No. 02	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a) Socialización inicial b) Formalización del proyecto por parte de obra e interventoría c) Aspectos administrativos y de seguridad en el trabajo	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Álvaro Solano Aguilar	Interventoría
				Faher Edwart Solano	Interventoría
				Perla Johanna Orejuela	Obra
				Mateo Rondón	Obra
12/12/2023	Comité técnico de obra No. 03	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a) Recorrido de obra b) Aspectos administrativos y de seguridad en el trabajo	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Álvaro Solano Aguilar	Interventoría
				Faher Edwart Solano	Interventoría
				Perla Johanna Orejuela	Obra
				Mateo Rondón	Obra
				Zayra Johana Bautista Varela	Interventoría
13/12/2023	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Aprobación de pólizas	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental

14/12/2023	ACTA PARCIAL N°1	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Entrega de carpetas con documentación requerida para el cobro del acta parcial N°1	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoria
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Edgar Leonardo Gómez	obra
18/12/2023	ACTA SUSPENSIÓN N°1	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Suspensión N°1 de actividades de obra e interventoría	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Edgar Leonardo Gómez	obra
17/01/24	ACTA REINICIO N°1	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Reinicio de actividades	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
17/01/24	Comité técnico de obra No. 04	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a. Fijación de fecha de reinicio de obra: día 17 de enero del año en curso; aceptación al proceso en SECOP. Generación de actas de reinicio. b. Entrega de solicitud de adición en tiempo por parte del CONSORCIO DEPORTIVOS. c. El contratista se compromete a realizar entrega de diseños eléctricos y presupuestos.	Angie Marcela chaves	Obra
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Álvaro Solano Aguilar	Interventoría
				Sergio Pita	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
				Edgar Gómez Rancancio	obra
				Zayra Johana Bautista Varela	Interventoría
30/01/24	Comité técnico de obra No. 05	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a. Adición en tiempo a contrato de interventoría y contratista. Aceptación al proceso en SECOP. b. Adición en tiempo a contrato de interventoría y contratista. Aceptación al proceso en SECOP. c. Presentación de cronograma por parte de contratista para inclusión de no previstos	Angie Marcela chaves	Obra
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Luz Ángela Jaramillo Díaz	Interventoría
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
				Zayra Johana Bautista Varela	Interventoría

			d. Gestión de recursos para la inclusión del área eléctrica en escenarios deportivas e. Entrega de oficios de prorroga		
13/02/24	Comité técnico de obra No. 06	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	a. CONSORCIO PTA, hace entrega de modificatorio de APUS nuevos y no previstos. b. Se comenta sobre el socavón existente en la cuarta cancha por paso del rio y que a futuro puede generar la perdida de área del escenario deportivo. C. El contratista propone reducir una de las cuatro canchas para hacer zona de juegos infantiles, bajo consulta de la comunidad. d. Acorde a cotización de juegos se realiza entrega de balance. e. La interventoría solicita la programación en Project.	Angie Marcela chaves	Obra
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Faher Solano v	Interventoría
				Sergio Pita	Infraestructura departamental
				Zayra Johana Bautista Varela	Interventoría
15/03/24	ACTA SUSPENSIÓN N°2	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Suspensión N°2 de actividades de obra e interventoría	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
22/03/24	ACTA PARCIAL N°2	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Entrega de carpetas con documentación requerida para el cobro del acta parcial N°2	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
22/04/24	ACTA PARCIAL N°3	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Entrega de carpetas con documentación requerida para el cobro del acta parcial N°3	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
15/05/24	ACTA REINICIO N°2	Secretaria de infraestructura	Reinicio de actividades	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoría

		de Piedecuesta		Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
29/05/24	ACTA SUSPENSIÓN N°3	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Suspensión N°3 de actividades de obra e interventoria	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoria
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental
24/07/24	ACTA REINICIO N°3	Secretaria de infraestructura de Piedecuesta	Reinicio de actividades	Leonardo Dueñes	Infraestructura departamental
				Luz Angela Jaramillo	interventoria
				Linda palacio	Infraestructura departamental
				Cesar Augusto Rueda Alarcón	Infraestructura departamental

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

		CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA								
		ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL N° 4								
		AVANCE DE OBRA								63,71%
		CONDICIONES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL 2		ACTA 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR PASEO DEL PUENTE										
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1.01	Cerramiento con tela de polipropileno h=2,00m	m	$ 30.729,00	$7.989.540,00	260,00	$ 7.989.540,00	0,00	$ 0,00	152,54	$ 4.687.402,00
1.02	Campamento provisional de obra	und	$ 5.399.939,00	$5.399.939,00	1,00	$ 5.399.939,00		$ 0,00	1,00	$ 5.399.939,00
1.03	Comisión de topografía	mes	$ 13.467.738,00	$40.403.214,00	5,00	$ 67.338.590,00	1,00	$ 13.467.738,00	4,00	$ 53.870.952,00
1.04	Demolición de losa de concreto existente hasta e=10cm. (Incluye retiro y disposición final)	m2	$ 38.730,00	$41.541.023,00	972,58	$ 37.668.023,00	4,40	$ 170.412,00	858,91	$ 33.265.584,00
1.05	Desmonte y retiro de malla eslaborada hasta una altura de 6.00m. (Incluye retiro y disposición final)	m2	$ 28.470,00	$29.110.006,00	998,48	$ 28.426.726,00	355,60	$ 10.123.932,00	995,00	$ 28.327.650,00
1.06	Demolición de antepecho en mampostería confinada. (Incluye retiro y disposición final)	m2	$ 40.551,00	$11.542.031,00	284,63	$ 11.542.031,00	95,90	$ 3.888.841,00	284,54	$ 11.538.382,00
1.07	Demolición de viga de cimentación de concreto reforzado (30cm x 30cm). (Incluye retiro y disposición final)	m	$ 40.361,00	$11.301.806,00	279,81	$ 11.301.806,00	111,50	$ 4.503.597,00	279,74	$ 11.298.978,00
1.08	Demolición de graderia de mampostería confinada con losa de concreto. (Incluye retiro y disposición final)	m2	$ 45.547,00	$11.350.768,00	249,21	$ 11.350.768,00	61,50	$ 2.801.141,00	249,05	$ 11.343.480,00
1.09	Desmonte de mobiliario existente. Incluye arcos de fútbol, sillas metálicas, pérgola y gimnasios biosaludables existentes. (Incluye retiro y disposición final)	und	$ 137.918,00	$2.482.524,00	18,00	$ 2.482.524,00	2,00	$ 275.836,00	12,00	$ 1.655.016,00
1.10	Desmonte de arcos de cancha de baloncesto. (Incluye retiro y disposición final)	und	$ 348.013,00	$696.026,00	2,00	$ 696.026,00		$ 0,00	2,00	$ 696.026,00
1.11	Excavación de material común (incluye retiro y disposición final)	m3	$ 94.986,00	$94.422.733,00	994,07	$ 94.422.733,00	534,90	$ 50.808.011,00	726,77	$ 69.032.975,00
1.12	Excavación material común (hasta un ancho de 0.50m) (Incluye retiro y disposición final)	m	$ 33.743,00	$26.893.508,00	797,01	$ 26.893.508,00	633,10	$ 21.362.693,00	633,10	$ 21.362.693,00
1.13	Relleno con material seleccionado	m3	$ 126.371,00	$63.957.000,00	498,22	$ 63.957.000,00	87,50	$ 11.283.811,00	119,36	$ 15.322.363,00
1.14	Replanteo manual de superficie	m2	$ 16.914,00	$93.583.824,00	4.947,86	$ 93.583.824,00	1.980,20	$ 37.453.503,00	3.952,56	$ 74.758.720,00
			SUBTOTAL :	$440.673.942,00		$463.053.138,00		$156.139.515,00		$342.560.160,00
2	ADECUACIÓN CANCHA No. 01 - ARENA									
2.01	Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3"	m3	$120.056,00	$1.349.429,00	25,37	$ 3.045.821,00	25,30	$ 3.037.417,00	25,30	$ 3.037.417,00
2.02	Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000	m2	$14.640,00	$11.547.300,00	398,47	$ 5.833.601,00	397,40	$ 5.817.936,00	397,40	$ 5.817.936,00
2.03	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC Ø=4"	m	$51.549,00	$7.914.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.04	Suministro e instalacion de base granular	m3	$211.766,00	$12.735.607,00	120,28	$ 25.471.214,00	115,60	$ 24.480.150,00	115,60	$ 24.480.150,00
2.05	Suministro e instalacion de arena de peña	m3	$147.419,00	$13.297.194,00	90,20	$ 13.297.194,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.06	Suministro e instalación de arco metálico de L=3.00m y H=2.00m. Incluye malla y pintura	und	$3.353.718,00	$6.707.436,00	2,00	$ 6.707.436,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$53.551.799,0		$54.355.266,00		$33.335.503,00		$33.335.503,00

3	**ADECUACIÓN CANCHA No. 02**									
3.01	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$11.949.955,00	112,86	$ 23.899.311,00	97,20	$ 20.583.655,00	97,20	$ 20.583.655,00
3.02	Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm)	m2	$159.097,00	$89.778.437,00	534,30	$ 85.005.527,00	499,90	$ 79.532.590,00	499,90	$ 79.532.590,00
3.03	Suministro e instalación de malla electrosoldada	kg	$15.015,00	$31.295.915,00	1.934,31	$ 29.043.665,00	1.759,80	$ 26.423.397,00	1.759,80	$ 26.423.397,00
3.04	Suministro e instalación de césped sintético para canchas	m2	$229.214,00	$129.345.460,00	464,30	$ 106.424.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.05	Suministro e instalación de arco metálico de L=3.00m y H=2.00m. Incluye malla y pintura	und	$3.353.718,00	$6.707.436,00	2,00	$ 6.707.436,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.06	Suministro e instalación de sellante para juntas en losa de concreto. Incluye corte de concreto	m	$37.797,00	$8.799.142,00	232,80	$ 8.799.142,00	208,50	$ 7.880.675,00	208,50	$ 7.880.675,00
			SUBTOTAL :	$277.876.345,00		$259.879.741,00		$134.420.317,00		$134.420.317,00
4	**ADECUACIÓN CANCHA No. 03**									
4.01	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$9.052.997,00	94,05	$ 19.916.592,00	94,03	$ 19.912.357,00	94,03	$ 19.912.357,00
4.02	Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	$10.432,00	$4.459.680,00	470,30	$ 4.906.170,00	464,50	$ 4.845.664,00	464,50	$ 4.845.664,00
4.03	Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-10	m3	$1.481.931,00	$50.682.040,00	37,60	$ 55.720.606,00	37,20	$ 55.127.833,00	37,20	$ 55.127.833,00
4.04	Alistamiento de superficie (aplicación de 2 capas de imprimante)	m2	$21.743,00	$9.295.133,00	470,30	$ 10.225.733,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.05	Suministro y aplicación de una capa base compuesta por material acrílico, arena de cuarzo y latex	m2	$26.681,00	$11.406.128,00	470,30	$ 12.548.074,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.06	Recubrimiento de resina acrílica (aplicación de 2 capas). Incluye demarcación	m2	$69.015,00	$29.503.913,00	470,30	$ 32.457.755,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.07	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para cancha. Incluye tablero en acrílico de 10mm y mallas	und	$9.489.660,00	$18.979.320,00	2,00	$ 18.979.320,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$133.379.211,00		$154.754.250,00		$79.885.854,00		$79.885.854,00
5	**ADECUACIÓN CANCHA No. 04**									
5.01	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$11.467.129,00	108,30	$ 22.934.258,00	89,10	$ 18.868.351,00	89,10	$ 18.868.351,00
5.02	Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	$10.432,00	$5.648.928,00	451,50	$ 4.710.048,00	436,80	$ 4.556.698,00	436,80	$ 4.556.698,00
5.03	Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-10	m3	$1.481.931,00	$64.197.251,00	36,10	$ 53.497.709,00	34,90	$ 51.719.392,00	34,90	$ 51.719.392,00
5.04	Alistamiento de superficie (aplicación de 2 capas de imprimante)	m2	$21.743,00	$11.773.835,00	451,50	$ 9.816.965,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.05	Suministro y aplicación de una capa base compuesta por material acrílico, arena de cuarzo y latex	m2	$26.681,00	$14.447.762,00	451,50	$ 12.046.472,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.06	Recubrimiento de resina acrílica (aplicación de 2 capas). Incluye demarcación	m2	$69.015,00	$37.371.623,00	451,50	$ 31.160.273,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.07	Suministro e instalación de arcos para baloncesto. Incluye tablero en acrílico	und	$5.722.690,00	$11.445.380,00	2,00	$ 11.445.380,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$156.351.908,00		$ 145.611.105,00		$ 75.144.441,00		$ 75.144.441,00

6	CONCRETOS Y MAMPOSTERÍA									
6.01	Viga de cimentación en concreto de 3.000 psi para cerramiento	m3	$1.057.819,00	$46.639.240,00	21,72	$ 22.975.829,00	20,70	$ 21.896.853,00	21,07	$ 22.288.246,00
6.02	Zapata en concreto de 3.000 psi para graderia	m3	$993.313,00	$27.971.694,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.03	Concreto de 3.000 psi para graderias	m3	$1.347.986,00	$181.331.077,00	19,52	$ 26.312.687,00	18,70	$ 25.207.338,00	18,70	$ 25.207.338,00
6.04	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi	kg	$12.945,00	$200.448.433,00	25.460,53	$ 306.673.288,00	11.043,60	$ 133.020.162,00	16.366,36	$ 197.156.896,00
6.05	Mamposteria H-10	m2	$104.552,00	$16.703.228,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.06	Friso	m2	$59.200,00	$51.281.408,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.07	Estuco para exteriores (3 manos)	m2	$54.963,00	$47.611.149,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.08	Pintura para exteriores (3 manos)	m2	$44.982,00	$38.965.208,00	866,24	$ 38.965.208,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.09	Concreto 3.000 psi antepecho para cerramiento	m3	$1.210.880,00	$43.628.006,00	45,40	$ 54.973.952,00	11,70	$ 14.167.296,00	11,70	$ 14.167.296,00
			SUBTOTAL :	$654.579.443,00		$ 449.900.964,00		$ 194.291.649,00		$ 258.819.776,00
7	ESTRUCTURAS METÁLICAS									
7.01	Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálica Ø=3" para alturas entre 3.00m y 6.00m con espacio libre entre tubos de 10cm embebido en antepecho. Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores	m2	$698.023,00	$933.619.723,00	1.114,00	$ 777.597.622,00	1.054,00	$ 735.716.242,00	1.054,00	$ 735.716.242,00
7.02	Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálica Ø=2" para alturas hasta 3.00m con espacio libre entre tubos de 10cm embebido en antepecho. Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores	m2	$437.020,00	$50.921.570,00	177,00	$ 77.352.540,00	158,40	$ 69.223.968,00	158,40	$ 69.223.968,00
			SUBTOTAL :	$984.541.293,00		$ 854.950.162,00		$ 804.940.210,00		$ 804.940.210,00
8	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL									
8.01	Construcción canal de aguas lluvias (sección transversal interna ancho=25cm x altura promedio=35cm). Incluye rejilla en concreto y acero de refuerzo	m	$425.737,00	$48.534.018,00	139,91	$ 59.139.127,00	136,00	$ 57.900.232,00	136,00	$ 57.900.232,00
8.02	Caja de recolección de aguas lluvias de 0,60m x 0,60m	und	$497.950,00	$3.983.600,00	2,00	$ 995.900,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 497.950,00
8.03	Pozo de inspección H<=2.00m. Incluye tapa de concreto, aro y contra-aro	und	$6.017.128,00	$12.034.256,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.04	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC Ø=6"	m	$113.771,00	$10.377.053,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.05	Suministro e instalación de tubería de pol eileno Ø=4"	m	$51.991,00	$7.798.650,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$82.727.577,00		$ 60.135.027,00		$ 57.900.232,00		$ 58.398.182,00
	SUBTOTAL ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR PASEO D			$ 2.783.681.518,00		$ 2.442.639.653,00		$ 1.536.057.721,00		$ 1.787.504.443,00
	ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CABECERA									
9	ACTIVIDADES PRELIMINARES									
9.01	Cerramiento con tela de polipropileno H=2.00m	m	$30.729,00	$4.670.808,00	152,00	$ 4.670.808,00		$ 0,00	152,00	$ 4.670.808,00
9.02	Campamento provisional de obra	und	$5.399.939,00	$5.399.939,00	1,00	$ 5.399.939,00		$ 0,00	1,00	$ 5.399.939,00

9.03	Comisión de topografía	mes	$13.467.738,00	$13.467.738,00	4,00	$ 53.870.952,00	1,00	$ 13.467.738,00	4,00	$ 53.870.952,00
9.04	Desmonte y retiro de malla eslaborada hasta una altura de 6.00m.(Incluye retiro y disposición final)	m2	$26.470,00	$4.890.861,00	171,79	$ 4.890.861,00	161,60	$ 4.600.752,00	161,60	$ 4.600.752,00
9.05	Demolición de mampostería confinada	m2	$40.551,00	$5.338.539,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.06	Demolición de viga de cimentación de concreto reforzado (30cm x 30cm). (Incluye retiro y disposición final)	m	$40.331,00	$1.643.914,00	20,70	$ 836.094,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.07	Desmonte de mobiliario existente. Incluye arcos de fútbol, sillas metálicas, pérgola y gimnasios biosaludables existentes. (Incluye retiro y disposición final)	und	$137.918,00	$275.836,00	2,00	$ 275.836,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 275.836,00
9.08	Excavación de material común (Incluye retiro y disposición final)	m3	$94.986,00	$51.931.696,00	546,73	$ 51.931.696,00	104,30	$ 9.907.040,00	194,70	$ 18.493.774,00
9.09	Excavación material común (hasta un ancho de 0.50m) (Incluye retiro y disposición final)	m	$33.743,00	$12.069.871,00	357,70	$ 12.069.871,00	136,00	$ 4.589.048,00	348,04	$ 11.743.914,00
9.10	Relleno con material seleccionado	m3	$128.371,00	$28.566.399,00	222,53	$ 28.566.399,00	71,40	$ 9.165.689,00	81,40	$ 10.449.399,00
9.11	Replanteo manual de superficie	m2	$18.914,00	$42.088.946,00	2.225,28	$ 42.088.946,00	956,30	$ 18.087.458,00	2.224,80	$ 42.079.867,00
			SUBTOTAL :	$170.344.547,00		$204.601.402,00		$59.817.725,00		$151.585.241,00
10	ADECUACIÓN CANCHA DE ARENA									
10.01	Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3"	m3	$120.056,00	$2.461.148,00	49,90	$ 5.990.794,00	8,70	$ 1.044.487,00	45,35	$ 5.444.540,00
10.02	Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000	m2	$14.640,00	$21.285.930,00	580,00	$ 8.491.200,00		$ 0,00	559,44	$ 8.190.202,00
10.03	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC Ø=4"	m	$51.549,00	$11.753.172,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.04	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$23.561.085,00	222,52	$ 47.122.170,00	222,50	$ 47.117.935,00	222,50	$ 47.117.935,00
10.05	Suministro e instalación de arena de peña	m3	$147.419,00	$24.604.231,00	166,90	$ 24.604.231,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.06	Suministro e instalación de arco metálico de L=3.00m y H=2.00m. Incluye malla y pintura	und	$3.353.718,00	$6.707.436,00	2,00	$ 6.707.436,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$90.383.002,00		$92.915.831,00		$48.162.422,00		$60.752.577,00
11	CONCRETO Y MAMPOSTERÍA									
11.01	Viga de cimentación en concreto de 3.000 psi para cerramiento	m3	$1.057.819,00	$15.687.456,00	30,30	$ 32.051.916,00	12,50	$ 13.222.738,00	12,50	$ 13.222.738,00
11.02	Zapata en concreto de 3.000 psi para graderia	m3	$993.313,00	$11.184.704,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.03	Concreto de 3.000 psi para graderías	m3	$1.347.986,00	$77.064.360,00	37,59	$ 50.670.794,00	29,10	$ 39.226.393,00	29,10	$ 39.226.393,00
11.04	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi	kg	$12.045,00	$70.305.220,00	8.266,88	$ 98.851.870,00	2.144,60	$ 25.831.707,00	2.144,60	$ 25.831.707,00
11.05	Mampostería H-10	m2	$104.552,00	$6.786.470,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.06	Friso	m2	$59.200,00	$22.918.688,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.07	Estuco para exteriores (3 manos)	m2	$54.963,00	$21.278.376,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.08	Pintura para exteriores (3 manos)	m2	$44.982,00	$17.414.331,00	387,14	$ 17.414.331,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.09	Concreto 3.000 psi antepecho para cerramiento	m3	$1.210.880,00	$7.882.829,00	10,80	$ 13.077.504,00	3,20	$ 3.874.816,00	3,20	$ 3.874.816,00
			SUBTOTAL :	$250.522.434,00		$212.066.415,00		$82.155.654,00		$82.155.654,00


12	ESTRUCTURAS METÁLICAS									
12.01	Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálica Ø=3" para alturas entre 3.00m y 6.00m con espacio libre entre tubos de 10cm embebido en antepecho. Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores	m2	$ 696.023,00	$175.482.982,00	70,00	$ 48.861.610,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$175.482.982,00		$48.861.610,00		$0,00		$0,00
13	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL									
13.01	Construcción canal de aguas lluvias (sección transversal interna ancho=25cm x altura promedio=35cm). Incluye rejilla en concreto y acero de refuerzo	m	$ 425.737,00	$37.890.593,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.02	Caja de recolección de aguas lluvias de 0.60m x 0.60m	und	$ 497.950,00	$995.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.03	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC Ø=6"	m	$ 113.771,00	$2.673.619,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.04	Suministro e instalación de tubería de polietileno Ø=4"	m	$ 51.991,00	$2.599.350,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			SUBTOTAL :	$44.159.662,00		$0,00		$0,00		$0,00
SUBTOTAL ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CABECERA				$ 730.892.627,00		$ 558.445.258,00		$ 190.135.801,00		$ 294.493.572,00
ÍTEMS NO PREVISTOS PASEO DEL PUENTE										
14	VARIOS									
NP1	Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø=4"	m	$54.647,00	$0,00	124,30	$ 6.792.622,00	123,90	$ 6.770.763,00	123,90	$ 6.770.763,00
NP2	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado Ø=10"	m	$247.913,00	$0,00	37,60	$ 9.321.529,00		$ 0,00	37,60	$ 9.321.529,00
NP3	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado Ø=12"	m	$371.345,00	$0,00	44,00	$ 16.339.180,00		$ 0,00	43,77	$ 16.253.771,00
NP4	Suministro e instalación de Arena para cimentación de tubería	m3	$197.336,00	$0,00	28,25	$ 5.574.742,00		$ 0,00	27,26	$ 5.379.379,00
NP5	Caja de recolección de aguas lluvias de 0.80m x 0.80m	und	$952.974,00	$0,00	8,00	$ 7.623.792,00	1,00	$ 952.974,00	8,00	$ 7.623.792,00
NP6	Concreto de 2500psi para solado	m3	$1.158.098,00	$0,00	36,30	$ 42.038.957,00		$ 0,00	19,72	$ 22.837.693,00
NP7	Concreto de 3000psi para estructura	m3	$1.584.900,00	$0,00	194,00	$ 307.470.600,00	126,10	$ 199.855.890,00	175,35	$ 277.912.215,00
NP11	Construcción de zona recreativa infantil sector Paseo del Puente	und	$185.500.000,00	$0,00	1,00	$ 185.500.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP12	Grama Sintética para zona infantil	m2	$225.380,00	$0,00	130,00	$ 29.299.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.02	Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm)	m2	$159.097,00	$0,00	294,90	$ 46.917.705,00	118,00	$ 18.773.446,00	118,00	$ 18.773.446,00
10.04	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$0,00	44,20	$ 9.360.057,00	17,70	$ 3.748.258,00	17,70	$ 3.748.258,00
NP8	Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø=6"	m	$112.201,00	$0,00	29,30	$ 3.287.489,00	29,20	$ 3.276.269,00	29,20	$ 3.276.269,00
TOTAL ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR PASEO DEL PUENTE				$ 0,00		$ 669.526.073,00		$ 233.377.600,00		$ 371.897.115,00

	ITEMS NO PREVISTOS SECTOR CABECERA									
15	VARIOS									
NP1	Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø=4"	m	$54.647,00	$0,00	163,00	$ 8.907.461,00		$ 0,00	153,40	$ 8.382.850,00
NP8	Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø=6"	m	$112.201,00	$0,00	60,00	$ 6.732.060,00		$ 0,00	58,64	$ 6.579.467,00
NP9	Pozo de inspección H<=2,00m > 3,00. Incluye tapa de concreto, aro y contra-aro	und	$8.740.577,00	$0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP3	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado Ø=12"	m	$371.345,00	$0,00	52,00	$ 19.309.940,00	50,50	$ 18.752.923,00	50,50	$ 18.752.923,00
NP4	Suministro e instalación de Arena para cimentación de tubería	m3	$197.336,00	$0,00	14,55	$ 2.871.239,00	14,50	$ 2.861.372,00	14,50	$ 2.861.372,00
NP5	Caja de recolección de aguas lluvias de 0.80m x 0.80m	und	$952.974,00	$0,00	2,00	$ 1.905.948,00	1,00	$ 952.974,00	1,00	$ 952.974,00
NP6	Concreto de 2500psi para solado	m3	$1.158.096,00	$0,00	9,10	$ 10.538.692,00	0,60	$ 694.859,00	0,60	$ 694.859,00
NP7	Concreto de 3000psi para estructura	m3	$1.584.900,00	$0,00	34,00	$ 53.886.600,00	4,30	$ 6.815.070,00	4,30	$ 6.815.070,00
NP10	Concreto de 4000psi para estructuras de drenaje aguas lluvias	m3	$1.963.066,00	$0,00	12,65	$ 24.832.785,00	2,30	$ 4.515.052,00	2,30	$ 4.515.052,00
NP13	Reforzamiento malla de cerramiento contra impacto	m2	$491.092,00	$0,00	183,00	$ 89.869.836,00	120,80	$ 59.323.914,00	120,80	$ 59.323.914,00
8.03	Pozo de inspección H<=2,00m. Incluye tapa de concreto, aro y contra-aro	und	$6.017.128,00	$0,00	2,00	$ 12.034.256,00	2,00	$ 12.034.256,00	2,00	$ 12.034.256,00
NP14	Construcción de zona recreativa infantil sector Cabecera	und	$138.000.000,00	$0,00	1,00	$ 138.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP12	Grama Sintética para zona infantil	m2	$225.380,00	$0,00	100,00	$ 22.538.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.02	Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm)	m2	$159.097,00	$0,00	117,50	$ 18.693.898,00	100,90	$ 16.052.887,00	100,90	$ 16.052.887,00
10.04	Suministro e instalación de base granular	m3	$211.766,00	$0,00	17,60	$ 3.727.082,00	15,10	$ 3.197.667,00	15,10	$ 3.197.667,00
	SUBTOTAL ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CABECERA			$ 0,00		$ 413.847.797,00		$ 125.200.974,00		$ 140.163.291,00
	SUBTOTAL OBRAS			$ 3.514.574.145,00		$ 4.084.458.781,00		$ 2.084.772.096,00		$ 2.594.058.421,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)			$45.560.889,00		$45.560.889,00		$15.484.350,00		$37.378.640,00
	VALOR TOTAL DE OBRA:			$3.560.135.034,00		$4.130.019.670,00		$2.100.256.446,00		$2.631.437.061,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:					$4.936,00				
	VALOR TOTAL DE OBRA:					$4.130.024.606,00		$2.100.256.446,00		$2.631.437.061,00

1.1.1 ACTIVIDADES TECNICAS

FRENTE PASEO DEL PUENTE
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.03 Comisión de topografía (mes)

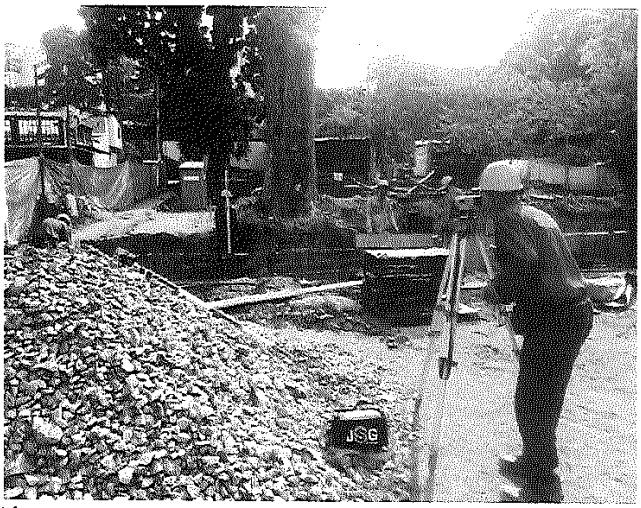


1.04 Demolición de losa de concreto existente hasta e=10 cm. (incluye retiro y disposición final). (m2)




1.05 Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m. (incluye retiro y disposición final). (m2)




1.06 Demolición de antepecho en mampostería confinada. (incluye retiro y disposición final). (m2)

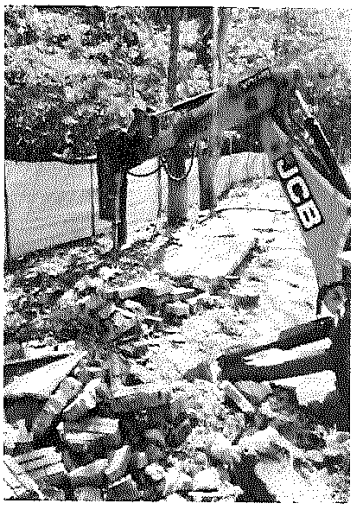

1.07 Demolición de viga de cimentación de concreto reforzado (30cm x 30cm). (incluye retiro y disposición final). (m)

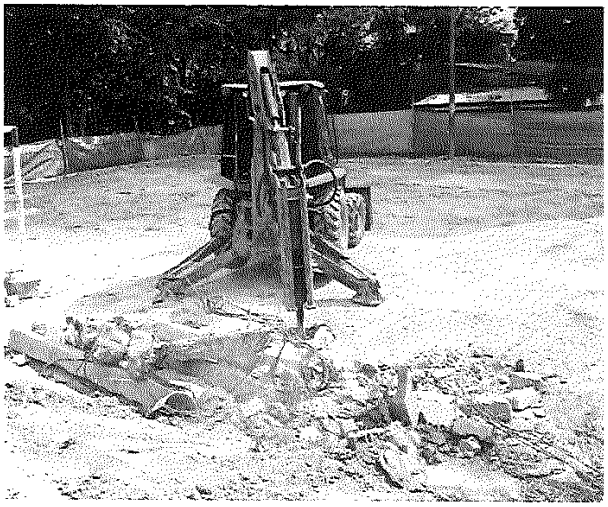

1.08 Demolición de gradería de mampostería confinada con losa de concreto. (incluye retiro y disposición final). (m2)

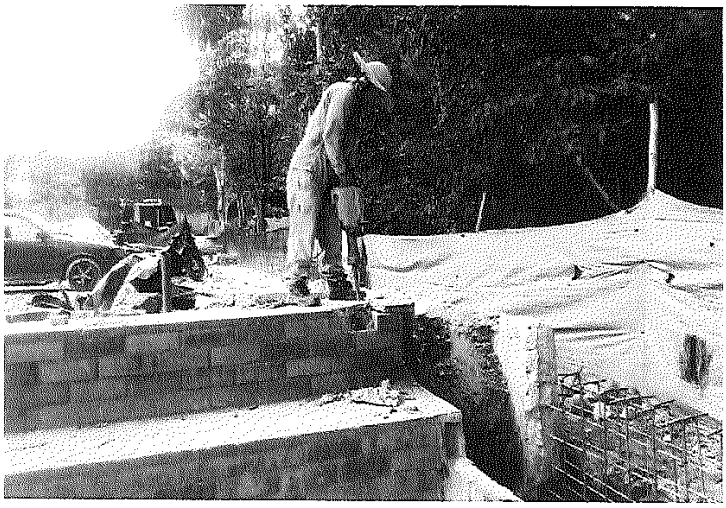

1.09 Desmonte de mobiliario existente. Incluye arcos de futbol, sillas metálicas, pérgolas y gimnasios biosaludables existentes. (incluye retiro y disposición final). (und)



1.11 Excavación de material común (Incluye retiro y disposición final) (m3)



1.12 Excavación de material común (hasta ancho de 0.50m)(Incluye retiro y disposición final) (m)



1.13 Relleno con material seleccionado (m3)




1.14 Replanteo manual de superficie (m2)



2. ADECUACIÓN CANCHA N°1-ARENA

2.01 Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3". (m3)

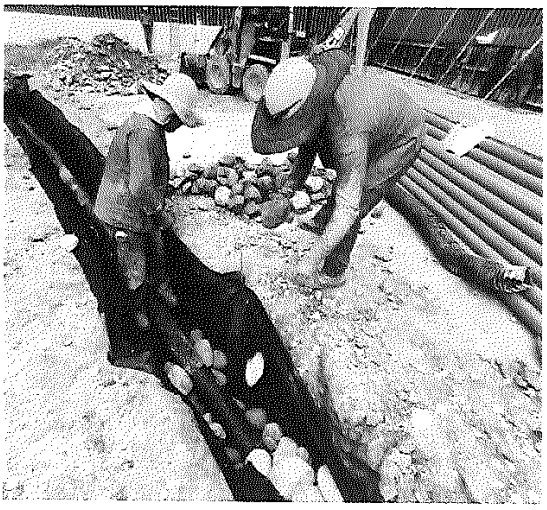

2.02 Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000. (m2)



2.04 Suministro e instalación de base granular. (m3)




3. ADECUACIÓN CANCHA N°2-SINTÉTICA

3.01 Suministro e instalación de base granular. (m3)



3.02 Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm). (m2)

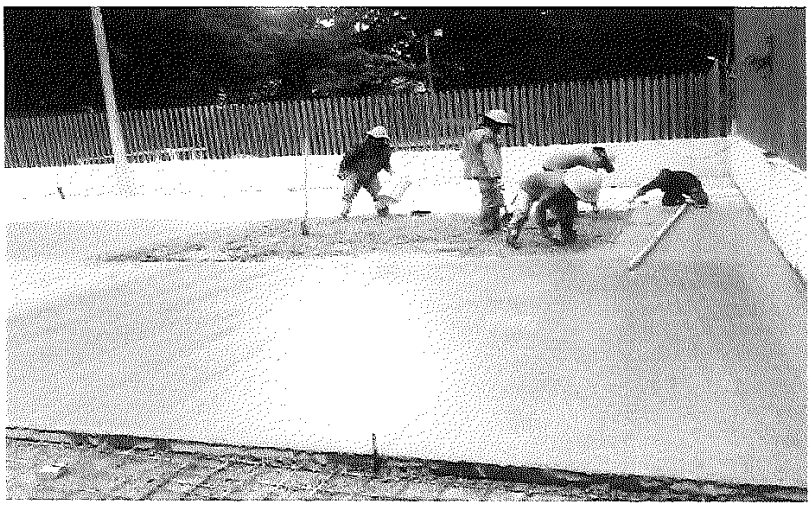

3.03 Suministro e instalación de malla electrosoldada. (kg)




3.06 Suministro e instalación de sellante para juntas en losa de concreto. (incluye corte de concreto). (m)




4. ADECUACIÓN CANCHA N°3-ASFALTO

4.01 Suministro e instalación de base granular. (m3)

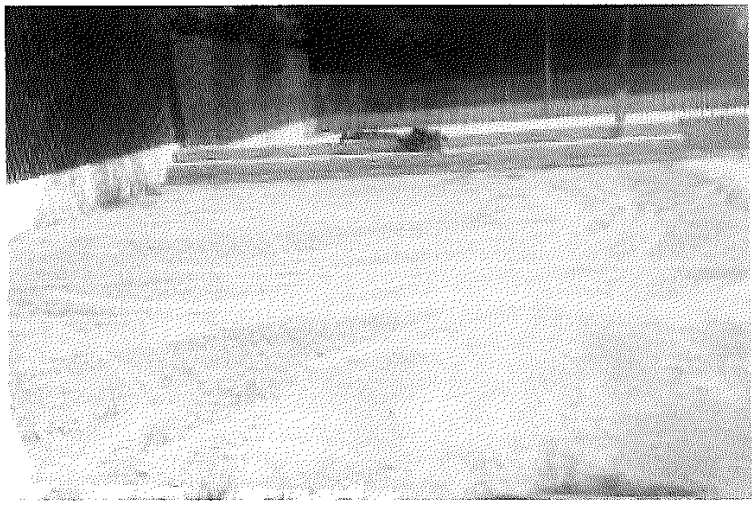

4.02 Suministro e instalación de riego de imprimación con emulsión asfáltica. (m2)

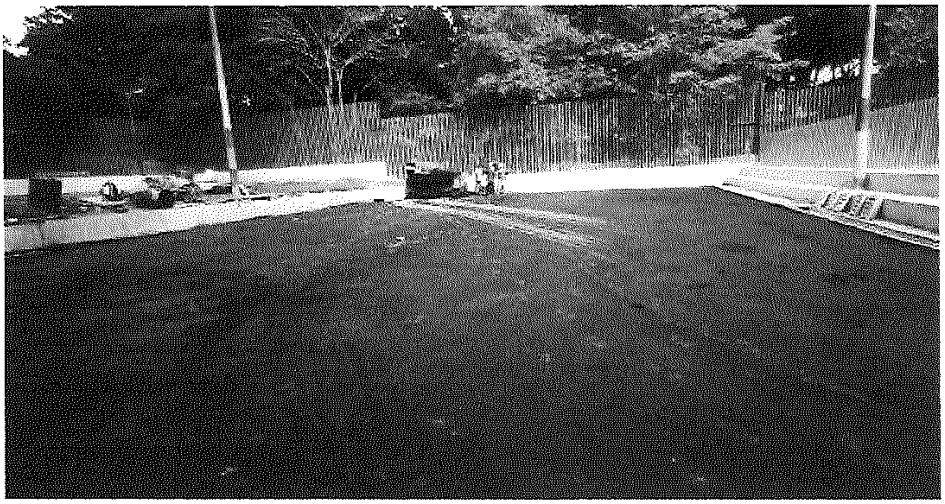

4.03 Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-10. (m3)



5. ADECUACIÓN CANCHA N°4-ASFALTO

5.01 Suministro e instalación de base granular. (m3)



5.02 Suministro e instalación de riego de imprimación con emulsión asfáltica. (m2)



5.03 Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-10. (m3)




6. CONCRETOS Y MAMPOSTERIA


6.01 Viga de cimentación en concreto de 3.000 psi para cerramiento (m3)



6.03 Concreto de 3000 psi para graderías. (m3)

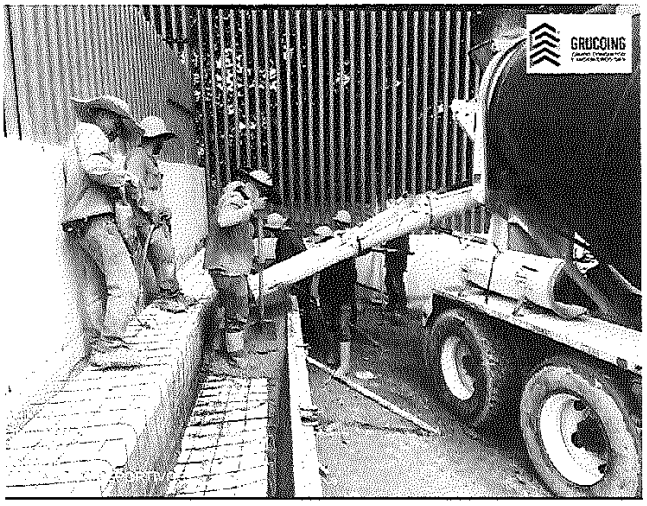

6.04 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (kg)

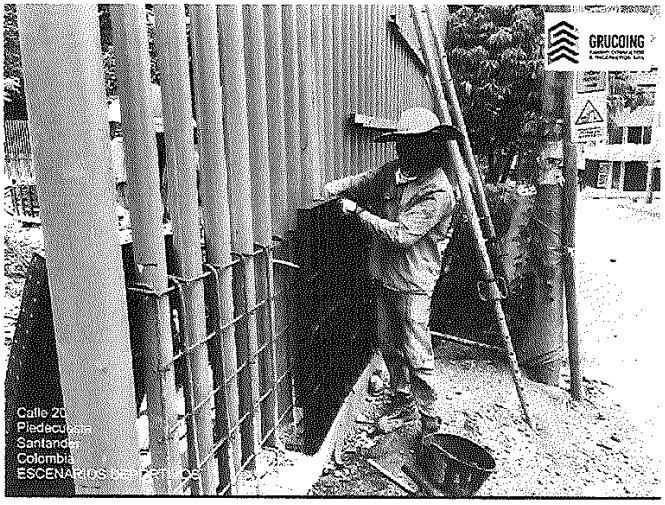


6.09 Concreto 3000 psi antepecho para cerramiento. (m3)



7. ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.01 Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálicas Ø=3" para alturas entre 3.00m y 6.00m con espacio libre entre tubos de 10cm embebido en antepecho. (incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores) (m2)

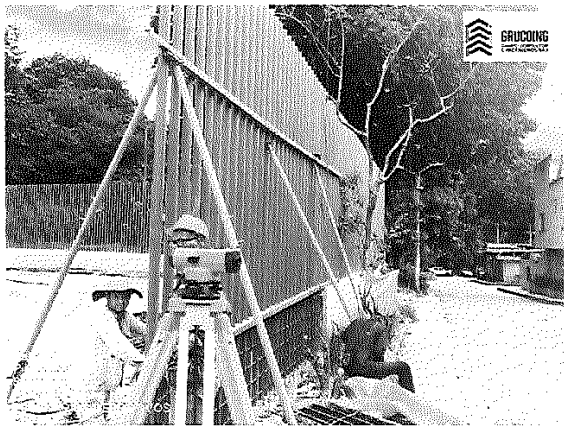

7.02 Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálicas Ø=3" para alturas hasta 3.00m con espacio libre entre tubos de 10cm embebido en antepecho. (incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores) (m2)



8. RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

8.01 Construcción de canal de aguas lluvias (sección transversal interna ancho =25cm x altura promedio=35cm) (incluye rejilla en concreto y acero de refuerzo) aja de recolección de aguas lluvias de 0.60m x 0.60m (m)




FRENTE CABECERA

9. ACTIVIDADES PRELIMINARES

9.03 Comisión de topografía (mes)




9.04 Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m. (incluye retiro y disposición final). (m2)

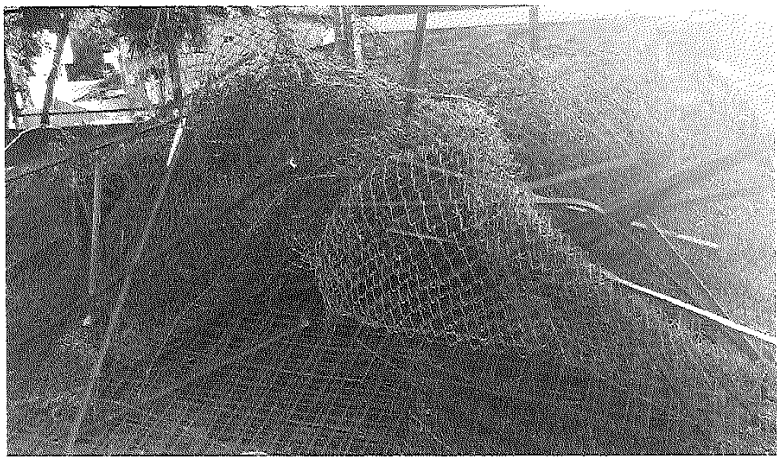

9.08 Excavación de material común. (incluye retiro y disposición final). (m3)



9.09 Excavación material común (hasta un ancho de 0.50m) (Incluye retiro y disposición final) (m)

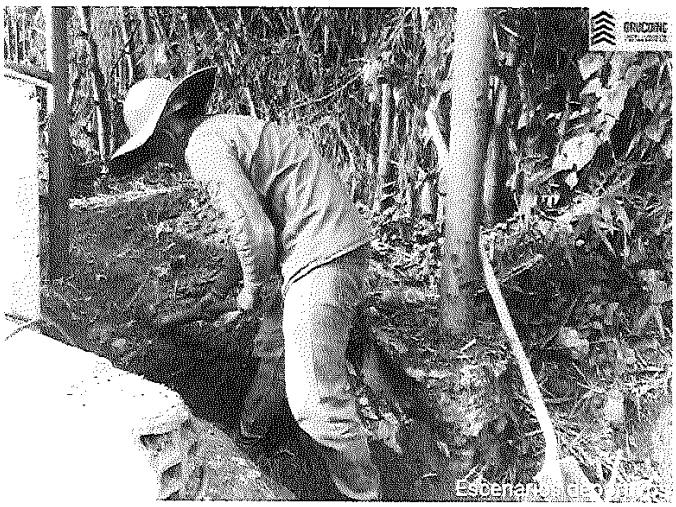

9.10 Relleno con material seleccionado. (m3)



9.11 Replanteo manual de superficie (m2)




10. ADECUACIÓN CANCHA DE ARENA

10.01 Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3". (m3)




10.04 Suministro e instalación de base granular. (m3)

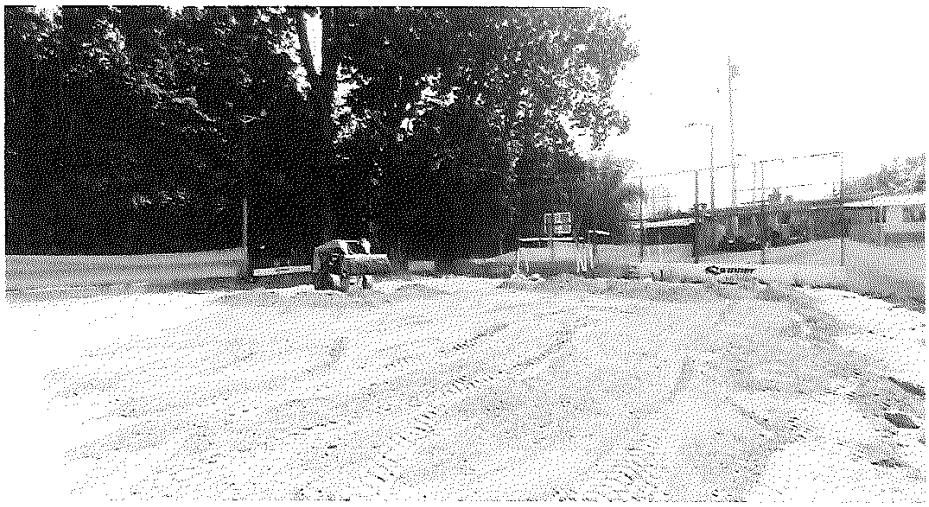

11. CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

11.01 Viga de cimentación en concreto de 3000 psi para cerramiento. (m3)

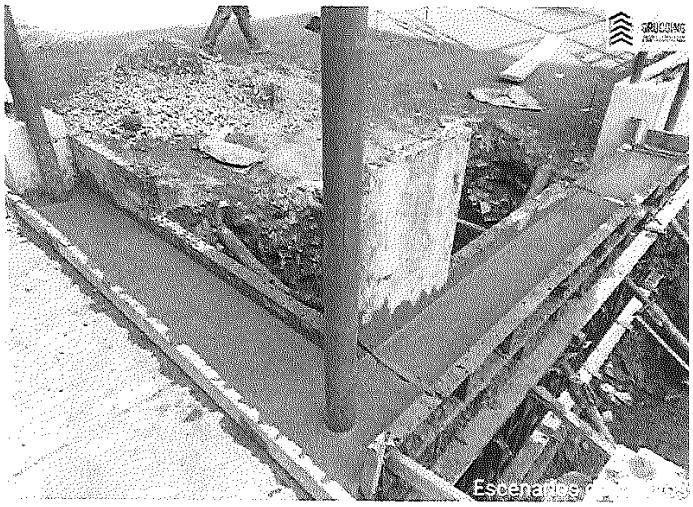


11.03 Concreto de 3000 psi para gradería. (m3)



11.04 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi. (kg)




11.09 Concreto 3000 psi antepecho cerramiento. (m3)

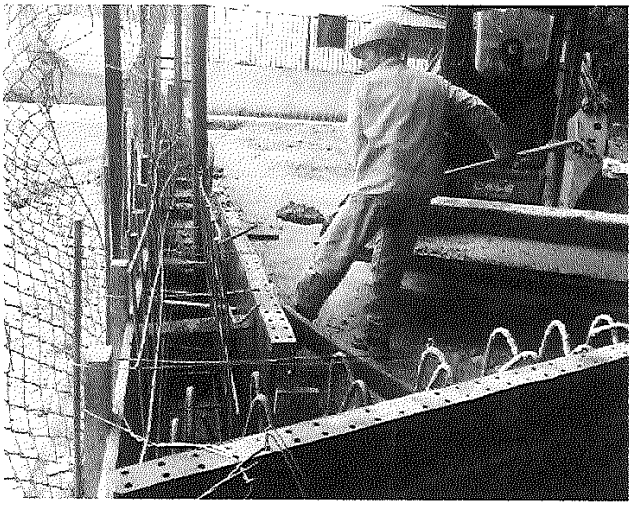

14. VARIOS PASEO DEL PUENTE


NP1 Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø=4". (m)

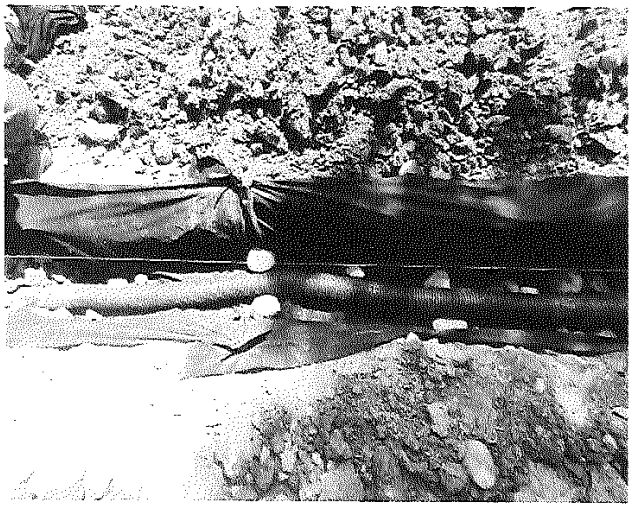


NP5 Caja de recolección de aguas lluvias de 0.80m x 0.80m. (und)



NP7 Concreto de 3000psi para estructura. (m3)

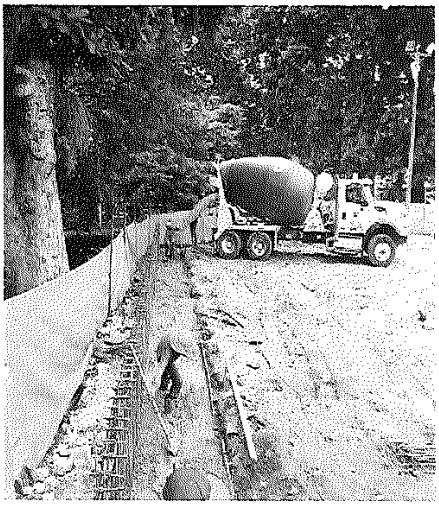

3.02 Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm). (m2)

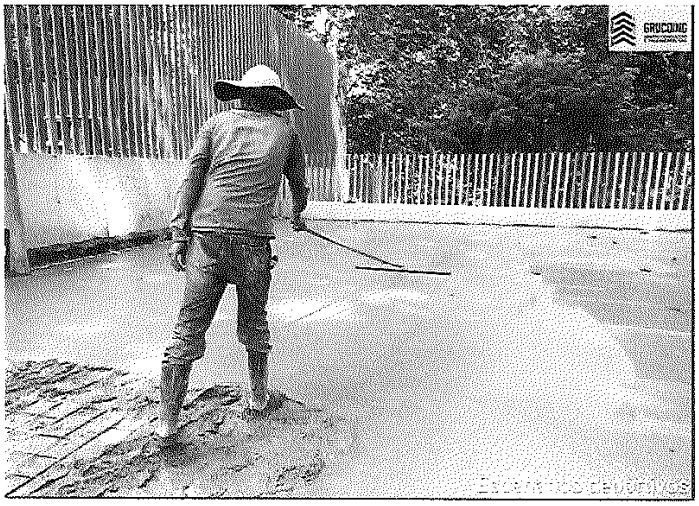

10.04 Instalación de base granular. (m3)



NP8 Suministro e instalación de tubería PVC Ø=6". (m)



15. VARIOS CABECERA

NP3 Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado Ø=12". (m)




NP4 Suministro e instalación de arena para cimentación de tubería. (m3)




NP5 Caja de recolección de aguas lluvias de 0.80m x 0.80m. (und)




NP5 Concreto de 25000 psi para solado. (m3)

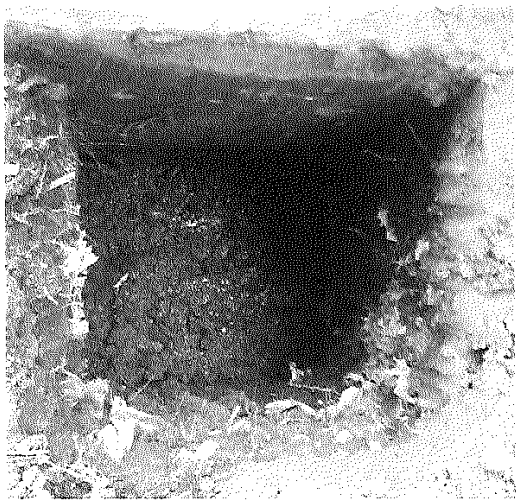

NP7 Concreto de 3000psi para estructura. (m3)

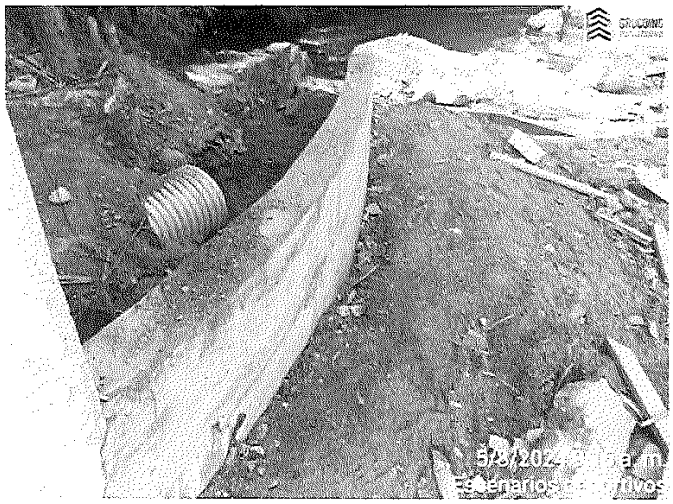

NP10 Concreto de 4000psi para estructuras de drenaje aguas lluvias. (m3)

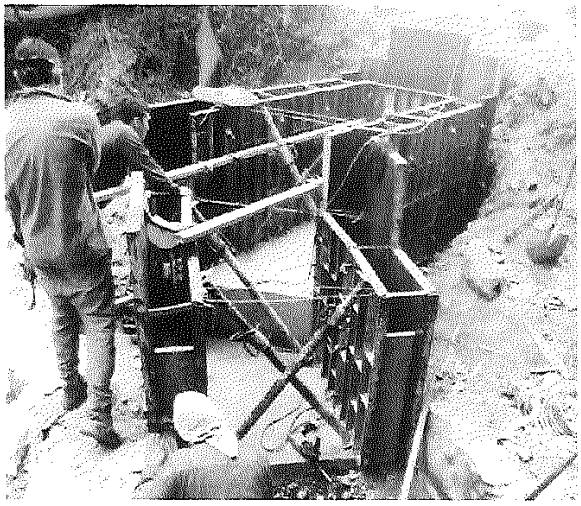

NP13 Reforzamiento en malla de cerramiento contra impacto. (m2)



8.03 Pozo de inspección H<=2.00m. (incluye tapa de concreto, aro y contra-aro). (und)



3.02 Losa de piso en concreto de 3000 psi (e=10cm). (m2)



10.04 Instalación de base granular. (m3)



1.1.2 AVANCE FINANCIERO

En el momento se presenta el acta de cobro parcial 4 a la entidad, la cual suma un valor total de $ 2.100.256.446,00 | con un porcentaje de avance financiero aproximado del 51% en el periodo y un 63.71% acumulado para un total del proyecto de $ 2.631.437.061,00.

Durante el periodo correspondiente a este corte, no solo en los frentes de obra, sino en el país en general, se presentaron gran cantidad de lluvias situación que ha ocasionado algunas dificultades y reprocesos en el trascurrir de la obra.

Durante este periodo se firmó un adicional en valor y tiempo en donde se evaluaron los diseños y cantidades teniendo en cuenta el cumplimiento del objeto contractual.

1.1.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se mitigan los impactos Ambientales de acuerdo con los lineamientos establecidos en las fichas del Plan de Manejo Ambiental perteneciente a documentos técnicos del proyecto.

- Se verifica la seguridad social de los trabajadores antes del ingreso a la obra.

1.1.4 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

- Entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores que ingresaron durante este periodo y se diligencia las planillas de entrega

- Se realiza control permanente de ingreso a la obra por medio del diligenciamiento de la planilla de ingreso del personal a sus respectivas horas y salidas del lugar de trabajo.

- Se realizan charlas esporádicas al personal sobre los diferentes aspectos de la obra a tener en cuenta durante la jornada laboral y se verifican la asistencia de todo el personal que interviene en el proyecto.

- Verificación de vinculación del personal al sistema de seguridad social antes de ingresar a la obra.

- Verificación del uso de dotación y equipos de protección personal de los trabajadores dependiendo de la labor a desempeñar durante el día.

- Revisión del botiquín e implementos de primeros auxilios, verificando que no se encuentren en mal estado o vencidos.

1.2 AVANCE EN TIEMPO

A la fecha la interventoría presenta un avance en tiempo del 80% al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5464777 de interventoría, tal como se detalla en la siguiente tabla:

CONTROL AVANCE EN TIEMPO					
Fecha Inicio:	15/11/2023	**Cantidad**		**Tiempo total transcurrido:**	80,00%
Fecha actual:	8/08/2024	120	[días]		
Fecha terminación:	8/09/2024	90	[días]		

1.3 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Damaris Andrea Alfonso Sánchez	63.537.962	Profesionales
Lilly Juliana Duran Higuera	1.098.622.228	Profesional siso
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP
Parmenio Rodríguez Ave	13.700.835	Cadenero 1
Juan de Dios Pérez Pabón	13.871.814	Oficios Varios
Orlando Pinzón Álvarez	5.595.911	Almacenistas
Arturo Arenas Jaimes	91.357.047	Oficios varios
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.252.372	Director de Obra
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional sst

Angie Marcela Chaves Romo	1.098.727.596	Residente de Obra
Anny Paola Manrique Diaz	1.098.778.469	Residente de Obra
Ingrit Johana Orellano Mercado	1.098.720.357	Profesional SST
Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo

Se anexa copia de la seguridad social del personal profesional de la empresa contratista, relacionados en el presente numeral.

1.4 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador
MINICARGADOR	CASE	2017	NGM417549	122708	Jhon N. Castillo
RETROEXCAVADORA	JCB	2018	SOR3CXTTPJ2674729	SB320/45045H00157175	Fernando Aramburo
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	2019	0R5200290	CMY06840	Wilman Ardila
MINIRETROCARGADOR	JCB	2014	JCB1CXWSA01744815	GN66168U920152Y	Wilman Ardila
MINICARGADOR	CASE	2019	NJM450588	000453344	Yeferson Acevedo

1.5 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **N.° 400-47-994000095818**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – DECRETO 1082 DE 2015

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA APROBADA	
			Desde DDMMAA	Hasta DDMMAA
400-47-994000095818	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 356,013,600.00	15/11/2023	08/01/2025
400-47-994000095818	SALARIOS	$ 712,027,200.00	15/11/2023	08/09/2027
400-47-994000095818	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 1,068,040,800.00	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA No: 400-74-994000023888

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA APROBADA	
			Desde DDMMAA	Hasta DDMMAA
400-74-994000023888	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	$ 0	15/11/2023	08/09/2024

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5464777
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($259.343.840,00)
VALOR ADICIONAL:	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($93.829.516,67)
VALOR TOTAL:	TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($353.173.366,67)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL:	3.5 MESES
CONTRATISTA:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9 R/L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
SUPERVISOR:	ING. CESAR AUGUSTO RUEDA
APOYO SUPERVISION:	ING. LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**
ANTICIPO (0%)	**N/A**
FECHA DE INICIACION:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ACTA DE SUSPENSION	N°1	18/12/23	N°2	15/03/24	N°3	29/05/24	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°1	17/01/24	N°2	15/05/24	N°3	24/07/24	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACION:	**8 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

2.2.1 ACTIVIDADES TECNICAS:

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Funciones y/o Actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores del municipio de Piedecuesta.
- Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término establecido por la Entidad.
- Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad y cuando sea el caso, actualización de las pólizas que lo requieran.
- Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
- Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes.
- Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.
- Asistir a las reuniones y los comités de técnicos realizados por el Municipio.
- Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Municipio y de los entes de control.
- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo a los documentos que soportan el presente proceso contractual.
- Colaborar con el Municipio en cualquier requerimiento que el haga.

- Dar a conocer al Municipio cualquier circunstancia que indirecta o directamente puede tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecución del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratación, y la oferta presentada.
- Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para la revisión y aprobación del supervisor del Municipio, como requisito de ejecución del contrato.
- Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá vincular laboralmente mediante contrato de trabajo el personal ofrecido.
- Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
- Atender de forma permanente la dirección del contrato.
- Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
- Garantizar las normas de seguridad industrial para todo el personal del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato. b) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
- Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.

- Llevar una bitácora del contrato de obra vigilado, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrolle de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Municipio y los entes de control.
- Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico y financiero al Municipio de Piedecuesta para la resolución final de las mismas adjuntando los respectivos soportes.
- Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., requeridas por el contratista de obra, y emitir un concepto técnico previo debidamente soportado, al respecto al Municipio de Piedecuesta.
- En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contratista de obra, el Interventor deberá enviar al Municipio de Piedecuesta (Oficina Gestora) copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia de la Compañía Aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho incumplimiento.
- Elaborar, suscribir y presentar al Departamento las respectivas actas parciales de la obra vigilada.
- Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y acta final del contrato.

- Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo contener a) avance de cada una de las actividades programadas b) registros fotográficos de avance de obra vigilada, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance en periodo de por lo menos quince días. c) resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. d) Fotocopia de la bitácora e) resumen de las actividades realizadas en el mes f) relación del personal empleado en la ejecución del contrato g) informe de seguridad industrial h) informe de manejo ambiental i) actualización del programa de ejecución k) acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
- Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y contener como mínimo: a) resumen de actividades y desarrollo del contrato debidamente soportado b) registro fotográfico definitivo c) acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. d) paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
- Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración

de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio.

- Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

  Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los documentos soportes del proceso.

2.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- El residente de Interventoría está a cargo de llevar la bitácora o libro de obra, donde se registra a diario las condiciones climáticas, el personal, el equipo empleado en obra y las actividades realizadas, así como las comunicaciones, comentarios y/o requerimientos tanto del contratista de obra como la interventoría.
- La interventoría realiza el seguimiento al programa de trabajo del contratista para el periodo en ejecución.
- La interventoría realiza el acompañamiento ambiental y con base en las observaciones de campo solicita la toma de acciones preventivas y correctivas para dar cumplimiento al PMA.
- La interventoría realiza la gestión administrativa relacionada con los especialistas, proveedores, insumos, documentación contable, estados financieros, afiliación del personal de interventoría a los sistemas de seguridad integral, pago de salarios del personal, novedades de personal, etc.

- Vigilar que el personal empleado por el contratista de obra esté debidamente afiliado a los sistemas de seguridad social integral. Además, se realiza el control de idoneidad y las novedades de personal del mismo.
- La interventoría ha mantenido una comunicación constante con el contratista de obra y la entidad contratante a través de la supervisión.
- El equipo de interventoría lleva el archivo correspondiente al contrato de Interventoría No. 2622 de 2019.
- La interventoría vela por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- La interventoría gestiona la inspección de la calidad de los materiales y calidad de las obras generadas que lo ameriten mediante ensayos y pruebas de laboratorio.
- El ingeniero Residente de Interventoría lleva registro fotográfico diario para evidenciar el avance de las actividades ejecutadas.
- La interventoría realiza el control de calidad de los productos manufacturados en obra a través de la toma de muestras para ensayos de laboratorio.
- La interventoría realiza la afiliación de su personal y el respectivo pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral.

2.2.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- La Interventoría verifica que se realizan las obras de acondicionamiento de drenaje para el manejo de aguas de escorrentía en el trazado de la malla vial de los diferentes sectores enmarcados dentro del proyecto.

- Se evidencia que el contratista ha seguido las indicaciones de la interventoría y ha realizado el acondicionamiento de sitio de acopio de material de obra.
- Durante los constantes recorridos de obra se realiza la inspección de elementos de protección personal en los trabajadores vinculados al proyecto
- Se verifica la instalación de lona verde con fines de aislar área de intervención del proyecto con predios vecinos.
- La interventoría manifiesta al contratista que previa remoción de especies arbóreas que impliquen aprovechamiento forestal, se debe contar con la resolución de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) que indica el número de árboles a talar y reubicar y las respectivas consideraciones de compensación.
- Se comunica al contratista que se encuentra prohibida la realización de cambios de aceite y reparación de maquinaria al interior del área del proyecto. Estas actividades deberán ser ejecutadas en sitios o talleres especializados.
- Se deberán realizar capacitaciones diarias al personal vinculado al proyecto, enfocando las charlas en temas medioambientales, de seguridad en el trabajo y salud ocupacional.
- Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental presentado por el contratista de obra, el cual se evalúa por medio de sus fichas técnicas. Ver Anexo.

2.2.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Verificar resultados de las pruebas y ensayos efectuados a control de materiales, maquinaria y equipo.
- Aprobar la calidad del personal.
- Verificar la cantidad y calidad de la señalización preventiva.
- Verificar el cumplimiento de la seguridad industrial y social.
- Efectuar el control de pólizas
- Revisar el cumplimiento del programa de trabajo.

2.3 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA

2.3.1 PERSONAL

Director de Interventoría	50%	MILTON VILLARREAL
Residente de interventoría	100%	ALVARO SOLANO
Residente de interventoría	100%	LUZ ANGELA JARAMILLO
Ingeniero Auxiliar	100%	DIEGO HERRERA
Ingeniero Auxiliar	100%	MARLON LOPEZ
Profesional HSEQ/SISO	100%	ANA DELIA RESTREPO
Topógrafo	100%	RONALD REYES
Cadenero	100%	SEBASTIAN SUAREZ
Cadenero	100%	IRIANA LIZARAZO

2.4 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. **Póliza N°** 96-44-101185984

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA APROBADA	
			Desde DDMMAA	Hasta DDMMAA
96-44-101185984	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$35,317,335.70	15/11/2023	9/03/2025
96-44-101185984	SALARIOS	$35,317,335.70	15/11/2023	9/09/2027
96-44-101185984	CALIDAD DEL SERVICIO	$70,634,671	26/01/2024	26/01/2029

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se evidencia un avance de ejecución del 63.71% en la ejecución del contrato, a la fecha debería tener un 80% de avance, se aclara que en todo el país se ha presentado una ola invernal lo que ha dificultado la realización de las labores en obra por parte del contratista de obra.

2. La INTERVENTORÍA, realiza el seguimiento y control de las actividades de obra ejecutadas por el contratista, para el periodo comprendido entre el 15 DE MAYO DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024 Y DEL 24 DE JULIO DE 2024 AL 8 DE AGOSTO DE 2024, garantizando que las mismas sean ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas de construcción y de calidad, además se realiza las actividades técnicas, administrativas y financieras relacionadas al seguimiento del flujo de caja, a nivel semanal de la línea base del presupuesto de obra, así mismo, valida y verifica la idoneidad del personal contratado. De igual forma,

verifica que el contratista se encuentra al día en pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales del presente periodo.

3. La interventoría verifica que el contratista cuente tanto con la maquinaria y equipo como con el personal mínimo de trabajo requerido. La interventoría garantiza que se ejecuten adecuadamente las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales por parte del contratista con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. A la fecha las pólizas tanto del contrato vigilado como el contrato de interventoría están actualizadas y se encuentran vigentes.

ING. LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
R/L GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
GRUCOING S.A.S.

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5464777 – OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."



INFORME TOPOGRAFICO INTERVENTORIA No. 4

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DE MAYO 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024 Y 24 DE JULIO DE 2024 Y 8 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATISTA: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
R/L LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ

CONTENIDO

1. **INTRODUCCION** 4
2. **OBJETIVO** 4
4. **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** 6
5. **DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES** 7
6. **EQUIPOS TOPOGRAFICOS** 9
7. **SOFTWARE UTILIZADO PARA LOS CALCULOS** 9

Para procesar la información tomada en campo se utilizaron los siguientes Software: 9

7.1.1 TOPCON LINK se utiliza para el procesamiento de las coordenadas de los puntos radiados. 9

7.1.2 AUTOCAD CIVIL 3D Para generar planos 9

7.1.3 AUTOCAD CIVIL 3D Para generar los planos 9

7.1.4 TOPCON TOOLS Descarga y postprocesos datos GPS milimétrico 9

8. **CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN** 10
9. **REGISTRO FOTOGRAFICO** 14

IMAGENES

Imagen 1Localización de Piedecuesta-Santander (fuente Wikipedia archivo Colombia). 6
Imagen 2 Localización frente Paseo del Puente (fuente Google Earth). 6
Imagen 3 Localización frente Cabecera (fuente Google Earth). 7
Imagen 4 Nivelación de estructuras (fuente propia). 14
Imagen 5 Levantamiento planimétrico (fuente propia). 14
Imagen 6 Replanteo Zona de juegos infantiles (fuente propia). 15
Imagen 7Nivelación estructuras (fuente propia). 15
Imagen 8 Nivelación graderías (fuente propia). 16
Imagen 9 Control de excavaciones (fuente propia). 16
Imagen 10 Control instalación de base (fuente propia). 17

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo documentar las actividades de control topográfico realizadas en los frentes de trabajo asignados a la empresa contratista **CONSORCIO DEPORTIVO PTA**. Estos frentes de trabajo están ubicados en el municipio de Piedecuesta Santander en los barrios Cabecera y Paseo del Puente, donde se ejecutarán labores de demolición y construcción de varias canchas deportivas, cerramientos perimetrales, un sistema de alcantarillado para aguas lluvias, sistemas de drenaje de las canchas, así como la creación de una zona de juegos infantiles y senderos peatonales.

El control topográfico es esencial para garantizar la precisión y calidad de las obras a ejecutar, asegurando que los trabajos de demolición y construcción se realicen conforme a los planos y especificaciones técnicas previamente establecidos. En este contexto, el presente documento detalla las metodologías empleadas, los resultados obtenidos, y las recomendaciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades mencionadas.

2. OBJETIVO

El objetivo general de este informe es proporcionar un registro detallado y preciso de las actividades de control topográfico realizadas en los frentes de trabajo asignados, con el fin de asegurar que las obras de demolición, construcción de canchas, cerramientos, sistemas de alcantarillado, drenaje, áreas de juegos infantiles y senderos peatonales se ejecuten conforme a los

planos y especificaciones técnicas establecidas. Este control topográfico es fundamental para garantizar la alineación, nivelación y ubicación adecuada de todas las estructuras y sistemas a implementar en el proyecto.

3. ALCANCE

El alcance de este informe incluye:

1. Revisión y Validación de Planos: Verificación de los planos topográficos y constructivos, asegurando que estén actualizados y reflejen con precisión las condiciones del terreno y los requerimientos del proyecto.

2. Control de Demoliciones: Supervisión topográfica de las actividades de demolición para garantizar que se realicen dentro de los límites establecidos y que se mantenga la seguridad estructural de las áreas circundantes.

3. Implantación y Control de Obra: Marcación y control de las estructuras a construir, como canchas, cerramientos, sistemas de alcantarillado y drenaje, asegurando su correcta ubicación y nivelación.

4.Monitoreo Continuo: Realización de levantamientos topográficos periódicos durante la ejecución de las obras para detectar y corregir posibles desviaciones, garantizando la adherencia a los planos y especificaciones.

5.Documentación y Reporte: Elaboración de planos y reportes topográficos que reflejen el progreso de la obra y cualquier modificación o ajuste necesario, sirviendo como registro oficial para la toma de decisiones en el proyecto.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.", se encuentra localizado en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 19 km. Ubicada en el casco urbano del municipio. La ubicación del proyecto se ilustra en las imágenes 1, 2 y 3.

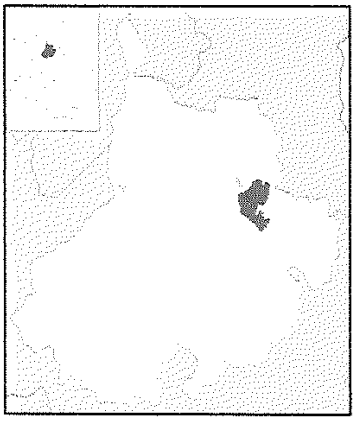


Imagen 1Localización de Piedecuesta-Santander (fuente Wikipedia archivo Colombia).

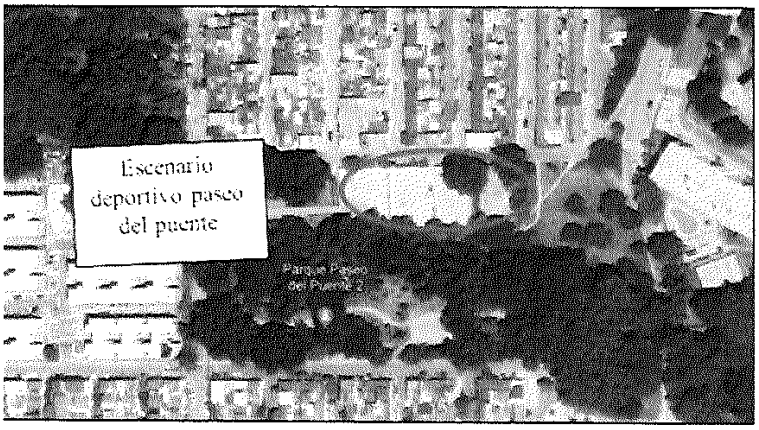


Imagen 2 Localización frente Paseo del Puente (fuente Google Earth).

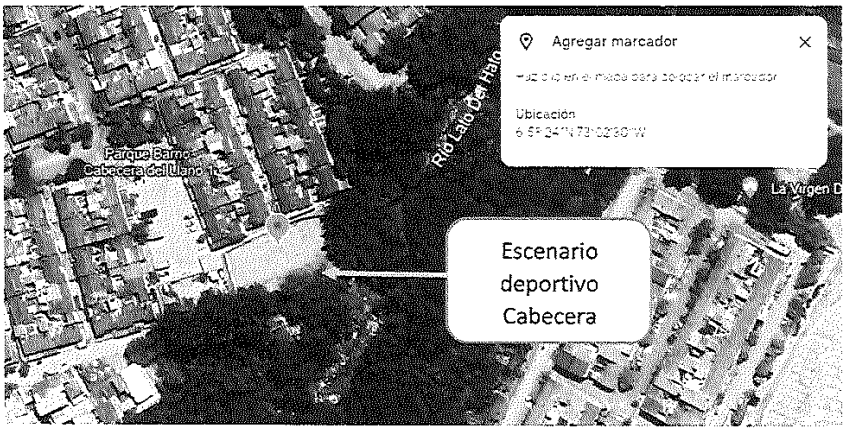


Imagen 3 Localización frente Cabecera (fuente Google Earth).

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

En el periodo del **15 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2024 Y DEL 24 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2024**, se realizan acompañamiento a las actividades en Paseo del Puente como localización y replanteo, control de niveles en excavaciones para zapatas, cajas de inspección y tubería de alcantarillado de aguas lluvias, replanteo de canchas, verificación de niveles de estructuras de pavimento etc. En el sector de Cabecera del llano se hace control de excavación para conformación de subrasante de la cancha de arena, y localización y replanteo de filtros, control de la localización de estructura de entrega del sistema de aguas lluvias (descoles), y nivelación de los elementos estructurales para cerramiento, gradería y zona de juegos infantiles

En los escenarios de paseo del puente, se realiza la localización y replanteo de muros perimetrales, y su vez se localizan las zapatas correspondientes, para esto se controla el nivel de excavación y posterior a esto se indican los niveles para fundidas de solado y zapatas de los muros, así como su alineación.

Se realiza la localización y replanteo de la tubería de aguas lluvias, se hace el control de excavación, nivelación y alineación de la tubería para la instalación.

En el escenario deportivo de cabecera se realiza el control de niveles para la conformación de la subrasante, se realiza la localización y replanteo de los filtros para la instalación.

Para los informes anteriores se utilizaron los parámetros nombrados a continuación donde se comprobaron los datos expuestos en las carteras de campo e informes dando un visto bueno a los datos depositado en cada uno de ellas, donde se verificaron tramos de excavación, volúmenes de excavación, llenos, chequeos de pendientes cotas, eje, bordes, terminados, cantidades de material para los escenarios deportivos entre otros ítems.

Para algunas comprobaciones se utilizarán deltas o puntos georreferenciados comprobados para ser utilizados como amarre de inicio y empezar las comprobaciones. Estos puntos fueron puestos por la contratista y comprobados por la interventoría.

Ya con estas coordenadas se realizaron comprobaciones de anchos y profundidades de excavación como también los chequeos de las cotas de batea en los ejes de excavación, tramos de excavación, volúmenes de excavación, llenos, chequeos de pendientes, cotas, eje, bordes, terminados de sardineles placa de contrapiso canchas nuevas.

Estas comprobaciones hicieron en campo amarrados a estas coordenadas anteriormente nombradas utilizando una **estación total marca Stonex R1 plus** y un nivel de precisión marca Stonex.

También se revisan todas las carteras presentadas por la contratista, y se hace el mismo ejercicio creando los archivos en DWG y PDF para comprobar áreas de excavación.

Se comprobaron carteras hechas por la contratista, distribuidas con los siguientes parámetros:

- Carteras de campo y diseño
- Datos de volúmenes
- Datos de excavación
- Terminados de sardineles

6. EQUIPOS TOPOGRAFICOS

- Estación total Topcon GTS-246 NW
- Nivel automático Topcon AT-B4
- Computador Portátil
- Accesorios y herramientas menores

7. SOFTWARE UTILIZADO PARA LOS CALCULOS

Para procesar la información tomada en campo se utilizaron los siguientes Software:

7.1.1 TOPCON LINK se utiliza para el procesamiento de las coordenadas de los puntos radiados.

7.1.2 AUTOCAD CIVIL 3D Para generar planos.

7.1.3 AUTOCAD CIVIL 3D Para generar los planos.

7.1.4 TOPCON TOOLS Descarga y postprocesos datos GPS milimétrico

8. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

TIENDA TOPOGRAFICA
NIT. 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA	VERSION 1
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Bucaramanga 18/JULIO/2024 Nº 0953

EQUIPO: *NIVEL AUTOMATICO* MARCA: TOPCON REF: AT-B4 No *XS4986*

EMPRESA: **GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS** NIT: 830.509.427 - 9 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCION: Calle 32 No. 8 – 41 Barrio Cañaveral Oriental

TELEFONO: 3176446297

NUEVO SI ☐ NO ■

Certificado vigente hasta: 18 DE ENERO/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

DIAGNOSTICO Y AJUSTE

Base Nivelante	X	X		X
Giro del Instrumento	X	X		X
Movimiento Lento	X	X		X
Retículo		X		X
Compensador				X
Enfoque de Perilla	X	X		X
Lente Objetivo		X		X
Lente interno		X		X
Nivel circular		X		X

1. Cambio de Grasas 2. Ajuste y/o limpieza 3. Requiere Cambio 4. Correcto

Nota: el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema

Cambio de Repuestos SI ☐ NO ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Firma Autorizada

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
0953

TIENDA TOPOGRAFICA
NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS. BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA	VERSION 1
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS)	FECHA DE EMISION: 01-01-2018
		DOCUMENTO CONTROLADO

Nº 0953

La Verificación se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

TEST DE EXACTITUD RETICULO HORIZONTAL
LECTURA EN LINEA DE 26M

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):***

	A
P1	6.235
	6.235
ERROR	0.000mm

TEST DE EXACTITUD RETICULO VERTICAL
LECTURA EN LINEA DE 26M

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):***

P1	6.789
P2	6.789
ERROR	0.000mm

ERROR DETECTADO 8 MM CORREGIDO A 1MM

PARÁMETRO O COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO
Sensibilidad nivel circular (/2mm)	8'	X	
Precision a 30m/100ft(mm/m)	2,5	X	
Precisión del nivel automático	0.3"	X	
Rango de Compensación	(+-) 15'	X	
Campo de Visualización	1º 30'	X	
Mínimo Enfoque (m / ft.)	0.5 / 1.6	X	

Nota: Los ajustes realizados al nivel están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de cierre permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

EQUIPO: *NIVEL AUTOMATICO* **MARCA:** TOPCON **REF:** AT-B4 **No:** X54986

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

FLORIDABLANCA: Calle 108 #33°26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
0953

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	VERSION 2
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Bucaramanga [illegible]

EQUIPO: ESTACION TOTAL MARCA: TOPCON REF: GTS-236NW No: V20519

EMPRESA: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS NIT: [illegible] CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCION: Calle 32 No. 8 – 41 Barrio Cañaveral Oriental

TELEFONO: 3176446257

NUEVO SI [ ] NO [X]

Certificado vigente hasta: 18 DE ENERO/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para este clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía

DIAGNOSTICO Y AJUSTE

DESCRIPCION	1	2	3	4	DESCRIPCION	1	2	3	4
Base Nivelante	X			X	Lente Interno			X	X
Nivel Circular y Tubular				X	Base de Retículo			X	X
Movimiento Horizontal				X	Retículo			X	X
Movimiento Vertical				X	Objetivo				X
Freno Horizontal				X	Verticalidad			X	X
Freno Vertical				X	Operación				X
Limpieza				X	Revisión de Teclado			X	X
Ajuste prismas				X	Programación de Parámetros			X	X
Revision Batería				X	Entrada y Salida de Datos				X
Revision Cargador				X					

1. Cambio de Grados 2. Ajuste y/o limpieza 3. Reemplazo Cambio 4. Corregido

Nota el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema

Cambio de Repuestos SI [ ] NO [X]

Cuales

Observaciones o Recomendaciones

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S
Firma Autorizada

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	VERSION 2
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

La verificación se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL Y VERTICAL

Datos tomados a *(Colimador SOUTH F420 «ITA Serie:E120663)*:

	A HORIZONTAL		A VERTICAL
P1	0°00'00"	P1	269°58'49"
P2	180°00'00"	P2	90°03'10"
ERROR	00°00'00"	ERROR	00°00'01"

TOLERANCIA DE ERROR PERMITIDO POR EL FABRICANTE ES DE 4 SEGUNDOS

ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION DEL EQUIPO				ERROR CORREGIDO Y CALIBRADO EL EQUIPO			
Posición 1 (Vertical D)	89	58	00	Posición 2 (Vertical D)	90	58	32
Posición 1 (Horizontal D)	0	00	00	Posición 2 (Horizontal D)	00	00	00
Posición 1 (Vertical I)	269	01	58	Posición 2 (Vertical I)	269	01	29
Posición 1 (Horizontal I)	180	00	00	Posición 2 (Horizontal I)	180	00	00
Error Observado V	0	00	00	Error Observado V	0	00	1
Error Observado H	0	00	00	Error Observado H	0	00	00

INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE (DISTANCIOMETRO) COND. 23° P. ATM 763MMHG CON. PRISMA -30					
ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION			ERROR CORREGIDO Y CALIBRACO EL EQUIPO		
DISTANCIA	MEDIDO	ERROR	DISTANCIA	MEDIDO	ERROR
5 MTRS	5.002	2MM	5 MTRS	5.000	----
10 MTRS	10.002	2MM	10 MTRS	10.000	----
100 MTRS	100.002	2MM	100 MTRS	99.999	1MM

Nota: Los ajustes realizados a la estación están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de error permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, la estación teórica garantizado por el fabricante.

EQUIPO: ESTACION TOTAL MARCA: TOPCON REF: GTS-240W NO: V20519

LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas
Telso 3112685852- 3207361086 - 6362981
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADOS

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

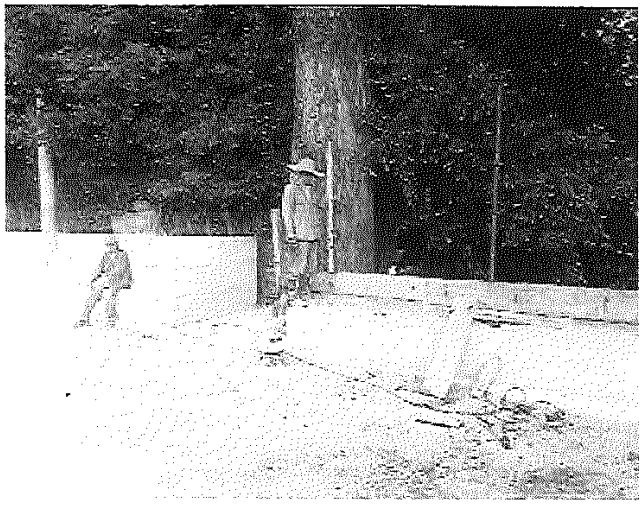


Imagen 4 Nivelación de estructuras (fuente propia).



Imagen 5 Levantamiento planimétrico (fuente propia).



Imagen 6 Replanteo Zona de juegos infantiles (fuente propia).



Imagen 7Nivelación estructuras (fuente propia).

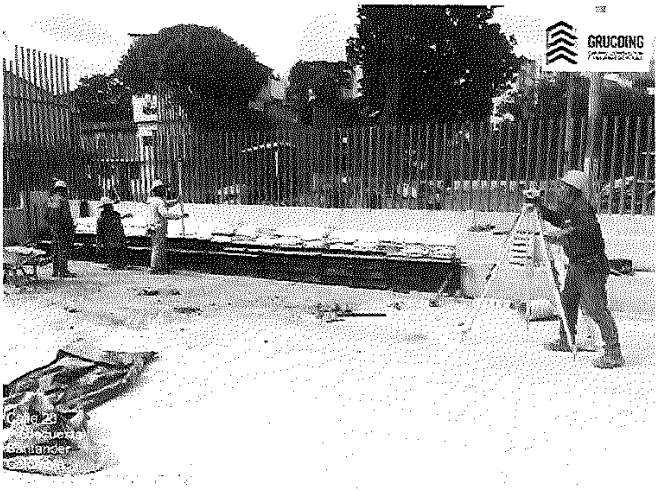


Imagen 8 Nivelación graderías (fuente propia).



Imagen 9 Control de excavaciones (fuente propia).

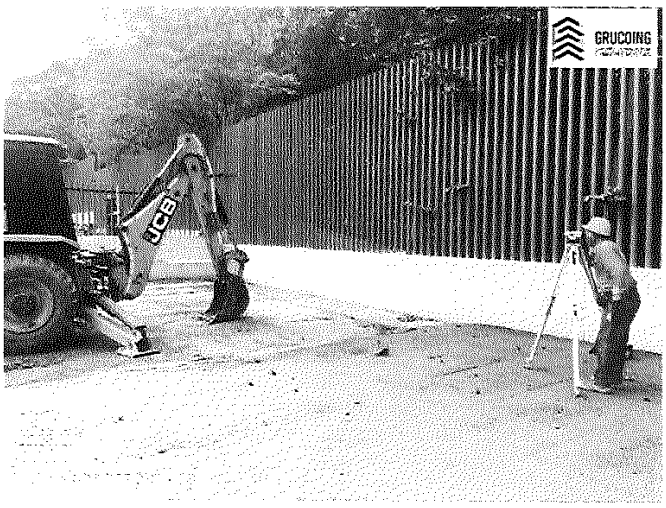


Imagen 10 Control instalación de base (fuente propia).

RONALD REYES RUEDA
TOPOGRAFO
LP 01-14730 CPNT

-05-24

Frente de obra Cabecera

personal: 1 Ing. Residente, 1 Hse, 1 Topografo, 2 operadores
1 Almacenista, 1 maestro de Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

equipo: 1 Miniretrocargador, Minicargador

Actividades

Armado de acero de refuerzo para adecuacion de graderias
encofrado para fundido primer tramo en concreto 3000 psi

Frente paseo del puente

personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 3 Of. varios
2 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 operadores

equipo: 1 Minicargador, 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador

Actividades:

Suministro instalacion tuberia 4 pulgadas Concho #1
Suministro e instalacion geotextil Concho #1
Construccion caja recoleccion aguas lluvias Concho #1
construcción de filtro frances, Excavación
en material comun para zanjas del alcantarillado
de aguas lluvias, instalación de tuberia
pvc novafort, relleno y compactación de
material seleccionado para zanjas de
alcantarillado, demoliciones de graderia existente
corte y figurado de acero para zarpa y
muro de cerramiento perimetral.

Firma

17-05-24 Frente de obra cabecera

personal: 1 Ing. Residente, 1 HSE, 1 Topografo, 2 operadores
1 Almacenista, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Mincargador

Actividades:
Armado de acero de refuerzo para adecuacion de graderias, encofrado y fundido segundo tramo en concreto de 3000psi

frente paseo del puente
personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 operadores
3 of. varios, 2 oficiales, 4 Ayudantes

equipos: 1 Mincargador, 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador

Actividades
- Armado de de aceros y colocacion de tubos para antepecho de cerramiento
Armado de aceros y encofrado para fundide de viga de cimentacion para cerramiento concreto 3000 psi, Excavación de material comun para cajas de aguas lluvias mezcla y fundida de concreto de 2500 psi para solado de zarpas y cajas, corte y Figurado de acero, cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones, Localizacion y replanteo de filtros, cajas dd sistema de drenaje.

Firmas Residente Interventoria

18-05-24

Frente de obra Cabecera

personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 HSE, 2 operadores 1 Almacenista, 1 maestro de obra, 1 Operador, 2 Ayudantes

equipos: 1 Minicargador, 1 minirretrocargador

Actividades:

Armado de acero de refuerzo para adecuacion de graderias encofrado y fundido en concreto de 3000 psi

Frente paseo del puente.

personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 Operadores 3, Of varios, 2 oficiales, 4 Ayudantes

equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador

Actividades

- Se continua el armado de aceros, encofrado y fundido en Concreto de 3000 psi de viga de cimentacion para graderia.
- armado de aceros y Colocacion de tubos Galv para antepecho en concreto de cerramiento
- mezcla y fundida de concreto de 2500 psi para Solado de zarpa en los muros perimetrales, nivelacion de excavacion para alcantarillado pluvial, instalacion de angulos para soporte de tuberia de cerramiento perimetral.

Firmas Residente Interventoria

20-05-24 Frente de obra cabecera

personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 HSE, 2 operadores
1 Almacenista, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

equipos: 1 Minirretrocargador, 1 Minicargador

Actividades:

- Construccio de encole para aguas lluvias, Armado de acero de refuerzo

frente paseo del puente

personal: 1 Ing. Residente, 3 Of Varios, 1 HSE, 2 operadores
1 Almacenista, 2 Oficiales, 4 Ayudantes

equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador

Actividades

- Se continua el armado de aceros, encofrado y fundido en concreto de 3000 psi de antepecho para escalonamiento
- Excavación de material comun para mejoramiento de subrasante en la cancha N°1, compactacion de subrasante, instalación de filtro tipo francés para drenaje de la cancha, instalación de bolo y relleno con base para mejoramiento de la estructura, retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones.

Firmas Residentes Interventoria

21-05-24

Frente de obra cabecera

personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 Hse, 1 Almacenista, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades:

- Se continua la construccion del encole para aguas lluvias

Frente de obra pasea del puente

personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 3 OF. Varios 2 Oficiales, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Minicargador, 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador.

Actividades

Se inicia armado de acero para antepechos divisorios entre concha #1 y concha #2 encofrado y fundida en concreto 3000 psi.

- Armado de acero encofrado y fundido de cercoma en concha #4 y 3

Figurado de acero para cimientos de graderia armado y encofrado de graderias de conchas 2 y 3 Sintetica y asfalto, relleno de sacos con material comun para conformacion de graderias, fundida de concreto de 3000 psi para graderias

Firmas Residentes de interventoria

22-05-24 Frente de obra cabecera.

personal: 1 Ing. Residente, 1 topografo, 1 Hse, 1 Almacenista
1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades:
fundida en concreto de 3000psi de encole

Frente de obra pasea del puente.
- Armado de acero para antepechos divisorios entre cancha #2 y #3, encofrado y fundido en concreto 3000 psi

personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 3 Of varios
2 oficiales, 4 Ayudantes

equipos: 1 Minicargador, 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador

Actividades

Nivelación e instalación de base para mejoramiento de estructura en las canchas N° 2, 3 y 4,
Almacén, nivelación e instalación de tubería para cerramientos perimetrales y divisorios,
Retiro de material proveniente de las excavaciones relleno de costales e instalación para conformación de estructuras de las graderías en las canchas N° 2 y 3 sintetica y asfalto respectivamente
Excavación para carcamos de las cancha N° 2, 3 y 4.

Firmas residentes de interventoria

22-05-24

Frente de obra Cabecera

personal

Equipo

Actividades:

Aseo general frente de obra.

Frente de obra paseo del puente.

personal

Equipo

Actividades

- Armado de aceros para graderios cancha # 4.
- traida de material para graderias cancha #4

23-05-24

Frente Paseo del Puente

Personal: 1 Residente, 1 HSE, 1 Almacenista, 1 Topografo
1 Aux. de topografia, 1 maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes
2 operadores

Equipos: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador
y Herramienta menor

Actividades: figurado de Acero, encofrado de graderias
cancha N°4, relleno y compactación de base en
la zona de graderias cancha N°4, fundido de
concreto graderias cancha N°4

Frente Cabecera

Personal: 1 Residente, 1 Almacenista, 2 operadores

Equipos: 1 mini retrocargador, 1 minicargador

Actividades: En este frente no se realizaron actividades

Firma Residentes Interventoria

Anymarmendoz

24-05-24 Frente Pasco del Puente

Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSE, 1 Almacenista
1 Topografo, 1 Aux de topografia, 1 maestro de Obra
3 Oficiales, 5 Ayudantes, 2 operadores

Equipos: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador
y Herramienta menor

Actividades: Relleno e instalación de sacos para conformación de graderias, figurado de acero, fundida en concreto graderias cancha N°4

Frente Cabecera

Personal: 1 Residente de Obra, 1 Almacenista, 2 operadores
1 Topografo

Equipos: 1 minirretrocargador, 1 minicargador

Actividades: En este frente no se realizaron actividades

Firma Residentes Interventoria

Anymarmendoz

25-05-24 Frente Pasco del Puente


Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSE, 1 Almacenista
1 Topografo, 1 Aux de topografia, 1 maestro de Obra
3 Oficiales, 5 ayudantes, 2 operadores

Equipos: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador
y Herramienta menor

Actividades: Desencofrado de formaleta metalica, corte de concreto para dilatación en graderias cancha N°4, relleno de costales con tierra para conformación de graderias cancha N°3, se finaliza la jornada

	con señalización, orden y aseo.
	Frente Cabecera
	Personal: 1 Residente de Obra, 1 topografo
	1 Almacenista, 2 operadores
	Equipos: 1 minirretrocargador, 1 mincargador
	y Herramienta menor.
	Actividades: Excavación de terreno natural
	para cimentación de zona de juegos
	infantiles, figurado de acero para viga
	y antepecho de cerramiento de zona de
	juegos infantiles.
	Firma Residentes Interventoría
27-05-24	Frente Paseo del Puente
	Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSE, 1 Almacenista
	1 Topografo, 1 Auxiliar de topografia, 1 maestro de Obra
	3 Oficiales, 5 Ayudantes, 2 operadores.
	Equipos: 1 Retrocargador, 1 mincargador, 1 Vibro-
	compactador y Herramienta menor.
	Actividades: Relleno de sacos para conformación
	del terreno en la graderia de la cancha N° 3,
	Excavación, relleno, compactación, instalación de
	malla electrosoldada para la placa de paso
	entre la graderia y el cárcamo de la cancha
	N°1; Nivelación y replanteo de la zarpa
	de muro perimetral para realizar mezcla y
	fundida de concreto de 2500 psi para solado,
	Instalación de rejillas prefabricadas en el
	carcamo de la cancha N° 3
	Frente Cabecera
	Personal: 1 Residente de Obra, 1 Topografo,
	2 Operadores, 1 Almacenista.


Equipos: 1 minirretrocargador, 1 minicargador y Herramienta menor
Actividades: Fundida de ciclopeo para mejoramiento de la cimentación de zona de juegos infantiles



Andamiero(a)

28-05-24 Frente Paseo del Puente
Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSE, 1 Almacenista 1 Topografo, 1 Aux de topografia, 1 maestro de obra 3 Oficiales, 5 ayudantes, 2 Operadores
Equipos: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibro compac y Herramienta menor
Actividades: Iniciamos con charla de seguridad por parte de HSE (Prevención del acoso laboral). encofrado de graderia de la cancha N°1, Fundida de graderia cancha N°3, fundida de zarpa muro perimetral cancha N°4, placa piso entre la graderia y el carcamo de la cancha N°4.

Frente Cabecera
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Topografo, 2 operadores 1 Almacenista
Equipos: 1 minirretrocargador, 1 minicargador y Herramienta menor
Actividades: fundida de muro perimetral de la zona de juegos infantiles



Andamiero(a)

29-05-24 Suspensión de actividades

24-07-24	Frente Pasco del Puente
Reinicio de Actividades	Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 HSE, 1 Topografo 1 Auxiliar de topografía, 1 Almacenista, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 5 Ayudantes, 3 auxiliares 2 operadores.
	Equipos: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompa y Herramienta menor
	Actividades: Demolición graderia cáncha N°4 (Arena) excavación y fundida de concreto 3000 psi para viga de amarre, fundida de concreto de 3000 psi para graderia cancha N° 2, Excavación de zarpa perimetral cancha N°4, mezcla y fundida de concreto de 2500psi para solado de la zarpa cancha N°4
	Frente Cabecera
	Personal: 1 Ingeniero residente, 1 Topografo 2 operadores, 1 Almacenista
	Equipos: 1 minirretrocargador, 1 minicargador
	Actividades:
	Excavación de material comun para mejoramiento de terreno en la zona de los juegos infantiles, retiro de material proveniente de excavaciones, relleno, aplicación y nivelación de base para mejoramiento de estructura en la zona de juegos infantiles
	Anyuriabia

25-07-24 Frente Paseo del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 HSE, 1 Topografo, 1 Aux de topografia, 1 Almacenista, 1 Maestro de Obra, 3 oficial 4 Ayudantes, 3 Of. Varios, 2 operadores

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargad

Actividades: Excavación de terreno natural en cancha N°1 para instalación de filtros y mejoramiento de la estructura con base, Retiro de material, Instalacion de rejillas prefabricadas en los carcamos de las anchos N° 2, 3 y 4, Fundida de placa piso cancha sintetica.

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 2 operadores, 1 Almacenist 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Desmonte de cerramiento existente para reposicion y refuerzo estructural, instalacio de tuberia de cerramiento perimetral zona de juegos infantiles, excavación de material comun para zanja de alcantarillado pluvial zona de juegos infantiles.

Anymarcaldiaz

Firma Residente de Interventoria

26-07-24

Frente Paseo del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 topografo, 1 Almacenista
3 Of. Varios, 2 Operadores, 1 Maestro de Obra
2 Oficiale, 4 Ayudantes, 1 HSE.

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador
1 Retrocargador

Actividades: Instalación de malla electro - soldada y fundida de placa para piso en concreto de 3000psi en zona de juegos infantiles, nivelación de base en las canchas N° 3 y 4 de asfalto y compactación de la misma.

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista
2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipos: 1 Minirretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Retiro de material, charla de seguridad por parte de HSE, instalación de tubería novafort para drenaje de zona de juegos infantiles, relleno de zanja con material seleccionado.

Programadora

Firmas Residentes Interventoría

27-07-24 Frente Paseo del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 topografo, 1 Almacenista 3. Of varios, 2 operadores, 1 Maestro de Obra 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 HSE

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador 1 Retrocargador

Actividades: Corte de concreto para generar dilataciones en las placas de la cancha sintetica, Excavación y retiro de material para adecuación de zonas verdes entre las canchas #3 y 4 de asfalto, se presentan lluvias durante toda la tarde

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 Operadores 1 oficial, 1 Ayudante

Equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Jornada de aseo y limpieza, en la tarde se presentan lluvias, el profesional HSE realiza charla de seguridad sobre el buen manejo de los EPP y hace recomendaciones de trabajo en zonas con presencia de agua.

Andrea Diaz

Firmas Residentes Interventoria

29-07-24

Frente Pasco del Puente:

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 Almacenista
3 of. varios, 2 operadores, 1 Maestro de Obra
2 oficiales, 4 Ayudantes, 1 HSE

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador
1 Retrocargador, 1 Finisher

Actividades: limpieza de las cancha N°: 3 y 4
aplicación de imprimación en las canchas
N°: 3 y 4; instalación de asfalto en la
cancha N°: 4 y compactación del mismo;
corte de concreto para generar dilataciones
en la placa de la zona de juegos
infantiles

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing Residente, 1 Almacenista, 2 operadores
1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Instalación de refuerzo
para las mallas, charla de seguridad por
parte de HSE

* En el frente de Pasco del puente de realizo
la instalación del cordon de dilatacion
en la zona de juegos infantiles.

Ing. Ayman Diaz

30-07-19

Frente Paseo del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 Almacenist
3 of. varios, 2 operadores, 1 maestro de Obra
2 oficiales, 1 Ayudantes, 1 HSE

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador
1 Retrocargador, 1 Finisher

Actividades: Instalación y compactación de asfalto en la cancha N° 3, jornada de orden y aseo

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 operadore
1 oficial, 2 Ayudantes

Equipos: 1 Minirretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Retiro de material y jornada de aseo, instalación de malla electrosoldada en zona de juegos infantiles, charla de seguridad por parte de profesional HSE excavación en material común para construcción de carcamo en la zona de juegos infantiles, encofrado de formaleta y figurad e instalación de acero para el carcamo.

Anymar Maldiaz

Firmas Residentes Interventoria

U40

31-07-24	Frente Paseo del Puente
	Personal = 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 HSE 1 Almacenista, 3 Of. varios, 2 operadores 1 Maestro de Obra, 2 oficiales, 4 Ayudantes
	Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador 1 Retrocargador
	Actividades: Descargue de juegos infantiles descargue de materiales, instalación de rejillas para carcamos, excavación y nivelación de terreno frente a las canchas para mejoramiento de espacio publico.
	Frente Cabecera
	Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo 1 Almacenista, 2 Operadores, 1 oficial, 2 Ayudante
	Equipos: 1 Minirretrocargador, 1 Minicargador
	Actividades: Excavación de material comun, instalación de tubería de pvc para manejo de aguas lluvias, relleno y compactación de material seleccionado.

Firma Residentes Interventoria

1-08-24 Frente Basco del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista
2 operadores, 3 op. varios

Equipos: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador,
1 Retrocargador

Actividades: Adecuación de sendero peatonal
frente a las canchas

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 1 Almacen
2 Operadores, 1 maestro de obra, 2 oficiales
4 Ayudantes, 1 HSE

Equipos: 1 Miniretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Fundida de concreto de 3000 psi
para placa de piso de zona de juegos infantiles

Arq Manuel Diaz

Firma Residentes Interventoria

2-09-24

Frente Pasco del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 operadores 3 Of. varios, 1 Topografo

Equipos: 1 Retrocargador, 1 Minicargador 1 Vibrocompactador

Actividades: limpieza y adecuación de tubería del cerramiento perimetral demarcación de colores para iniciar el proceso de pintura, localización y replanteo de arcos en las canchas 3 y 4 de asfalto

Frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista 2 operadores, 1 maestro de obra, 1 oficial 4 Ayudantes, 1 HSE

Equipos: 1 Minirretrocargador, 1 Minicargador

Actividades: Iniciamos con charla de Seguridad por parte de HSE "higiene postural", continuamos con actividades de corte de concreto para generar dilataciones, excavación y fundida de concreto para viga de cimentación y caja de aguas lluvias, iniciamos con pintura de malla

Firma Residentes Interventoría

3-08-24 Frente Rastro del Puente

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 operadore
3 oficiales, 1 topógrafo

Equipos: 1 Retrocargador, 1 Minicargador
1 Vibrocompactador

Actividades: Descargue de Arcos, continuamos con actividades preliminares de pintura de cerramiento perimetral como limpieza y lijado

frente Cabecera

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Almacenista, 2 operadore
1 Oficial, 1 maestro de obra 4 Ayudantes

Equipos: 1 Minicargador, 1 Miniretrocargador

Actividades: figurado de acero para viga de cimentacion

Firma Residente Interventoria

INFORME HSEQ No. 04

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.5464777
INTERVENTORIA: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9
CONTRATO DE OBRA No. N°CO1.PCCNTR5450603
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS PTA

Responsable:
ING ZAYRA BAUTISTA VARELA
Profesional HSEQ Interventoría
GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
2024

INTRODUCCIÓN

Mediante contrato de interventoría se adjudicó a **"GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S". NIT 830509427-9** la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.**

Mediante contrato de obra **N°CO1.PCCNTR5450603**, se adjudicó a **CONSORCIO DEPORTIVOS PTA.**, el contrato para la "**CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**".

El presente documento corresponde al informe HSEQ N° 04, elaborado por la interventoría durante el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, el cual contiene las actividades de interventoría ejecutadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad en la construcción y remodelación de los escenarios deportivos paseo del puente y cabecera del municipio de Piedecuesta.

MARCO NORMATIVO

Constitución Nacional de Colombia 1991 - Congreso Nacional de Colombia - Rescata temas relacionados con la protección del medio ambiente y el derecho de la comunidad de gozar de un ambiente sano. Contiene la prohibición expresa de introducir al territorio Nacional sustancias Tóxicaso peligrosas.

Decreto Ley 2811 de 1974 - Presidencia de la República - *Por el cual se dicta el Código Nacional deRecursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual se regula el manejode los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.*

Ley 99 de 1993 - Congreso Nacional de Colombia - Ley General Ambiental de Colombia. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental,SINA.

Resolución 541 de 1994 - Ministerio del Medio Ambiente - Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y carga orgánica, suelo y subsuelo de excavación

Decreto 948 de 1994 - Presidencia de la República - Prohíbe el uso de combustibles contaminantes, particularmente de aceites lubricantes gastados y otros residuos considerados peligrosos.

Decreto 4741 de 2005 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT - *Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.*

Decreto 1072 de 2015 - Ministerio del Trabajo, *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.*

Decreto 1076 de 2015 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

Resolución 472 de 2017 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - *Por la cual se reglamentala gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD)y se dictan otras disposiciones.*

Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 "*Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones*".

Decreto 052 de 2017 - Ministerio del Trabajo - *Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición parala implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).*

Resolución 0312 de 2019 - Ministerio del Trabajo - *Por la cual se modifican los Estándares Mínimosdel Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.*

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo comprendido entre el 15 AL 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, el contratista Consorcio PTA, desarrollo dentro de su componente ambiental:

- Comisión topográfica
- Demolición de losa de concreto existente
- Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m.
- Demolición de antepecho en mampostería confinada
- Demolición de viga de cimentación de concreto reforzado
- Demolición de gradería de mampostería confinada con losa de concreto
- Demolición de mobiliario existente
- Excavación de material común
- Relleno con material seleccionado
- Replanteo manual de superficie
- Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3"
- Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000
- Suministro e instalación de base granular
- Losa de piso en concreto de 3000psi
- Suministro e instalación de malla electrosoldada

- Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica
- Suministro, trasporte e instalación manual de mezcla asfáltica.
- Vida de cimentación en concreto de 3000 psi para cerramiento
- Concreto de 3000 psi para graderías
- Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi
- Concreto 3000 psi antepecho para cerramiento
- Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálica
- Suministro e instalación de cerramiento en tubería
- Construcción de canal de aguas lluvias
- Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m
- Demolición de mampostería confinada
- Suministro e instalación de tubería perforada PVC 0=4"
- Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado 0=12"
- Suministro e instalación de arena para cimentación de tubería
- Caja de recolección de agua lluvias de 0.80m x 0.80m
- Concreto de 2500psi para solado
- Poso de inspección

ANEXO A. PASA CONSORCIO PTA

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

*De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del Decreto 2041de 2014), para el proyecto "***REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER***", no se requiere la expedición de licencia ambiental. No obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.*

Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento.

- **LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO**

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, la autorización para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y dado que las obras a desarrollar se encuentran contenidas en el POT y además son desarrolladas por la Entidad en cumplimiento de sus funciones, no necesitan la obtención de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 de 2015.

- **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar **"REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**, *no corresponde a una edificación y por lo tanto no se requiere licencia de construcción de acuerdo al Decreto 1077 de 2015.*

En la siguiente tabla se presentan los permisos ambientales requeridos para la ejecución del contrato.

Tabla 1. Permisos ambientales aplicables al proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	REQUIERE	
	SI	NO
ZONAS DE DEPOSITO		X
LICENCIA AMBIENTAL		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL		X
PODA RADICULARES	X	
PODA DE COPA	X	
CONCESIÓN DE AGUAS		X
OCUPACIÓN DE CAUCES		X
VERTIMIENTOS		X
EMISIONES		X

Para este periodo comprendido del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, no se realizaron actividades de obra, que requirieran de permisos y/o licencias ambientales.

- **ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO**
  - Comisión topográfica

- Demolición de losa de concreto existente
- Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m.
- Demolición de antepecho en mampostería confinada
- Demolición de viga de cimentación de concreto reforzado
- Demolición de gradería de mampostería confinada con losa de concreto
- Demolición de mobiliario existente
- Excavación de material común
- Relleno con material seleccionado
- Replanteo manual de superficie
- Suministro e instalación de bolo entre 1" y 3"
- Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000
- Suministro e instalación de base granular
- Losa de piso en concreto de 3000psi
- Suministro e instalación de malla electrosoldada
- Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica
- Suministro, trasporte e instalación manual de mezcla asfáltica.
- Vida de cimentación en concreto de 3000 psi para cerramiento
- Concreto de 3000 psi para graderías
- Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi
- Concreto 3000 psi antepecho para cerramiento
- Suministro e instalación de cerramiento en tubería metálica
- Suministro e instalación de cerramiento en tubería
- Construcción de canal de aguas lluvias
- Desmonte y retiro de malla eslabonada hasta una altura de 6.00m
- Demolición de mampostería confinada
- Suministro e instalación de tubería perforada PVC 0=4"
- Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado 0=12"
- Suministro e instalación de arena para cimentación de tubería
- Caja de recolección de agua lluvias de 0.80m x 0.80m
- Concreto de 2500psi para solado
- Poso de inspección

MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD)

Se verifico para el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto 2024, la realización de actividades técnicas generadoras de material de escombros, los cuales fueron dispuestos por el contratista en la escombrera OSSAS INGENIERIA y El CAIRO con documentación completa y aprobada como puede verse a detalle en la Tabla 3. Lista de proveedores/ Gestores de RCD.

Para la disposición final de los RCD durante el presente periodo, se verifica que dichos residuos sean dispuestos en los sitios autorizados con verificación de los recibos y certificados anexos.

Tabla 2. Consolidado de cantidad escombros metros cúbicos.

PERIODO	NOMBRE ESCOMBRERA	TOTAL
05/08/2024	OSSAS INGENIERIA	56 M3
01/05/2024	El CAIRO	883M3
05/08/2024	OSSAS INGENIERIA	224 M3
01/07/2024	El CAIRO	279 M3
TOTAL		1442 M3

El certificado de disposición final, se encuentra en gestión, motivo por el cual se vera reflejado en el siguiente informe.

Durante el presente periodo, se continuó verificando que los residuos de construcción y demolición (RCD) si permanecen acopiados por más de 24 horas, se encuentre adecuadamente señalizados mientras realizan evacuación al respectivo botadero.

Tabla 3. Lista de proveedores /Gestores de RCD.

SITIO	DOCUMENTO QUE PRESENTA	ENTIDAD
OSSAS INGENIERIA	Autorización vigente para funcionamiento de escombrera	Concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 11581 del 25-09-2009.
EL CAIRO	Autorización vigente para funcionamiento de escombrera	Según Acuerdo Municipal 100 del 30 de noviembre de 2010, contempla el predio "Lote 1 Saldo" donde se proyecta la "Escombrera El Cairo" identificado con Matricula Inmobiliaria 300-374035 y Código predial nacional N° 68307000000000020081000000000 (Código anterior: 68307000000020081000) es compatible para el desarrollo de actividades de disposición final de RCD o escombrera regional.

	Concepto de viabilidad ambiental botadero de tierra EL CAIRO	Según Res. CDMB No. 703 del 8 de agosto de 2018, se procederá a realizar la inscripción de Gestor de RCD como sitio de Disposición Final al predio denominado predio "Lote 1 Saldo" donde se proyecta la "Escombrera El Cairo", identificado con Matricula Inmobiliaria 300-374035 y Código predial nacional N° 68307000000000020081000000000 (Código anterior: 683070000000020081000) propiedad de la empresa INVERNOTA S.A.S.

Tabla 4. Indicador de manejo de residuos de demolición y construcción.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA
1. Disposición de Escombros	((Cantidad de escombros Generados/ Cantidad de escombros eliminados) * 100%) = (941/941) *100= 100%
2. Áreas de Almacenamiento Escombros	((Áreas de almacenamiento de escombros señalizadas/ Áreas de almacenamiento de escombros en obra) *100%) = (2/2) *100% = 100%
3. Áreas de escombros almacenados	((Áreas de escombros almacenados/ Áreas de escombros cubiertos) *100%) = (2/2) *100%= 100%

ANEXO B. CERT. DISPOCION Y APROBECHAMIENTO DE RCD

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS

Se cuenta con un punto ecológico fijo y rotativos (3 canecas de 55 gal y 1 residuos peligrosos) para el manejo de los residuos sólidos generados en la obra, frente paseo del puente - cabecera, con los siguientes códigos de colores de acuerdo a la Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019:

- Blanco: Residuos aprovechables. (plástico, cartón, vidrio papel, metales).
- Verde: Residuos orgánicos. (restos de comida, desechos agrícolas).
- Negro: Residuos no aprovechables. (papel higiénico, servilletas, papel y cartones contaminados concomida, papeles metalizados).

Residuos peligrosos (RESPEL): No se presentan producción de RESPEL dentro del proyecto durante la ejecución del presente periodo.

Las Disposición final de los residuos no aprovechables se realiza con la empresa municipal deservicio de aseo la Piedecuestana.

En la siguiente tabla se presenta el balance de los residuos sólidos generados durante el periodo.

Tabla 5. Balance de tipos de residuos generado en el periodo.

MES	APROVECHABLES (KG)	ORGÁNICOS APROVECHABLES	NO APROVECHABLES (KG)	PELIGROSOS (KG)
15/11/2023 al 14/12/2023	0	2.0	6.9	0
15-18/12/2023 al 17-14/01/2024	0	1.7	6.1	0
15/02/2024 al 14/03/2024	0	2.3	7.5	0
15-29/05/2024 y del 24/07/2024 al 08/08/2024	0	7.8	59.5	0
TOTAL	0	13.8	80	0

Para el presente periodo el contratista realizo entrega de bolsas de cemento vacías, las cuales se encontraban en almacenamiento temporal, al PROGRAMA DE SACOS VERDES de Cemento Argos S.A. las cantidades corresponden a 57kg las cuales se entregaron para su aprovechamiento mediante reciclaje en la industria de fibrocemento.

ANEXO C. CERT. ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO



Observación:
Punto ecológico Paseo del Puente



Observación:
Punto ecológico Cabecera

Tabla 6. Indicador de manejo de residuos sólidos.

INDICADORES PROGRAMA	FORMULA	CIFRAS
1. Residuos sólidos	(No. de charlas ambientales realizadas/No. De Charlas ambientales planeadas) *100	= (1/1)*100%= 100%
2. Residuos sólidos	(Kg de residuos dispuestos mensualmente /Kg de residuo generado) *100	(7.8/7.8) *100% =100%
3. Manejo adecuado de los residuos solidos	((Kg de Residuo recuperado o reciclado mensualmente/Kg de residuo generado) *100)	((59.5/59.5) *100%) =100%
4. Disposición adecuada de RS	Kg de residuos sólidos entregados a empresas autorizadas para su disposición final /Kg de residuos sólidos generados *100	((0/0)*100%)=100%

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS COMBUSTIBLE Y ACEITES

Se verifica la existencia de baterías sanitarias en los dos frentes de trabajo, así como la frecuencia de lavados semanales y la realización de alquiler de batería sanitaria por parte de la empresa RETCOR S.A.S.

No se presentan residuos de combustible o aceites durante el periodo, el arreglo de la maquinaria se realiza en zonas específicas donde no exista riesgo de derrames.

Se realiza la hidratación a través de distribución de bolsas de agua potable.

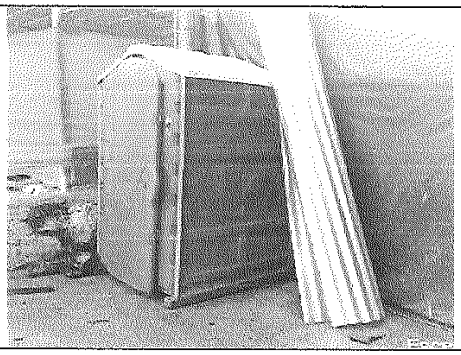
	
Observación: Limpieza de baños portátiles	Observación: Baño portátil

Tabla 7. Indicador de manejo de residuos sólidos.

INDICADORES PROGRAMA	FORMULA	CIFRAS
1. servicio de baños portátiles	(Número de baños instalados/número de baños necesarios)*100%	= (2/2) *100%
2. Limpieza de baños	(Número de limpiezas realizadas/ número de limpiezas programadas)*100%	= (3 SEM/3 SEM) *100%

Se presenta certificado correspondiente al periodo 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024;, en los cuales se refleja la instalación y mantenimiento realizado por **RETCOR S.A.S - EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S.** donde se evidencian los periodos de prestación de servicio, la cantidad de galones generados, la cantidad de baterías presentes por frente de obra, así como el número de visitas y la disposición final de las aguas residuales con la PIEDUCUESTANA de servicios públicos.



ANEXO D. DOC BATERIA SANITARIA

MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONCRETO

Para el presente periodo se inspecciono el ingreso de materiales de construcción como puede verse a detalle en la tabla N.8,

Tabla 8. Consolidado de cantidades de materiales.

MATERIALES PETREOS EN OBRA PRESENTE PERIODO	
TIPO DE MATERIAL	**CANTIDAD**
Cemento	700 bultos
Bolo	10.5 m3
Piedra	4 m3
Arena	100 m3
Base	636 m3
Triturado	105 m3

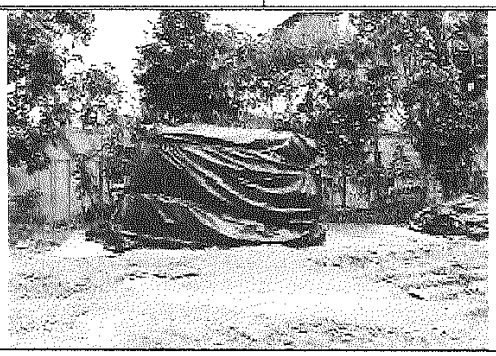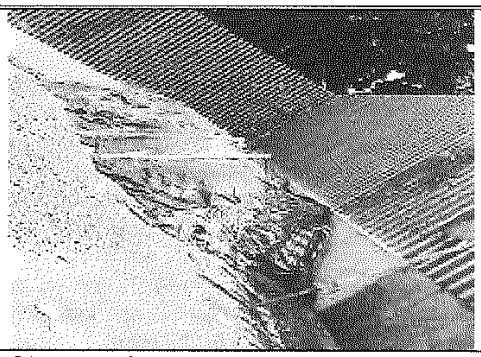	
Observación: Almacenamiento de materiales en obra	Observación: Almacenamiento de Materiales pétreos en obra

ANEXO E. DOCUMENTACION DE MATERIALES PETREOS

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Durante el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, las actividades se realizan de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm y sábado de 07:00 am a 09:00 am con el personal operativo y hasta el mediodía con personal de maquinaria si se requiere adelantar actividades.

Se registra demoliciones y movimientos de tierra, finaliza la actividad de traslado de material a puntos de acopio, con minicargador Bobcat, de los cuales se realiza control de horarios de trabajo de 7 a 8 horas al día durante la jornada laboral, se verifica en campo el uso y entrega de protección auditiva al personal que está expuesto a ruido.

El material que emana polvo en las zonas de trabajo, junto a la limpieza manual de la calle cuando salen volquetas con RCD, está a cargo del contratista. Realizan adecuaciones de limpieza de llantas de las volquetas dentro de la obra.

Por medio de las inspecciones realizadas durante el presente periodo, se verifica la instalación del cerramiento perimetral de los escenarios deportivos, el cual consta de: tramos de Malla eslabonada y tela verde de 2 m de altura, apoyada sobre maderos rollizos separados cada 3 mts aproximadamente. Dicho cerramiento tiene la funcionalidad de mitigar las emisiones de material particulado, ruido hacia la comunidad aledaña a la obra y prevenir el acceso de personal no autorizado a las áreas de trabajo de las cuales consta el proyecto.

MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

Se verifica en campo el estado de los equipos y maquinaria, en cuanto a la no presencia de fugas de aceite y que el funcionamiento sea óptimo para realizar las actividades de obra.

Se verifica la documentación de previo ingreso de vehículos y maquinaria, como requisito principal se verifica la vigencia del certificado técnico mecánico, SOAT, Licencia de conducción, certificado de importación y tarjeta de propiedad, se adjunta en el informe mensual HSEQ por parte del contratista.

Se verifica el diligenciamiento de las inspecciones pre operacionales de la maquinaria y equipos menores, las cuales se anexan en el informe mensual HSEQ por parte del CONSORCIO DEPORTIVOS PTA.

El contratista informa que no realiza entrega de cronograma o plan de mantenimiento preventivo, ya que realizan de manera correctiva.


Tabla 9. Documentación vehículos

Placa	N° SOAT	Fecha SOAT	RTM	Fecha RTM
CAD178	0308004166893000	14/12/2024	171390772	29/01/2025
OSJ698	0308004166941000	16/12/2024	171760010	14/02/2025
TTW843	9310009606001	31/10/2024	169938134	01/12/2024
WFD114	9310013958601	31/05/2025	168390649	14/09/2024


Tabla 9. Documentación vehículos

Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador
MINICAR GADOR	CASE	2017	NGM417549	122708	Jhon N. Castillo
MINICAR GADOR	CASE	2019	NJM450588	000453344	Yeferson Acevedo
RETRO EXCAVADORA	JCB	2018	SOR3CXT TPJ2674729	SB320/450 45H00157175	Fernando Aramburo
MINIRETRO CARGADOR	JCB	2014	JCB1CXWSA 01744815	GN66168U920152Y	Wilman Ardila
VIBRO COMPACTADOR	CATER PILLAR	2019	0R5200290	CMY06840	Wilman Ardila


Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador
VIBRO COMPACTADOR	CATER PILLAR	2019	0R5200290	CMY06840	Wilman Ardila

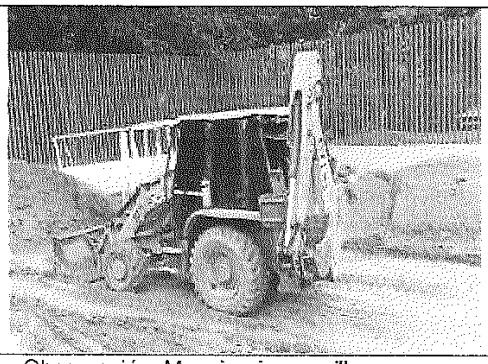


Observación: Maquinaria amarilla en campo

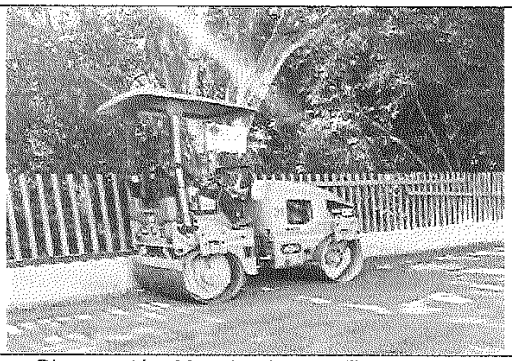

Observación: Maquinaria amarilla en campo

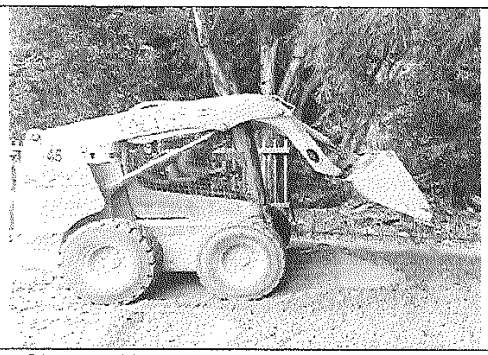

Observación: Maquinaria amarilla en campo

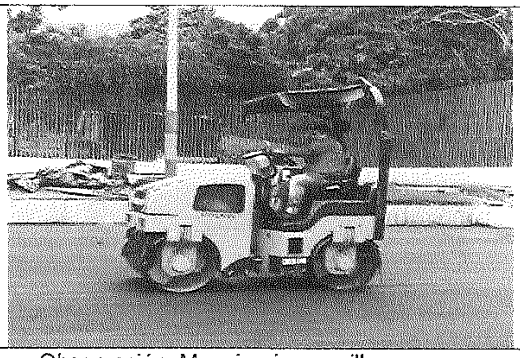

Observación: Maquinaria amarilla en campo

ANEXO F. DOCUMENTACION MAQUINARIA-DOC PERSONAL ROTATORIO, PREOP

MANEJO DE RECURSO SUELO

Determinar las medidas necesarias para el manejo de los residuos generados durante las actividades relacionadas con el descapote y demolición, para el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, minimizando la afectación que pueda generarse a los recursos naturales cercanos al área de adecuación tales como flora y fauna.

Durante la ejecución de la actividad de demolición de concretos, no se generaron afecciones en la fauna y flora presente.


Tabla 11. Indicador de manejo de flora.


INDICADORES PROGRAMA	FORMULA	CIFRAS
1. Manejo de flora	(Número de árboles afectados / Numero de árboles curados) * 100	(0/0) *100%=100%

MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Acorde a inspección e n campo el consorcio Deportivo PTA, cuenta con:

- Un Conteiner para oficinas administrativas ubicado en el frente Paseo del puente.
- Almacén de materiales, frente paseo del puente y frente cabecera.
- Cambiador de ropa, frente paseo del puente y frente cabecera.

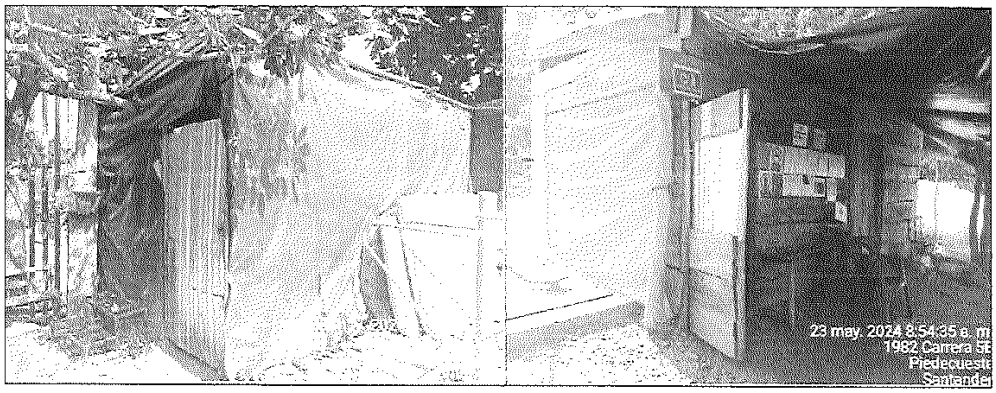

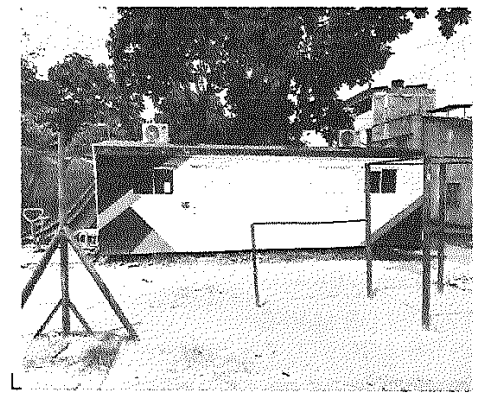Observación: Almacen de Obra Paseo del Puente	Observación: Vestier de Obra Paseo del Puente
	
Observación: Conteiner Paseo del Puente	Observación: Almacén de Obra Cabecera del llano

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital importancia en todas las empresas a lo largo del territorio colombiano, para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los miembros de la organización, por medio de la prevención y protección de la salud de cada uno de ellos en todos los puestos de trabajo. Lo anterior se logra por medio de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, y, de esta manera, intervenir por medio de actos o condiciones laborales más seguros en pro de la mejora continua la cual se logra a través de la implementación de un método lógico y por etapas claras como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo fue aprobado durante el periodo del primer informe HSEQ del contratista para el presente contrato.

Mediante el presente informe, se presenta el seguimiento que realiza durante el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024, la Interventoría **GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9,** en lo referente a la implementación del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo y al cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL

En el presente periodo reportado, se realiza la verificación los soportes de afiliaciones al sistema general de seguridad social: ARL, CCF, PENSIÓN, entregadas por el CONSORCIO DEPORTIVOS PTA. antesdel ingreso de cada trabajador vinculado al contrato, de igual manera del personal operador de maquinaria y servicio de vigilancia privada.

Se adjunta soportes de afiliaciones y planillas de seguridad como anexo.

Tabla 12. Personal de Obra

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024							
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS PIEDECUESTA							
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**EPS**	**AFP**	**CCF**	**ARL**
Damaris Andrea Alfonso Sánchez	63.537.962	Profesional SISO	16/11/2023	Nueva EPS	Protección	No cotiza	Axa Colpatria
Lilly Juliana Durán Higuera	1.098.622.228	Profesional SISO	16/11/2023	Salud total	Porvenir	Comfenalco	Axa Colpatria
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	16/11/2023	Sanitas	Colfondos	No cotiza	Axa Colpatria
Parmenio Rodríguez Ave	13.700.835	Cadenero I	16/11/2023	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco	Axa Colpatria
Juan de Dios Pérez Pabón	13871814	Oficios Varios	16/11/2023	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco	Axa Colpatria
Orlando Pinzón Álvarez	5.595.911	Almacenista	16/11/2023	Salud Total	Porvenir	Comfenalco	Axa Colpatria
Arturo Arenas Jaimes	91357047	Oficios Varios	16/11/2023	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	Axa Colpatria
Chris Anny Paola Manrique Diaz	1.098.778.469	Residente de obra	16/11/2023	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	Axa Colpatria
EMPRESA: CONSTRUCCIONES CONAINCO							

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024							
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS PIEDECUESTA							
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**EPS**	**AFP**	**CCF**	**ARL**
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	16/11/2023	Sura	Colfondos	Comfenalco	Axa Colpatria
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SST	17/01/2024	Sura	Protección	Comfenalco	Axa Colpatria
EMPRESA: INFRACORP SAS							
Angie Marcela Chaves Romo	1.098.727.596	Residente de obra	16/11/2023	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	Axa Colpatria
Fabian Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	16/11/2023	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco	Axa Colpatria
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS							
Jhon Freddy Valencia Delgado	1.005.149.383	Ayudante de obra	26/02/2024	Salud Total	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Carlos Andrés Valencia Delgado	1.095.839.551	Oficial de obra	26/02/2024	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Ender Giovany Rincón	1.095.828.352	Oficial de obra	26/02/2024	Salud Total	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Jairo Alirio Flórez Montoya	91.220.106	Ayudante de obra	26/02/2024	Salud Total	Colfondos	Cajasan	Axa Colpatria
Ramiro Gómez	91.355.925	Oficial de obra	26/02/2024	Salud Mía	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Uriel Caballero Vargas	91.356.619	Oficial de Obra	04/03/2024	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Andrés Ortega Torres	77.143.866	Ayudante de obra	04/03/2024	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria
Manuel Barrera Flórez	91.248.488	Ayudante de obra	04/03/2024	Salud Total	Colpensiones	Cajasan	Axa Colpatria
Jorge Santos Jurado	88.306.900	Ayudante de obra	19/02/2024	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan	Axa Colpatria

Para la ejecución de la obra la presente interventoría inspecciono, se cuente con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

ANEXO G. AFILIACIONES Y/O PLANILLAS DE PAGOS

Tabla 13. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024			
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS PIEDECUEESTA			
NOMBRE COMPLETO	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO
Manrique Diaz	1.098.778.469	Residente de obra	09/
EMPRESA: CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS			
N/A	N/A	N/A	N/A
EMPRESA: INFRACORP			
N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS			
Jorge Santos Jurado	88.306.900	Ayudante de obra	22/07/2024
Manuel Barrera Flórez	91.248.488	Ayudante de obra	22/07/2024

Se adjunta inducción, examen de ingreso entrega de EPPS y afiliaciones y/o planillas de pago.

ANEXO H. DOCUMENTACION DE PERSONAL DE INGRESO

NOVEDADES DE RETIRO

Para el presente periodo no se presentaron novedades de retiro, motivo por el cual no se realizan anexos al respecto.

Tabla No 14. NOVEDADES DE RETIRO
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024

EMPRESA: CONSORCIO DEPORTIVOS PIEDECUESTA		
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE RETIRO**
NA	NA	NA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES CONAINCO		
NA	NA	NA
EMPRESA: INFRACORP SAS		
Chris Anny Paola Manrique Diaz	1.098.778.469	08/05/2024
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS		
Ramiro Gómez	91.355.925	13/07/2024
Uriel Caballero Vargas	91.356.619	13/07/2024
Andrés Ortega Torres	77.143.866	13/07/2024

ANEXO I. NOVEDADES DE RETIRO

PERSONAL ROTATIVO

Se verifica la documentación del personal rotativo y maquinaria, utilizados por DEPORTIVOS PTA para los diferentes escenarios de obra, en el periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024.

Tabla 15. Personal Rotativo

Personal rotativo Placa	N° SOAT	Fecha SOAT	RTM	Fecha RTM	Conductor
CAD178	0308004166 893000	14/12/2024	171390772	29/01/2025	Raúl Jaimes Carrillo
OSJ698	0308004166 941000	16/12/2024	171760010	14/02/2025	Luis Méndez Peña
TTW843	9310009606 001	31/10/2024	169938134	01/12/2024	Sergio Andrés Porras
WFD114	9310013958 601	31/05/2025	168390649	14/09/2024	Sergio Luis Esteban

ANEXO F. DOC PERSONAL ROTATIVO, DOC. MAQUINARIA, PREOPERACIONALES

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Los exámenes médicos de ingreso del personal del contratista, se realizan por medio de la CERTIFICA MEDICAL GROUP, quien cumple con toda la documentación requerida según la Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 y la resolución 1918 de 2009.

Cada vez que se vea el requerimiento de contratar personal, CONSORCIO DEPORTIVOS PTA, remite los soportes para su respectiva revisión por parte de esta interventoría.

Para el presente periodo se registra ingreso de personal, motivo por el cual se realiza anexos.

Tabla 16. Listado de exámenes médicos realizados

TIPO DE EXAMEN	CANTIDAD
Exámenes médicos ocupacionales de ingreso	3
Exámenes médicos ocupacionales periódicos	0
Exámenes médicos ocupacionales de egreso	0
TOTAL	3

Durante el periodo en referencia del informe N° 03, no se presentan incidentes ni accidentes laborales dentro del proyecto.


A continuación, se presentan los indicadores de ausentismo y accidentalidad de CONSORCIO DEPORTIVOS PTA, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento:


ANEXO H. DOCUMENTACION DE INGRESO

Tabla 17. Indicadores de Accidentalidad


N	MES	N° AT			N TRABAJO	DIAS INCA PASIDA	DIAS CARGA DOS	TOTAL, DIAS TRABAJAD OS	TOTAL, HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRES TRABAJADA S
		S4	C1	Total						
1	NOV	0	0	0	10	0	0	13	0	1040
2	DIC	0	0	0	10	0	0	15	0	1200
3	ENE	0	0	0	12	0	0	13	0	1248
4	FEB	0	0	0	12	0	0	12	0	1152
5	MAR	0	0	0	19	0	0	14	0	2128

6	MAY	0	0	0	19	0	0	15	0	2280
7	JULIO	0	0	0	21	0	0	8	0	1344
8	AGOS	0	0	0	18	0	0	8	0	1152
	TOTAL	0	0	0	30.3	0,0	0	41,0	0	11544.

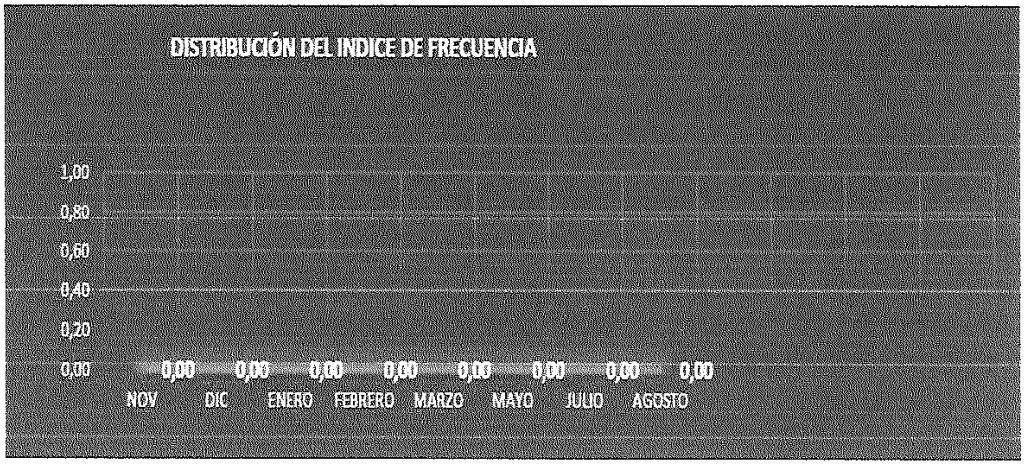


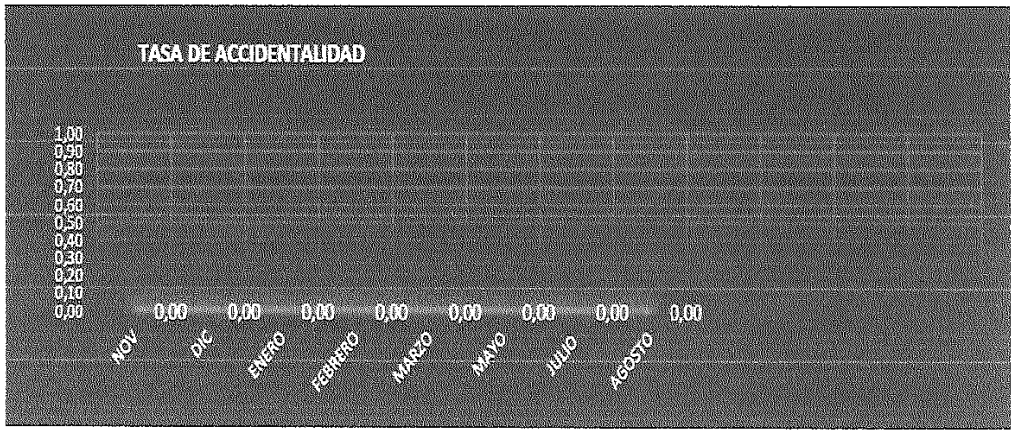


NUMERO DE TRABAJADORES

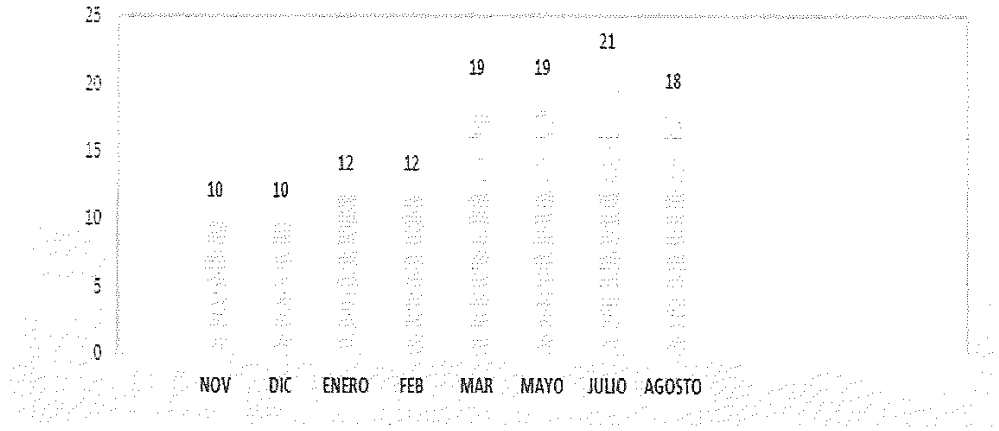

TOTAL DE AT

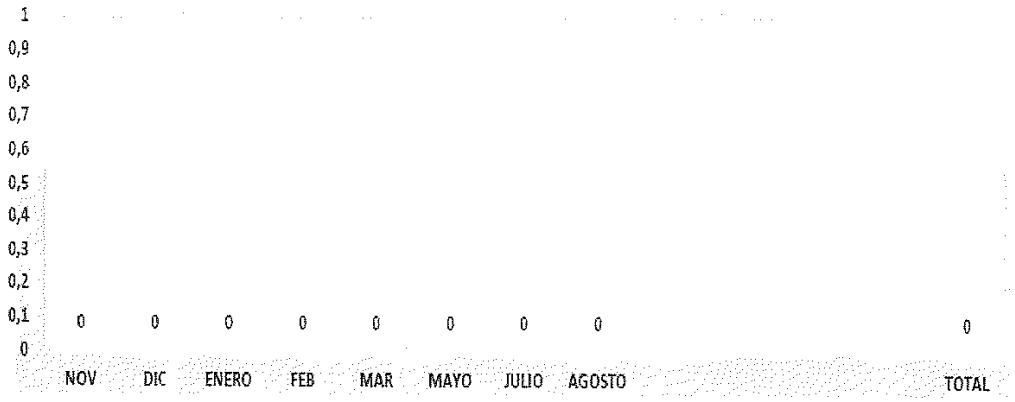

Consolidado de incidentes y/o accidentes





INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el presente periodo, se realizó de seguimiento a las inspecciones de Seguridad realizadas por el CONSORCIO DEPORTIVOS PTA.

Tabla 18. Inspecciones y análisis de trabajo seguro efectuadas en el periodo del informe.

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN.
Inspección de Elementos de Protección Personal	16 de mayo de 2024 26 de julio de 2024 05 de agosto de 2024
Inspección Locativa de Obra	22 de mayo de 2024 30 de julio de 2024
Inspección de herramientas manuales	Del 13 al 18 de mayo de 2024 Del 20 al 25 de mayo de 2024 Del 27 al 31 de mayo de 2024 Del 22 al 27 de julio de 2024 Del 29 de julio al 03 de agosto de 2024

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN.
Inspección de botiquín y camilla	23 de mayo de 2024 25 de julio de 2024
Inspección de extintores	23 de mayo de 2024 26 de julio de 2024

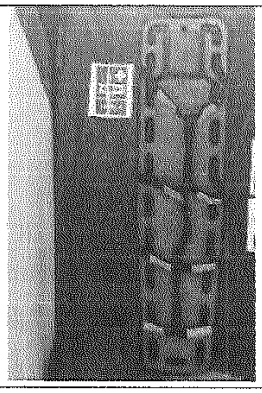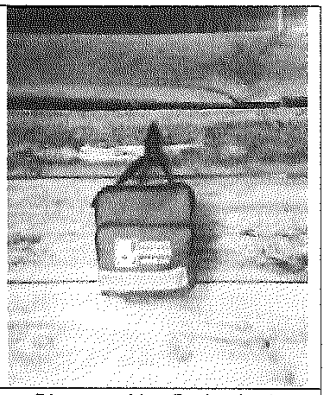		
Observación: Camilla de Obra	Observación: Extintor	Observación: Botiquín de Obra

ANEXO J. INSPECIONES SST


ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Para este segundo periodo no se registran actividades de alto riesgo motivo por el cual no se diligencian análisis de trabajo seguro.

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Se inspecciona el estado del cerramiento con tela verde de 2 m de altura, apoyada sobre malla eslabonada y malla graduable, maderos rollizos separados cada 3 m aproximadamente. Dicho cerramiento tiene la funcionalidad de mitigar las emisiones de material particulado, ruido hacia la comunidad aledaña a la obra y prevenir el acceso de personal no autorizado a las áreas de trabajo de las cuales consta el proyecto.

Durante el desarrollo de actividades del presente periodo de inicio, el contratista realiza los mantenimientos requeridos del cerramiento, e instala la señalización de los flujos vehiculares, peatonales y la señalización interna de la obra.

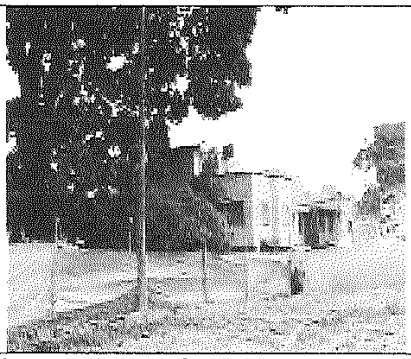	
Observaciones: Serramineo Frente Paseo del Puente	**Observaciones:** Sendero peatonal para vivienda frente a cancha de Cbecera

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista realiza la entrega completa de dotación al personal que ingresa a labores dentro del contrato, esta Interventoría realiza inspecciones y verificación del uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal proporcionados a los trabajadores al momento del inicio y ejecución del contrato.

ANEXO K. ENTREGA DE EPPS.

PUNTO DE HIDRATACIÓN

El CONSORCIO DEPORTIVOS PTA, hidrata a su personal mediante la designación de bolsas de agua de 500ml.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO DEPORTIVOS PTA., de acuerdo con el plan de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo e inspeccionado

por GRUCOING SAS.

Tabla 20. Cronograma de actividades de SST

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUTADO	% CUMPLE
Identificación de peligros y riesgos	SI	100%
Inspección equipos de Emergencia	SI	100%
Reposición y/o cambio de EPP´s	SI	100%
Capacitaciones Programadas	SI	100%
Jornadas de Orden y aseo	SI	100%
Reuniones COPASST Y CCL	SI	100%

REGISTRO DE CHARLAS/ INDUCCIÓN/ CAPACITACIÓN

En el presente periodo, se realizó el seguimiento en la ejecución de las charlas mensuales, allí se mencionaron temas en relación con riesgos asociados a las actividades, seguridad, salud y medio ambiente. Adicionalmente, se verifican los registros de la inducción realizada al personal que ingresa al contrato.

Lo anterior se evidencia con registros de asistencia y participación, en el informe mensual HSEQ N° 04 de CONSORCIO DEPORTIVOS PTA y los registros de inducción mostrados a la Interventoría durante el proceso de ingreso de los trabajadores a la obra.

Tabla 21. Capacitaciones - Charlas de seguridad realizadas de tipo SSTA en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	FECHA	TEMA
1	22/02/2024	Responsabilidades en el SGSST
2	01/03/2024	Trabajo en equipo
3	07/03/2024	Reporte de actos y condiciones inseguras RACI
4	12/03/2024	Consecuencias del consumo excesivo de alcohol

ANEXO L. CAPACITACIONES

Tabla 22. Inducciones realizadas de tipo SSTA en el periodo

NOVEDADES DE INGRESO		
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024		
EMPRESA: CONSORCIO DEPORTIVOS PIEDECUESTA		
FECHA DE INGRESO	CARGO	NOMBRE COMPLETO
09/05/2024	Residente de obra	Chris Anny Paola Manrique Diaz
22/07/2024	Ayudante de obra	Jorge Santos Jurado
22/07/2024	Ayudante de obra	Manuel Barrera Flórez

Véase la inducción al cargo en el **ANEXO h. PERSONAL DE INGRESO** donde puede verse a detalle la inducción al cargo realizada al personal de ingreso.

ACTIVIDADES COPASST Y CONVIVENCIA LABORAL

COPASST

Para el presente periodo la interventoría evidencia se dé cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, inspeccionando la designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del CONSORCIO DEPORTIVOS PTA el 21 de febrero de 2024.

ANEXO M. ACTA COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se evidencia la primera reunión realizada el día 27 de mayo del 2024 por parte del CONSORCIO PTA, como puede verse a detalle en el siguiente anexo.

ANEXO N. ACTA COCOLA

PLAN DE EMERGENCIAS

Se evidencia en los diferentes frentes de obra estado, vigentes, de fácil absceso en la obra

y a disposición del personal.

Tabla 23. Listado de elementos de emergencia

ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Camilla	1	Obra
Extintor multipropósitos 20 lb	1	Obra
Botiquín de primeros auxilios	1	Obra





Observación: Elementos de primeros auxilios

Véase en las inspecciones de seguridad ANEXO J INSPECIONES SST las inspecciones de camilla botiquín y extintor.

CONTROL INTERNO INTERVENTORIA

AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EXÁMENES MÉDICOS

La Interventoría GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9, realiza las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal contratado para ejecutar el contrato CO1.PCCNTR.5464777

El personal está cubierto en riesgos laborales por la ARL SURA

Se adjunta planillas de pago de seguridad social del personal de CONSORCIO DEPORTIVOS PTA correspondiente Al periodo del 15 al 29 de mayo y del 24 de julio al 08 de agosto del 2024

Tabla 24. Relación personal Interventoría

CARGO	DEDICACION	NOMBRE
Director de Interventoría	50%	MILTON VILLARREAL
Residente de interventoría	100%	FAHER SOLANO (30 marzo) Cambia LUZ ANGELA JARAMILLO (15 de mayo del 2024)
Residente de interventoría	100%	ALVARO SOLANO
Ingeniero Auxiliar	100%	JOSE ORDUZ
Ingeniero Auxiliar	100%	DIEGO HERRERA hasta 24 de julio MARLON FABIAN LOPEZ Desde el 24 Julio de 2024
Profesional HSEQ/SISO	100%	ZAYRA JOHANA BAUTISTA VARELA
Profesional HSEQ/SISO	100%	ANA DELIA RESTREPO GONZALES

Topógrafo	100%	RONALD REYES
Cadenero	100%	JORGE DULCEI
Cadenero	100%	SEBASTIAN SUARES

La empresa GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9, desde el inicio del contrato realizó la respectiva entrega de Dotación y Elementos de protección personal necesarios para el grupo de trabajo de la Interventoría, el cual ejecutara actividades por la duración del desarrollo en el contrato CO1.PCCNTR.5464777, denominado como "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.".

ANEXO M. SEGURIDAD SOCIAL GRUCOIN SAS

CONCLUSIONES, OBSEVACIONES O PENDIENTES

Esta interventoría en desarrollo de sus funciones dentro del contrato de **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER** para el informe mensual HSEQ 01, concluye:

- Se verifica los documentos de ingreso del personal nuevo que vaya a ingresar a la obra (ARL, CPF,EPS, Pensión, exámenes de ingreso, inducción, entrega de EPP).
- Se verifica todos los soportes de exámenes de ingreso del personal, inducciones, charlas de seguridad y condiciones de salud.
- Se verifica los soportes de entrega de Dotación, EPP y reposición del mismo.
- El contratista realiza el cerramiento perimetral para los escenarios deportivos durante el periodo del presente informe.
- El contratista cuenta con áreas de oficinas, almacén, zona para los trabajadores (comedor y Vestier), punto de hidratación y baños portátil para hombres.
- Cuentan con el servicio de vigilancia nocturno y fines de semana, el cual es

contratado por medio de la empresa DELTA.

- El contratista entrega carta y/o exámenes de Egreso del personal retirado durante el periodo según aplique.

- Para el manejo de los residuos sólidos, A cumple con los requerido en la Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 (código de colores), contando con 1 puntos ecológicos dentro del proyecto.

aportes en línea

Resumen Gen)l de Pago)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	20240806161247314469	9471097892	E	2024/08/08	2024/08/08	BANCO AV VILLAS	0	$15,745,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIAS (18 Afiliados)						$51,271,700	$8,265,600			$51,271,700	$2,124,300			$51,271,700	$1,911,800			$51,271,700	$3,318,600		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: INTERVENTORIAS (18 Afiliados)						$51,271,700	$8,265,600			$51,271,700	$2,124,300			$51,271,700	$1,911,800			$51,271,700	$3,318,600		$2,500,000	$125,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (18 Afiliados)						$51,271,700	$8,265,600			$51,271,700	$2,124,300			$51,271,700	$1,911,800			$51,271,700	$3,318,600		$2,500,000	$125,000
1	CC	1098668541	BAUTISTA ZAYRA	230301	30	$3,121,000	$499,400	EPS005	30	$3,121,000	$124,900	CCF40	30	$3,121,000	$124,900	14-11	30	$3,121,000	$217,300	30	$0	$0
2	CC	1054679289	CAMACHO JHON	230301	29	$3,480,000	$556,800	ESSC24	29	$3,480,000	$139,200	CCF40	29	$3,480,000	$139,200	14-11	29	$3,480,000	$242,300	29	$0	$0
3	CC	1054679289	CAMACHO JHON	230301	1	$120,000	$19,200	ESSC24	1	$120,000	$4,800	CCF40	1	$120,000	$4,800	14-11	1	$120,000	$0	1	$0	$0
4	CC	91494927	DULCEY JORGE	25-14	30	$2,050,000	$328,000	EPS002	30	$2,050,000	$82,000	CCF40	30	$2,050,000	$82,000	14-11	30	$2,050,000	$142,700	30	$0	$0
5	CC	1101684040	HERRERA DIEGO	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF40	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC	1234340745	LOPEZ MARLON	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS041	30	$3,600,000	$144,000	CCF40	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
7	CC	37726063	LUNA LUZ	25-14	30	$3,480,000	$556,800	EPS002	30	$3,480,000	$0	CCF40	30	$3,480,000	$0	14-11	30	$3,480,000	$0	30	$0	$0
8	CC	1100949492	MANCILLA EDUAR	230201	30	$3,120,700	$499,400	EPS010	30	$3,120,700	$124,900	CCF40	30	$3,120,700	$124,900	14-11	30	$3,120,700	$217,300	30	$0	$0
9	CC	91259274	MANTILLA CESAR	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000
10	CC	1098757422	MARTINEZ JORGE	230301	12	$1,000,000	$160,000	EPS005	12	$1,000,000	$40,000	CCF40	12	$1,000,000	$40,000	14-11	12	$1,000,000	$69,600	12	$0	$0
11	CC	74085419	ORDUZ JOSE	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF40	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
12	CC	1010156184	ORDUZ LAURA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS041	30	$2,100,000	$84,000	CCF40	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
13	CC	91538070	PARDO GERMAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	1098692672	REYES RONALD	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF40	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
15	CC	1005257715	SARMIENTO WENDY	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
16	CC	1094952603	SIERRA CRISTIAN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
17	CC	91276127	SOLANO ALVARO	25-14	30	$6,200,000	$1,654,000	EPS005	30	$6,200,000	$248,000	CCF40	30	$6,200,000	$248,000	14-11	30	$6,200,000	$431,800	30	$0	$0
18	CC	63436631	VILLAMIL YASMIN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
19	CC	1098752434	VILLAVIZAR JHERSON	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS041	30	$2,200,000	$88,000	CCF40	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$51,271,700	$8,265,600			$51,271,700	$2,124,300			$51,271,700	$1,911,800			$51,271,700	$3,318,600		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	20240806161247314469	947109792	E	2024/08/08	2024/08/08	BANCO AV VILLAS	0	$15,745,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$8,265,600	$0	$0	$8,265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,338,800	$0	$0	$2,338,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,971,400	$0	$0	$3,971,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,955,400	$0	$0	$1,955,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$3,318,600	$0	$0	$3,318,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$3,318,600	$0	$0	$3,318,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,911,800	$0	$0	$1,911,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	18	$1,911,800	$0	$0	$1,911,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$2,124,300	$0	$0	$2,124,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$144,000	$0	$0	$144,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$144,000	$0	$0	$144,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$184,900	$0	$0	$184,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$212,000	$0	$0	$212,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$144,000	$0	$0	$144,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,000	$0	$0	$292,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$825,400	$0	$0	$825,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				18	$15,745,300	$0	$0	$15,745,300

2024/08/08 11:13 AM

aportes en línea

Resumen Ger)l de Pago)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICA MOSQUERA	KILOMETRO 14 TIBAITATA CI	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176445297	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	828223948	9470222932	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$2,198,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1014189419	MOZO ERIKC	230301	27	$3,150,000	$504,000	EPS008	27	$3,150,000	$126,000	CCF22	27	$3,150,000	$126,000	14-11	27	$3,150,000	$219,300	27	$0	$0
2	CC	1014189419	MOZO ERIKC	230301	3	$350,001	$56,100	EPS008	3	$350,001	$14,100	CCF22	3	$350,001	$14,100	14-11	3	$350,001	$0	3	$0	$0
3	CC	1023894800	RESTREPO ANA	230301	30	$3,678,000	$588,500	EPS005	30	$3,678,000	$147,200	CCF22	30	$3,678,000	$147,200	14-11	30	$3,678,000	$256,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$7,178,001	$1,148,600			$7,178,001	$287,300			$7,178,001	$287,300			$7,178,001	$475,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,148,600	$0	$0	$1,148,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,148,600	$0	$0	$1,148,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$475,300	$0	$0	$475,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$475,300	$0	$0	$475,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$287,300	$0	$0	$287,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$287,300	$0	$0	$287,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$287,300	$0	$0	$287,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,100	$0	$0	$140,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$147,200	$0	$0	$147,200
TOTAL				2	$2,198,500	$0	$0	$2,198,500

2024/08/08 11:15 AM

aportes en línea

Resumen Ger)l de Pago)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION 2	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	828209194	9471111177	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$5,415,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION 2 (8 Afiliados)						$20,420,809	$3,325,800			$20,420,809	$817,200			$19,947,352	$798,200			$20,420,809	$474,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO CAMPO (1 Afiliados)						$5,800,000	$986,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$403,700		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$5,800,000	$986,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$403,700		$0	$0
1	CC	1098720597	JARAMILLO LUZ	25-14	30	$5,800,000	$986,000	EPS037	30	$5,800,000	$232,000	CCF40	30	$5,800,000	$232,000	14-11	30	$5,800,000	$403,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMO 2 (7 Afiliados)						$14,620,809	$2,339,800			$14,620,809	$585,200			$14,147,352	$566,200			$14,620,809	$70,600		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$14,620,809	$2,339,800			$14,620,809	$585,200			$14,147,352	$566,200			$14,620,809	$70,600		$0	$0
2	CC	1098622039	ARIAS YULI	230201	29	$2,320,000	$371,200	EPS046	29	$2,320,000	$92,800	CCF40	29	$2,320,000	$92,800	14-11	29	$2,320,000	$12,200	29	$0	$0
3	CC	1098622039	ARIAS YULI	230201	1	$80,000	$12,800	EPS046	1	$80,000	$3,200	CCF40	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
4	CC	1098724065	BARAJAS YENI	230301	29	$3,383,334	$541,400	EPS005	29	$3,383,334	$135,400	CCF40	29	$3,383,334	$135,400	14-11	29	$3,383,334	$17,700	29	$0	$0
5	CC	1098724065	BARAJAS YENI	230301	1	$116,667	$18,700	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF40	1	$116,667	$4,700	14-11	1	$116,667	$0	1	$0	$0
6	CC	91262098	BELTRAN GELVER	230201	15	$1,050,000	$168,000	EPS003	15	$1,050,000	$42,000	CCF40	15	$1,050,000	$42,000	14-11	15	$1,050,000	$5,500	15	$0	$0
7	CC	1019101343	GARCIA DAYANITH	25-14	28	$1,814,400	$290,400	EPS046	28	$1,814,400	$72,600	CCF40	28	$1,814,400	$72,600	14-11	28	$1,814,400	$9,500	28	$0	$0
8	CC	1019101343	GARCIA DAYANITH	25-14	2	$129,600	$20,800	EPS046	2	$129,600	$5,200	CCF40	2	$129,600	$5,200	14-11	2	$129,600	$0	2	$0	$0
9	CC	1098730284	MATEUS JESUS	230301	20	$2,029,000	$324,700	MIN002	20	$2,029,000	$81,200	CCF40	20	$2,029,000	$81,200	14-11	20	$2,029,000	$10,600	20	$0	$0
10	CC	1098730284	MATEUS JESUS	230301	10	$777,807	$124,500	MIN002	10	$777,807	$31,100	CCF40	3	$304,350	$12,200	14-11	10	$777,807	$0	3	$0	$0
11	CC	63557417	ROJAS HEIDY	230301	29	$1,256,667	$201,100	MIN002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
12	CC	63557417	ROJAS HEIDY	230301	1	$43,334	$7,000	MIN002	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
13	CC	1005481528	SUAREZ JUAN	25-14	30	$1,620,000	$259,200	EPS046	30	$1,620,000	$64,800	CCF40	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	$8,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$20,420,809	$3,325,800			$20,420,809	$817,200			$19,947,352	$798,200			$20,420,809	$474,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen Gen)l de Pago)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION 2	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	828209194	9471111177	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$5,415,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,325,800	$0	$0	$3,325,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,556,400	$0	$0	$1,556,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,217,400	$0	$0	$1,217,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$552,000	$0	$0	$552,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$474,300	$0	$0	$474,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$474,300	$0	$0	$474,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$798,200	$0	$0	$798,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$798,200	$0	$0	$798,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$817,200	$0	$0	$817,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$164,500	$0	$0	$164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$238,600	$0	$0	$238,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,100	$0	$0	$140,100
TOTAL				8	$5,415,500	$0	$0	$5,415,500

aportes en línea

Resumen Gen)l de Pago)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6792311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	828199344	9470853118	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$892,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Apurte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6,96 (1 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
1	CC	91256877	VILLARREAL MILTON	25-14	30	$2,880,450	$460,900	EPS010	30	$2,880,450	$115,300	CCF40	30	$2,880,450	$115,300	14-11	30	$2,880,450	$200,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CALLE 32 # 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6792311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	828199344	94708531 18	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$892,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODICIO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$460,900	$0	$0	$460,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$460,900	$0	$0	$460,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,500	$0	$0	$200,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$200,500	$0	$0	$200,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,300	$0	$0	$115,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$115,300	$0	$0	$115,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,300	$0	$0	$115,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$115,300	$0	$0	$115,300
TOTAL				1	$892,000	$0	$0	$892,000

aportes en línea

Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	687179303	94687488848	E	2024/06/11	2024/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,244,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIAS (2 Afiliados)					$4,373,334	$699,800			$4,373,334	$175,000			$2,520,000	$100,800			$4,373,334	$175,400		$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIAS (2 Afiliados)					$4,373,334	$699,800			$4,373,334	$175,000			$2,520,000	$100,800			$4,373,334	$175,400		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					$4,373,334	$699,800			$4,373,334	$175,000			$2,520,000	$100,800			$4,373,334	$175,400		$0	$0
1	CC	1098692672	REYES RONALD	230301	27	$2,520,000	$403,200	EPS017	27	$2,520,000	$100,800	CCF40	27	$2,520,000	$100,800	14-11	27	$2,520,000	$175,400	27	$0	$0
2	CC	1098692672	REYES RONALD	230301	3	$186,667	$29,900	EPS017	3	$186,667	$7,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$186,667	$0	0	$0	$0
3	CC	1096952803	SIERRA CRISTIAN	230301	30	$1,666,667	$266,700	EPS017	30	$1,666,667	$66,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	30	$1,666,667	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CARTAGENA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CARTAGENA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
4	CC	1091669181	GUTIERREZ JUAN	05-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$170,000	CCF09	30	$3,000,000	$170,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RIOHACHA (2 Afiliados)					$11,450,002	$1,099,400			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$212,600		$0	$0
Centro de Trabajo: MOLINO GUAJIRA (2 Afiliados)					$11,450,002	$1,099,400			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$212,600		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)					$11,450,002	$1,899,400			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$122,200			$11,450,002	$212,600		$0	$0
5	CC	56078904	CORONADO INGRIS	230301	8	$1,266,667	$202,700	CCFC55	8	$1,266,667	$50,700	CCF30	8	$1,266,667	$50,700	14-11	8	$1,266,667	$88,200	8	$0	$0
6	CC	56078904	CORONADO INGRIS	230301	22	$3,483,334	$557,400	CCFC55	22	$3,483,334	$0	CCF30	22	$3,483,334	$0	14-11	22	$3,483,334	$0	22	$0	$0
7	CC	1122808975	HERNANDEZ JAIME	25-14	8	$1,786,667	$303,900	EPS037	8	$1,786,667	$71,500	CCF30	8	$1,786,667	$71,500	14-11	8	$1,786,667	$124,400	8	$0	$0
8	CC	1122808975	HERNANDEZ JAIME	25-14	22	$4,913,334	$835,400	EPS037	22	$4,913,334	$0	CCF30	22	$4,913,334	$0	14-11	22	$4,913,334	$0	22	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAUCA (1 Afiliados)					$2,610,000	$417,600			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$181,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CAUCA (1 Afiliados)					$2,610,000	$417,600			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$181,700		$0	$0
Ciudad: LA VEGA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,610,000	$417,600			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$104,400			$2,610,000	$181,700		$0	$0
9	CC	10307382	CAMPO JERSON	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF14	30	$2,610,000	$104,400	14-11	30	$2,610,000	$181,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**				$21,433,336	$3,496,800			$21,433,336	$521,600			$19,580,002	$447,400			$21,433,336	$778,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682179303	94682488848	E	2024/06/11	2024/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,244,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$3,496,800	$0	$0	$3,496,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,619,300	$0	$0	$1,619,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,877,500	$0	$0	$1,877,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$778,500	$0	$0	$778,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$778,500	$0	$0	$778,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$447,400	$0	$0	$447,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$104,400	$0	$0	$104,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$122,200	$0	$0	$122,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$100,800	$0	$0	$100,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$521,600	$0	$0	$521,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$50,700	$0	$0	$50,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$191,500	$0	$0	$191,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$104,400	$0	$0	$104,400
TOTAL				6	$5,244,300	$0	$0	$5,244,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	202406061178503141 33	94683314 25	E	2024/06/11	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$11,069,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIAS (15 Afiliados)						$35,615,037	$5,760,900			$35,615,037	$1,425,100			$35,528,370	$1,421,600			$35,615,037	$2,462,200		$0	$0
Centro de Trabajo: **INTERVENTORIAS (15 Afiliados)**						$35,615,037	$5,760,900			$35,615,037	$1,425,100			$35,528,370	$1,421,600			$35,615,037	$2,462,200		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (15 Afiliados)						$35,615,037	$5,760,900			$35,615,037	$1,425,100			$35,528,370	$1,421,600			$35,615,037	$2,462,200		$0	$0
1	CC	1098668541	BAUTISTA ZAYRA	230301	30	$3,121,000	$499,400	EPS005	30	$3,121,000	$124,900	CCF40	30	$3,121,000	$124,900	14-11	30	$3,121,000	$217,300	30	$0	$0
2	CC	91494927	BUCEFY JORGE	25-14	30	$2,050,000	$328,000	EPS002	30	$2,050,000	$82,000	CCF40	30	$2,050,000	$82,000	14-11	30	$2,050,000	$142,700	30	$0	$0
3	CC	37726061	LUNA LUZ	25-14	30	$3,480,000	$556,800	EPS002	30	$3,480,000	$139,200	CCF40	30	$3,480,000	$139,200	14-11	30	$3,480,000	$242,300	30	$0	$0
4	CC	1100949492	MANCILLA EDUAR	230201	30	$3,120,700	$499,400	EPS010	30	$3,120,700	$124,900	CCF40	30	$3,120,700	$124,900	14-11	30	$3,120,700	$217,300	30	$0	$0
5	CC	1098757422	MARTINEZ JORGE	230301	28	$2,333,334	$373,400	EPS005	28	$2,333,334	$93,400	CCF40	28	$2,333,334	$93,400	14-11	28	$2,333,334	$162,500	28	$0	$0
6	CC	1098757422	MARTINEZ JORGE	230301	2	$166,667	$26,700	EPS005	2	$166,667	$6,700	CCF40	2	$166,667	$6,700	14-11	2	$166,667	$0	2	$0	$0
7	CC	91276789	MELO OSCAR	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS007	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	1010156184	ORDUZ LAURA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS041	30	$2,100,000	$84,000	CCF40	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
9	CC	91538070	PARRA GERMAN	230201	8	$800,000	$128,000	EPS041	8	$800,000	$32,000	CCF40	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$55,700	8	$0	$0
10	CC	1098788135	REYES LUIS	230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS010	23	$1,533,334	$61,400	CCF40	23	$1,533,334	$61,400	14-11	23	$1,533,334	$106,800	23	$0	$0
11	CC	1098807336	SANTOS SILVIA	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
12	CC	1005257715	SARMIENTO WENDY	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS010	28	$1,213,334	$48,600	CCF40	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
13	CC	1005257715	SARMIENTO WENDY	230201	7	$86,667	$13,900	EPS010	7	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	7	$86,667	$0	0	$0	$0
14	CC	91276127	SOLANO ALVARO	25-14	30	$6,200,000	$1,054,000	EPS005	30	$6,200,000	$248,000	CCF40	30	$6,200,000	$248,000	14-11	30	$6,200,000	$431,600	30	$0	$0
15	CC	1098664643	TOVAR PABLO	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS002	30	$1,740,000	$69,600	CCF40	30	$1,740,000	$69,600	14-11	30	$1,740,000	$121,200	30	$0	$0
16	CC	63436631	VILLAMIL YASMIN	230301	11	$916,667	$146,700	EPS005	11	$916,667	$36,700	CCF40	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$63,900	11	$0	$0
17	CC	1098752434	VILLANUEVA JHERSON	230201	28	$2,053,334	$328,600	EPS041	28	$2,053,334	$82,200	CCF40	28	$2,053,334	$82,200	14-11	28	$2,053,334	$143,000	28	$0	$0
Total	**Afiliados(15)**					$35,615,037	$5,760,900			$35,615,037	$1,425,100			$35,528,370	$1,421,600			$35,615,037	$2,462,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIAS	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	2024060611285031413 3	94683314 25	E	2024/06/11	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$11,069,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$5,760,900	$0	$0	$5,760,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,210,800	$0	$0	$2,210,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,386,000	$0	$0	$2,386,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,164,100	$0	$0	$1,164,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,462,200	$0	$0	$2,462,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$2,462,200	$0	$0	$2,462,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,421,600	$0	$0	$1,421,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	15	$1,421,600	$0	$0	$1,421,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,425,100	$0	$0	$1,425,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$238,400	$0	$0	$238,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$0	$0	$68,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$198,200	$0	$0	$198,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,800	$0	$0	$410,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$509,700	$0	$0	$509,700
TOTAL				15	$11,069,800	$0	$0	$11,069,800

2024/06/12 02:54 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HABITAT GRUPO 3	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176446297	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	202406061133073141139	9468334228	E	2024/06/11	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$2,773,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023894803	RESTREPO ANA	230301	30	$3,678,000	$588,500	EPS005	30	$3,678,000	$147,200	CCF22	30	$3,678,000	$147,200	14-11	30	$3,678,000	$256,000	30	$0	$0
2	CC	1022996766	VELASCO KATHERINE	230201	30	$1,780,000	$284,800	EPS017	30	$1,780,000	$71,200	CCF22	30	$1,780,000	$71,200	14-11	30	$1,780,000	$123,900	30	$0	$0
3	CC	1014256912	VELOZA ERICK	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$8,958,000	$1,433,300			$8,958,000	$358,400			$8,958,000	$358,400			$8,958,000	$623,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,148,500	$0	$0	$1,148,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$284,800	$0	$0	$284,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$623,500	$0	$0	$623,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$623,500	$0	$0	$623,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$358,400	$0	$0	$358,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$358,400	$0	$0	$358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$358,400	$0	$0	$358,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$71,200	$0	$0	$71,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$147,200	$0	$0	$147,200
TOTAL				3	$2,773,600	$0	$0	$2,773,600

2024/07/22 04:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	C13 GESTION DEL RIESGO	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	716629301	9467459057	E	2024/06/11	2024/06/19	BANCOLOMBIA	8	$1,121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74085419	OROZ JOSE	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF40	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$250,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$3,700	$0	$579,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$576,000	$3,700	$0	$579,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,600	$1,600	$0	$252,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$250,600	$1,600	$0	$252,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$1,000	$0	$145,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$144,000	$1,000	$0	$145,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$1,000	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$144,000	$1,000	$0	$145,000
TOTAL				4	$1,114,600	$7,300	$0	$1,121,900

2024/07/22 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION 2	CALLE 32 B 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	2024060611301731413S	94683308S4	E	2024/06/11	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$6,397,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO(Centro de Trabajo: 2 Afiliados)						$25,726,393	$4,020,400			$25,126,393	$1,005,200			$25,126,393	$1,005,200			$25,126,393	$361,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO MENSAJERIA (1 Afiliados)						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$250,600		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$250,600		$0	$0
1	CC	1101684080	HERRERA DIEGO	230201	30	$3,600,000	$576,000	EPS002	30	$3,600,000	$144,000	CCF40	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMO 2 (9 Afiliados)						$21,526,393	$3,444,400			$21,526,393	$861,200			$21,526,393	$861,200			$21,526,393	$111,200		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)						$21,526,393	$3,444,400			$21,526,393	$861,200			$21,526,393	$861,200			$21,526,393	$111,200		$0	$0
2	CC	1098622039	ARIAS YULI	230201	28	$2,240,000	$358,400	EPS010	28	$2,240,000	$89,600	CCF40	28	$2,240,000	$89,600	14-11	28	$2,240,000	$11,700	28	$0	$0
3	CC	1098622039	ARIAS YULI	230201	2	$160,000	$25,600	EPS010	2	$160,000	$6,400	CCF40	2	$160,000	$6,400	14-11	2	$160,000	$0	2	$0	$0
4	CC	1098724065	BARAJAS YENI	230301	29	$3,383,334	$541,400	EPS005	29	$3,383,334	$135,400	CCF40	29	$3,383,334	$135,400	14-11	29	$3,383,334	$17,700	29	$0	$0
5	CC	1098724065	BARAJAS YENI	230301	1	$116,667	$18,700	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF40	1	$116,667	$4,700	14-11	1	$116,667	$0	1	$0	$0
6	CC	1098675715	BAUTISTA YESENIA	230301	30	$2,520,000	$403,200	EPS046	30	$2,520,000	$100,800	CCF40	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	$13,200	30	$0	$0
7	CC	1019101143	GARCIA DAYANITH	25-14	30	$1,944,000	$311,100	EPS010	30	$1,944,000	$77,800	CCF40	30	$1,944,000	$77,800	14-11	30	$1,944,000	$10,200	30	$0	$0
8	CC	1098720597	JARAMILLO LUZ	25-14	30	$3,745,000	$599,200	EPS037	30	$3,745,000	$149,800	CCF40	30	$3,745,000	$149,800	14-11	30	$3,745,000	$19,600	30	$0	$0
9	CC	1098730284	MATTUS JESUS	230301	30	$2,717,392	$434,800	MIN007	30	$2,717,392	$108,700	CCF40	30	$2,717,392	$108,700	14-11	30	$2,717,392	$14,200	30	$0	$0
10	CC	63557417	ROJAS HEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN302	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1005487528	SUAREZ JUAN	25-14	30	$1,620,000	$259,200	FSSC24	30	$1,620,000	$64,800	CCF40	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	$8,500	30	$0	$0
12	CC	63558737	URIBE VIVIANA	25-14	30	$1,780,000	$284,800	EPS010	30	$1,780,000	$71,200	CCF40	30	$1,780,000	$71,200	14-11	30	$1,780,000	$9,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$25,126,393	$4,020,400			$25,126,393	$1,005,200			$25,126,393	$1,005,200			$25,126,393	$361,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION 2	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6793211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	2024060611301731413S	94683308S4	E	2024/06/11	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$6,392,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODICIO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$4,020,400	$0	$0	$4,020,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,454,300	$0	$0	$1,454,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,606,100	$0	$0	$1,606,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$361,800	$0	$0	$361,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$361,800	$0	$0	$361,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,005,200	$0	$0	$1,005,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	$1,005,200	$0	$0	$1,005,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$1,005,200	$0	$0	$1,005,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$245,000	$0	$0	$245,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$160,700	$0	$0	$160,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$149,800	$0	$0	$149,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$100,800	$0	$0	$100,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$144,000	$0	$0	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,100	$0	$0	$140,100
TOTAL				10	$6,392,600	$0	$0	$6,392,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6792331	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682128990	94679096 94	E	2024/06/11	2024/06/04	BANCO PICHINCHA S.A.	0	5892,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1(Administrativos 6 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6,96 (1 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0
1	CC 91256877	VILLARREAL MILTON	J5-14	30	$2,880,450	$460,900	EPS010	30	$2,880,450	$115,300	CCF40	30	$2,880,450	$115,300	14-11	30	$2,880,450	$200,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,880,450	$460,900			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$115,300			$2,880,450	$200,500		$0	$0

2024/06/06 11:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830509427	9	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CALLE 32 8 41 CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6792311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682128990	94679099694	E	2024/06/11	2024/06/04	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$892,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$460,900	$0	$0	$460,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$460,900	$0	$0	$460,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,500	$0	$0	$200,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$200,500	$0	$0	$200,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,300	$0	$0	$115,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$115,300	$0	$0	$115,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,300	$0	$0	$115,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$115,300	$0	$0	$115,300
TOTAL				1	$892,000	$0	$0	$892,000
