01 Nov-2023

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yudith Vasconcelos	Rep. Apoyo Supervisión	
Agustín Pinto D.	prof. Apoyo Sup. Epaay	
Felipe Molina	Contratista Ltlo	
Ma. Angelica T.	Interventora S.	
Johana Camargo S.	Profesional Contratista de obra	
Luis Andrés López M.	Ing Director de Interventoría	

8 de 8

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
15 | 11 | 2023	2:30 pm	4:00 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodiran, Municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Diego Pérez	Residente de Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
3	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DÍA

- Visita de campo
- Avance del proyecto
- Actividades desarrolladas
- Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido por los frentes de obra en ejecución, se evidencia la presencia de personal laborando, topografía, acopio de Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4" y PVC alcantarillado de diámetro 60", también en bodega material crudo de rio clasificado Tmax. 3", base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), arena lavada y demás materiales necesarios para la construcción del proyecto. También se evidencia la presencia de controladores viales en los frentes de obra.

El contratista de obra manifiesta que el avance de obra es aproximadamente del 0,40%, el cual no ha sido el esperado debido a que al realizar la localización y replanteo se evidencio que la red de impulsión instalada se encuentra muy cerca del eje del emisario del alcantarillado pluvial, por lo cual al realizar las excavaciones para la instalación de la tubería se dejaría sin operación el bombeo diario de las aguas residuales de origen domestico que se originan en el centro poblado, por este motivo y con el propósito de garantizar la evacuación de las aguas residuales de la EBAR a la PTAR, se priorizo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4", la cual es menos representativa y nos atrasa la instalación de la tubería del emisario del alcantarillado pluvial de diámetro 60".

La interventoría manifiesta que a la fecha se han adelantado las siguientes actividades: Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado; Excavación en material común; suministro e instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4", relleno en arena lavada apisonada, relleno con material seleccionado de la excavación; Cargue y retiro mecánico de material sobrante de las excavaciones; Transporte de material Pétreo. Se realizaron las actividades en la red de media tensión necesarias para trasladar la red al costado izquierdo aguas abajo de acuerdo a los planos de diseño.

Durante la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales. Además, se esta implementado el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El contratista de obra manifiesta que de acuerdo a las actividades programadas una vez terminada la instalación de la tubería de la red de impulsión del alcantarillado sanitario de la EBAR a la PTAR, se inicie en el menor tiempo posible la instalación de la tubería del emisario del alcantarillado pluvial, de acuerdo a la programación inicial del proyecto.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yudith Tejada Sánchez	Prof. Apoyo a la Supervisión ACUATODOS	
Luis Andrés Lopez Mesa	Ing Director de Interventoría	
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
11 | 12 | 2023	2:40 p.m.	3:50 p.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Instalaciones social CEDCO Colombia Energy Development CO.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Robinson Fuquen. Vega.	Gestor Social.	CEDCO
	Diego Perez.	Ing. Residente	Synergia. Construcciones
	Angelica Trujillo.	Profesional Social	Synergia. Construcciones
	Andrés López.	Director Interventoria	Consintec del Oriente.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Coordinar las actividades de Construccion con la operación de CEDCO

ORDEN DEL DÍA

Presentación de los Asistentes
Información del Proyecto
Puntos de transito (Identificación)

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes al presente comité.
-El Ingeniero director de Interventoria realizo, la presentación oficial de las areas a intervenir en el centro poblado de Tilodiran en las cuales se evidencio la intervención de la mayor parte del corregimiento en las cuales se evidencio la necesidad de coordinar las actividades para optimizar la operación de las empresas durante la ejecución del proyecto el cual dura aproximadamente un año.
-Luego de verificar las areas a intervenir se evidencio que las operaciones se centran en la carrera 5 entre calles 5 y 7 y en la calle 4 entre carreras 4 y 2, por lo cual se requieren rutas alternas para el transito de vehiculos pesados durante la ejecución del proyecto, por lo cual el gestor social de CEDCO solicita si es posible se. radique a la secretaria de Movilidad del municipio de Yopal para que aprueben las rutas alternas que se puedan generar durante la ejecución del proyecto y en un espacio que se genere se de aviso a los usuarios y residentes las rutas alternas que se puedan generar

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Informes presentación / Interventoría
- Cronograma o fechas mas relevantes de la ejecución / synergia
- Continuar la mesa de trabajo con el municipio / Interventoría y synergia

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Andres Lopez Mesa.	Ing Director de Interventoría,	
Robinson Fuquen Vega	GESTOR SOCIAL	
DIEGO PEREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA SYNERGIA.	
Mg. Angelica Trujillo	Profesional Social	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
13 / 12 / 2023	10:30 am	12:00pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodiran, Municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Diego Pérez	Residente de Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
3	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DÍA
• Visita de campo • Avance del proyecto • Actividades desarrolladas • Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita de obra en el emisario final del Alcantarillado Pluvial desde el pozo PP-44 (inicio de la servidumbre) hasta PP-55 (junto a la PTAR) donde se aprecia la presencia de maquinaria (retroexcavadoras, minicargador, vibrocompactador), personal laborando, equipo menor (vibrocompactadores maléales tipo rana, canguro y venitin), comisión de topografía, Tubería PVC para alcantarillado pluvial de diámetro 60" y base granular acordonada cerca del eje de la excavación, también en bodega material crudo de rio clasificado Tmax. 3", base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), arena lavada y demás materiales necesarios para la construcción del proyecto. También se evidencia la presencia de controladores viales en los frentes de obra.

La interventoría informa que con el propósito de iniciar en el menor tiempo la ejecución de las actividades del Alcantarillado Pluvial se puso en operación provisional la Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4", para evacuar las aguas residuales domesticas de la estación de bombeo (EBAR) a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para lo cual fue necesario dejar aproximadamente los últimos 100 metros superficiales hasta que se realice la rehabilitación de la PTAR.

El contratista de obra manifiesta que el avance de obra es aproximadamente del 5,5%, el cual ha mejorado considerablemente debido a que luego de realizar la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4", se iniciaron las actividades del Alcantarillado pluvial, aprovechando que han disminuido considerablemente las lluvias se prioriza la instalación de la tubería del emisario del alcantarillado Pluvial de diámetro 60", teniendo en cuenta que el sector donde se encuentra ubicado es inundable en época de invierno.

La interventoría manifiesta que a la fecha se están adelantado las siguientes actividades: Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado Pluvial; Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida); Excavación a mano en material común; Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"); Suministro e instalación de Tubería PVC alcantarillado pluvial de diámetro 60"; Manejo, control y extracción de agua del fondo de las excavaciones debido a la presencia de nivel freático. Durante la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales. Además, se esta implementado el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

El contratista de Obra informa que aun no se ha podido ingresar con volquetas y los vehículos que transportan la tubería al sector comprendido entre el pozo de inspección PP-56 (aguas abajo de la PTAR) a la estructura de descarga debido a que este tramo es muy bajo y aún continúa inundado por la escorrentía superficial que se acumula en esta zona en época de invierno.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El contratista de obra manifiesta que con el propósito de incrementar los rendimientos de obra al garantizar el acceso de los vehículos de carga se iniciara con la construcción del emisario del alcantarillado pluvial, entre el pozo de inspección PP-56 a la estructura de descarga.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Andrés López Mesa.	Ingeniero Director de Interventoría	
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Yudith Yaguara Sánchez	Prof. Apoyo a la Supervisión	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
10 | 01 | 2024	3:00 p.m.	4:10 p.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Oficina Unión Temporal Buena Vista

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Ing Diego Perez	Ing Residente	Synergica
	Ing Luis Andres López	Ing Director	Consultor del Oriente
	Ing Beyer Cardot	Prof de Apoyo	U.T Buena Vista

611

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar la información de los dos proyectos.


ORDEN DEL DÍA

- Verificación de la información entregada por la Unión Temporal Buena Vista.
- Toma de decisiones.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- La interventoria y la obra del proyecto del Alcantarillado pluvial manifiestan que se revisó la información de los planos entregados por la unión temporal Buena Vista e informan que el poste ubicado en la calle 5 con vía a Yopal se encuentra ubicado dentro de la curva de acceso al centro poblado, los demas postes se encuentran ubicados en la zona verde de los perfiles suministrados por el municipio de Yopal
- El ingeniero de la unión Temporal Buena Vista manifiesta que solicitan el apoyo por parte del contratista de obra para identificar los ejes de las vias a pavimentar dentro del centro poblado de Tilodiran. A lo cual se le informa que las comisiones de topografia estan disponibles para tener acceso a la información que requieran en campo e identificar los ejes de las vias de acuerdo a las proyecciones establecidas contractualmente.
- Teniendo en cuenta que el poste de la Calle 5 con Vía a Yopal se encuentra dentro de la curva se solicita a la Unión Temporal Buena Vista mover el poste. los demas postes se encuentran por fuera de las vías y cumplen con la ubicación dentro de la zona verde y no tienen inconvenientes para proceder con las excavaciones, los postes que se van a instalar nuevos se van a proceder con la topografia de obra y la Unión Temporal

Buena vista para garantizar que se instalen de acuerdo a los perfiles viales esta actividad se va a realizar de forma coordinada entre las comisiones de topografía.

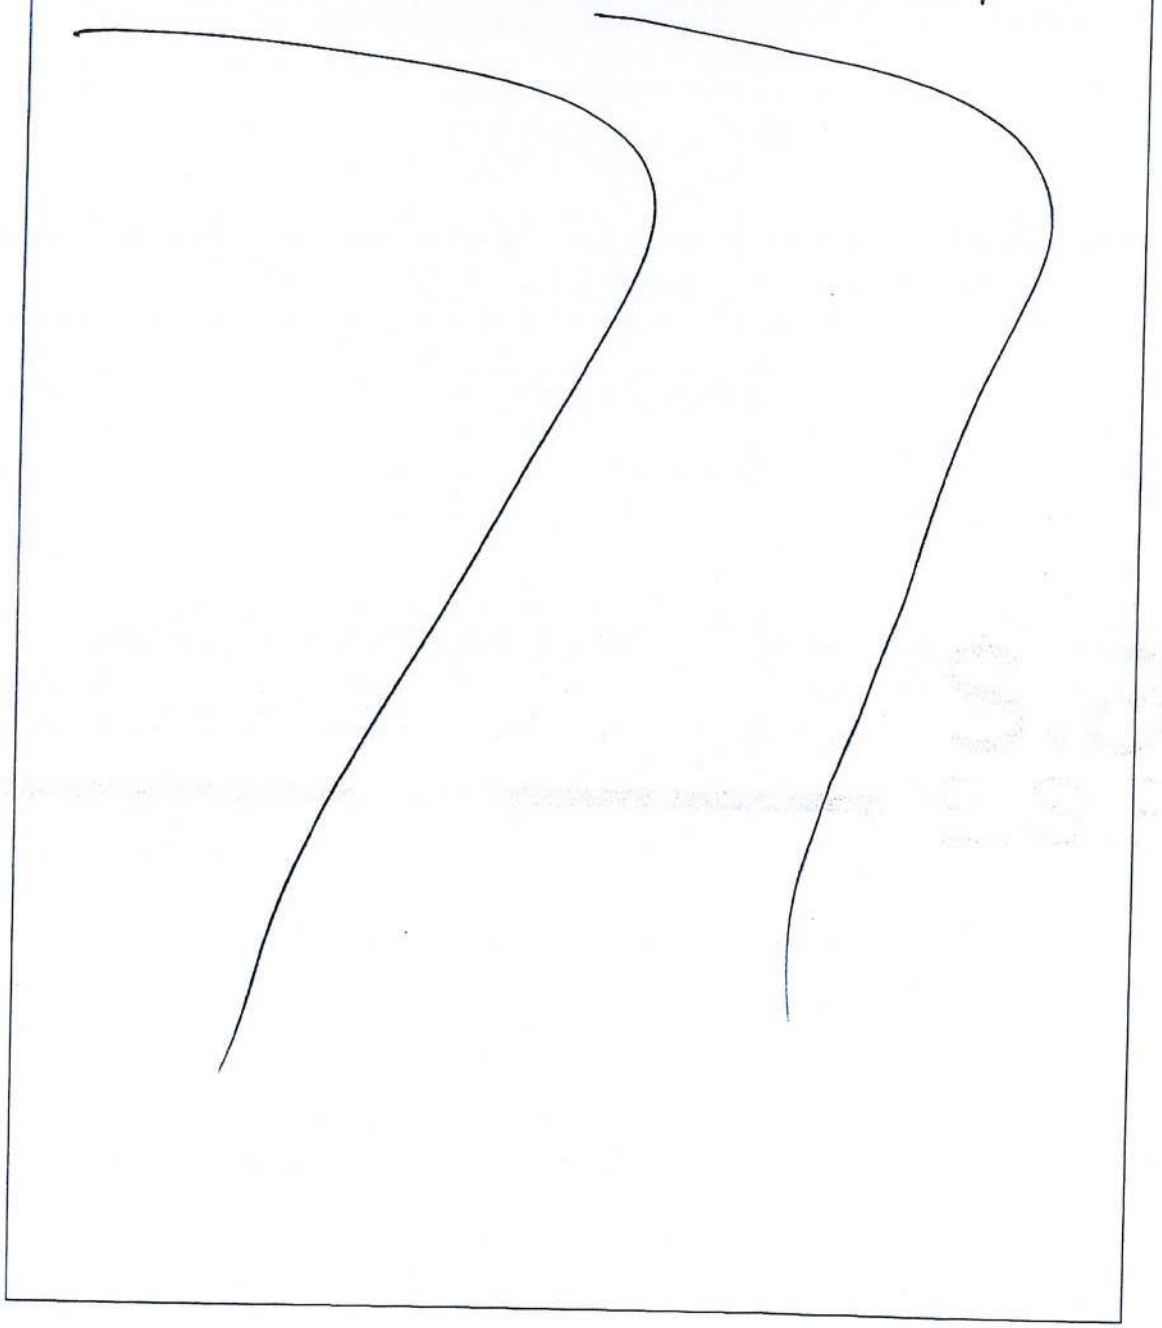

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Mover el poste de las calles 5 con vía a yopal - UT Buena Vista.
- Coordinar con las comisiones de Topografía - Synergia y Consinter

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Andrés López Mesa	Ing Director de Interventoría	
DIEGO PEREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	
Beyer Cantor B.	Profesional Apoyo UT Buenavista	

GA

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
19 / 01 / 2024	4:20 pm.	

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Instalaciones Union Temporal Buenavista.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Ing Diego Perez.	Ing Residente Obra.	Synergia Construcciones
	Ing Andrés López	Ing Director Interv.	Consintec del Oriente.
	Ing. Jeferson Salazar	Ing Director Obra.	U.T Buena Vista.

Hoja 3.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión Final Trazados redes de Iluminación Centro poblado Tilodiran Municipio de Yopal.

ORDEN DEL DÍA

- Revisión de la Información en planos
- Verificación de las actividades pendientes y compromisos anteriores.
-

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Los participantes del presente comité manifiestan que se ha trabajado de forma coordinada en el suministro de información de los dos proyectos para garantizar la ubicación de las redes por lo cual las comisiones de topografía de los dos proyectos unificaron coordenadas y los ejes de las vías proyectadas (Actividad que se realizo en el centro poblado de acuerdo a los compromisos Anteriores)
- De acuerdo a la información de diseño de las redes de iluminación se evidencia que realizaron el trazado de acuerdo a los ejes del pavimento para evitar futuras afectaciones sobre movimientos de postes. El director de Obras de la VT Buena Vista, manifiesta que se realizo el desplazamiento del poste de la Calle 5 con Vía a Yopal de acuerdo al compromiso anterior.
- El Ing residente de obra de Synergia Construcciones manifiesta que solamente se evidencia la afectación futura de 3 postes existentes de la Calle 5 entre calles 4 y 3 a los cuales les Tienen proyectado instalar luminarias el Ing. Director de VT. Buena Vista manifiesta que no hay inconveniente a mover esos postes por parte de Synergia Construcciones cuando se requiera realizar de acuerdo a la programación de obra del Alcantarillado pluvial.

G16

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

De acuerdo a los diferentes comites realizados se evidencia que se pueden adelantar las actividades electricas programadas y expuestas en los planes suministrados por la UT Buena Vista.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Hernan Salazar	Director de obra	
Luis Andres Lopez	Ing Director Interv.	

3 de 3

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
17 | 1 | 2024	2:30 pm	4:00pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodiran, Municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Diego Pérez	Residente de Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
3	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U
4	Ing Jairo Cubides	Profesional de Apoyo	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DÍA
• Visita de campo • Avance del proyecto • Actividades desarrolladas • Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita de obra en el emisario final del Alcantarillado Pluvial desde el pozo PP-44 (inicio de la servidumbre) hasta La estructura de descarga donde se aprecia la presencia de maquinaria (retroexcavadoras, minicargador, vibrocompactador, carrotanque), personal laborando, equipo menor (vibrocompactadores manuales tipo rana, canguro y venitin), comisión de topografía, Tubería PVC para alcantarillado pluvial de diámetro 60" y base granular acordonada cerca del eje de la excavación, también en bodega material crudo de rio clasificado Tmax. 3", base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), arena lavada y demás materiales necesarios para la construcción del proyecto. También se evidencia la presencia de controladores viales en los frentes de obra.

El contratista de obra manifiesta que el avance aproximado a la fecha es del 11%, de acuerdo a la programación el avance debería ser del 18%, expresa que se han presentado inconvenientes con los propietarios de las zonas de servidumbre (donde se construye el emisario final del alcantarillado Pluvial), debido a que no dejaron iniciar actividades de obra hasta que se realizaron acuerdos con cada uno de ellos, los propietarios indicaron que no podían sacar el ganado de los potreros y que los pastos se les podían dañar por el material particulado que se genera durante la realización de las actividades de la obra, esta situación genero demoras durante las conversaciones para permitir el ingreso de la maquinaria. Los propietarios de estos predios autorizaron el inicio de las obras con el compromiso por parte del contratista de realizar cercas con alambres de púas perimetrales al sitio de intervención, que se hicieran riegos en época de verano sobre las vías de circulación de los vehículos y disponer de bebederos para el ganado, entre otras. Esta demora no estaba programada ni se previó cuando se realizó el proyecto, por lo cual se afectó la ruta crítica de la programación.

Adicionalmente, el contratista de Obra informa que el ingreso con volquetas y los vehículos tipo turbo que transportan la tubería al sector comprendido entre el pozo de inspección PP-56 (aguas abajo de la PTAR) a la estructura de descarga ha sido muy complicado debido a que es un sector muy bajo y aún no se ha evaporado la escorrentía superficial que se acumula en esta zona en época de invierno. Por este inconveniente ha sido necesario disponer de una retroexcavadora para garantizar el suministro de materiales hasta los colectores del emisario del alcantarillado pluvia, esta movilización de la maquinaria ha disminuido la ejecución del proyecto debido a que no se ha podido incrementar los frentes de obra.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El contratista de obra manifiesta que, para incrementar los rendimientos de obra en los próximos días va a disponer de otro frente de obra y luego incrementara a tres en la construcción del emisario del Alcantarillado Pluvial, entre el pozo de inspección PP-56 a la estructura de descarga.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JAIRO LOBOS	PROP. DE APOYO	
DIEGO PEREZ	ING. RESIDENTE	
Luis Andrés López M.	Ing Director Interventoría	
Yajaira Sanchez	Prof. Apoyo a la Supervisor	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
23 | 2 | 2024	2:30 pm	3:30pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE PLANEACION, MUNICIPAL DE YOPAL.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	WILSON ARENAS	REFERENTE HIDROCARBUROS	ALCALDIA DE YOPAL
2	DIDIER CÓRDOBA	NEGOCIADOR TIERRAS	CEDEO
3	JOSÉ ÁLVAREZ	OBRAS CIVILES	CEDEO
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO	PROFESIONAL SOCIAL	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S.
5	YUDITH YAJAIRA SANCHEZ R	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ACUATODOS S.A.E.S.P
6	DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S.
7	LUIS ANDRES LOPEZ M.	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSINTEC DEL ORIENTE
8	ANDRES DIAZ M.		CEDEO
9	HAROL GARCIA CAMARGO	REPRESENTANTE SECRETARIA DE MOVILIDAD	ALCALDIA YOPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZAR A LA EMPRESA CEDRO EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PROPUESTO EN LA RESOLUCIÓN No 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VIAS URBANAS.

ORDEN DEL DÍA

- PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES
- ACTIVIDADES A DESARROLLAR
- RUTAS PARA TRAFICO PESADO
- COMPROMISOS

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SIENDO LAS 2:30 pm SE INICIA EL PRESENTE COMITÉ CON LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DE LA EMPRESA COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO "CEDRO", EL MUNICIPIO DE YOPAL, LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EL CONTRATISTA DE OBRA SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S Y LA INTERVENTORIA CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA INICIA LA INTERVENSIÓN MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE REUNION SE REALIZA DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA REUNION CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AREA SOCIAL DE CEDRO, EL CUAL SE REALIZO EL PRIMER ACERCAMIENTO PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 032 DE 2023.

LA INTERVENTORIA EXPONE LAS OBRAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE A DESARROLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL LAS CUALES INCLUYE LOS SIGUIENTES CAPITULOS:

- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL
- REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO, LA EJECUCIÓN DE ESTE CAPITULO ES CRITICA DEBIDO A LAS PROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓN MAYORES A 5 M Y EL TIPO DE SUELO QUE AL PARECER DE ACUERDO A LOS SONDEOS ES ARENA.
- INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN
- REPOSICIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS: ESTE CAPITULO INCLUYE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO.

SE ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO COPIA DE LA SOCIALIZACIÓN EN LA CUAL SE DESCRIMINAN DE FORMA GENERAL LAS OBRAS A CONSTRUIR (14 FOLIOS)

EL RESIDENTE DE OBRA, MANIFESTO QUE EL MUNICIPIO DE YOPAL OTORGO LA RESOLUCION No 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL DURANTE LA "CONSTRUCCIONES ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", DE ACUERDO A LOS CIERRES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE VAN A INTERVENIR LAS VIAS AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA LA CIRCULACION DEL TRAFICO PESADO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA CEDCO, POR LO CUAL SE PLANTEAN DOS RUTAS OPCIONALES PARA LA CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023.

DE ACUERDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR SE IDENTIFICO EL CRUCE DE LA CARRERA 3 CON CALLE 1 (VIA LOS MANGOS) COMO CRITICO PARA LA OPERACIÓN DE CEDCO, DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE DEBE CERRAR EL TRAFICO PARA GARANTIZAR LA ADECUADA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA PARA LAS DIFERENTES REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, POR LO CUAL ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCION EN ESTE SECTOR SE DEBE PROGRAMAR OTRA REUNION APROXIMADAMENTE EN TRES MESES PARA TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES POR PARTE DE LAS EMPRESAS Y GARANTIZAR EL TRANSITO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y HORARIOS QUE SE DEFINAN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS EN ESTA INTERSECCION.

LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CEDCO INFORMAN QUE CUANDO SE HAGA LA INTERVENSION DEL CRUCE DE LA CARRERA 3 CON CALLE 1, SOLO SE PODRIA MANTENER CERRADA LA VIA POR UN MAXIMO DE 24 HORAS YA QUE NO CUENTAN CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA OPERACIÓN, POR LO CUAL SE DEBE PROGRAMAR CON ANTERIORIDAD LA REALIZACIÓN DE ESTE CIERRE PARA ORGANIZAR LA LOGÍSTICA QUE SE REQUIERE Y LA DURACION DEL CIERRE.

JUEGO DE VERIFICAR LAS OPCIONES PARA LA CIRCULACION DEL TRAFICO PESADO, SE IDENTIFICO QUE LA OPCION 1 ESTA APROBADA POR EL MUNICIPIO DE YOPAL, Y LA OPCION 2 REQUIERE SER ANALIZADA PARA SER APROBADA POR EL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA VERIFICAR SI ES VIABLE LA CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS POR LA RUTA PROPUESTA Y SOLICITAR EL PERMISO DE UTILIZAR ESTA RUTA, SE PROGRAMA UNA REUNION PARA EL DIA MIERCOLES 28 DE FEBRERO A LAS 8:00 AM EN LA ESQUINA DE LA CARRERA 3 CON CALLE 2 PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN.

DE ACUERDO A LAS DECISIONES QUE SE TOMEN PARA EL FLUJO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS DENTRO DE LAS VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, SE DEBE REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD PARA INFORMARLES LAS RUTAS ESTABLECIDAS, DICHA SOCIALIZACION SE PLANTEA PARA EL SABADO 2 DE MARZO A LAS 10:00 AM.

REUNION OBRAS TITO.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Wilson Arenas	9163G267	
Didier Cordoba	14295826	
Andres Ortiz	98706032	
Jose Alvarez	7168457	
Hernil Garcia Romero	1118537487	
Angelica Trujillo	23.914.357	
Diego Perez	79941038	
Yajaira Sanchez	42.437055	
Luis Andres Lopez Mesa	4252839	

5 de 5

CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	SOCIALIZACION PAT ODERS COMPROMISO DEL PUEBLO.
ÁREA RESPONSABLE	HIDROCARBUROS
LUGAR	SALON DE JUNTAS PIMENTON
DIRIGIDO A	CEDCO, ALCALDIA, DE YOPAL
FECHA	
HORA INICIO	
HORA FINAL	

II. INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

Ítem	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	Número de documento	Edad	Género: Masculino	Género: Femenino	Género: OSIGD	Teléfono	Grupo étnico: NARP	Grupo étnico: Indígena	Grupo étnico: RROM	Grupo étnico: Ninguno	Población vulnerable: Discapacidad	Población vulnerable: Víctima	Población vulnerable: Migrante	Población vulnerable: Habitante de calle	Población vulnerable: Reincorporado	Población vulnerable: Privado de la Libertad	Población vulnerable: Cabeza de hogar	Población vulnerable: Gestante	Población vulnerable: Campesino	Población vulnerable: Ninguno	Datos institucionales: Entidad / Dependencia	Datos institucionales: Cargo	Datos institucionales: Correo electrónico	¿Acepta la Política de tratamiento de datos? * SI / NO	FIRMA O HUELLA
1	WILTON	ARENAS		9656609					3108178															ALCALDIA YOPAL.	REPRESENTE HIDROCARBUROS			
2	DIDIER	CORDOBA		14295826		X			310 2786053															ALCALDIA YOPAL	NEGOCIADOR TIERRAS CEDCO.			
3	JOSE	ALVAREZ		7168457		X			310850 3447.															ALCALDIA YOPAL	OFICINA CEDCO.			
4	ANGELICA	TRUJILLO		23914317			X		320477 3522															SYNERGIA CONSTRUCCIONES	PROFESIONAL SOCIAL			
5	DIEGO	PEREZ		79941000		X			3123538															SYNERGIA CONSTRUCCIONES	RESIDENTE OBRA			
6	YAJAIRA	SANCHEZ		47.457055			X		310767 9385															ACUATODOS	PROF. APOYO ADMINISTRATIVA			
7	LUIS ANDRES	LOPEZ MESA		7252834		X							X											INTERVENTORIA	ING DIRECTOR.	consintecdelamiente@gmail.com.		
8	ANDIE	ORTIZ		1080000002		X			3105779270				X											CEDCO	D.D.S	valeria.ortiz@cedco.gov.co		
9																												
10																												

III. INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE		DOCUMENTO		CARGO / NÚMERO DE CONTRATO		PROGRAMA / ÁREA / PROYECTO	

Convenciones OSIGD: Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diverso NARP: Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

* Política de tratamiento de datos: www.yopal.gov.co/Transparencia y acceso a la información pública/ 1. Información de la Entidad/ Políticas y Reglamentos (http://www.yopal.gov.co/politicas y lineamientos/politica de tratamiento de datos personales 1.96.119)

SOCIALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

LOCALIZACION

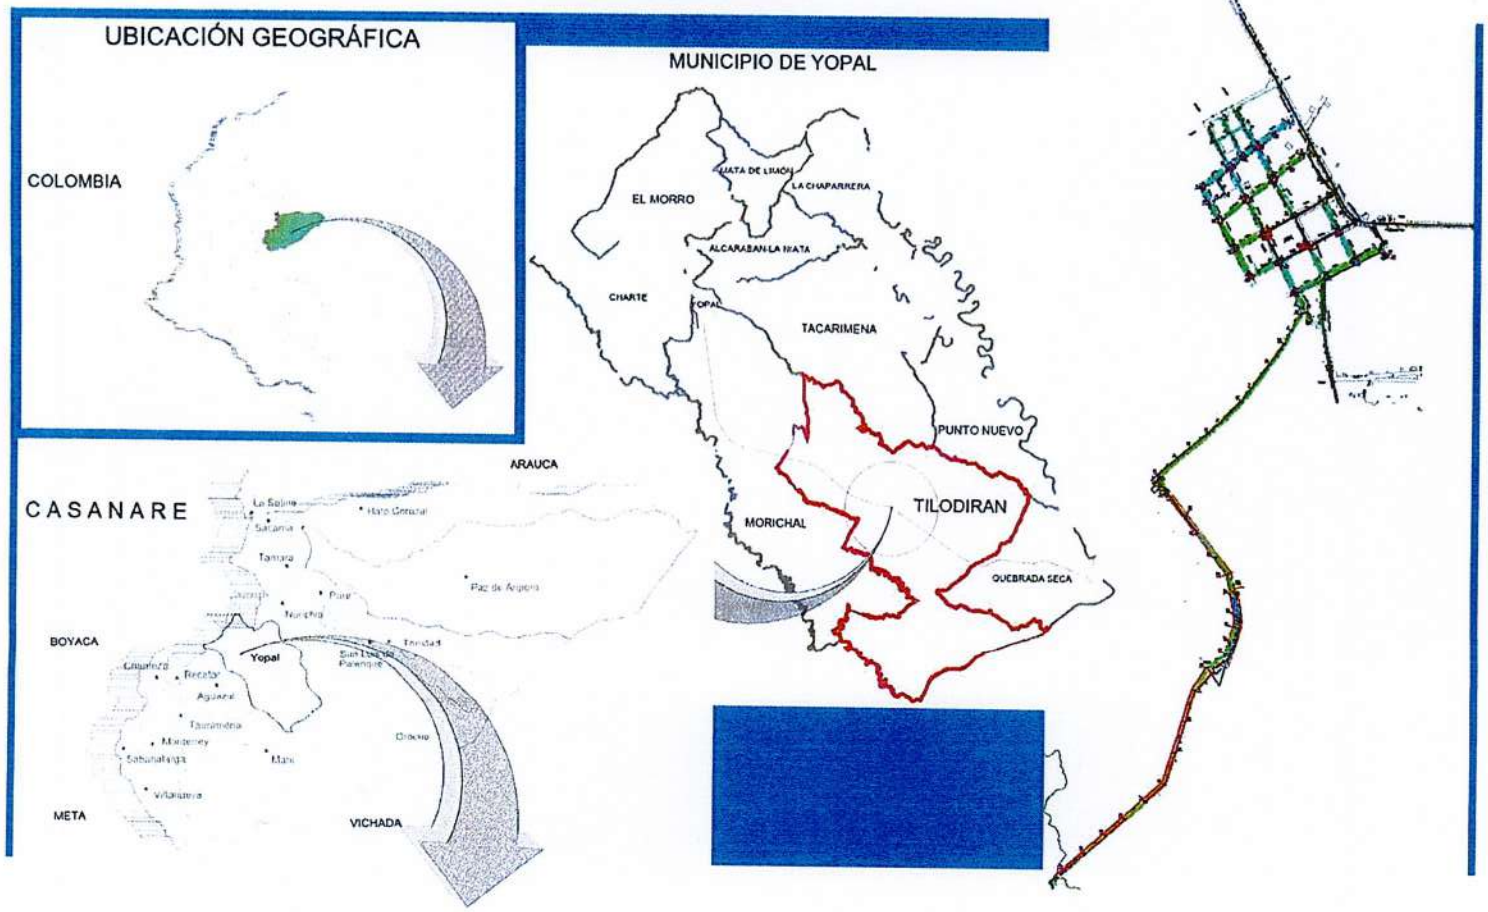

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

628

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO BPIN	2023005850020
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
APROBACION:	DECRETO DEPARTAMENTAL 0130 DEL 6 DE JUNIO DE 2023
VALOR:	$ 41.022.265.889,00
FUENTES DE FINANCIACION:	**$ 41.022.265.889,00** (100%) – REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION
ENTIDAD EJECUTORA:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
PLAZO DE EJECUCION	12 MESES

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

629

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	INVERSION
EJECUCION DE OBRA FISICA	$38.919.603.368,00
INTERVENTORIA	$2.041.894.296,00
APOYO A LA SUPERVISION	$60.318.720,00
TOTAL	**$41.021.816.384,00**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

CONTRATOS DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023 (10 MESES)	$38.919.603.368,00	SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 844.004.840-0
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE 2023 (11 MESES)	$2.041.894.296,00	CONSINTER DEL ORIENTE E.U. NIT: 900.326.145-4
APOYO A LA SUPERVISION **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 031 de 2023 (12 MESES)**	$60.318.720,00	YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS C.C: 47.437.055 de YOPAL

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

631

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
CAP-1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	$ 25.145.962.141,70
CAP-2	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 2.970.483.314,45
CAP-3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 145.528.668,58
CAP-4	REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO	$ 716.159.698,10
CAP-5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 9.724.559.375,88
	PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 63.633.447,00
	PLAN DE MANEJO DEL TRAFICO (PMT)	$ 153.276.722,00
	VALOR TOTAL OBRA	**$38.919.603.368,00**

632

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL



Tuberia PVC 12"	545,20
Tuberia PVC 18"	163,80
Tuberia PVC 24"	439,80
Tuberia PVC 33"	194,40
Tuberia PVC 36"	341,60
Tuberia PVC 39"	110,70
Tuberia PVC 48"	374,30
Tuberia PVC 60"	2.100,70
TOTAL =	4.270,50

acuatodos s.a. E.S.P.

633

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

acuatodos s.a. ESP




Tuberia PVC 8"	150,60
Tuberia PVC 10"	149,10
Tuberia PVC 12"	585,20
TOTAL =	884,90

Tuberia de Polietileno Ø=110 mm = 4"	1.550,00

634

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VIAS A PAVIMENTAR

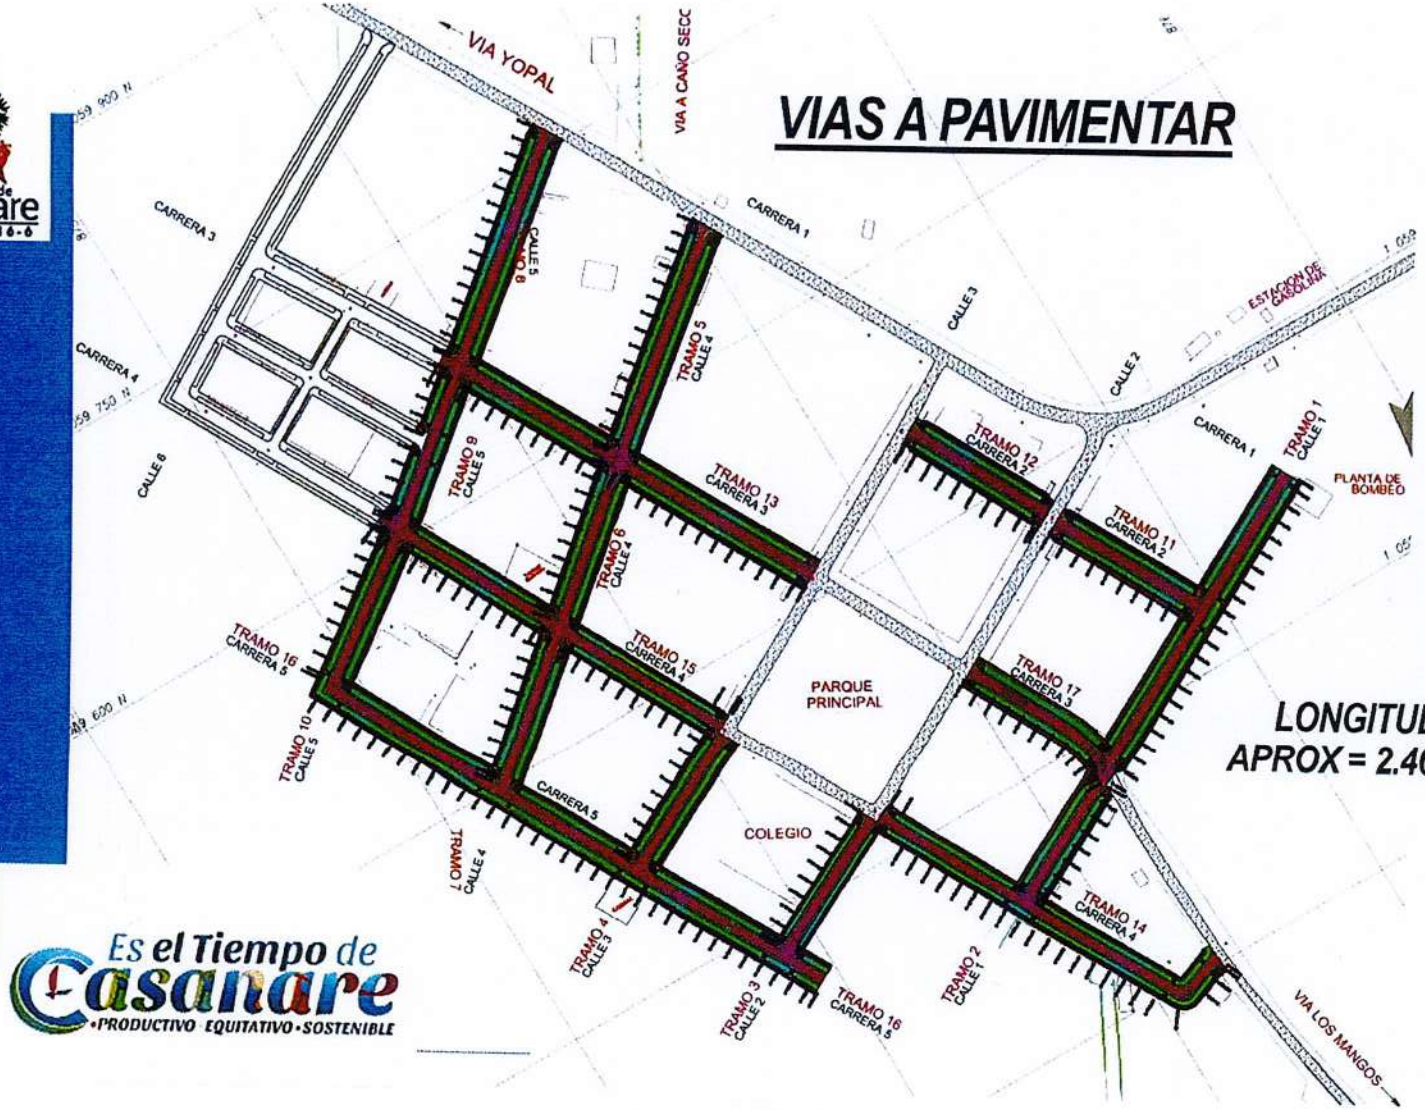

LONGITUD APROX = 2.466 M

acuatodos s.a. E.S.P.

Es el Tiempo de Casanare
•PRODUCTIVO •EQUITATIVO •SOSTENIBLE

635

VIAS TRAFICO PESADO



ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


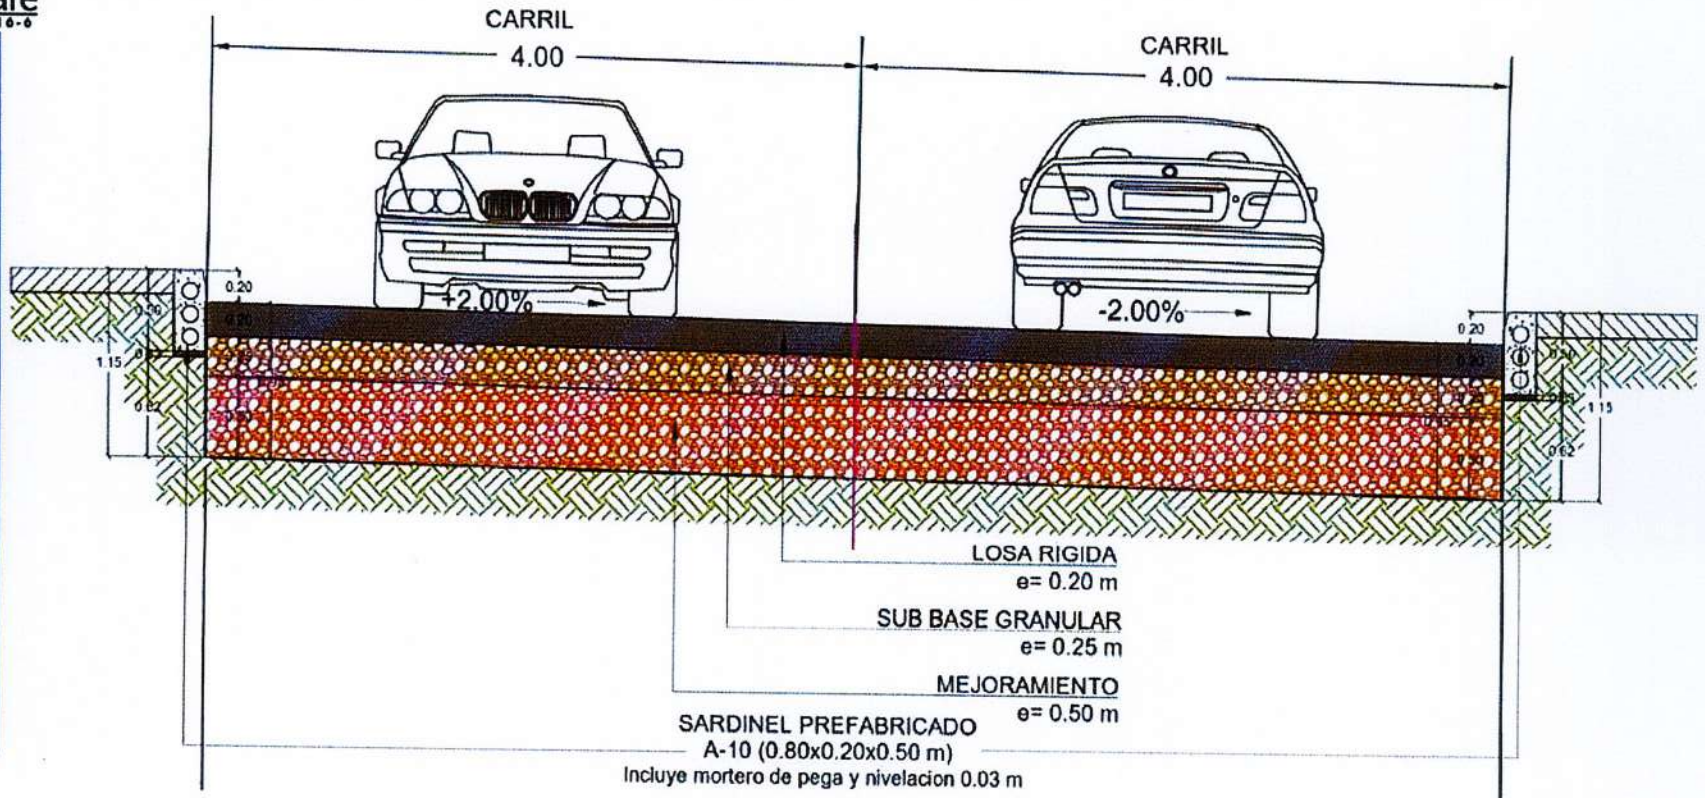



Ilustración 1. Estructura del pavimento

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6


acuatodos s.a. E.S.P.

EJEMPLOS DE ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

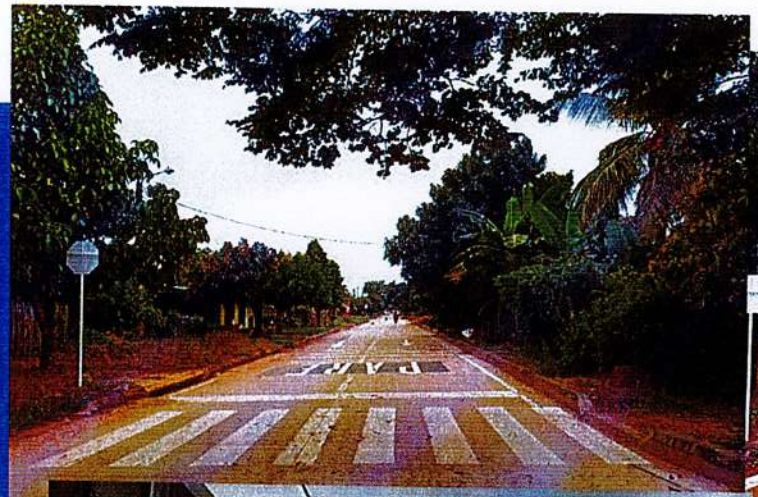

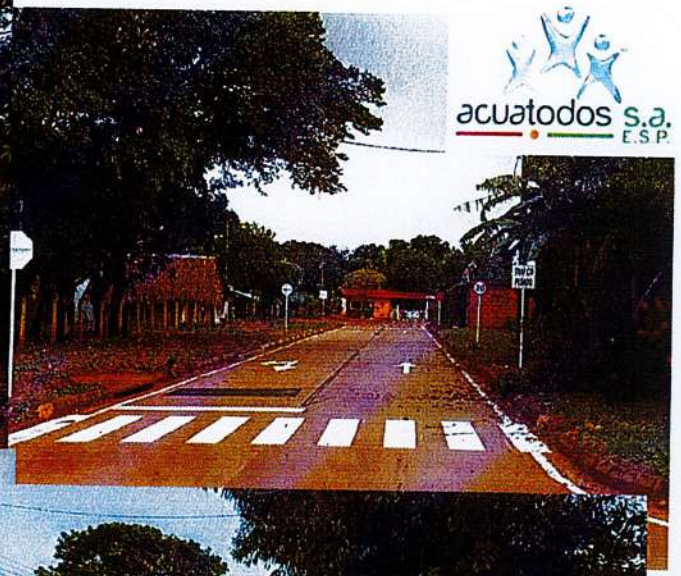



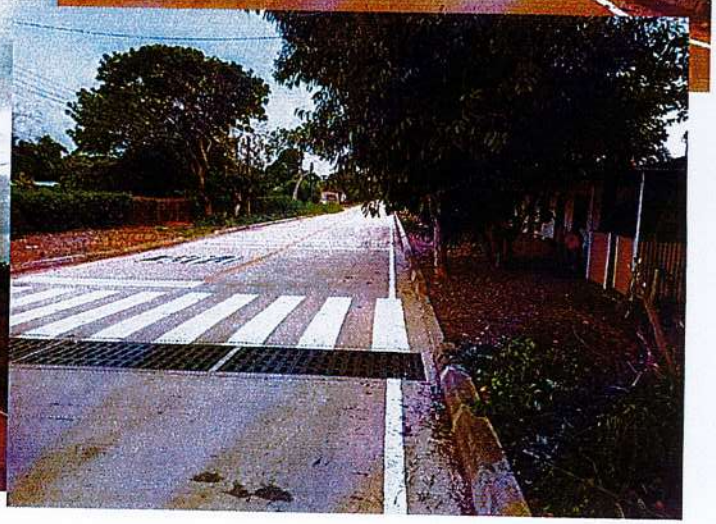

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos S.A. E.S.P

EJEMPLOS DE SUMIDEROS LATERALES



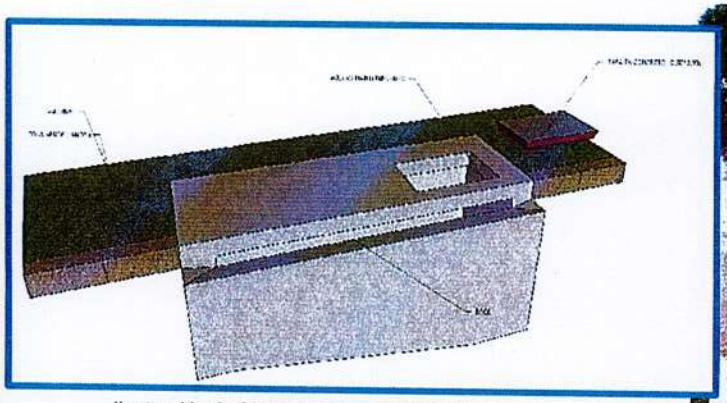


Ilustración 2. SUMIDEROS LATERALES



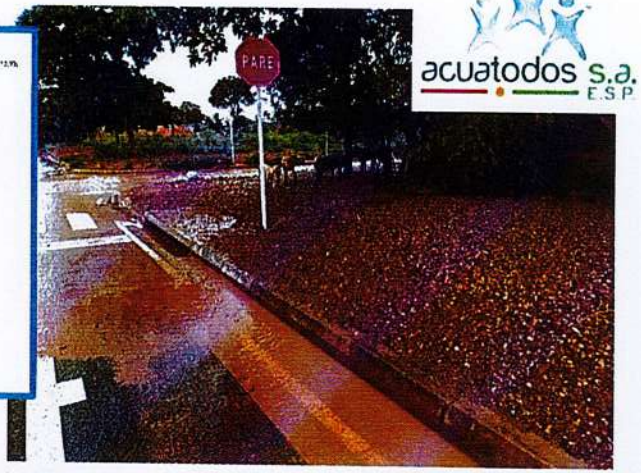

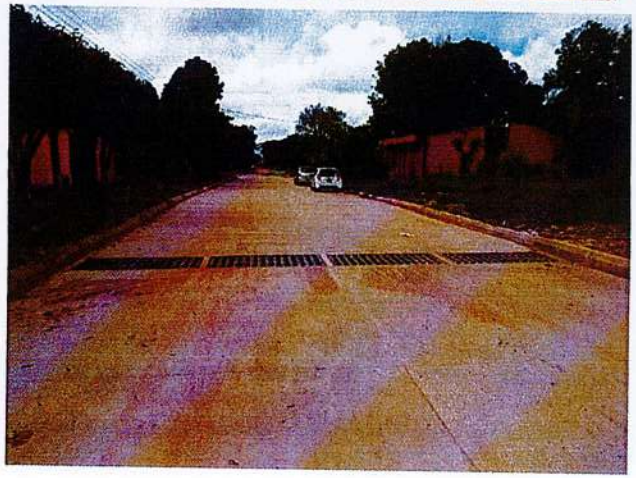

GRACIAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

acuatodos s.a. E.S.P.

SGR

DNP

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
28 | 2 | 2024	8:10 am.	10:15 am.

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Carrera 3 con Calle 2 Parque Central Tilodiran.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Carlos Barrera	Asistente Logistico	CEDCO
	Andres. Forero	Especialista Comunidades	CEDCO
	Jose Alvarez	Proyectos Obras Civiles	CEDCO
	Judith. Figueroa Sanchez	Prof. de apoyo sup.	Acuatodos S.A
	Didier. Cordoba	Gestor Tierras	CEDCO
	Diego Perez	Residente de Obra	Synergia Constructora
	Luis Andrés Lopez Mesa	Director Interventoría	Consintec del Oriente

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar los posibles Rutas para el Transito de Vehiculos pesados durante la ejecución del Proyecto.

ORDEN DEL DÍA

- Visita de los posibles rutas para el Trafico pesado
- Prueba con un Tracto camion.
- Conclusiones.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Al inicios la reunión se realiza el recorrido para realizar el desvio de los vehiculos de carga desde y hacia la vereda los mangos se han identificado dos posibles opciones.

- Opcion 1: Via al Algarrobo se toma la calle 2 en la carrera 2 se gira a la izquierda hasta la calle 1 luego se gira a la derecha hasta la via a los mangos. (carrera 3) en la cual se gira de nuevo a la izquierda
- Opcion 2: Via al Algarrobo se toma la calle 2 hasta la carrera 3 donde se gira a la izquierda hasta la calle 1 y se toma la via a los mangos.

Se realiza el recorrido de las dos posibles opciones caminando donde se identifica que antes de conducir el transito por estas vias se deben hacer actas de vecindad. para identificar el estado de las viviendas y las vias. antes de la operación.

* Los representantes de CEDCO solicitaron un tractocamión con trailer para realizar una prueba de la circulación de estos vehiculos.

Se identifico que es viable el transito por la opción 2 tanto de ingreso como de salida del centro poblado al realizar la prueba se evidencio que la opcion 2 es mas viable dado que se elimina un cruce a 90° y en la intersección para

Tomar la vía a la vereda los mangos en la calle 1 con carrera 3 es más suave la curva para los vehículos de estas características.

*Conclusiones:

- Al definir las opciones de desvío de los vehículos pesados se debe contar con controladores de tránsito debido a los radios de curva y el tránsito sobre la calle 2 entre carreras 3 y vía al Algarrobo
- Antes de iniciar la operación se deben realizar las actas de vecindad de las vías y las viviendas para tener las evidencias del reconocimiento de las estructuras.
- Se debe socializar ante la comunidad las opciones del tránsito de vehículos pesados que se definan
- Se debe realizar una reunión con los demás actores viales que utilizan esta vía tales como Emerald, frontera, los Palmeras, arroceros, entre otros.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Amilo BARRERA P	ASISTENTE LOGISTICO	
Ignacio Andrade Lago	Gerente Comunidad	
JOSE AZUAREZ.	PROYECTOS OBRA CIVIL.	
Yudith Tejeira Jaulag	Prof. Apoyo a la Supervisión	
DIDIER CORDOBA	GESTOR TIERRAS CEDICO	
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA SANEAMIENTO	
Luis Andrés Lopez M.	Ing Director. Consultor del Oriente.	
JAIRO LOBIDES	ING. RESIDENTE	

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
04 | 03 | 2024	10:00 a.m.	11:00 am.

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Instalaciones despacho Municipio de Yopal

II. ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Judith Yaneiza Sanchez	Prof de Apoyo Supervision	ACUATODOS SA.
	Wilson. Arenas.	Asesor Despacho	Alcaldia de Yopal
	Juan Manuel Holguin	Prof. Contratista Sec.	Movilidad Municipio Yopal
	Maria Angelica Trujillo	Prof. Social.	Synergia Construcciones
	Martha Chaparro	Coordinadora Social	Enero/d.
	Luis Andres Lopez Mesa	Ing Director Interv	Consorcio del Oriente

1 de 4

6/15

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informar a la empresa Emerald el Plan de manejo de tránsito propuesto en la resolución No. 030477 del 9 de febrero de 2024. Permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los participantes
- Alcance del proyecto
- Ruta para tráfico pesado
- Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicial el presente comité con la presentación de cada uno de los asistentes por parte del municipio de Yopal, la empresa departamental de Servicios Publicos "ACUATODOS SA ESP" consintes del Oriente EU. Interventoria contratada, synergia Construcciones. Contratista de Obra y la operadora Emerald.
- Se realiza una breve explicación de las actividades que se van a realizar durante la ejecución del proyecto los cuales incluyen redes del Alcantarillado Sanitario y Pluvial, traslado de redes de acueducto y la pavimentación de las calles del centro poblado. Para realizar las actividades establecidas contractualmente se requiere el cierre de vias. por lo cual el contratista de Obra solicito ante el municipio de Yopal el Plan de Manejo de tránsito el cual fue aprobado de acuerdo a la resolución No. 030477 del 9 de febrero de 2024. el cual se va a implementar durante toda la ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con una ruta para el trafico de vehiculos pesados se esta definiendo la ruta más viable para tener la menor afectación de los vehiculos pesados que continuamente tienen que utilizar esta vía debido a que la mayoria de las actividades establecidas en el proyecto se van a realizar en este sector y por lo tanto se debe suspender temporalmente el flujo vehicular en la vía establecida

- Luego de analizar varias opciones de desvio del trafico pesado por el Centro poblado de Tilodiran se ha propuesto por parte del Contratista de obra la siguiente ruta hacia la vereda los monjes:
Los vehiculos que ingresan por la Via al Algarrobo giran a la derecha en la calle 2 hasta la carrera 3 (esquina del parque) luego giran a la izquierda para tomar la via a la vereda los monjes. en la Calle 1, esta ruta se va a enviar a la secretaria de Movilidad. para su aprobación e implementación de acuerdo a lo establecido contractualmente. y teniendo en cuenta los horarios
La Coordina Social de Emerald manifiesta que esta ruta se debe socializar con la comunidad y se deben hacer actas de vecindad antes de desviar los vehiculos pesados por esta ruta.
- De acuerdo a lo expresado por la Secretaria de Movilidad. el contratista de Obra debe solicitar los ajustes pertinentes de la resolución No 03047 del 9 de febrero de 2024 en la cual se incluya la ruta de trafico pesado y los horarios en los cuales se contara con controladores viales para garantizar la movilidad segura en el centro poblado durante el tiempo que se utilice el desvio del trafico pesado.
- Las determinaciones que se tomen se estaran informando oportunamente para que Emerald cordere su operación de los vehiculos pesados.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Realizar actas de vecindad, realizar Socialización con la comunidad del centro poblado

FIRMA DE LOS ASISTENTES 04 Marzo 2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yudith Yagama Sánchez	Prof. Apoyo a la Supervisión ACUATODOS	
Wilson Arenas	Asesor Despacho Alcaldía de Yopal	
Juan Manuel Holguín	Profesional contratado Sec. Movilidad Yopal	
Ma. Angelica Trujillo	Prof. Social Sinergia Construcciones	
Martha P. Chaparro	Coord. Social	Martha Panaparro
Luis Andrés López M.	Ing. Director Interventoría	Consultor del Oriente E.U.

4 de 4

48

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoria No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
20 / 03 / 2024	10:15 am.	11:30 am

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Centro Poblado de Tilodiran.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Jeferson Salazar.	Director Obra	U.T Buena Vista
	Ivan Ricaurte.	Ing Residente obra	U.T Buena Vista
	Jairo Rojas	Ing Residente Interv.	Jairo Enrique Perez
	Andres López	Director Interventoria	Consultor del Orient.
	Diego Perez	Ing Residente Obra	Synergia Construcciones

1 de 3

641

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión Postes que fueron necesario desinstalarlos por el desarrollo de la Obra.

ORDEN DEL DIA

Presentación Asistentes
Visita de Obra
Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

*Luego de realizar la presentación de los asistentes se procede a informar por parte del contratista de obra que debido a la inestabilidad del Terreno (arenoso), elevados profundidades de excavación y nivel freatico presente en la carrera 4 entre calles 1 y (estación) via Aguazuelo y en la calle 1 entre carreras 1 y 2 a sido necesario desinstalar tres (3) postes para garantizar la integridad de los elementos y la seguridad de los habitantes del centro Poblado.

*Se procede a visitar los frentes de Obra y se evidencia lo informado por el Contratista de Obra, aunque se esta colocando entibado los taludes han fallado lo que ha generado sobre excavaciones no previstas inicialmente.
El contratista manifiesta que estan modificando los entibados para evitar generar mayores excavaciones y proteger los otros postes instalados.

*Los representantes de UT Buena Vista y la interventoria del alumbrado solicitan que una vez terminen las actividades de relleno se vuelvan a instalar los 3 postes y se dejen cimentados cumpliendo las normas para garantizar la estabilidad de estos elementos. El contratista de Obra manifiesta el compromiso de volver a dejar los postes en los sitios que se encontraban instalados, si se llegan a presentar inconvenientes se deben garantizar las condiciones en que deben instalarse los postes electricos.

2 de 3

050

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Volver a instalar los 3 postes desinstalados a la fecha con su debido cimiento. y garantizar la integridad de los postes y redes instalados en el centro poblado de Tilodiran y Sinarcio Construcciones

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector Salazar	Director de obra	
Iván Ricaurte P	Ingeniero Residente Obra	
Jairo H. Rojas P	Residente Interventoria	
Luis Andrés López	Ing Director Interventoria	
DIEGO PEREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	

3 de 3

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
15 | 04 | 2024	10:30 am.	12:30 pm.

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Centro Poblado de Tilodiran.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Yahaira Sanchez	Prof Apoyo Supervisión	ACUATODOS SA ESP
	Diego Perez	Residente de Obra	Synergia Construcciones
	Luis Andrés López R.	Director de Interven	Consintec del Oriente
	Angelica Trujillo	Profesional Social	Synergia Construcciones
	Edgar Corredor.	Comunidad Vereda	
	Jose Maldonado	Edil.	
	Johana Maldonado	Edil	
	James Yeth Mesa Vanegas	Comunidad Vereda.	
	Albeiro Corredor	Comunidad Vereda	

C-2

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaraciones a las solicitudes realizadas por los representantes de la comunidad.

ORDEN DEL DIA

- Presentación de los asistentes
- Aclaraciones a las apreciaciones por parte de los líderes de la comunidad.
- Entrega de información

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Se realiza presentación de cada uno de los asistentes a la presente reunión
* La comunidad manifiesta que la alcantarilla diagonal a Disney quedo en vacio. La interventoria manifiesta que la disposición que tiene la alcantarilla se evidencia que fue realizado durante el proceso constructivo esta alcantarilla no fue necesario demolerla debido a que el tubo del alcantarillado pluvial paso por debajo y no fue necesario demoler parte de esta estructura por lo cual la interventoria solicito rellenar la parte inferior con concreto. Ciclopeo sobre el relleno inicial de la tubería para continuar y llenar los huecos por debajo de la alcantarilla.
- Los representantes de la comunidad solicitan se aclare el proceso constructivo. El Ingeniero residente informa que luego de realizar la excavación se procede a instalar la cama o soleado de la tubería luego se realiza el relleno inicial y atraque hasta 30 cm sobre la cota lomo con base granular de 1 1/2". Despues se realiza el relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado el material que no cumple se dispone en los sitios autorizados y se rellena con la brevedad optima.
- Los representantes de la Comunidad solicitan se aclare de donde se esta trayendo la arena para el proyecto. El Ingeniero residente aclara que toda la arena para el proyecto se suministra desde Yopal.

2 de 4

- Luego de aclarar las dudas se procede a realizar visita de campo para identificar y terminar de aclarar las inconvenientes expresados por la comunidad. En la carrera 4 con Vía a la Vereda Agualinda se puede identificar la arenera con la que se está realizando la construcción del Pozo de inspección la cual es suministrada por el contratista desde el acopio de la bodega a los diferentes frentes con retroexcavador. (Registro fotográfico). Posteriormente se revisa la alcantarilla ubicada a los predios del señor Disney en la cual se evidencia que ya se relleno con material seleccionado los costados de la alcantarilla también se revisa el interior de los tubos y no se evidencia daño estructural por la instalación de la tubería del alcantarillado pluvial, sin embargo la estructura se mantendrá en observación para garantizar la estabilidad cuando entre en operación. También se realiza visita a la Vía provisional para el desvío del tráfico hacia la Vereda Agualinda donde se puede evidencia que de acuerdo a compromisos anteriores por parte del Contratista de Obra se realizo la instalación de un tubo para garantizar la evacuación de la escorrentía superficial del agua que se queda acumular proveniente de los predios aguas arriba del terraplén, al igual se bajo más el tubo de la intersección de la servidumbre hacia la PTAR y la Vía provisional y se realizo un canal para descolar las aguas llueve paralelo a la red eléctrica, los representantes de la comunidad manifiestan si es posible incrementar los descoles aguas abajo para que se evacue más rápido el agua que se queda acumular en este sector.
- La interventoría realiza entrega de los documentos solicitados por la señora Alberta Corredor los cuales fueron:
  - Contrato de obra 032 de 2023
  - Socialización Inicial del proyecto realizada el 27/10/2023

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Ma. Angelica Trujillo Delgado.	Profesional Social	
[illegible]	VEEDURIA COMUNIDAD	
[illegible]	VEEDURIA. PTE ASOJUNTAS	
[illegible]	[illegible]	
Lina Maldonado	Edil	
Jose Maldonado	Edil	
[illegible]	[illegible]	
Luis Andres Lopez M.	Director Interventoria.	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
24 / 4 / 2024	2:00 pm	4:00pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodiran, Municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Diego Pérez	Residente de Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
3	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U.
4	María Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DÍA
• Visita de campo • Avance del proyecto • Actividades desarrolladas • Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita de obra en el tramo 38 (PZ 36N AL PZ 37N) del alcantarillado sanitario ubicado en la calle 1 entre carreras 1 y 2, emisario final del Alcantarillado Pluvial desde el pozo Tramo 40 (PP-41 al PP-40) y Tramo 39 (PP40 al PP39), se están realizando actividades para la construcción de la estructura de descarga, donde se aprecia la presencia de maquinaria (retroexcavadoras, minicargador, vibrocompactador, carrotanque), personal laborando, equipo menor (vibrocompactadores manuales tipo rana, canguro y benitin), comisión de topografía, Tubería PVC para alcantarillado pluvial de diámetro 12", 60" y base granular acordonada cerca del eje de la excavación, también en bodega material crudo de rio clasificado Tmax. 3", base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), arena lavada, acero de refuerzo y demás materiales necesarios para la construcción del proyecto. También se evidencia la presencia de controladores viales en los frentes de obra.

El contratista de obra manifiesta que el avance aproximado a la fecha es del 44%, de acuerdo a la programación el avance debería ser del 60%, manifiesta que se han presentado inconvenientes durante la ejecución del alcantarillado sanitario debido a la inestabilidad del material y al elevado nivel freático, aunque se han instalado entibados el material es poco cohesivo y dificulta las actividades programadas, repercutiendo en demoras que están afectando la ruta crítica de la programación.

Todas las actividades que se están realizando han requerido el trasiego de agua (manejo de aguas) debido al elevado nivel freático y a la escorrentía superficial generada por las elevadas precipitaciones que se han presentado en el centro poblado de Tilodiran.

La interventoría y el profesional de apoyo a la supervisión solicitan al contratista de obra se tomen medidas para incrementar los rendimientos de obra debido a que se evidencia una diferencia del 16% en la programación, que afecta la ejecución del proyecto debido a lo establecido contractualmente.

El contratista de obra manifiesta que se han tenido acercamientos con la comunidad para definir la ruta provisional de tráfico pesado hacia la vereda los mangos, durante la ejecución del proyecto de acuerdo a lo solicitado a la secretaria de Movilidad del Municipio de Yopal, por lo cual en los próximos días se realizara la socialización de la ruta que se apruebe.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El contratista de obra manifiesta que van a tomar medidas para mejorar el avance del proyecto, debido a que los inconvenientes presentados a la fecha no eran previsibles durante la realización de la programación inicial del proyecto.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yudith Yaguara Sandoval	Prof. Apoyo Supervisión Acuatodos	
Luis Andrés López Mesa.	Ing. Director de Interventoría.	
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Diony Bonilla	Kleopl	

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
25 | 04 | 2024	5:20 pm.	6:10 pm.

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Instalaciones de Consintec del Oriente C.V.

II. ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Judith Fabiola Sanchez	Prof de Apoyo Sup.	ACUATODOS SA ESP
	Maria Angelica Trujillo	Prof Social	Synergia Construcciones
	Martha Patricia Chaparro	Prof Social	Encargada
	Luis Andres Lopez M.	Director Interventoria	Consintec del Oriente
	Diego Perez	Residente de Obra	Synergia Construcciones

G51

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar. Resolución No. 030477 del 9 de febrero de 2024 y actuaciones posteriores

ORDEN DEL DIA

- Presentación de los Asistentes
- Entrega información
- Socialización e interpretación de la información
- Conclusiones.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Se inicia el presente comité con la presentación de cada uno de los asistentes al presente comité.
* Por solicitud de la secretaria de la empresa Emcatel se realiza entrega de la siguiente información:
- Resolución No. 030477 del 9 de febrero de 2024
- Oficio Ajuste, radicado el 23 de abril de 2024, horarios
- Plano ruta alterna trafico pesado hacia la vereda los mangos
* Se realiza la interpretación de la información por parte de los contratistas de obra e Interventoría de acuerdo al plano suministrado el cual fue enviado a la secretaria de Movilidad del Municipio de Yopal, en la cual se puede tomar la siguiente ruta:

Los vehículos pesados ingresaran al centro poblado por la calle 2 hasta la carrera 3 donde se realiza el giro a la izquierda para tomar la vía a los mangos.

Se informa que para realizar este ingreso se deben tener en cuenta los siguientes horarios. (Unicamente)

Lunes a Viernes de 9a 11 am y de 3 a 5 pm.
Sábado de 9 a 11 am.

- Conclusiones: Para vincular a la comunidad se debe realizar socialización de las medidas autorizadas por el municipio de Yopal para las vías alternas del Trafico Pesado

se plantea tentativamente realizar dicha reunión con la comunidad para el día viernes 3 de mayo en horas de la tarde o el sábado 4 de mayo.

- Luego de esta reunión se debe programar la realización de las actas para verificar el estado del pavimento antes de realizar el desvío de los vehículos pesados
- El contratista de obra debe instalar las vallas o pescadillas con la información de los horarios y los desvíos autorizados por la secretaría de movilidad.

3 de 4

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ma. Angelica Trujillo	Profesional Social	
Martha P Oropeza	Coord - Social EEC	Martha P Oropeza
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Luis Andres Yañez M	Ing Director Interventoria	
Yudith Yepez Sanchez	Prof. Apoyo Supervisor ACUATODOS	

4 de 4

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización Ruta para el trafico de vehiculos pesados, de acuerdo a la Resolución No. 03047 del 9 de Febrero de. 2024.

ORDEN DEL DIA

-Desarrollo de la Reunión
-Presentación ruta trafico vehiculos pesados hacia la vereda los mangos
-Proposiciones y Varios

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión siendo las 9:30 am del Sabado 4 de mayo de 2024, Con la presencia de la comunidad del centro poblado de Tilodiran, contratista de Obra Synergia Construcciones e Ingenieria S.A.S, Interventoria Consorcio del Oriente C.U, Profesional de Apoyo a la supervisión por parte de la Empresa Departamental de servicios publicos de Casanare, ACUATODOS SA ESP, Representantes del Municipio de Yopal y la empresa operadora CEDCO.
El Area Social de la empresa contratista de Obra realizo la presentación del proyecto y la ruta para el trafico pesado durante la Ejecución del proyecto.
- La Interventoria manifiesta las diferentes actuaciones que se han realizado para establecer la ruta mas viable y con menor afectación en el centro poblado que ademas genere el menor traumatismo en las labores diarias de los habitantes.
Se le informa a los habitantes que durante la ejecución de las actividades dentro del centro poblado no se puede seguir utilizando la via que actualmente utilizan los vehiculos pesados para el ingreso a la vereda los mangos debido a que la mayoria de las actividades se centran sobre la Carrera 5 y ademas es el sector de los mangos

04/05/2024 1 de 6

profundidades de excavación
El proceso constructivo es realizar la construcción de las redes del alcantarillado sanitario, posteriormente construir los colectores del alcantarillado pluvial, traslado de redes de acueducto y se finaliza con las obras complementarias que incluyen la pavimentación de las vías. Estas actividades son demoradas debido a la complejidad del terreno natural que hasta ahora es arenoso y muy inestable lo que implica trabajar con las condiciones de seguridad para disminuir los riesgos, esto genera bajos rendimientos de obra que atrasan la ejecución del proyecto. Con el propósito de evitar cargas en la vía se debe desviar el tránsito pesado por vías que no se van a intervenir o por donde se genere el menor riesgo y afectación de los habitantes.
El Contratista de Obra realizo los tramites pertinentes para realizar los cierres totales y Parciales de Vías Urbanas del centro poblado para lo cual el Municipio de Yopal realizo la resolución No. 03047 del 9 de febrero de 2024 y se solicito el ajuste para incluir la siguiente vía de trafico pesado durante la ejecución del proyecto. desde y hacia la Vereda los mangos: Calle 2 entre la vía Yopal- Aguazul y Carrera 3 entre calle 2 y calle 1 y se toma la vía a los mangos los horarios propuestos que tendrá la ruta para el trafico pesado en el sector es. Lunes a Viernes 9 a 11 am y de 3 a 5pm. y el día sabado de 9 a 11. am.
Los horarios se establecen de acuerdo a la menor afluencia de niños para lo cual se tienen en cuenta que no coincidan con el ingreso y salida de Colegio.
Estos horarios han sido concertados con los operadores de los pozos petroleros de la zona quienes son los que inciden en el mayor numero de vehículos pesados dentro del centro poblado de Tilodiran.
En estos horarios se contara con controladores viales por parte

del contratista de Obra. (3)
Los representantes de la comunidad manifiestan que se deben revisar las viviendas para que si por el transito de los vehiculos pesados se presentan afectaciones al igual se debe revisar la via (calle 2 hasta la via el algarrobo) y la alcantarilla que se encuentra en la llegada al terraplen, tambien se deben revisar los reductores de velocidad existentes
El Contratista de Obra se compromete a realizar las actas de vecindad de cada una de las viviendas y se entregara copia a los propietarios para que la conserven en el caso de alguna reclamación.
Para revisar la via antes de realizar el desvio del trafico pesado se solicita acompañamiento de los representantes de la comunidad.
Antes de realizar la solicitud de la via provisional del trafico pesado se realizaron pruebas con un tractocamión para verificar que era viable la via propuesta.
Los representantes de la comunidad solicitan se tomen medidas adicionales durante la cosecha de arroz y la entrada y salida de los camiones con ganado. El contratista de obra manifiesta que estas medidas se han propuesto debido al trafico actual que circula por la via a los mencyos
Los representantes de la comunidad solicitan a los representantes de CEDCO la posibilidad de realizar el desvio de los vehiculos pesados por la via que ellos realizaron (privada) para salir antes del centro poblado. Los representantes de CEDCO manifestaron que esta via aun continua en construcción y tramites pertinentes para poderla en operación para los vehiculos vinculados a sus actividades.

04/05/2024 3 de 5

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Luz enidia	47426864	Luz
Olga Ramirez	47428781	
Faisuly Gaitán	1123160010	Faisuly.
Carolina Sierra	1006840948	Carolina
Carmen Alicia Ortiz	68295411	Carmen Alicia Ortiz
David Eduardo Torres	1118574577	
Juan Manuel Holguin	7160753	
Stivenson de la Cruz	1006558602	Stivenson DC
Rafael antonio perez	9430423	
Betty Franco	1115855865	
helmer Fredy Chaparro	7364974	
Yorge Andrés Ortiz	1116203	Yorge Andrés Ortiz
Doris Virginia Molina	47441302	Doris M. O.
Ulises Rosas B	9527813	
Rodrigo Gonzalez	9658310	
Leder Vasquez	1007599040	

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Ismael Vargas B	4186356	
Horelino López	17986593	Horelino López
Jorge Ortiz	7685288	
Jorge Cuellar	9473017	
Alejandro Gualdron	1029647554	Alejandro
Luis Carlos Carelof	7486078	
Jorge Cardenas P	9524798	
Ana Rodriguez	47438404	
Martha Cecilia Monroy R	46.360.452	Martha C. Monroy
Elsy R Guayabo R.	40400828	Elsy Guayabo R
Luis Hernandez	78703056	
Ingri Dayana Sierra	1006840449	Ingri Sierra.
Luis Andrés López M.	4.252837	
DIEGO PEREZ	79.941.038	
Angelica Trujillo D	29914357	
Yudith Yajaira Sanchez	47437055	

04/05/2014 5 de 5

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 4/05/2024 | LUGAR:

TEMA(S): Reunión Informativa Socialización Visita a Obra Para

PROYECTO: Contratos de Trato Directo

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo Profesional | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Karen Y. Rely Cuadra	1118.650.173	Prof. Apoyo Ambiental	
2	Rosa Correa Camargo	1118533762	Fiscal	Rosa correa
3	Juan Bautista	1007467653	Vicepresidente	
4	Alcides Perez C.	1121822829	Secretario	
5	Disney Niño	88051 4475	Fiscal JAC	
6	Arverra Corredor Garcia	47429.196	Pte Asentamiento	
7	Dimar Alvarez M.	9.652.395	Lider Comunal	
8	José Calixto Hernández	7837506	Pte Tilo JAC	
9	Mireya Rincón Tco	47427.957	comunidad	
10	Absalón Izquierdo Mor	4077060	Vic. JAC Tilo Norte	
11	Edelmira Diaz	23422569	Tilo Norte	
12	Martha Cecilia Monroy R	46.360.452	Comunidad	Martha Monroy
13	Gladys Edith Anza M.	35196239	tesorera	
14	Jose Javier Perez	11201285	Comunidad	
15	Sofia Marcela Cely R	24.229.305	Comunidad	
16	Nuri Molina ortiz	32319474	medio Ambiente	
17	Cesar Corredor G	9'654.291	Usuario 1	
18	Belarmino Paez	19215792	Quimanta	
19	Angela Egleano	39698607	Dpt. Social	
20	Jose Maldonado	9653919	Edil	
21	Jairo Andres Yepes	82498 91	Cepco Social	
22	JENNY FARFAN – GESTORA SOCIAL	1118535410	EMERALD	
23	Diana León	35481487	comunidad	
24	U42 conpiamos	47426869	una en plaza	
25	Olga Ramirez	47428781	Auxiliar Arc	
26	Faiuly Gaitán	1123160010	Estudiante	Faiuly
27	Carolina Sierra	1006840448	A.D. CASA	Carolina.S
28	Ingrid Sierra	1006840449	A.D. CASA	Ingrid S.
29	Carmen Alicia Quenza Medina	68298411	AD casa	Carmen Alicia
30	David Eduardo Torres Hidalgo	1118574577	Ing SM	

Observaciones | Vo.Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		HORA:	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Juan Manuel Holguín	7160753	Secretaria Movilidad Vpal	
2	ULISES ROSAS B	9597813		
3	Ladar Vasquez	1007599040		
4	Ismael Vasquez B	4186356		
5	Aurelino López	17986593		Aurelino López
6	Helman Freddy Chaparro	73609764		
7	Betty Franco	1115855865		
8	Rafael antonio Pérez	9430423	Ed. Tilodiran	
9	Shirvanan De La Rosa	1006558607		Shirvanan DC
10	Lina Maldonado	47439302	Edil	
11	Judith Yajaira Sánchez	47437055	Ref. Apoyo	
12	Ismenia Ariza	23467709	Independiente	
13	Carlos Rodriguez	19219394	Independiente	
14	Cesar Julio Ruiz	5237282	Independiente	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

8:9

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

acuatodos s.a. E.S.P

130.20.10 0836

Yopal, 31 OCT 2023

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Tel: 3133957778
E-MAIL: synergiaconstrucciones@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 032 DE 2023:** "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: SOLICITUD INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

Cordial saludo;

De acuerdo a lo establecido en el contrato de la referencia en la ***cláusula 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 28: Instalará una valla informativa de acuerdo con la información, medidas y modelo que será suministrado por ACUATODOS S.A. E.S.P a través de la Subgerencia Técnica y Operativa***..., de manera atenta nos permitimos hacer la entrega de las especificaciones de la valla informativa que debe ser instalada por parte del contratista de obra, la cual debe ser verificada por la interventoría, dando cumplimiento a los siguientes parámetros.

La información que deberá aportar la valla informativa es la siguiente:

a) Numero de contrato y fecha
b) Objeto del contrato
c) Nombre del contratista de obra/ Consorcio, U.T con Nit
d) Nombre del Interventor/ Consorcio, U.T con Nit
e) Plazo de ejecución
f) Valor en pesos
g) Entidad ejecutora
h) Fuente de financiación
i) Mayor información : contactenos@espacuatodos.gov.co
j) Linea gratuita: 018000912826

Las vallas de los proyectos que sean financiados con recursos del Sistema Genera de Regalías – SGR, se ajustaran a los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Regalías en lo que corresponda

CARACTERISTICAS: Las vallas fijas, deben cumplir como mínimo con las siguientes características: 1. Utilizar el diseño único de imagen proporcionado por la Oficina de Prensa y Comunicaciones 2. Alta resistencia del material a la intemperie. 3. Ensamble sobre estructura metálica estable, instalada con sistemas fijos resistentes a los fenómenos de la naturaleza. 4. Estar debidamente integrada física, y arquitectónicamente al paisaje,

671

respetando la arborización existente y sus elementos constitutivos. 5. La instalación de elementos permanentes o transitorios en los diferentes sitios en que se permite, tendrá en cuenta las condiciones especiales de visibilidad y preservación del paisaje, además de las condiciones de seguridad física. Las torres serán hincadas en el terreno como mínimo a una profundidad de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto, cuya resistencia mínima será de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. 6. La distancia mínima entre cualquier punto del elemento y el conductor más cercano de una red de servicios públicos, incluyendo los elementos que lo soportan (torres de energía de alta tensión, redes de energía, teléfonos en superficies bajo tierra}, deberá ser 8+00 metros. 7. La parte inferior del tablero de la valla deberá quedar a una altura, mínima sobre el nivel del terreno, que garantice su visibilidad y que brinde seguridad, en ningún caso esta altura será inferior a uno coma ocho (1,8) metros.

DISTANCIAS Y DIMENSIONES:

Las vallas publicitarias deben cumplir con las siguientes distancias y dimensiones: 1. El área máxima se establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de este Decreto, 2. La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo será de dos con diez (2+10), 3. Respetar las líneas de alta tensión guardando una distancia mínima de dieciséis (16) metros.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones proporcionara el diseño de la imagen **en formato de impresión TIFF o JPEG en medio magnético. El contratista deberá proporcionar:**

- Imagen en alta resolución alusiva al proyecto, resolución min. 150 dpi peso min. De la imagen 8 megabytes.
- Medio por el cual se guardará el archivo, USB o DVD con suficiente espacio para garantizar el correcto almacenamiento del archivo.

El Tamaño de las vallas depende del valor del contrato el cual se adoptará las siguientes dimensiones y diseño básico de la imagen:

1. Para contratos cuyo valor supere los Diez mil Millones un peso ($10.000.000.001), el área será de cuarenta (40} metros cuadrados, con lila altura de cuatro (4) metros por diez (10) metros de ancho, el diseño incluirá la bandera, logotipos, render o imagen de la obra e información del contrato.



10 metros de Ancho

NOTA: La información de los datos del contrato deberán ser ajustados por parte del contratista.

a) Las vallas de información deberán instalarse por parte del contratista, en un plazo no mayor a veinte (20) dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra pública o proyecto de infraestructura, aquellas que no cumplan con los requisitos estipulados en el presente decreto, deberán ser retiradas y reemplazadas en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario.
b) El contratista será responsable del mantenimiento de las vallas las cuales deberán mantenerse siempre en perfecto estado de legibilidad y seguridad y deben ser remplazadas en caso de presentar deterioro.
c) Si en las obras y proyectos de infraestructura en ejecución se cambian o remplazan vallas por deterioro, las mismas deberán cumplir los diseños y parámetros establecidos en el presente Decreto.
d) La Gobernación de Casanare a través de la Oficina de Prensa y Comunicaciones ejercerá la inspección y vigilancia, para el uso del diseño de la imagen proporcionada por esta dependencia, y control y seguimiento para el proceso precitado, en razón a que cuenta con el personal idóneo para sugerir, proponer y diseñar las piezas gráficas.
e) La interventoría y/o supervisión de los contratos celebrados por el Departamento de Casanare, será la encargada de verificar el cumplimiento de lo estipulado en el presente decreto.
f) En todas las obras y/o proyectos de infraestructura cofinanciados por la Nación u otra entidad pública o privada, donde el Departamento sea la entidad ejecutora, deberán acogerse a los parámetros y mecanismos descritos en el presente Decreto.
g) Una vez terminada la respectiva obra o liquidación del contrato, y esta sea inaugurada u entregada a la comunidad, dichas piezas graficas (vallas), deberán ser retiradas del lugar en que fueron instaladas por el contratista.

Arq. CAMILO RAMIREZ MORALES
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

COMUNICACIÓN OFICIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

1160.173 -

ALCALDÍA DE YOPAL
2023262170
Fecha 2023-11-01 07:43:59

Yopal, 01 de noviembre de 2023

SEÑORA
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante legal
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CALLE 38 N° 24-82 VILLAS DE SAN JUAN. email: synergiaconstrucciones@gmail.com
Código Postal NA
YOPAL

ASUNTO Respuesta a radicado 2023151402

Con el fin de dar respuesta a la solicitud allegada a nuestro despacho el día 30 de Octubre de 2023, mediante radicado 2023151402, donde manifiesta en la Solicitud: Solicitud Viabilidad Técnica PMT

Respuesta: Una de las funciones de la secretaria de Movilidad de Yopal, es ayudar y otorgar a la ciudadanía la seguridad que cuando se realicen cierres de vías totales, temporales o parciales y cierres de superficie de rodamiento por diferentes actividades, eventos, construcciones, obras, etc., cuenten con los dispositivos de seguridad apropiados al evento u obra a realizar, una señalización suficiente, necesaria y adecuada, que sea legible, eficiente, visible y de comodidad a la circulación y movilidad.

Por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal le permite informar que dentro de las funciones está contemplado la expedición de permisos de cierres parciales, temporales o totales de vías mediante acto administrativo, previa presentación de los siguientes requisitos:

1. Documento técnico del Plan de Manejo de tránsito (PMT) acorde al manual de señalización val 2015 Mintransportes, Capitulo 4. Además, el PMT debe ser diseñado y firmado por un ingeniero en transportes y vías, Ingeniero Civil o un especialista de Transportes y Vías. Para ello, se debe adjuntar Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios donde la Matricula Profesional este vigente del profesional que elabora el PMT.

2. Dentro del PMT deberá estar incluido un plano(s) o esquema(s) o modelo con la caracterización detallada de toda la señalización requerida (Kit de señalización de aproximación) a utilizar para el proyecto, actividad o evento a realizar.

3. Adjuntar Fotocopia Registro Único Tributario (RUT) de la empresa, contratista, organizador, entidad y/o persona Natural.

04

4. Adjuntar la Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la empresa contratista, organizador, entidad y/o persona Natural.

5. Presentar **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual**, en donde el beneficiario y/o asegurado sea el Municipio de Yopal, y que ampare el plazo del evento. La expedición de la resolución por parte de Secretaría de Movilidad de Yopal, está acorde a la cobertura inicial y final de la Póliza. El documento anterior deberá estar firmado por el Tomador de la Póliza.

6. Radicar toda la documentación a los siguientes correos: contactenos@yopal-casanare.gov.co / setransito@yopal-casanare.gov.co o presencialmente en la Diagonal 15 No. 15-21, primer piso oficina de correspondencia Alcaldía de Yopal

7. Las empresas contratistas, entidades, organizadores, entidades y/o personas naturales deben incluir dentro de la petición y el documento PMT las fechas que durara el proyecto, eventos o las actividades. Además, los horarios que se establecerán para realizar estas mismas actividades.

8. Todas las personas que desarrollen labores de controladores viales o auxiliares de tránsito para cierres temporales, parciales o totales, deben ser idóneas para tal fin, deben cumplir con las especificaciones mencionadas en el manual de señalización 2015, capítulo 4, numeral 4.10.5.2. Auxiliar de Tránsito. Además, deberán presentar certificado de capacitación como auxiliar de tránsito.

9. Para las notificaciones de un acto administrativo, estas se realizarán personalmente al representante legal, en caso contrario, en representante legal autorizara mediante una solicitud de poder a un apoderado para que pueda ser notificado.

Si cumple con los requerimientos exigidos la Secretaría de Movilidad expedirá el acto administrativo de autorización de cierres de vías.

Con relación al asunto de la petición, en conjunto con el grupo de Ingenieros de la Secretaría de Movilidad y una vez revisando el Documento Técnica del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), le manifiesta lo siguiente:

- El contenido del PMT deberá estar definido con el Manual de Señalización Vial 2015 Mintransportes, especificamente revisar el Capítulo 4. Numerales 4.5 Plan de Manejo de Tránsito, 4.5.1. Objetivo General, 4.5.2. Objetivos Específicos, 4.5.3. Principios Fundamentales y la normatividad Vigente.
- Por otro lado, dentro del documento técnico, se deberá determinar el tipo de categoría de los trabajos, revisar numeral 4.5.4. Categoría de trabajos por realizar.
- Una vez se determine el tipo de Categoría (I, II o III) de la obra, se define la metodología para la elaboración de un PMT, revisar numeral 4.5.5. (tabla 4-1. Esta misma tabla le define los aspectos relevantes para la elaboración del PMT).
- Los esquemas de intervención vial deberán ser más nítidos, ya que no verifican claramente la señal correspondiente.

- Se recomienda ajustar el documento técnico en los puntos anteriormente descritos.

Sin otro particular, agradezco su atención presta.

ORLANDO CRUZ MARTINEZ - SECRETARIO DE MOVILIDAD
Secretario Despacho - Secretario(a) De Movilidad

Elaboró: Juan M[illegible] Holguín Saenz
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: Diosefren Melo Castañeda
Cargo: Profesional Universitario 02

116

Tilodiran, noviembre 20 del 2023

Señores
ACUATODOS S.A. E.S.P
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
SYNERGY CONSTRUCCIONES SAS
CONSINTER DEL ORIENTE E.U
YADITH YAJAIRA SANCHEZ
La Ciudad.

Asunto: **PRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL, cuyo objeto es "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN Nº 2023005850020, CON OBJETO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Respetados señores

En calidad de ciudadanos de la vereda Tilodiran, del corregimiento de Tilodiran y haciendo uso del articulo 161 de la Ley 1757 del 2015, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para informarles que se creó la Veeduria, bajo la Resolución Nº 122 de 14 noviembre del 2023, para la ejecución del Proyecto BPIN Nº 2023005850020

Solicitamos:
1. Copia del proyecto BPIN Nº 2023005850020.
2. Copias de los de obra pública, consultoria y apoyo a la supervisión
3. Planos planta general.
4. Planos planta perfil de cada una de las actividades.
5. Espeificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar.
6. Detalle de cada una de las especificaciones

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente.

ABSALON LEGUIZAMON
Coordinador
Email:veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

HAME YEH NEME UNIVIO

EDGAR CORREDOR GARCIA

EDELMIRA DIAZ DE LEGUIZAMON

ARVEIRA CORREDOR GARCIA

Copia: Personeria

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Tilodiran, noviembre 20 del 2023

Señores
ACUATODOS S.A. E.S.P
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
SYNERGY CONSTRUCCIONES SAS
CONSINTER DEL ORIENTE E.U
YADITH YAJAIRA SANCHEZ
La Ciudad.

Asunto: **PRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL, cuyo objeto es "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN Nº 2023005850020, CON OBJETO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Respetados señores

En calidad de ciudadanos de la vereda Tilodiran, del corregimiento de Tilodiran y haciendo uso del articulo 161 de la Ley 1757 del 2015, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para informarles que se creó la Veeduria, bajo la Resolución Nº 122 de 14 noviembre del 2023, para la ejecución del Proyecto BPIN Nº 2023005850020

Solicitamos:
1. Copia del proyecto BPIN Nº 2023005850020.
2. Copias de los de obra pública, consultoria y apoyo a la supervisión
3. Planos planta general.
4. Planos planta perfil de cada una de las actividades.
5. Espeificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar.
6. Detalle de cada una de las especificaciones

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente.

ABSALON LEGUIZAMON
Coordinador
Email:veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

HAME YEH NEME UNIVIO

EDGAR CORREDOR GARCIA

EDELMIRA DIAZ DE LEGUIZAMON

ARVEIRA CORREDOR GARCIA

Copia: Personeria

Powered by CamScanner

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Inscribir, reconocer y ordenar el registro de la veeduría ciudadana denominada **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"** creada el siete (07) de noviembre de 2023; de acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - INCLUÍR a la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, en el registro público de las veedurías inscritas en esta jurisdicción, dejando constancia expresa que, según la información reportada por la mencionada Veeduría, la misma podrá actuar bajo el marco de las siguientes precisiones:

OBJETO DE LA VIGILANCIA. – "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN No 2023005850020 CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTEGRANTES: La veeduría ciudadana **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, estará integrada por las siguientes personas.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ABSALON LEGUIZAMON ROJAS	C.C.No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3107794965
HAME YEH NEME UNIVIO	C.C.No. 74.814.516 de Yopal	Centro Poblado Tilodiran-Yopal	3212938406
EDGAR CORREDOR GARCIA	C.C.No. 9.654.291 de Yopal	Calle 30B No. 12A – 60 Yopal	3143305803
EDELMIRA DIAZ De LEGUIZAMON	C.C.No. 23.422.569 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3112513555
ARVEIRA CORREDOR GARCIA	C.C.No. 47.429.176 de Yopal	Calle 12 No. 18-36	3114406563

PARÁGRAFO: Los ciudadanos reconocidos como veedores ciudadanos en el presente artículo, aparecen firmando el Acta de Constitución anexa a la solicitud presentada ante esta Personería. Se reconoce como presidente de la veeduría al señor ABSALON LEGUIZAMON ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno (Boyacá).

NIVEL TERRITORIAL: Según lo acordado por los integrantes registrados de la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, la Veeduría inscrita ante esta Personería se circunscribe al municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 67 de la Ley 1757 de 2015, los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, procurando la formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscalización.

DURACIÓN: Según lo expresado en el acta de conformación, la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, tendrá una duración de dos (02) años, a partir de la fecha de su inscripción, pudiendo prorrogarse si aun persiste el objeto de la misma.

Powered by CamScanner

LUGAR DE RESIDENCIA: La Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, inscrita ante esta Personería, definió como lugar de residencia, ubicación y notificación, la dirección y se fijará como domicilio principal la ciudad de Yopal, departamento de Casanare, y su sede será en Tilodiran, Finca La Primavera-Yopal, y correo electrónico veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

ARTICULO TERCERO. En firme el presente acto administrativo, se procederá a efectuar el Registro de la inscripción de la veeduría ciudadana en el libro que se lleva para tal fin en la Personería de Yopal.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar la presente Resolución a los interesados, en la forma prevista en las normas del C.P.C.A.

La presente se expide en Yopal, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), a solicitud del interesado.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL ALBERTO PEÑA TORRES.
Personero Municipal de Yopal

Revisó: Janeth Patricia Lama Vela
Personera Delegada para la Vigilancia y la Moralidad Administrativa

Elaboró: Diana Milena Moreno Rozo
Asistente de Despacho

Powered by CamScanner

NIT 900.326.145-4

Yopal, diciembre 13 de 2023

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud relleno inicial con base granular triturada y relleno final con material seleccionado de la excavación.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, de acuerdo a las actividades que se están adelantando para la instalación de la tubería PVC de 60" de diámetro, con el propósito de garantizar la integridad y estabilidad de los colectores instalados a la fecha por medio del presente les solicitamos realizar en el menor tiempo posible el relleno inicial con base granular triturada tamaño máximo 1-1/2" de acuerdo a lo establecido en las especificaciones de diseño y realizar el relleno final de las zanjas con material seleccionado de la excavación. Lo anterior con el fin de prevenir posibles demoras en la ejecución del proyecto debidas a los procesos de construcción.

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 13-12-2023
HORA 3:52 PM
CANTIDAD FOLIOS 1
MÓNICA

NIT 900.326.145-4

Yopal, diciembre 14 de 2023

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Iniciar la construcción pozos de inspección en el menor tiempo posible.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que se está adelantando la construcción de los tramos de los colectores en tubería PVC de diámetro 60", a la fecha se evidencia la existencia de espacios (excavaciones abiertas debidamente señalizadas) para las estructuras de conexión, por medio del presente les solicitamos iniciar en el menor tiempo posible la construcción de los pozos de inspección del sistema de alcantarillado pluvial. Lo anterior con el fin de evitar la afectación de la ruta crítica y prevenir posibles demoras en la construcción del proyecto debidas a las actividades de construcción de los pozos de inspección, los cuales se realizan de forma manual y requieren el tiempo suficiente para garantizar la estabilidad de las estructuras antes de realizar los rellenos perimetrales y permitir la circulación de vehículos en las vías intervenidas.

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RECIBIDO DE
14-12-2023
10:40am
1
MÓNICA

NIT 900.326.145-4

Yopal, diciembre 18 de 2023

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Rellenos compactados.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que se están adelantando las obras necesarias para la instalación de los colectores del alcantarillado pluvial, por medio del presente les recordamos que las actividades de Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2") en el cual se incluye el solado, atraque y relleno inicial sobre la tubería, y la actividad de relleno final en material seleccionado de la excavación compactado, se deben realizar por capas con el equipo idóneo (vibrocompactador manual tipo rana y/o canguro y/o de rodillo y/o vibrocompactador autopropulsado) para obtener las densidades de diseño que garanticen la transferencia de los esfuerzos para estabilidad de los colectores y las obras complementarias.

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

18-12-2023
3:40Pm
1
MÓNICA

Consinter del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal, diciembre 19 de 2023

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Recomendaciones.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, por medio del presente les solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones las cuales se deben reforzar con la comunidad durante la ejecución del proyecto:

- Se debe continuar por parte de los profesionales vinculados con las aclaraciones necesarias que soliciten los habitantes del centro poblado de Tilodiran para cambiar la percepción de algunos de los miembros de la comunidad que aún no creen en los beneficios que les aportará el proyecto debido a experiencias negativas con proyectos anteriores ejecutados en el corregimiento.
- Se deben apoyar y fortalecer los compromisos y recomendaciones que por parte de la profesional social les brinden a los habitantes del centro poblado para evitar cualquier incidente y/o accidente durante la construcción, de acuerdo a las socializaciones casa a casa que se realicen para comprenden los riesgos que trae consigo este tipo de trabajos.
- Es importante continuar con las recomendaciones a la comunidad frente al sentido de pertenencia con el proyecto ya que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los habitantes del centro poblado.

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

19-12-2023
4:30 Pm.
1
MÓNICA.

NIT 900.326.145-4

Yopal, enero 24 de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud de mejora de los elementos utilizados como señalización preventiva.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, por medio del presente le solicitamos mejorar e incrementar los elementos de señalización preventiva utilizados durante la ejecución del proyecto, lo anterior debido a que por los fuertes vientos que se están presentando ocasionan deterioro prematuro en la señalización utilizada para demarcar las áreas donde se están adelantando las actividades objeto del citado contrato.

Cabe resaltar que todos los elementos que sean utilizados como señalización deben cumplir las normas vigentes.

En espera de una pronta ejecución de lo solicitado,

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-01-2024
HORA: 8:44 a.m.
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
MÓNICA
EL RECIBIDO NO INDICA ACEPTACIÓN

Rad: 20245000062561

Yopal, 16 de febrero de 2024

Ingeniero
DIEGO OLNEY PEREZ
Residente de Obra
Sinergia Construcciones e Ingenieria S.A.S
Yopal

REF: ACTA DE VENCINDAD

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el oficio allegado el dia 13 de febrero del año en curso a la ESE Salud Yopal, con referencia "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", en el corregimiento de Tilodiran.

Solicitamos se realice la inspección del Centro de Atención Primaria en Salud de Tilodiran el dia martes (20) de febrero del año en curso a las 08:00 de la mañana, visita que será asistida por el Arquitecto Cristian Martínez y la ingeniera Fernanda Estepa.

Sin otro particular,

EDWIN BARRERA RODRIGUEZ
Gerente
ESE Salud Yopal

Elaboró: Johana Patricia Torres Caceres
Cargo: Apoyo Oficina Asesora de Planeacion

686

NIT 900.326.145-4

Yopal, febrero 16 de 2024

SECRETARIA DE TRANSITO Y SECRETARIA PRIVADA
contactenos@yopal-casanare.gov.co; setransito@yopal-casanare.gov.co
Municipio de Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION RESOLUCION No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VIAS URBANAS

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U.** actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que se están adelantando las actividades de construcción del contrato de la referencia para lo cual se requiere realizar cierres de las vías del centro poblado de Tilodiran, los cuales fueron aprobados por el municipio de Yopal según la Resolución No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 (anexa).

Actualmente la empresa COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO "CEDCO", utiliza las vías del centro poblado para el tránsito de los vehículos pesados necesarios para su operación de acuerdo a la autorización para la utilización de unas vías específicas, las cuales se encuentran incluidas dentro de las vías a intervenir durante la construcción del citado contrato de obra pública, por lo cual solicitamos realizar una mesa de trabajo conjunta el día y la hora que consideren pertinente para identificar las rutas alternas de los vehículos pesados durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto.

Agradeciendo su amable atención.

Sin otro particular,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

CC: jenis_vaya@sierracol.com; luis_tobian@sierracol.com; adriana_mora@sierracol.com; notificacionesjudiciales@espacuatodos.gov.co; contactenos@espacuatodos.gov.co; synergiaconstrucciones@gmail.com

COMUNICACIÓN OFICIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

1160.136.14

ALCALDÍA DE YOPAL
2024203405
Fecha 2024-02-10 11:29:27

Yopal, 10 de febrero de 2024

señora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
3173639276
SYNERGIA
CALLE 38 N° 24-82 - YOPAL
Código Postal 850001
synergiaconstrucciones@gmail.com

ASUNTO Respuesta a radicado 2024105549

Cordial saludo.

Por medio del presente se da respuesta favorable a su solicitud de permiso de cierre vial en el centro poblado de Tilodiran - Municipio de Yopal - Departamento de Casanare, para Ejecutar el contrato de Obra No. 032 de 2023, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE**" autorización concedida con un plazo que comprende desde el día 12 de Febrero de 2024 hasta el día 20 de Agosto de 2024, por medio del acto administrativo No. **03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024**, el cual sera notificado de forma personal en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Yopal.

Sin otro particular,

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ - SEC. DE MOVILIDAD
Secretario Despacho - Secretario(a) De Movilidad

Elaboró: Andrea Estefania Jimenez Vargas
Cargo: Profesional Universitario 02

Revisó: Nelson Ricardo Camargo Perez - Sec. De Movilidad
Cargo: Secretario Despacho - Secretario(a) De Movilidad

688

NIT 900.326.145-4

Yopal, febrero 22 de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Bajo suministro de tubería de policloruro de vinilo (PVC).

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, de acuerdo a lo identificado en el desarrollo del proyecto en las últimas semanas se ha evidenciado el bajo suministro de tubería de policloruro de vinilo (PVC), el cual ha reflejado notoriamente la reducción del avance del proyecto. Aunque SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S cuente con la maquinaria, topografía, base granular y demás insumos necesarios para la construcción en los diferentes frentes de obra, la actividad más representativa que es el suministro e instalación de la tubería de PVC atrasa notoriamente la ruta crítica del proyecto. Por medio del presente le solicitamos tomar las acciones correctivas necesarias para suministrar oportunamente la Tubería de PVC y evitar demoras en la ejecución del proyecto.

En espera de una pronta respuesta,

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 22-02-2024
HORA: 4:50 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
MÓNICA
EL RECINTO NO

Tilodiran, abril 04 del 2024

Señores
SYINERGIA CONSTRUCCIONES
Vereda Tilodiran
E.S.M

Asunto: **SOLICITUD DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VIA LA GLORIA.**

Cordial saludo señores ingenieros.

Obrando en representación de la comunidad del corregimiento de Tilodiran y cumpliendo con nuestras funciones, solicitamos respetuosamente el análisis y concepto técnico para que se realice la demolición de la alcantarilla que se encuentra entre el centro poblado y la vía rural hacia la gloria, donde al pasar el tubo se fracturó, lo que queda generando un riesgo para las personas que transitan por esta vía. Por tal razón, solicitamos que esta alcantarilla se demuela y sea construida nuevamente.

Agradecemos la atención prestada y su pronta respuesta.

Atentamente.

Recibí
4-04-2024

JOSE D MALDONADO
Edil Cto Tilodiran
310 320 1355

ARVEIRA CORREDOR
Pte Asojuntas Cto Tilodiran

690

Tilodirán, Abril 22 de 2024

Señores

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Yopal – Casanare

Respetados Señores

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la conexión de la acometida del alcantarillado Sanitario, teniendo en cuenta que por al frente de mi propiedad se está realizando la construcción de dicho proyecto, la cual adjunto Fotocopia Escritura.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

Yolanda Chaparro

YOLANDA CHAPARRO DE VALDERRAMA

C.C. 23.738.944 de Yopal

Cel.3143570043

22-04-2024

Powered by CamScanner

691

ESCRITURA NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (2431)

FECHA DE OTORGAMIENTO DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL 2014

OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE YOPAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMATO DE CALIFICACIÓN
MATRICULA INMOBILIARIA No 470-94004
CERTIFICADO CATASTRAL No. 000100030072000
NATURALEZA DEL ACTO
DIVISIÓN MATERIAL CÓDIGO 0918
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE IDENTIFICACIÓN
YOLANDA CHAPARRO DE VALDERRAMA **23.738.944 YOPAL**

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca087297459

ESCRITURA NUMERO (2431)
FECHA DE OTORGAMIENTO DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2014
En la Ciudad de Yopal Departamento de Casanare República de Colombia a los (10) Días del mes de OCTUBRE del año Dos Mil Catorce (2014) al despacho de la Notaria Segunda del Circulo de Yopal del cual es titular **EDILBERTO PÉREZ SUAREZ** Comparecieron: **YOLANDA CHAPARRO DE VALDERRAMA,** Quien manifiesta ser mayor de edad, veciña de Yopal, de estado civil casada con sociedad conyugal vigente, identificada con la cédula de ciudadanía No 23.738.944 expedida en Yopal, quien actúa en nombre propio y manifestó. **PRIMERO:** Que es propietaria un lote de terreno sin vivienda ubicado en la carrera 2 y calle 2 y 3 del Municipio de Yopal con una extensión de **DIECISIETE HECTAREAS (17 Has) TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CON NOVENTA Y UN CENTIMETROS CUADRADOS (3.282.91 M2),** delimitado por los siguientes linderos: **PUNTO DE PARTIDA:** Se tomo como punto de partida el detalle treinta y cinco 35 situado al Norte donde concurren las colindancias de **DUMAR ALVAREZ LA VIA YOPAL ALGARROBO** el interesado colinda asi **NORTE:** Con la vía Yopal Algarrobo del detalle 35 al detalle 4 en una distancia de 304.45 metros cerca de alambre al medio **ESTE:** Con **PEDRO RINCON TRUJILLO** del detalle Nro. 4 al detalle Nro. 7 en una

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas - sin ningún costo para el usuario

Powered by CamScanner

distancia de 455.49 metros cerca de alambre al medio continuando con ALVARO RINCON del detalle Nro. 7 al detalle Nro. 8 en una distancia de 165.38 metros cerca de alambre al medio **SUR:** Con MARIA NIÑO del detalle Nro. 8 al detalle Nro. 16 en una distancia de 638.88 metros cerca de alambre al medio OESTE: Con Vía a los mangos del detalle Nro. 16 al detalle Nro. 19 en una distancia de 128.79 metros con cerca de alambre al medio continuando con calle 2 y carrera 2 del detalle Nro. 19 al detalle Nro. 32 en una distancia de 137.34 metros cerca de alambre al medio continuando con lotes 1, 2, 3, 4 del detalle Nro. 32 al detalle Nro. 41 en una distancia de 60.66 metros cerca de alambre al medio continuando con **DUMAR ALVAREZ** del detalle Nro. 41 al detalle Nro. 35 en una distancia de 100.54 metros cerca de alambre al medio y encierra. **SEGUNDO:** Que el predio fue adquirido por la exponente mediante escritura pública No. 2436 de fecha 26 de Noviembre del 2010 otorgada en la notaria Segunda de Yopal y registrada bajo el folio de matricula inmobiliaria No. 470-94004. **TERCERO:** Que de común acuerdo y con la resolución No. 102-54-1457 de fecha 01 de Octubre del 2014 expedida por la oficina de planeación Municipal de Yopal se procede a realizar la división material del inmueble determinado en el punto Primero de este instrumento de la siguiente manera: **LOTE No 1:** con una extensión de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS (291.86 M2)** y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 12 al mojon 11 con una longitud de 10.97 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 11 al mojon 10 con una longitud de 26.93 metros lineales colinda con el Lote Nro. 2 de la presente subdivisión cerca al medio **SUR:** del mojon 10 al mojon 13 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 13 al mojon 12 con una longitud de 31.44 metros lineales colinda con el Lote Nro. 6 de la presente subdivisión cerca al medio y encierra **LOTE No 2:** con una extensión de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CON SETENTA CENTIMETROS CUADRADOS (246.70M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 11 al mojon 8 con una longitud de 10.97 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del

Papel notarial para uso exclusivo de la escr... - Sin costo para el usuario

Powered by CamScanner

mojon 8 al mojon 9 con una longitud de 22.41 metros lineales colinda con el Lote Nro. 3 de la presente subdivisión cerca al medio **SUR:** del mojon 9 al mojon 10 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 10 al mojon 11 con una longitud de 26.93 metros lineales colinda con el Lote Nro. 1 de la presente subdivisión cerca al medio y encierra **LOTE No. 3** con una extensión de **DOSCIENTOS UN METROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS (201.55 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 8 al mojon 7 con una longitud de 10.97 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 7 al mojon 6 con una longitud de 17.90 metros lineales colinda con el Lote Nro. 4 de la presente subdivisión cerca al medio **SUR:** del mojon 6 al mojon 9 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 9 al mojon 8 con una longitud de 22.41 metros lineales colinda con el Lote Nro. 2 de la presente subdivisión cerca al medio y encierra **LOTE No. 4** con una extensión de **CIENTO CINCUENTA METROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS (150.74 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 7 al mojon 25 con una longitud de 10.04 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 25 al mojon 5 con una longitud de 13.79 metros lineales colinda con el Lote Nro. 5 de la presente subdivisión cerca al medio **SUR:** del mojon 5 al mojon 6 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 6 al mojon 7 con una longitud de 17.90 metros lineales colinda con el Lote Nro. 3 de la presente subdivisión cerca al medio y encierra **LOTE No. 5** con una extensión de **DOSCIENTOS SEIS METROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (206.42 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Powered by CamScanner

los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 4 al mojon 3 con una longitud de 9.34 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 3 al mojon 2 con una longitud de 20.00 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección de la carrera 1) cerca al medio **SUR:** del mojon 2 al mojon 5 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 5 al mojon 25 con una longitud de 17.79 metros lineales colinda con el Lote Nro. 4 de la presente subdivisión y continua y termina en línea quebrada del mojon 25 al mojon 4 con una longitud de 6.41 metros lineales con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio y encierra **LOTE No. 6** con una extensión de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN METROS CUARENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS (341.49 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 24 al mojon 12 con una longitud de 11.61 metros lineales colinda con el predio del señor DUMAR ALVAREZ cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 12 al mojon 13 con una longitud de 31.44 metros lineales colinda con el Lote Nro. 1 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **SUR:** del mojon 13 al mojon 1 con una longitud de 9.67 metros lineales colinda con el lote Nro. 7 de la presente subdivisión (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 1 al mojon 101 con una longitud de 10.00 metros lineales colinda con el Lote de la señora OLGA MONROY en línea continua del mojon 101 al mojon 102 con una longitud de 10.00 metros lineales con el predio de la señora ETELVINA MOLINA en línea continua del mojon 102 al mojon 103 con una longitud de 10.00 metros lineales con el predio del señor ALBEIRO VALDERRAMA y termina en línea continua del mojon 103 al mojon 24 con una longitud de 6.23 con el predio del señor MARCO TULIO RINCON cerca al medio y encierra **LOTE No. 7** con una extensión de **QUINIENTOS VEINTIUN METROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS (521.46 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 20 al mojon 1 con una longitud de 25.25 metros lineales colinda con el predio de la señora OLGA MONROY En línea continua del mojon 1 al mojon 13 con una longitud de 9.67 metros lineales

Powered by CamScanner

TERCERA HOJA: DE LA ESCRITURA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (2431) ==========

FECHA DE OTORGAMIENTO DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL 2014

10.00 metros lineales con el Lote Nro. 1 en línea continua del mojon 10 al mojon 9 con una longitud de 10.00 metros lineales con el Lote Nro. 2 en línea continua del mojon 9 al mojon 6 con una longitud de 10.00 metros lineales con el Lote Nro. 3 en línea continua del mojon 6 al mojon 5 con una longitud de 10.00 metros lineales con el Lote Nro. 4 en línea continua del mojon 5 al mojon 2 con una longitud de 10.00 metros lineales con el Lote Nro. 5 de la presente subdivisión y termina en línea continua del mojon 2 al mojon 34 con una longitud de 19.75 metros lineales con la proyección de la carrera 1 cerca al medio. **ORIENTE:** del mojon 34 al mojon 33 con una longitud de 4.99 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección de la calle 2) cerca al medio **SUR:** del mojon 33 al mojon 26 con una longitud de 10.40 metros lineales colinda con el lote Nro. 8 (servidumbre cesión de la vía de acceso A.A.A.Y (proyección de la calle 2) cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 26 al mojon 20 con una longitud de 4.99 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección calle 2) cerca al medio y encierra LOTE **No. 8** con una extensión de **MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CON CUATRO CENTIMETROS (1.567.04 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 26 al mojon 33 con una longitud de 104.40 metros lineales colinda con el Lote Nro. 7 de la presente subdivisión (cesión de vía calle 2) cerca al medio **ORIENTE:** del mojon 33 al mojon 32 con una longitud de 15.01 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección de la calle 2) cerca al medio **SUR:** del mojon 32 al mojon 31 con una longitud de 19.68 metros lineales colinda con la Proyección de la carrera 1 en línea continua del mojon 31 al mojon 28 con una longitud de 15.50 metros lineales con el Lote Nro. 9 de la presente subdivisión (predio alcaldía A.A.A.Y) y termina en línea continua del mojon 28 al mojon 27 con una longitud de 69.22 metros lineales con el Lote de la señora YOLANDA CHAPARRO cerca al medio **OCCIDENTE:** Del mojon 27 al mojon 26 con una longitud de 15.01 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Powered by CamScanner

CHAPARRO (Proyección calle 2) cerca al medio y encierra **LOTE No. 9** con una extensión de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOA (285.82 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 28 al mojon 31 con una longitud de 15.50 metros lineales colinda con el Lote Nro. 8 de la presente subdivisión (Servidumbre E.A.A.A.Y vía calle 2) cerca al medio **ORIENTE:** del mojon 31 al mojon 30 con una longitud de 17.15 metros lineales colinda con predios de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección de la calle 2) cerca al medio **SUR:** del mojon 30 al mojon 29 con una longitud de 15.50 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO cerca medio **OCCIDENTE:** Del mojon 29 al mojon 28 con una longitud de 17.15 metros lineales colinda con el predio de la señora YOLANDA CHAPARRO (Proyección calle 2) cerca al medio y encierra **LOTE No. 10** con una extensión de **DIECISEIS HECTAREAS (16 Has) NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL METROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS (9.489.83 M2)** y delimitado por siguientes linderos: y delimitado por los siguientes linderos: **NORTE:** del mojon 30 al mojon 1 con una longitud de 458.32 metros lineales colinda con via pública cerca al medio **ORIENTE:** del mojon 1 al mojon 8 con una longitud de 458.32 metros lineales colinda con predio del señor PEDRO RINCON TRUJILLO cerca al medio **SUR:** del mojon 8 al mojon 9 con una longitud de 167.39 metros lineales colinda con el predio del señor ALVARO RINCON continua en línea quebrada del mojon 9 al mojon 18 con una longitud de 635.29 metros lineales colinda con el predio de la señora MARIA NIÑO cerca medio **OCCIDENTE:** Del mojon 18 al mojon 28 con una longitud de 320.10 metros lineales colinda con vía pública continua del mojon 28 al mojon 31 con el lote Nro. 9 de la presente subdivisión (E.A.A.A.Y) continua en línea quebrada del mojon 31 al mojon 2 con una longitud de 59.37 metros lineales con la via pública (Proyección carrera 1 y calle 2) continua en línea quebrada del mojon 2 al mojon 29 con una longitud de 29.34 metros lineales con el Lote Nro. 5 de la presente subdivisión y termina del mojo 29A con el mojon 30 con una longitud de 40.62 metros lineales con el predio de DUMAR ALVAREZ cerca al medio y encierra Así mismo el Compareciente hace constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres completos estado civil número de cédula de ciudadanía la matricula

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública No tiene costo para el usuario

Powered by CamScanner

CUARTA HOJA: DE LA ESCRITURA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (2431) ==========

FECHA DE OTORGAMIENTO DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL 2014

linderos y el valor de la venta Declara que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y en consecuencia asume la responsabilidad que se derive de cualesquiera inexactitudes de los mismos conoce la ley y sabe que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza pero no de la veracidad de las declaraciones del Interesado al otorgarse se le advirtió que una vez firmado este instrumento la Notaria no aceptara correcciones o modificaciones sino en la forma y casos previstos por la ley **A LOS OTORGANTE SE LES HIZO LA ADVERTENCIA QUE DEBEN PRESENTAR ESTA ESCRITURA PARA REGISTRO OFICINA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO PERENTORIO DE DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO CUYO INCUMPLIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS POR MES DE RETARDO COMPROBANTES FISCALES** Los comparecientes presentaron para su protocolización los siguientes documentos Resolución Nro. 102-54-1457 de 01 de Octubre del 2014 expedida por la Secretaria de Planeación Municipal de Yopal, fotocopias de las cédulas de ciudadanía, certificado de tradición y libertad **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** Leída esta escritura a los comparecientes quienes lo hallaron en todas sus partes y a quienes se les advirtió la obligatoriedad de su registro dentro del término legal EL NOTARIO LO AUTORIZA PREVIAS ADVERTENCIAS LEGALES.

DERECHOS NOTARIALES $ 96.700

IVA $ 15.472

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO $9.200

PAPEL DE SEGURIDAD Aa015240093=Aa015240094=Aa015240095==
Aa015240096. ==========

LA COMPARECIENTE

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca087298272

Powered by CamScanner

Yolanda Chaparro

YOLANDA CHAPARRO VALDERRAMA
C.C. 23.738.944
TEL 3212596243
DIRECCION Calle 25 N. 21-37
CIUDAD DONDE VIVE Tilodirán
ACTIVIDAD ECONOMICA Hogar -

EDILBERTO PEREZ SUAREZ
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE YOPAL

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE YOPAL

C E R T I F I C A :

Doy fe de que esta es la primera fotocopia tomada de su original que expido hoy 14 OCT 2014 en papel común debidamente sellado y rubricado con destino al interesado

Powered by CamScanner

NIT 900.326.145-4

Yopal, abril 25 de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud conexiones acometidas domiciliarias alcantarillado sanitario.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U.** actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes por parte de los propietarios de los predios del centro poblado de Tilodiran, por medio del presente le informamos que cada una de las solicitudes que sean recibidas serán revisadas constatando la información entregada por el dueño en el predio y de ser viable se realizara el trámite pertinente para autorizar la construcción por medio de un comité de obra o se puede registrar en el libro de obra (bitácora).

Cabe aclarar que de acuerdo a lo expresado durante la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta la construcción de una acometida en cada una de las calles que colinden con las vías a pavimentar por cada predio que el usuario tenga los documentos en los cuales se acredita la propiedad del inmueble.

Agradeciendo su amable atención,

Atentamente,

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 25 04 2024.
HORA: 4:57 pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO

COMUNICACIÓN OFICIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

1160.173 -

ALCALDÍA DE YOPAL
2024214021
Fecha 2024-04-29 14:13:13

Yopal, 29 de abril de 2024

SEÑORA
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL
SYNERGIA
Calle 38 # 24-82. Email: synergiaconstrucciones@gmail.com
Código Postal 850002
YOPAL

ASUNTO Respuesta a radicado 2024117782

Cordial Saludo

Con el fin de dar respuesta a la solicitud allegada a nuestro despacho el día 23 de Abril de 2023, mediante radicado 2024117782, donde manifiesta en el Asunto: **Ajuste Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024**

Una vez revisada toda la documentación e información relacionada con la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024. la Secretaría de Movilidad de Yopal le permite informar; previa a la revisión del documento PMT por parte del área de Ingeniería, este se debe actualizar, en su medida que se ha mencionado y adjuntado un tramo que no está contemplado originalmente en el PMT, por esta misma razón es indispensable su actualización del PMT. Además, es importante allegar la siguiente información:

1. Actualización del Plan de Manejo de tránsito (PMT
2. Adjuntar Fotocopia Registro Único Tributario (RUT) de la empresa actualizada.
3. Adjuntar la Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la empresa contratista.
4. Presentar **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual.**
5. Presentar Cedula de ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificación de antecedentes disciplinarios del Ingeniero que realizó el Plan de Manejo de Tráfico.
6. Radicar toda la documentación a los siguientes correos: contactenos@yopal-casanare.gov.co / setransito@yopal-casanare.gov.co o presencialmente en la Diagonal 15 No. 15-21, primer piso oficina de correspondencia.

Nota: Que la información que la empresa va a suministrar, al escanearse sea de buena calidad.

Sin otro particular, agradezco su atención presta

701

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ - SEC. DE MOVILIDAD
Secretario Despacho - Secretario(a) De Movilidad

Elaboró: Juan Manuel Holguin Saenz
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: Diosefren Melo Castañeda
Cargo: Profesional Universitario 02

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Yopal, 31 de Agosto del 2023

OF-PROY-TIL

Doctora:
ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN
Oficina Jurídica
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: APROBACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN MINUTA AL CONTRATO DE OBRA No. 032 DE 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la póliza de cumplimiento particular No. 57-45-101001919 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 expedida por la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A para su aprobación, anexando las pólizas, el clausulado y el recibo de pago, de acuerdo al contrato en referencia.

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

acuatodos s.a. E.S.P.
SUBGERENCIA JURÍDICA
FECHA. 9/09/23
HORA. 4:07
FIRMA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Yopal, 9 de Octubre del 2023

Doctora:
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA CERTIFACION DE FIDUCIA Y CERTIFICACION GIRO DE PARCIALES

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la certificación de la Fiduciaria Bancolombia S.A de acuerdo al contrato de referencia y certificación para giro de parciales con el Banco Bogotá.

Agradezco su atención prestada

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Anexo certificaciones

acuatodos s.a. E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 10-10-2023
HORA: 9:20 am
FIRMA:
1427
(22 folios)

Grupo Bancolombia Capital

Fiduciaria Bancolombia S.A. – Sociedad Fiduciaria

Medellín, 6 de octubre de 2023

Señores
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** realizó ante Bancolombia S.A. la constitución de la **Cuenta de Ahorros No.62900004849** denominada **P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S 032** identificada con el **NIT 830054539,** el 6 de octubre de 2023.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, DANIELA FIGUEROA LONDOÑO Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida

Cordialmente,

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Sección
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS identificado(a) con NITPJ 8440048400 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 409077252 desde el 12 de mayo de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 09 de octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Yopal, 10 de Octubre del 2023

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Recibí 10/10/2023

Asunto: SOLICITUD DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar el desembolso del anticipo del contrato de la referencia. Lo anterior atendiendo a lo estipulado en el contrato en su cláusula sexta (forma de pago).

La solicitud del anticipo esta por un valor de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($19.459.801.684,00)** moneda corriente, correspondiente al 50% del valor total del contrato.

Anexo a la solicitud el cuadro del plan de inversión del anticipo para su revisión y aval.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 1.945.980.168,40	10,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 5.837.940.505,20	30,00%
3	Transporte de materiales petreos	$ 4.864.950.421,00	25,00%
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 2.918.970.252,60	15,00%
5	Contratos de Mano de Obra	$ 3.891.960.336,80	20,00%
	TOTAL	$ 19.459.801.684,00	100%

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Yopal, 11 de Octubre del 2023

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 11/10/2023
HORA: 11:15 am CANTIDAD DE FOLIOS: 6
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: APROBACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la póliza de cumplimiento particular No. 57-45-101001919 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 expedida por la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A para su aprobación, anexando las pólizas de acuerdo al contrato en referencia.

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-GER-04
	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	RREVISIÓN: 27-03-2022

Yopal 30 de octubre de 2023

OF – 073

Señores
Secretaria de tránsito y transporte
YOPAL CASANARE

30 OCT 2023
RAD 20231514024:13PM

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 032 DE 2023 "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **SOLICITUD VIABILIDAD TECNICA PMT**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el plan de manejo de transito del contrato de obra 032 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
Con el fin de ser viabilizado, y aprobar cierre temporal de vías a intervenir, según tiempo de ejecución del proyecto (12 meses).

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

VIAS A INTERVENIR

No. TRAMO	SUBTRAMO DE DISEÑO	SECTOR
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2

Reviso.
DR. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Proyectó
María Doris Bernal
COORD. SST

ALCALDIA DE YOPAL
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

Yopal, 26 de enero de 2024

30 ENE 2024
RAD No.: 20241051 30
NOMBRE: HORA: 2:15

Ingeniera
ADRIANA HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Yopal

REFERENCIA : CONTRATO DE OBRA NRO. 032 DE 2023 DE ACUATODOS S.A. ESP – CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO : SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO – DISPOSICIÓN DE RCD

Cordial Saludo Ingeniera Adriana;

La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. con NIT nro. 844.004.840-0, suscribió con ACUATADOS S.A. ESP el Contrato de la referencia, el cual en este momento se encuentra en ejecución.

Para el tema de disposición final de Residuos de Demolición y Construcción RCD, se inició el respectivo trámite ante CORPORINOQUIA el pasado 11 de diciembre de 2023, bajo el radicado nro. 2023-19857, sin que a la fecha se haya tenido respuesta de la Corporación.

A la fecha aún no se ha iniciado con la disposición de RCD, pero de acuerdo con la programación de obra pronto se requerirá de un sitio debidamente legalizado por CORPORINOQUIA, razón por la que acudo a Ustedes para solicitar su colaboración en el sentido de permitirnos disponer RCD en la escombrera municipal.

Teniendo en cuenta la capacidad de la escombrera municipal, entendemos que es limitado el volumen que nos puedan autorizar a disponer, a lo cual nos ceñiremos a las condiciones que establezca el Ente Territorial.

Agradezco la colaboración que el Municipio de Yopal a través de la Secretaría de Infraestructura nos pueda brindar.

Sin otro particular,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

712

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-GER-04
	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	RREVISIÓN: 27-03-2022

Yopal 31 de enero de 2023

OF-PROY-TIL

Señores
ING. NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad
Yopal

ALCALDÍA DE YOPAL
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
31 ENE 2024
2024 10055 49
RADICADO
NOMBRE
3:13 Pm

ASUNTO: Respuesta a oficio alcaldía de Yopal 2023262170

Cordial saludo

Por medio la presente me permito adjuntar los requisitos que son necesarios para solicitar permiso de cierre vías temporal para la construcción del proyecto CONTRATO DE OBRA 032 DE 2023 "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, de acuerdo al oficio enviado con radicado 2023262170, el cual se ajusta el documento técnico con las observaciones, el proyecto tiene una duración de 12 meses.

Requisitos adjuntos:

1. Documento técnico del plan de manejo de transito (PMT), firmado por el ingeniero EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ, fotocopia de la cedula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios.
2. Plano de la caracterización detallada de la señalización requerida.
3. Fotocopia registro único tributario (RUT).
4. Fotocopia de la cedula del representante legal.
5. Póliza de responsabilidad Civil.

Reviso.
DR. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Proyectó
Maria Doris Bernal
COORD. SST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Yopal, 12 de Febrero del 2024

OF-PROY-TIL

Señor:
NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ
Secretario de Movilidad
Yopal

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: AUTORIZACIÓN.

Cordial saludo,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO en mi calidad de representante legal de **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S**, AUTORIZO al señor DIEGO OLNEY PÉREZ PACHÓN, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.941.038 de Bogotá D.C, para que reciba la resolución para el cierre vial del centro poblado de Tilodirán.

ALCALDÍA DE YOPAL
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RECIBIDO
13 FEB. 2024
RADICADO
RECIBIDO POR:
HORA: 2:42pm No. DE FOLIOS 2

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

714

RESOLUCIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

RESOLUCIÓN No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito**. Para los efectos de la presente Ley entiéndase autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las nomas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

autoridades,para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito: definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros**. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para los cierres totales, parciales y temporales de vías urbanas y rurales del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA**", que reglamenta los dispositivos temporales para el control en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015.

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad de las demás

716

personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento de Casanare.

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística**. "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

RESOLUCIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

Que mediante oficio allegado a esta secretaría el día 31 de Enero de 2024, mediante radicado No. 2024105549, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P,** con contrato de Obra No. 032 de 2023, solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutarán entre el 12 de Febrero de 2024 hasta el 20 de Agosto de 2024, dichos cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	12 de Febrero de 2024 hasta 20 de Agosto de 2024	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa

CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VIAS

No TRAMO	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	HORARIOS DE TRABAJO	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	12 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	LUNES A VIERNES 7 AM A 6 PM Y SABADOS 7 AM A 12:30 PM	PARCIAL - TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	12 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 JUNIO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	15 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE		PARCIAL - TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024		PARCIAL - TOTAL
18	18	VIA AQUALINDA DESDE LA ENTRADA PLANTA DE TRATAMIENTO A CARRERA 4	12 FEBRERO AL 20 ABRIL 2024		PARCIAL - TOTAL

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

718

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedarán habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realizan las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vías, **EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 3, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 20 de Agosto de 2024.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE...

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva del presente acto administrativo, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

720

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final; estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Movilidad que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aislé perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo

de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **20 de Febrero de 2024 hasta el 20 de Agosto de 2024**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de la Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 3, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 20 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el capítulo cuarto del manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 0001885 del 17 de Junio de 2015, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y temporales de vías.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de

apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será la encargada de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vías, es necesario que la contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista,

deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar la presente Resolución en los términos establecidos en el art. 67 del código de procedimiento administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Nueve (09) días del mes de Febrero de 2024.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboró: Andrea Estefanía Jiménez
Cargo: Profesional universitario

Revisó: Nelson Ricardo Camargo P.
Cargo: Secretario de Movilidad de Yopal

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL

El Señor DIEGO O. PEREZ P Se Hizo Presente
En Este Despacho El Dia 13 Del Mes FEB Del Año 2024
Quien Se Identifica Con La C.C. No. 79.941.038
Expedida en BOGOTA
Quien Se Notifica De La Resolución No. 03047
De Fecha 9 FEB-2024
FIRMA
LA SECRETARIA

724

Tilodirán, 13 de Febrero de 2024

OF-PROY-TIL

E.S.E "SALUD Y... NIT. 844.003 225-... RECIBIDO GERENCIA Nombre: Fecha: 13-02-2024 Hora: 3:30 pm

Señor
EDWIN JESÚS BARRERA RODRIGUEZ
Gerente ESE Salud Yopal

REFERENCIA: *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.*

ASUNTO: ACTA DE VECINDAD

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de informarle que dentro de las actividades que se encuentra ejecutando la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA S.A.S, está la realización de las actas de vecindad en las vivienda del corregimiento de Tilodirán, actividad que tiene como objetivo realizar la inspección de la infraestructura de la vivienda para conocer en qué estado se encuentra, teniendo en cuenta que dentro de las actividades de ejecución se utiliza maquinaria pesada la cual puede generar daños por las vibraciones, por ello es importante realizar esta visita, la cual también le permitirá a usted tener como soporte en caso de que se presente un daño y puedan hacer la respectiva reclamación a la empresa contratista. Durante la visita el profesional deberá realizar un registro fotográfico y fílmico a toda la casa desde el exterior como interior.

Cordialmente,

ING. DIEGO OLNEY PÉREZ
Residente de Obra

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Tilodirán, 16 de Febrero de 2024

OF-PROY-TIL

Señora
MARINA VALDERRA
Presidenta de la Junta de Acción Comunal

REFERENCIA: *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.*

ASUNTO: ACTA DE VECINDAD CANCHA DEPORTIVA

Cordial saludo

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de informarle que dentro de las actividades que se encuentra ejecutando la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA S.A.S, está la realización de las actas de vecindad en las vivienda del corregimiento de Tilodirán, actividad que tiene como objetivo realizar la inspección de la infraestructura de la vivienda para conocer en qué estado se encuentra, teniendo en cuenta que dentro de las actividades de ejecución se utiliza maquinaria pesada la cual puede generar daños por las vibraciones, por ello es importante realizar esta visita, la cual también le permitirá a usted tener como soporte en caso de que se presente un daño y puedan hacer la respectiva reclamación a la empresa contratista. Durante la visita el profesional deberá realizar un registro fotográfico y fílmico a toda la casa desde el exterior como interior.

Cordialmente,

ING. DIEGO OLNEY PÉREZ
Residente de Obra

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-GER-04
	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	RREVISIÓN: 27-01-2024

Yopal 14 de febrero de 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 14/2/24
HORA: 5:00 Pm CANTIDAD DE FOLIOS: 2
RECIBIDO POR: Fabian Rojas
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF – PROY- TIL

Señores
CONSINTER DEL ORIENTE
JOSE NICOLAS ROSO
R/L INTERVENTORIA

Referencia: CONTRATO DE OBRA 032 DE 2023 "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".


Asunto: mejora de los elementos utilizados como señalización preventiva".


Cordial saludo.

me permito informar que durante el desarrollo de las actividades se ha cumplido con la señalización requerida para cada actividad, cabe resaltar que, si bien por los fuertes vientos la señalización se ve afectada, estamos prestos a mejorar según sus indicaciones se reforzara la señalización donde se vea la necesidad según la ejecución del proyecto tratando de cumplir al máximo sus solicitudes como evidencia se anexa registro fotográfico.

reitero el compromiso del área de SST en todos los procesos donde se adelantan actividades del proyecto promoviendo una cultura cero accidentes.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

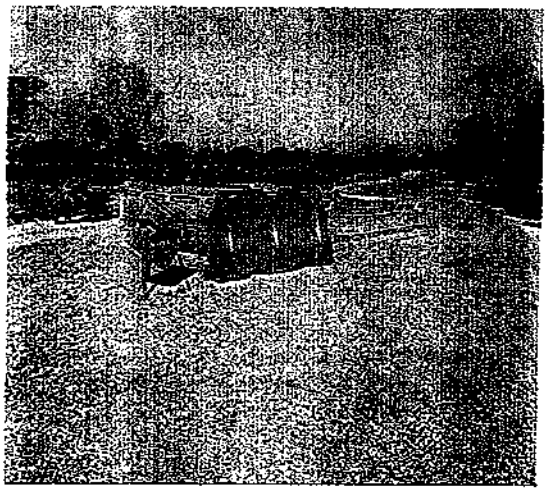

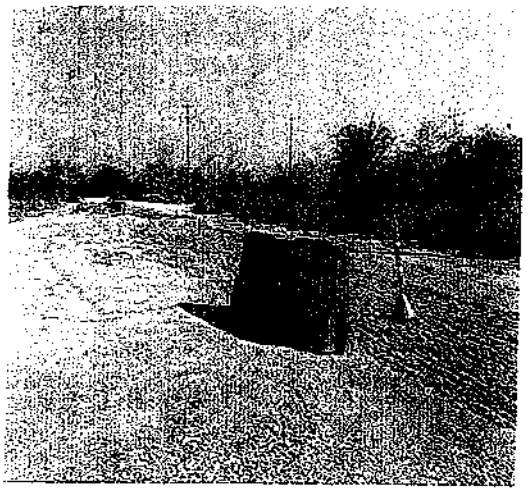





Reviso.
DR. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Proyectó
María Doris Bernal
COORD. SST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Tilodirán, 16 de Febrero de 2024

OF-PROY-TIL

RECTOR
KEVIN JAIR GELVEZ GALVIS
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA INMACULADA

REFERENCIA: *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.*

ASUNTO: ACTA DE VECINDAD

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de informarle que dentro de las actividades que se encuentra ejecutando la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA S.A.S, está la realización de las actas de vecindad en las vivienda del corregimiento de Tilodirán, actividad que tiene como objetivo realizar la inspección de la infraestructura de la vivienda para conocer en qué estado se encuentra, teniendo en cuenta que dentro de las actividades de ejecución se utiliza maquinaria pesada la cual puede generar daños por las vibraciones, por ello es importante realizar esta visita, la cual también le permitirá a usted tener como soporte en caso de que se presente un daño y puedan hacer la respectiva reclamación a la empresa contratista. Durante la visita el profesional deberá realizar un registro fotográfico y fílmico a toda la casa desde el exterior como interior.

Cordialmente,

ING. DIEGO OLNEY PÉREZ
Residente de Obra

RDO. 20-02-2024

729

Tilodirán, 26 de Enero de 2024

OF-PROY-TIL

Señor
DIEGO PARRA LEGUIZAMON
Intendente Inspección de Policía

REFERENCIA: *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.*

ASUNTO: ACTA DE VECINDAD

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de informarle que dentro de las actividades que se encuentra ejecutando la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA S.A.S, está la realización de las actas de vecindad en las vivienda del corregimiento de Tilodirán, actividad que tiene como objetivo realizar la inspección de la infraestructura de la vivienda para conocer en qué estado se encuentra, teniendo en cuenta que dentro de las actividades de ejecución se utiliza maquinaria pesada la cual puede generar daños por las vibraciones, por ello es importante realizar esta visita, la cual también le permitirá a usted tener como soporte en caso de que se presente un daño y puedan hacer la respectiva reclamación a la empresa contratista. Durante la visita el profesional deberá realizar un registro fotográfico y fílmico a toda la casa desde el exterior como interior.

Cordialmente,

ING. DIEGO OLNEY PÉREZ
Residente de Obra

Recibí
F. DIEGO PARRA
26-01-2024
10:30

730

Yopal, 11 de Abril del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 15-Abril-24
HORA: 5:00pm CANTIDAD DE FOLIOS: 17
RECIBIDO POR: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señora:
MARINA VALDERRAMA
PRESIDENTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - TILODIRÁN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".


Asunto: ACTAS DE VECINDAD, VIVIENDAS SIN ACCESO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informarle que, al realizar el proceso de actas de vecindad para llevar a cabo la ejecución del contrato de obra de referencia, no fue posible ingresar a la totalidad de las viviendas aledañas a los tramos viales que serán intervenidos por la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S en el centro poblado de Tilodirán, para dichas viviendas, la empresa contratista no se hará responsable de los daños o afectaciones que se puedan ocasionar en las actividades de obra a ejecutar, pues no existe evidencia del estado anterior al inicio de la obra.

A continuación, se evidencia el registro fotográfico de la fachada de las viviendas a las cuales no se les pudo realizar la inspección debido a la ausencia del usuario:


CALLE 1 CON CARRERA 3 ESQUINA	
	

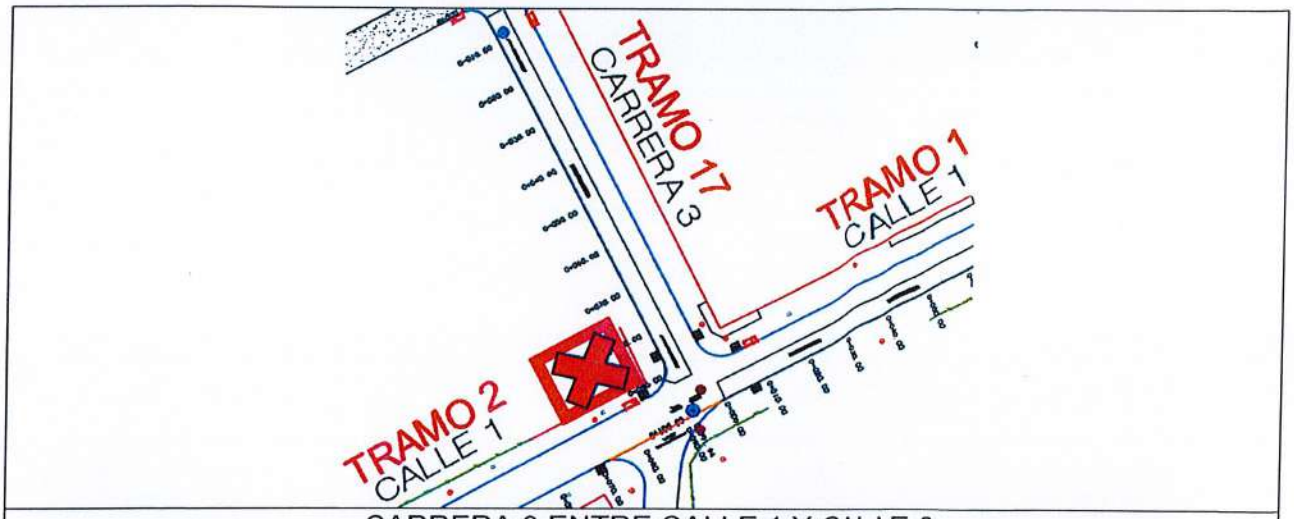

CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2






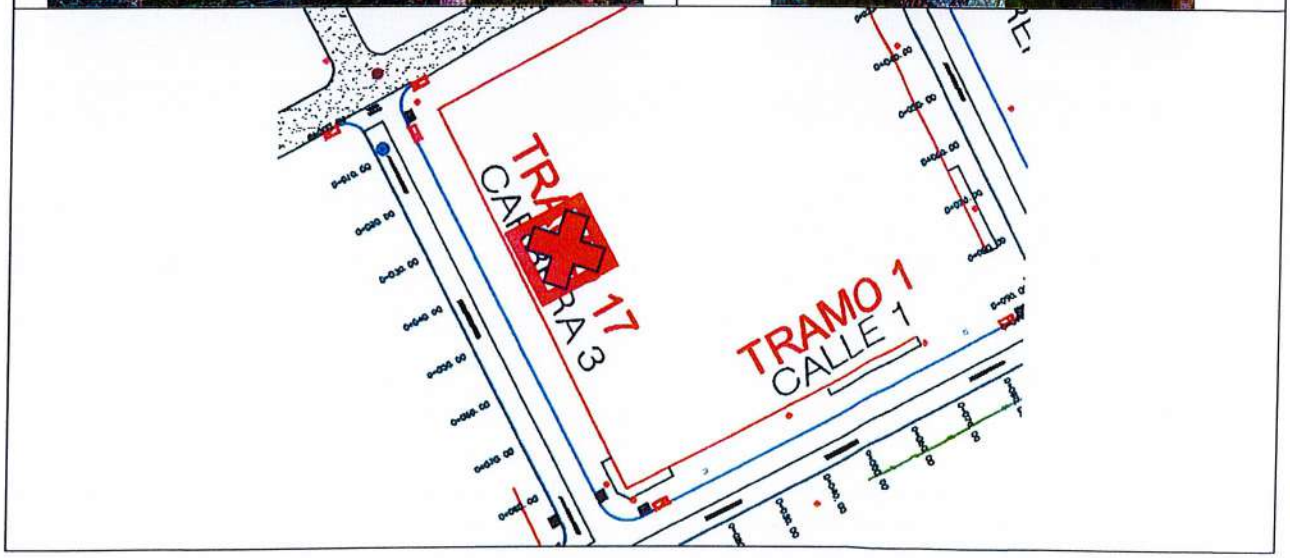

732

CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2

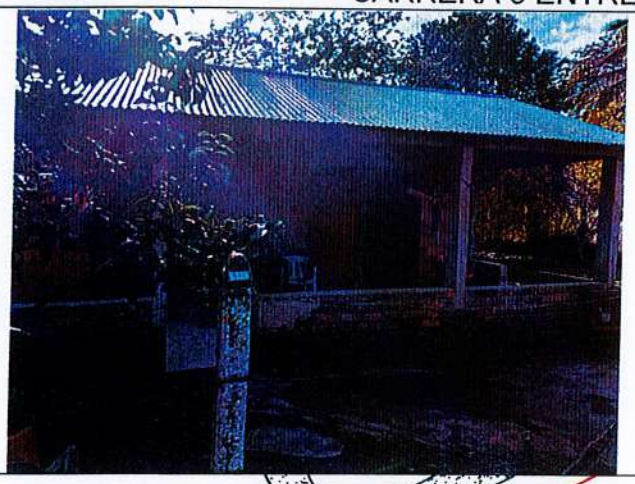






CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2





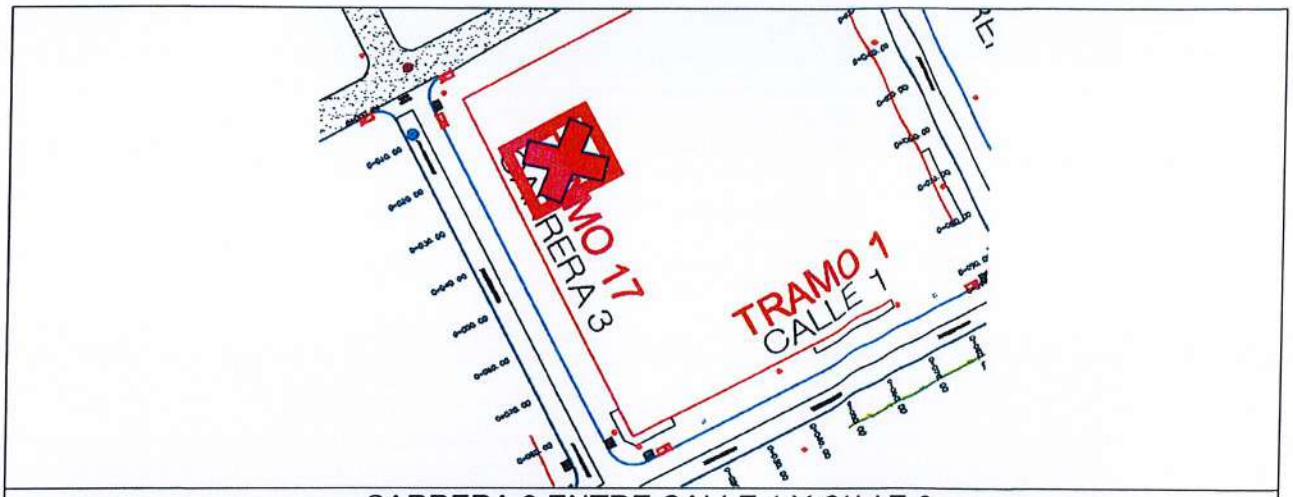

CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2








CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2






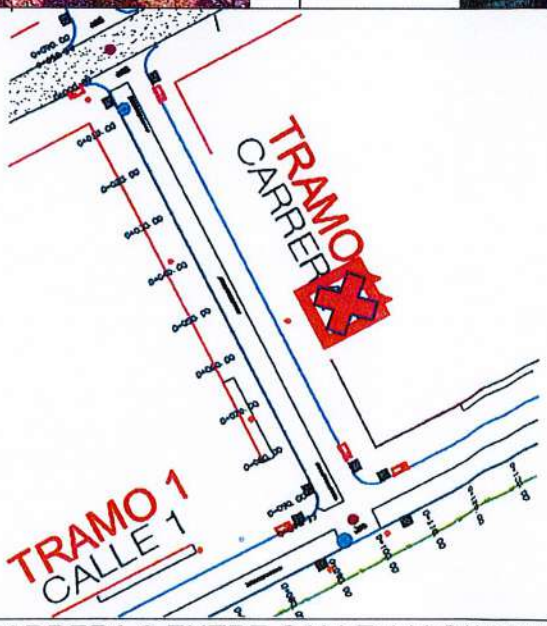

CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2





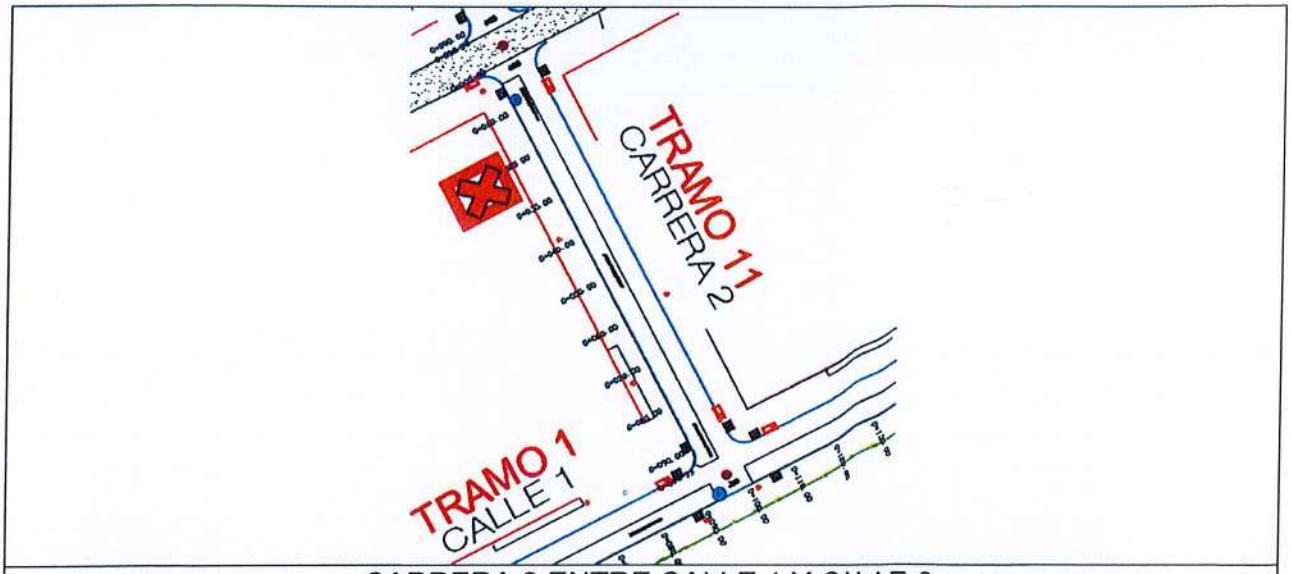

CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2









736

CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2

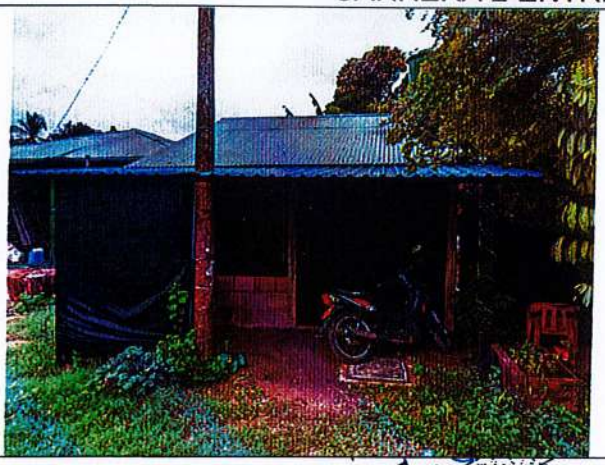



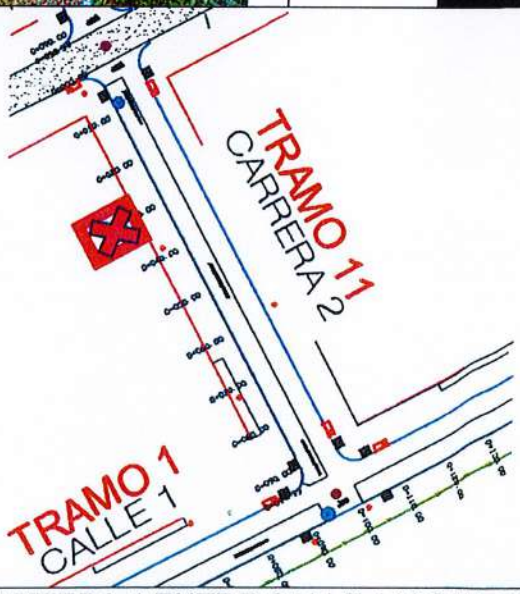


CARRERA 4 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2






737

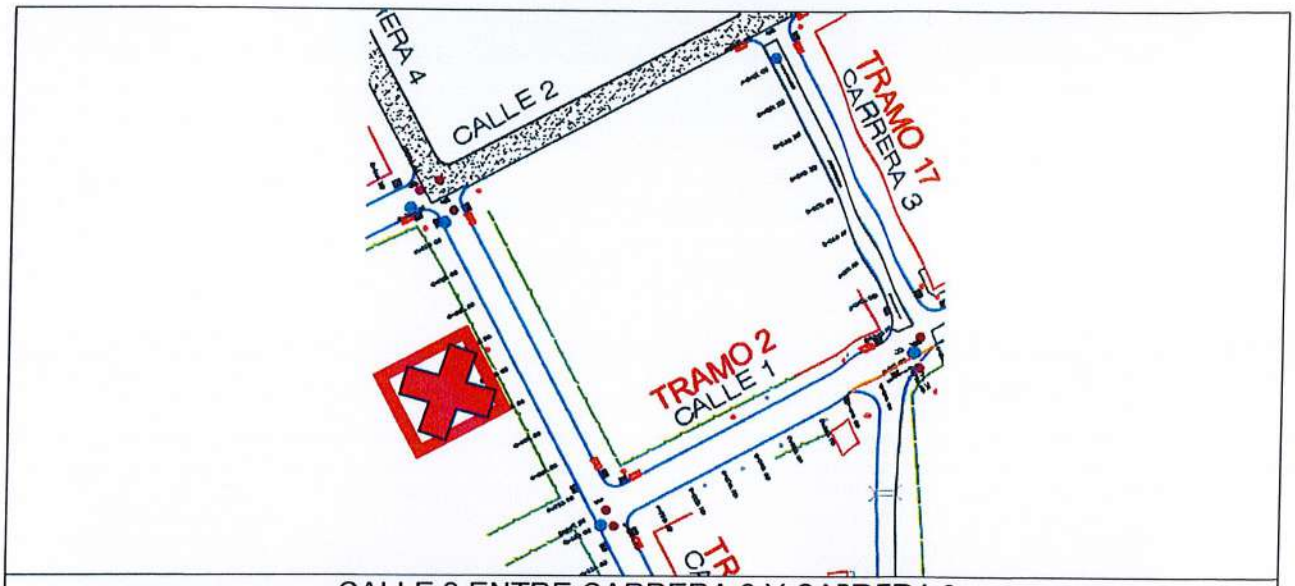

CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3






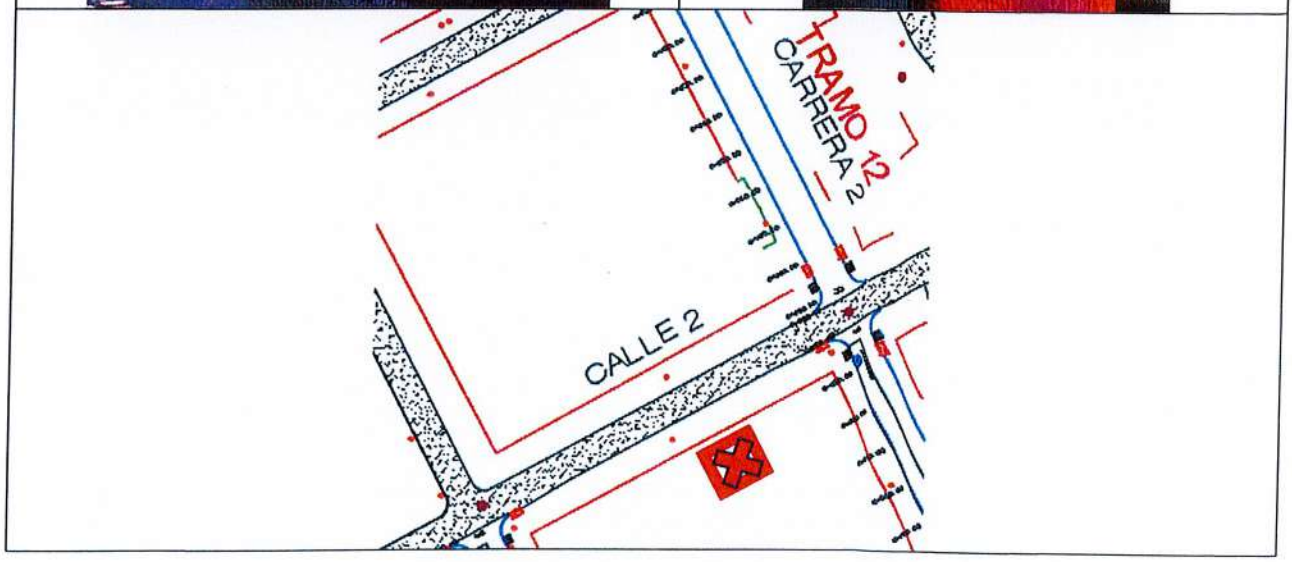

CALLE 2 CON CARRERA 3 ESQUINA






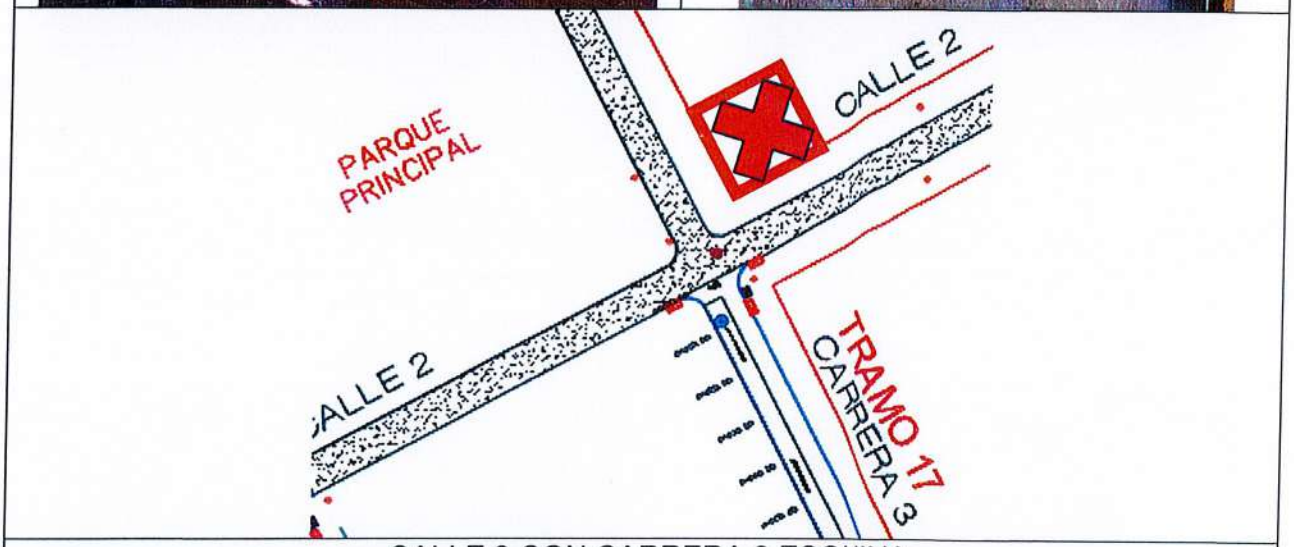

CALLE 2 CON CARRERA 2 ESQUINA






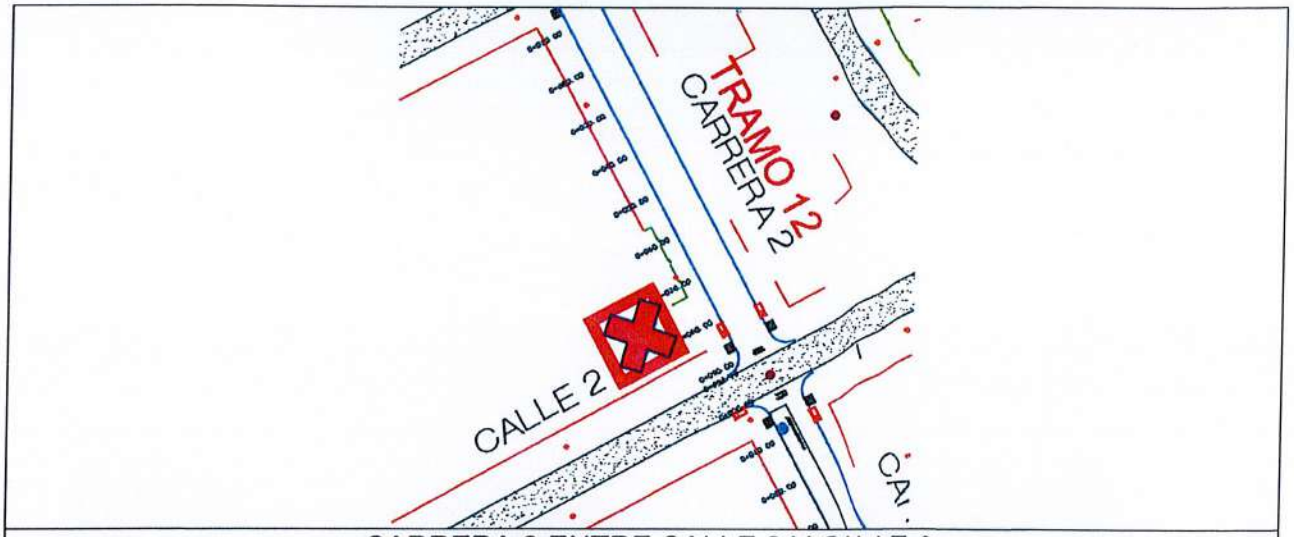

CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3





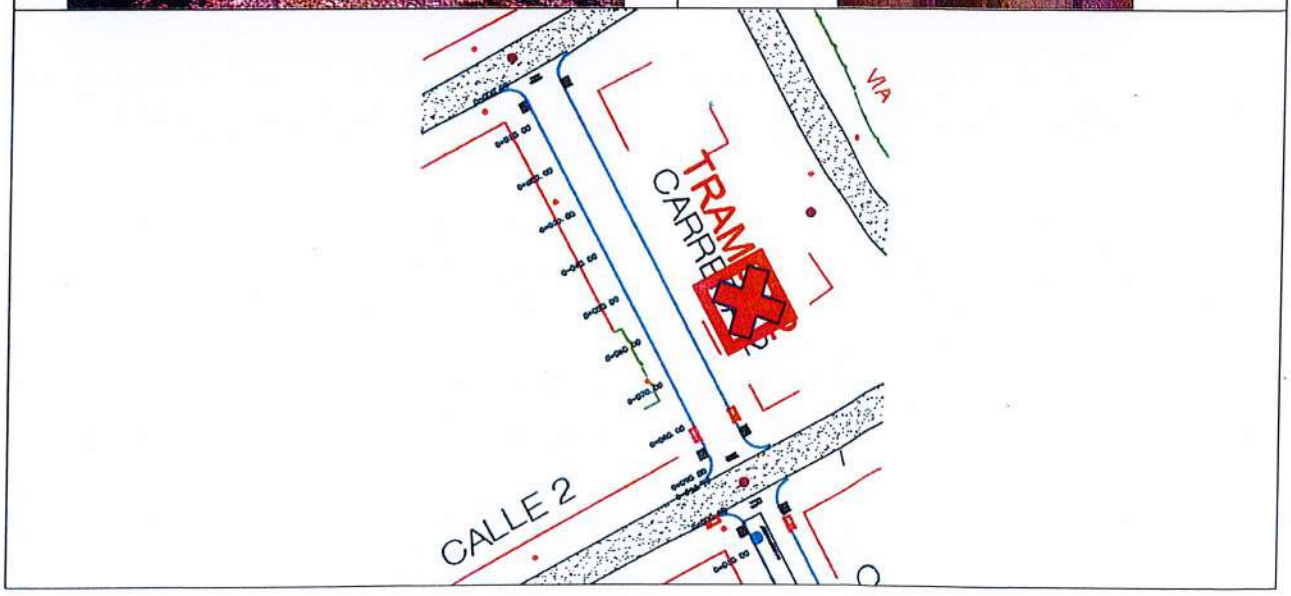


740

CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3





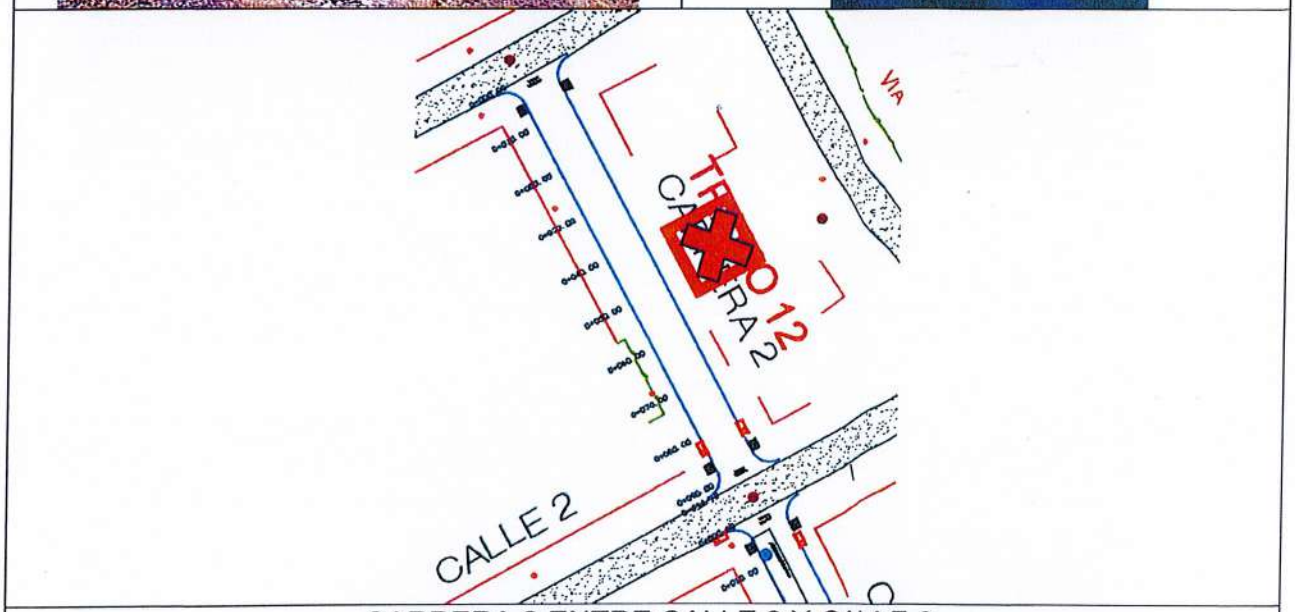


CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3






241

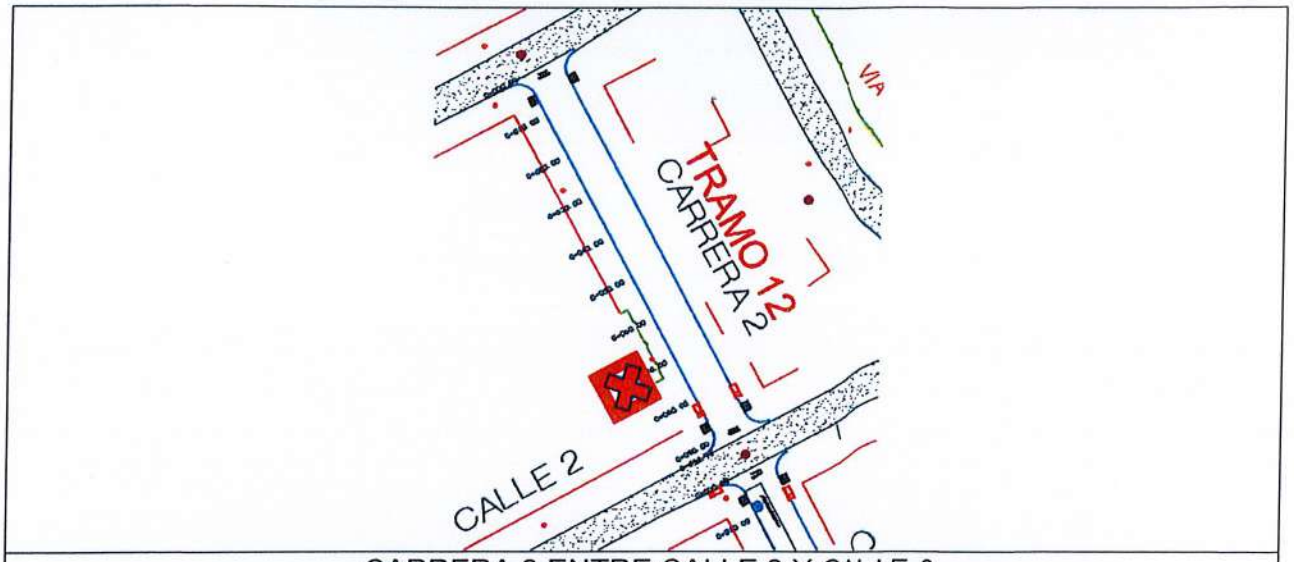

CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3






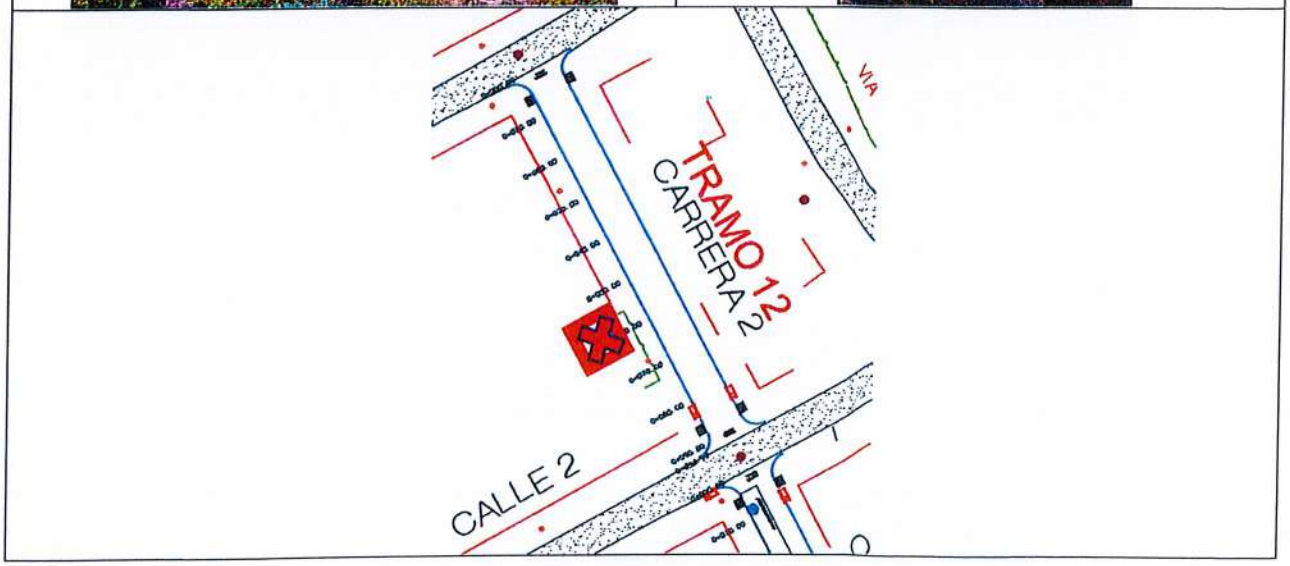

CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3






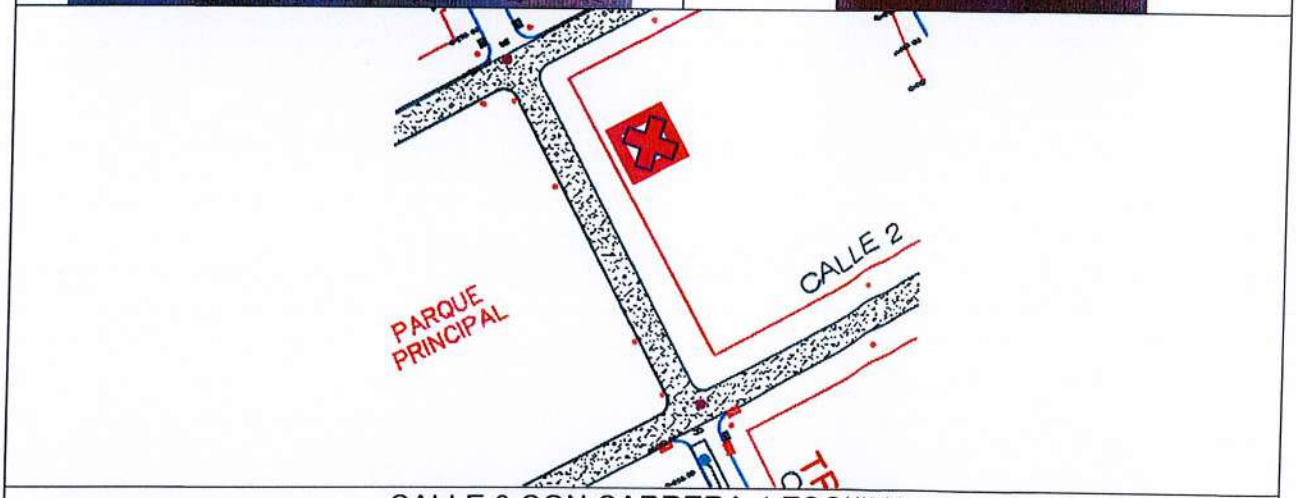


CALLE 3 CON CARRERA 4 ESQUINA






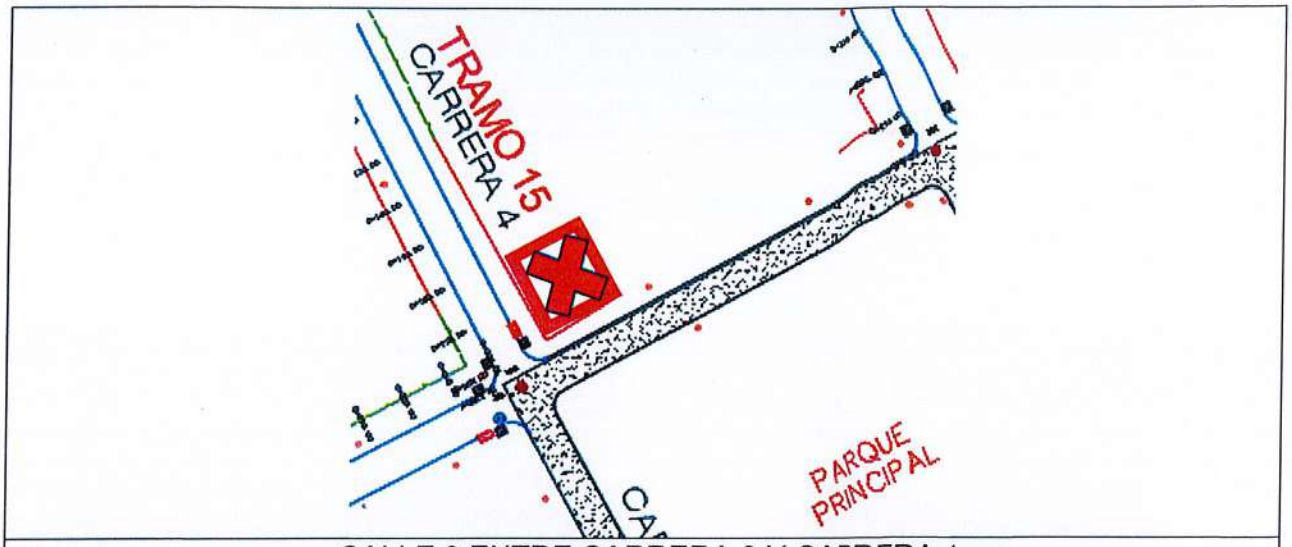

CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4

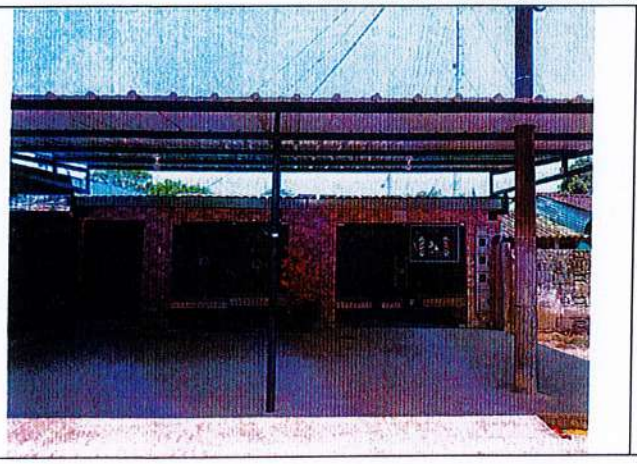




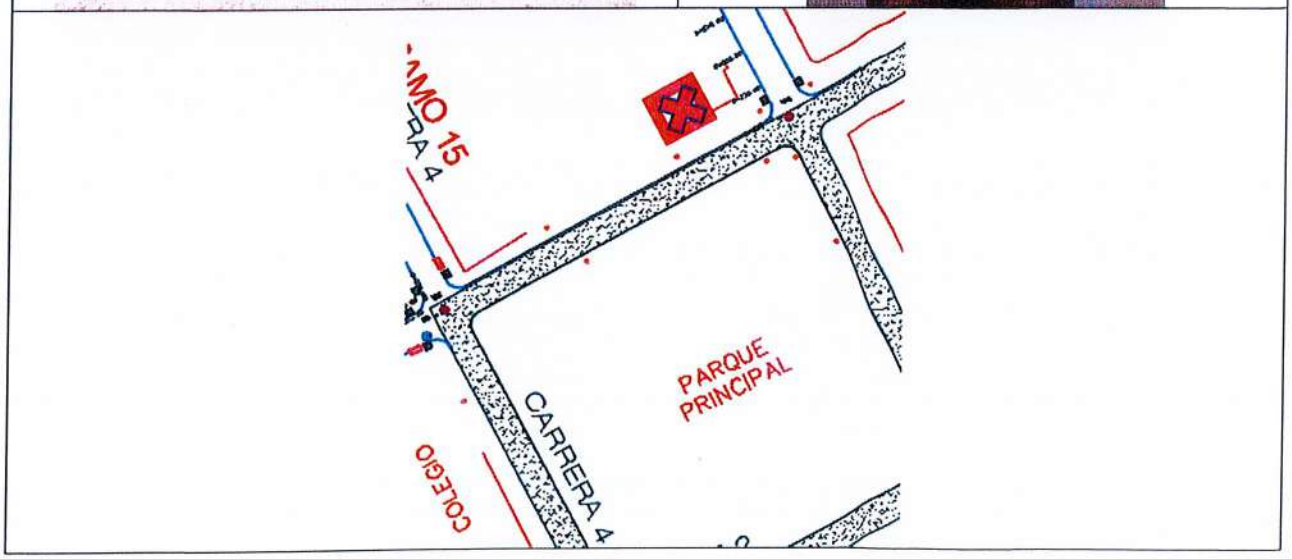


244

CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4

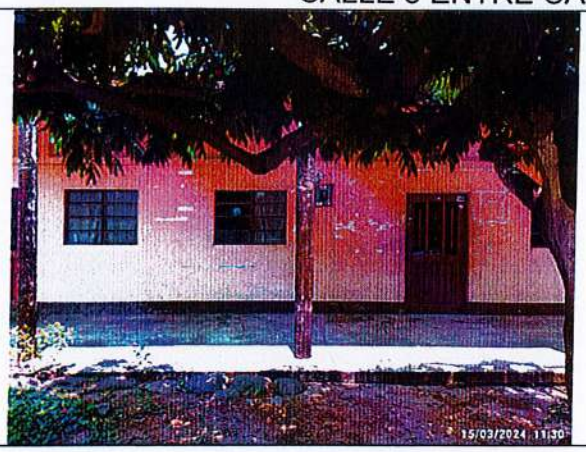




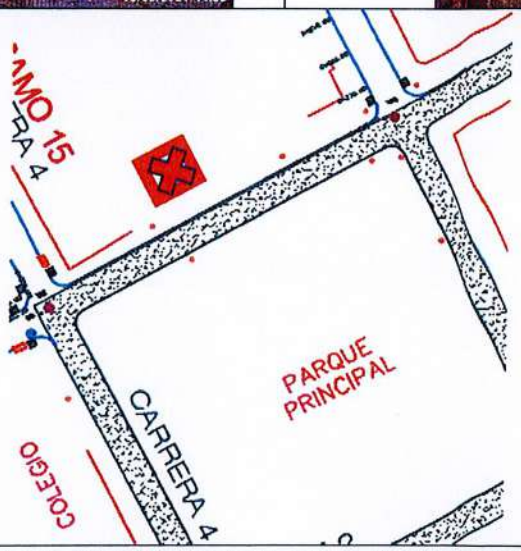

CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4






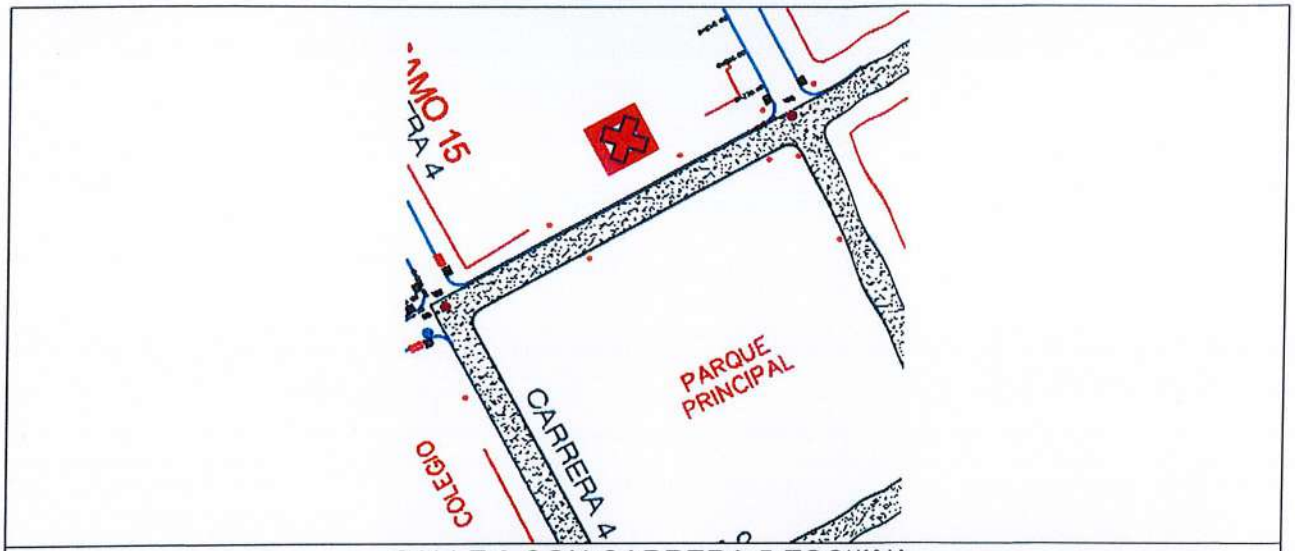

CALLE 3 CON CARRERA 5 ESQUINA







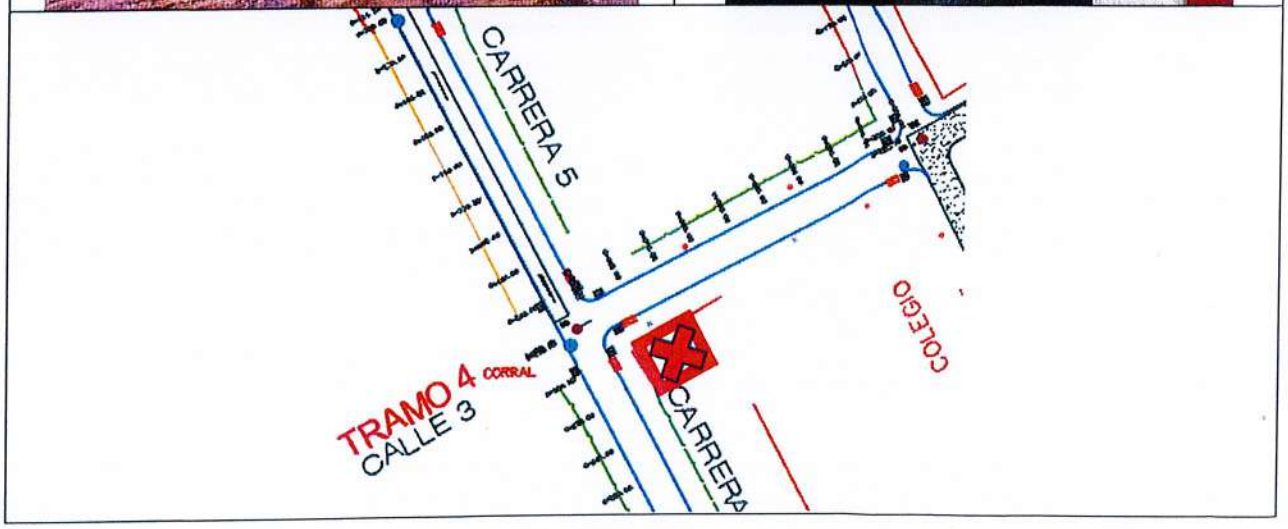

346

Adicionalmente, se presentaron algunas viviendas a las cuales no se les pudo realizar la inspección debido a la no autorización por parte del usuario, cabe resaltar que, inmediatamente se le aclaró al usuario que la empresa contratista no se hará responsable por daños o afectaciones en la vivienda. A continuación, se muestra el registro fotográfico de la fachada de dichas viviendas:

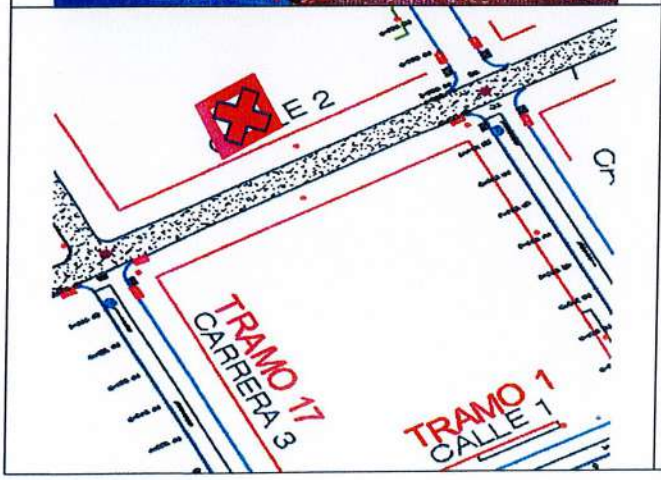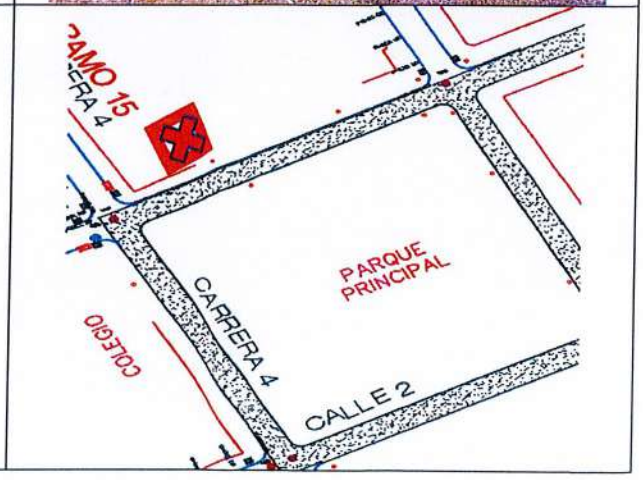CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3	CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4
	
	

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

DIEGO OLNEY PÉREZ PACHÓN
RESIDENTE DE OBRA

Con copia a la Interventoría, **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**

247

Yopal, 22 de Abril del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 22-ABRIL-24
HORA: 4:50Pm CANTIDAD DE FOLIOS: 10
RECIBIDO POR: Fabian Parra.
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD CONEXIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO SANITARIO.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar sobre un requerimiento enviado por la usuaria Yolanda Chaparro de Valderrama, donde solicita la conexión domiciliaria a la red de alcantarillado sanitario (se adjunta documento). Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Interventoría que se verifique, revise y se evalúe la viabilidad de dicha solicitud.

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 18 de Marzo del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA OF-PROY-TIL
FECHA: 19-Marzo-24
HORA: 9:00 am CANTIDAD DE FOLIOS: 2
RECIBIDO POR: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
YEFERSON BELISARIO SALAZAR SUÁREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL BUENA VISTA

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE POSTERÍA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la aprobación y acompañamiento de la actividad de deshincado y movimiento de algunos postes de concreto ubicados en el centro poblado de Tilodirán, los cuales son parte del contrato que está ejecutando el contratista UNIÓN TEMPORAL BUENA VISTA. Cabe resaltar que, una vez finalizadas las actividades de instalación de tubería en estos puntos, se hincará la postería en su punto inicial, dicha actividad será realizada por SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior debido a que dicha postería está en riesgo de presentar un desplazamiento ya que las excavaciones que se están realizando en el sector son bastante inestables, actividad a la cual se le está realizando el entibado necesario para la protección de los taludes, como consecuencia del material encontrado en estos puntos de excavación (arenas); teniendo en cuenta el peligro que conlleva esta situación a los usuarios que tienen sus viviendas cercanas a estos postes, se requiere de manera urgente la aprobación de dicha solicitud. A continuación, se adjunta registro fotográfico de los puntos que se requieren intervenir:

Recibido
15/03/2024
Monica Verdugo
Hora: 4:49 PM.

Calle 38 # 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



Cabe resaltar que, a medida que se avanza en la ejecución del proyecto existe la posibilidad de que se presenten nuevamente estas situaciones, las cuales serán informadas de manera inmediata ante el contratista UNIÓN TEMPORAL BUENA VISTA para su respectiva aprobación. Los costos que conlleven la realización de esta actividad serán asumidos por SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Yopal, 08 de Abril del 2024

MARCADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 08-ABRIL-24
HORA: 9:49Pm CANTIDAD DE FOLIOS: 2
RECIBIDO POR: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VÍA LA GLORIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar sobre un requerimiento enviado por el Edil del centro poblado de Tilodirán José Maldonado, el cual manifiesta la necesidad de la demolición y construcción de una alcantarilla ubicada en la vía La Gloria (se adjunta documento). Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Interventoría que se verifique, revise y se evalúe la viabilidad de dicha solicitud.

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

251

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-GER-04
	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	RREVISIÓN: 27-03-2022

Yopal 22 de abril de 2024

OF-PROY-TIL
ALCALDÍA DE YOPAL
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
23 ABR 2024
RAD No: 20241107782
NOMBRE: HORA:


Señores
ING. NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad
Yopal

ASUNTO: Ajuste Resolución No. 03047 del 09 febrero de 2024.

Cordial saludo,

Por medio la presente me permito solicitarle el ajuste resolución de cierre totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, dado que es necesario incluir la ruta del tráfico pesado desde y hacia la vereda los Mangos ya que la rula autorizada en el momento será intervenida durante la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La ruta de acceso hacia la Vereda Los Mangos propuesta para el ingreso y la salida del tráfico pesado es la que se muestra a continuación: Calle 2 entre la vía Yopal-Algarrobo y carrera 3 entre calle 2 y calle 1 y se toma la vía los mangos, los horarios propuestos que tendrá la ruta para el tráfico pesado en el sector es lunes a viernes de 9 a 11 am y de 3 a 5 pm y el día sábado de 9 a 11 am.

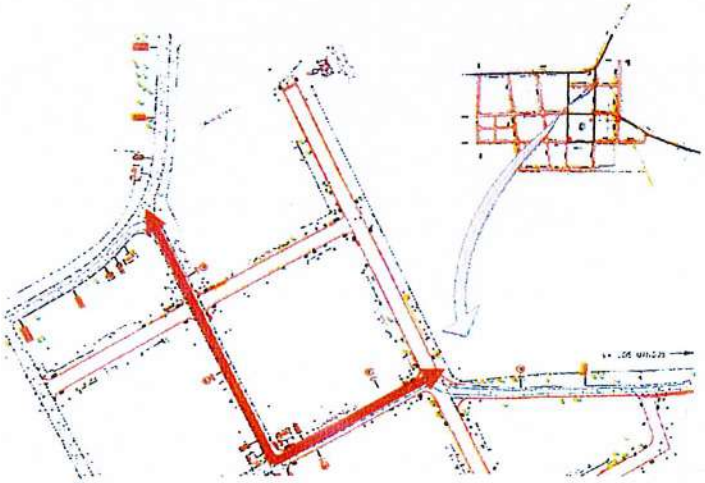

Agradezco su atención y una pronta respuesta

DR. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Anexo: plano

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 23-ABRIL-24
HORA: 5:00pm CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

252

5.12.9 BITÁCORAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

BITACORA DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA A.
NIT: 844.004.840-0

INTERVENTOR: CONSINTER DEL ORIENTE E.U
R/L JOSÉ NICOLAS ROSO BERNAL
NIT: 900.326.145-4

CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A.ESP"
NIT: 900.307.208-9

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 DE AGOSTO DE 2024.

líder

2

líder

MARTES | 10 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se lleva a cabo suscripción del Acta de Inicio del Contrato de obra pública No. 032 DE 2023, el cual tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con un plazo contractual de Diez (10) meses, fijando como fecha de inicio el día 10 de octubre de 2023, y como fecha de terminación el día 09 de Agosto de 2024.

El valor del contrato de obra pública corresponde a un valor total de Treinta y Ocho mil novecientos diecinueve millones seiscientos tres mil trescientos sesenta y ocho pesos M/CTE. C$ 38.919.603.368,00)

las actividades a ejecutar se encuentran divididas en capitulos, de acuerdo al presupuesto oficial de la siguiente manera:

Capitulo 1: Construcción Alcantarillado Pluvial
Capitulo 2: Rehabilitación Alcantarillado Sanitario
Capitulo 3: Instalación Eléctrica e Iluminación
Capitulo 4: Reposición Sistema de Acueducto
Capitulo 5: obras Complementarias

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

líder

MIÉRCOLES	11 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Se lleva a cabo trámites administrativos, correspondientes a la vinculacion de personal de topografia y demás personal requerido para dar inicio a las actividades programadas, actualizacion de pólizas y otros trámites administrativos requeridos e indispensables. Se realiza actualizacion de programacion de obra, con el fin de ser presentada para aprobacion y fines pertinentes ante la Subgerencia Técnica y Operativa de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. ESP". RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
JUEVES	12 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Durante la jornada, se realiza visita técnica a las instalaciones de la Estacion de Bombeo de Agua Residual (EBAR) y a la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), localizadas en la zona Urbana y Rural respectivamente del conegimiento Tilodiran, Municipio de Yopal, con el fin de realizar reconocimiento junto con la firma interventora de las actividades programadas a ejecutar en dicha infraestructura. RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
VIERNES	13 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
	Se da inicio a la ejecución de actividades preliminares, realizadas por la comisión topografica, las cuales corresponden a localización y replanteo de redes existentes, pozos de inspección y verificación de las condiciones actuales de dichos sistemas de alcantarillado sanitario y red de impulsión existente, realizando apiques para identificar el trazado actual de la línea de succión que conduce desde la EBAR hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual.
	PERSONAL: - Residente de Obra - Residente de Interventoria - Comisión Topográfica
	EQUIPO - Herramienta Menor - EQUIPO DE TOPOGRAFIA
	RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
SÁBADO	14 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

líder

Se da continuidad a la realiacion de actividades preliminares, realiadas por la comision topografica, las cuales corresponden a la localiacion y replanteo de redes existentes, pozos de Inspeccion y condiciones de dichos sistemas de alcantarillado sanitario y redes de acueducto.

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topografica

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografia

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO

DIA NO LABORABLE

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES	16 DE OCTUBRE DE 2023
	ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO
	DIA NO LABORABLE (FESTIVO).
	RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
MARTES	17 DE OCTUBRE DE 2023
	ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
	La comisión Topográfica continúa con la ejecución de actividades preliminares; se da Inicio a la ejecución de Replanteo y localización de tuberías de Alcantarillado en los tramos No. TP-28 y TP-31, Tubería PVC Alcantarillado 36".
	Se da inicio a la elaboración de las Actas de vecindad, en el sector que comprende la Calle 1 desde la EBAR hasta la PTAR, realizando a su vez Socialización y explicación casa a casa de las actividades a ejecutar, en acompañamiento de profesionales del área de Ingeniería Civil y del área Social.
	PERSONAL:
	- Residente de obra
	- Residente de Interventoría
	- Comisión Topográfica.

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- EQUIPO DE TOPOGRÁFIA.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Deyra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

La Comisión Topográfica continúa con la ejecución de actividades preliminares; se continúa con el Replanteo y localización de tuberías de Alcantarillado en los tramos No. TP-14 y TP-15, Tubería PVC Alcantarillado 39".

Se realiza rocería del área donde se realizará la construcción de los tramos de Alcantarillado Pluvial que inicia en el Tramo TP-45 hasta la PTAR.

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica

EQUIPOS
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografía.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

761

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

La comisión Topográfica continua con la ejecución de actividades Preliminares; se continua con el Replanteo y localización de tuberías de Alcantarillado en los tramos No. TP - 20, Tubería PVC Alcantarillado 48".

Se continua con la rocería del Area de servidumbre, donde se localizará la Tubería PVC Alcantarillado 60"

PERSONAL:
- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica

EQUIPOS:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografía.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
líder

VIERNES	20 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO la comisión Topográfica continua con la ejecución de actividades Preliminares; se continúa con el Replanteo y localización de tuberías (de tuberías) de Alcantarillado en los Tramos No. TP-22 al TP-24, Tubería PVC Alcantarillado 48" Se da continuidad a la elaboración de las Actas de vecindad, en el sector que comprende la Calle 1 desde la EBAR hasta la PTAR, realizando a su vez socialización y explicación casa a casa de las actividades a ejecutar, en acompañamiento de profesionales del área de Ingeniería civil y del área Social. PERSONAL - Residente de obra - Residente de Interventoría - Comisión Topográfica EQUIPO: - Herramienta menor - Equipo de Topografía. RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
SABADO	21 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO

	NO se ejecutan actividades por malas condiciones climáticas, se presentan fuertes lluvias durante toda la jornada.
	RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
DOMINGO	22 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
	DIA NO LABORABLE.
	RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
LUNES	23 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
	La Comisión Topográfica continua con la ejecución de actividades Preliminares; se continúa con el Replanteo y localización de Tuberías de Alcantarillado en los tramos No. TP-24 al TP-25, Tubería PVC Alcantarillado 48"
	Se da terminación a la actividad de Rocería del area de servidumbre donde se localizará la Tubería PVC Alcantarillado 60".

líder

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografía

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

La Comisión Topografica continua con la ejecución de actividades preliminares; se da inicio al Replanteo y localización de Tuberías de Alcantarillado en los Tramos No. TP-32 al TP-38, Tubería PVC Alcantarillado 60".

Se realiza rocería al predio donde se llevará a cabo la adecuación del campamento y área de Almacenamiento de materiales.

PERSONAL
- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica.

líder

	EQUIPO: - Herramienta Menor - Equipo de Topografía. RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA
Miercoles	25 DE OCTUBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO La comisión Topografica continúa con la ejecución de actividades preliminares; Se da inicio y continuación al Replanteo y localización de Tuberías de Alcantarillado en los Tramos No. TP-38 al TP-40, Tubería PVC Alcantarillado 60". Se continua con actividades de rocería en el predio donde se llevará a cabo la adecuación del campamento. PERSONAL: - Residente de obra - Residente de Interventoría - Comisión Topográfica - EQUIPO - Herramienta menor - Equipo de Topografía

líder

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Jueves 26 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

La comision topografica continua con la ejecución de actividades preliminares. Se continua con el replanteo y localizacion de Tuberias de Alcantarillado en los Tramos No. TP-40 al TP-48., Tuberia PVC Alcantarillado 60".

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topográfica

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografia

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Viernes 27 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

La comision Topografica continua con la ejecucion de actividades Preliminares. Se continua con el replanteo y localizacion de Tuberias de Alcantarillado en los Tramos No. T.P- 48 al TP-50, Tuberia PVC Alcantarillado 60".

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topografica

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografia

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

SABADO

28 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se da inicio a adecuaciones preliminares del campamento y se continua con el replanteo y localizacion de Tuberias de Alcantarillado en los Tramos No. TP-50 y TP-55. Tubera Alcantarillado PVC 60".

PERSONAL.
- Residente de obra
- Residente de Interventoria

EQUIPO

- Herramienta Menor
- Equipo de Topografia.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

DOMINGO

29 DE OCTUBRE DE. 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DIA NO LABORABLE.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES

30 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la localizacion y replanteo de Tuberias de Alcantarillado en los Tramos No. TP-55 a TP-58, se continua con la ejecucion de actividades en campamento.

PERSONAL

- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topografica

líder

EQUIPO:
- Herramienta Menor
- Equipo de Topografia.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES

31 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO / LLUVIOSO

Se continua con el replanteo y localizacion de Tuberias de Alcantanillado en los Tramos No. TP-58 al TP-64. Tubería PVC Alcantanllado 60"

PERSONAL
- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comisión Topografica

EQUIPO
- Herramienta Menor
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE INTERVENTORIA — INSPECTOR DE OBRA

MIÉRCOLES	01 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Se da terminación a la actividad de Replanteo y localización de Tubería PVC Alcantarillado Pluvial; Se da Inicio a la localización y replanteo de la Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de 4". Se da inicio al Recibo y descargue de la Tubería PVC Novaloc Alcantarillado 60". PERSONAL - Residente de obra - Inspector de obra - Residente de Interventoría - Inspector de Interventoría - Comisión Topográfica - EQUIPO: - Herramienta Menor - Equipo de Topografía - Retroexcavadora de Orugas PC 210 RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA
Jueves	02 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Se continúa con la localización y Replanteo previo a la Instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 de 4", la cual hace parte de la línea de Impulsión que se ubica desde la EBAR, hasta la PTAR. Se continúa con el recibo y descargue de la Tubería PVC novaloc Alcantarillado 60"

líder

	PERSONAL - Residente de obra - Inspector de obra - Residente de Interventoria - Inspector de Interventoria - Comision Topográfica EQUIPO - Equipo de Topografia - Retroexcavadora sobre orugas PC 210. RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORIA Dayro Marley INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA
VIERNES	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 Estado del Tiempo: SOLEADO Se continúa con la localización y replanteo previo a la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 4", que hace parte de la linea de impulsión que se localiza desde la EBAR hasta la PTAR. Se llevan a cabo adecuaciones preliminares al área y zona donde se llevará a cabo la instalación de la linea de impulsión; Adicional a esto, se continúa con la construcción del campamento o punto de acopio y almacen de materiales, equipos y herramientas, Descargue de Tubería PVC novaloc 60". PERSONAL - Residente de obra - Inspector de obra - Residente de Interventoria - Inspector de Interventoria - Comision Topográfica - Ayudante de obra - Maestro de obra.

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210
- Herramienta menor.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SÁBADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la localización y replanteo del trazado de la línea de Impulsión; Se da inicio a la actividad de excavación manual para la instalación de cerca en campamento.

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoria
- Comisión Topografica
- Maestro de obra
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoria
- Ayudante de obra

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

líder

DOMINGO	05 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO DIA NO LABORABLE. RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
LUNES	06 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO / LLUVIOSO DIA NO LABORABLE (FESTIVO). RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
MARTES	07 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Se da inicio a la actividad de excavación a mano en material común para la Instalación de la línea de Impulsión, a su vez se da inicio a la ejecución del encamado, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Una vez se lleva a cabo la actividad del encamado, se procede a realizar la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 de Ø = 110 mm = 4" y su unión, la cual se lleva a cabo por medio del

líder

procedimiento de termofusión a tope; una vez instalada la tubería, se procede a realizar el relleno en arena lavada apisonada para el respectivo atraque de la Tubería y postenor a esto, se lleva a cabo el relleno en material seleccionado de la excavación compactado; el material sobrante se dispone en el area de trabajo para luego ser retirado al punto autorizado para la ejecución de dicha actividad. Todas las actividades ejecutadas, se llevan a cabo de acuerdo al Diseño y las especificaciones tecnicas establecidas en el Proyecto. Se realiza Replanteo de red media tension.

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topografica
- Maestro de obra (1)
- Inspecter de obra
- Inspecter de Interventoria
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (2)

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor
- Retroexcavadora Sobre orugas PC 210
- Volqueta.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material comun para la instalación de la linea de Impulsión, a su vez se

Continúa con la actividad de encamado en arena lavada apisonada, posterior a esto se lleva a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 RN 10 ϕ = 110 mm = 4", por medio del procedimiento de termofusión a tope; una vez instalada la tubería se procede a realizar el relleno en arena lavada apisonada para el respectivo atraque de la tubería y posterior a esto, se lleva a cabo el relleno en material seleccionado de la excavación compactado; el material sobrante se dispone en el área de trabajo para luego ser retirado al punto autorizado para la ejecución de dicha actividad. Todas las actividades son realizadas de acuerdo al Diseño y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra (1)
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoría
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (2)

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
- HERRAMIENTA MENOR
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210
- Volqueta.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORÍA

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

líder

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común para la instalación de la línea de impulsión, a su vez se continúa con la actividad de encamado en arena lavada apisonada, posterior a esto se lleva a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ: 110mm 4", por medio del procedimiento de termofusión a tope; una vez instalada la tubería se procede a realizar el relleno en arena lavada apisonada para el respectivo atraque de la tubería y posterior a esto, se lleva a cabo el relleno en material seleccionado de la excavación compactado; el material sobrante es cargado y retirado al punto autorizado. las actividades ejecutadas se realizan de acuerdo al Diseño y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra (1)
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoría
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (2)

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
- Herramienta Menor
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210
- Volqueta

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Dayra Marley

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO 6:00 AM A 2:00 PM / SOLEADO.

líder

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común para la Instalación de la línea de Impulsión, la cual se llevará a cabo en Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 110 mm = 4".

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra (1)
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoría
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (2)

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
- Herramienta Menor
-

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORÍA

Dayra Marley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORÍA

SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común para la posterior Instalación de la línea de Impulsión, a su vez se lleva a cabo la actividad de encamado en arena lavada apisonada; posterior a esto, se lleva a cabo la instalación de la tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 110 mm = 4", por medio del procedimiento y equipo de termofusión a tope; la cual se realiza contando con la asesoría de personal capacitado de la empresa PAVCO WAVIN, quienes asesoran y acompañan la

líder

realización de la actividad y la capacitación del personal. Una vez realizado el procedimiento de instalación de la tubería, se lleva a cabo el relleno en arena lavada apisonada para el respectivo atraque de la tubería, posterior a esto, se realiza el relleno en material seleccionado de la excavación, el cual es compactado; el material sobrante es cargado y retirado al punto autorizado. Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños, proceso y procedimientos técnicos de marca y a las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Oficial de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Ayudante de obra (2)

EQUIPO

- Equipo de Topografía
- Volqueta
- Herramienta menor
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORÍA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORÍA

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DIA NO LABORABLE.

líder

	RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
LUNES	13 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO DIA NO LABORABLE (FESTIVO) RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
MARTES	14 DE NOVIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO Se continua con la actividad de excavacion a mano en material comun, se realiza encamado de arena, instalacion de tubera, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavacion compactado y cargue y retiro de material sobrante. Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos tecnicos de marca y a las especificaciones tecnicas establecidas en el Proyecto. PERSONAL - Residente de obra — Inspector de obra - Residente de Interventoria — Inspector de Interventoria líder

- Comisión Topografica
- Maestro de obra (1)
- Oficial de Obra (2)
- Ayudante de Obra (6)

EQUIPO
- Comisión Topografica (EQUIPO DE TOPOGRAFIA)
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Retroexcavadora Sobre orugas PC 210

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encamado de arena, instalación de Tubería, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado y cargue y retiro del material sobrante. las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, procesos y procedimientos tecnicos de la marca PAVCO y a las ESPECIFICACIONES TECNICAS establecidas en el proyecto.

PERSONAL:
- Residente de obra
- Residente de Interventoria
- Comisión Topografica
- Maestro de obra (1)
- Inspector de obra (1)
- Inspector de Interventoria (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (7)

EQUIPO:
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES

16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encamado de arena, Instalación de tubería, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado y cargue y retiro de material sobrante. Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la Interventoría y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL:
- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topografica
- Maestro de obra (1)
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoría
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (7)

EQUIPO:
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA

líder

- Herramienta menor
- Volqueta
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210

RESIDENTE OBRA | DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavacion a mano en material común, se realiza encamado de arena, instalacion de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 110mm - 4", relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavacion compactado y cargue y retiro de material sobrante de la excavación. las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL
- Residente de obra
- Inspector de obra
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria
- Comision Topografica
- Oficial de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Ayudante de obra (7).

EQUIPO
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Volqueta
- Herramienta menor
- Retroexcavadora PC 210

RESIDENTE OBRA | DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO | 18 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavación a mano en material comun, se realiza encamado de arena lavada, Instalacion de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ: 110mm 4", relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado y cargue y retiro de material sobrante de la excavación. las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos, procedimientos y manuales de la marca PAVCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas estableadas en el proyecto.

PERSONAL:
- Residente de obra
- Inspector de obra
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria
- Comision Topográfica
- Oficial de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Ayudante de obra (7)

EQUIPO
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta menor
- Volqueta
- Retroexcavadora sobre Orugas PC 210

RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DIA NO LABORABLE

RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encamado de arena lavada, instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 Φ: 110 mm : 4", relleno con arena lavada apisonada para ataque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, cargue y retiro de material sobrante de la excavación; las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos tecnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la interventoria y las especificaciones tecnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL
- Residente de obra
- Inspector de obra

lider

- Residente de Interventoria	- Inspector de Interventoria
- Comision Topografica	- Oficial de obra (2)
- Maestro de obra (1)	- Ayudante de obra (7)

EQUIPO

- Equipo de Topografia	- Volqueta
- Herramienta Menor	- Retroexcavadora PC 210

RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material comun, se realiza encamado de arena lavada, Instalacion de Tubera Polietileno PE 100 PN 10 ϕ=110 mm, relleno con arena lavada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, cargue y retiro de material sobrante de la excavación; las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la empresa PAVCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL

- Residente de Obra	- Inspector de Interventoria
- Residente de Interventoria	- Inspector de Obra
- Comisión Topografica	- Oficial de Obra (2)
- Maestro de Obra (1)	- Ayudante de Obra (8)

líder

EQUIPO
- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini cargador Bot cat
- Retroexcavadora sobre oruga

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encamado en arena lavada, instalación de tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ: 110 mm = 4", relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, cargue y retiro de material sobrante al punto autorizado. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL:
- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comisión Topografica
- Maestro de obra
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoria
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (8)

EQUIPO:
- Equipo de Topografia
- Volqueta

líder

- Herramienta Menor
- Retroexcavadora PC 210
- MiniCargador

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encamado en arena lavada, Instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 110 mm = 4", relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, cargue y retiro de material sobrante al punto autorizado. las actividades fueron realizadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones realizadas por la interventoría y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto

PERSONAL:

- Residente de Obra
- Inspector de obra
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Oficial de obra (2)
- Maestro de obra
- Ayudante de obra (8)

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
- Volqueta, Minicargador
- Herramienta Menor
- Retroexcavadora PC 210

líder

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIOSO 8:00 AM A 12 M / SOLEADO

Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ= 4", que corresponde a la línea de Impulsión que se ubica desde la EBAR hasta la PTAR, se llevan a cabo las siguientes actividades, deacuerdo a lo establecido en los diseños y especificaciones técnicas del Proyecto:

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encamado de tubería
3. Instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ= 4"
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque de tubería
5. Relleno de la excavación con material seleccionado
6. Cargue y Retiro de material sobrante

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de Obra
- Inspector de Obra / Interventoría
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (8)
- Profesional HSEQ

EQUIPO:

- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Minicargador - Miniexcavadora
- Retroexcavadora

RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO

25 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO / LLUVIOSO 1:00 P.M A 5:00 P.M

Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 Ø= 4" (LINEA DE IMPULSIÓN) y demás actividades que hacen parte del capítulo 2.4. Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales, y que se describen a continuación, dichas actividades son ejecutadas de acuerdo a lo establecido en los Diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto:

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encamado
3. Instalación de Tubería de Polietileno 4" (Termofusión)
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque
5. Relleno con material seleccionado de la excavación
6. Cargue y Retiro de Material Sobrante

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topografica
- Maestro de obra
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (8)
- Director de Interventoría
- Operadores de Maquinaria
- Profesional SST
- Controladora vial (1)

EQUIPO:

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini Cargador
- Retroexcavadora PC 210
- Miniexcavadora

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DIA NO LABORADO.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 8:00 AM A 12:00 m / SOLEADO

♥ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalacion linea Impulsion

En este frente de obra, se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la Instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 4", correspondiente a la linea de Impulsion que se localiza desde la EBAR hasta la PTAR, y cuyas actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto:

líder

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encamado de Tubería
3 Instalación de Tubería de Polietileno (Por termofusión A TOPE)
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque de tubería
5 Relleno con material seleccionado de la excavación
6 Cargue y Retiro de Material Sobrante

PERSONAL:

- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra: (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (8)
- Operadores de Maquinaria
- Profesional SST / HSEQ
- Controladora Vial (1)
- Almacenista

EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini Cargador
- Retroexcavadora PC 210
- Mini excavadora.

♥ FRENTE DE OBRA No. **2** → Instalaciones Eléctricas
Se da inicio a la ejecución de actividades eléctricas, Subcapítulo **3.1 Media tensión,** llevando a cabo apertura de hueco para postes.

PERSONAL:

- Cuadrilla BB (Instalaciones)

EQUIPO:

- Herramienta Menor

líder

792

RESIDENTE OBRA | DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Morley
INSPECTOR OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 8:00 AM A 11:00 AM / SOLEADO

♥ FRENTE DE OBRA No. 1 → Instalacion Linea de Impulsion
En este frente de obra, se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalacion de la Tuberia de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 4". Correspondiente a la linea de Impulsion que se localiza desde la EBAR hasta la PTAR, y cuyas actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños y las especificaciones tecnicas del Proyecto.

1. Excavacion a mano en material Comun
2. Relleno en arena lavada apisonada para encamado
3. Instalacion de Tuberia de Polietileno PE 100 PN 10 ϕ = 4"
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque
5. Relleno con material seleccionado de la excavacion
6. Cargue y Retiro de material Sobrante

♥ FRENTE DE OBRA No. 2 → Instalaciones electricas
Se continua en la ejecucion de actividades electricas que hacen parte del subcapitulo 3.1 Media Tension, llevando a cabo la ejecucion de las siguientes actividades.

1. Instalacion de Postes en concreto 12 m x 510 kgf, dicha actividad consistio en el suministro, transporte, armada, hincada y plomada de los postes con referencia No.

P8, P9, P11 y P12, Dichos postes fueron cimentados, de acuerdo a las inapropiadas condiciones del terreno, que mostró caracteristicas de alto grado de expansion y compresibilidad, siendo rellenos naturales inestables y con presencia de nivel freatico a menos de 0,80 m de profundidad.

2. Retiro y traslado de postes de ferroconcreto de 12m x 510 kgf; actividad que incluyó ahoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio (P10, P13).

3. Desmonte y montaje de transformador trifasico 30 KVA, Incluyendo Protecciones

4. Cimentacion para postes de 10/12m (P10, P13).

PERSONAL

- Residente de obra
- Residente de Interventoria
- Comision Topografica
- Maestro de obra (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (8)
- Operadores de maquinaria
- Profesional SST | HSEQ
- Controladora vial (1)
- Almacenista
- Cuadrilla FF-1 (Especializada).

EQUIPO

- Equipo de Topografia
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Minicargador
- Retroexcavadora PC 210 (2).
- Miniexcavadora
- Camion grua.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIÉRCOLES | 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

✔ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación línea de Impulsión.
En este frente de obra se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno ϕ= 4" (línea de impulsión) las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, las recomendaciones del fabricante de la tubería, la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.

✔ FRENTE DE OBRA NO. 2 → Instalaciones eléctricas
Se continúa en la ejecución de actividades eléctricas que hacen parte del subcapítulo 3.1. Media Tensión, llevando a cabo su ejecución de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Proyecto, el Diseño y la normatividad actual que rige la materia.
1. Se lleva a cabo instalación de estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble 2m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15 KV, suministro, transporte y montaje
2. Se lleva a cabo instalación de estructuras LA-461 | H-1000 para red compacta 13,2 KV, Incluye suministro y vestida.

PERSONAL:

- Residente de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (8)
- Inspector de obra / Interventoría
- Operadores de maquinaria
- Profesional SST / HSEQ
- Controladora vial (1)
- Almacenista
- Cuadrilla FF-1

líder

EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini cargador
- Retroexcavadora PC 210 (2)
- Camión grúa
- Equipos para trabajo seguro en alturas.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

Jueves 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

♥ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación línea de Impulsión

En este frente de obra se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno $\phi = 4"$ (Línea de Impulsión). las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, las recomendaciones del fabricante de la tubería, la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.

♥ FRENTE DE OBRA NO. 2 → Instalaciones Eléctricas

Se continúa en la ejecución de actividades eléctricas que hacen parte del Subcapítulo **3.1 Media Tensión**, llevando a cabo su ejecución de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Proyecto, el Diseño y la normatividad actual que rige la materia.

1. Se lleva a cabo instalación de Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, Suministro y vestida.

líder

2. Se lleva a cabo Instalación de Descargadores de Sobretensión (3go/3) 15 kV cambio red compacta abierta Suministro e Instalación.

PERSONAL

- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topografica
- Maestro de Obra
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (8)
- Inspector de obra / Interventoria
- Operadores de maquinaria
- Profesional SST / HSEQ
- Controladora vial
- Almacenista
- Cuadrilla FF-1

EQUIPO:

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta y equipo menor
- Volqueta
- Mini cargador
- Retroexcavadora PC 210
- Camion grua
- Equipos para trabajo seguro en alturas.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2023

* FRENTE DE OBRA No. 1 → Instalación Línea de Impulsión
Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno Ø=4". las actividades son realizadas de a cuerdo a los diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto.

♥ FRENTE DE OBRA No. 2 → Instalaciones Electricas
Se continúa con la instalación de Cable mensajero en acero extrareforzado ϕ=1/4" para red compacta, dicha actividad incluye Suministro, tendido y tensionado. Se realiza instalación de puestas a tierra para cable mensajero. Incluyendo Suministro e Instalación.

PERSONAL.

- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topografica
- Maestro de obra:
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (8)
- Inspector obra / Interventoria
- Operadores de Maquinaria
- Profesional SST
- Controladora vial
- Almacenista
- Cuadrilla FF-1

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 02 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

♥ Frente de OBRA No. 1 → Instalación Linea de Impulsión
Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno ϕ= 4". las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto.

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno en arena lavada apisonada para encamado
3. Instalación de Tubería de Polietileno ϕ = 4".

líder

4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque
5 Relleno con material seleccionado de la excavación
6. Cargue y Retiro de Material Sobrante

✔ FRENTE DE OBRA NO. 2 → Instalaciones Eléctricas
Se lleva a cabo Instalación de red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15 kV (3 x No. 2), Incluye suministro, tendido y tensionado.

PERSONAL:

- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topografica
- Maestro de Obra
- Oficial de Obra (2)
- Ayudante de Obra (8)
- Inspector de Obra / Interventoría
- Operadores de maquinaria
- Profesional SST
- Controladora Vial
- Almacenista
- Cuadrilla FF-1

EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Herramienta y Equipo menor
- Volqueta
- Minicargador
- Retroexcavadora PC 210 (2)
- Camion Grúa
- Equipos para trabajo seguro en Alturas

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO	03 DE DICIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO ♥ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación línea de Impulsión DIA NO LABORABLE. ♥ FRENTE DE OBRA NO. 2 → Instalaciones Eléctricas Se continua con la instalación de la red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15 kV (3 x NO. 2) incluye suministro, tendido y tensionado. Se lleva a cabo la instalación de espaciadores angulares a lo largo de los tramos comprendidos así: P0 - P8, P8 - P9, P9 - P10, P10 - P11, P11 - P12, P12 - P13. PERSONAL - Residente de Obra - Residente de Interventoria - Cuadrilla FF - 1 (Especializada) EQUIPO - Camión Grúa - Equipos para trabajo seguro en alturas. RESIDENTE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA Dayra Marley INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
LUNES	04 DE DICIEMBRE DE 2023 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
