IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

el menor afluencia de niños y que no coincida con la entrada y salida del Colegio. ademas es importante mencionar que estos horarios se verificaran también con los operadores de los pozos petroleros, unido a esto se contará con Controladores viales por parte del Contratista de la Obra.

Dentro de los proposiciones y varios, la interventoria manifiesta las diferentes actuaciones que se han realizado para establecer la ruta alterna y que no genere traumatismo ni afectacion; es importante resaltar que no podran seguir utilizando la ruta que actualmente estaban utilizando para estos vehiculos, teniendo encuenta que la mayoria de las actividades se Concentran sobre la carrera 5 y ademas de los sectores con mayor excavacion.

Dentro del proceso Constructivo esta la Construcción de las redes del alcantarillado Sanitario, Construir Colectores del alcantarillado pluvial, traslado de redes de acueducto y se finaliza con las obras complementarias como es la pavimentación de las vias. este tipo de actividades vaa demorar por la complejidad del terreno ya que es muy areno e inestable lo que genera mayor trabajar con condiciones de seguridad para disminuir riesgos, lo que hace

Powered by CamScanner

bajos rendimientos que atrasan la ejecución del proyecto.
Dentro de las intervenciones algunos lideres Comunitarios Consideran que se debe revisar las viviendas ya que por dicho sector transitaran estos vehiculos que pueden generar daños, para lo cual la profesional respondia que la mayoria de estos viviendas ya se han revisado levando actos de vecindad, sin embargo recomiendo que algunos viviendas no se han podido revisar por los propietarios no lo permiten, no se encuentran en sus casas sin embargo se han dejado tarjetas con el numero de telefono para que nos llamen y agendar la visita., otro de los aspectos a revisar es los reductores de velocidad existentes; de acuerdo a las observaciones frente a los actos de vecindad el Contratista verificara y se realizara los actos de vecindad, entregandole Copia a los propietarios, en caso de que requieran hacer una reclamacion
Para revisar la via antes de realizar el desvio del trafico pesado se solicita el acompañamiento de los representantes de la Comunidad; aunque tambien es importante que la Comunidad conozca que se realiza prueba con un tractocamión para verificar si era viable esta propuesta; los representantes del gremio ganadero, amarero solicitan se tomen

Powered by CamScanner


medidas durante la cosecha de arroz y la entrada y salida de los camiones congeniado estas medidas se han propuesto debido al tráfico actual que transita por la ruta de los manglares.

La comunidad y los representantes solicitan a CEDCO la posibilidad de realizar el desvío de los vehículos pesados por la vía que ellos realizaron (privada) sin embargo CEDCO les informa que aun se encuentra en construcción y en trámites para ponerla en operación.

Powered by CamScanner

2603


IV. DESARROLLO DE LA AGENDA



VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Se anexa listado de			
2.	asistencia			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES



VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la próxima Reunion		
dd	mm	aaaa

6

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 4/05/2022 HORA:

TEMA(S): Reunión Informativa "Socialización Ruta a Tierra Para Vendedores de Techo Usado"

PROYECTO:

INSTRUCTOR: Angelica Murillo Prof. Social Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Karen Y. Lely Cuadra	1418.650.173	Prof. Apoyo Enlace	
2	Rosa Correa Camargo	1118533762	Fiscal	Rosa correa
3	Juan Bautista	1007767053	Vicepresidente	
4	Adalber Perez C.	1121822829	Secretario	
5	Disney Niño	85051447	Tesorero Aj	
6	Aquiles Corredor Garcia	47429.176	Fiscal Acompañante	
7	Dimar Alvarez M.	9.652.395	Líder Comunidad	
8	José Calixto Hernández	7837506	Pte Tilo Norte JAC	
9	Hiraya Rincón Leo	47427.987	comunidad	
10	Abdalah Izquierdo	4077066	Vic JAC Tila Norte	
11	Edelmira Diaz	23422569	Tilo Norte	
12	Martha Cecilia Monroy R	46.360.452	Comunidad	Martha Monroy
13	Gladys Edith Ariza M.	35196239	tesorera	
14	Jose Javier Perez.	11201285	comunidad	
15	Aida Marcela Cely R.	24.229.305	Comunidad	
16	Nuri Molina ortiz.	32319474	medio Ambiente	
17	JORGE CORREDOR G.	9'654.291	USUARIO 4.	
18	Belarmino Ruiz	19215792	Comunidad	
19	Angela Galeano	39698602	Ant. Social	
20	Jose Maldonado	9658919	Edil	
21	Lazaro Rivera Ayala	82499[illegible]	Comunidad	
22	JENNY FALFAN – GESTORA SOCIAL	1118535410	EMERALD -	
23	Diana Leon	35491487	comunidad	
24	Luz Consuelo	47427869	Usuario	
25	Olga Ramirez	47428781	Auxiliar Orc.	
26	Faiuly Gaitán	1123160010	Estudiante	faiuly
27	Carolina Sierra	1006840448	A.D. CASA	Carolina S.
28	Ingrid Sierra	1006840449	A.D. CASA	Ingrid S.
29	Carmen Alicia Cuenca Medina	68298411	AD casa	Carmen Alicia
30	David Eduardo Flores Hidalgo	1118574577	Ing SM	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

7

Powered by CamScanner

2605

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR:	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Juan Manuel Holguin	7160753	Secretaria Movilidad y ppll	
2	ULISES ROSAS B	9597813		
3	Ladi Vargas	1007599040		
4	Ismael Vargas B	4186356		
5	Aurelino López	17986593		Aurelino López
6	Helmer Fredy Chaparro	73609764		
7	Betty Franco	1115 855865		
8	Rafael antonio Pérez	9430423	Ed. Tiburon	
9	Alvaro A. La Rosa	1006558602		Alvaro A.
10	Lina Maldonado	47439302	Edil	
11	Yudith Tapaira Sánchez	47.437.055	Prof. Apoyo	
12	Ismenia Ariza	23467709	Independiente	
13	Carlos Rodriguez	19219394	Independiente	
14	Cesar Julio Ruiz	5237282	Independiente	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

8.

Powered by CamScanner

2606

8.6.6 ACTA DE REUNION No. 008

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
10	mayo	2022	Inicio	10:00am	Fin	12:30pm	frente de Obra

Tipo de Reunion: | proyecto:

ACTA DE REUNION No. 008

I. OBJETO

Por solicitud de la veeduria; requieren conocer los avances de la obra y el cumplimiento especif. tecnicas

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión citada por la veeduria. del Corregimiento de Tilodiran, con el acompañamiento de representante de esta, Director de la interventoria CONSINTER, profesional de apoyo a la supervision empresa ACUATODAS, Contratista de la Obra SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, el Objetivo de esta reunion es conocer los avances de la obra y despejar algunas inquietudes que tiran referente a la obra con respecto a las alcantarillas y el material que estan utilizando para las

Powered by CamScanner


que las vias sean mas Compactadas, por ello la veeduria desea Conocer si la empresa Contratista esta Cumpliendo Con las especificaciones tecnicas o si es necesario realizar ajustes que no se tenian Contemplados pero que se hacen necesarios, lo-grando de que se ejecute todo Con la mayor Cali-dad; para ello interviene el Director de la Interven-toria quien aclara que el material que se esta utili-zando es el adecuado, de rio que permita mayor com-pactacion, ademas debe estar semihumedo no puede estar totalmente seco; los representantes Comprenden y les queda Claro dicho aspecto, Sin embargo otro de sus inquietudes es lo alcantarilla que se encuentra ubicada en el puente Corredor vial entrada a la vereda Aqualindo, para ello interviene el ing. Resi dente en donde infoma que antes de iniciar los trabajos de obra se realiza un registro fotografico para verificar en que Condiciones estaba la tubería y la grieta que refieren ellos es la punta que hicie ron Cuando instalaron el alcantarillado, teniendo en cuenta que primero Construyen un carril y luego el otro y al parecer ahi fue donde se hizo la Asure, la interventoria vela Asure y da la Orden de que se Coloque Ciclope ala alcantarilla para que el

Powered by CamScanner

tubo no se dañe, la alcantarilla se levanta y se coloca una placa por encima y se quita totalmente seguidamente se realiza un recorrido con los representantes de la veeduria Por cada uno de los frentes de trabajo y se les va explicando el proceso constructivo que se ha venido instalando el material que se esta utilizando y la tubería. La veeduria manifiesta agradecimiento por explicar y despejar los dudas presentados, teniendo en cuenta que la Comunidad tambien les esta informando por ello que todo acerco y de esta manera podrían explicarle a los personas respecto al tema.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA



VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES



VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la próxima Reunión		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.7 PLAN DE GESTION SOCIAL

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

1. ALCANCE

1.1. Objetivo General

El "PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA" (PGS) para el proyecto dominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", establece las estrategias que contribuirán a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos, con ocasión de la ejecución de la obra, haciendo énfasis en la importancia de la ejecución de las mismas en la prestación del servicio y como la comunidad debe hacerse participe para su sostenibilidad.

Además de ser el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto.

1.2 Objetivos Específicos

- Informar a la comunidad oportunamente sobre el inicio de la ejecución del proyecto, indicando para ello las generalidades del mismo.
- Evitar las especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.
- Manejar las quejas ciudadanas con respecto a: accesibilidad, ruidos generados por las obras y suspensión temporal de servicios públicos.
- Evitar la creación de falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión de la ejecución del proyecto.
- Mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto.

- Crear estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por tránsito de maquinaria pesada.

2. PRELIMINAR DE LA OBRA

2.1 Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto

El proyecto a ejecutar denominado **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"** se localiza en el centro poblado de Tilodiran Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, correspondiente esta zona a un área poblada con actividades comerciales, restaurantes, afluencia constante de visitantes, por ello sin duda alguna su ejecución generara un alto impacto de movilidad de las personas y en algunas actividades cotidianas.

Con la intervención de este proyecto se puede ver alterado el espacio publico como son los andenes y calzadas, igualmente se puede presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la cual es necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, evitando con ello molestias en la comunidad y propendiendo siempre por establecer buena relaciones entre la comunidad y con todos los actores involucrados en el proyecto, por lo cual es importante mantener una constante relación con las comunidades afectadas por las actividades del proyecto.

2.2. Línea Base de Datos

Las acciones a tener en cuenta son las siguiente:

- Intervención preventiva
- Intervención correctiva

Lo que se busca con el Plan de Gestión Social, es prever los impactos sociales negativos mediante mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento,

monitoreo y detección de alertas tempranas, tanto del PGS como del proyecto mismo, con el propósito de emprender acciones orientadas a prevenirlos.

En el momento que no sea posible implementar los mecanismos preventivos, se debe activar un sistema de atención oportuno, en donde converjan las áreas técnicas, ambiental, operativa y social de los actores involucrados en la ejecución del proyecto.

2.2.1 Metodología de la línea base de datos

Contempla siete pasos a saber:

- Planeación
- Estudio del marco normativo e indagación de necesidades de información en instancias de toma de decisiones.
- Diseño preliminar de la estructura y el contenido de la línea base.
- Análisis y verificación de la información
- Selección de indicadores y documentación
- Desarrollo de la herramienta informática
- Implementación y capacitación

2.3 Censo de Inmuebles

Antes de iniciar la ejecución del proyecto es necesario realizar en las viviendas, lotes, negocios, el diligenciamiento del formato de actas de vecindad, el objetivo de esta visita, es identificar de manera técnica el estado de la construcción antes, durante y después de una intervención constructiva.

En cada acta de vecindad se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, arboles de carcas vivas, valladas y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

Esta acta de vecindad permite ser un soporte para el contratista en los eventos que deba dar respuesta a preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) que realice el propietario, arrendatario o tenedor de bienes inmuebles que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto.

Si bien esta actividad se orienta a proteger los intereses del contratista, se formula en el programa de Gestión Social por el manejo que se le debe dar a los PQRS que la comunidad pueda presentar por afectación a la infraestructura de la obra.

2.3.1 Procedimiento para el levantamiento de Actas de Vecindad

Las actas de vecindad se irán levantando en la medida que se vaya a realizar dicha actividad con varios días de anticipación y posterior a la cual ingresarán al archivo de la obra.

Se debe informar a la comunidad sobre dicha actividad en la reunión de inicio o socialización del proyecto, donde se comunica sobre la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio. Antes de iniciar esta acción la profesional Social del contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones, en el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se hará contacto con el presidente de la JAC para informarle sobre el levantamiento del acta de vecindad en esa área.

Las actas de vecindad se diligenciarán en el formato adjunto a este documento. Las actas de vecindad confirmaran el estado de la infraestructura a través del registro fílmico y fotográfico, se realizará el registro filmico de manera lenta donde se puede identificar el estado del inmueble o de lo que se encuentra en el área donde se realiza el levantamiento del acta de vecindad, debe contener legibles la identificación (nombre y apellidos) del funcionario del contratista, del profesional de la interventoría y de la persona a que a nombre del predio, realizo el acompañamiento.

2.4 Recorrido Ruta Saludable Inicial

Se debe programar con los lideres comunitarios, funcionarios, contratista e interventoría, en donde se especifique y se deje constancia a la comunidad y demás participantes de la zona de influencia directa del proyecto, el estado actual de la infraestructura existente de los sistemas de acueducto y alcantarillado y la proyección de obras a desarrollar.

3. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

3.1 Reunión Inicial de Obra

Antes de iniciar las actividades de obra, se debe realizar la reunión de inicio o socialización del proyecto, con el objeto de informar a la comunidad del área de influencia directa, sobre las actividades que se van a realizar, cuando y en donde se van a iniciar, se informara también sobre las características técnicas del proyecto, sobre la oficina de información y atención al ciudadano, sobre el requerimiento de mano de obra para el proyecto, y levantamiento de actas de vecindad. Los temas a tratar serán:

- Objetivo de la reunión
- Objeto del contrato y numero de contrato
- Responsables de la ejecución: Ente Ejecutor, Contratistas e Interventoría.
- Características del diseño, duración del contrato y presentación del grupo de profesionales del constructor y de la interventoría
- Ubicación de la zona (s) a intervenir (plano de localización)
- Beneficios de la obra
- Procedimiento para vinculación de mano de obra
- Procedimiento para el manejo del acceso a los predios
- Dudas e inquietudes
- Compromisos

Como evidencia de esta actividad se obtendrá una planilla firmada por los asistentes con su debido registro fotográfico.

3.2 Reunión de Avance de Obra

Se realizarán las reunioness que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y/o los organismos de control. Las reuniones de avance de obra, tiene como objeto realizar el seguimiento a las obras y al cumplimiento de las obligaciones, así como informar a la comunidad el estado de la obra civil y los posibles impactos generado con la ciudadanía.

3.3 Reunión de Finalización

Esta reunión se realizará al 95% de avance, con el fin de informar acerca de las obras ejecutadas y el cumplimiento de la información suministrada en la reunión de inicio y de avance que se hayan efectuado, realizando un balance de todas las actividades hechas a la fecha.

Las actividades de gestiona realizar para la reunión de finalización a tener en cuenta son las siguientes:

- A la comunidad de la zona de influencia del proyecto, se debe informar sobre la reunión de finalización de la obra.

- Los espacios logísticos sugeridos para las reuniones con la comunidad deben contar con mobiliario, ser amplios, buena visibilidad para proyectar la presentación. Se recomienda gestionar con las Juntas de Acción comunal para el trámite del préstamo o alquiler del sitio.

- A la Alcaldía Municipal y demás autoridades locales de interés para el proyecto, se les debe remitir una carta informando el lugar, fecha y hora de la reunión de finalización de las obras.

Insumos mínimos de la reunión de finalización de la obra son:

Acta de reunión: Se debe levantar un acta de reunión en el cual se debe registrar los aspectos importantes que se traten en la reunión de finalización. Una vez terminada la reunión se deben divulgar los compromisos resultantes de los mismos, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

Listado de asistencia: Mediante un formato establecido para este fin se registrarán los asistentes a esta reunión, para lo cual se acompañará con un registro fotográfico de la reunión, el profesional social encargado de la reunión.

4. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

4.1. Accesibilidad a Viviendas y Negocios

En el evento de presentarse algún tipo de interferencia en la accesibilidad a viviendas y negocios, el profesional social debe realizar una visita a cada uno de los predios afectados, para lo cual levantara un acta individual que contenga los datos del predio y del propietario y acordara en común acuerdo cuales serán las medidas que se tomaran para garantizar el acceso.

4.2 Daños e Edificaciones

Cuando presentan situaciones de daños e edificaciones, mobiliario y zonas verdes, se debe entregar un volante informativo al propietario para que conozca cual debe ser el mecanismo a utilizar.

4.3 Suspensión de Servicios Públicos

De acuerdo a los cortes o suspensiones de servicios públicos efectuados por la ejecución de las obras, el contratista debe informar a toda la comunidad afectada, esta suspensión debe ser coordinada con la empresa prestadora de servicio, en los casos en que se presenten suspensiones de servicio diferentes a las programadas por el contratista, será responsabilidad exclusiva del prestador del servicio.

4.4. Trabajos Nocturnos

Cuando se requiera la realización de trabajos nocturnos, se debe informar al 100% de los propietarios con anticipación.

5. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Con el objeto de hacer un adecuado seguimiento a las obras con el acompañamiento de la comunidad se ejecutarán las siguientes actividades.

5.1 Recorridos por los Frentes de Obra

El profesional del área social debe permanentemente realizar recorridos con el fin de acompañar, informar e interactuar con las comunidades, además de recopilar la información que alimente la línea base.

5.2. Rutas Saludables

Se deben realizar recorridos por las obras de infraestructura en ejecución conjuntamente con el contratista, interventoría y ACUATODOS S.A. ESP, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento de los beneficios específicos que se generaran con ocasión del proyecto. De igual forma se pretende empoderar a la comunidad de los bienes y beneficios derivados del proyecto, de tal manera que se asegure la sostenibilidad de las inversiones y el mejoramiento en la prestación del servicio.

5.3 Punto de Atención a la comunidad

A partir de la fecha en que se de inicio a las obras, se debe brindar un espacio físico de atención a la comunidad, el cual debe ser atendido por el profesional del área social, quien recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.

6. ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

6.1 Comité de Obra y recorrido final

El profesional del Área Social programara un comité de obras, con el propósito de coordinar de manera unificada la entrega oficial de las obras a la comunidad, a este comité se convocarán a todos los involucrados en el proyecto, esto es: Contratistas, Interventoría, Municipio de Yopal y demás autoridades locales de interés en el asunto. Durante este recorrido se realizará el acta de entrega protocolaria de obras, de igual manera se debe levantar el registro de asistencia de los participantes, soportándola además con registro fotográfico y fílmico.

6.2 Cierre de los Puntos de Atención a la Comunidad

El profesional del Área social, una vez culminando el proceso constructivo, realizara el cierre de todas las reclamaciones que se encuentren pendiente, en el caso de que exista alguna dificultad de cierre, el profesional de social debe informar en el último comité de la obra de manera escrita las razones por las cuales no se ha podido realizar tramite y de esta manera poner a discusión en comité acuerdo y/o compromisos para los cierres, los cuales se deben evacuar antes de la reunión de finalización de obras con la comunidad, la firma de acta de liquidación y entrega del informe final.

7. PRESENTACION DE INFORMES

De todas actividades que se realicen antes, durante y finalizadas las obras se deben presentar informes ejecutivos con los respectivos soportes, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social de Obras.

7.1 Matriz de impactos generados durante la obra

MATRIZ DE INDICADORES				
PROGRAMA	**ESTRATEGIA**	**METODO**	**META**	**INDICADOR**
Programa de información, sensibilización y comunicaciones	**Sensibilización Información**	**Herramientas Comunitarias:** Afiches, vallas, plegables, reportajes audiovisuales **Escenarios de Reunión:** Diálogos, mesas de trabajo y profundización, socialización **Atención Personalizada Campañas con Grupos Primarios:** Junta de Acción Comunal, Comités Locales (Ambientales, Sociales) Instituciones Educativas, Etc	Involucrar al 60% de la población residente, propietaria, transeúnte habitual o usufructuaria de la zona. Involucrar al 90% de la población residente, propietaria, transeúnte habitual o usufructuaria de la zona.	Actividades planeadas/actividades ejecutadas Población convocada/Población asistente No. De campañas de sensibilización diseñadas/No. De campañas de sensibilización desarrolladas
	Difusión-Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Acceder al 100% de la población	Plan de Comunicaciones formulado/ Plan de comunicaciones ejecutado
Programa para incrementar oportunidad de generación de empleo	Difusión del servicio	Socialización Registro de Personal	Suplir el 100% de los requerimientos de la firma del contratista	Mecanismos de difusión propuestos/ fuentes de información del usuario Personal capacitado/personal

2622

				vinculado Personal vinculado/permanencia promedio
Programa de atención a la comunidad	Oficina de atención al usuario Participación comunitaria	Difusión del servicio Instalación del puesto de atención a la comunidad Atención PQRS Seguimiento y control Escenarios de participación	Atender al 100% de la población que demande el servicio Involucrar el 20% de la población base	No. De PQRS interpuestos/ No. De PQRS atendidos

2623

7.2 Informes Mensuales

Los cinco primeros días hábiles de cada mes y cada vez que se presente un acta para pago, el contratista y el profesional social entregaran a ACUATODOS S.A ESP al área de Gestión Social en Obras, con copia a la interventoría un informe de avance de las actividades.

7.3 Informe Final

Finalizada la obra y antes de firmar el acta de liquidación del contrato, el profesional del área social presentara un informe final ejecutivo, con los respectivos soportes de todas las actividades generadas durante la ejecución de la obra, dentro de las cuales están:

- Informe físico con los lineamientos establecidos para informes con los productos finales.
- Informe final impreso con fotografías a color y en medio digital.
- Copia de los registros levantados de todas las actividades realizadas con la comunidad, acta de reuniones, comités de control social, comités de obra, entre otras actividades.

8. SOCIALIZACION

8.1 Vallas Informativas

Se instalará una valla de acuerdo a lo establecido en el decreto 0217 de 2014, cumpliendo con las condiciones de diseño, características físicas, distancias y dimensiones contenidas en el mencionado decreto.

8.2. Cuñas Radiales

El profesional de área social hará levantamiento de información de los medios de comunicación, de acuerdo a la necesidad que se requiera para comunicarle a la comunidad.

Anexos

FORMATO ACTA DE VECINDAD
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA
FORMATO ACTA DE REUNIONES
FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS PQRS

MARIA ANGELICA TRUILLO DELGADO
C.C 23.914.357
T.P 150982313
TRABAJADORA SOCIAL

8.6.8 ACTA DE REUNION No. 004

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
dd	mm	aaaa	Inicio	10:00	Fin	11:00	lote Carlos Rodriguez

Tipo de Reunion: | proyecto:

ACTA DE REUNION No. 004.

I. OBJETO

Daño a cerca de alambre y cosechas por los bovinos de la Sra Marina Valderrama en el lote señor Carlos Rodriguez

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el señor Carlos Rodriguez propietario del lote que queda cerca a ptar, con la profesional social Maria Angelica Trujillo quien solicito reunion para presentar la siguiente queja, refiere una inconformidad y se esta viendo afectado porque el ganado bovino de la señora Marina Valderrama se esta pasando para su lote causando daños como: dañando las matas, sus siembras, destruyendo todo

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

lo que hay en su lote, manifiesto que el no considera pertinente hablar con la señora marina ya que ella fue la que permitio el ingreso de trabajos de obra con la empresa que esta ejecutando el proyecto; proyecto al que no esta encontra pero si se encuentra inconforme con estas cosas, refiere ademas que con quien tiene que hablar es que la empresa contratista y la empresa hablar con ella: por ello la profesional lo escucho y atendio su queja refiriendo que se hablara con ella para que arregle la cerca de su lote para que de esta manera no se vuelva a salir el ganado ademas de que tambien se arreglara la cerca de el señor Carlos Rodriguez; por lo tanto el señor Carlos se siente tranquilo y agradece que este compromiso se haga. sabe que siempre que se ha visto afectado la empresa busca una solución quedando todos muy satisfechos de ambas partes por ello sabe que esto no se volvera a presentar.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

la profesional social, realizó acercamiento con la Señora Marina Valderra le informo del incidente, quien manifesto que no hay ningun problema pues ellos se Comprometen arreglar la cerca para que el ganado no se vuelva a salir y Cause daño.

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Carlos Rodriguez	Comunidad.		
2.	Marina Valdema.		J. A. C.	
3.	Angelica Trujillo D.	22.914.357.	Social	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.9 ACTA DE REUNION No. 006

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
03	02	2024	Inicio	3:00pm.	Fin	4:00pm	Alcaldia.

Tipo de Reunion: | proyecto: construccion alcantarillado pluvial optimizacion Redes de acueducto y alcantarillado.

ACTA DE REUNION No. 006

I. OBJETO

El objetivo de la reunion es dar a conocer el objeto del proyecto a las companias de hidrocarburos que queda cerca al corregimiento Tilodiran adelas porque se haran cierres temporales que pueden afectar la Operacion

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión con la participación de la empresa CEDCO, Acuatodos, Interventoria Consinter, Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria, Ing de Planeación Alcaldia, Movilidad Transito, el objetivo de esta reunion es para socializar el plan de manejo de transito propuesto en la resolución No. 03047 del 9 febrero de 2024. permiso para cierres totales o parciales de las vias urbanas, reunion direccionada por el Director de la interventoria Consinter el Ing Andres lopez quien le explica a la empresa CEDCO y demás participantes en que consiste el proyecto de alcantarillado pluvial y sanitario y obras complementarias, tenien

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

do en cuenta que se va intervenir alguna de las vias del Corregimiento de Tilodiran para lo cual se cuenta con el permiso, sin embargo de los Cierres viales autorizados son sectores por los Cuales transita trafico pesado de la Operacion de CEDCO + otras Compañias de hidrocarburos, por lo cual se plantea dos rutas, opcionales para la Circulacion durante la ejecucion del proyecto y durante las diferentes actividades a ejecutar del Cruce de la 3ra con Calle 1ra via a los mangos Como critico la Operacion CEDCO teniendo en cuenta que se debera Cerrar la via, para la adecuada instalacion de la tuberia, aproximadamente en tres meses se iniciaran trabajos por ello se acordaron horarios y fechas Cuando se Cierre la via. Luego de verificar las opciones para la Circulacion del trafico pesado se identifica que la opcion número uno! esta aprobada por el municipio de yopal y la Opcion numero dos, requiere ser analizada para ver si es viable la Circulacion de los vehiculos por la ruta propuesta y solicitar el permiso de utilizar esta ruta, unido o esto se programa una reunion para el dia miercoles 28 de febrero a las 8:00am en la esquina de la Carrera 3 con Calle 2 parque del Centro de Tilodiran.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

De acuerdo a las decisiones que se tomen para el flujo de vehiculos pesados dentro de las vias urbanas se debe realizar una socializacion con la Comunidad para informarles las notas establecidas.

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Se anexa listado de asistencia			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

Ninguna.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.10 ACTA DE REUNION No. 007

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	4/09/2024	Hora de la Reunion	10:00am	Lugar
dd mm aaaa	Inicio	10:00am	Fin	11:30	Alcaldia

Tipo de Reunion: proyecto: construccion alcantarillado fluvial, optimizacion redes de acueducto y alcantarillado

ACTA DE REUNION No. 007.

I. OBJETO

Reunion con la compañia ENERAL con el objetivo de informarle y darlo conocer en que consiste el Proyecto

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunion siendo las 10:00am en las instalaciones de la Alcaldia Yopal, quienes nos acompañan Martha Chaparro Coordinadora Social ENERAL, Wilson Arenas Alcaldia, Juan Manuel Holguin Secretaria de Movilidad. Servicios publicos Supervision Ing. Yajaira Sanchez Interventoria Ing Andres lopez, Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria Mg. Angelica Trujillo Profesional social, En primer lugar se comienza a explicar, en este caso al personal de Eneral de que trata el Proyecto de Alcantarillado Pluvial y sanitario y obras complementarias, teniendo

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

encuento que se va a intervenir algunos de las vias del Corregimiento de Tilodiran, para lo Cual se cuenta con el permiso, sin embargo en cuanto a los tiempos de vias autorizados que son sectores por, los cuales transito el trafico pesado de la Operacion de tra ral, para lo cual tambien se le planteo las 2 rutas opcionales para la Circulacion durante la ejecu cion del proyecto y durante las diferentes ac tividades a ejecutar del cruce de la 3ra con calle 1ra via a los mangos como punto Critico de la Operación GENERAL. teniendo en cuenta que se debera cerrar la via, para la adecuada insta lacion de la tubería, aproximadamente mes y medio se iniciaran los trabajos. por ello es im portante acordar horarios y fechas cuando se cie rre la via, se le informa que con tiempo se realiza una prueba, y la opcion #1 es la mas viable y la unica., por ende en esta vta se deben Cumplir tres Controladores viales y tener una buena señalizacion., por ello la empresa Contratista refiere la posibilidad que el tramo de la Controlado ra sea de ambos partes, la coordinadora social infor mara a su empresa para ser analizada.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

finalmente por parte de la empresa Contratista se debera realizar una reunion con la comunidad para dar a conocer la nueva ruta alterna. por donde pasara la Operacion del trafico Pesado. Reunion que se les informara para que dia sera fecha y hora.

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

8.6.11 OFICIO POLICIA TILODIRAN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA
Construcciones e ingeniería

Tilodiran, 8 de abril de 2024

Señor
COMANDANTE SUB ESTACION DE POLICIA
Corregimiento Tilodiran

Recibido
Pt. Jniel Quiñones
10/04/2024
10:20

REFERENCIA: *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS".*

ASUNTO: Faltas cometidas por el señor Fabian Ruiz en cuanto al cierre de la vía sector entrada vereda Agua Linda

Cordial saludo

Respetuosamente, me permito dirigirme a usted con el propósito de dar a conocer la situación que se viene presentando con el señor Fabian Ruiz, como es de su conocimiento el señor tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, y nuestras actividades de ejecución de nuestro proyecto ***Construcción alcantarillado pluvial optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias"*** son de alto riesgo ya que dentro de ellas se realizan excavaciones profundas para la instalación de tubería, para ellos se requiere maquinaria como retroexcavadoras entre otras, el día 29 de febrero se realizó una reunión de tipo informativa con todos los habitantes del sector corredor vial entrada a la vereda Agua linda para darles a conocer que por las actividades de obra se debe cerrar la vía en el cual todos estuvieron de acuerdo incluyendo los padres del señor Fabian Ruiz, quienes viven en este sector, razón por la cual se instala un sendero peatonal para que las personas puedan ingresar a sus viviendas, en cuanto a el paso de los vehículos y motos deberán dar la vuelta por la ruta alterna que se construyó, es importante resaltar que nosotros estamos cumpliendo con la señalización para guiar al peatón y recomendaciones que se deben observar dentro y fuera de la obra.

Calle 38 No. 24 - 82 Yopal Móvil: 3173639276
synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA
Construcciones e Ingeniería

Sin embargo en repetidas ocasiones el señor Fabian Ruiz no cumple, no respeta la señalización, la hace caer, la destruye, arranca las estacas, en un primer momento la Profesional Social realizó un acercamiento con el señor Ciro Ruiz padre del señor Fabian a quien le informamos que su hijo no estaba acatando las recomendaciones quien se comprometió hablar con él, sin embargo el problema sigue persistiendo, unidos a esto el personal de la obra, la HSE (profesional encargada de la salud, seguridad en el trabajo) le han llamado la atención, por infringir, quien ha sido irrespetuoso, grosero e incluso ha amenazado a la profesional HSE, unido a esto no respeta cuando las volquetas se encuentra en tránsito, realmente nos preocupa esta situación que se vienen presentando hace varios días ya que en cualquier momento en su estado de inhibición puede accidentarse y presentar alguna dificultad en la conducta.

Cabe resaltar que el día sábado 6 de Abril, nuevamente la Profesional Social de la empresa contratista, se acerca donde reside el señor Fabian Ruiz con el acompañamiento de la Policía para informarle que no puede ingresar en moto por el sector corredor vial entrada vereda Agua linda quien se mostró irrespetuoso con la profesional, es por ello que interviene la Policía indicándole que su comportamiento está generando muchos problemas y que no puede continuar generando más riesgo y las recomendaciones que se le están brindando es por su seguridad y la seguridad de la Obra.

Agradecemos de antemano su acompañamiento y apoyo ya que es imprescindible para nosotros garantizar la seguridad de toda la comunidad y de nuestro personal

Cordialmente,

MA. ANGELICA TRUJILLO D.
Profesional Social
Synergia Construcciones e Ingeniería
Cel. 3204773522

264

8.6.12 ACTA DE REUNION No. 009

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
26	Mar	2024	Inicio	5:20 pm	Fin	6:10pm	Oficina CONSINTER

Tipo de Reunion: | **proyecto:**

ACTA DE REUNION No. 009.

I. OBJETO

Socializar Resolución No. 03047 del 9 de febrero de 2024. y actividades posteriores

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión con la presentación de cada uno de los asistentes: Coordinadora Social de la Empresa EMERALD Martha Chaparro, Profesional de Apoyo a la Supervison Yahaira Sanchez ACUATODOS, CONSINTER DEL ORIENTE Andres lopez, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Diego Perez y Profesional Social Angelica Tujillo, el Director de la interventoria Ing Andres Lopez. informa que por solicitud de la Social de EMERALD hace entrega de la Resolucion No. 03047 del 9 de febrero de 2024 y Oficio ajuste radicado del 23/04/24 Sobre los horarios paso de vehiculos trafico pesado.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

y plano ruta alterna trafico pesado hacia la vereda los mangos.

De acuerdo a estas tres entregas se procede a analizar cada uno de estos tres documentos, en donde se da a conocer la Resolucion de cierres totales y parciales de vias urbanas del Centro Poblado de Tilodiran.

En cuanto al oficio sobre los horarios. estos serán de acuerdo al horario laboral de la Empresa Contratista de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y los dias sabados de 9:00am a 11:00am, en este caso la social de ENERAID refiere que la periodidad de los vehiculos es mínima de dos Carros dia de por medio o cada dos dia sin embargo refiere que verificara esta infomación con el area encargada. asi mismo se focaliza el plano en donde se muestra la ruta alterno; la focial de ENERAID desea que le aclaren si esta via que se va a habilitar venir quedará apta para el trafico pesado es decir con el proceso constructivo en cuanto a la pavimentación, informandole que todas las vias quedan apta solo Movilidad es quien con el tiempo verificara si continuan con esa misma ruta o deberan modificar

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Con respecto al ingreso de estos vehiculos, sera de la siguiente manera; ingresaran al Centro poblado por la calle 2 hasta la carrera 3 donde se realiza el giro a la izquierda para tomar la via a los llanos.


Por parte de los asistentes de la empresa contratista refieren que desde el area social, se realizara una reunión de caracter informativo con la Comunidad, Presidentes de J.A.C del Corregimiento de Tilodiran, empresas de hidrocarburos lideres, Ediles, ganaderos entre otros para socializar la nueva ruta alterna, horarios y demas aspectos., la reunion se realizara entre el dia 3 o 4 de mayo, hora y fecha por confirmar.

Asi Como tambien verificar las actas de vecindad que quedan por este sector, asi Como tambien el estado del Pavimento.

Finalmente el Contratista de la Obra debe instalar las vallas, pasacalles, señalizacion con la informacion de los horarios y desvios autorizado. por la secretaria de Movilidad.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

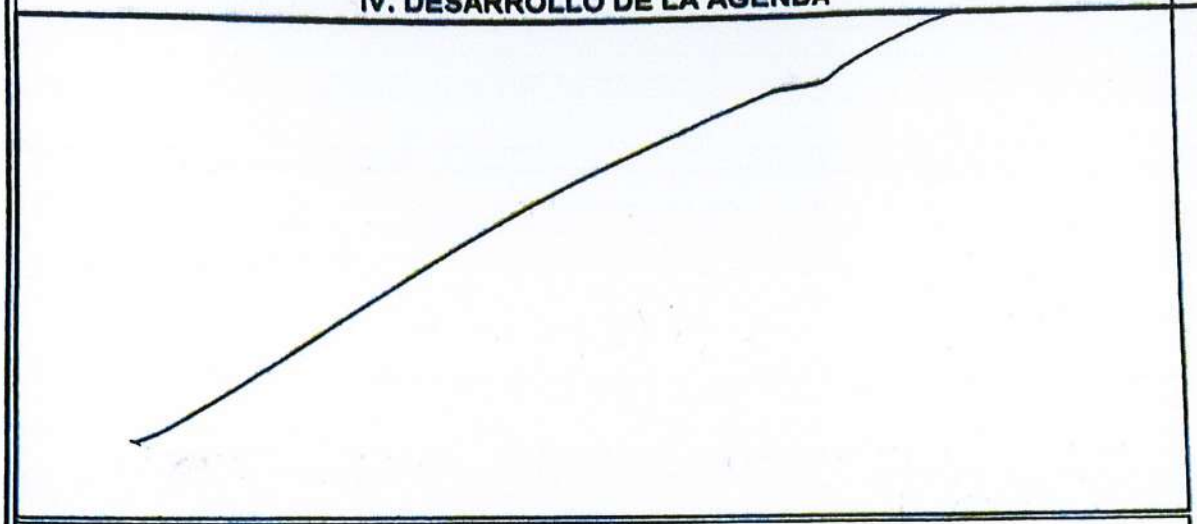

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Se anexa asistencia			
2.	por parte de la interventoría.			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES



VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la próxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ma. Angelica Trujillo	Profesional Social	
Martha P. Chaparro	Coord - Social EEC	Martha P. Chaparro
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Luis Andrés Yáñez M.	Ing. Director Interventoría	
Yudith Yajaira Sanchez	Prof. Apoyo Supervisión ACUATODOS	

4 de 4

Powered by CamScanner

2646

8.6.13 ACTA DE REUNION No. 011

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
10	MAY	2022	Inicio	2:45 pm.	Fin		Predio lote Carlos Rodriguez.

Tipo de Reunion: | proyecto:

ACTA DE REUNION No. 011

I. OBJETO

Reunion para lograr acuerdo para el acceso de los vehiculos de la empresa y propietarios del sector Callejuela la Reserva.

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunion con los propietarios del lote Ubicado en la Reserva del Corredor Vial entrada a la vereda Aqualindo, Carlos Rodriguez y Ismenia Ariza Cortez, Ingeniero Residente, Ma. Angelica Trujillo D. Profesional Social de la empresa Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria, el Objetivo de esta reunión es evaluar si es posible nos permitan el paso para la entrada y salida de los vehiculos de la empresa que Comunican con la Callejuela entrada Comunal. la Reserva.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Los propietarios refieren que no tienen ningun problema en permitir el acceso por su lote, sin embargo como contraprestación, requieren algunos Compromisos por parte de la empresa como es:

1. Realizar una excavación por el lado izquierdo de la Callejuela promedio de 50 cm de aucho por 60 cm de fondo de la via desde donde inicia la Callejuela hasta donde finaliza. la Callejuela, interseccion con la via alterna.
2. Arreglo al acceso al predio del Señor Carlos Roanquez y en todo lo largo del trayecto a utilizar donde se requiera.
3. La empresa debe hacer e instalal el broche de 5 mts con cadena y con candado para evitar el ingreso de personal no autorizado.
4. Requiere Suministro de Material de excavacion # 30 viajes para el mejoramiento de su predio.
5. Dejar el optimas condiciones la via utilizada en el predio la Reserva.
6. Ademas del paso de los velicolos de la empresa, el señor Carlos le permite el paso a los señores Disney Niño, Cira Ruiz y Blanca Jimenez. veci

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

nos de este sector, quienes requieren el paso de sus vehiculos y algunas motos de los empleados del Señor Disney Niño


7. El horario de acceso para el paso es de 7:00 am a 5:00 pm, sin embargo en caso de llegar despues de este horario de las 5:00 pm el celador de la Obra ubicado en este sector abrira el candado para que ingrese o salga.

8. Colocar Cinta de asegurauiento de broche a broche para mantener la seguridad y los Conductores utilizen unicamente la via a Utilizar.



Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

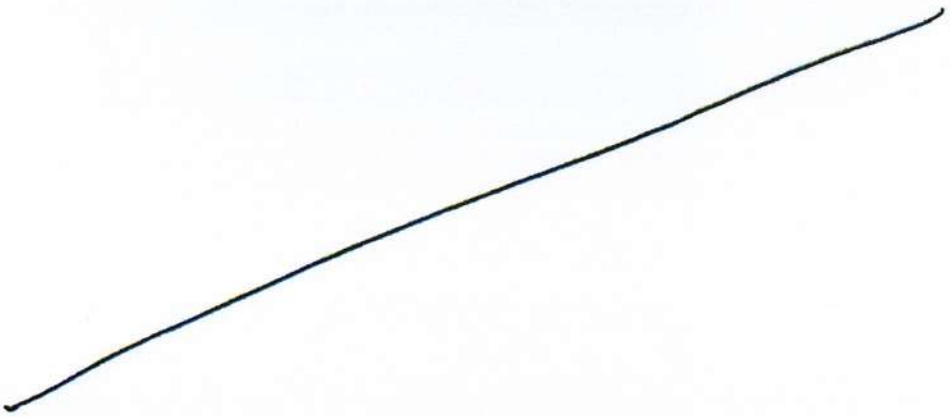

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	19219394	propieta.	
2.	Ma. Angelica Padilla O	23914357	Social	
3.	Ismenia Arizo Cortes	25467709	Propietario	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.14 CONFORMACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA TILODIRAN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Tilodiran, noviembre 20 del 2023

Señores
ACUATODOS S.A. E.S.P
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
SYNERGY CONSTRUCCIONES SAS
CONSINTER DEL ORIENTE E.U
YADITH YAJAIRA SANCHEZ
La Ciudad.

Asunto: **PRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL, cuyo objeto es "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN Nº 2023005850020, CON OBJETO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Respetados señores

En calidad de ciudadanos de la vereda Tilodiran, del corregimiento de Tilodiran y haciendo uso del articulo 161 de la Ley 1757 del 2015, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para informarles que se creó la Veeduria, bajo la Resolución Nº 122 de 14 noviembre del 2023, para la ejecución del Proyecto BPIN Nº 2023005850020

Solicitamos:
1. Copia del proyecto BPIN Nº 2023005850020.
2. Copias de los de obra pública, consultoria y apoyo a la supervisión
3. Planos planta general.
4. Planos planta perfil de cada una de las actividades.
5. Espeificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar.
6. Detalle de cada una de las especificaciones

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente.

ABSALON LEGUIZAMON
Coordinador
Email:veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

HAME YEH NEME UNIVIO

EDGAR CORREDOR GARCIA

EDELMIRA DIAZ DE LEGUIZAMON

ARVEIRA CORREDOR GARCIA

Copia: Personeria

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Tilodiran, noviembre 20 del 2023

Señores
ACUATODOS S.A. E.S.P
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
SYNERGY CONSTRUCCIONES SAS
CONSINTER DEL ORIENTE E.U
YADITH YAJAIRA SANCHEZ
La Ciudad.

Asunto: **PRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL, cuyo objeto es "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN Nº 2023005850020, CON OBJETO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Respetados señores

En calidad de ciudadanos de la vereda Tilodiran, del corregimiento de Tilodiran y haciendo uso del articulo 161 de la Ley 1757 del 2015, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para informarles que se creó la Veeduría, bajo la Resolución Nº 122 de 14 noviembre del 2023, para la ejecución del Proyecto BPIN Nº 2023005850020

Solicitamos:
1. Copia del proyecto BPIN Nº 2023005850020.
2. Copias de los de obra pública, consultoria y apoyo a la supervisión
3. Planos planta general.
4. Planos planta perfil de cada una de las actividades.
5. Espeificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar.
6. Detalle de cada una de las especificaciones

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente.

ABSALON LEGUIZAMON
Coordinador
Email:veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

HAME YEH NEME UNIVIO

EDGAR CORREDOR GARCIA

EDELMIRA DIAZ DE LEGUIZAMON

ARVEIRA CORREDOR GARCIA

Copia: Personería

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2654

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Inscribir, reconocer y ordenar el registro de la veeduría ciudadana denominada **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"** creada el siete (07) de noviembre de 2023; de acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - INCLUÍR a la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, en el registro público de las veedurías inscritas en esta jurisdicción, dejando constancia expresa que, según la información reportada por la mencionada Veeduría, la misma podrá actuar bajo el marco de las siguientes precisiones:

OBJETO DE LA VIGILANCIA. – "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN No 2023005850020 CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTEGRANTES: La veeduría ciudadana **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, estará integrada por las siguientes personas.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ABSALON LEGUIZAMON ROJAS	C.C.No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3107794965
HAME YEH NEME UNIVIO	C.C.No. 74.814.516 de Yopal	Centro Poblado Tilodiran-Yopal	3212938406
EDGAR CORREDOR GARCIA	C.C.No. 9.654.291 de Yopal	Calle 30B No. 12A – 60 Yopal	3143305803
EDELMIRA DIAZ De LEGUIZAMON	C.C.No. 23.422.569 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3112513555
ARVEIRA CORREDOR GARCIA	C.C.No. 47.429.176 de Yopal	Calle 12 No. 18-36	3114406563

PARÁGRAFO: Los ciudadanos reconocidos como veedores ciudadanos en el presente artículo, aparecen firmando el Acta de Constitución anexa a la solicitud presentada ante esta Personería. Se reconoce como presidente de la veeduría al señor ABSALON LEGUIZAMON ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno (Boyacá).

NIVEL TERRITORIAL: Según lo acordado por los integrantes registrados de la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, la Veeduría inscrita ante esta Personería se circunscribe al municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 67 de la Ley 1757 de 2015, los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, procurando la formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscalización.

DURACIÓN: Según lo expresado en el acta de conformación, la Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, tendrá una duración de dos (02) años, a partir de la fecha de su inscripción, pudiendo prorrogarse si aun persiste el objeto de la misma.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUGAR DE RESIDENCIA: La Veeduría denominada, **"VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)"**, inscrita ante esta Personería, definió como lugar de residencia, ubicación y notificación, la dirección y se fijará como domicilio principal la ciudad de Yopal, departamento de Casanare, y su sede será en Tilodiran, Finca La Primavera-Yopal, y correo electrónico veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

ARTICULO TERCERO. En firme el presente acto administrativo, se procederá a efectuar el Registro de la inscripción de la veeduría ciudadana en el libro que se lleva para tal fin en la Personería de Yopal.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar la presente Resolución a los interesados, en la forma prevista en las normas del C.P.C.A.

La presente se expide en Yopal, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), a solicitud del interesado.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL ALBERTO PEÑA TORRES.
Personero Municipal de Yopal

Revisó: Janeth Patricia Luna Vela
Personera Delegada para la Vigilancia y la Moralidad Administrativa

Elaboró: Diana Milena Moreno Rozo
Asistente de Despacho

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

8.6.15 ACTAS DE VECINDAD PERIODO OCTUBRE 2023

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	

ACTA N°: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023


CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

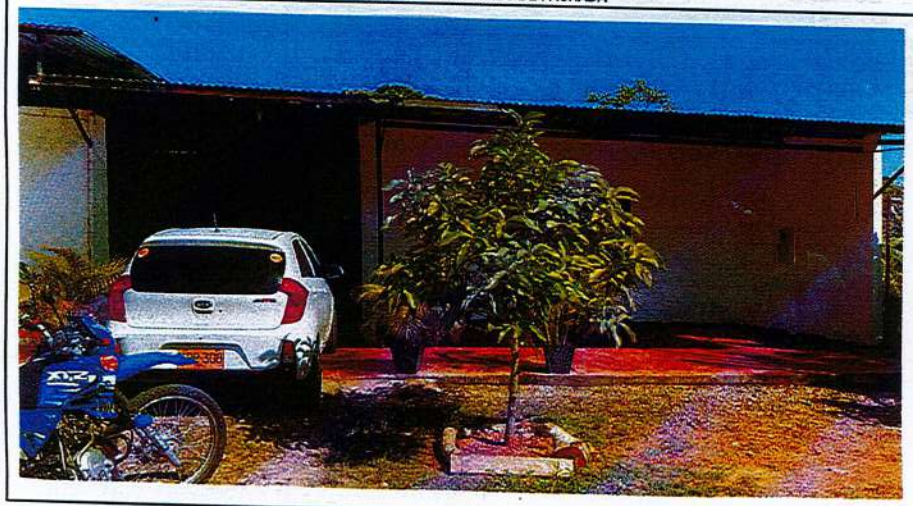

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Laudy Tarazona.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Julio Cesar Paz.
Cédula de Ciudadanía: 1.118.558.303.
Dirección: Cra 2 # 21-08.
Teléfono: 3108161683
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial	X	7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	X en piso sin acabado.	☐	X grietas y fisuras	☐ Tejadezinc ☐ internamente ☐ cielo raso.	☐	X Pozo en zona de garaje, tapa ☐ fisuras. ☐ Tanque presenta fisuras!	☐
2.HUMEDADES	☐	☐	☐		☐		☐
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐		☐		☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐		☐
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐		☐
COMENTARIOS		Mampostería. bloque	Pisos rusticos; mineral, encuapados.		Sin afectación evidente		Carpintería yeteri ca en puertas, ventanas.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Laudy Tarazona
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Laudy Tatiana Tarazona
C.C. O NIT 1118544912

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2658

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA DD 17 MM 10 AA 2023	

ACTA N°: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


PISOS



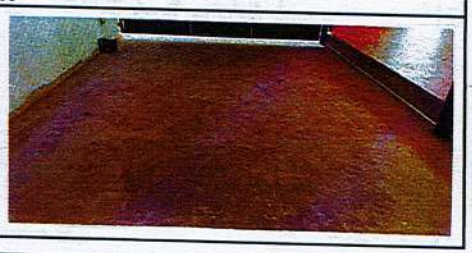

PAREDES

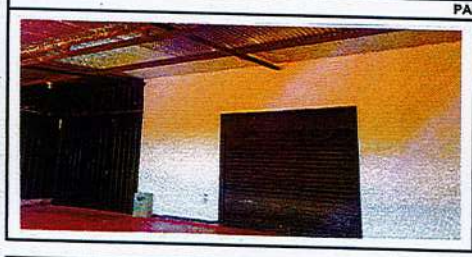

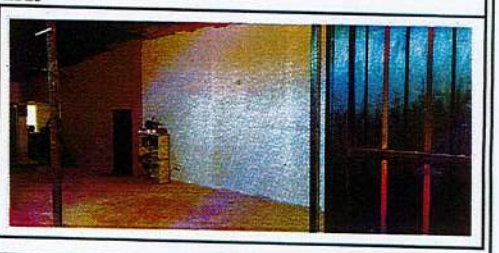

TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

LAUDY TARAZONA
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: laudy tatiana tarazona
C.C. O NIT 1118574912

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2654

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 02

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	
DD 17 MM 10 AA 2023	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

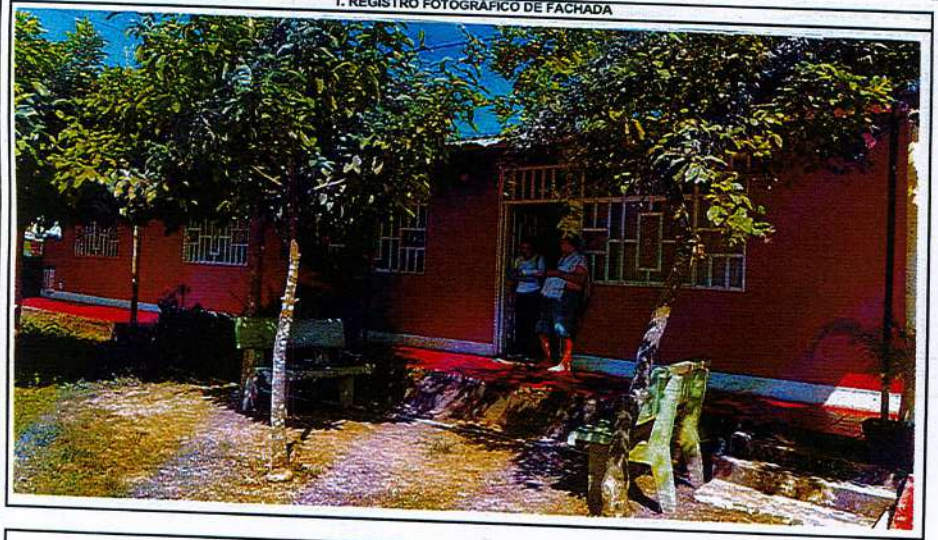

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carlos Witches Gonzalez.
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario Carlos Witches Gonzalez
Cédula de Ciudadanía 9528793.
Dirección Mz 13 Lt 528 793.
Teléfono 3107643756.
Departamento CASANARE Municipio YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos 1 Barrio Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar Obra Gris Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI X NO

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado Escarpado Plano X.

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS			X Piso del garaje hay grietas	X Dilacion eterbog habit. # 2.			
2.HUMEDADES		X humedad pared					
3.HUNDIMIENTOS		pasillo de acceso					
4.DESPLAZAMIENTOS		dilataciones por el pañete					
5.OTROS							
COMENTARIOS		Muros en mau-postería	Tableta de gres enchapado y patio es rustico	Teja eternit lamina de zinc exterior y eterboard habitaciones		Piefabricado lavadero	Aguas lluvias libre.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT cc 9528793

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2660

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 02

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 17	MM 10	AA 2023			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


PISOS






PAREDES





TECHO



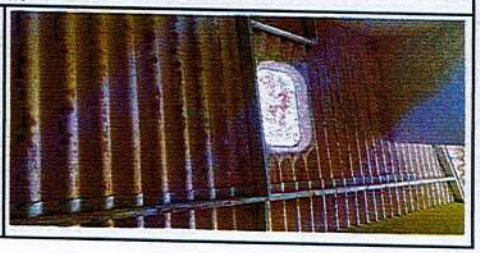

BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2691

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 00

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

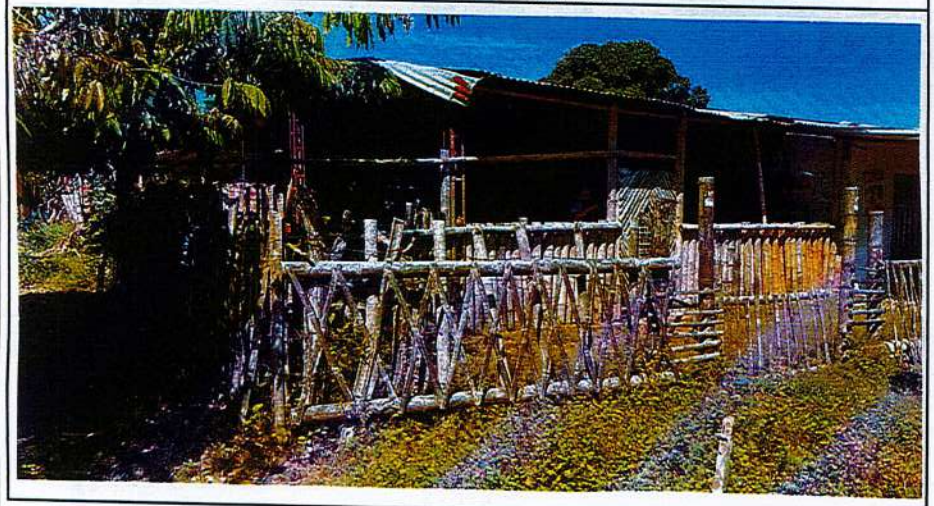

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Faustino Perez.

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Faustino Perez.

Cédula de Ciudadanía: 9.657.634

Dirección: Cra 2 # 29-11 Lote #5

Teléfono: 313 7803584

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris X Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		11. Minero	
2. Comercial		7. Baldío		12. Otro	
3. Industrial		8. Salubridad			
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)			
5. Agropecuario		10. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS		Dilataciones.	Relleno, rustico, concreto liso.	teja de zinc y eternit.	en guadua y algunos perfiles metalicos, zona de garaje.		
2.HUMEDADES		en muros area de cocina					
3.HUNDIMIENTOS							
4.DESPLAZAMIENTOS							
5.OTROS							
COMENTARIOS	Terraqueo en guadua, sin andenes.	Mampostería bloque en concreto	fisuras en contracción por concreto			No existe lavadero, ni subterraneo.	En madera, lamina de zinc.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x 9651634

Nombre: ___ Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

C.C. O NIT ___

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre ___

Testigo

Nombre ___

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2662

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 03

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS

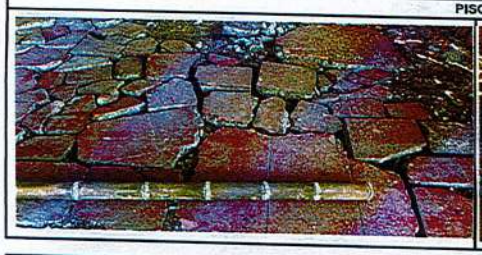



PAREDES





TECHO





BAÑO






OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x _____ 965163 9

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

_____

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

_____

Representante de la interventoría

Nombre

_____

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2693

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 04


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA					
Inicial		Seguimiento		Cierre	
DD 17	MM 10	AA 2023			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

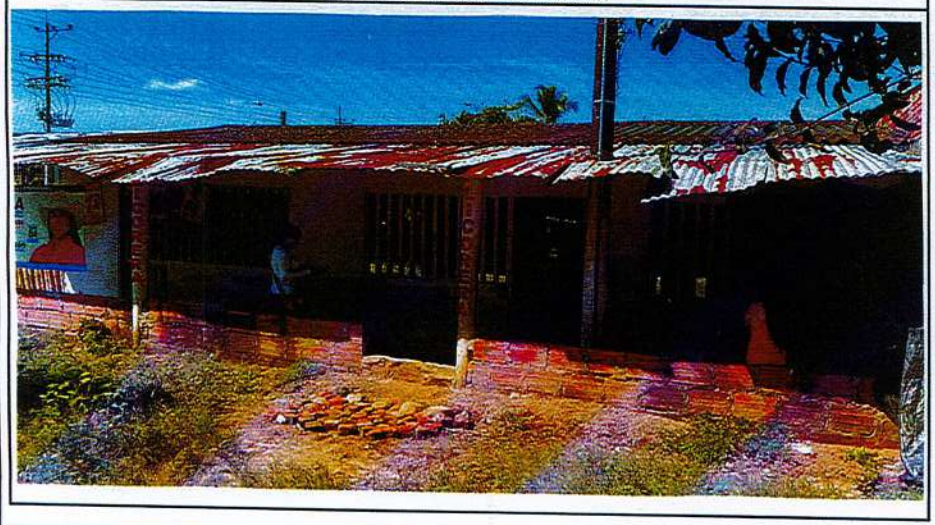

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marcelo Mesa Solo.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Faustino Perez

Cédula de Ciudadanía: 9651634.

Dirección: Cra 7 #29-61 Lt 4.

Teléfono: 312 435 8124.

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI X NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	X Presento unos cortes que hicieron con polidora.	X Moros en Mampo	X patio, habita ciones	☐ Eternit, teja de zinc.	☐ en serchas.	☐ no hay afectaciones	☐ lavadero en concreto.
2.HUMEDADES	☐	X tenia	X	☐ Cubierta externa presenta afectación	☐	☐	☐ Baño presenta humedad.
3.HUNDIMIENTOS	X presento hundimientos.	X	X	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Vidrio fisura en ventana principal fechada	Vidrio roto, no tiene de la puerta principal.					Carpintería en madera metalica.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Faustino Perez
C.C. O NIT 9651634

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2664

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD 17	MM 10	AA 2023	

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES

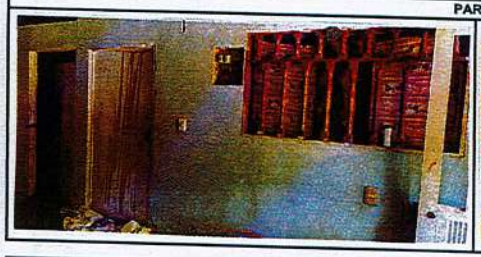




TECHO






BAÑO





COCINA





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2995

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 01

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Dora Torres

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Dora Torres.

Cédula de Ciudadanía: 47.433.415

Dirección: Manzana 1 Lt 9.

Teléfono: 314 358 0407.

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ Contracción dilataciones en piso	☐ Muros internos no hay afectaciones en mampostería	☒ piso presenta grietas	☐ No presenta afectación	☐ Sin afectación tiene pañete	☐ Lavadero en concreto no hay sub terraneo sin servicio.	☐ Aguas lluvias drenaje libre a la vía.
2.HUMEDADES	☐	☐	☐ Piso rustico concreto liso	☐ Eternit, teja arquitectonica	☐	☐	☐ Tiene pozo pro fundo en el patio.
3.HUNDIMIENTOS	☒	☐	☐ Rebit. encha podas.	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐ faltado muro grietas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Dora Nelsi Torres.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47433415

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Rojas

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2666

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 05

	PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 | MM 10 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES





TECHO





BAÑO





COCINA





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT 47.433415.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés Lafaile

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2662

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 06

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

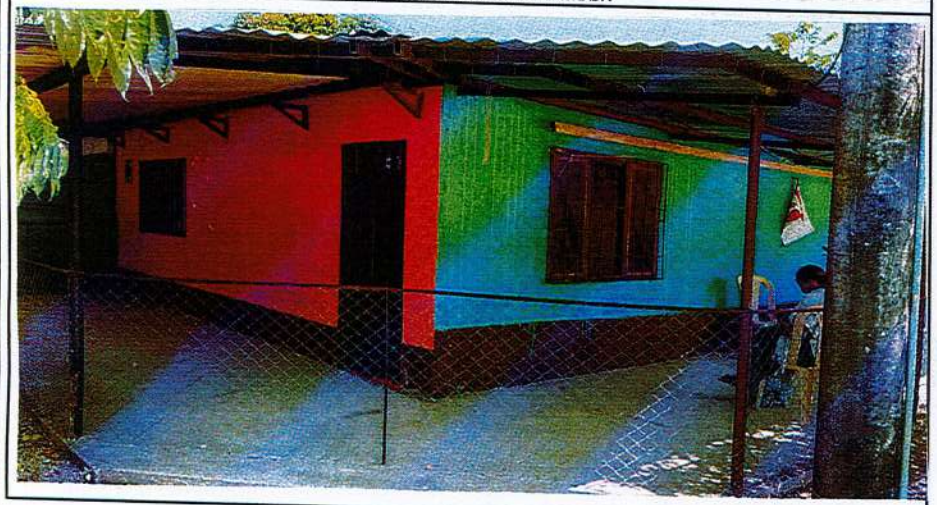

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carlos Antonio Gutierrez Reine.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Carlos Antonio Gutierrez Reine.
Cédula de Ciudadanía: 17.410.958.
Dirección: Casa 167 Mza 3 # 2-04.
Teléfono: 3133360754
No. de pisos: 1
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacaderos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☐	☒ habit. principal y Secundaria.	☒ Fisuras de pisos sala comedor.	☐ No tiene afectacion	☒ Columna afectada	☒ Tanque	☐
2.HUMEDADES	☐	☐ Junto a un interruptor.	☐	☐	☐ desprendimiento de rebaque	☐	☐ Tanque Subterraneo.
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐ Sala Comedor, Columna desprendiendo de rebaque	☐	☐	☐ Colomnetas.	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ Muro de Cocina.	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐ Mampostería.	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS			Pisos enchapados				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X
Nombre: Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2668

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 06

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA					
DD	17	MM	10	AA	2023


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES






TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 7116956

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoria
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2669

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	DD 17 MM 10 AA 2023.

ACTA N°: 07.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

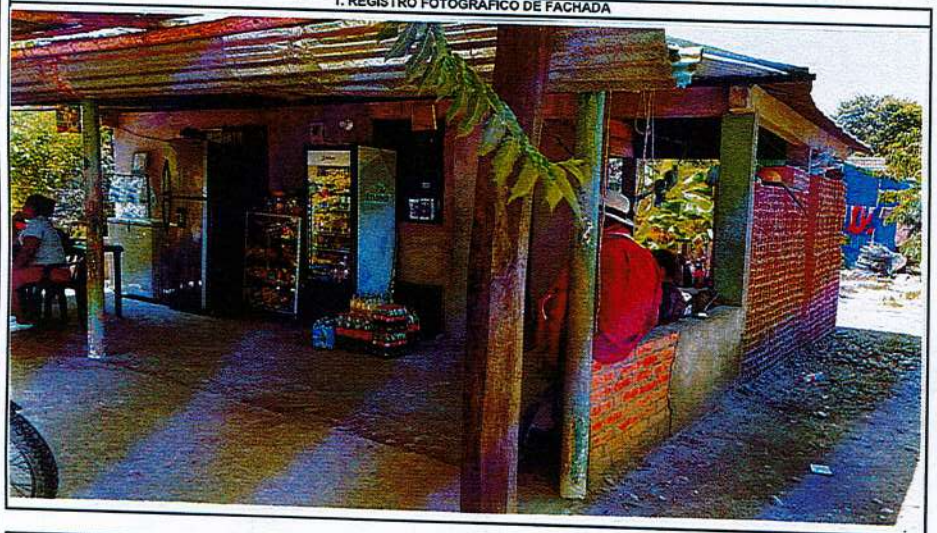

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ana Rosa Vargas.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ana Rosa Vargas.

Cédula de Ciudadanía: 47.441977.

Dirección: Cra 164

Teléfono: 3132432762

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ fisuras en panete.	☒ En zona de baño (Enel)	☒ zona Comercial, zona de acceso ☐ grietas en piso local.	☐ Teja de Zinc.	☐ estructura metalica y de madera. Aparentemente en buen estado.	☒ Lavadero presenta fisuras ☐ humedad en concreto	☐ Carpintería metalica esca sa, solo hay puerto en hab tacion y cocina Ventanería en habitacion.
2.HUMEDADES	☐	☐					
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐					
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐					
5.OTROS	☐	☐					
COMENTARIOS			Pisos en mineral, concreto baño, habit. en Machimbrado.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Ana Rosa Vargas
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47441977

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Otto Ruiz

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2670

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 07

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES







TECHO

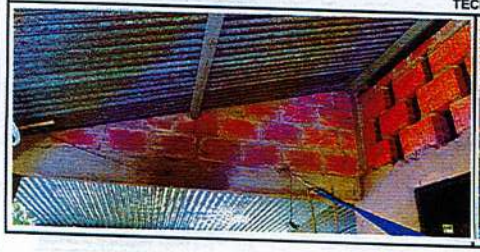



BAÑO





COCINA





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Ana Rosa Vargas
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47441977

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

1692

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 08

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

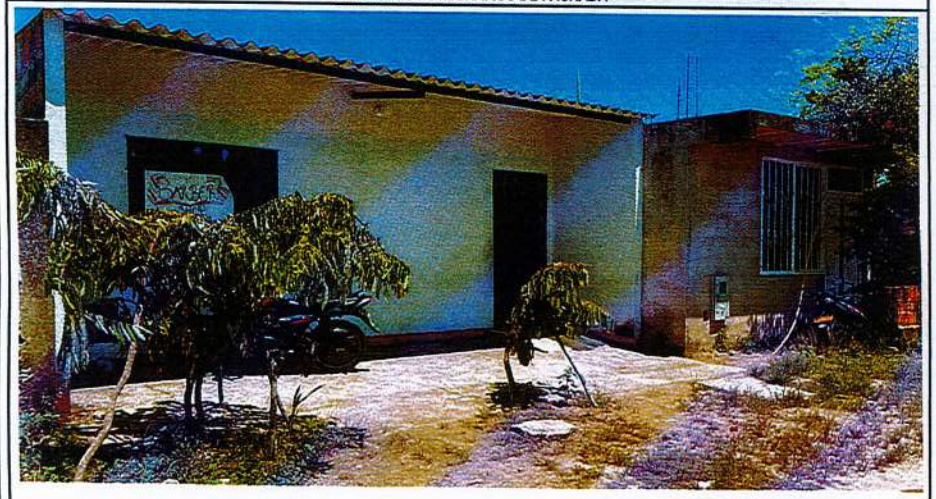

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Damaris Ortega.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Damaris Ortega
Cédula de Ciudadanía: 1.118.553.290
Dirección: Reposado 02 la 18-18
Teléfono: 3228932792 No. de pisos: 1
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6, Televisión cable		X
7, Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	X presenta grieta en piso	☐ Muros pañetados y pintados. Mampostería, bloque	X Sala-Comedor ☐ piso enchapado en la barbería y rustico resto de la vivienda.	☐ Sin afectación, teja en eternit	☐ No se evidencia afectación.	☐ Lavadero prefabricado, tiene humedad.	☐ Carpintería metálica en habitación principal
2.HUMEDADES	☐	☐		☐	☐	X	☐
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐		☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐		☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐		☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS		No presenta afectación.	En buen Condición)				Zona de entrada de la barbería.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Damaris Ortega
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 1118553290
C.C. O NIT

Representante del Contratsita de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2672

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 08

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES





TECHO



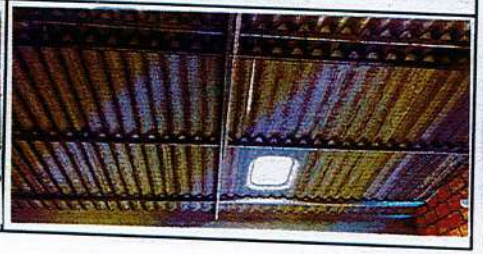

BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Damaris Ortega.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 1118533290
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2673

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 09.

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 | MM 10 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

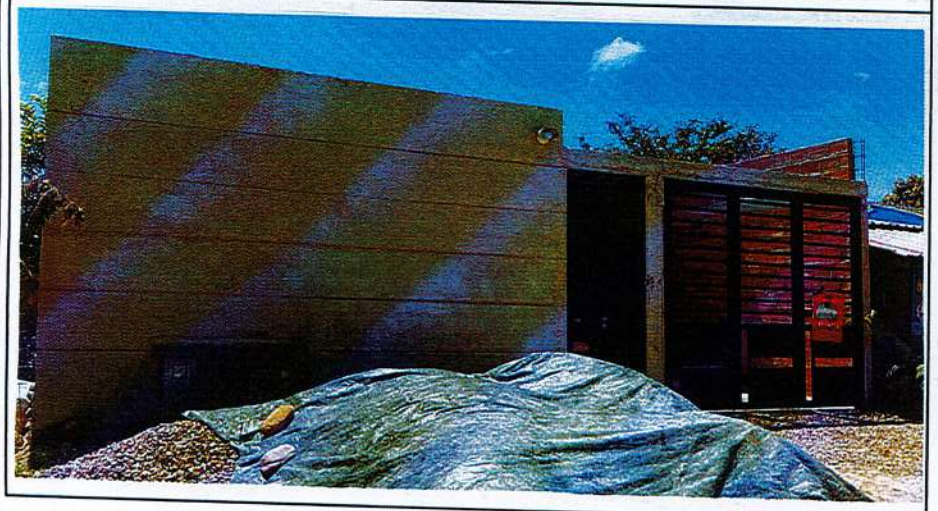

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hector Julio Barrera.

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Hector Julio Barrera.

Cédula de Ciudadanía: 74.862.027.

Dirección: Cll 1 # 4-42

Teléfono: 3125301284

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris X Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS		Muros en mampostería.	X piso fisurado por contracción	Teja arquitectonica.		Pozo profundo	Lavadero en concreto.
2.HUMEDADES							
3.HUNDIMIENTOS			Piso rustico y enchapado				
4.DESPLAZAMIENTOS							
5.OTROS							
COMENTARIOS	Vivienda nueva en proceso de construccion						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: ___

C.C. O NIT 74.862.027

Representante del Contratista de Obra

Nombre: ___

Representante de la Interventoría

Nombre ___

Testigo

Nombre ___

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

4492

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 09

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES






TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 74.962027

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2675

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023	

ACTA N°: 040

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

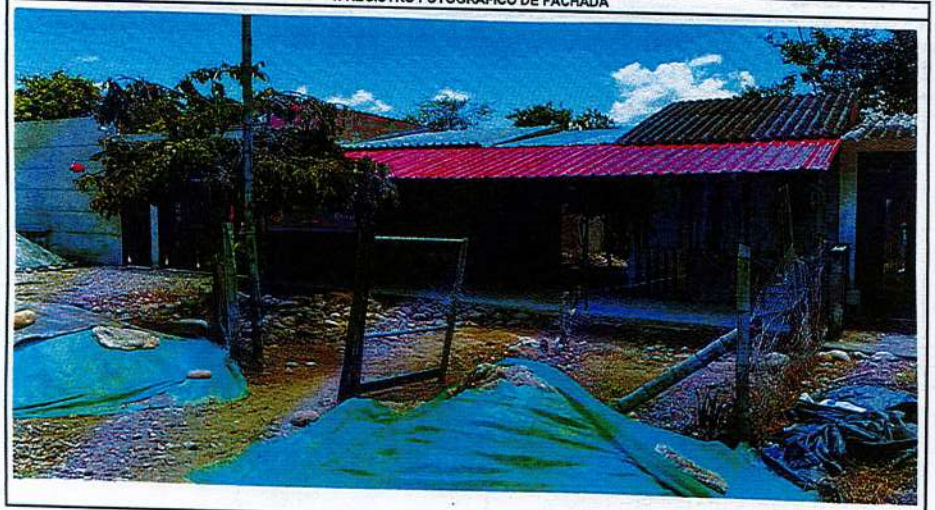

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hamilson. Gomalez.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario: Edilma García García

Cédula de Ciudadanía

Dirección: Tilodiran Cra 13 39 (Centro)

Teléfono: 321 292 37 22

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ Piso contracción Concreto.	☐ fisuras en zona de lavadero y patio.	☐ habitación enchapada ☐ baño enchapado ☐ Cocina con piso mineral, piso en tierra grietas zona lavadero-patio	☐ Teja de zinc ☐ Una parte estructura metalica ☐ guadua y madera.	☐ Sin afectación	☐ Lavadero prefabricado ☐ fisuras y humedad	☐ Tiene carpintería en habitación Cocina, vidrio rota, ventana puerta. ☐ Tiene puesto el baño, habit. principal.
2.HUMEDADES	☐	☐					
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐					
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐					
5.OTROS	☐	☐					
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1-113-698.124

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

9296

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 010

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS

PAREDES

TECHO





BAÑO




OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1.113.698.124

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2694

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 011

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: flor Eunice Achagua.
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Jose del Carmen Achagua.
Cédula de Ciudadanía: 1.193.784.
Dirección: Barrio Tilodiran lote 1.
Teléfono: 3229616932.
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1. Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Habitacion principal se encuentra con Condado

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒ Cuál?

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ fachada interna	☒ No se evidencia	☒ Alrededor del	☐ Tejo de zinc.	☐ Aparente buen	☐ Tanque en	☐ Manejo interno
2.HUMEDADES	☐ Cerramiento	☐ afectacion	☐ tanque y	☐	☐ estado con pañete	☐ concreto	☐ de agua lluvias.
3.HUNDIMIENTOS	☐ Externo con	☐ fisuras de	☐ baño hundido	☐	☐	☐ subterraneo	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐ mamposteria	☐ pañete	☐ y grietas	☐	☐	☐ (Pozo profundo)	☐
5.OTROS	☐ malla estructural.			☐	☐	☐ Baño enchapado.	☐
COMENTARIOS		grieta en la habitacion principal			Lidino de la habitacion roto.	Cocina, habitacion enchapada no tiene cenefas.	*Existen dos Cocinas.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

flor eunice achagua
3348601
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2678

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 011

	PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES






TECHO





BAÑO






OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

flor Eunice Achagua
X 33481601
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2674

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 012

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 | MM 10 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

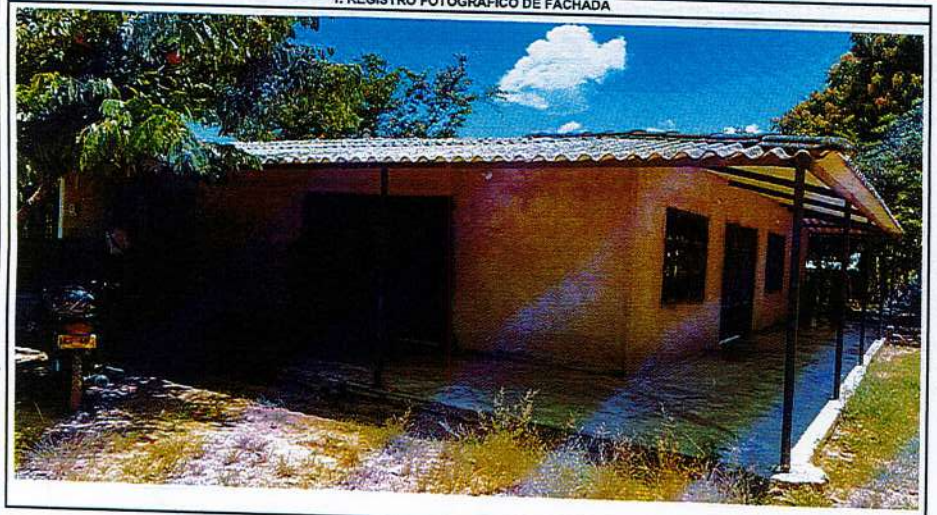

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Adamaris Garay Ramirez.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Adamaris Garay Ramirez.
Cédula de Ciudadanía
Dirección: Calle 3 # 4-38.
Teléfono: 3132078088
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris X Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	X Presente fisuras en andenes	X fisuras en cocina.	X pisos fisurados y en minera	Estructura metalica y teja de eternit.	Teja en Eternit y lamina de zinc	X Tanque en concreto presente humedad y fisuras	Carpintería metalica, sin vidrios
2.HUMEDADES		X humedad (local comercial)	Zona de almacenamiento (Alfiz) presenta fisuras	Techo en Cielo Raso (habit. +1) por aparente buen estado.	Columnas y viga		
3.HUNDIMIENTOS		Patio presenta humedad.	Pisos en otros partes de la casa en rustico.				
4.DESPLAZAMIENTOS							
5.OTROS							
COMENTARIOS		Zona de bolones y patio piso en tierra.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x Adamaris Garay R.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47438068

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2680

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 012

PAGINA	1	DE	1	
Inicial	Seguimiento	Cierre		
FECHA				
DD 17	MM 10	AA 2023		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS







PAREDES





TECHO

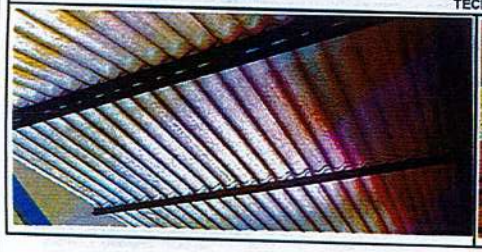

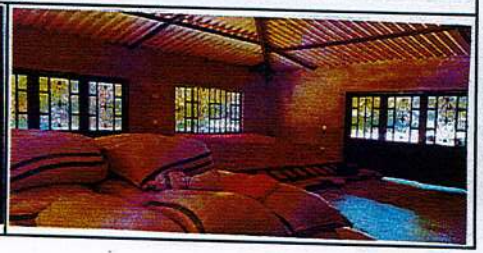


BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

xAdamaris Garay Ra.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47438068

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2681

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 013.

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 | MM 10 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

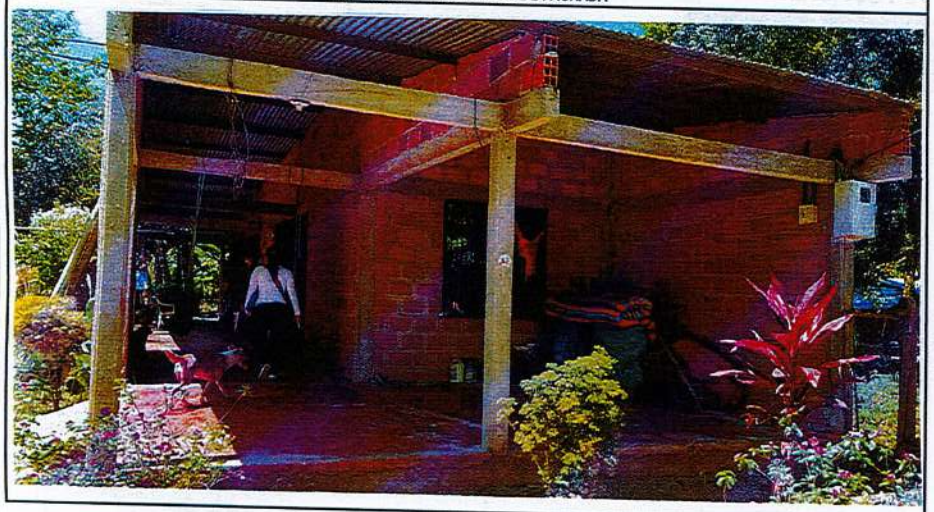

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Policarpo Tabaco

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Leocadio Gonzalez

Cédula de Ciudadanía: 9.648.889

Dirección: Tilodiran Finca San Rafael.

Teléfono: 3118506911.

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Borreg. Tilodiran Finca San Rafael.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☒	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpinteria metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ No presento	☐ Huecos en mam	☒ Piso en mineral	☐ Estructura	☐ en buen estado	☐ Tienen pozo	☐ Carpintería me
2.HUMEDADES	☐ Andenes.	☐ posteria.	☐ presencia fisura	☐ metalica y	☐ Vigas, Columnas.	☐ profundo	☐ fatiga solo en
3.HUNDIMIENTOS	☐ Tampoco fachada	☒ Sin afectación	☐	☐ Tejo en zinc	☑	☐ lavadero	☐ las habitaciones
4.DESPLAZAMIENTOS	☐ Cerramiento	☐	☐	☐	☐	☐ prefabricado	☐
5.OTROS	☐ En cerca, alambre	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	postes, porton malla eslavonada						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Policarpo Tabaco
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 9005.743

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2682

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 013.	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA: DD 17 MM 1 AA

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES






TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Policarpo Zabarco
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 3005.743

Representante del Contratsita de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2683

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 014

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 | MM 10 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ciro Julio Ruiz
Tenencia: Propietario X Arrendatario Ciro Julio Ruiz. Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario
Cédula de Ciudadanía 3237282
Dirección Correg. Tilodiran Granja los Acacios.
Teléfono 3116263499 No. de pisos 1
Departamento CASANARE Municipio YOPAL - TILODIRÁN Barrio Correg. Tilodiran Granja los Acacios

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ Cuál? URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☒	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ Sin afectación alguna	☒ Cocina, por pañete, se generan fisuras.	☒ fisuras por contracción del concreto	☐ Sin afectación	☐ Sin afectación	☐ No existe. lavaderos.	☐ Tienen una cocinera, pozo profundo.
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐ Estructura Teja zinc.	☐	☐	☐
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐ Pisos en concreto INT	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐		☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS			Cocina encha pada			Cerramiento en cerca viva exterior. interior malla eslavonada.	Carpintería metálica. vidrio Roto de la puerta principal.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X 3237282
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

1687

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 014

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES






TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratsita de Obra
Nombre: DIEGO REEZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

1685

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 015

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Blanca Jimenez.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___
Nombre del Propietario: Blanca Jimenez.
Cédula de Ciudadanía: T.I. 10.088
Dirección: Correg. Tilodiran finca el Trompillo
Teléfono: 3214584080
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: Barrio: finca el Trompillo

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☒	Viviendo en Construcción, Se sugiere hacer nuevamente visita, cuando termine la casa.
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ Sin afectacion ☐ viviendo en ☐ construcción	☐ sin afectacion ☐ ☐ ☐ ☐	☒ En la habita ☐ cion si presen ☐ ta fisura y ☐ la placa del ☐ pozo septico	☐ Teja arquitec ☐ tonica y ☐ en lamina ☐ de zinc.	☐ Sin novedad. ☐ ☐ ☐ ☐	☐ lavadero pre ☐ fabricado. ☐ ☐	☐ Carpintería ☐ metalica sin ☐ vidrios ☐
2.HUMEDADES							
3.HUNDIMIENTOS							
4.DESPLAZAMIENTOS							
5.OTROS							
COMENTARIOS			Un dia fraguado el piso de sala Comedor				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 7371/0068

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2686

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 015


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA 1 DE 1	
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Inicial / Seguimiento / Cierre	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 17 MM 10 AA 2023	

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


PISOS





PAREDES






TECHO






BAÑO

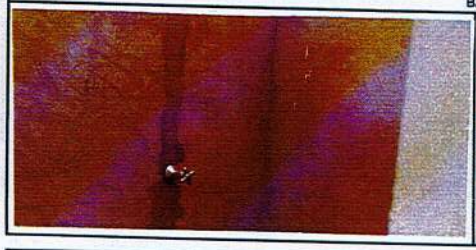



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23760068

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2687

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 016

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Betty Franco.

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Betty Franco.

Cédula de Ciudadanía

Dirección: Corr. Tilodirán Finca Jade.

Teléfono: 3122097 ##

No. de pisos

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN Barrio: finca jade

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐	Garaje Uso del garaje	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ No hay afectacion, anden enchapado	☐ No hay afectacion Mouposteria.	☐ Piso en goro le fisuras contraccion por concreto	☐ No hay afectacion	☐ Tgo de zinc.	☐ Lavadero prefabricado	☐ Pozo septico (2)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐ piso en Ni neral, enchape y otro rustico o concreto.	☐	☐ Teja eternit. (solo corredor-baño).	☐	☐ Pozo profundo.
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Betty Franco
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1115855865

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

8892

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 016

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS






PAREDES




TECHO





BAÑO

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA




*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Betty Franco
C.C. O NIT 1115855865

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2684

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 017

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 10 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

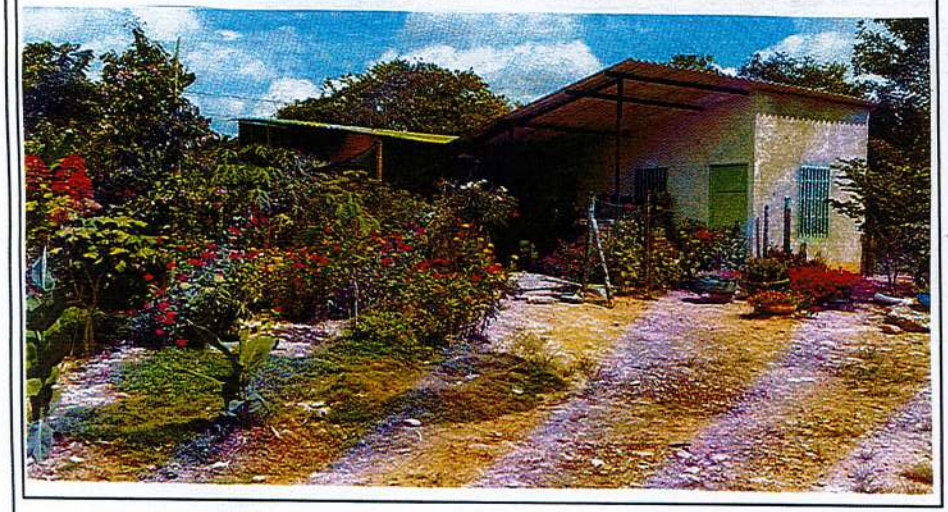

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María Edilma González.

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: María Edilma González

Cédula de Ciudadanía: 47.434.871

Dirección: Carrera 7 Bis #

Teléfono: 321 466 36 35

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☐	☒
2. Alcantarillado	☐	☒
3. Energía	☒	☐
4. Teléfono	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros Cuál?	☐	☒

OBSERVACIONES: Se recomienda el traslado de las plantas ubicadas en la zona exterior de la casa.

TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐	URBANO ☒			
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminada ☐		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☒			
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒		

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ Afectaciones en piso	☐ No hay afectación	☒ grietas en habitaciones, patio, cocina	☐ Teja de fibrocemento, todo la cosa, estructura metalica	☐ Aparentemente en buen estado	☐ Lavadero prefabricado	☐ Carpintería metálica, sin vidrios.
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.HUNDIMIENTOS	☐ No hay andenes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS			El baño echo todo piso en concreto, algunas partes en cerámica.				Tiene caja de inspección, no tiene pozo séptico.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Edilma González
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47434871

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2690

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 017.

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 20	MM 10	AA 2023.	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


PISOS



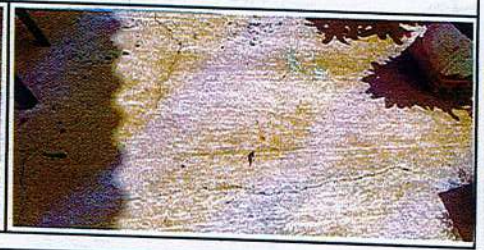

PAREDES





TECHO





BAÑO





COCINA





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Edilma Gonzalez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1117318875

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

1692

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA Nº: 018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA					
Inicial		Seguimiento		Cierre	
DD	20	MM	10	AA	2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ana Joaquina Rojas

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ana Joaquina Rojas.

Cédula de Ciudadanía: 23375706.

Dirección: Casa 163 Tilodiran

Teléfono: 322 478 4330

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje Uso del garaje	SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ Fachada grieta ☐ Cubierta Cuida ☒ hundimiento en zona externa ☐	☐ Bloque, estero de guadua ☐ Parte externa del baño cara col, desprendimiento de parete	☒ fisuras y grietas ☐ ☒ Hundimientos ☐ Pisos: rustico y mineral	☐ Teja de Zinc ☐ Con estructura metalica ☐ Estructura en guadua ☐	☐ Columnas con tubo ☐ lleno en concreto ☐ y guadua ☐ Concreto en buen estado. ☐	☐ Tanque en Concreto. ☐ Presento humedad ☐	☐ No tiene pozos ni septico ni profundo. ☐
2.HUMEDADES							
3.HUNDIMIENTOS							
4.DESPLAZAMIENTOS							
5.OTROS							
COMENTARIOS			Cocina en tubería de gres Cerchas de Teja presenta fisuras y grietas.			Cuenta con dos baños.	

NOTA: SE DE LA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Ana Joaquina Rojas
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23375706

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2692

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 018

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 10	AA 2023			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES





TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Ana Joaquina Rojas
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23375706

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2693

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 10 AA 2023	

ACTA N°: 019.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

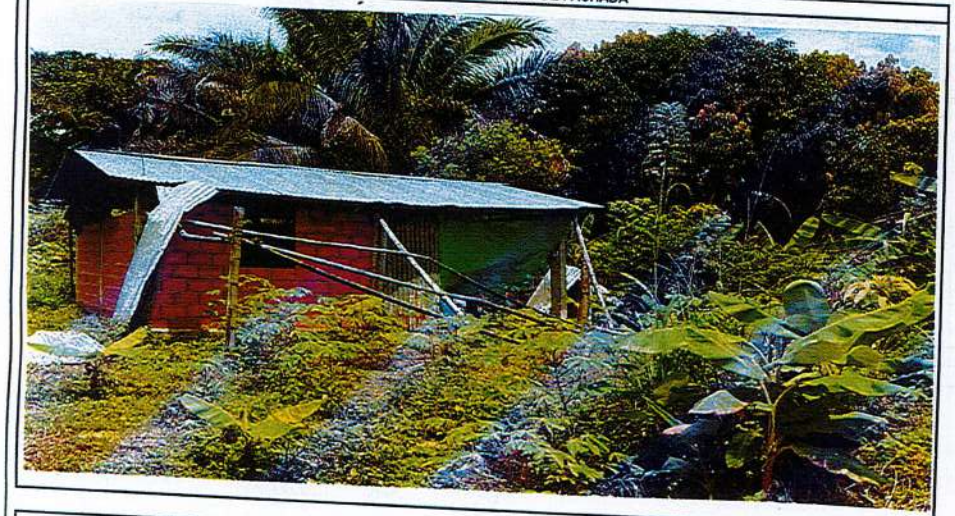

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ana Rosa Socha Guanoro
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Ana Rosa Socha Guanoro
Cédula de Ciudadanía: 1.118.554.310
Dirección: Finca el Tesoro.
Teléfono: 3117303582
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Correg. Tilodiran, finca el Tesoro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL X Cual? URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar X Obra Gris Terminada

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI NO

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado Escarpado Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario	X	10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ No tiene andenes	☐ Muros en mampostería sin afectación	☒ Concreto	☐ Estructura en cuadrada Teja Zinc.	☐ En buen estado no tiene vigas solo columnas	☐ No tiene lavadero.	☐ Baño, no tiene
2.HUMEDADES	☐ Cubierto de la fachada caido y patio.	☐	☐ Con figuras y grietas.	☐	☐	☐ Tiene pozo septico y profundo	☐ Cubierta de plastico caido.
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐		☐ No se encuentra habitado actualmente
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐		No tiene carpintería metalica, sin puertas ni ventanas.
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐		
COMENTARIOS							

FIRMAS

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

X Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2694

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 019	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 10 AA 2023

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS





PAREDES





TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118564590

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PAEZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2695

8.6.16 ACTAS DE VECINDAD PERIODO NOVIEMBRE 2023

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 020

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 22 MM 11 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Unibio Garces Carmen Suzana.
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Unibio Garces Carmen Suzana.
Cédula de Ciudadanía: 47430290
Dirección: Calle 6 # 3-19 Tilodiran.
Teléfono: 313 345 2528
No. de pisos: 1
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL - TILODIRÁN Barrio: Las Villas

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		Habitacion #3 no fue posible revisarla se encontraba con llave y el propietario ofrece las consecuencias.
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1.GRIETAS Y FISURAS	X Fisura sobre puerta acceso a habitación	☐ habitacion #1	☐ habit- #2	☐ Teja de eternit	☐ No tiene vigas	☐ Tiene 2 lavaderos, enchapados, Un tanque pequeño tiene desprendimiento de enchape	☐ Tiene Pozo subterraneo
2.HUMEDADES	☐	☐ Muros: Con grietas transversales y longitudinales. Despren dimiento de Celucia	☐ daño en baldosos.	☐ estructura Metalica, sin	☐ Baño: enchapado		☐ Carpintería metalica en puertas y ventanas.
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐ Muros en pasillo presenta humedad	☐ chas	☐ presenta fisura en la ducha		
4.DESPLAZAMIENTOS	☐ Anden perimetral con grietas, desprendimiento de mortero	☐ habitacion en muros Humedades, y desprendimiento de Pañete	☐ Muros internos del corredor, fisuros internos, desprendimiento de				
5.OTROS	☐	☐	☐				
COMENTARIOS	Cerramiento con grietas hundimiento de piso, seccion circular	Habit #2 Puesto a la calle. presenta humedades por salitre	Pisos interior de concreto fisuras	Observación: Los datos encontrados por la Campaña SESCO.			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2694

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 020

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD | MM | AA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No: ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS

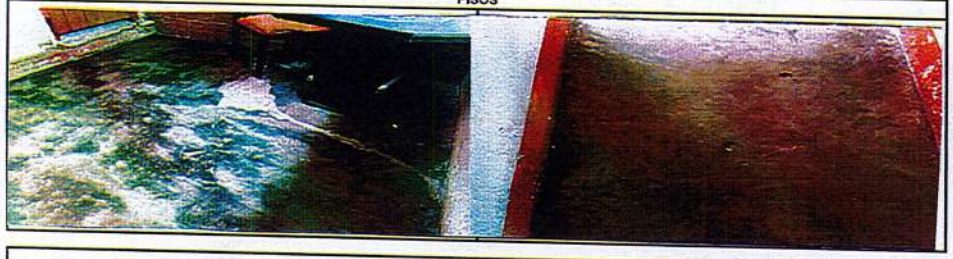


PAREDES

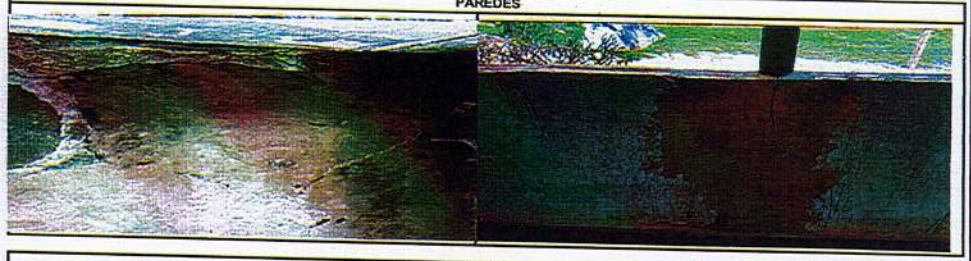

TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2698

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 021

PAGINA 1 DE 1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Isabel Neme

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: María Isabel Neme.

Cédula de Ciudadanía: 47 429 913.

Dirección: Carrera 5 # 5-35

Teléfono: 3212163380

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Bolido

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Dilatación muro puerta principal.	☐ Piso habt 2 con fisuras.	☐ Humedad en tejado	☐ Columnas fachada fracturadas.	☐	☐ Vidrio ventanas rotos.
2 HUMEDADES	☐	☐ Separación marco puerta habt. 2 y muro.	☐ Falta baldosa borde muro patio	☐	☐ Grieta parte superior puerta entrada.	☐	☐ Cerramiento fisurado.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ Fisuras muro ventana habt 2.	☐	☐	☐ Acero expuesto viga patio (lavadero).	☐	☐ Filtración agua en el lavaplatos
4 DESPLAZAMIENTOS	☐		☐	☐		☐	☐ Lavadero con baldosa.
5 OTROS	☐						
COMENTARIOS		Grieta muro lavaneros. Humedad muros baño. Deterioro y descascaramiento parte trasera puerta (muro).	Descascaramiento pintura muros. Humedad bajo tanque elevado.		Columna deteriorada con acero expuesto (lavadero). Grietas columnas habt. patio.		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

María Isabel Neme
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47429913

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 021

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÈTICO


OBRA:

PISOS





PAREDES





TECHO






BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Isabel
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: María Isabel Ulloa
C.C. O NIT 47499973

Representante del Contratsta de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

7400

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 022

PAGINA 1 DE 1 — Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

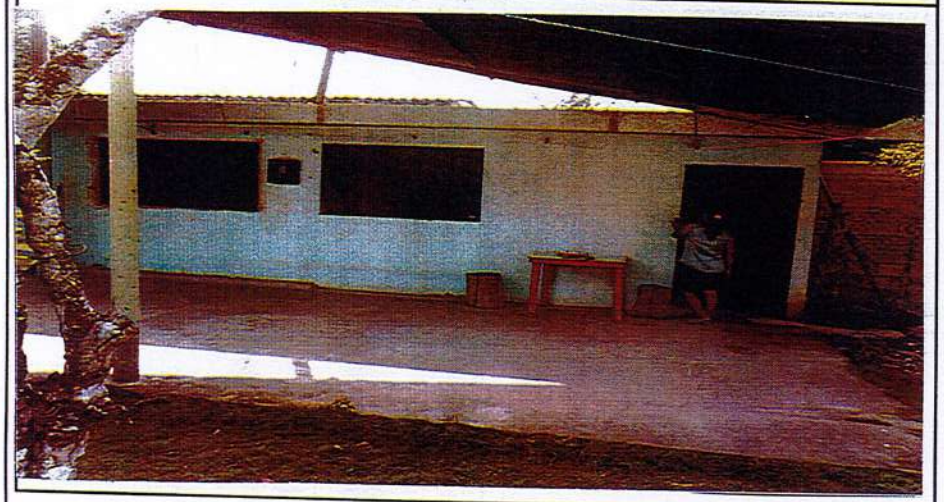

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María Isabel Neme

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: María Isabel Neme

Cédula de Ciudadanía: 47 429 913

Dirección

Teléfono: 3212657430

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Heinando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6. Televisión cable		
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Grietas muro fachada.	☐ Fisuras bordes ventanas muros.	☐ Piso anden con grietas.	☐	☐ Deterioro y grietas columnas fachada	☐	☐ Filtracion de agua lavaplatos.
2 HUMEDADES	☐	☐ Descascaramiento muro cocina.	☐	☐	☐	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ Fisuras arco entrada cocina.	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐		☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐		☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

María Isabel Neme
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: María Isabel Neme
C.C. O NIT 47429913

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

1027

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES



TECHO

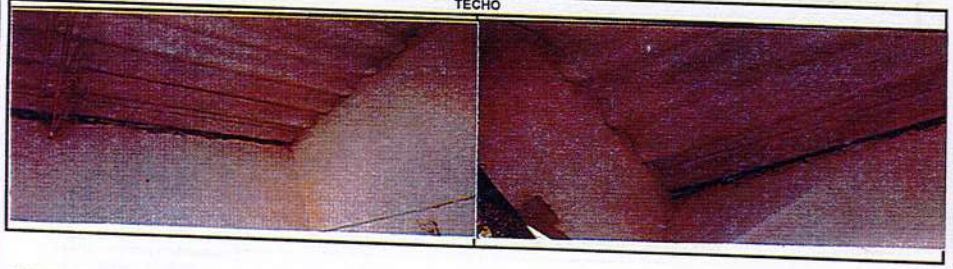


BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

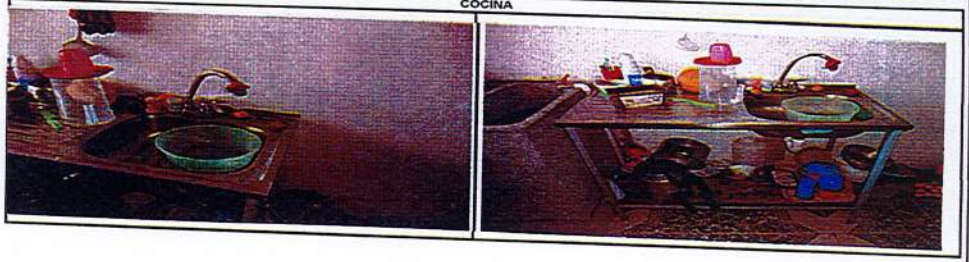

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

María Isabel Alemie
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1124944115

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2022

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	
DD 24 MM 11 AA 2023.	

ACTA N°: 023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María Berta Martinez.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: María Berta Martinez.

Cédula de Ciudadanía: 47.429.773

Dirección: Calle 1 # 5 esquina.

Teléfono: 3124774473

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Grietas en muros fachada.	☐ Cimegen muro habt 1.	☐ Pico cala agrietado	☐ Techo baño fisurado	☐ Parte superior puerta principal agrietada y deformada.	☐	☐ Tanque con filtración
2 HUMEDADES	☐	☐ Muro tv con grieta	☐ Pisos cata con grietas y fisura.	☐	☐	☐	☐ Faltan balaustras baño.
3 HUNDIMIENTOS	☐ Piso anden fisurado	☐ Muro habt 3 agrietado.	☐ Fisuras muro armario habt 2.	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ Dilatación Muro marco baño.	☐ Ventana habt	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐		☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS		Separación muro esquina televisor.	2 rota. (puerta)				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS María Berta Martinez 47429773

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: ___

C.C. O NIT ___

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría

Nombre Sandra López

Testigo

Nombre ___

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

7403

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA	
		DD 24 MM 11 AA 2023	

ACTA N°: 023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS

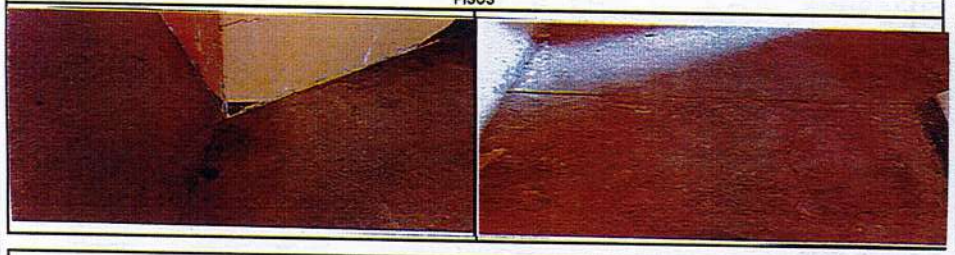


PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS MariaBerta Martinez

47402773

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 024

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 24 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

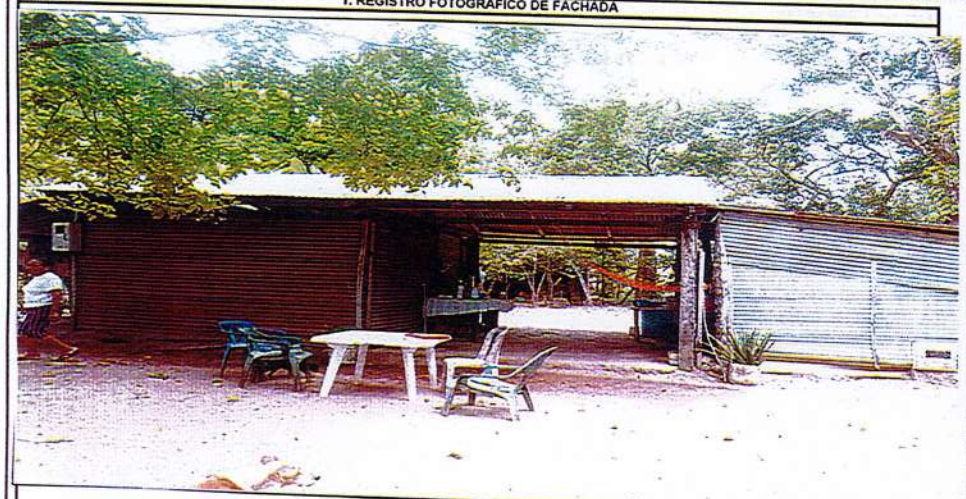

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Eva González

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Eva González.

Cédula de Ciudadanía: 47.450.201

Dirección:

Teléfono: 3228325477

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Muros en lámina.	☐ Piso no tiene.	☐	☐ Columnas de madera	☐	☐ No cuenta con
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐ Vigas de madera	☐	☐ lavamanos, ni
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ducha.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

FLA.J° Eva González
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47450201

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2965

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA Nº: 024	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023	
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023	
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.	

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS




PAREDES

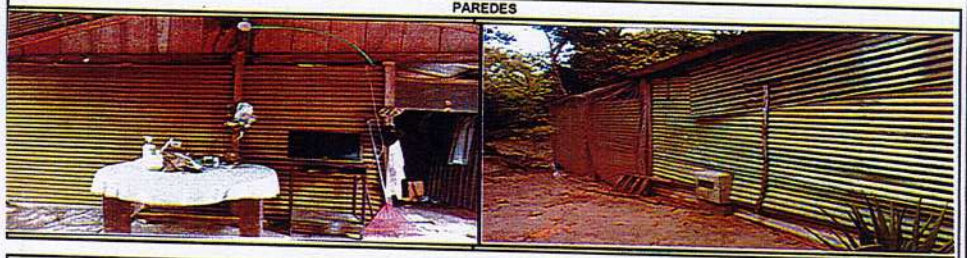

TECHO

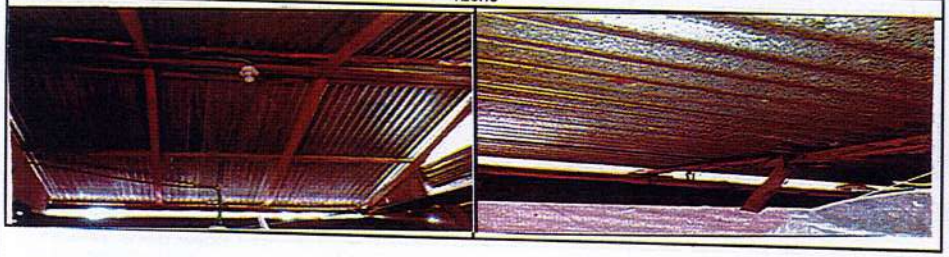

BAÑO

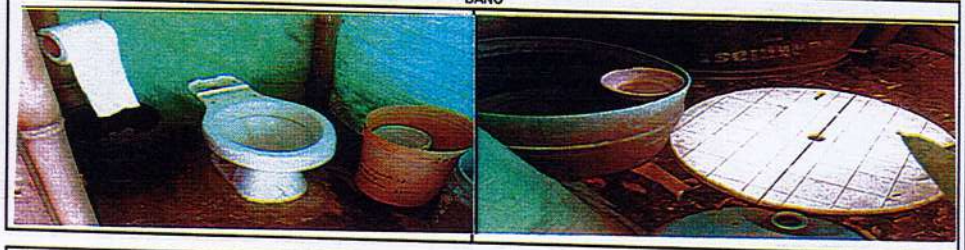

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

ELDY EVA Bermudez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1117430967

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoria
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

206

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

ACTA N°: 025

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

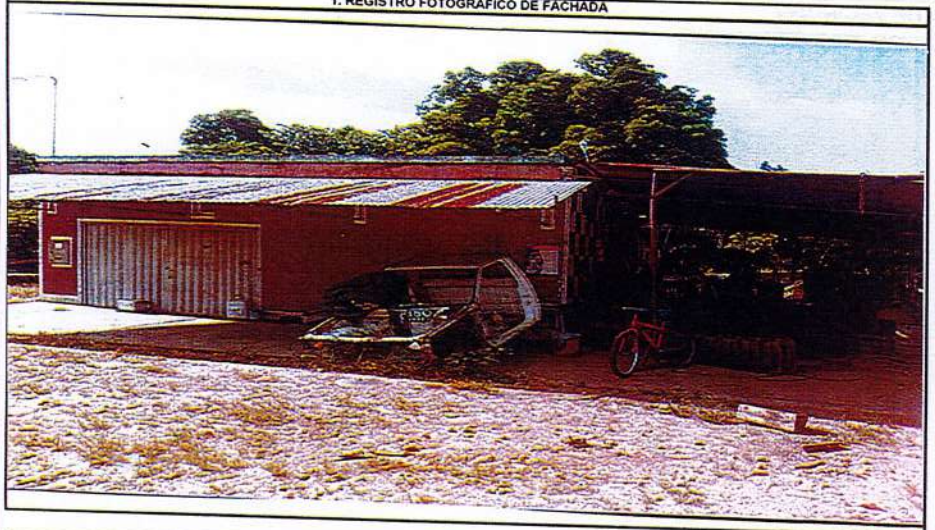

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Noel Gonzalez.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Luis Noel Gonzalez.

Cédula de Ciudadanía: 5.921.060

Dirección: C 6 # 01-10 Manz. 21 lote 1-10

Teléfono: 321 466 2135

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Polido.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☒ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Pintura soplada	☐ Humedad habit. 2.	☐ Piso con fisuras	☐ Baño 2 fisurado	☐ Viga sobre baño 2	☐ Carpintería	☐ Baño 2 no tiene
2 HUMEDADES	☐	☐ Muros patio fisurados (cercamiento).	☐	☐	☐ con fisuras.	☐ metálica desgas-	☐ lavamanos
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ Borde muro puerta	☐	☐	☐	☐ tada.	☐ Baño 1 lavamanos
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ deteriorado.	☐	☐	☐	☐	☐ suelto.
5 OTROS	☐	☐ Humedad muro baño 1.	☐	☐	☐	☐	☐ Tanque con fisuras
							☐ y filtración de agua
COMENTARIOS		Fisura muro continuo puerta habit. 2. Borde ventana con grieta.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 5.921.060

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 025	PAGINA 1 DE 1	


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023	PROYECTO	Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DD 24 MM 11 AA 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023		
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

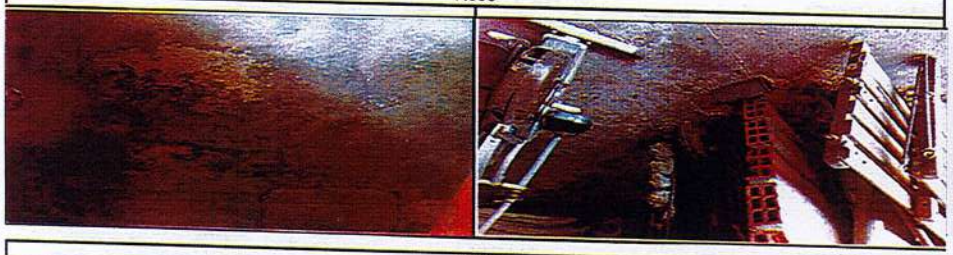


PAREDES



TECHO

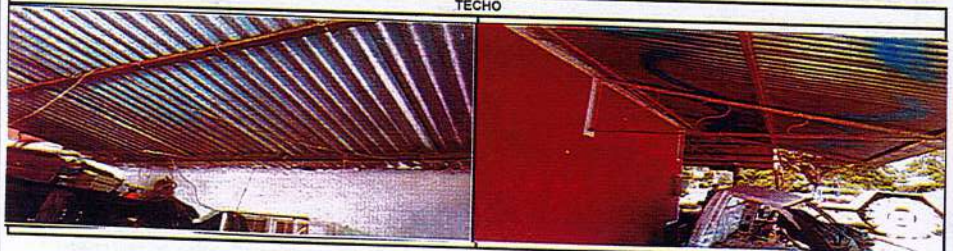

BAÑO

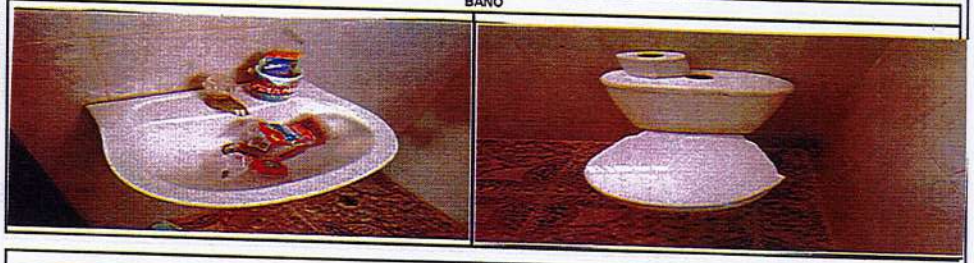

COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 5981000

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Jimbes López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

8027

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 026	PAGINA 1 DE 1	Inicial / Seguimiento / Cierre

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Fanny Martin Cardenas
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Rosa Lilia Barrera
Cédula de Ciudadanía: 52366011. Cel. 3134198007.
Dirección: Cra 17. Tilodiran.
Teléfono
Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris X Terminada X
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		11. Minero	
2. Comercial		7. Baldío		12. Otro	
3. Industrial		8. Salubridad			
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)			
5. Agropecuario		10. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO ___ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Grieta entre muros sala y habt. 1.	☐ Piso habt 3	☐ Cubierta rota	☐ Columnas cubierta	☐ Tanque con	☐ Vidrio ventana
2 HUMEDADES	☐	☐ Pintura soplada	☐ baldosas rotas	☐	☐ agrietadas con humedad	☐ filtración de agua	☐ habt. 1 roto.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ baño adentro	☐	☐	☐ Viga aerea comedor	☐	☐ Parte inferior puerta
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ Pintura soplada muros	☐	☐	☐ con porosidad	☐	☐ baño corroida.
5 OTROS	☐	☐ habt. 4	☐	☐	☐ Columna baño afuera	☐	☐ Baldosa rota
					con grietas		mesón cocina.
COMENTARIOS		Grieta muro Suiche habitación 2 y humedad Grieta muro esquina habt 1.					☐ Vidrio rota puerta Junto a la colina Baldosa comedor rota Baño afuera con lavamanos y humedad Baldosa baño afuera rota.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Fanny Martin Cardenas
C.C. O NIT 1118168740

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2208

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 026

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 24 MM 11 AA 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO




BAÑO

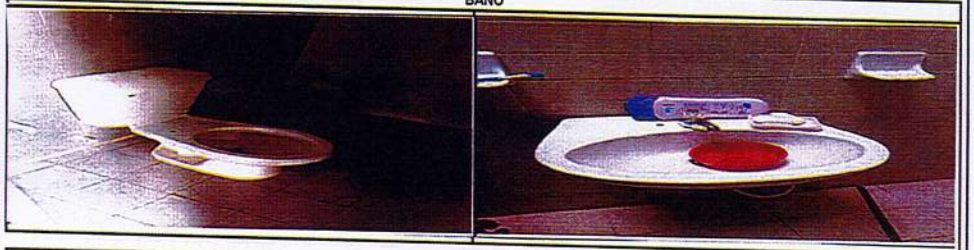

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Jany Martin Cárdenas
C.C. O NIT 1118166190

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

01 de 2

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1	DE 1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 25 | MM 11 | AA 2023.

ACTA N°: 027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

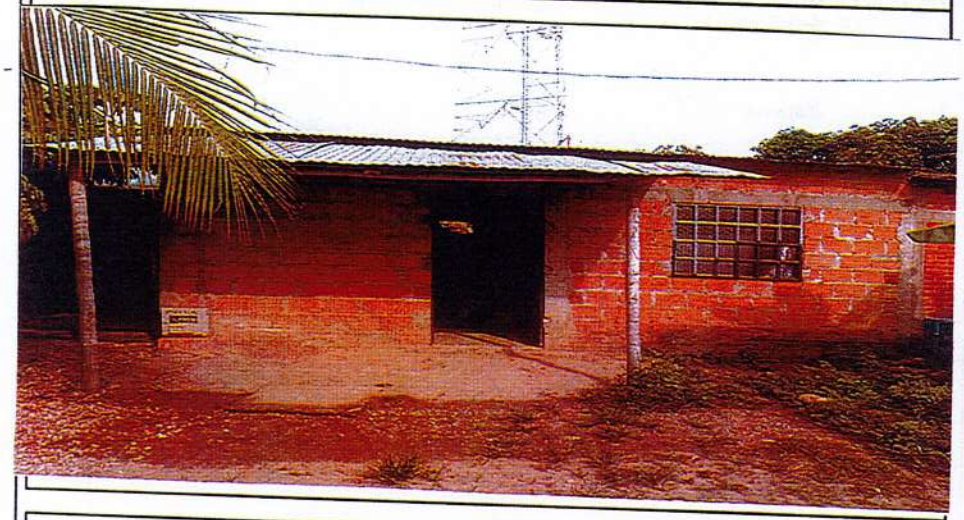

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Gregorio Fernandez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Alejandro Morales.

Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Teléfono: 3228326412

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Humedad muro habt 1	☐ Piso fisurado.	☐	☐ Fisuras en viga fachada.	☐	☐ Carpintería metálica
2 HUMEDADES	☐	☐ Muros bloque rotos	☐	☐	☐ Viga aereada con acero expuesto.	☐	☐ ventana oxidada.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ Humedad muros	☐	☐	☐	☐	☐ Tanque con fisuras y filtraciones.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ Pata-cocina.	☐	☐	☐	☐	☐ No tiene lavaplatos.
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ No tiene lavamanos.
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jose

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoría

Nombre: Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2311

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA	
		DD 25 MM 11 AA 2023	

ACTA N°: 027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

PISOS



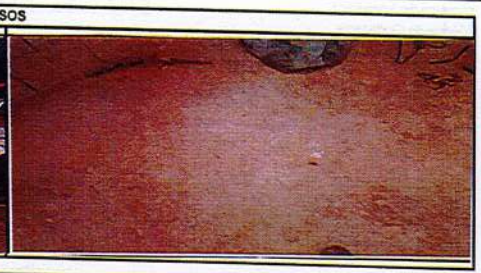

PAREDES

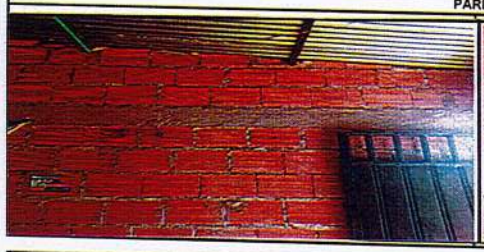





TECHO





BAÑO



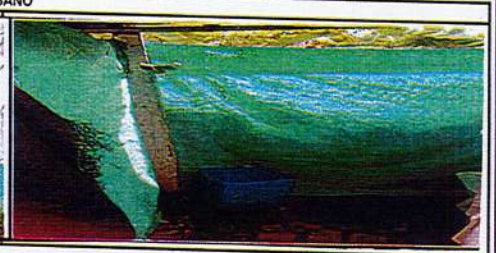

COCINA





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

JOSE

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato.
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2412

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 25 MM 11 AA 2023

ACTA N°: 028

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

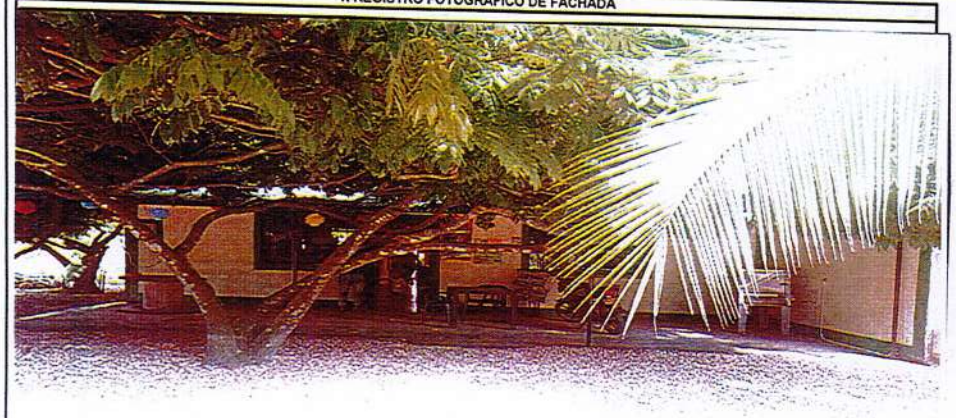

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sibilina Cardozo

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Sibilina Cardozo

Cédula de Ciudadanía: 47.433.091

Dirección: M2 - 11.

Teléfono: 3222475847

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Fisura en muro frontal y muro lateral.	☐ Piso con pendiente.	☐	☐	☐	☐ Cocina con baldosa en parte superior.
2 HUMEDADES	☐	☐ Muro patio con humedad.	☐ Piso patio con fisuras.	☐	☐	☐	☐ No tiene llave de agua
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ Muro dilatado baño exterior.	☐	☐	☐	☐	☐ Tanque con fisuras y filtraciones.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐		☐	☐	☐	☐	
5 OTROS	☐		☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	NOTA: No se permitió acceso a la habt. 1, 2 y 3.						No tiene lavamanos.

FIRMAS

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Sibilina Cardozo
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Sibilina Cardozo
C.C. O NIT: 47433091

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés Lopez

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

212

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 028	PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 25 MM 11 AA 2023	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023	
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023	
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.	


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS





PAREDES



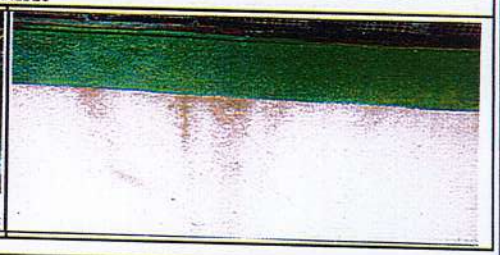

TECHO





BAÑO





OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Sibilina Cardozo
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47433091

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

214

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 029

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

[ ] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 25 MM 11 AA 2023.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

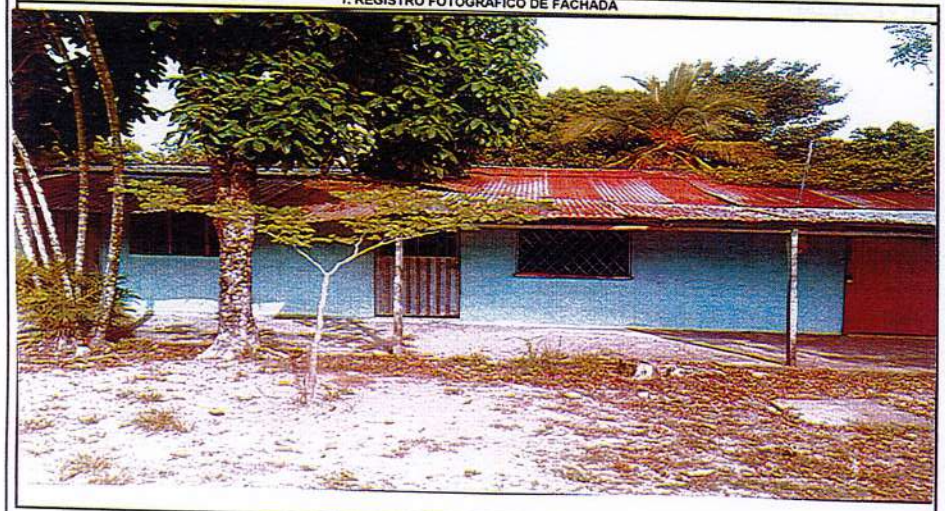

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Vargas

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Jose Vargas

Cédula de Ciudadanía: 9.655.110

Dirección:

Teléfono:

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] Cuál? URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	[ ] Anden fisurado.	[ ] Fisura parte superior	[ ] Habt. 1 piso	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] Baldosas lavaplatos
2 HUMEDADES	[ ] Dilatación muro	[ ] habt. 1 ventana.	[ ] baldosa.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] no tals.
3 HUNDIMIENTOS	[ ] y teja	[ ] Dilatación muro	[ ] Pisos con fisuras	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] Lavadero fisurado y
4 DESPLAZAMIENTOS	[ ] Grieta fachada	[ ] parte superior entrada	[ ] Piso habt. 1, 2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] confiltración de agua
5 OTROS	[ ]	[ ] pasillo.	[ ] y 3 con baldosa	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] Carpintería metálica
		[ ] Humedad habt. 3.					oxidada.
COMENTARIOS		fisuras muro habt 3.	Habt. 4 sin baldosa.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 9655110

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2415

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 029

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DD | MM | AA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA:


PISOS






PAREDES



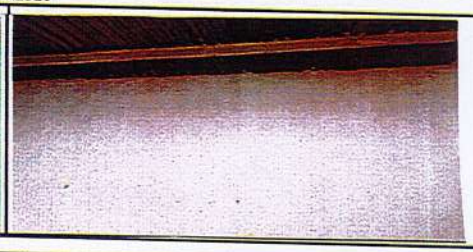


TECHO






BAÑO






OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



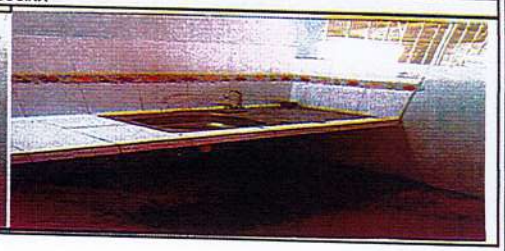

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 9655[illegible]0

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoria

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato.
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2216

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 030

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

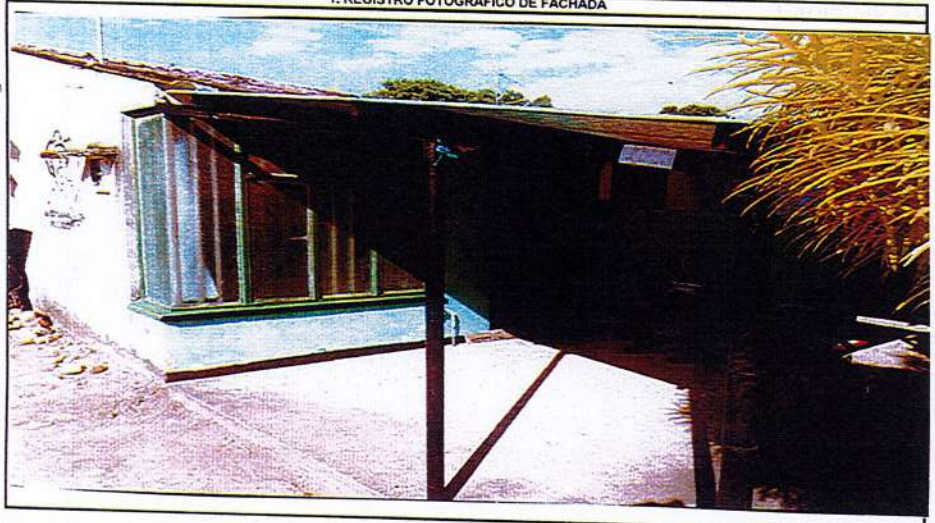

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Manguira

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Jose Manguira / Ana Lucia Manguira.

Cédula de Ciudadanía: 9432775

Dirección: Cra 3 #6-31

Teléfono: 3208582085

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Muro divisorio con grieta.	☐ Humedad en muros.	☐	☐ Humedad teja	☐ Acero expuesto viga puerta baño.	☐	☐ No se hace verificación de lavamanos por obstrucción de objetos.
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Carpintería metálica desgastada.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							humedad bajo tanque elevado.

FIRMAS

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Obra Social Manguira

C.C. O NIT 2032450472

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre: Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 030

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DD 27 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO

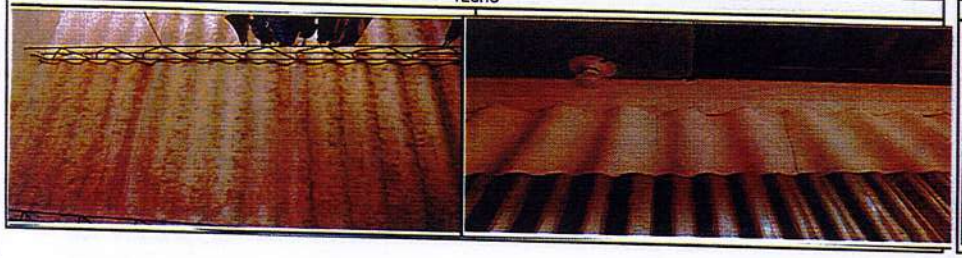


BAÑO

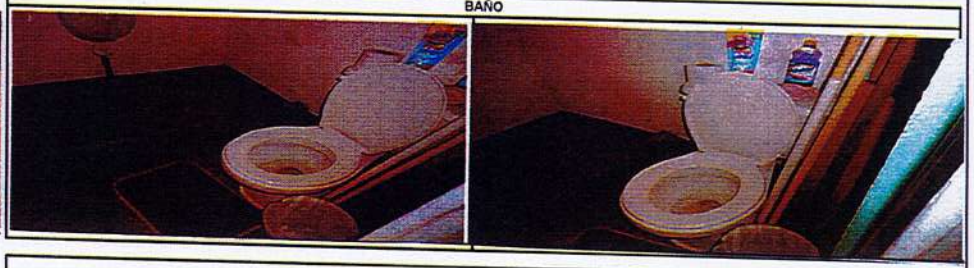

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C O NIT 47711044

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoria

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2218

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 031

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luz Mery Niño

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Luz Mery Niño

Cédula de Ciudadanía: 47.429.315

Dirección: Cra 3 # 6A-55

Teléfono: No tiene

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Hernando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris X Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐ Muros con humedad	☐ Piso Fisurado.	☐	☐ Acero expuesto viga Comedor	☐	☐ Baldosas cocina rotas
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐ Vigas ventana patio con grietas de arriba a abajo.	☐	☐ Carpintería metálica oxidada.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Ventana habt. sin vidrio.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							Tanque con filtrar, humedad y filtración de agua.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Luz Mery Niño
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 031	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

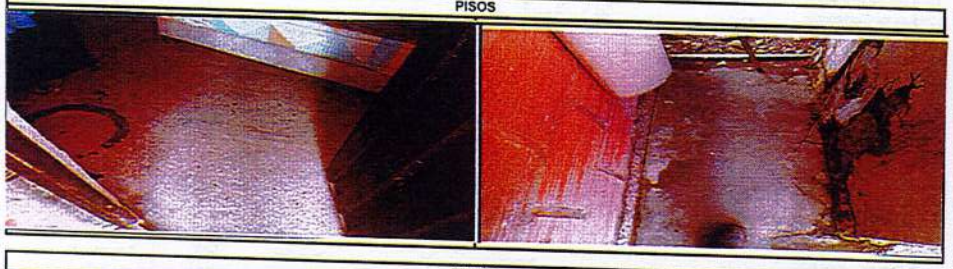

PAREDES

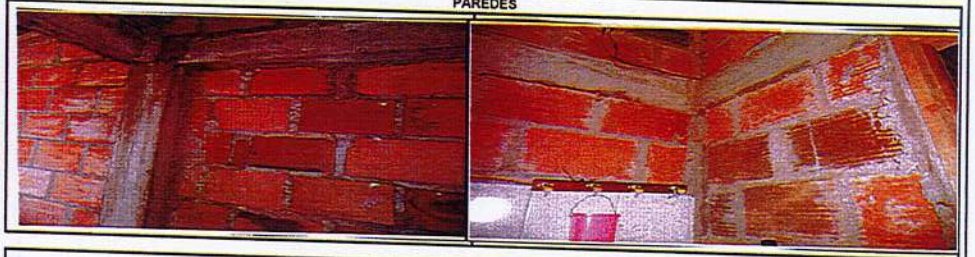

TECHO

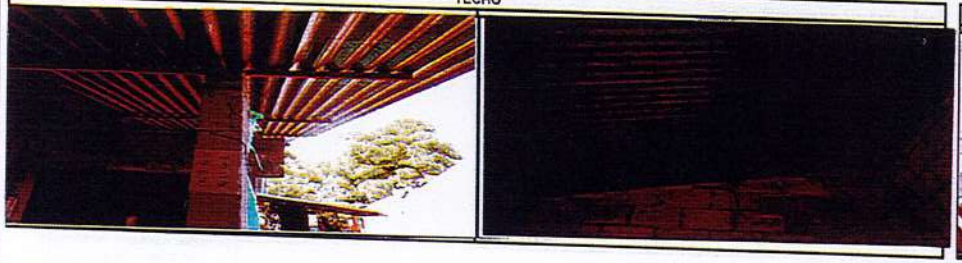

BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

*Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Luz Mery Niño
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Andrea López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista Interventor Poseedor

2220

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

ACTA N°: 032

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

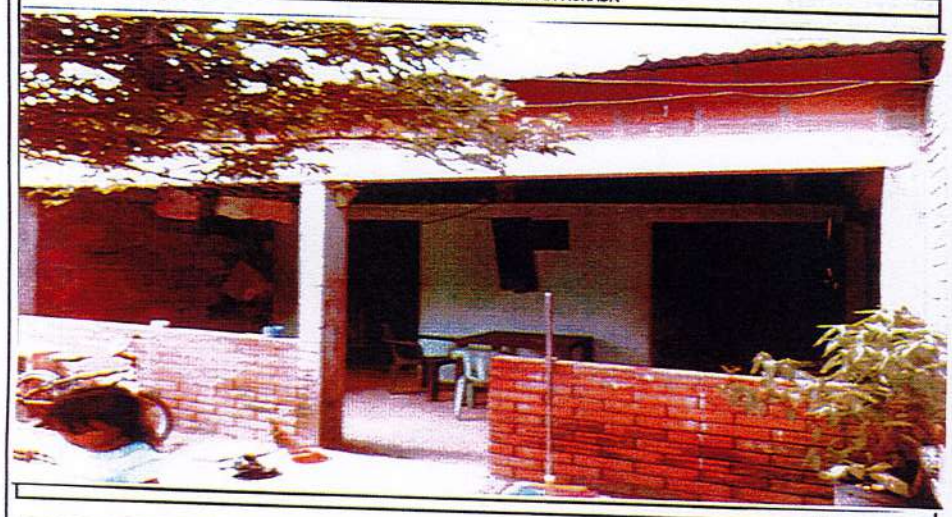

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Eva Sandra Nieves

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? Hermana

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía: 1003172722

Dirección

Teléfono: 3133493584

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	Tiene pozo séptico
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Columna con grieta	☐ Humedad muro cocina	☐ Piso con grietas	☐ Cubierta con humedad.	☐ Acero expuesto viga muro comedor.	☐	☐ Baldosas baño rotas
2 HUMEDADES	☐	☐ Muro habt. 4 con grieta y humedad	☐	☐ Separación muro y cubierta	☐ Columna puerta habt 1 deteriorada con acero expuesto	☐	☐ No tiene lavamanos.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐ Columnas desgastadas. Habt 2 separación entre viga y muro.	☐	☐ Carpintería metálica oxidada y carcomida.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐		☐	☐ Cocinas sin llave de agua
5 OTROS	☐	☐	☐	☐		☐	Baldosas cocina rotas
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Eva Sandra Nieves.

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 1003172722.

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la interventoría

Nombre Fabián López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2221

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 032

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO

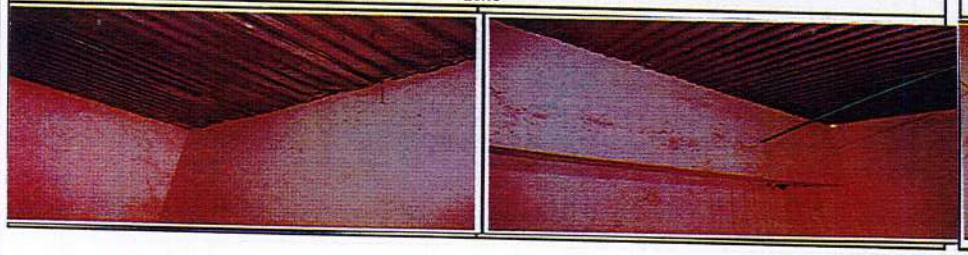

BAÑO

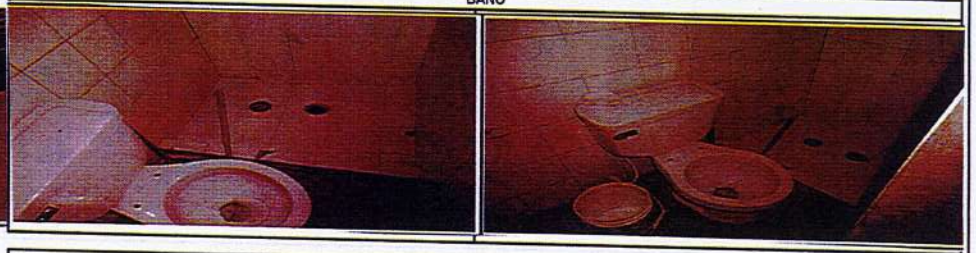

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Eva Sandra Nieblo.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1003172727.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2222

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 033

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 27 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yeimy Seija

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Nuevo

Nombre del Propietario: Luis Sarteaga

Cédula de Ciudadanía: 1.118.574.352

Dirección: Cra 3#6A-21

Teléfono: 3228535802

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Columna puerta con fisuras.	☐ Humedad muro baño	☐ Piso cocina con grietas	☐ Cubierta con	☐ Losa baño 2 con cielos	☐ Lavadero con	☐ Ventana y puerta
2 HUMEDADES	☐	☐	☐ Piso con fisuras.	☐ humedad.	☐ expuesto.	☐ humedad y	☐ sin vidrio.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐ Columna puerto patio	☐ filtración de agua.	☐ No tiene lavamanos
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐ con grietas.	☐	☐ instalado. baño 1
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Baño 2 baldosas rotas.
							☐ Carpintería metálica
COMENTARIOS							desgastada.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yeimy Seija Arias
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118574352

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2223

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 033	PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA	
		DD 27 MM 11 AA 2023	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

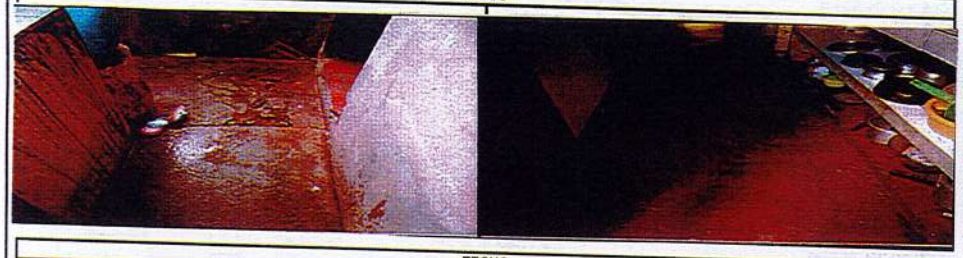


PAREDES

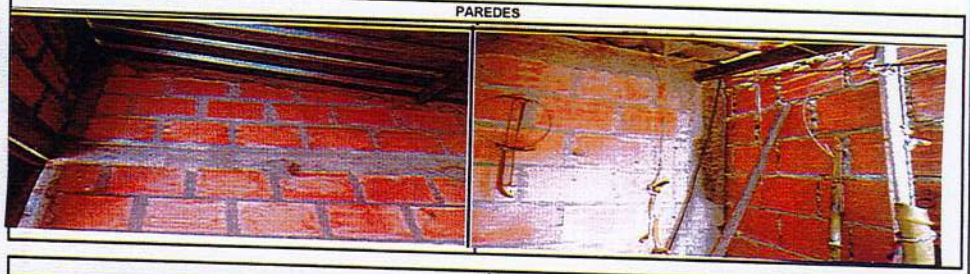

TECHO

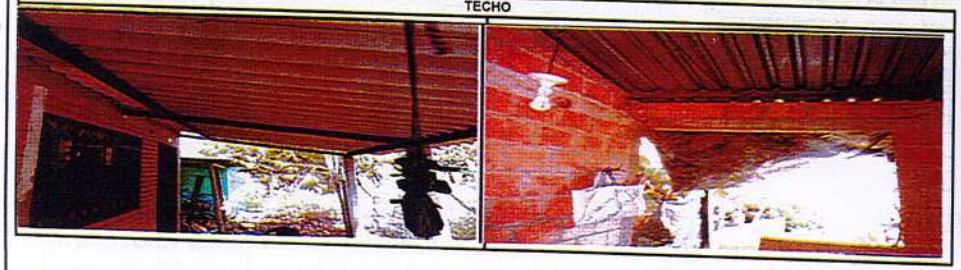

BAÑO

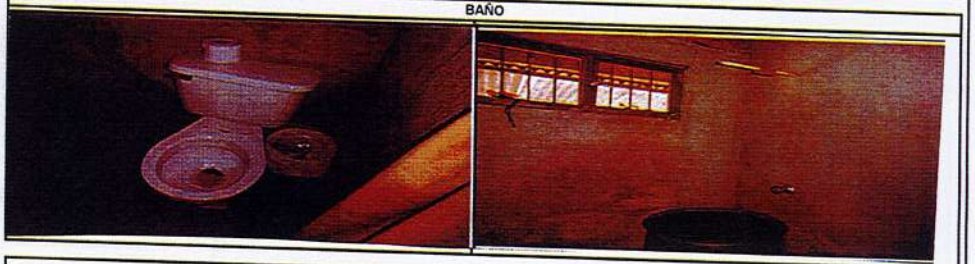

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yeimy Seija arias
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118554352

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 037	PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ingrid Sierra

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Yudy

Cédula de Ciudadanía: 1006840449

Dirección:

Teléfono: 3222580287

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		Pozo séptico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	Vidrio ventana roto	Humedad en muros	Piso en batiso	Separación entre cubierta y muro.	Vigas desportilladas y fisuradas	Baldosas tanque rotas	Pintura soplada
2 HUMEDADES	Fisuras muro parte	Pintura soplada.	Piso andén con grietas.		Columna patio con grietas.		Faltan baldosas ducha;
3 HUNDIMIENTOS	Fisuras en columnas						Filtración de agua lavaplatos.
4 DESPLAZAMIENTOS	Humedad de muros.						Baldosas con cuarteo
5 OTROS							Puerta baño social rota
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Ingry Sierra.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2225

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 034

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 27 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES




TECHO

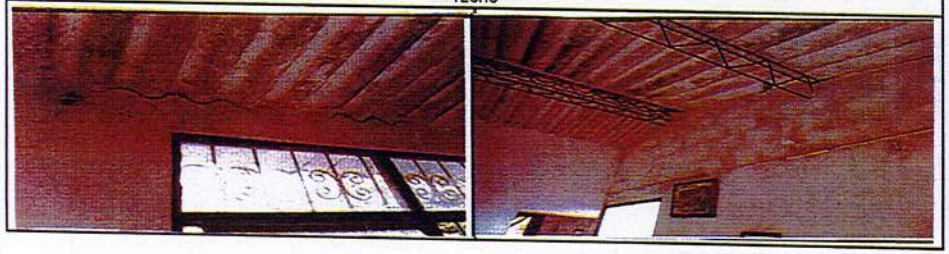

BAÑO



COCINA

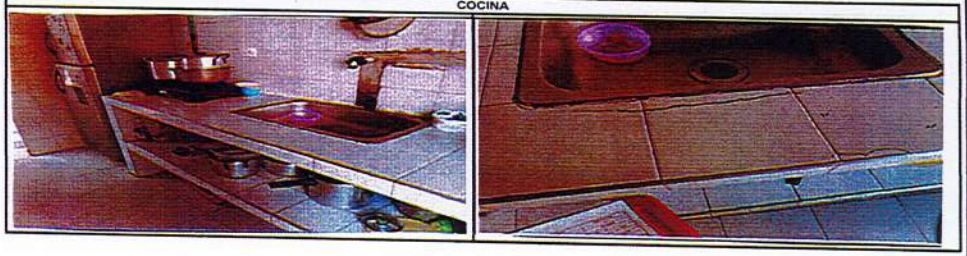

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

ingry sierra.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2226

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 035

Inicial	X	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 28 MM 11 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

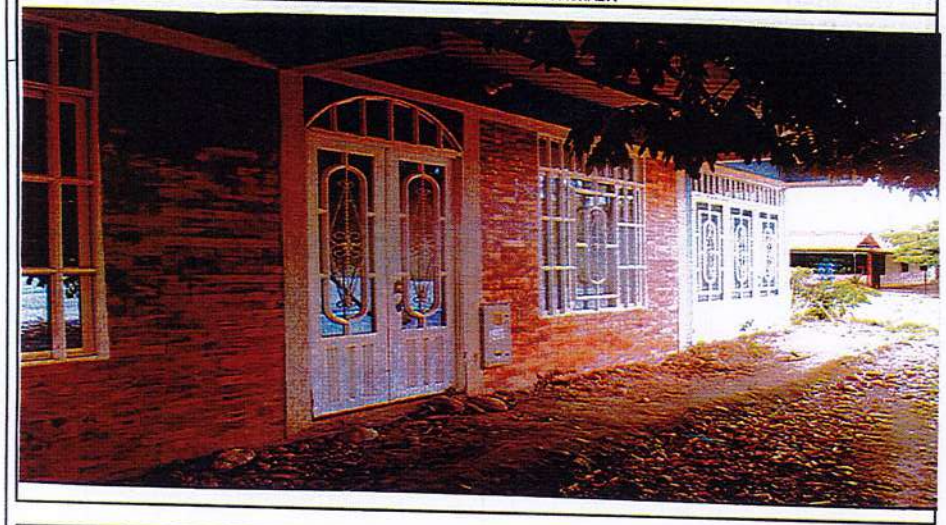

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carlos Seija Hernandez.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Ana Bertilde Univio

Cédula de Ciudadanía: 47433228

Dirección: Clle 6 # 3-25 D.

Teléfono: 3143023345.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Fisuras en 2 y 3ra columna fachada lateral	☐ Habt 2 con fisura (grieta) esquina superior.	☐ Piso con baldosas completas	☐ Separación muro y cubierta.	☐ Viga sobre tanque con grietas y acero expuesto	☐	☐ Marco puerta patio separado de la columna.
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐ Marcos ventanas oxidados.	☐ Fisuras muro cocina junto a maro puerta	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐ Humedad muros fachada trasera	☐ habt 1.	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS							
COMENTARIOS	No se accedió a la habt 1.	Fisura desde arriba hasta baldosa cama. Fisura de arriba a abajo muro puerta baño	Baldosa rota baño ducha. Fisuras finas en bordes ventana	muro sab grieta bombillo Grieta muro tras puerta garaje.			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carlos Seija Hernandez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1171122012

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2473

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 035	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 28 | MM 11 | AA 2023


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS

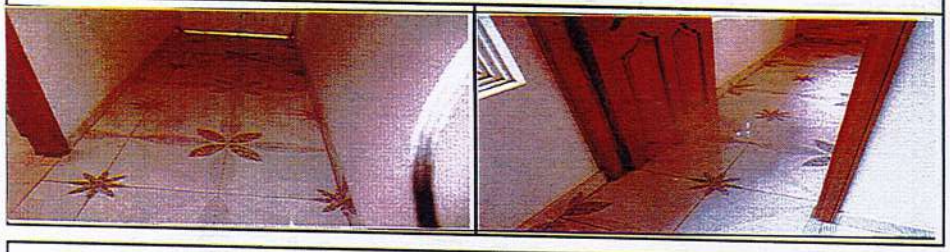


PAREDES

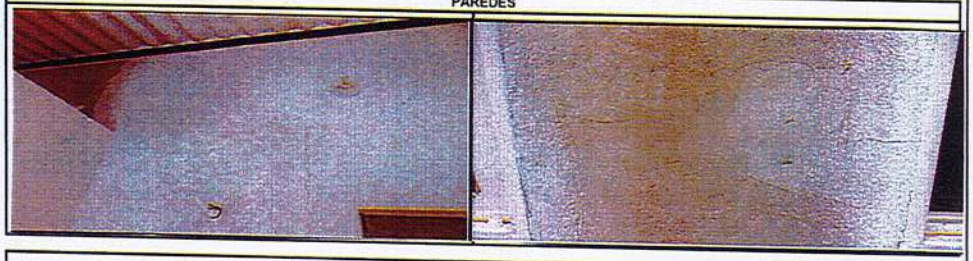

TECHO

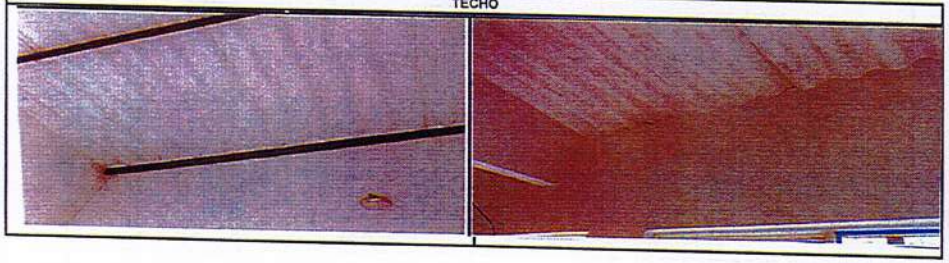

BAÑO

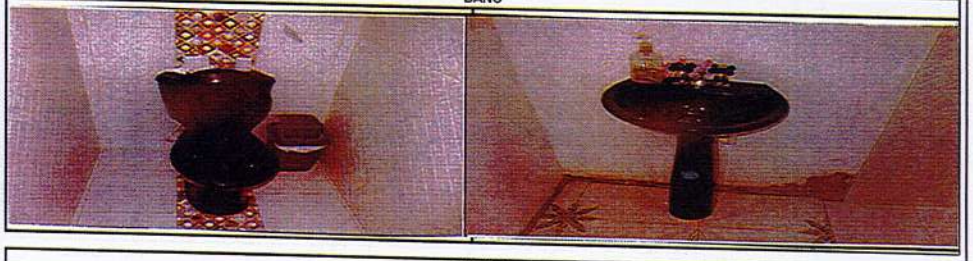

COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carlos Seijo Hernandez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1117132018

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre Alvaro Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestion del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2228

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 036

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 28 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Julio Alexander Herrera

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Julio Alexander Herrera.

Cédula de Ciudadanía: 74.851.778.

Dirección: Cra 4 # 54-55

Teléfono: 3102102287

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: Las Villas.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6, Televisión cable		X
7, Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldio	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Andén con grietas	☐ Grieta muro sala-comedor.	☐ Piso en baldosa	☐ Cubierta con	☐	☐ Tanque con	☐ Faltan baldosas
2 HUMEDADES	☐ Grieta unión casa de al lado.	☐ Humedad muro bajo	☐ A lo patio fisurado.	☐ humedad	☐	☐ humedad y	☐ baño 1.
3 HUNDIMIENTOS	☐ Pintura levantada.	☐ tanque elevado.	☐	☐	☐	☐ filtración de agua	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Julio H. Vega S.
C.C. O NIT 74851778

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Ambrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2224

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 036

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 28	MM 11		AA 2023		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES



TECHO

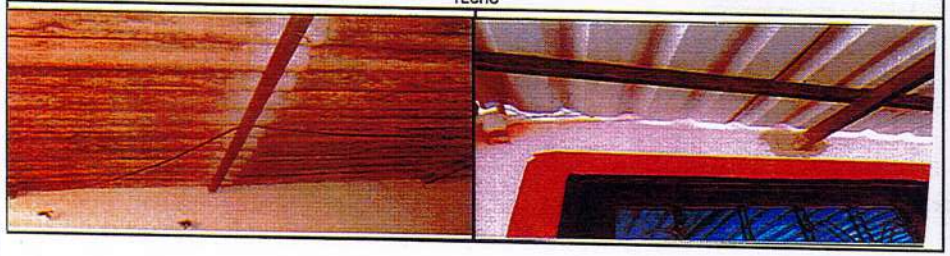


BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

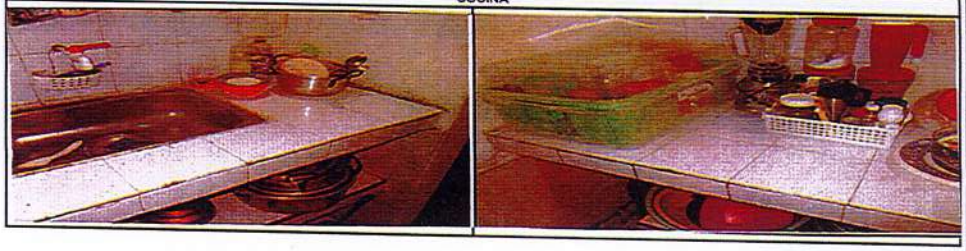

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT 7486178

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2230

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA	
DD 28	MM 11	AA 2023

ACTA N°: 037

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

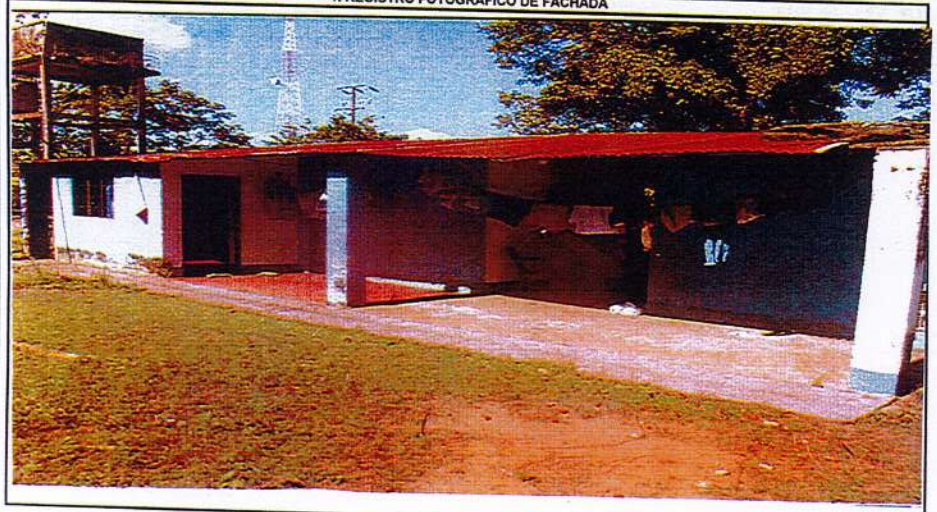

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Erika Gonzalez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Martha Lucia Castañeda

Cédula de Ciudadanía: 21.069.457

Dirección:

Teléfono: 3103037649

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	Tiene pozo profundo.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: NO

PENDIENTE DEL TERRENO: Sin edificar ☐ SI ☐ Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Muros con fisuras.	☐	☒ Piso concreto agrietado.	☒ Lamina de zinc	☐ Columna con grietas (Cubierta).	☒ Tanque en concreto con fisuras y filtracion de agua.	☒ Inodoro fisurado.
2 HUMEDADES	☒ Pintura soplada y descascarada.	☐	☐	☒ Separacion entre muro y cubierta.	☒ Columna esquina fachada con grieta.	☐	☐ Baño con humedad
3 HUNDIMIENTOS		☐	☐	☐	☒ Fisura junto viga maestra	☐	☒ No tiene llave
4 DESPLAZAMIENTOS	☒ Humedad en muros	☐	☐			☐	☐ lavaplatos.
5 OTROS	☐	☐	☐	☐		☐	☐
COMENTARIOS	No se permite acceso a la habt #2.				Viga puerta cocina con grieta. y columnas con fisuras. (una con grieta)		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Erika Gonzalez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1007[illegible]057

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrea López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2231

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 037

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 28 MM 11 AA 2023


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

PISOS




PAREDES

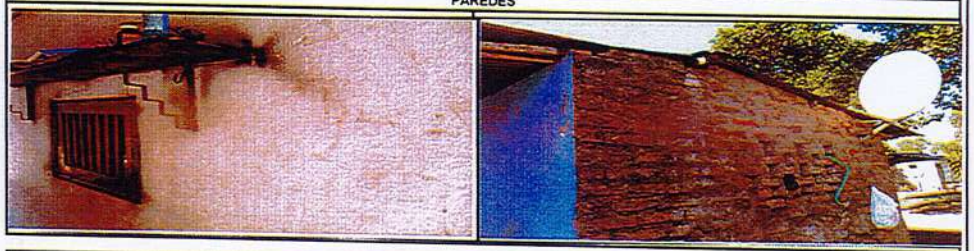

TECHO




BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

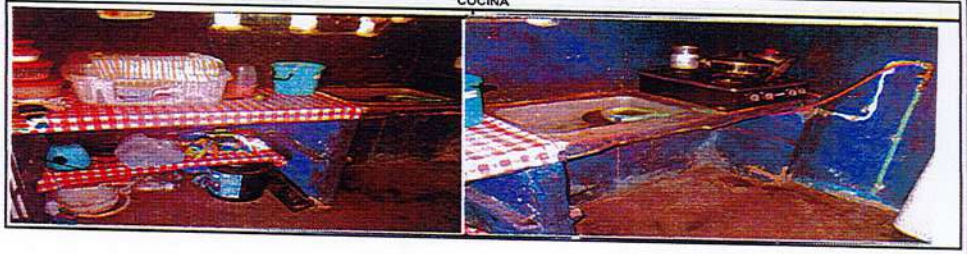

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Erika Gonzalez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1007709052

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2732

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	
DD 28 MM 11 AA 2023	

ACTA N°: 039

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nino Jorge Anibal

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Niño Jorge Anibal

Cédula de Ciudadanía: 4.762.039

Dirección: .

Teléfono: .

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6, Televisión cable		X
7, Otros		X

OBSERVACIONES: Tiene pozo profundo y pozo séptico.

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Andén con grieta	☐ Muros con fisuras.	☐ Piso ~~Cerro~~	☒ Eternit.	☒ Columnas portón con	☒ Cocina enchapada.	☒ Faltan vidrios portón
2 HUMEDADES	☐ parte concreto	☒ Muro salida habt	☐ concreto con	☒ Patio lámina	☐ grietas	☒ Tanque en concreto	☒ Carpintería metálica
3 HUNDIMIENTOS	☒ Andén enchapado	☐ #3 con grietas.	☐ grietas	☐ zinc.	☒ Viga con grietas ventana	☐ Con fisuras y	☐ Oxidada y corroida.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☒ Muro cerramiento	☐ Habt 1 pro	☒ Baño y habt	☐ cocina.	☐ filtración de agua.	☐
5 OTROS	☐	☐ sala con grieta.	☐ enchapado.	☐ separadas #1	☒ Columna muro divisorio	☐	☐
			☒ Habit. a parte	con cielo raso.	patio fisurado.		
COMENTARIOS		Muros con humedad.	enchapadas.		* Pisos expuesto viga habt. 1		
					* Columnas entrada habt separadas enguadas.		

FIRMAS

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

x Jorge Anibal Niño

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: ___

C.C. O NIT X

Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoría

Nombre Andrés Lopez

Testigo

Nombre ___

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2333

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 039

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 28 MM 11 AA 2023


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS




PAREDES

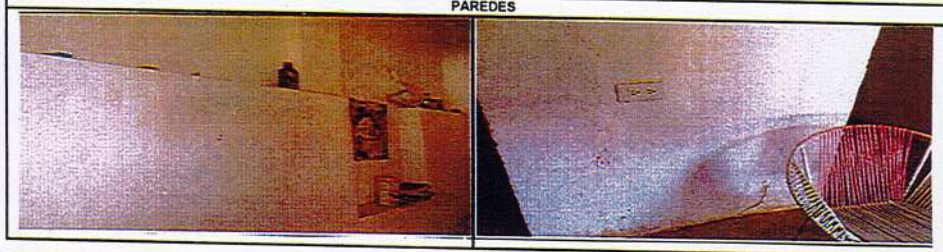

TECHO

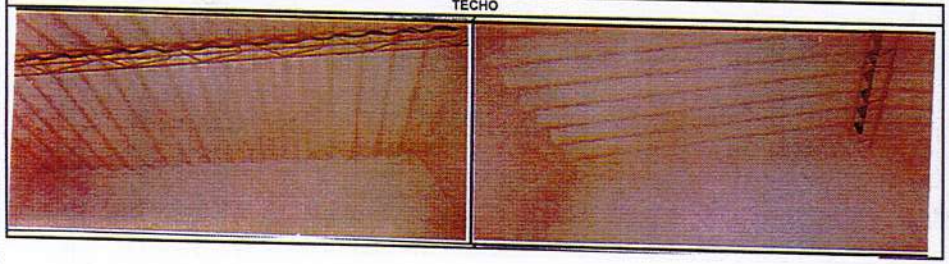

BAÑO

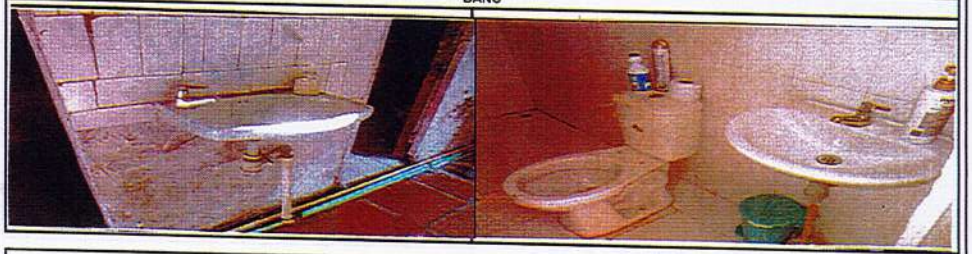

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2734

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 040

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

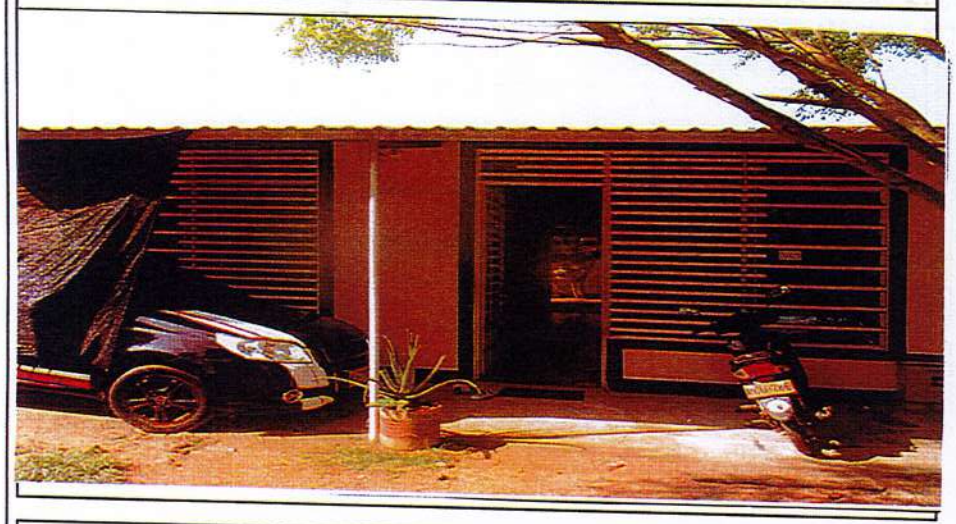

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Olga lucia Figueredo

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Olga lucia Figueredo

Cédula de Ciudadanía

Dirección: Cra 4 # 24-39

Teléfono: 3232753015

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No de pisos: 1 Barrio: Las Villas.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐ Piso anden fisurado	☐ fisura borde ventana	☐ Piso enchapado	☐	☒ Columna fracturada	☒ Tanque elevado.	☒ Falta baldosas muro
2 HUMEDADES	☐	☐ cocina exterior.	☐	☐	☐ puerta habt. 2.	☒ Tanque en concreto	☐ mesón cocina
3 HUNDIMIENTOS	☐	☒ Humedad muro	☐	☐	☒ Fisura placa tanque	☐ con fisuras, humedad	☒ Carpintería
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ baño	☐	☐	☐ elevado.	☐ y filtración de agua.	☐ metálica desgastada
5 OTROS	☐	☒ Humedad muros patio	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS		x Fisuras bordes ventana habt #2.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Olga lucia Figueredo
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118557957

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2235

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 040

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 29 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES

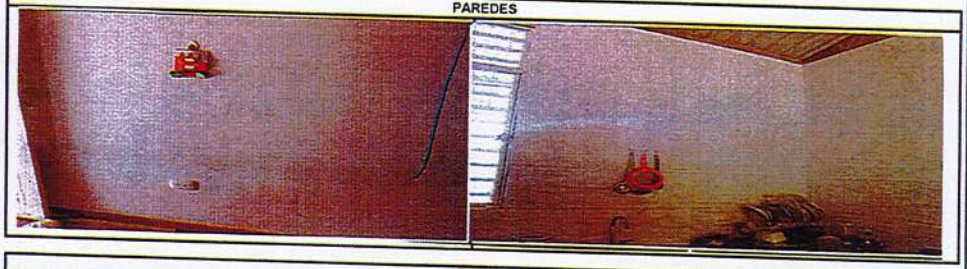

TECHO

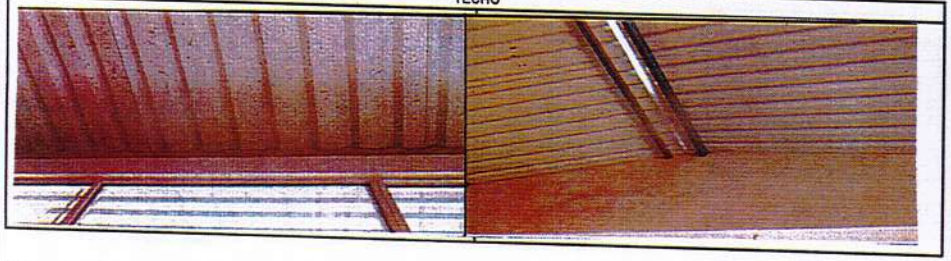

BAÑO

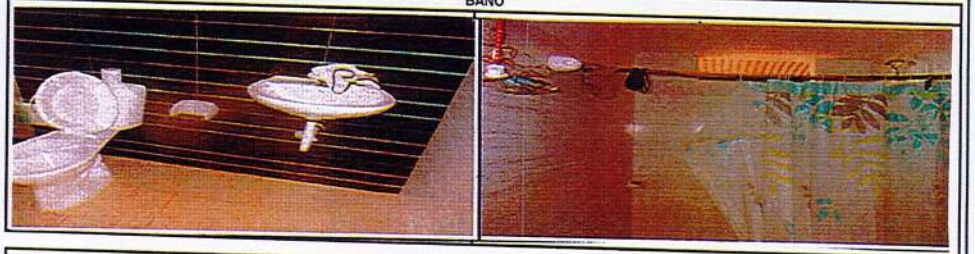

COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

dga Lucia Figueredo
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118559951

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2236

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 041

Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Joly Carolina Caro Gonzalez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Joly Carolina Caro Gonzalez.

Cédula de Ciudadanía: 1.118.536.824

Dirección

Teléfono: 321 453 4143.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos ___ Barrio: Las Vilas

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] Cuál? URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	X Piso andén grietas.	X Fisuras borde ventana	X Piso enchapado	X Cobierta en	X Grieta columna puesta	X Tanque en cemento	X Habt 1 con alfaecord.
2 HUMEDADES		X Fisuras muros Sala - comedor.	X Piso patio en concreto.	2 Inc con humedad	principal	con fisuras.	X Inodoro sin tapa
3 HUNDIMIENTOS		X Humedad muro habt 1		X Habt 1 con	X Columna exterior habt	Ladrillo	tanque.
4 DESPLAZAMIENTOS		X Grietas muro pasillo		cielo raso	#3 con grieta.		
5 OTROS		habitaciones.			X Viga habt #3 y pasillo fisurada.		
COMENTARIOS		X Fisuras muro armario habt #1.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Yuli Caro
C.C. O NIT 1185536824

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2374

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 041	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA		
DD 29	MM 11	AA 2025

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES



TECHO

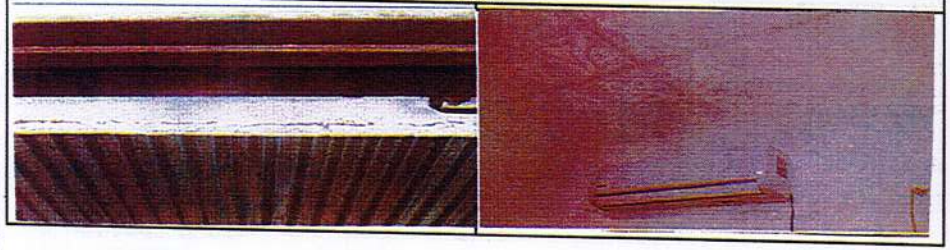

BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yuli Caro

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 1118536824
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

238

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 042

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

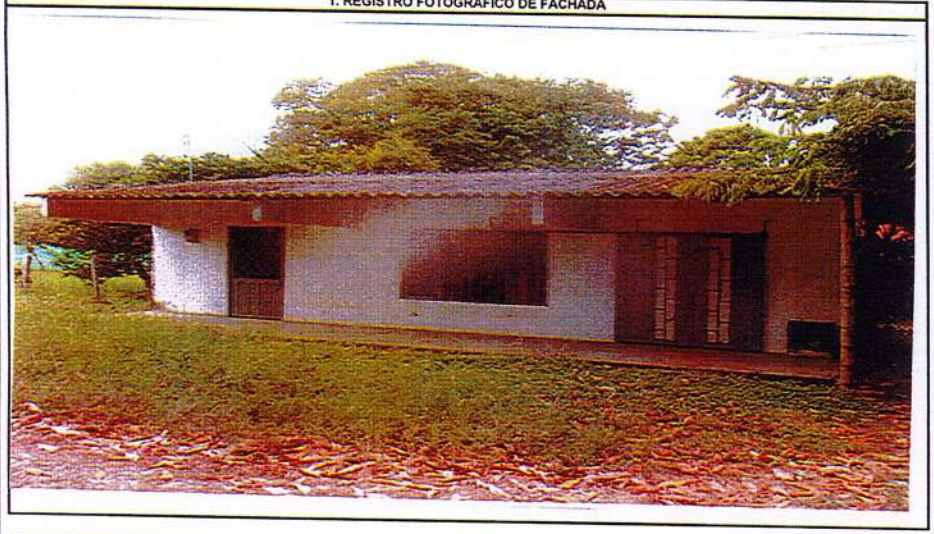

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Magdalena Perez.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Magdalena Perez.

Cédula de Ciudadanía: 23239458

Dirección: Cra 4#4-37

Teléfono: 3112966318

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6, Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Tiene pozo séptico

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Piso con grietas	☒ Humedad.	☒ Habt1 con baldosa	☒ Cubierta en	☒ Columna fachada	☒ Tanque con fisuras.	☒ Cerramiento en
2 HUMEDADES	☒ Fisuras fachada.	☒ Muro frente puerta	☒ Piso con grietas.	☐ eternit con	☐ esquina 129. con grieta.	☒ Tanque elevado.	☐ guadua.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐ garaje con grietas.	☐ Piso fuera baño	humedad.	☒ columna habt1 con	☒ Placa tanque	☒ Baldosas cocina
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☒ Pintura levantada	☐ con hundimiento	☐	☐ fisura.	☐ elevado con grietas	☐ rotas.
5 OTROS	☐	☒ Muro junto al baño	☐	☐	☒ Viga "garaje" con	☐ (No es plástico,	☒ Carpintería metálica
		agrietado (casi por caer) * Muros horno			☐ grietas.	fadillo.	baño oxidada y
COMENTARIOS		* Muro ventana habt4 con grietas, y	descascaramiento		x Habt 3 grieta muro		corroida.
		y muro contiguo con grietas.			detrás puerta. y		* Vidrio puerta habt4
					mismo muro en la		roto esquina.
					mitad.		
					* Columnas kiosko con acero		
					expuesto y con fisuramiento.		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD.

FIRMAS

Magdalena Perez

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT.

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2334

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 042

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 29 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO

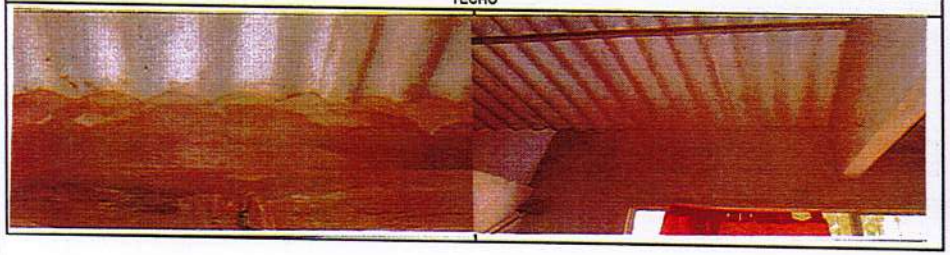

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2410

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 043

PAGINA 1 DE 1 — Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

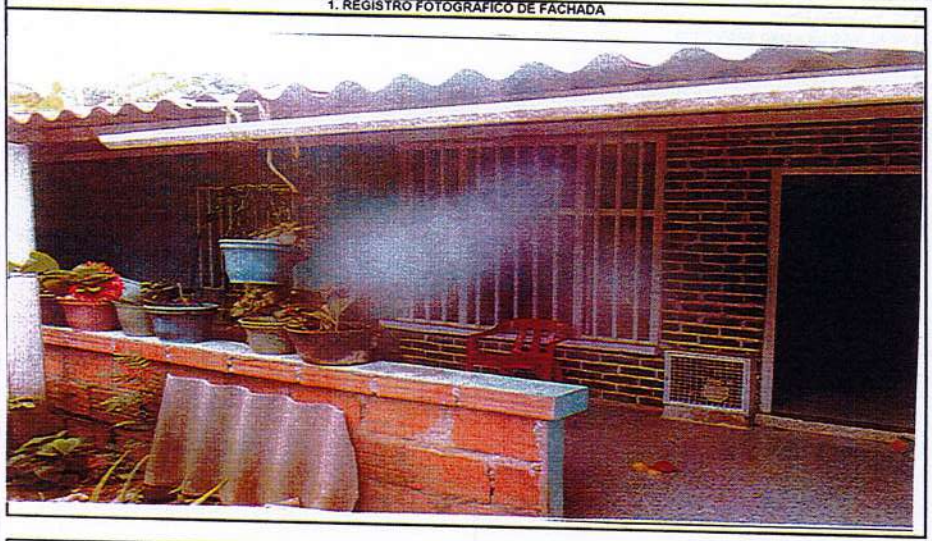

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ana Rosa Socha

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ana Rosa Socha

Cédula de Ciudadanía: 1.115.564.590

Dirección: Cra 4 # 5A-25

Teléfono: 311 530 3282

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Las Villas

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	Tiene pozo septico.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, pasaderos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Cerramiento con fisuras.	☒ Humedad.	☒ Piso enchapado	☒ Cubierta eternit	☒ Viga paño con acero	☒ No tiene lavaderos	☒ Carpintería metálica
2 HUMEDADES	☐	☒ Muro hab 1 fisura	☒ Piso concreto	☐ y lámina zinc	☐ expuesto	☒ Lavadero con humedades	☐ desgastada.
3 HUNDIMIENTOS	☒ Pintura soplada	☐ de lado a lado.	☐ fisurado	☐	☐	☐ fisuras y filtración de agua	☒ Baldosas mesón
4 DESPLAZAMIENTOS	☒ Vidrio roto.	☐	☒ Piso baño descascarado.	☐	☐	☒ Tanque elevado.	☐ rotas
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐		☐
COMENTARIOS							

FIRMAS

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Ana Rosa Socha
CC. O NIT 1115564590

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre: Diosdado Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

1742

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 043

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 29 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO




BAÑO

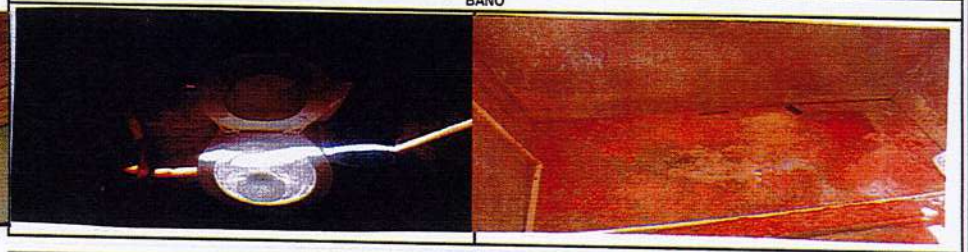

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

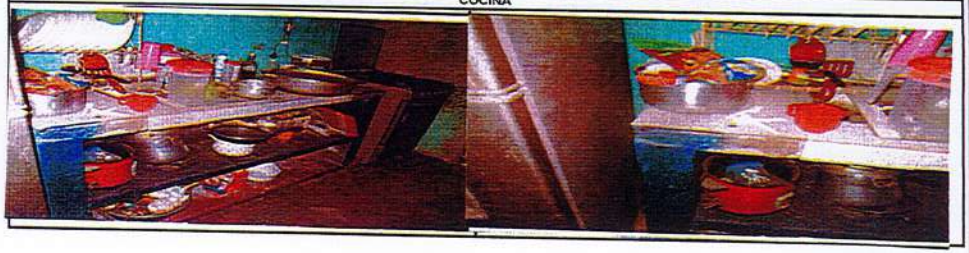

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Ana Rosa Sachi
C.C. O NIT 1118564390

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato.
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2742

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 044

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 29 | MM 11 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yadira Zamudio.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: María Edelmira. Gimenez.

Cédula de Ciudadanía: 29746158.2.

Dirección: Mza 19 lote 11 casa 2.

Teléfono: 311 2 7c 5093.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1. Barrio: Las Villas.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Cerramiento de madera y malla.	☒ Muro cocina y baño con humedad.	☒ Piso habt. y cocina en baldosa	☒ Cubierta en zinc.	☒ Columna puerta baño con grietas.	☒ No tiene lavadero	☒ Cocina con baldosa.
2 HUMEDADES	☐	☐	☐ Piso con grietas.	☐	☒ Columna parte trasera baño con grietas	☒ Tanque prefabricado	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☒ Tiene tanque elevado.	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yadira Zamudio

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Yadira Zamudio

C.C. O NIT 1118533021

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ Z

Representante de la Interventoría

Nombre: Jessica López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2743

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 044

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS

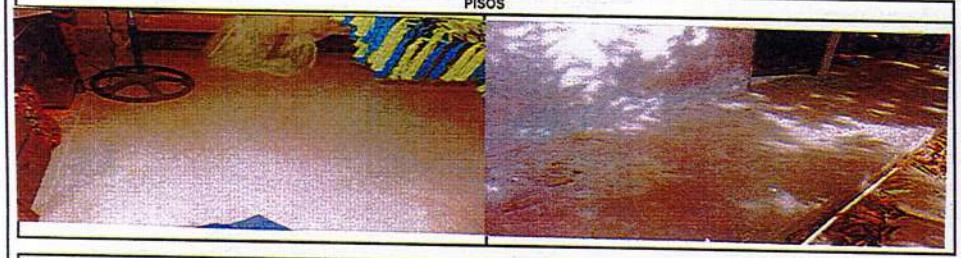


PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yadira Zamudio

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Yadira Zamudio

C.C. O NIT 1118335021

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre Andres López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2444

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA Nº: 045	PAGINA 1 DE 1	Inicial / Seguimiento / Cierre


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 29 | MM 11 | AA 2023.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

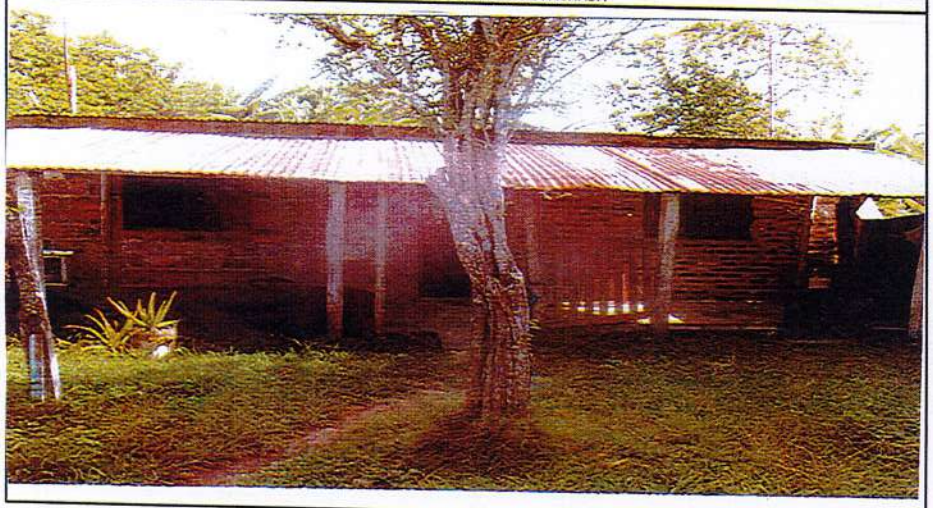

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yadira Zamudio
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: María Edelmira Jimenez
Cédula de Ciudadanía: 39746158
Dirección:
Teléfono: 3112725583
Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran Np de pisos: 1 Barrio: Las Villas.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Cerramiento en madera y malla.	☒ Grieta muros tanque (de lado a lado)	☒ Piso con fisuras	☒ Cubierta de zinc.	☒ Tiene vigas deguadia	☒ No tiene lavanderia	☒ Mesón enchapado
2 HUMEDADES	☐	☐	☒ Piso baño enchapado.	☐	☒ Columna puerta patio fisurada.	☒ Tanque con baldosa.	☐ con baldosas despar-tadas.
3 HUNCIMIENTOS	☒ Piso entrada con grietas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yadira Zamudio
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Yadira Zamudio
C.C. O NIT 47435521

Representante del Contratsita de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Sht 2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 045

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 29 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS

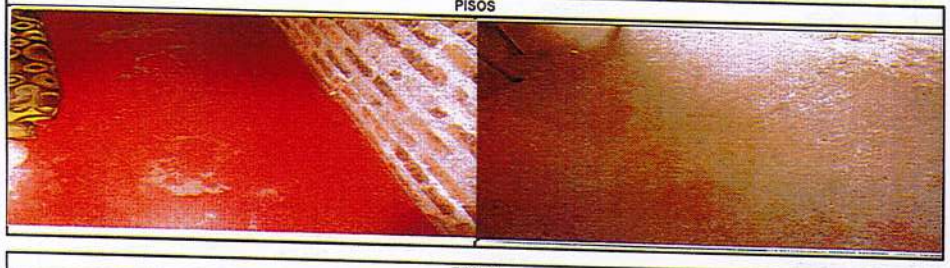


PAREDES



TECHO

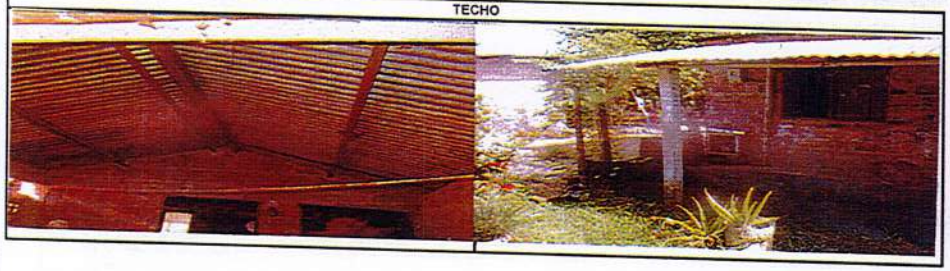


BAÑO

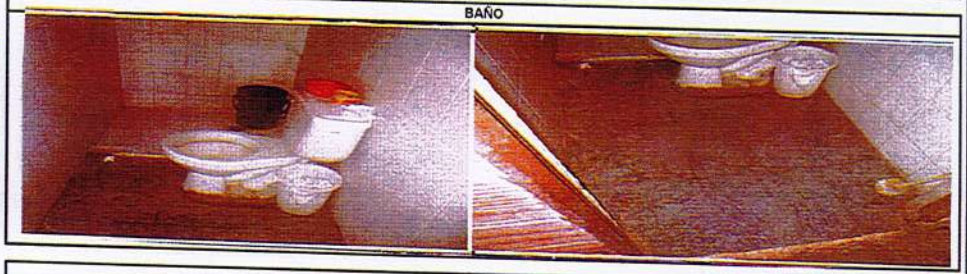

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

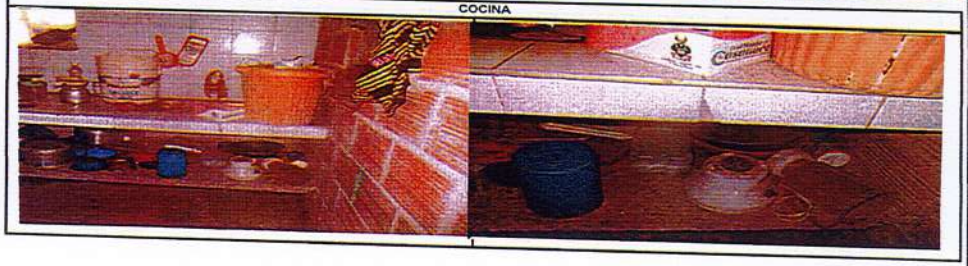

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yadira Zamudio
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Yadira Zamudio
C.C. O NIT 1118535021

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2446

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 046

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 30 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

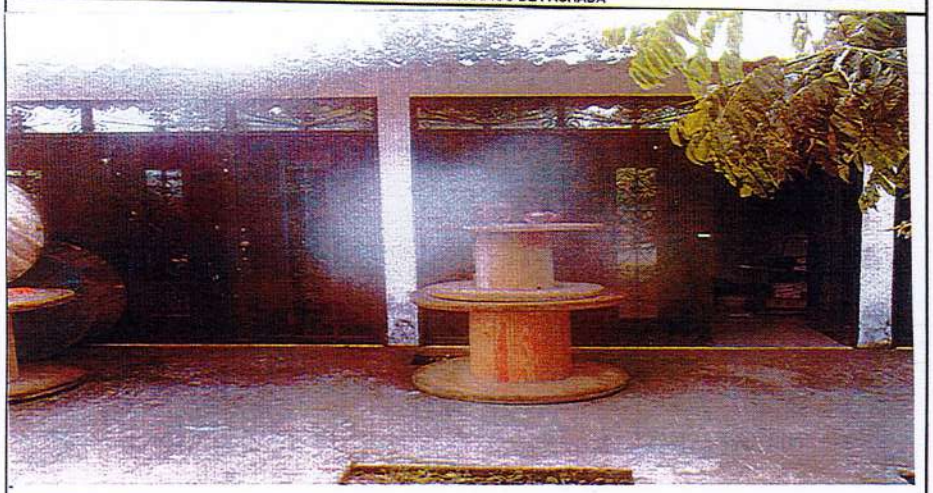

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Cristina Salazar

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario: Cristina Salazar

Cédula de Ciudadanía: 47479409

Dirección:

Teléfono: 310 222 1596

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Columnas fisuradas	☒ Humedad muro garage #1.	☒ Piso enchapado	☒ Separación	☐	☒ Tanque con humedad.	☒ Baldosas muro cocina rotas.
2 HUMEDADES	☒ Falta vidrio puerta	☐	☐	☐ Cubierta - muro.	☐	☐	☒ Baños enchapados.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☒ Fisura de arriba-abajo muro habt 1.	☐	☒ Cubierta eternit con humedad	☐	☐	☒ Carpintería metálica desgastada.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☒ Fisura muro esquina ventana habt. 1.	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Nota: No se accedió al patio (Tenía candado)						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Cristina Salazar

C.C. O NIT: 47479409

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO RUEZ

Representante de la Interventoría

Nombre: Pedro López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

274

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 046

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DD 30 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS

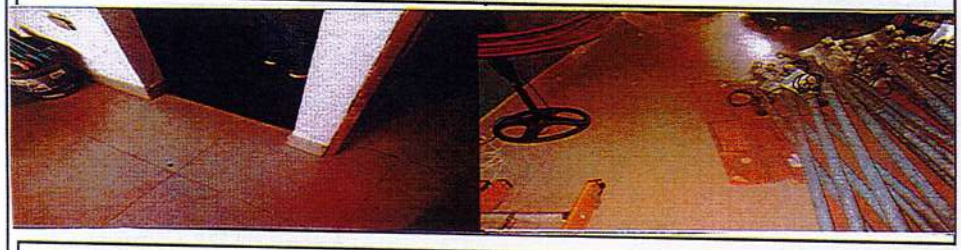


PAREDES

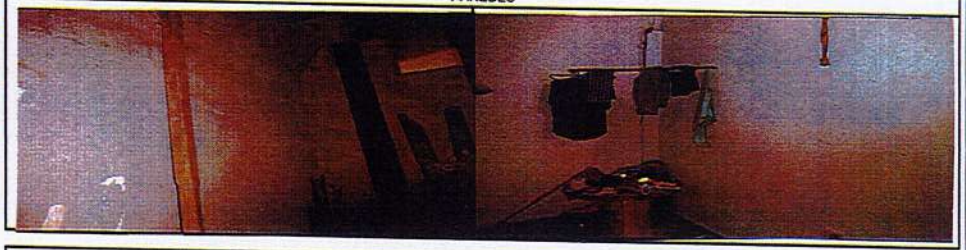


TECHO

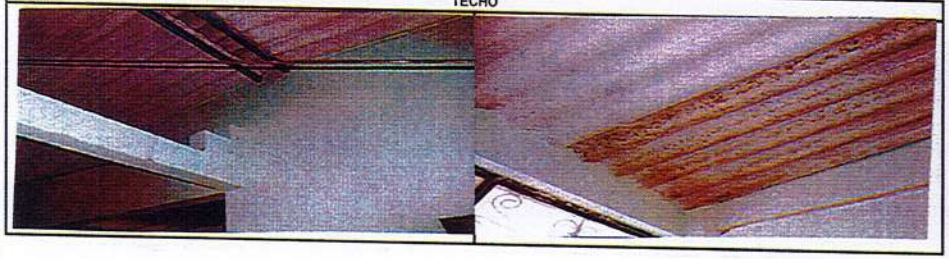

BAÑO



COCINA

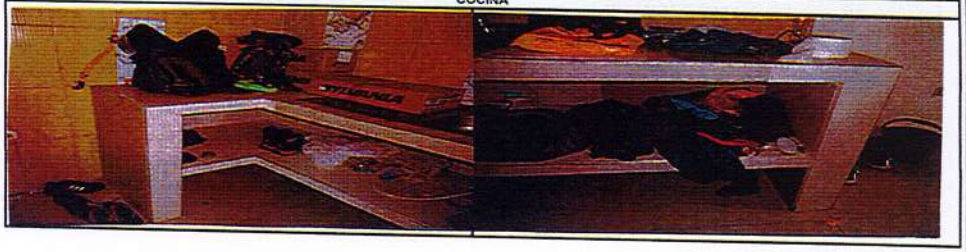

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1.074.184.009

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2348

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 047

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 30 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

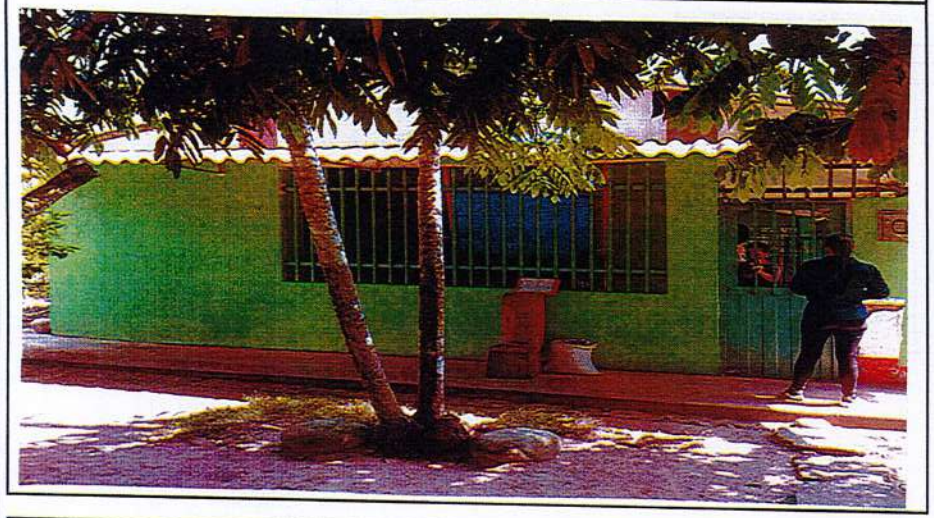

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Ricaurte Molina

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Jose Ricaurte Molina.

Cédula de Ciudadanía: 9.654.203.

Dirección: Mz. 6 Lt 10.

Teléfono: 3214851452

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ___ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Anden fisurado y agrietado.	X Grietas muro sala.	X Piso con grietas	X Cubierta eternit con humedad	X Viga habt aparte con grieta y columna fisurada	X No tiene lavamanos.	X Carpintería metálica desgastada.
2 HUMEDADES		X Grietas pequeños muro ventan. habt #1	X Habt aparte con piso en baldosa			X No tiene lavaplatos.	X Baño enchapado.
3 HUNDIMIENTOS	X Muro deteriorado	X Pintura descascarada				X Tanque con fisuras y humedad.	
4 DESPLAZAMIENTOS	X Grieta borde ventana	X Grieta muro habt #1 sala.					
5 OTROS	muro						
COMENTARIOS		X Grieta muro afuera habt #2. X Grietas borde ventanas pasillo	X Muros baño con humedad. X Grieta muro cocina puerta.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jose Ricaurte Molina
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Jose Ricaurte Molina
C.C. O NIT 9654203

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2494

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 047

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 30 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS

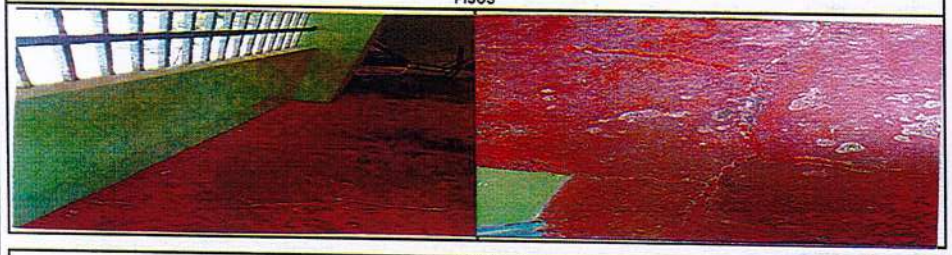


PAREDES



TECHO

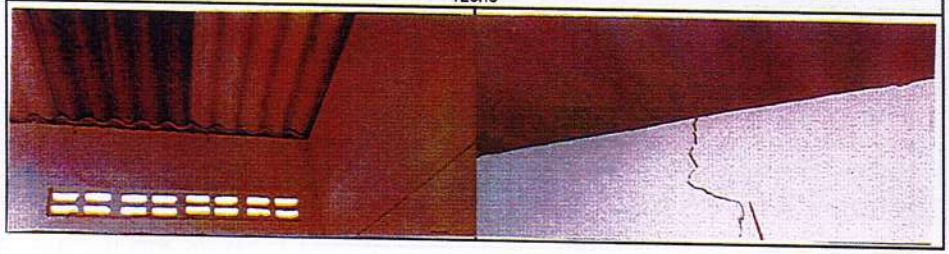


BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

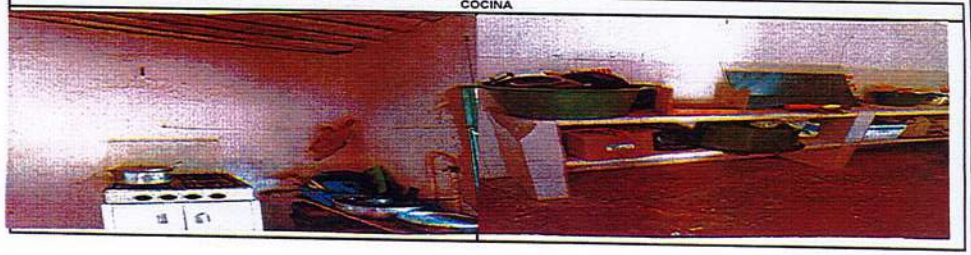

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Jose Ricardo Molina
C.C. O NIT 96124203

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2750

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐	
FECHA	
DD 30 MM 11 AA 2023	

ACTA Nº: 048

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

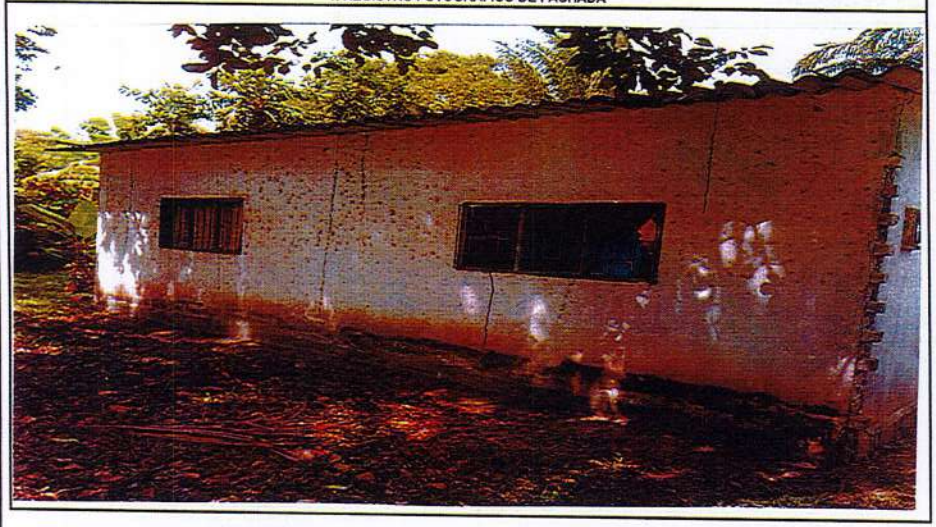

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Omar Ricardo Gratiboria A.

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario X Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Omar Ricardo Gratiboria A.

Cédula de Ciudadanía: 1.047.530.933

Dirección: Casa 104 Tilodiran

Teléfono: 350.512.2023

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	☐	X	Pozo séptico.
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris X Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Fisuras finas	X Fisuras finas habt	X Piso con grietas y	X Cubierta eternit	X Vigas fuera habt. en madera	X Tanque elevado	X Carpintería metálica
2 HUMEDADES	X Ventanas sin vidrio.	☐ #3.	☐ descascaramiento	☐	X Columna habt #1 deteriorada.	☐ en ladrillo.	☐ desgastada y oxidada
3 HUNDIMIENTOS	☐	X Pintura soplada.	☐	☐	X Hay columnas enguadro	X Tanque con humedad	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	X Muros baño con	☐	☐	☐ y vigas de madera.	☐ y filtración de agua.	☐
5 OTROS	☐	☐ humedad	☐	☐	X Columnas despoltilladas	☐	☐
COMENTARIOS	Nota: No se permitió acceso habt #2				* Columnas puerta cocina deterioradas.		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

1002645527

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

1 de 2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 048

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 30 MM 11 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

PISOS

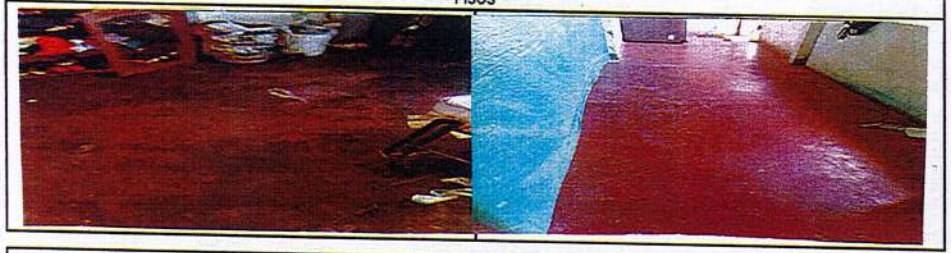


PAREDES

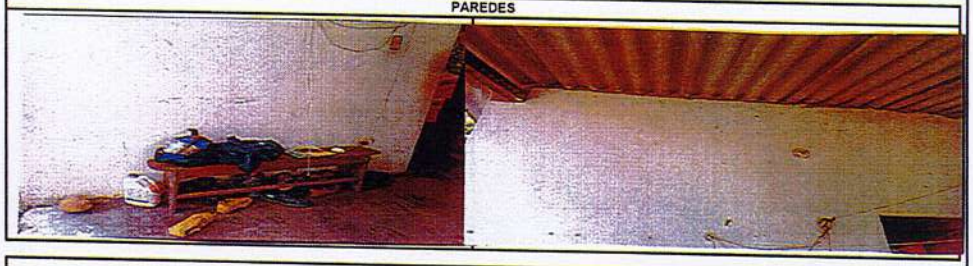

TECHO




BAÑO

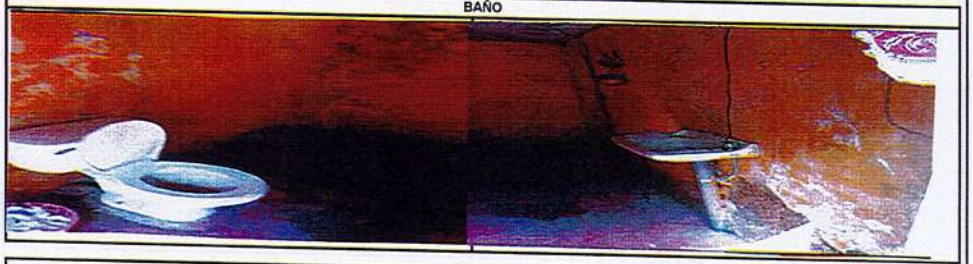

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

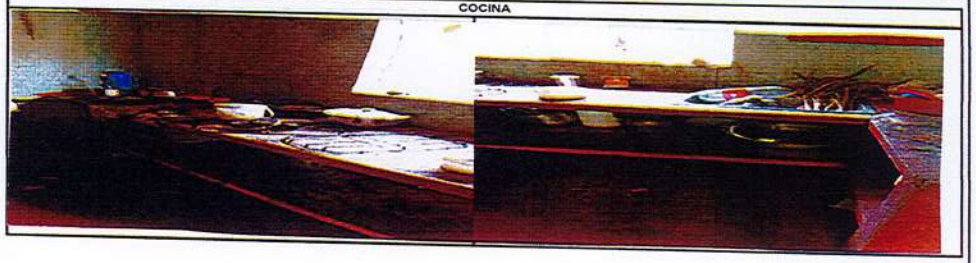

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

1002645527

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2752

8.6.17 ACTAS DE VECINDAD PERIODO DICIEMBRE 2023

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 049

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

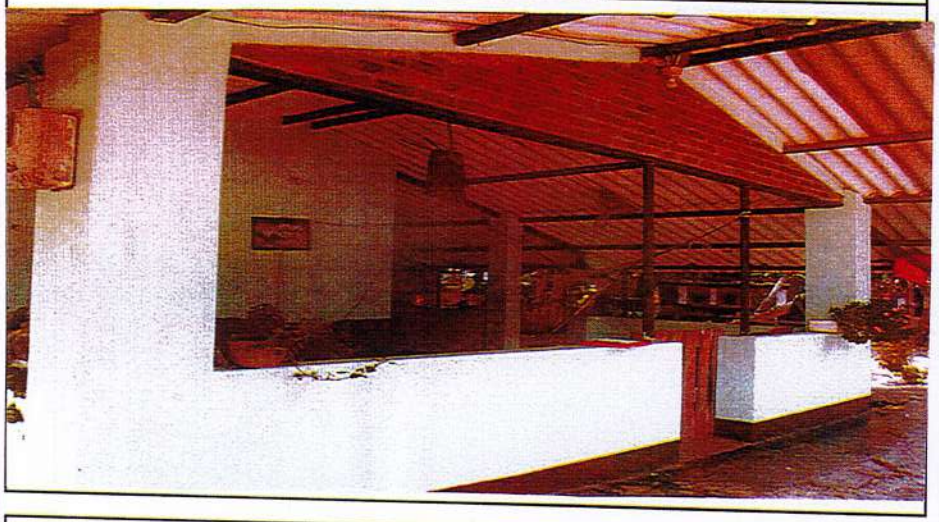

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Lizeth Pana

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Edilma González

Cédula de Ciudadanía

Dirección

Teléfono: 3155460538

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Tiene pozo profundo.

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cual? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris X Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	X Muro fachada lateral con fisura.	X Muro habt #1 con ladrillo a la vista.	X Piso con grietas y descascaramiento	X Cubierta eternit	X Columnas y vigas metálicas	X Lavaplados con grietas.	X Estructura a parte con grietas, humedad (abandonada).
2 HUMEDADES	X Cerramiento en madera y alambre	X Pintura descarcarada habt #2.		X Fisura borde habt #1 y #2.	para abertela.	Tanque con fisuras, humedad y filtración de agua.	
3 HUNDIMIENTOS		X Muro habt # con ladrillo a la vista				X Tanque elevado.	
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
COMENTARIOS		* Muros baño con humedad				* Fisuras en lavamanos.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118565446.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2454

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 049

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

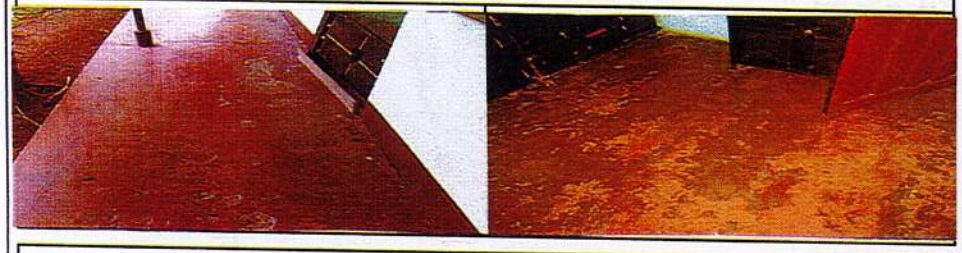


PAREDES



TECHO

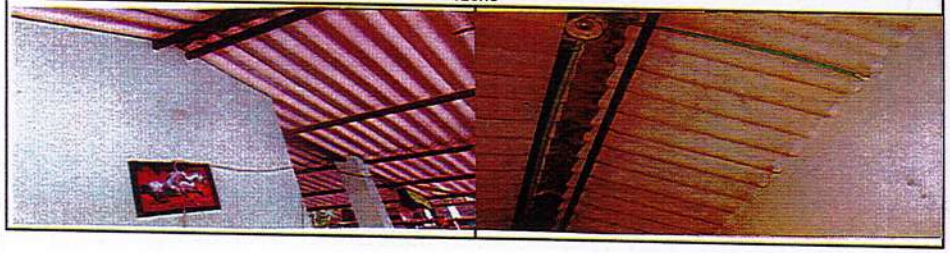


BAÑO

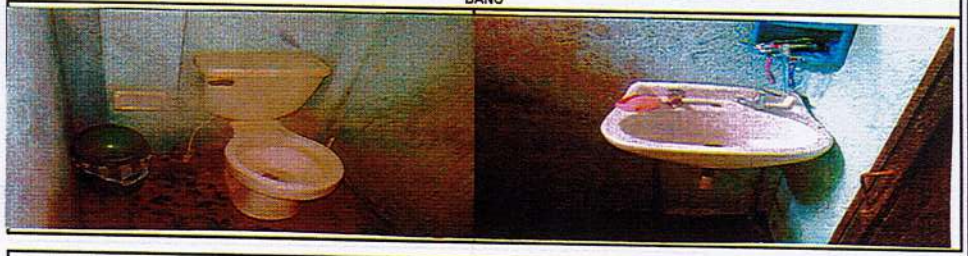

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

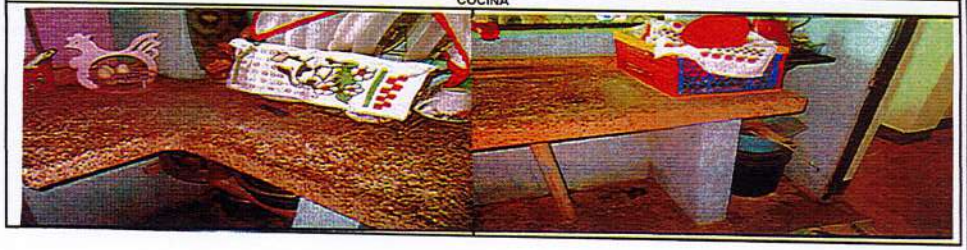

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1118562946

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2755

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 050

PAGINA	1	DE	1

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Martha Cecilia Monroy

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía: 46.360.452

Dirección

Teléfono: 3103450584

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Tiene la conexión de gas natural pero no se usa.

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Anden en concreto.	X Fisuras finas borde ventana local.	X Piso local enchapado	X Cubierta en lámina.	X Tiene columnas en guadua.	X Lavadero prefabricado	X Baño enchapado
2 HUMEDADES	☐	☐	X Piso garaje con fisuras.	☐	X Columna esquina trasera con fisura de arriba casi hasta abajo.	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	X Fisura muro ventana garaje barriba	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	X Columnas con fisuras en borde.	☐	☐
5 OTROS	☐	X Fisura muro ventana #2 garaje lo abajo.	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Martha Cecilia Monroy R.

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor)

Nombre: 46360452 Soy.

C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre: Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2956

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 050

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

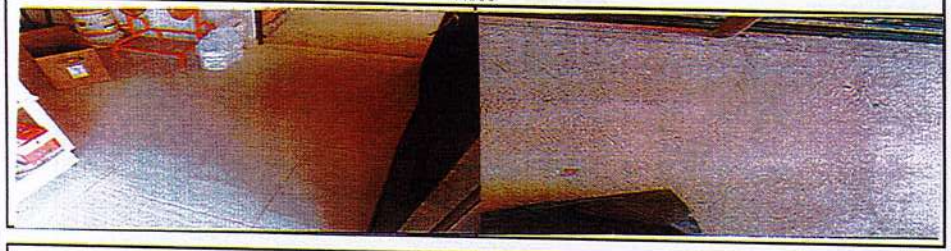

PAREDES

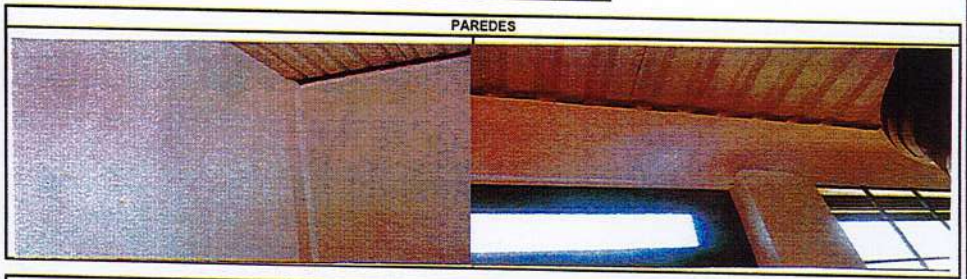

TECHO

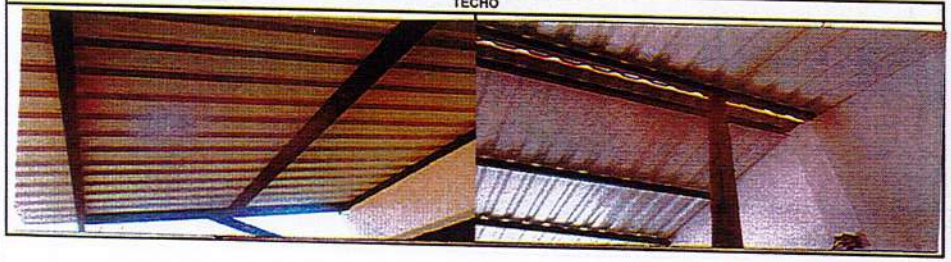

BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

*Martha Cecilia Monroy R

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 46.360.452 Soyl.

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato

Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2457

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 057

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

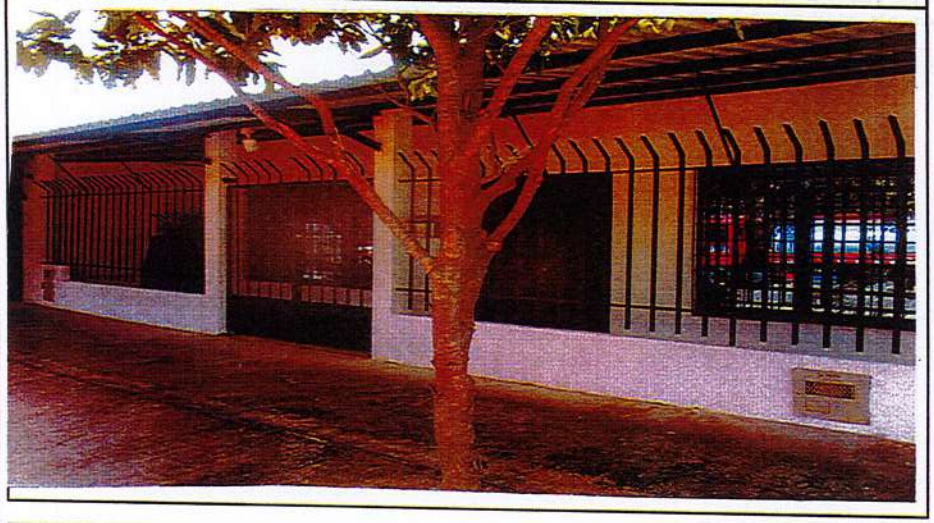

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Martha Cecilia Monroy

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Hermana

Nombre del Propietario: Lucero Monroy

Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Teléfono: 3103450558

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	X	6. Recreacional		Garaje	SI X	NO
2. Comercial		7. Baldío		Uso del garaje		
3. Industrial		8. Salubridad				
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Minero		
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Grietas en unas de viviendas.	☒ Fisuras parte superior	☒ Humedad y grietas entrada (concreto).	☒ Cubierta en lámina.	☒ Vigas metálicas cubierta	☒ Tanque elevado	☒ Fisuras en meson para BBQ.
2 HUMEDADES	☐	☐ barrio social.	☐	☐	☐	☒ Tanque prefabricado.	☐
3 HUNDIMIENTOS	☒ Cerramiento con reja y muro.	☒ Fisuras borde ventana hab 1 # 2	☐	☒ Tiene cielo raso	☐	☒ Tanque subterráneo	☒ Baños enchapados
4 DESPLAZAMIENTOS	☒ Fisuras en borde muro cerramiento	☐	☒ Piso enchapado	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☒ Humedad y fisuras muro derecho cerramiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Martha Cecilia Monroy R.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 46.360.452

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2438

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 001

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

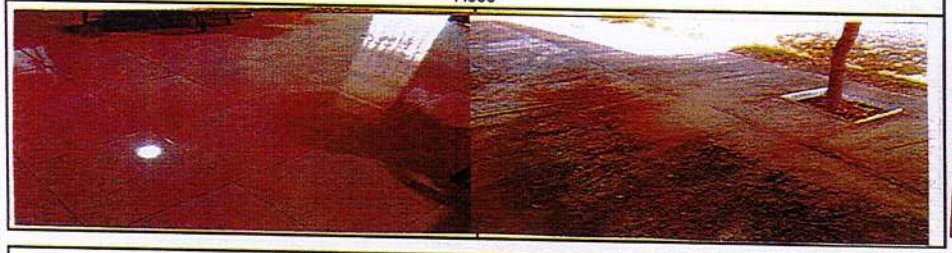


PAREDES



TECHO

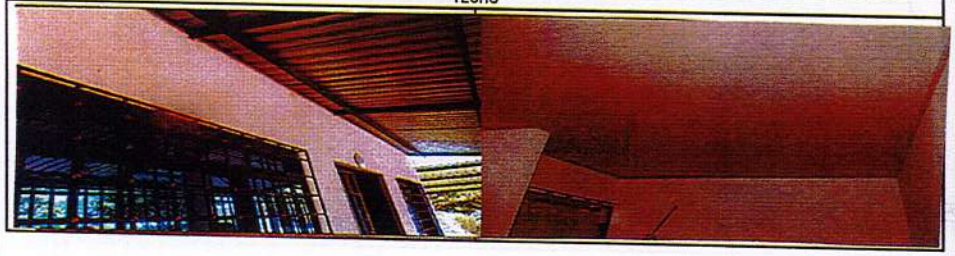

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Martha Cecilia Monroy R

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 46.360.452.

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato

Copias Contratista Interventor Poseedor

2454

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 052

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 01 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

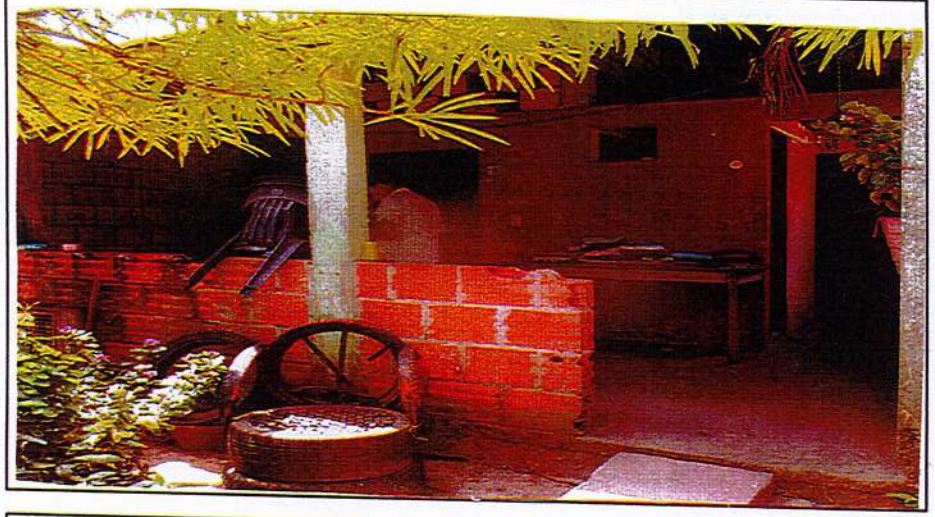

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Aristides Bertel

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Vicky Rincon

Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Teléfono: 3228145151

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		Subterraneos.
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Baldío		Garaje	SI ☐ NO ☐
3. Industrial		8. Salubridad		Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Minero	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Bloque roto.	☒ Muros cocina	☒ Piso con fisuras	☒ Cubierta en	☒ Placa tanque elevado	☒ Columnas lavadero	☒ No tiene lavamanos.
2 HUMEDADES	☒ Fisuras columnas	☐ fisurados	☐	☐ lámina.	☐ fisurada	☐ fracturadas	☒ Baldosa baño rota.
3 HUNDIMIENTOS	☐	☒ Pintura levantada.	☐	☐	☐	☒ Lavadero prefa-	☒ Baldosas cocina
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☒ Muros baño con	☐	☐	☐	☐ bricado.	☐ Tejas y con-fisuras
5 OTROS	☐	☐ humedad.	☐	☐	☐	☒ Tanque elevado.	☒ Carpintería metálica
		☒ Bloques rotos				☐	☐ degastada.
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Aristides Bertel

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

CC O NIT 15002433

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre Andrés Lopez

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2760

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 052

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 01 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

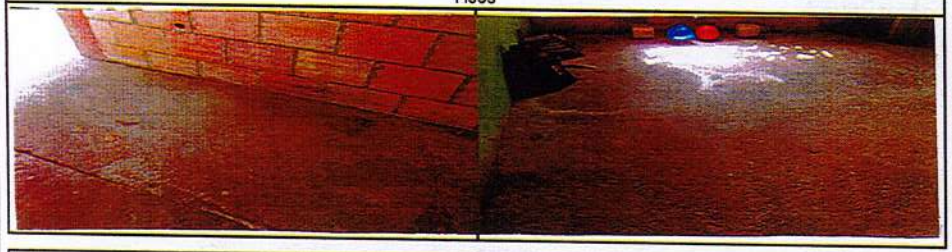


PAREDES



TECHO



BAÑO

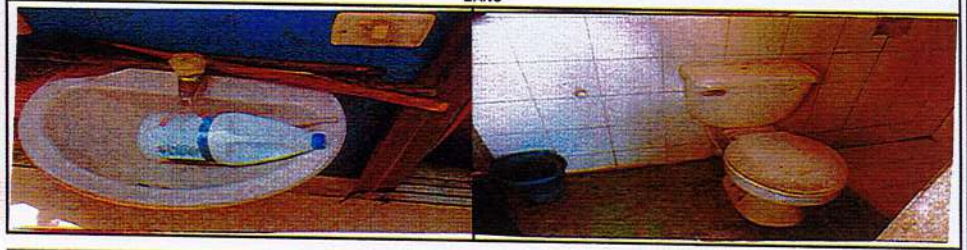

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Aristide Vastel
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 15 662 233

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2 x 67

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 053

PAGINA 1 DE 1 — Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

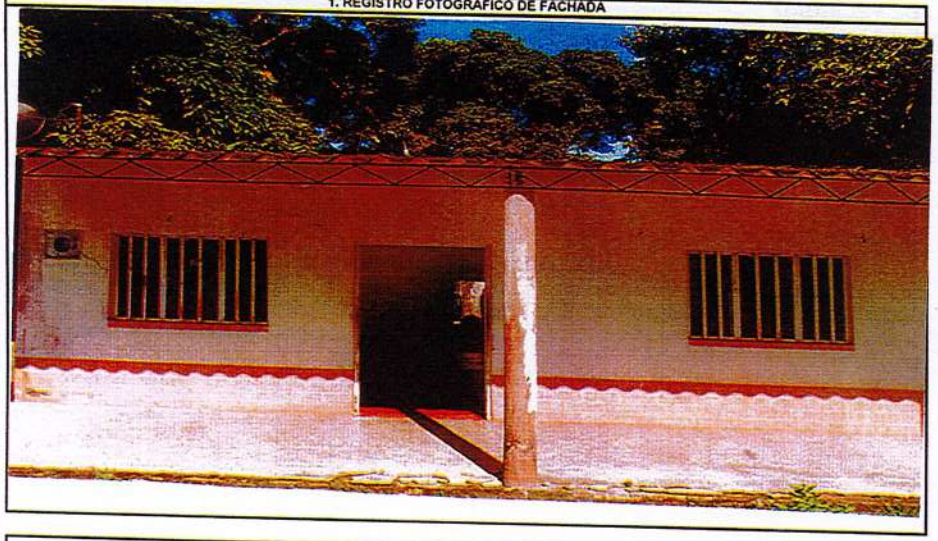

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Alfonso Garay

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Luis Alfonso Garay

Cédula de Ciudadanía: 9651915

Dirección:

Teléfono: 3124559069

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		Pozo séptico
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris X Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas. nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Anden agrietado	X Muro ventana sala grieta	X Piso con grietas.	X Dilatación entre muro y cubierta.	X No tiene columnas en la parte delantera.	X Tiene tanque elevado	X Meson cocina con grietas.
2 HUMEDADES	X Fachada lateral humedad.	X Humedad en muros.		X Cubierta en eternit.	X Vigas con acero expuesto	X Tanque con baldosa Fisurar en el cemento y filtración de agua	X Baño enchapado.
3 HUNDIMIENTOS		X Grieta habt#1.					
4 DESPLAZAMIENTOS	X Grietas en muros	X Muro ventana nevera con grietas.					
5 OTROS	X Carpintería metálica oxidada.						
COMENTARIOS		X Grieta habt#2. X Muro ventana comedor con grietas.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

X Luis Alfonso Garay

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: C.C. O NIT 9651915

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre Yesmer López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2262

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023	

ACTA N°: 053

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

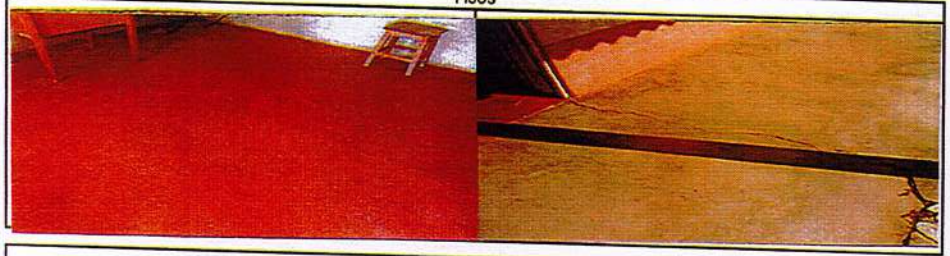


PAREDES

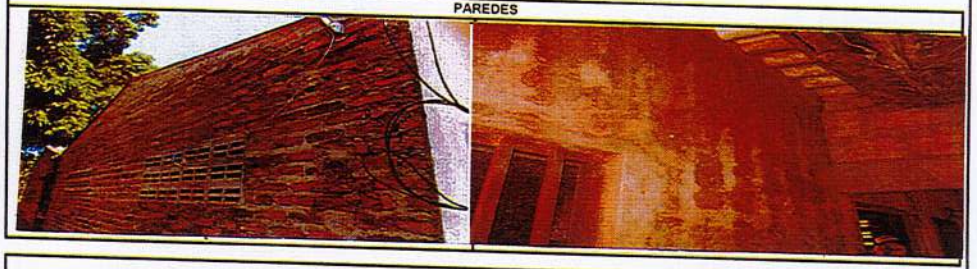

TECHO

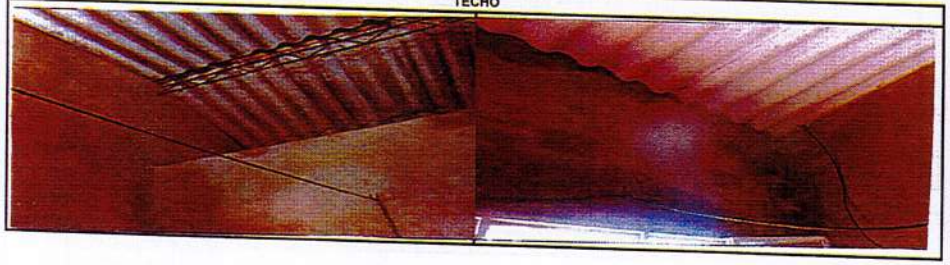

BAÑO

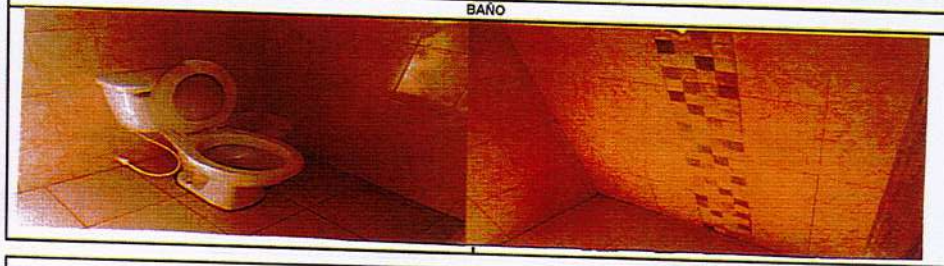

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO [illegible]

Representante de la Interventoría
Nombre [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2963

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 054

PAGINA 1 DE 1 — Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

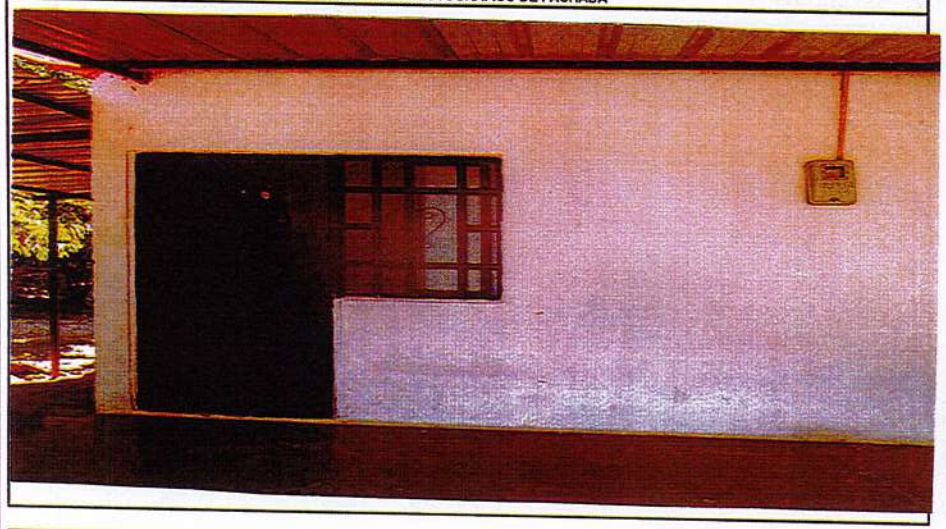

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nubia Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Nubia Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 23741769

Dirección:

Teléfono: 3124122535

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No de pisos: ___ Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Es una habitación

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldio	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Arden con grietas y levantamiento.	X Ventana con bloque		X Cubierta eternit	X Columna fachada con grietas		
2 HUMEDADES							
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
COMENTARIOS	NOTA: Es solo una habitación.						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x Nubia Rodriguez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 23741769
C.C. O NIT

Representante del Contratsita de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2364

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 054

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES



TECHO

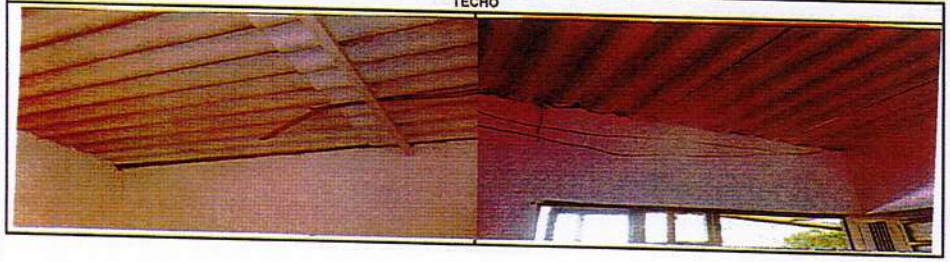

BAÑO

COCINA

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Comparte baño con el acta #55.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x Nubia Rodríguez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23.741.769

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2765

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 055

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

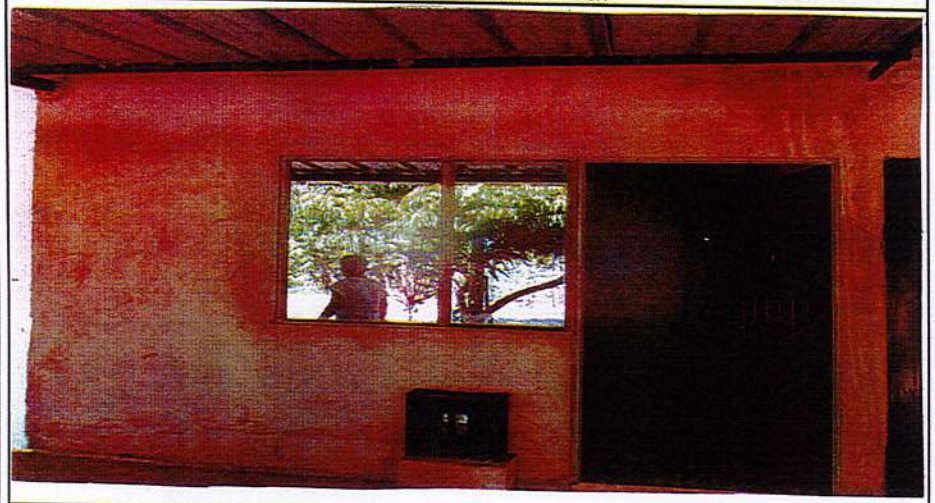

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nubia Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Nubia Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 23.741.769

Dirección:

Teléfono: 3124122535

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Esquina habitación.

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Carpintería metálica desgastada	X Esquina habf. fracturada	X Piso enchapado	X Cubierta en lámina zinc.	X Columna con acero expuesto	X Lavaplatos sin llave.	X Baño en baldosa.
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	X Lavamanos suelto.	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	X Tanque prefabricado	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐ con humedad y fisuras.	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐		☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodríguez

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: C.C. O NIT 23.741.769.

Representante del Contratsita de Obra

Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria

Nombre: Andrea López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2766

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 055

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

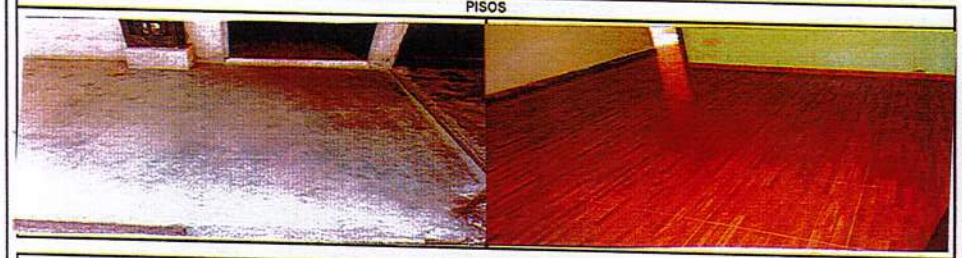

PAREDES

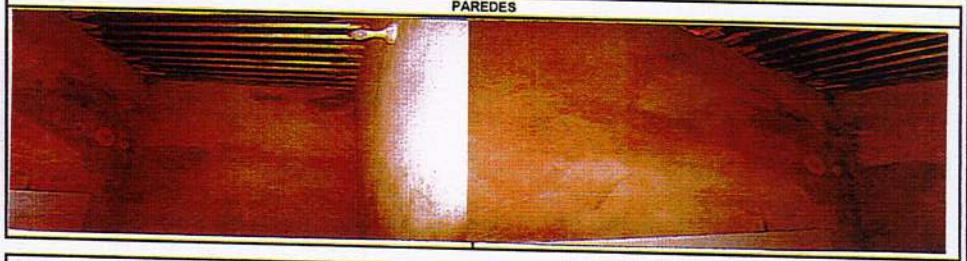

TECHO

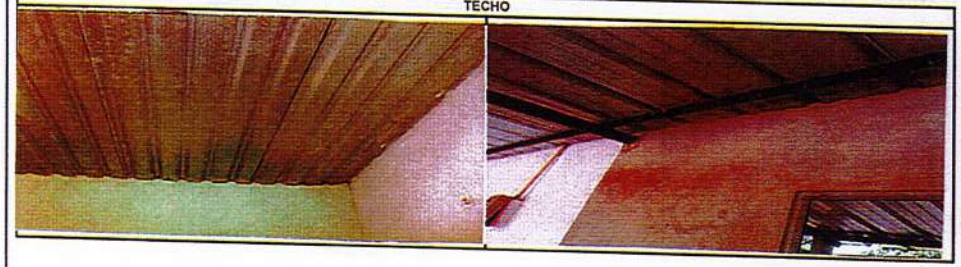

BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodríguez

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 23.711.766

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2967

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 056

PAGINA 1 DE 1 — Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nubia Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Nubia Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 23.741.769

Dirección:

Teléfono: 3124122535

Departamento: CASANARE Municipio: Nunchia No. de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Es una habitación

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Fachada en bloque	☒ Fisura encuentro puertas baño	☒ Piso enchapado	☒ Fracturas en unión cubierta y muro.	☒ Grieta en columna fachada.	☒ No tiene lavamanos.	☐
2 HUMEDADES	☒ No tiene cielo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Nota: Es una habt.						

NOTA: SE DE LA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodríguez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 23.741.769.
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible] PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: [illegible] López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2368

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 056

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD 04	MM 12	AA 2023	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS







PAREDES

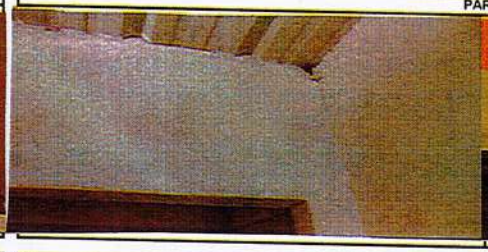

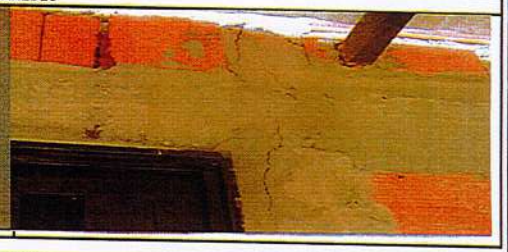


TECHO



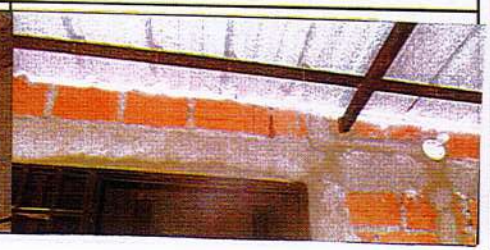

BAÑO

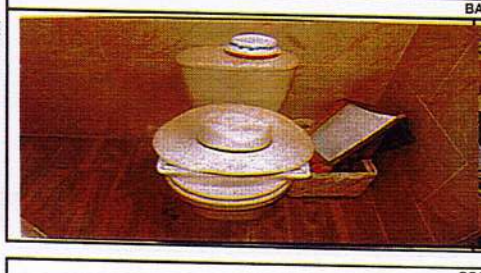



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodriguez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23.711.769

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre Mirladis Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2464

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 057

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

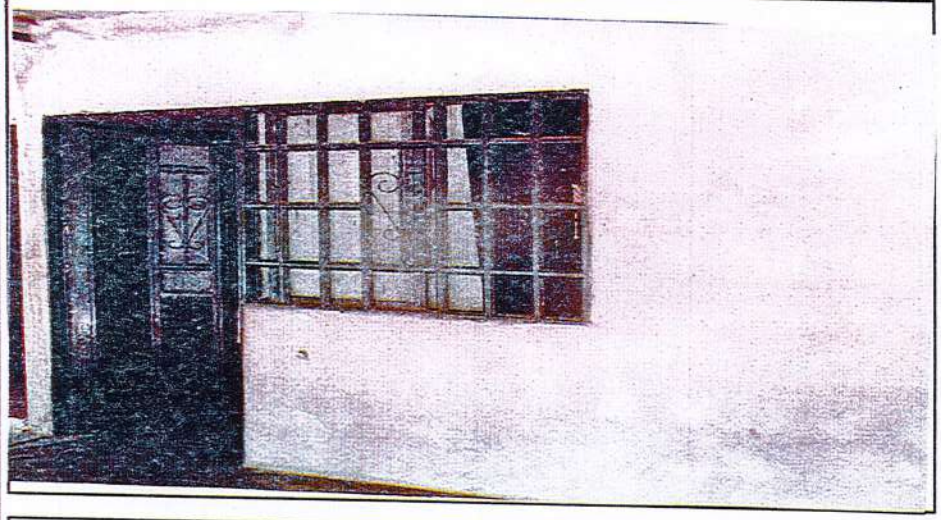

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nubia Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Nubia Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 20.741.769

Dirección:

Teléfono: 3124122535

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ fisura columna puerta.	☒ Muros con humedad	☒ piso con grietas y descascaramiento	☒ Cubierta en lámina zinc.	☐	☒ No tiene lavamanos	☐
2 HUMEDADES	☐	☒ Muro baño con humedad.	☐	☐	☐	☒ Tiene tanque elevado	☐
3 HUNDIMIENTOS	☒ Fisuras en borde muro / cubierta.	☐	☐	☐	☐	☒ Tiene aljibe.	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodriguez

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: C.C. O NIT 23711769.

Representante del Contratsita de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria

Nombre: Andrea Lopez

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

0670

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 057

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS




PAREDES



TECHO



BAÑO

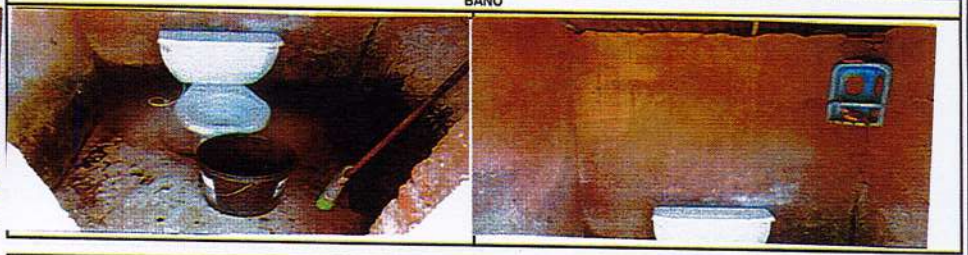

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodríguez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Nubia Rodríguez
C.C. O NIT 23744769.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista Interventor, Poseedor

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 058

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Berenice Chavita

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Esposa

Nombre del Propietario: Rodolfo Garay

Cédula de Ciudadanía: 74.857.581

Dirección: Cll 5#2-08

Teléfono: 3204252908

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No. de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		Pozo séptico
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		11. Minero	
2. Comercial		7. Baldío		12. Otro	
3. Industrial		8. Salubridad			
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)			
5. Agropecuario		10. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Piso anden enchapado	X Muros con humedad.	X Piso enchapado	X Cubierta eternit con humedad.		X Tiene tanque elevado	X Borde medio meson sin baldosin.
2 HUMEDADES	X Humedad y fisura muro derecho y pintura soplada.	X Fisura esquina ventana puerta lateral.	X Piso patio enchapado.	X Cubierta patio en mal estado.		X Filtración en la llave lava platos.	X Baño enchapado.
3 HUNDIMIENTOS		X Fisuras muro patio/ hab #3.				X Tanque con baldosa.	
4 DESPLAZAMIENTOS						X Tiene fisura y humedad.	
5 OTROS	X Vigas cubierta metl						
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Berenice Chavita D.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT: 74.857.581

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2472

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 058

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES

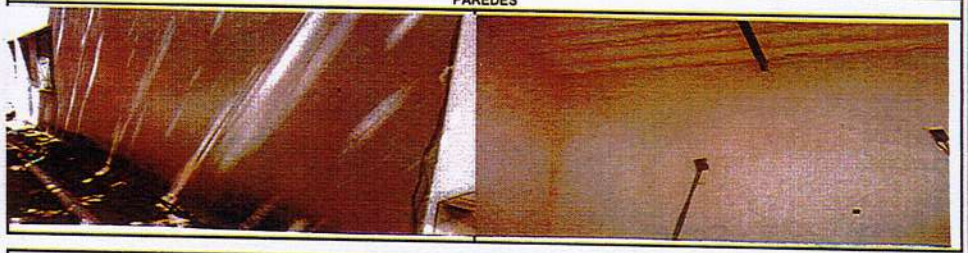

TECHO

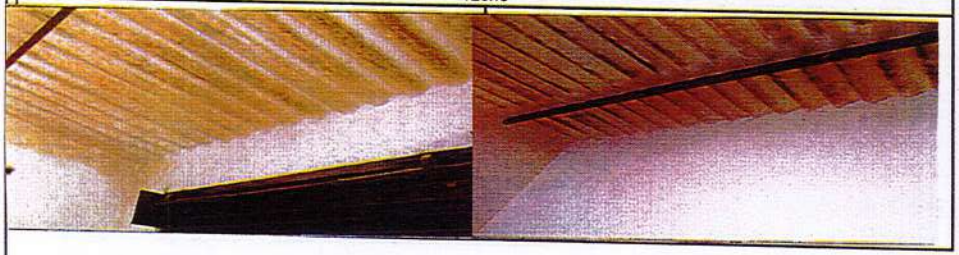

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Berenice Chavita D

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato

Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2273

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 059

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

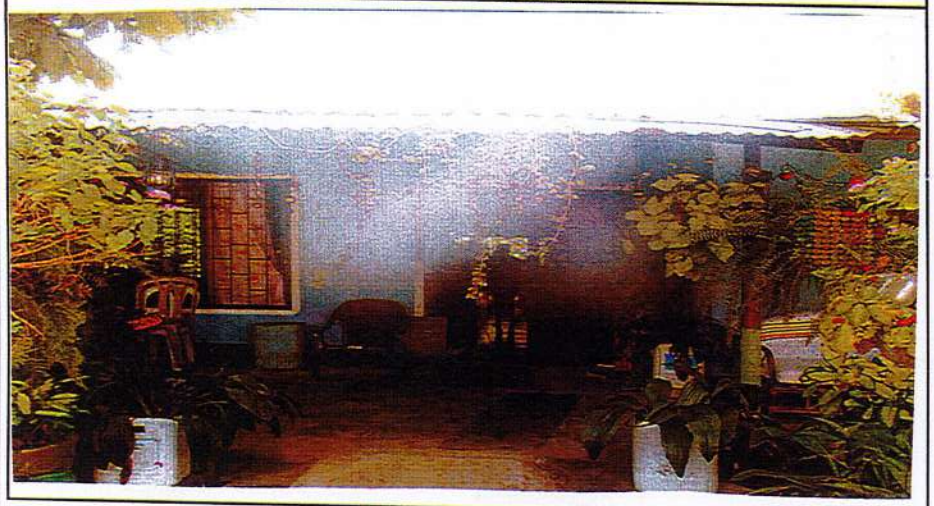

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Celia Flórez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Esposa

Nombre del Propietario: Luis Gonzalo Valderrama.

Cédula de Ciudadanía: 9652885

Dirección: K3#4-41

Teléfono: 3134811610.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	Garaje / Uso del garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Cubierta fachada zinc	☒ Muros con humedad.	☒ Piso enchapado.	☒ Cubierta eternit y lamina	☒ Columna esquina ☐ Habf & concreta.	☒ Lavadero con ☐ baldosa	☒ Falta baldosas baño #01.
2 HUMEDADES	☐	☒ Fisuras muro lado #2.	☐	☐	☐	☒ Tanque elevado.	☒ Vidrio habt 1 roto.
3 HUNDIMIENTOS	☒ Piso andén con grietas	☒ Pintura soplada	☐	☐	☐	☐	☒ Ventana cocina
4 DESPLAZAMIENTOS	☒ Puerta sin vidrios.	☒ Muro frente a baño	☐	☐	☐	☐	☐ Sin vidrio.
5 OTROS	☒ Vidrio ventana roto	☐ con grieta. ☒ Pintura levantada patio / lavadero.	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 13725137

Representante del Contratista delegado
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrea Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2274

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 059

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

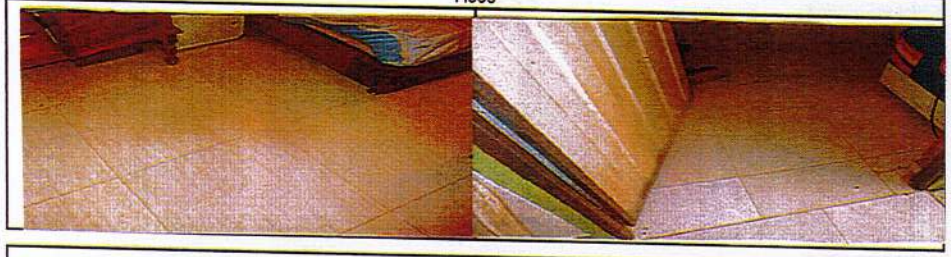


PAREDES



TECHO

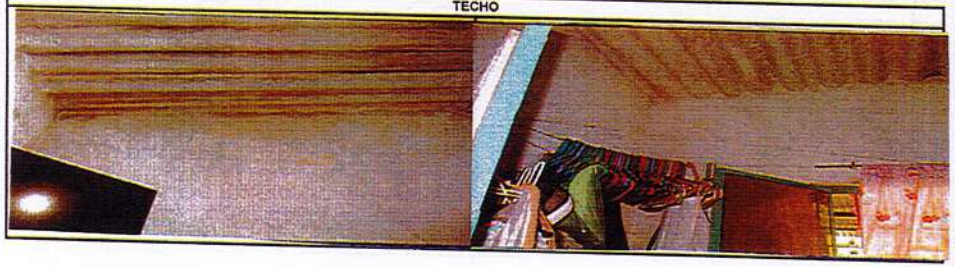

BAÑO

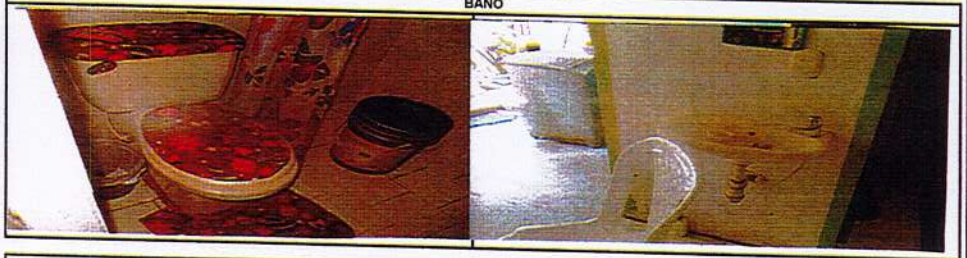

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 23725152

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2145

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023	

ACTA N°: 060

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Nelson Vela
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Jose Nelson Vela
Cédula de Ciudadanía: 9514667
Dirección:
Teléfono: 3118999428
Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL					
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje / Uso del garaje	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Muros con humedad	☒ Fisuras muros patio	☒ Piso hab en baldosa,	☒ Cubierta eternit.	☒ Vigas metálicas	☒ Tanque elevado	☒ Baño enchapado.
2 HUMEDADES	☒ Vidrio puerta roto.	☐ y humedad.	☐	☐	☐	☒ Tanque prefabricado	☒ Mesón con baldosa
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☒ Piso patio con grietas.	☒ Dilatación entremuro y cubierta.	☐	☐ con fisuras y humedad.	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: 9514667
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

9tt2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA DD 04 MM 12 AA 2023	

ACTA N°: 060

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS




PAREDES

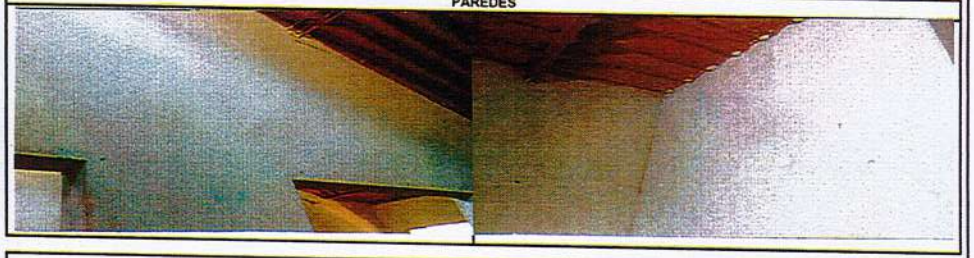

TECHO

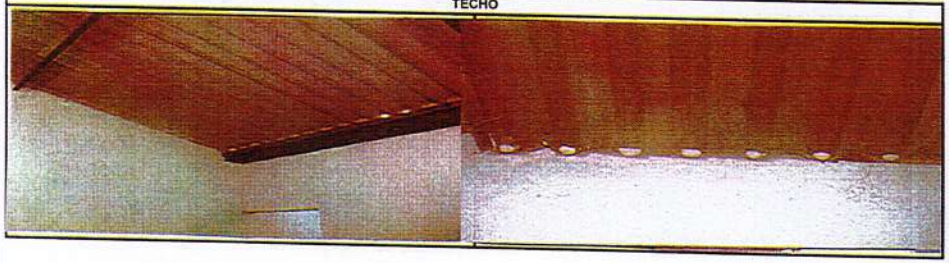

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 95'4667

Representante por Contratsita de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

6662

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023.	

ACTA N°: 061

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Diana León

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Diana León.

Cédula de Ciudadanía: 33.481.487

Dirección:

Teléfono: 3143489145

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Aire acondicionado

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Anden con grietas	☒ Habt #3 con fisuras en muro.	☒ Piso enchapado.	☒ Habt #1 con cielo raso y aire acondicionado	☒ Humedad en viga habt 5.	☒ Tanque prefabricado con humedad y goteo en la llave	☒ Cocina con baldosa
2 HUMEDADES	☒ Grieta muro 129.	☐	☒ Piso patio cemento	☐	☐	☐	☒ Humedad en viga canal.
3 HUNDIMIENTOS	☒ Puerta principal sin vidrio.	☒ Humedad muro sala #2.	☐	☒ Cubierta eternit.	☐	☒ Tanque #2 con humedad y fisuras.	☒ Carpintería metálica desgastada.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☒ Cielo raso sala y habt #5 y #6.	☐	☐	☒ Baño #2 sin lavamanos.
5 OTROS	☐	☐	☐		☐		
COMENTARIOS	Nota: Habt 4 se tomaron fotos desde afuera.					☒ Vidrio puerta mitad roto. ☒ Tanque #3 con baldosa.	☒ Cocina #2 y #3 con baldosa. ☒ Cocina #3 con baldosas rotas.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Diana Carolina León S.
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Diana León
C.C. O NIT 33 481 487

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

8 de 12

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 061

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 04 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES

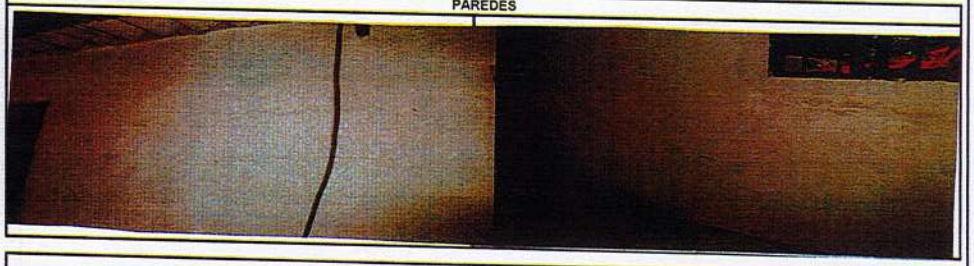

TECHO

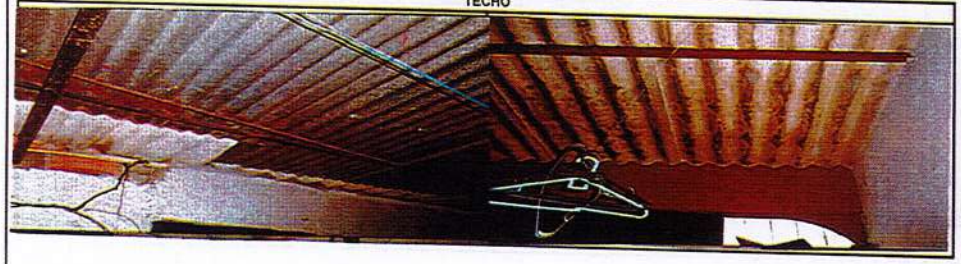

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Diana Catalina León Jimenez
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Diana León
C.C. O NIT 33481487

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [illegible]

Representante de la Interventoria
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

bttz

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 062

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jorge Iván Monroy.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X. Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Carolina Rodriguez Monroy.

Cédula de Ciudadanía: 1.118.553.792.

Dirección:

Teléfono: 3143327475.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energia	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Tiene aire acondicionado.

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpinteria metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X No tiene enden	X Muros bañoren humedad y fisuras finas.	X Piso exterior con dilatación	X Cubierta cielo raso	X Fisuras en columna fachada.	X Tanque elevado.	X Mesón BBQ con grietas.
2 HUMEDADES	X Cerramiento en malla.	X Fisuras en muros	X Piso interior enchapado.			X Tanque prefabricado con humedad.	X Mesón cocina enchape.
3 HUNDIMIENTOS		X Grieta muro habt#1					X Baño interno enchapado.
4 DESPLAZAMIENTOS		X Grieta esquina habt#2					X Vidrio vencido habt. #3.
5 OTROS							
COMENTARIOS	Nota: es una casa prefabricada. Nota 2: Se realizó prueba de estanquidad.	No tiene filtración de agua. (Piscina)					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: ___
C.C. O NIT 1.118.553.792

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2380

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 062

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

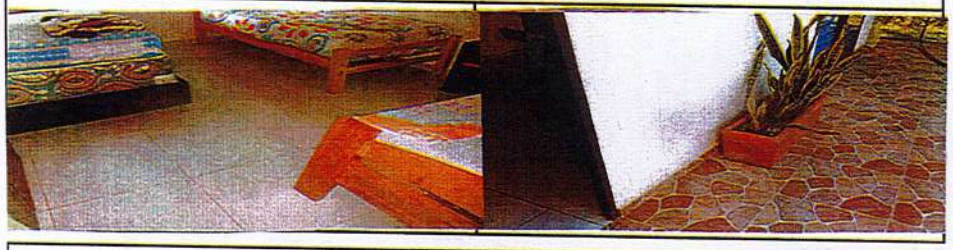

PAREDES

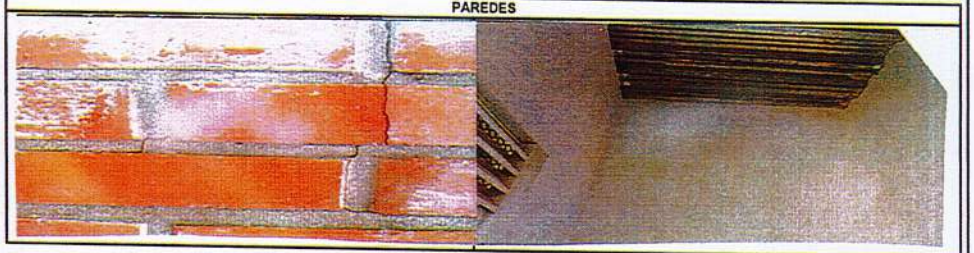

TECHO

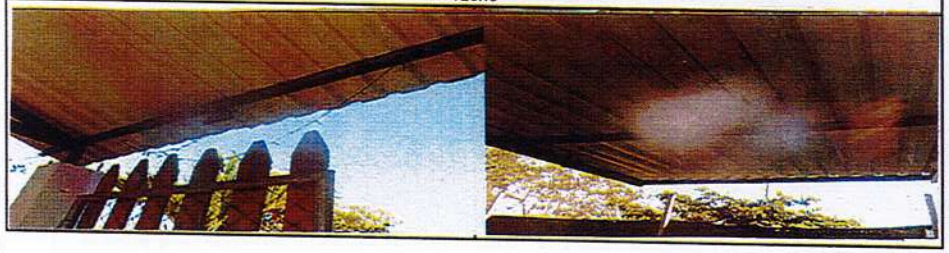

BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

x 7185782

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2281

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 063

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María E. Gomez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Junta de Acción Comunal (Comunidad.

Nombre del Propietario / Cédula de Ciudadanía: Init / 84 400 2429 - 7.

Dirección

Teléfono: 310 824 0716.

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energia	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Planta de tratamiento (Peta) PTAP.

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje Uso del garaje	SI ☐ NO ☒
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☒	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Cerramiento en ladrillo, malla y alambre	☒ Muros con humedad.	☒ Piso con fisuras	☒ Humedad y fisuras cuarto #1	☒ Columnas con humedad y fisuras. cuarto #1	☒ Tanque elevado.	☒ Bombas cuarto #5
2 HUMEDADES	☐	☒ Humedad y grieta muro cuarto #3.	☐	☐	☒ Columnas desportillados cuarto #03.	☒ Tanque en concreto con grietas, humedad y filtración de agua	☐ con goteo.
3 HUNDIMIENTOS	☒ Columna con grieta y algunas fisuras. (Humedad).	☒ Fisura muro puerta cuarto #03.	☐	☐	☒ Columna esquina cuarto #5 fracturada.	☐	☒ Estructura metálica. Oxidadas.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☒ Cuarto #4 con el ladrillo a la vista.	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS							
COMENTARIOS	X Malla con oxido.	X Cuarto #5 con fisuras. X Acero expuesto sobre ventana cuarto #5	NOTA: No se permitió acceso al cuarto #2. X Grieta sobre ventana cuarto #5.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:

C.C. O NIT 1118.539.394

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la interventoria

Nombre Andrea López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2782

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 063

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES

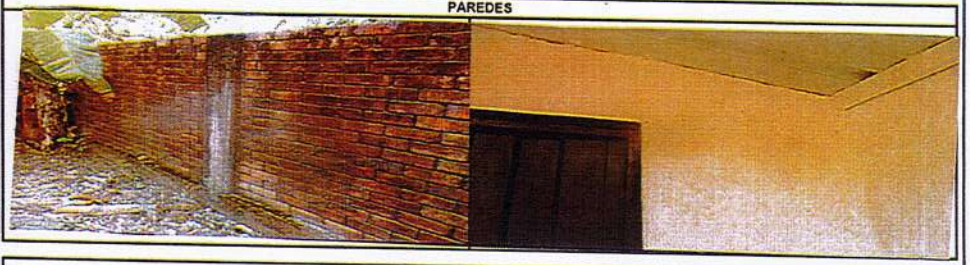

TECHO

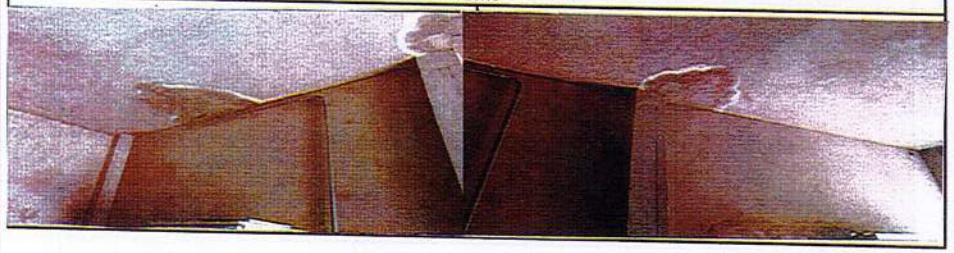

BAÑO

COCINA

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1.118.539.399.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2383

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

ACTA N°: 064


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

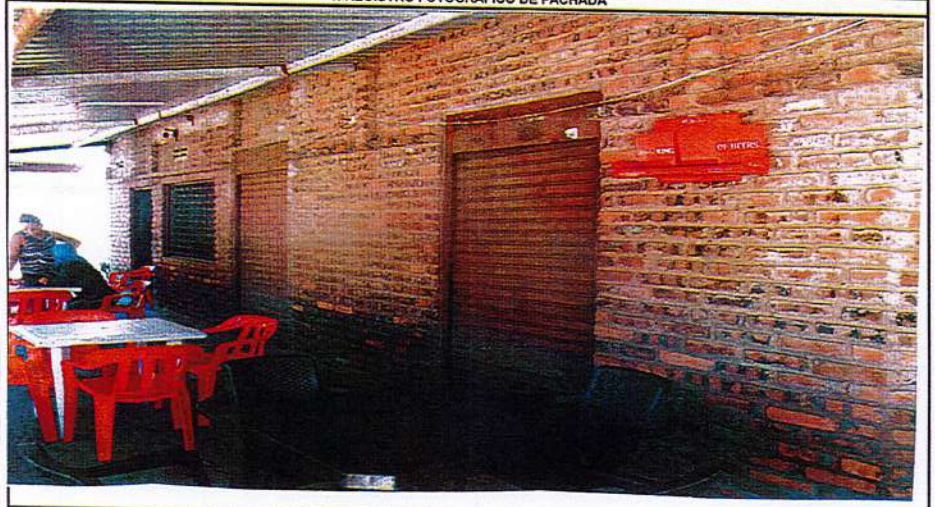

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Olivia Corredor.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Olivia Corredor

Cédula de Ciudadanía: 52064251

Dirección: Cra 3 # 4-06

Teléfono: 3026263914

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris X Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje / Uso del garaje: SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Fachada con ladrillo a la vista.	X Pintura levantada.	X Piso con fisuras	X Cubierta metálica	X Vigas y columnas	☐	X Baño local enchapado.
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	X Tiene cielo raso	☐ Metálicos.	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	X Piso con grietas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	X Grieta muro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 52064251

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrea López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

4847

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 054

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 05 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS



PAREDES

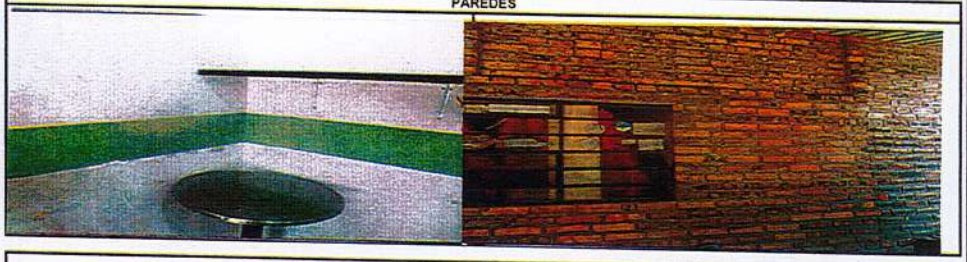

TECHO

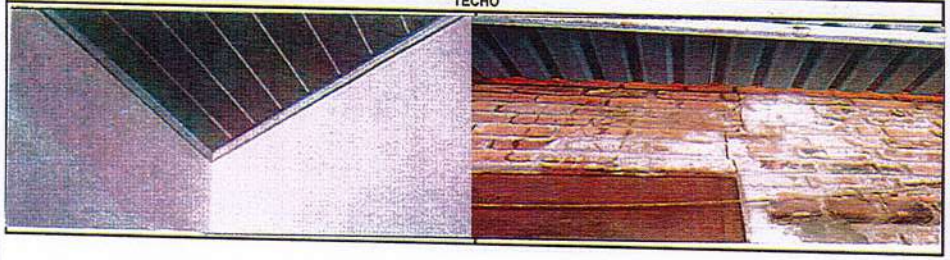

BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: [illegible]

C.C. O NIT 52604251 Bta

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre: [illegible]

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato

Copias Contratista Interventor Poseedor

2485

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 065.

PAGINA 1 DE 1 — Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

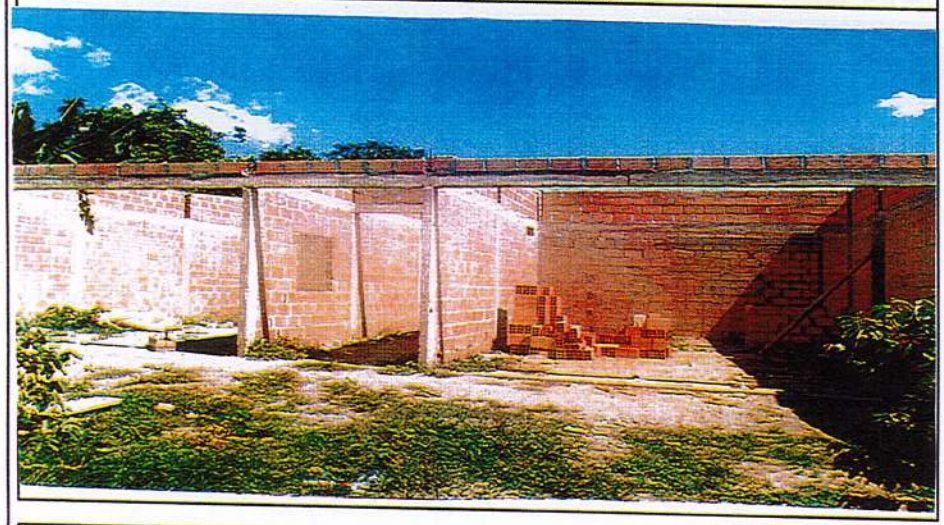

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Olivio Corredor

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Olivio Corredor

Cédula de Ciudadanía: 52 064 251.

Dirección:

Teléfono: 3026263414

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☒ Muro en bloque con fisuras.	☐	☐	☒ Pañete columna con grietas.	☐	☐
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Nota: Edificación en construcción						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 52064.251

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

9872

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 065

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 05 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS

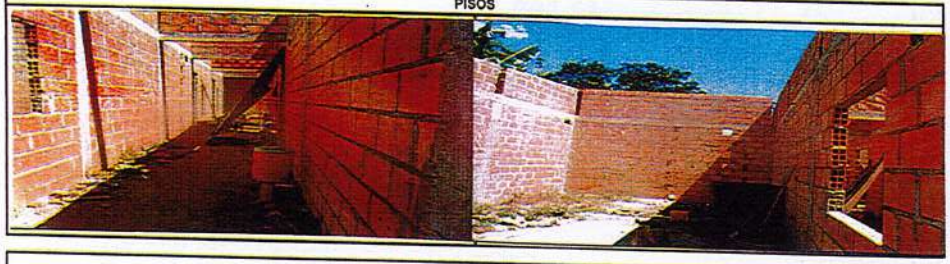

PAREDES

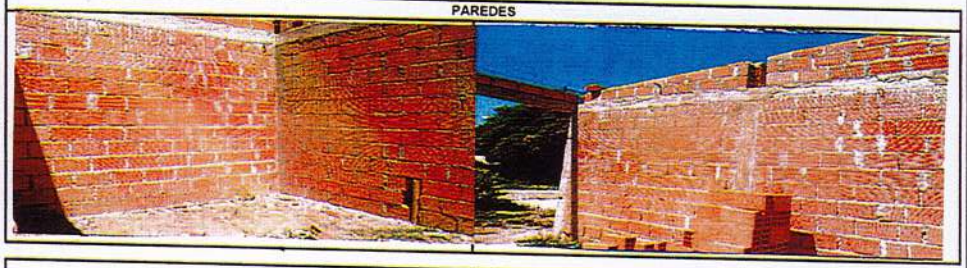

TECHO

BAÑO

COCINA

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 5206125

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

6867

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 066

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 08 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

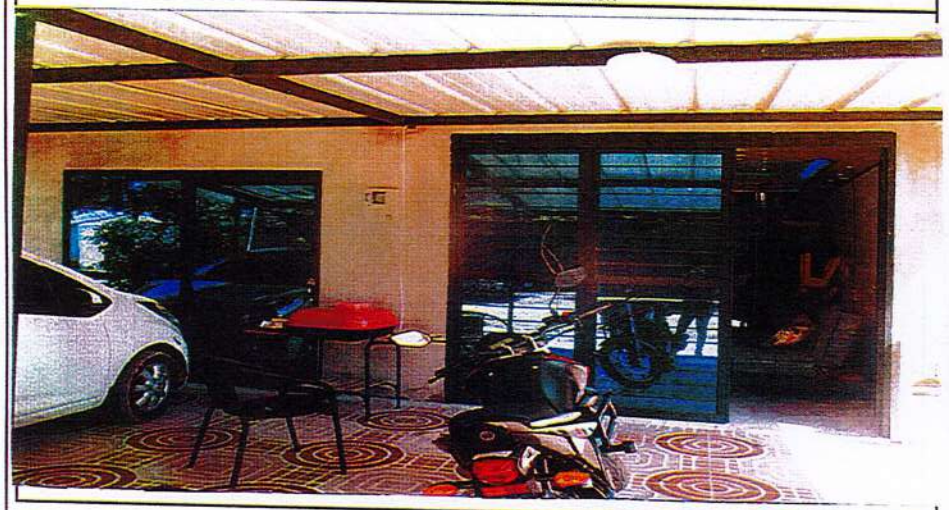

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Olivia Corredor

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Olivia Corredor

Cédula de Ciudadanía: 52064251

Dirección:

Teléfono: 3026263911

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES: Aire acondicionado. Casa prefabricada.

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Enchape andén	☒ Fisuras muro habt 1.	☒ Piso enchapado	☒ Cobierta exterior	☐	☒ Tanque prefabricado	☒ Baño habt 1 enchapado.
2 HUMEDADES	☒ Fisuras en fachada	☒ Fisuras muro habt 2 y hueco bajo suelo.	☐	☐ metálica	☐	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☒ Vidrio vencido muro divisorio patio.	☐	☒ Tiene cielo raso.	☐	☐	☒ Cocina enchapada.
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ Fisuras muro habt 3.	☐	☐	☐	☐	☒ Vidrio vencido habt ☐ #3.
5 OTROS	☐		☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		X Muro entrada habt 5 sin pañete. X Fisuras muro habt 4 y habt 5.	X Tienen aire acondicionado: Habt 1, 3, 4 y 5.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 52064251

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2288

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 05

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS

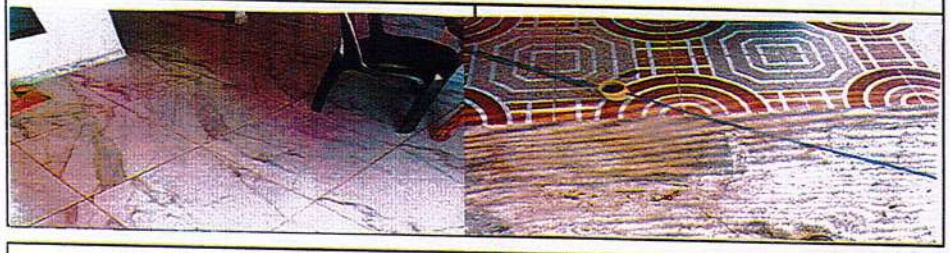


PAREDES

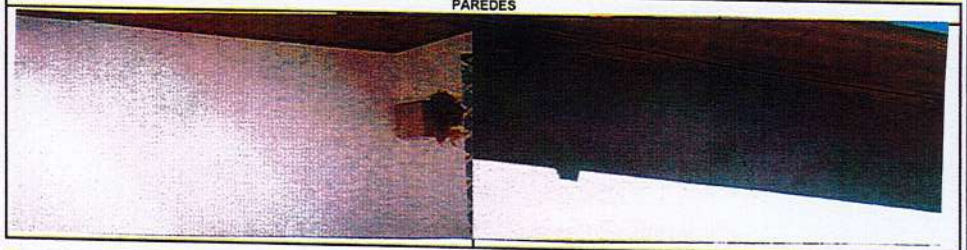

TECHO



BAÑO

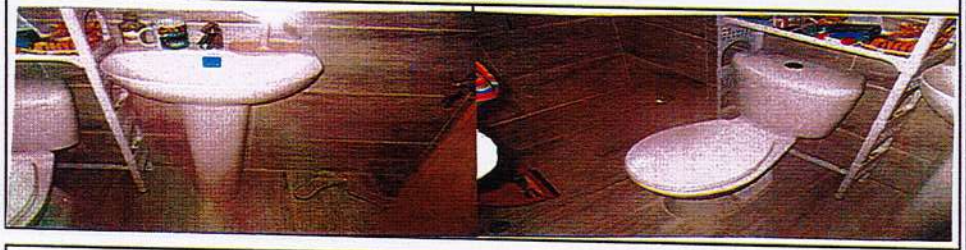

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 52069251 B15

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2484

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 067

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 05 | MM 12 | AA 2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Estela Guanaro

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Estela Guanaro

Cédula de Ciudadanía: 47 479 830

Dirección: C 2 No. 7-74 MZ 13 LT 8.

Teléfono: 3134050311

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Ventanas derecha y puerta sin vidrios.	X Habt 1 con grieta.	X Piso enchapado.	X Cubierta en zinc.		X Tanques elevados	X Baño #2 sin lavamanos
2 HUMEDADES	X Andén con grietas	X Habt 2. pintura soplada	X Piso patio cemento con grietas.			X Tanque con humedad y fisuras.	
3 HUNDIMIENTOS	X Muros con fisuras y pintura levantada.	X Grieta esquina habt #3 y pintura soplada.					
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS	X Dilatación cubierta y muro.						
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Estella Guanaro
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Estela Guanaro
C.C. O NIT 47479830

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Oscar Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres López

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Obt2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 067

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 05 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:


PISOS

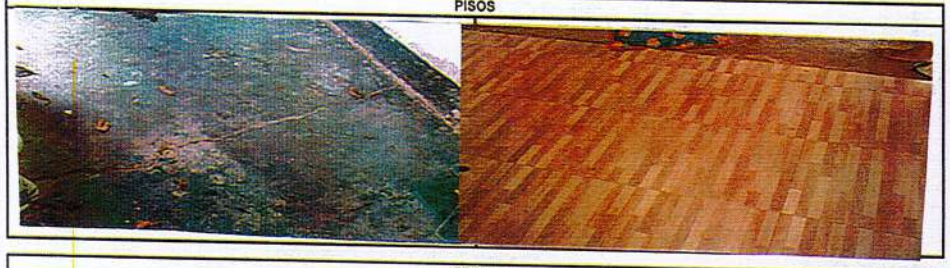


PAREDES



TECHO

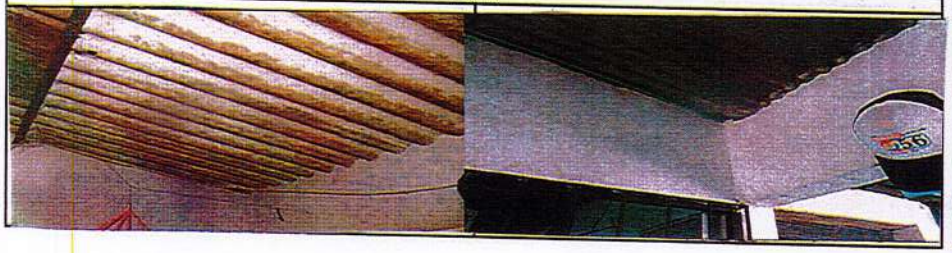

BAÑO

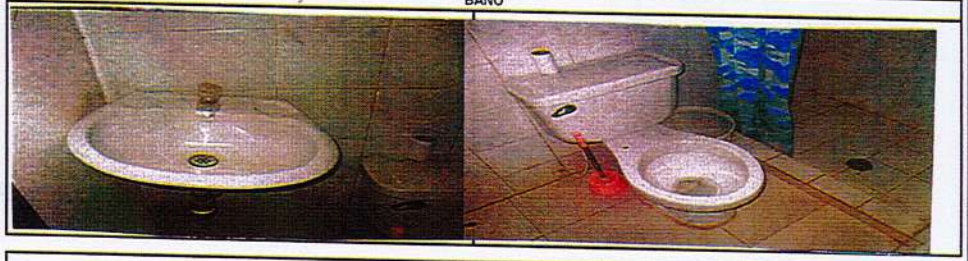

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Stella Guevara
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 47421498 30

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

11 de 22

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 063

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 08 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luz Marina Valderrama

Tenencia: Propietario X | Arrendatario | Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Luz Marina Valderrama

Cédula de Ciudadanía: 23.740.216

Dirección: Cll 4#3-6

Teléfono: 3202948332

Departamento: CASANARE | Municipio: Tilodiran | No de pisos: 1 | Barrio: Esquina parque.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

OBSERVACIONES: Aire acondicionado / wifi

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? | URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ | Obra Gris ☐ | Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ | NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ | Escarpado ☐ | Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Anden con grietas X Grietas en fachada X Humedad y pintura levantada. ☐ Teja zinc y eternit X Columnas con acero expuesto.	X Grieta esquina muro puerta principal. ☐ X Esquina externa muro habt#3 grieta. X Habt#2 con grieta esquina X Grietas muro habt#3.	X Piso enchapado X Piso habt#1 sin enchape. ☐ X habt#4 sin enchape.	X Teja eternit X Habt#2 con cielo raso (icopor) ☐ X Habt#4 con cielo raso (icopor)	X Columna baño fracturada.	X Lavadero con humedad y pintura soplada. X Tanque elevado en ladrillo con fisuras. X Pozo profundo sin utilizar.	X Carpintería metálica desgastada. ☐ X Cocina enchapada. ☐
2 HUMEDADES							
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
COMENTARIOS		X Muro divisorio con ma enladrillo a la vista. X Muros lavadero humedad					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Luz Marina Valderrama
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Luz Marina Valderrama
C.C. O NIT 23.740.216

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2262

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 068

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 08 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


PISOS




PAREDES



TECHO

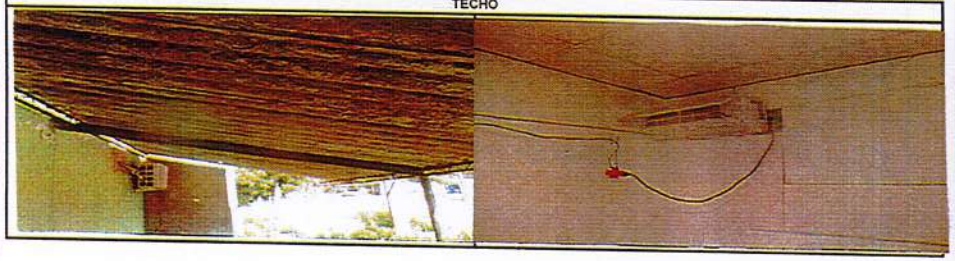

BAÑO

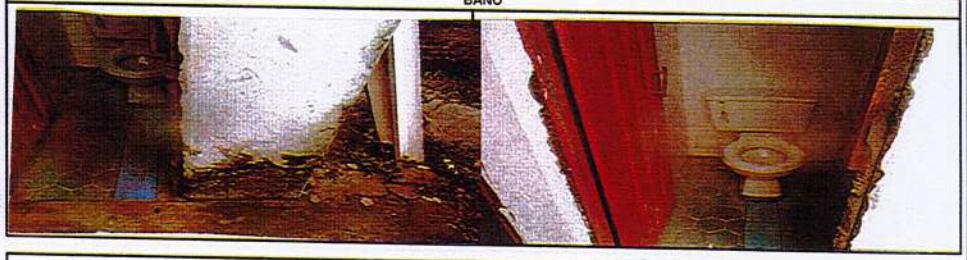

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Luis Maria Valderrama.
C.C. O NIT 93740246

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

2793

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 069

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 11 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

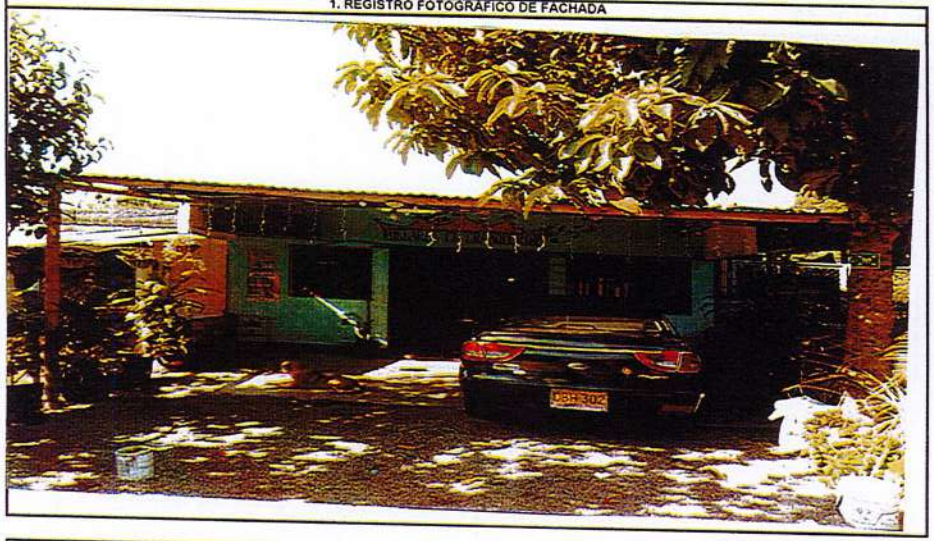

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Lidia Guanano

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Lidia Guanano.

Cédula de Ciudadanía: 33.481.949

Dirección: Cra 2 #2-29

Teléfono: 3123648289

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No de pisos: 1 Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: W1-F1 / Alcantarillado.

TIPO DE PREDIO: RURAL Cuál? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial	X	7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje Uso del garaje SI ___ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Cubierta en lamina	X ~~Hab #1~~ muros con humedad.	X Piso con fisuras. comercial	X Cieloraso. en local.		X Tanque elevado.	X Baño comercial sin lavamanos.
2 HUMEDADES	X Grieta muro derecho					X Tanque faltan baldosas	
3 HUNDIMIENTOS	X Piso cemento.	X Humedad muro cocina	X Piso vivienda descascarado.	X Vivienda teja zinc.		X Baño faltan baldosas	X Baldosa cocina en buen estado.
4 DESPLAZAMIENTOS	X Cerramiento en			X ~~Hab #1~~ y #2. con cielo raso			
5 OTROS	bloque con humedad.						
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

LIDIA ESNEYIT GUANANO
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: LIDIA ESNEYD GUANANO
C.C. O NIT 33481449.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre ___
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

6622

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 069

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 11 MM 12 AA 2023


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

PISOS




PAREDES




TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: LIDIA ESNEYDI GUANDRO
C.C. O NIT 33481948

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

Sht 2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 070

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 11 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Katy Niebles Tuay

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Trabajadora

Nombre del Propietario: María Nubia Cardenas Rueda

Cédula de Ciudadanía: 46352797

Dirección:

Teléfono: 3142458926

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodirán No de pisos: 1 Barrio:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje: SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Anden baldosa	☒ Grieta sobre muro entrada principal.	☒ Pozo enchapado.	☒ Cubierta eternit	☐	☒ Tanque elevado	☒ Puertas gabinetes
2 HUMEDADES	☒ Cubierta eternit	☐	☒ Faltan baldosas	☒ Habt #1 cielo raso caido.	☐	☒ Lavadero con baldosa y humedad	☐ Cocina con vidrios rotos.
3 HUNDIMIENTOS	☒ Separación entre cubierta y muro.	☒ Grieta puerta trasera negocio.	☐ habt (sala) junto al patio y habt 1.	☐	☐	☐	☒ Carpintería madera desgastada.
4 DESPLAZAMIENTOS		☒ Grieta muro habt #2.	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐ Pintura descascarada		☐		☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Katy Niebles

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Katy Niebles

C.C. O NIT 1118536680

Representante del Contratsita de Obra

Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria

Nombre: Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

9bt2

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 070

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 11 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS




PAREDES

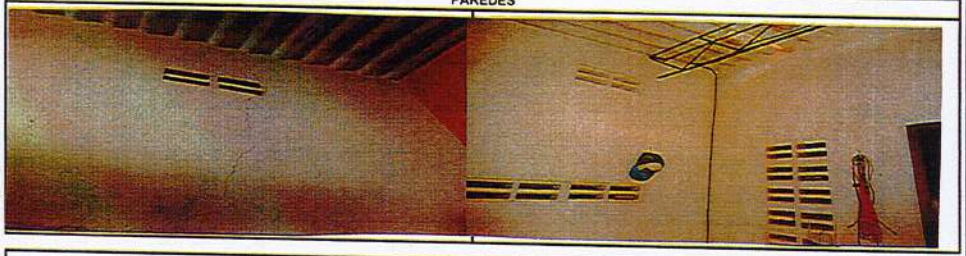

TECHO




BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

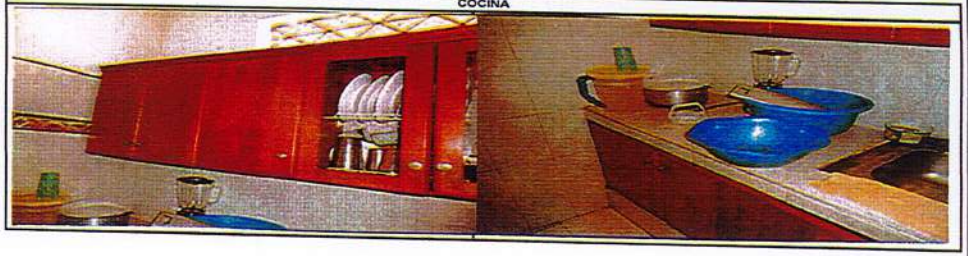

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Katy Niebles

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: 1118536680

C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria

Nombre Andrés López

Testigo

Nombre

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

294

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 071

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 11 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

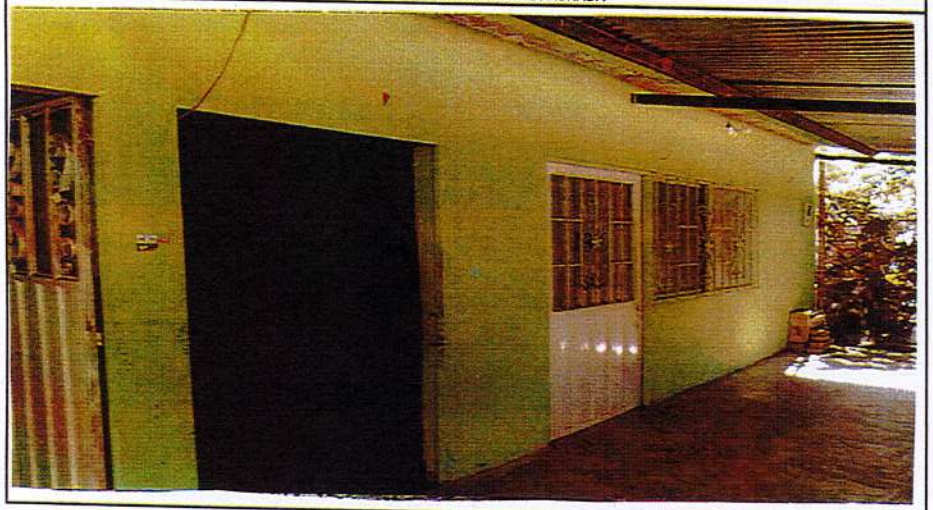

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luz Aneira García

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Esposa

Nombre del Propietario: Marco Tulio Rincon

Cédula de Ciudadanía: 4.162.028

Dirección: K21 # 2-34

Teléfono: 3112588251

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran No. de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Tiene 2 pozos sépticos

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cuál? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO ___ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Teja zinc.	X Hab #3 muros con humedad.	X Habt. #1 fisurado	X Cubierta elemt	X Dilatación entre columna y viga entrada principal	X Lavadero con fisura	X Cocina sin lavaplatos
2 HUMEDADES	X Grieta en andén.	☐	X Habt #3 con piso descascarado.	☐	X Vigas patio en madera.	X Ducha con filtración de agua	X Carpintería metálica desgastada.
3 HUNDIMIENTOS	☐	X Grieta muro habt 4.	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	X Habt #4 descascarado	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Nota: No se accedió a la habt #2.						

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Luz Aneira García
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 24190754

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre: Mauricio Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2398

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 071

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 11 MM 12 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023
CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023
INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS

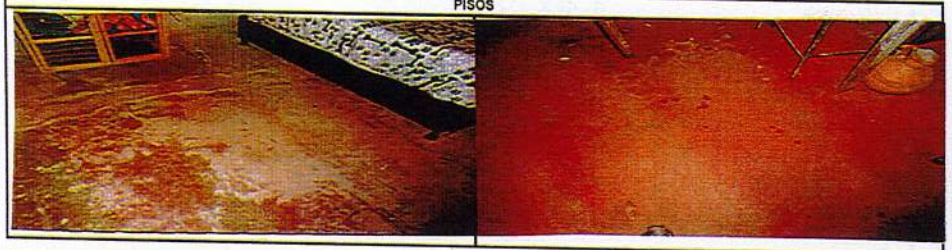


PAREDES

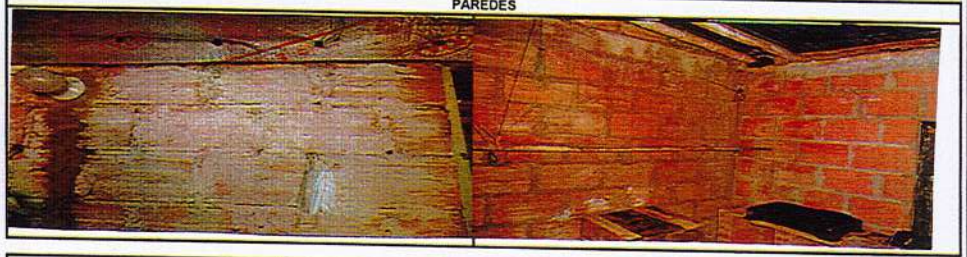

TECHO



BAÑO

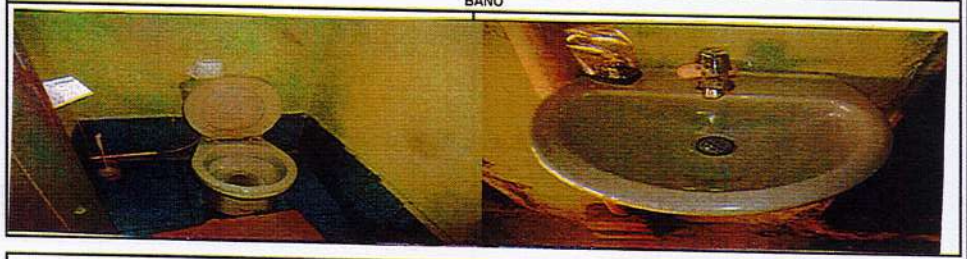

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Luis Alfonso Garcia
C C O NIT 84190754

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldia, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

2744

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 032

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 12 | MM 12 | AA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Julieth Moreno

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Elizabeth.

Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Teléfono: 3212567642

Departamento: CASANARE Municipio: Tilodiran. No. de pisos: ___ Barrio: Centro.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial	X	7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Grietas en anden X Vidrio roto fachada lateral Cubierta eternit y zinc. X Carpinteria metalica desgastada.	X Grieta muro entrada habt #1 y pintura soplada. X Grieta muro entrada habt #3.	X Piso con fisuras.	X Cubierta eternit X Cerchas desgastadas.	X Grieta columna baño	X Tanque en baldosa con fisuras y humedad.	X Mesón enchapado con adoquines faltantes y concreto deteriorado. X Baldosas faltantes en baño.
2 HUMEDADES							
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
COMENTARIOS	X Piso con descoscaramiento.	Nota: No se accedió a la habt #3. Tiene candado.					X Ventana habt #1 Sin un vidrio y un vidrio roto.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Julieth Moreno
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. O NIT 1073249754

Representante del Contratista de Obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

2800
