CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 04
PERIODO: DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:

4318 DE 2023 – OAC LOS ALETONES
4045 DE 2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
4346 DE 2023 – OAC CAMPOALEGRE

PERIODO:

DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO


<table>
<tr><td>Tipo de Documento:

INFORME TÉCNICO</td><td colspan="2" rowspan="3">Contrato:

ACEPTACIÓN DE OFERTA 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</td></tr>
<tr><td>Titulo:

INFORME MENSUAL No 4. JULIO/2024</td></tr>
<tr><td>Emitido para:

Aprobación</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ELABORÓ:
Ing. Residente</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>Ing. Diego Fernando Gallego Calderon
C. C. No. 1.006.524.418 de Belén de los Andaquies
M P No. 091037 0644694 CND</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REVISÓ:
Ing. Director</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>Ing. Elkin David Ramos Mosquera
C. C. No. 7.692.245 de NEIVA
M P No. 19202 61820 CAU</td></tr>
<tr><td rowspan="2">APROBÓ:
Supervisor</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>José Ricardo Burbano Barcenas</td></tr>
</table>

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023
4045 DE 2023
4346 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES
Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 4

MES O PERIODO: JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4-6
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7-13
	CONTENIDO		14-18
1	**INTRODUCCIÓN**		19-21
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		22
2.1	Localización		22-27
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		28
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		28-30
2.4	Características técnicas del proyecto		30-42
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		43
3.1	Información general de convenios solidarios		43-53
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		54-60
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		60
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		60-62
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	63-64
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	64
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	64
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	65
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	65-66
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	66
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	67
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		67
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		67
	• Seguimiento programa de obra		68-70
4.10	• Actas de comité de obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	70
4.11	• Actas de reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	70
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		71
5.1	Información general del contrato		71-74
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		75
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		76
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	76
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	76
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	76
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	76
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		76
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	76
7	**Conclusiones y recomendaciones**		77
8	**Anexos**		78-82
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		83-103
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		104-111
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		112-169
8.4	Informes semanales		170-203
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		204-210
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		211-223
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		224-233
8.8	Estado general del tiempo		234-240
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		241-258

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023
4045 DE 2023
4346 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES
Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 4

MES O PERIODO: JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		259-268
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		269-275
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		276-282
8.13	Seguimiento programa de obra		283-289
8.14	Actas de comité de obra		290-302
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		303-308
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		309-312
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		313-314
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		315-318
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		319-320

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4318 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 196.378.598,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	102
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 147.760.112,00	$ -	$ 147.760.112,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.185.683,00	$ -	$ 44.185.683,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.432.803,00	$ -	$ 4.432.803,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 196.378.598,00	$ -	$ 196.378.598,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 15.780.601,07	$ -	$ 15.780.601,07	$ 15.780.601,07
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 15.780.601,00	$ -	$ 15.780.601,00	$ 15.780.601,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 70.008.970,19
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.780.601,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 27,614%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS COMO VIGAS RIOSTRAS, HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS.



ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR SOBRE LA VIA.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4045 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 185.171.800,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 185.171.800,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.939.422,00	$ -	$ 138.939.422,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 42.064.195,00	$ -	$ 42.064.195,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.168.183,00	$ -	$ 4.168.183,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 185.171.800,00	$ -	$ 185.171.800,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 50.228.943,00	$ -	$ 50.228.943,00	$ 50.228.943,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 15.022.926,79	$ -	$ 15.022.926,79	$ 30.045.853,58
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 65.251.870,00	$ -	$ 65.251.870,00	$ 65.251.870,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 75.159.381,90
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 65.251.870,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -5,350%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EXCAVACIONES PARA ENCOLES Y DESCOLES DE LA ALCANTARILLA





INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA, FUNDIDA DE ATRAQUES E INSTALACIÓN DE TUBERIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4346 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.753.948,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	102
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.067.610,00	$ -	$ 151.067.610,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.154.310,00	$ -	$ 44.154.310,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.532.028,00	$ -	$ 4.532.028,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.753.948,00	$ -	$ 199.753.948,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 15.770.574,19	$ -	$ 15.770.574,19	$ 15.770.574,19
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 15.770.574,00	$ -	$ 15.770.574,00	$ 15.770.574,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 85.966.109,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.770.574,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -35,141%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.	19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 19
ANTECEDENTES 21
FINALIDAD DEL PROYECTO 21
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 22
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 22
2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS 22
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 28
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 28
A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES 28
B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES 29
C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE 29
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS 30
3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS 43
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 43
➢ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023 ..... 43**
➢ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023 ..... 47**
➢ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023 ..... 51**
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 54
3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS 60
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 60
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 63
4.1. INFORME SEMANAL 63
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS 64
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS 64
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 65
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 65
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 65
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 66
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS 67
4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL 67
➢ **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO 67**
➢ **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 68**
4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 70

4.11. ACTAS DE REUNIÓN 70
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 71
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 71
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 75
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 76
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 76
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 76
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA 76
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 76
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 76
7. CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES 77
8. ANEXOS 78
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 78
8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318 78
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 78
8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346 78
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 78
8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318 78
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 78
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346 78
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO 78
8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318 78
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 78
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346 78
8.4. INFORMES SEMANALES 78

8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **78**
8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045 ..... **78**
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **78**
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **78**
8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **78**
8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045 ..... **78**
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **78**
8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **79**
8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **79**
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **79**
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **79**
8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **79**
8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **79**
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **79**
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **79**
8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **79**
8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **79**
8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **79**
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **79**
8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **79**
8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **79**
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **79**
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **79**
8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **79**

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **79**
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **79**
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **79**
8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **80**
8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **80**
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **80**
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **80**
8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **80**
8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **80**
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **80**
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **80**
8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA **80**
8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **80**
8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **80**
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **80**
8.14. ACTAS DE REUNIÓN **80**
8.14.1. Actas de reunión de la Vereda Los Aletones– CS#4318 ..... **80**
8.14.2. Actas de reunión de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **80**
8.14.3. Actas de reunión de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **80**
8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA **80**
8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **80**
8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **80**
8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **80**

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 81

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""**, hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor BENITO OME MUÑOZ de la JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor LUIS ELVER CAANTILLO PATIÑO de ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA

VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor JESUS OME RENTERIA de la JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, los cultivos ilícitos y aprovechamientos forestales.

Debido el aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas, las trochas son intervenidas con maquinarias pesada para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, una de las principales actividades económicas de la región que afectan la transitabilidad y aspecto de estas.

El programa caminos para la paz pretende ayudar a la transformación de nuestros campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías terciarias con el objetivo de regenerar las comunicaciones, comercio y acceso a bienes básicos como la salud y educación de estas veredas.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá *s*e localiza en el Sur del país, haciendo parte de la región Amazonia*.* Cuenta con una superficie de 88.965 Km², es el tercer departamento más extenso. Su capital es la ciudad de Florencia*,* y está dividido política y administrativamente en 16 municipios; dos de ellos son los municipios de Belén de los Andaquies y Morelia en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de Belén de los Andaquies se encuentra localizado en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia. Se encuentra en la Zona de transición Andino-Amazónica. En este municipio Se desprende la cordillera Oriental de los Andes Colombianos del Macizo Colombiano. Entre sus paisajes se encuentran el de montaña, piedemonte, lomeríos y valles. Su cabecera municipal se encuentra localizada sobre las coordenadas 1°24’59” latitud Norte y 75°52’21” a una altitud de 310 m s. n. m.

En cuanto al municipio de Morelia se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia y al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 1°29’25” de latitud norte y 75°43’43” de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46468 hectáreas (464.7 km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- *VEREDA LOS ALETONES (CS # 4318 - 2023)*

El tramo a intervenir de Placa Huella se encuentra ubicado en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda Los Aletones, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda Aletones en Km 11+450 de la vía Tramo Los Mosquera, con coordenadas iniciales 1,48793 N ; - 75,86604 W, y punto final de coordenadas 1,48851 N- 75,86735 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=ebdd4dd3-54ae-4426-9c87-2888ad8574f4&cp=1.488768%7E-75.865319&lvl=17.5&v=2&sV=2&form=S00027&style=h

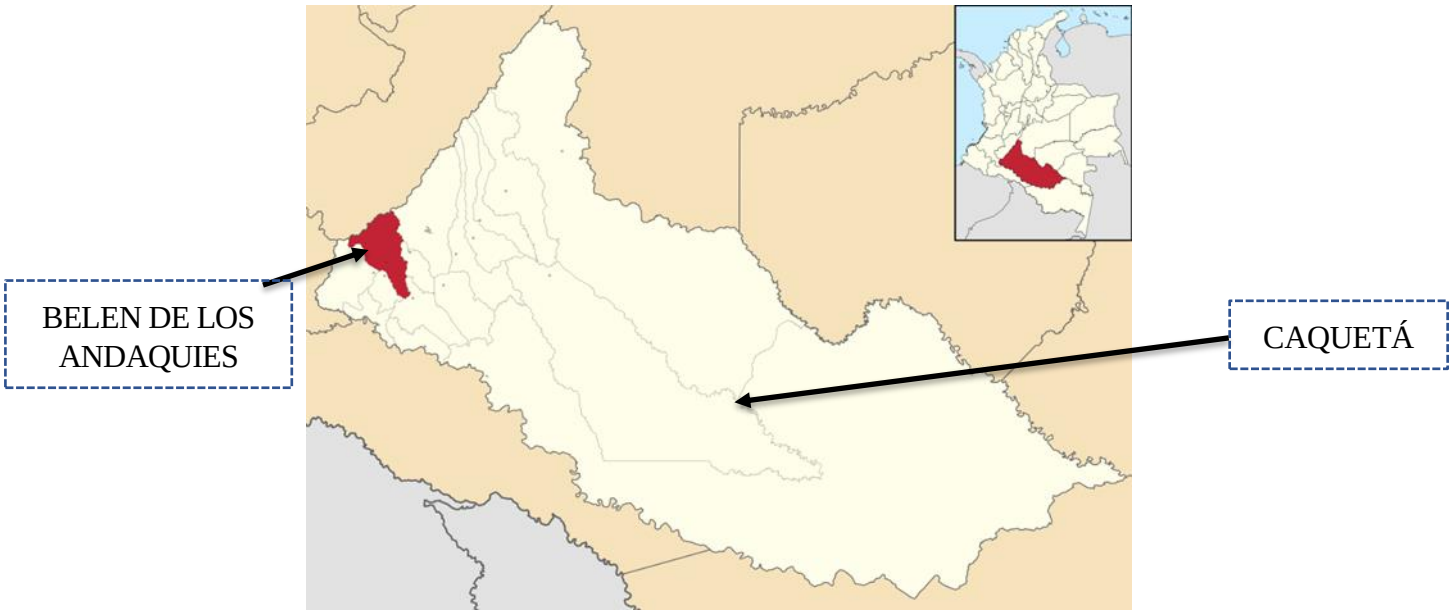


Ilustración 1. *Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 2. *Ubicación del proyecto en la Vereda Los Aletones.*



Ilustración 3. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Los Aletones.*

- *ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES (CS # 4045 - 2023)*

Los puntos a intervenir de Alcantarillas se encuentran ubicados en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda El Porvenir, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda El Porvenir en Km 2+400 de la vía Tramo Génova, con coordenadas iniciales 1,42528 N; - 75,88028 W, y punto final de coordenadas 1,44111 N; - 75,87000 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=395e39ac-09e7-4d8c-bc15-5c781dcf6238&cp=1.43193%7E-75.866188&lvl=14.7&v=2&sV=2&form=S00027

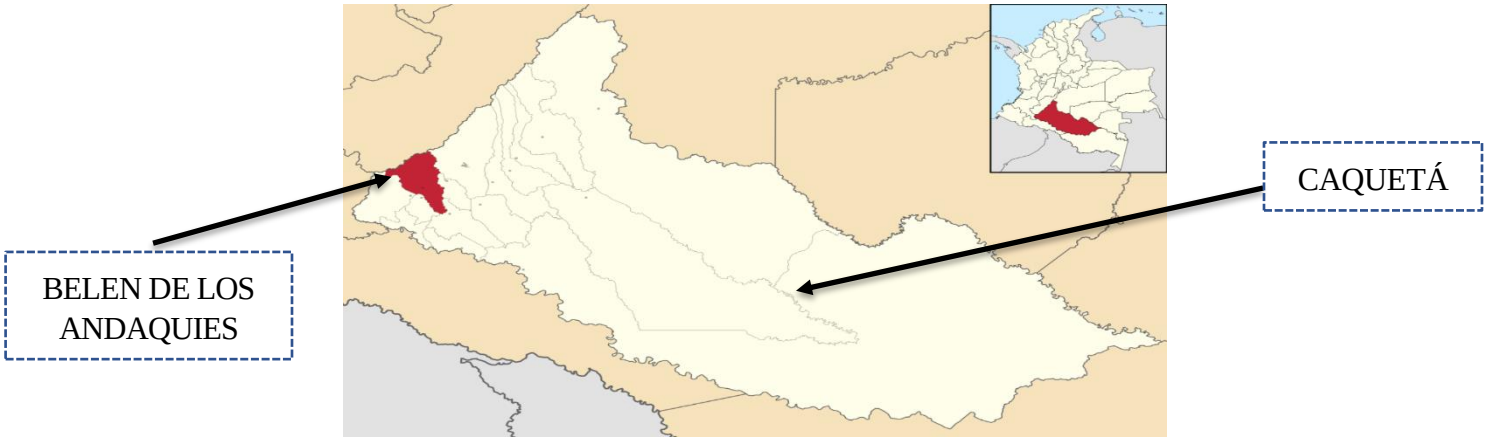


Ilustración 4. *Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 5. *Ubicación del proyecto ASOJUNTAS BELEN en la Vereda El Porvenir.*

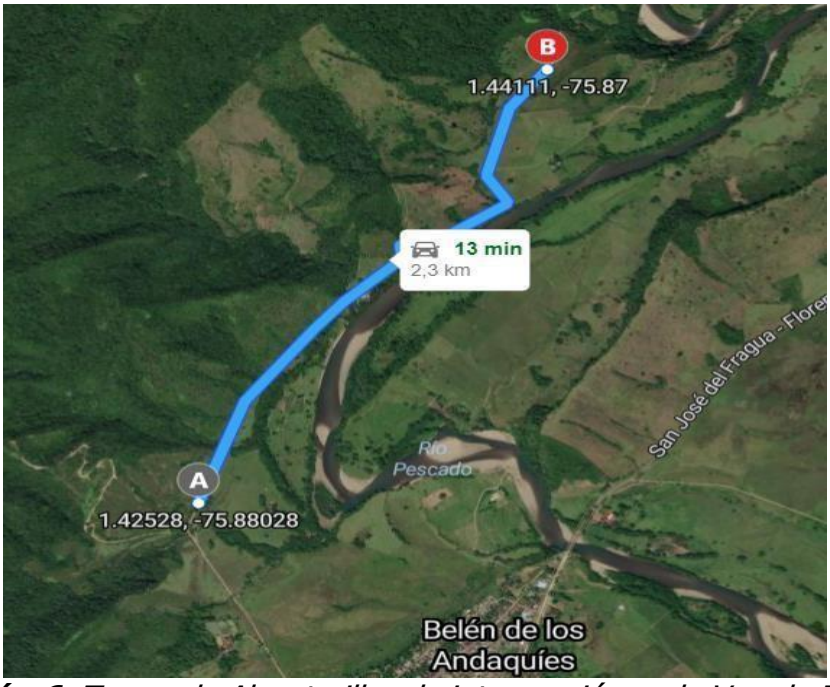


Ilustración 6. *Tramo de Alcantarillas de intervención en la Vereda El Porvenir.*

- *VEREDA CAMPOALEGRE (CS # 4346 - 2023)*

Los puntos a intervenir de Alcantarilla y Placa Huella se encuentran ubicados en el Se encuentra ubicados en el municipio de Morelia Caquetá en la vereda Campoalegre, teniendo como punto de referencia inicial el PR 21+000 de la vía Morelia – Valparaíso, con coordenadas iniciales 1,31611 N; - 75,69974 W, y punto final de coordenadas 1,31416 N; - 75,69173 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=40c04c60-c5b6-498e-a7ae-c62470f7a743&cp=1.315309%7E-75.700997&lvl=16.8&v=2&sV=2&form=S00027

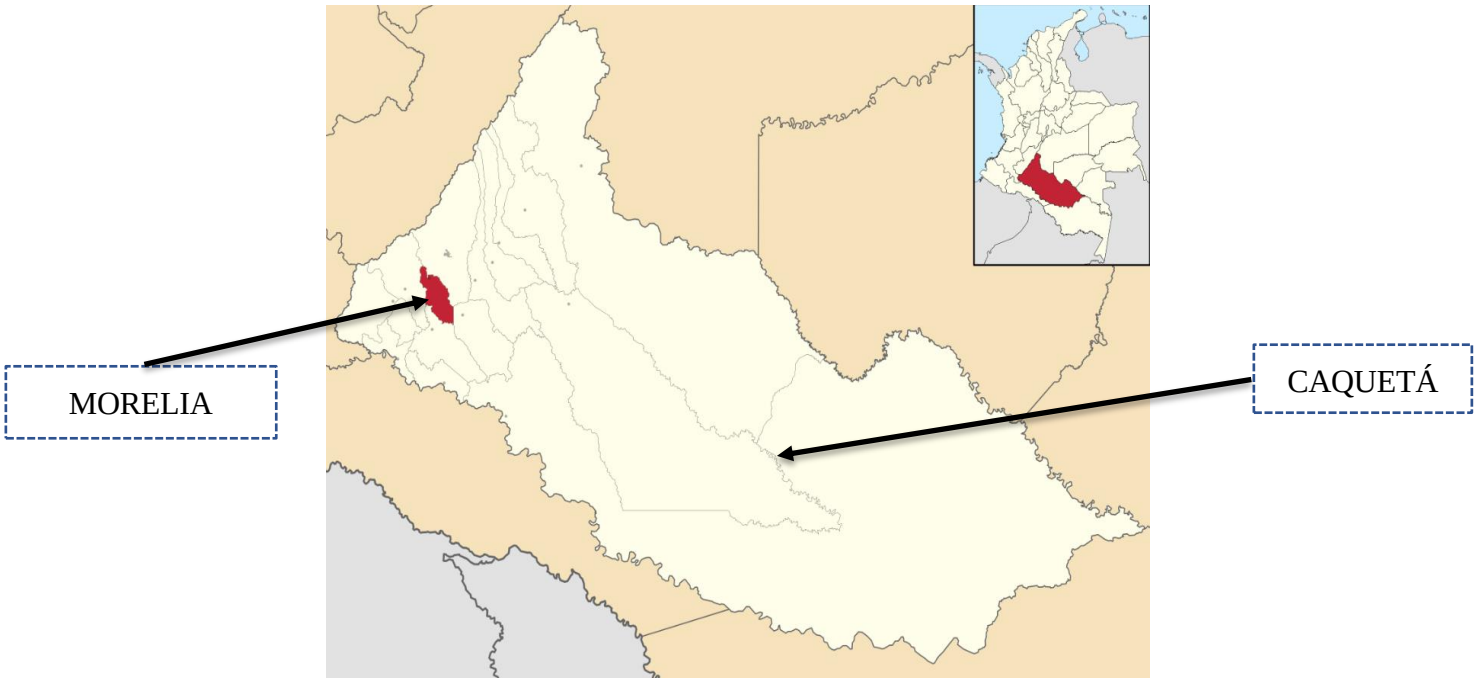


Ilustración 7. *Localización municipio de Morelia en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 8. *Ubicación del proyecto en la Vereda Campoalegre.*

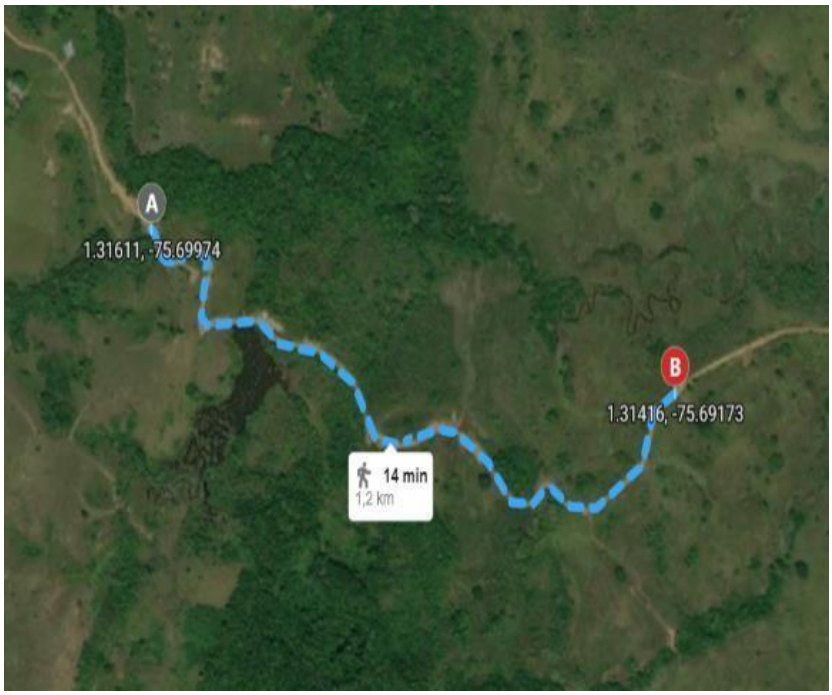


Ilustración 9. *Tramo de placa huella y alcantarilla de intervención en la Vereda Campoalegre.*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Belén de los Andaquies en sus veredas Aletones, El Porvenir, San Luis, San Antonio, Las Minas, El Prado y Los Ángeles, en el municipio de Morelia en sus Veredas Campo Alegre, Fuente Hermosa, Virginia y Rochela. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a las comunidades una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, la cual ocupa un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Los Aletones*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir llamado Los Mosquera actualmente se ha convertido en un punto crítico que dificulta el acceso y el tránsito de vehículos o motocicletas hacia las diferentes zonas veredales del municipio. Una de las principales causas de esta problemática se genera en épocas de invierno principalmente por la composición del suelo tipo arcilloso que suelen presentar un alto porcentaje de saturación de humedad provocando una afectación directa al estado de la vía. Debido esto se requiere una intervención directa a través de un mejoramiento a la estructura de la vía y pavimentación mediante el sistema

de placa huella con el fin de mejorar la movilidad y el transporte de los diferentes productos agrícolas comercializados en la zona con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento económico en el área rural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

- INVENTARIO

En el tramo de intervención se evidencian alcantarillas en concreto reforzado y tramos de placa huella por sectores.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Regular	8
Placa Huella	Regular	500 m

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención – Asojuntas Belén de los Andaquies*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Los puntos a intervenir se encuentran por nombre vía Génova – La abeja, los cuales presentan diversos puntos críticos en diferentes tramos principalmente por el mal manejo y drenaje de aguas lluvias en épocas de inviernos que provocan la perdida de los finos, socavación, derrumbes entre otros afectando la movilidad y el transito vial de los habitantes, productos agrícolas, etc. Por lo tanto, se requiere la necesidad de realizar mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje existentes (cunetas y alcantarillas) además de construir o implementar nuevas obras de canalización y desagües en puntos críticos a lo largo de la vía. De esta manera se busca mitigar el impacto y daños de la vía por causas de las fuertes lluvias.

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Campoalegre*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir se encuentra en un estado general de la superficie como una vía carreteable que presenta irregularidades del terreno a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias, los cuales impiden la transitabilidad de fácil acceso en épocas de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es variable entre 5 a 6 m aproximadamente. Se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.


A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Aletones, Campoalegre y la Asociación comunal de juntas del municipio de Belén de los Andaquies, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LOS ALETONES** (CS#4318 DE 2023)

La organización de acción comunal de la vereda Los Aletones tiene como alcance la construcción de ciento dos (102) metros lineales de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

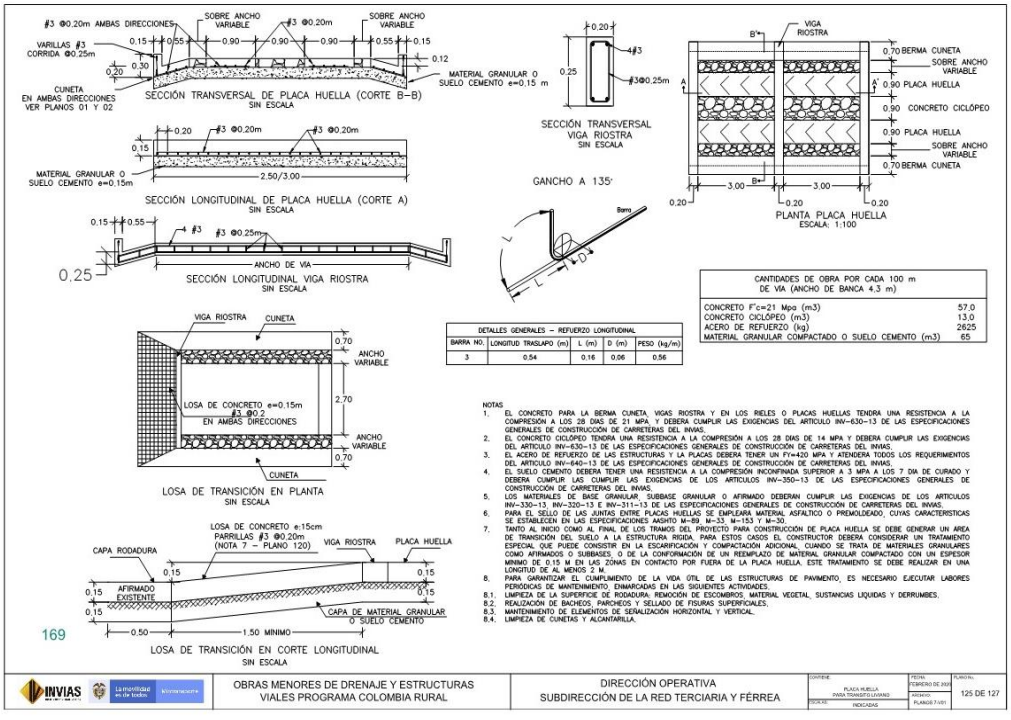



- **ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES** (CS#4045 DE 2023)


La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies tiene como alcance la construcción de cinco (5) alcantarillas.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

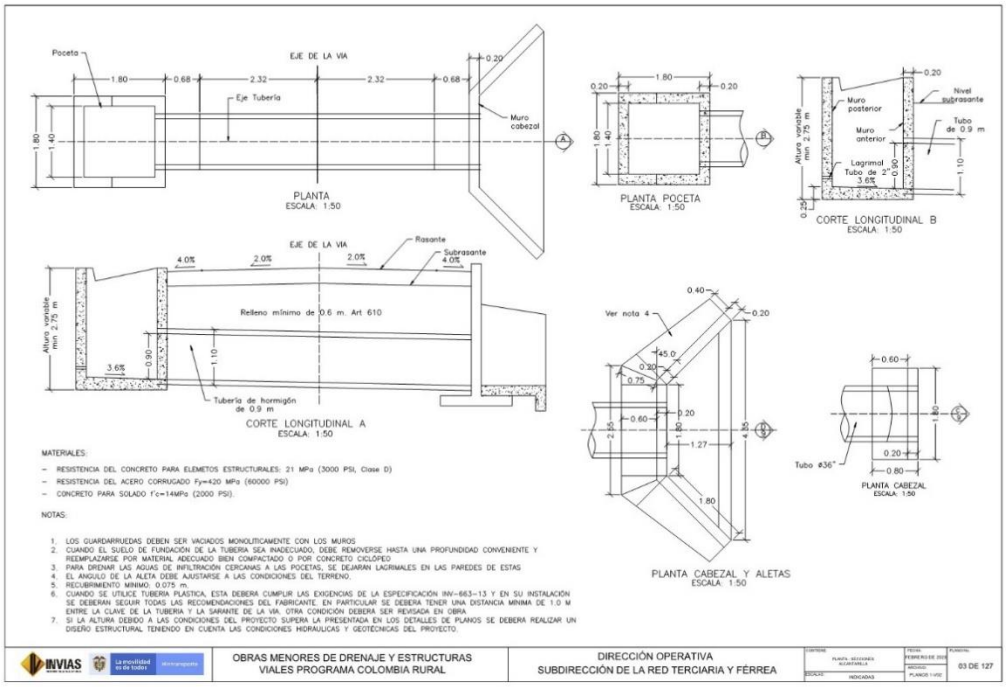

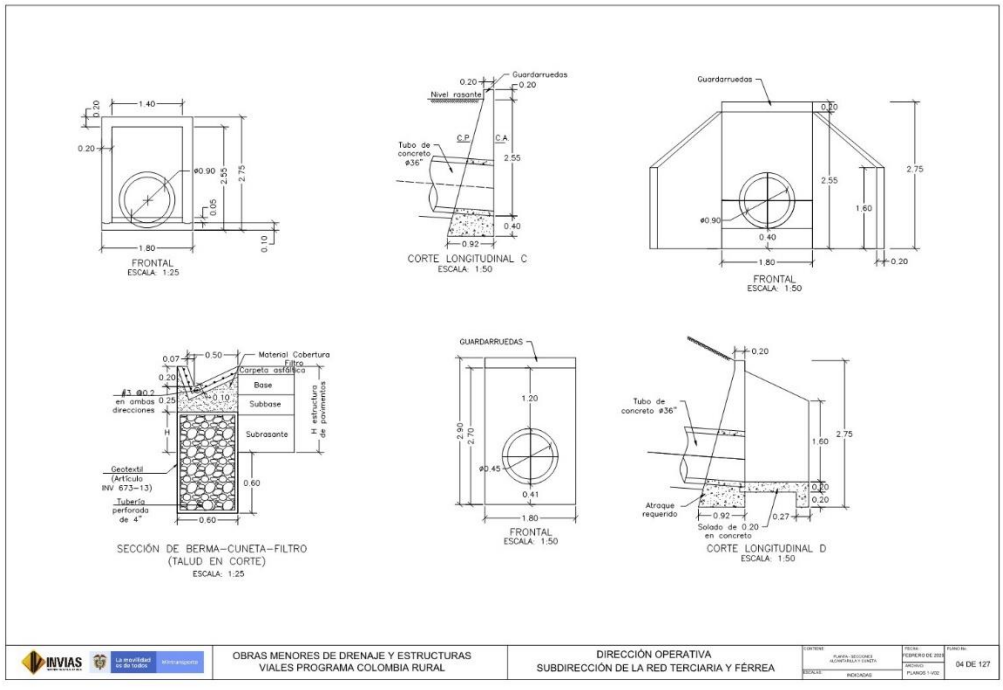


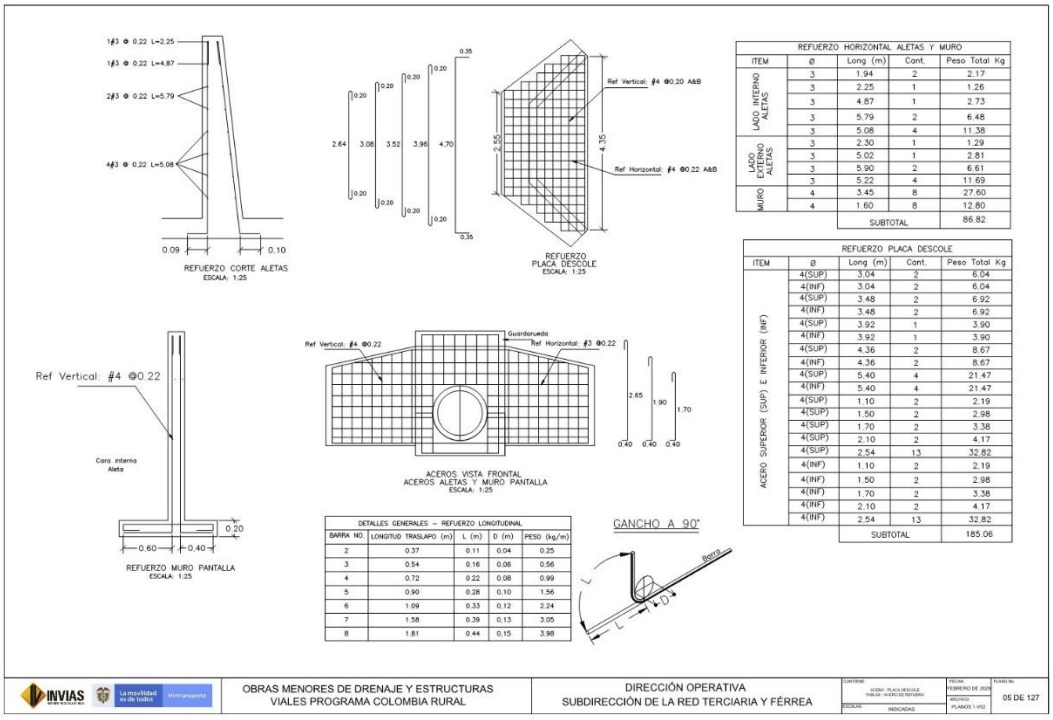

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
MURO	3	5.22	4	11.69
	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
SUBTOTAL				86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE				
ITEM	Ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
SUBTOTAL				185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

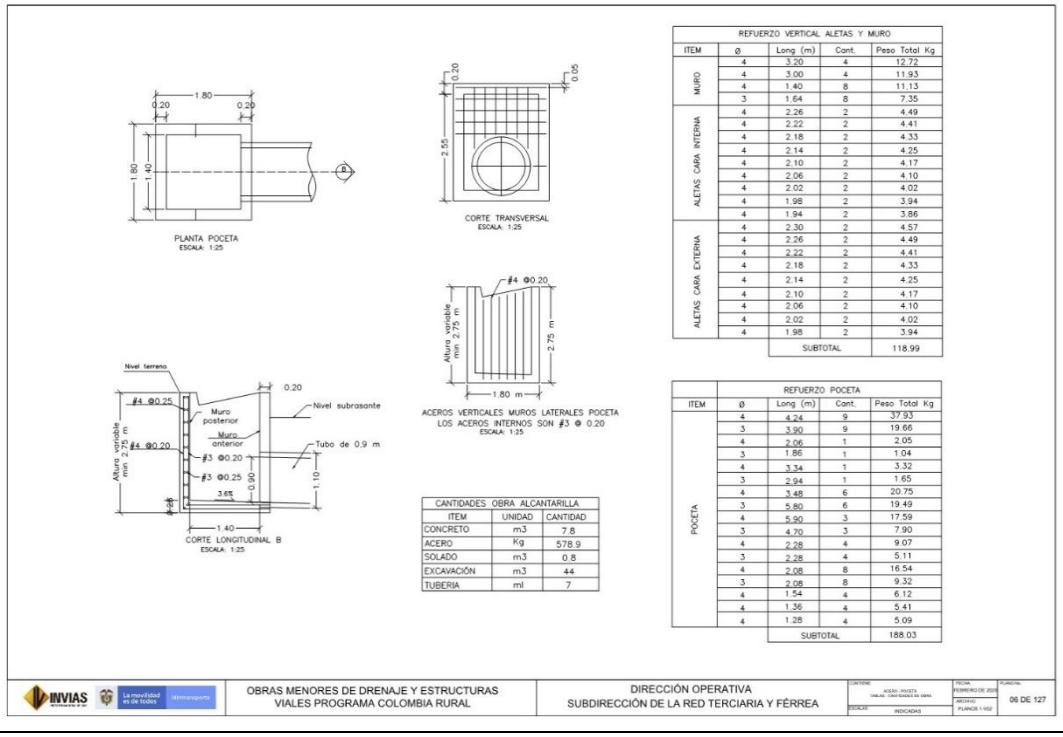

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
SUBTOTAL				118.99

REFUERZO POCETA				
ITEM	Ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
SUBTOTAL				188.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERIA	ml	7


CRA 1 No. 29-08 Oficina 208 B/ El Cunduy
elkinramos@gmail.com – Florencia - Caquetá

- **JAC CAMPOALEGRE** (CS#4346 DE 2023)

La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

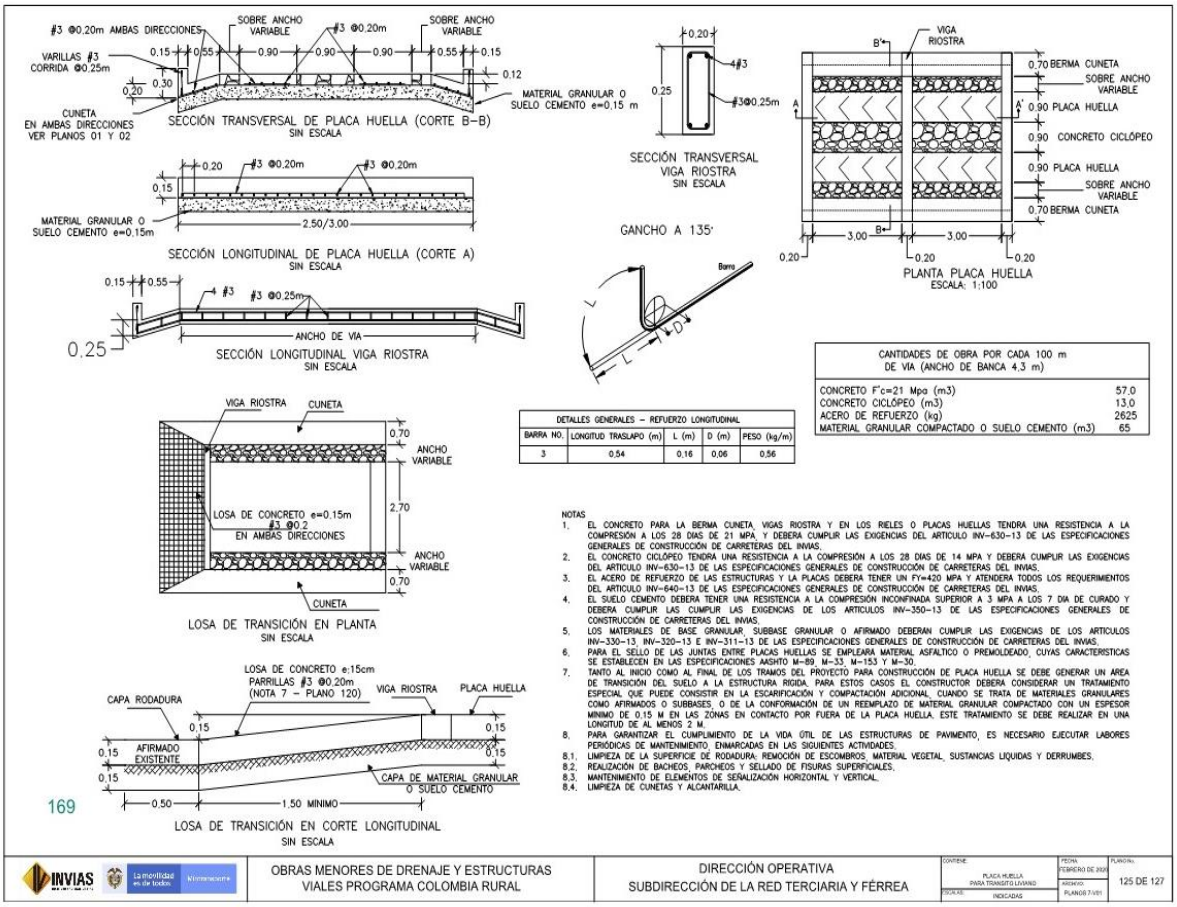

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
3	0.54	0.16	0.06	0.56

CANTIDADES DE OBRA POR CADA 100 m DE VIA (ANCHO DE BANCA 4.3 m)	
CONCRETO F'c=21 Mpa (m3)	57.0
CONCRETO CICLÓPEO (m3)	13.0
ACERO DE REFUERZO (kg)	2625
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO O SUELO CEMENTO (m3)	65

NOTAS


1. EL CONCRETO PARA LA BERMA CUNETA, VIGAS RIOSTRA Y EN LOS RIELES O PLACAS HUELLAS TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE 21 MPA, Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
2. EL CONCRETO CICLÓPEO TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE 14 MPA Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
3. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PLACAS DEBERA TENER UN FY=420 MPA Y ATENDERA TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO INV-640-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
4. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPA A LOS 7 DIA DE CURADO Y DEBERA CUMPLIR LAS CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV-350-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
5. LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV-330-13, INV-320-13 E INV-311-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
6. PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARA MATERIAL ASFALTICO O PREMOLDEADO, CUYAS CARACTERISTICAS SE ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES AASHTO M-89, M-33, M-153 Y M-30.
7. TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN AREA DE TRANSICIÓN DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RIGIDA. PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSIDERAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACIÓN DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.15 M EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA LONGITUD DE AL MENOS 2 M.
8. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.


8.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCIÓN DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
8.2. REALIZACIÓN DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
8.3. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
8.4. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.


169

INVIAS | OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL | DIRECCIÓN OPERATIVA SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | CONTIENE: PLACA HUELLA PARA TRANSITO LIVIANO | ESCALAS: INDICADAS | FECHA: FEBRERO DE 2024 | ARCHIVO: PLANOS 7 V01 | PLANO No. 125 DE 127

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

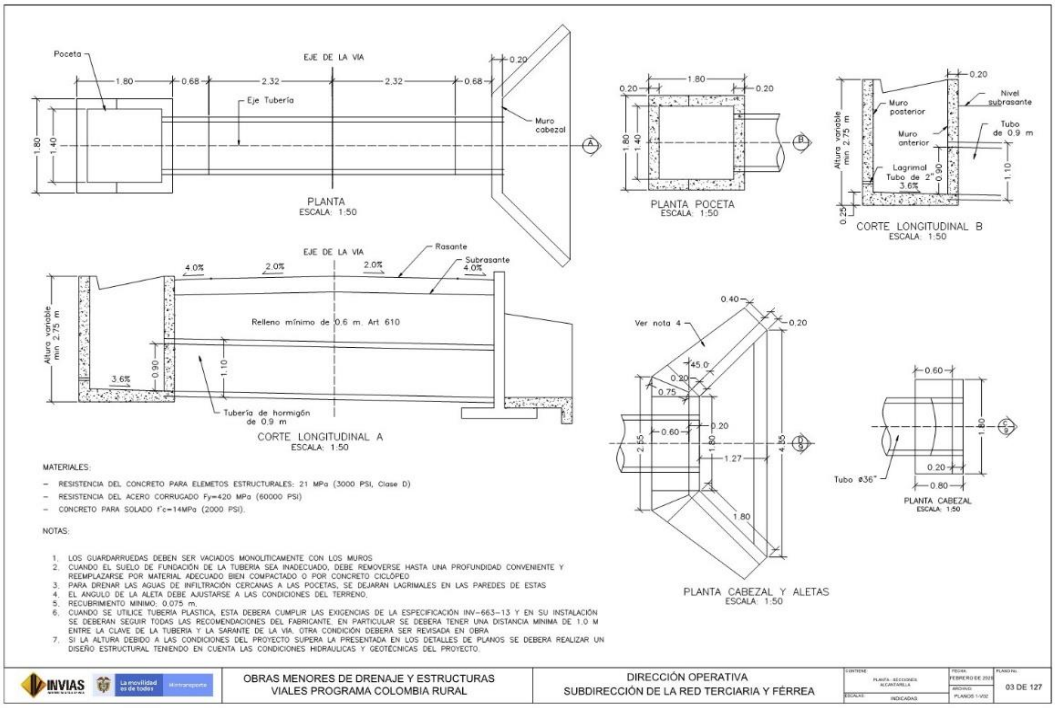

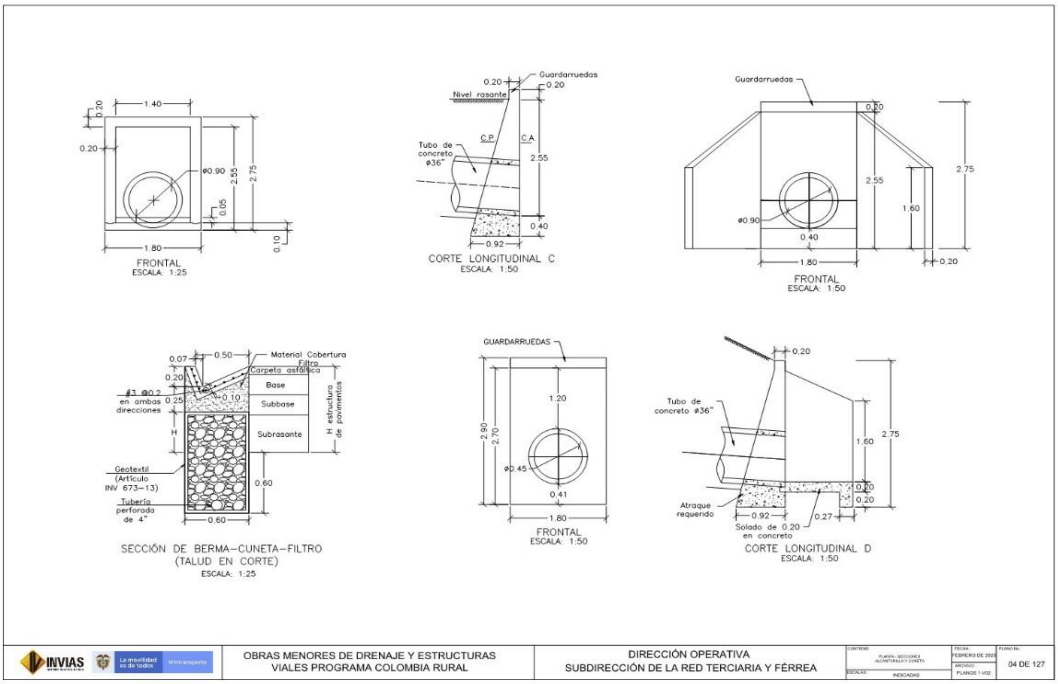

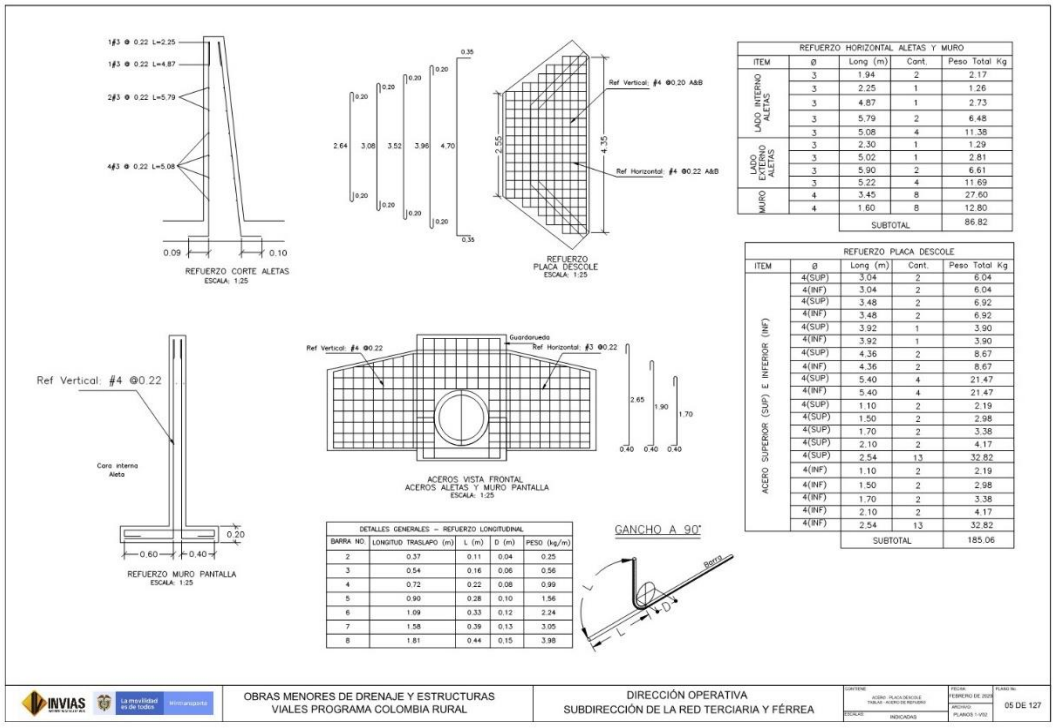

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
	3	5.22	4	11.69
MURO	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
SUBTOTAL				86.82


REFUERZO PLACA DESCOLE				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
SUBTOTAL				185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCIÓN OPERATIVA
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

05 DE 127

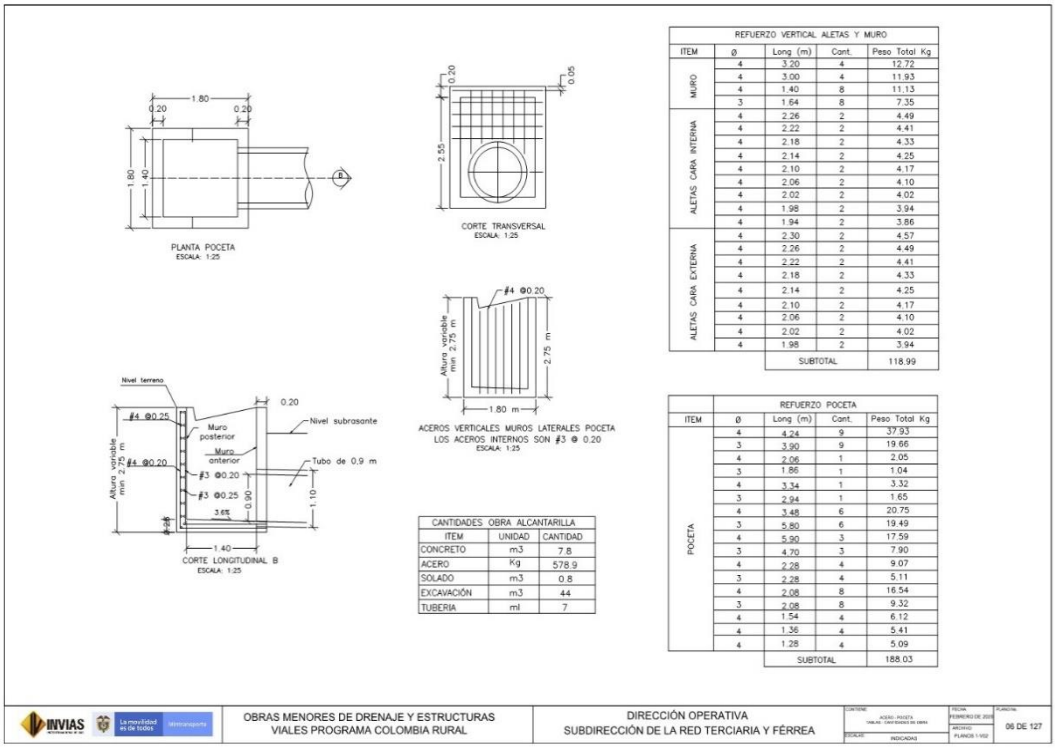

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
SUBTOTAL				118.99

REFUERZO POCETA				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
SUBTOTAL				188.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERIA	ml	7

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCIÓN OPERATIVA
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA


06 DE 127

- **JAC CAMPOALEGRE** (CS#4346 DE 2023)

La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

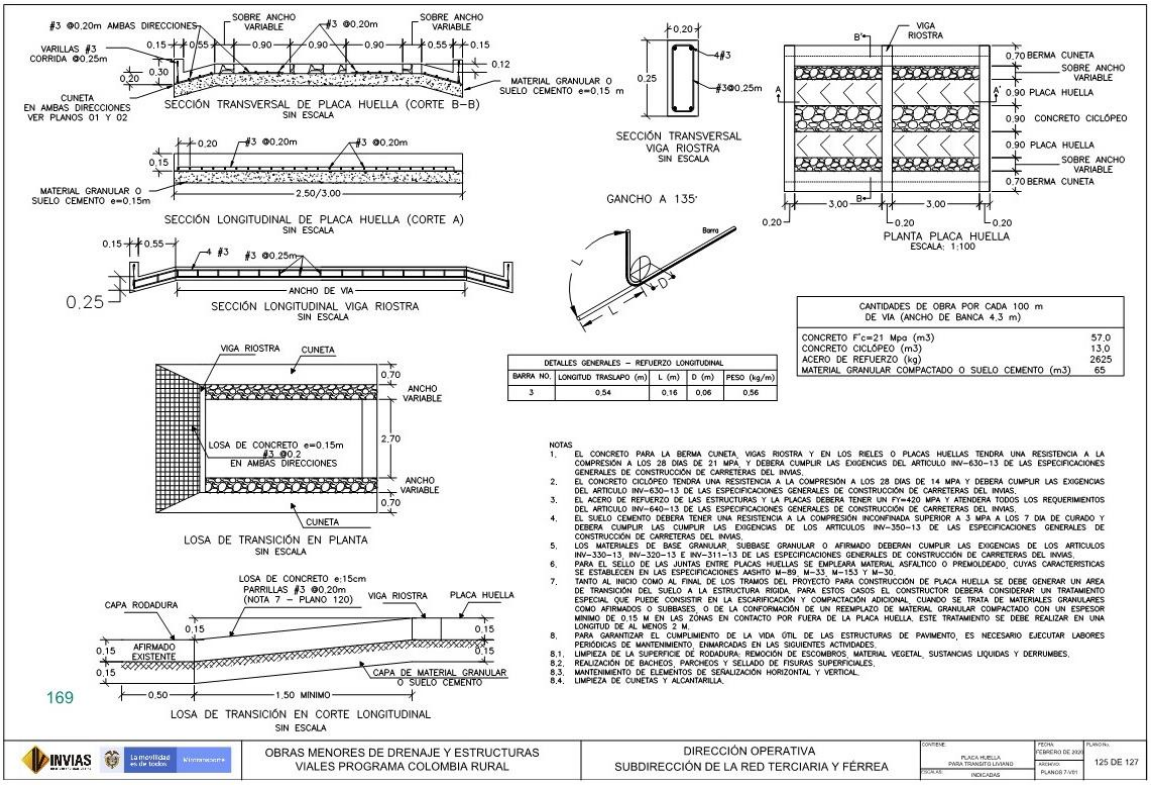


DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
3	0.54	0.16	0.06	0.56


CANTIDADES DE OBRA POR CADA 100 m DE VIA (ANCHO DE BANCA 4.3 m)	
CONCRETO F'c=21 Mpa (m3)	57.0
CONCRETO CICLÓPEO (m3)	13.0
ACERO DE REFUERZO (kg)	2625
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO O SUELO CEMENTO (m3)	65


NOTAS

1. EL CONCRETO PARA LA BERMA CUNETA, VIGAS RIOSTRA Y EN LOS RIELES O PLACAS HUELLAS TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE 21 MPA, Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO INV–630–13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVAS.
2. EL CONCRETO CICLÓPEO TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE 14 MPA Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO INV–630–13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVAS.
3. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PLACAS DEBERA TENER UN FY=420 MPA Y ATENDERA TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO INV–640–13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVAS.
4. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPA A LOS 7 DIA DE CURADO Y DEBERA CUMPLIR LAS CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV–350–13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVAS.
5. LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV–330–13, INV–320–13 E INV–311–13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVAS.
6. PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARA MATERIAL ASFALTICO O PREMOLDEADO, CUYAS CARACTERISTICAS SE ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES AASHTO M–89, M–33, M–153 Y M–30.
7. TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN AREA DE TRANSICIÓN DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RIGIDA, PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSIDERAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACIÓN DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.15 M EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA LONGITUD DE AL MENOS 2 M.
8. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
   8.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCIÓN DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
   8.2. REALIZACIÓN DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
   8.3. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
   8.4. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

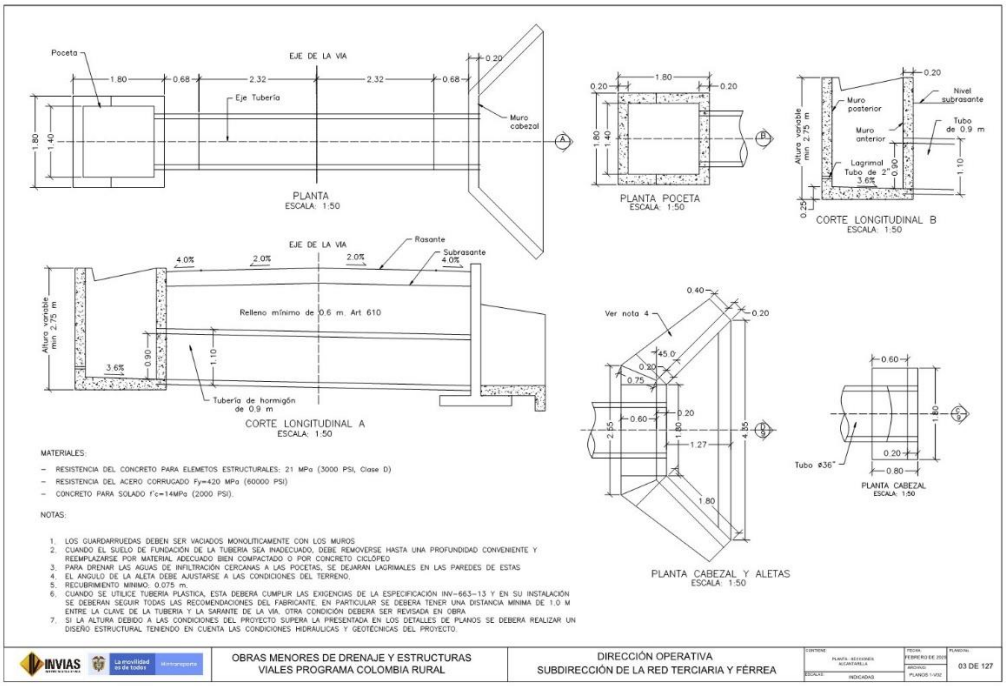

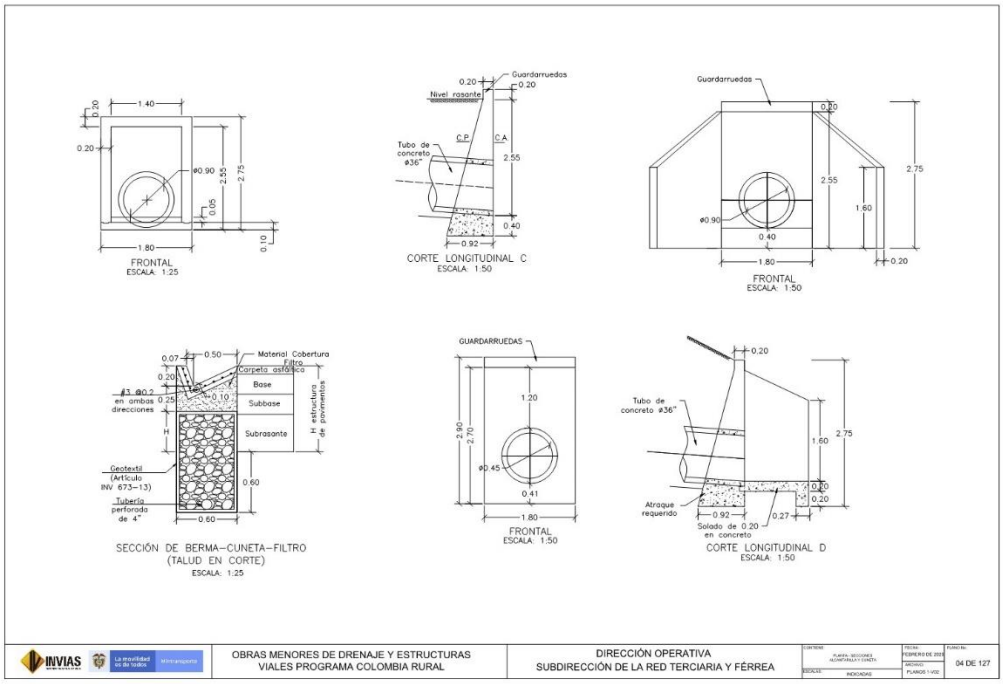

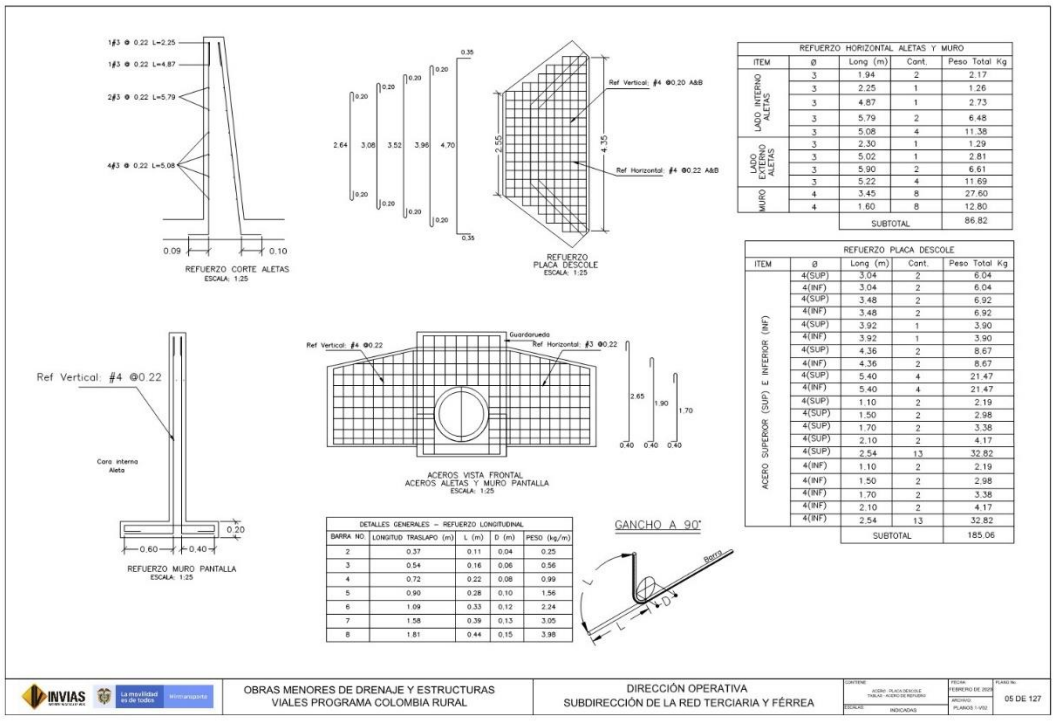

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
MURO	3	5.22	4	11.69
	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
SUBTOTAL				86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
SUBTOTAL				185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

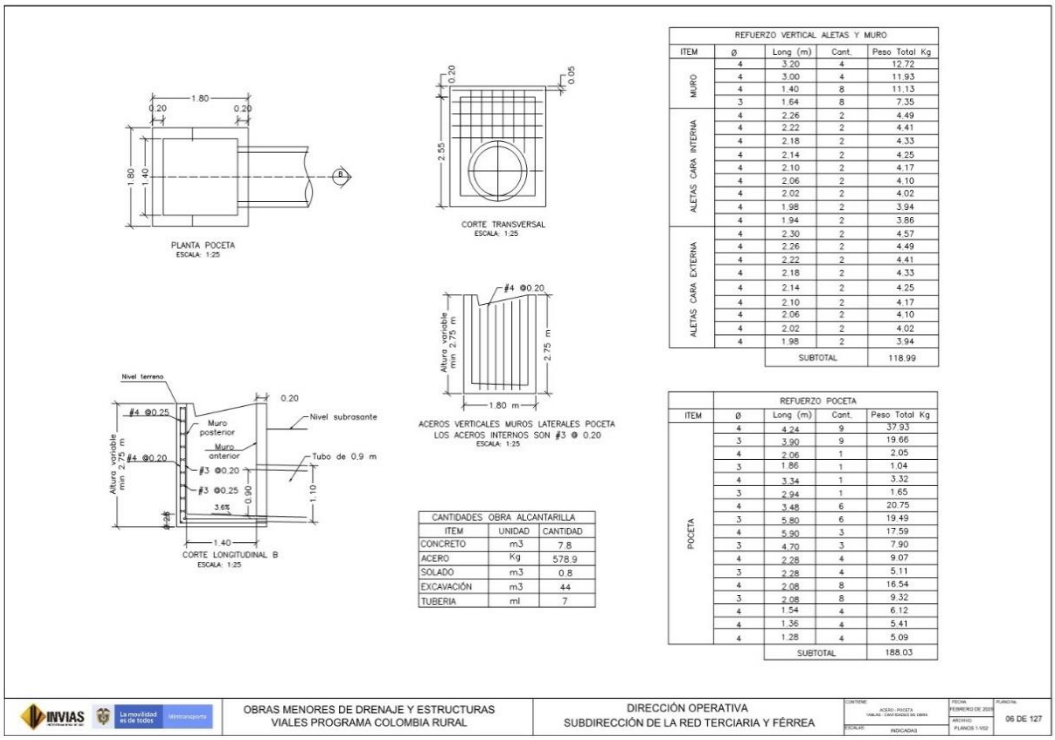

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
SUBTOTAL				118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
SUBTOTAL				188.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERIA	ml	7

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 4318 – 2023 se suscribió el día 17 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor BENITO OME MUÑOZ en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**$197.378.598,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**$196.378.598,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4318-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES
NIT:	900.553.557-8
REPRESENTANTE LEGAL:	BENITO OME MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	17.683.153 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	$ 197.378.598,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 196.378.598,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 16 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 01 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4318-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19

de junio de 2024 un alcance físico de 102 ml de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETÁ	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES	102,00	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	$ -
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 209.706,00	$ 209.706,00
							SUB-TOTAL	$ **209.706,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	163,000	$ 29.262,00	$ 4.769.706,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	125,740	$ 244.056,00	$ 30.687.601,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,420	$ 1.136.318,00	$ 69.792.652,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,920	$ 616.013,00	$ 15.967.057,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.087,150	$ 8.530,00	$ 26.333.390,00
							SUB-TOTAL	$ **147.550.406,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ **147.760.112,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ **4.432.803,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ **44.185.683,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ **196.378.598,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4045 – 2023 se suscribió el día 24 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DELOS ANDAQUIES**, por un valor del convenio de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$186.171.800,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$185.171.800,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4045-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
NIT:	900.128.460-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	17.684.267 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	$ 186.171.800,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 185.171.800,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4045-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como*

se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de 5 alcantarillas, dos de ellas aleta por aleta y las otras tres caja-aleta. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado.

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	ALCANTARILLAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	BELEN DE LOS ANDAQUIES	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS CABECERA MUNICIPAL	5,00	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	$ 65.271,00	$ 783.252,00
							SUB-TOTAL	$ 783.252,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 178.577,00	$ 178.577,00
							SUB-TOTAL	$ 178.577,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	270,30	$ 26.911,00	$ 7.274.043,00
4	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	67,60	$ 56.658,00	$ 3.830.081,00
5	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	0,00	$ 150.500,00	$ -
6	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	19,10	$ 711.276,00	$ 13.585.372,00
7	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	50,90	$ 1.080.948,00	$ 55.020.253,00
8	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3643,00	$ 7.350,00	$ 26.776.050,00
9	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	76,30	$ 151.961,00	$ 11.594.624,00
10	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	30,00	$ 663.239,00	$ 19.897.170,00
							SUB-TOTAL	$ 137.977.593,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 138.939.422,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 185.171.800,00

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4346 – 2023 se suscribió el día 14 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *JESUS OME RENTERIA* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (**$200.753.948,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (**$199.753.948,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4346-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE
NIT:	900.622.519-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS OME RENTERIA
IDENTIFICACIÓN:	17.631.475 DE FLORENCIA

VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.753.948,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 199.753.948,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4346-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de ciento dos (102) ml de placa huella y una (1) alcantarilla. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m) Y ALCANTARILLAS (und)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MORELIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE	102 ML Y 1 ALCANTARILLA	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	6,00	$ 66.271,00	$ 397.626,00
							SUB-TOTAL	$ 397.626,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 176.561,00	$ 176.561,00
							SUB-TOTAL	$ 176.561,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,43	$ 28.211,00	$ 96.764,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	100,98	$ 144.365,00	$ 14.577.978,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	62,08	$ 1.040.558,00	$ 64.597.841,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	26,44	$ 547.005,00	$ 14.462.812,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.807,19	$ 8.610,00	$ 24.169.906,00
							SUB-TOTAL	$ 117.905.301,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	56,20	$ 28.211,00	$ 1.585.458,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0,30	$ 58.057,00	$ 17.417,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	3,58	$ 151.900,00	$ 543.802,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	16,00	$ 547.005,00	$ 8.752.080,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	11,10	$ 1.040.558,00	$ 11.550.194,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	731,00	$ 8.610,00	$ 6.293.910,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	22,20	$ 21.976,00	$ 487.867,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 559.565,70	$ 3.357.394,00
							SUB-TOTAL	$ 32.588.122,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT								
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.067.610,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.753.948,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 (LOS ALETONES)

El convenio solidario N° 4318-2023 que comprende una placa huella de 102 metros lineales por cinco metros de ancho, en la cual se han evidenciado diferentes actividades preliminares de instalación de campamento de obra, puntos de acopio para materiales pétreos, cemento y acero requeridos para la construcción de placa huella.

	
Imagen No. 1: Señalización de material granular sobre la vía.	**Imagen No. 2:** Acopio de material granular sobre la vía.

- **Figurado de Acero de Refuerzo FY 4200 Kg/cm2:** Se realizaron actividades de figuración principalmente de corte, doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones requeridas por el diseño para el refuerzo transversal y longitudinal de los diferentes elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos. Para esta actividad se ocuparon todos los auxiliares de obra (05), un oficial de obra (01), dirigidos por el maestro de obra e ingeniero residente.

	
Imagen No. 3: Figuración de acero de refuerzo para cunetas y bordillos.	**Imagen No. 4:** Figuración de acero de refuerzo de vigas riostras.

Por otro lado, el día 24 de julio se socializó ante la comunidad de la vereda Los Aletones por parte de esta firma de interventoría junto con el residente de obra el nuevo alcance del proyecto teniendo en cuenta la Cláusula Tercera: Alcance del objeto:, que se estipula en el Convenio Solidario, y con base a las cotizaciones realizadas por la JAC, se dio a conocer la actualización de los precios de materiales de obra, costos de transportes de materiales de construcción, costos de mano de obra, entre otros factores que intervienen en el costo directo de obra, dejando claro que se ejecutará ciento dos (102) metros lineales de placa huella en el tramo que se está interviniendo, tal como se aprobó en el Acta de comité de obra técnico No. 1 que se firmó el día 19 de junio de 2024.

- ❖ CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 (ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES)

- El Convenio Solidario No. 4045-2023 comprende un total de cinco alcantarillas y actividades de mantenimientos de estructuras ya existentes sobre el corredor vial que conecta el municipio de Belén de los Andaquies y El Centro Poblado los Aletones. Durante el presente mes de Julio del año 2024 se ha mostrado un avance significativo en actividades de mantenimiento y limpieza de alcantarillas debido a las fuertes lluvias en la zona. En la cual se ha evidencian actividades de excavación de forma manual y mecánica para la limpieza de las cunetas y perfilación por ambos costados de la vía de está forma garantizando el correcto encole de las aguas hacia la poceta. También se ha realizado excavación y desmonte de forma manual en el descole de la alcantarilla, ya que con el pasar del tiempo presenta acumulación de sedimentos y vegetación que no garantizan la funcionalidad en su totalidad de esta. Por último, es importante mencionar la limpieza de sedimentos y diferentes desechos presentes en la tubería que dificultaban el flujo para el desagüe de las aguas lluvias. Para estas actividades se ocuparon todos los auxiliares de obra (05), un oficial de obra (01), dirigidos por el maestro de obra e ingeniero residente.

	
Imagen No. 5: Desmonte y limpieza sobre margen izquierda y derecha de vía.	**Imagen No. 6:** Limpieza manual de alcantarilla.

	
Imagen No. 7: Desmonte de descole de alcantarilla.	**Imagen No. 8:** Limpieza manual de cunetas.

- **Excavaciones varias sin clasificar:**

  Durante el proceso constructivo de las alcantarillas se ha evidenciado primeramente una localización y replanteo, posteriormente se han realizado actividades de excavación mecánica para zapata, muros, aletas y poceta teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos estructurales estipulados en el diseño. Por último, se evidencia la excavación para la instalación de la tubería con una profundidad que varía dependiendo las condiciones del terreno con un ancho de 1,50 m para las cinco alcantarillas tal como lo estipula el diseño, de igual forma la excavación de forma manual para el encole y descole de las aguas lluvias.

	
Imagen No. 9: Excavaciones mecánicas para instalación de tubería.	**Imagen No. 10:** Excavaciones manuales para descole.

- **Excavaciones en roca en seco:**

  Durante la ejecución de actividades de excavación para la poceta y placa de descole se han presentado dificultades en dos de las cinco alcantarillas debido al tipo de suelo rocoso existente en la zona, la cual requiere el uso de maquinaria pesada para poder llevar a cabo la excavación y posteriormente se perfila manualmente con cincel. Es importante mencionar que el uso de maquinaria en este tipo de actividades el costo es superior a cualquier tipo de excavación de material común.

	
Imagen No. 11: Excavación mecánica de roca en seco en poceta.	**Imagen No. 12:** Excavación mecánica de roca en seco en poceta.

- **Concreto reforzada resistencia 14 Mpa:**

  Se evidencia fundición de concreto de una resistencia de 14Mpa en solados de limpieza para la instalación de la tubería en cada una de las cinco alcantarillas con el objetivo de evitar la contaminación de los tubos con el terreno natural.

Imagen No. 13: Instalación de solado de limpieza.	**Imagen No. 14:** Instalación de solado de limpieza.

Durante el proceso constructivo de la instalación de la tubería se ha realizado un atraque para la tubería de las cinco alcantarillas con el objetivo de fijar y garantizar la estabilidad de está. Se vacía en capas de concreto por los ambos costados equivalente a 1/3 de la dimensión del tubo con un diseño de mezclas para 2000 PSI.

	
Imagen No. 15: Instalación de atraque en concreto para tubería de 36”.	**Imagen No. 16:** Instalación de atraque en concreto para tubería de 36”.

- **Tubería de concreto reforzado 21 Mapa:**

  Posteriormente a la excavación para la instalación de la tubería se procede a realizar la colocación de seis tubos prefabricados en cada una de las cinco alcantarillas con un diámetro de 36” con refuerzo en acero N°3 para un total de 30 tubos, para la correcta instalación y funcionamiento de esta se tienen en cuenta la alineación del tubo, la pendiente indicada en el diseño, el acople y ajuste de un tubo a otro. Por último, el emboquillado para evitar algún tipo de filtración que pueda generar afectaciones a largo plazo.

	
Imagen No. 17: Instalación de tubería en concreto reforzado de 36”.	**Imagen No. 18:** Instalación de tubería en concreto reforzado de 36”.

- **Relleno para estructuras con suelo:**

  En el proceso de finalización de la instalación de la tubería cómo ultima actividad se debe hacer el relleno en material seleccionado en capas de 15 cm hasta llegar a un mínimo de 60 cm dependiendo las condiciones del terreno y se compacta manualmente, por último, se perfila en la rasante de la vía con el fin de conservar la banca de la vía y no afectar el paso vial.

	
Imagen No. 19: Relleno con material seleccionado sobre la excavación.	**Imagen No. 20:** Relleno con material seleccionado sobre la excavación.

Por otro lado, el día 24 de julio se socializó ante la comunidad que pertenece a la Asociación Comunal de juntas del municipio de Belén de los Andaquies por parte de esta firma de interventoría junto con el residente de obra el nuevo alcance del proyecto teniendo en cuenta la Cláusula Tercera: Alcance del objeto:, que se estipula en el Convenio Solidario, y con base a las cotizaciones realizadas por la JAC, se dio a conocer

la actualización de los precios de materiales de obra, costos de transportes de materiales de construcción, costos de mano de obra, entre otros factores que intervienen en el costo directo de obra, dejando claro que se ejecutará la construcción de cinco (05) alcantarillas en el tramo en el que se está interviniendo, tal como se aprobó en el Acta de comité de obra técnico No. 1 que se firmó el día 19 de junio de 2024.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 (CAMPOALEGRE)

Para el presente mes de julio del presente año, la junta de acción comunal de la vereda Campoalegre no ha dado aún inicio de obra físicamente, pero se vienen adelantando actividades administrativas para el proceso de compra de materiales de obra, contratación de mano de obra no calificada y maquinaria pesada, entre otras actividades propias del proyecto.

Por otro lado, el día 20 de julio se socializó ante la comunidad de la vereda Campoalegre por parte de esta firma de interventoría junto con el residente de obra el nuevo alcance del proyecto teniendo en cuenta la Cláusula Tercera: Alcance del objeto:, que se estipula en el Convenio Solidario, y con base a las cotizaciones realizadas por la JAC, se dio a conocer las actualizaciones de los precios de materiales de obra, costos de transportes de materiales de construcción, costos de mano de obra, entre otros factores que intervienen en el costo directo de obra, dejando claro que se ejecutará ciento dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla en el tramo a intervenirse, tal como se aprobó en el Acta de comité de obra técnico No. 1 que se firmó el día 19 de junio de 2024.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han presentado ítems no previstos en ninguno de los convenios establecidos ya que en uno de ellos no se ha ejecutado obra y en los otros dos convenios no se han encontrado hasta el momento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4879 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 4318–4045–4346 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.
7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de junio – 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a la vereda de Los Aletones, La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies y en la vereda Campoalegre en el municipio de Morelia, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.

- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.

- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas previo inicio por parte de las JAC.

- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS".

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada uno de los convenios vinculados con Asojuntas Belén, Vereda los Aletones y Vereda Campoalegre.

- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella y alcantarillas.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora cinco (5) informes semanales para cada uno de los convenios solidarios (JAC de la vereda Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies y JAC de la vereda Campoalegre), de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 4318-2023 (**Los Aletones**)

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 4045-2023 **(Asojuntas Belén de los Andaquies)**

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 4346-2023 (**Campoalegre**)

- Informe semanal No. 14: del 01 de julio al 07 de julio de 2024
- Informe semanal No. 15: del 08 de julio al 14 de julio de 2024
- Informe semanal No. 16: del 15 de julio al 21 de julio de 2024
- Informe semanal No. 17: del 22 de julio al 28 de julio de 2024
- Informe semanal No. 18: del 29 de julio al 04 de agosto de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de julio de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados a cada uno de los convenios solidarios. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Durante el mes de julio de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada uno de los convenios solidarios. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes julio de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de julio de 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las juntas donde se ejecutan los convenios solidarios, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de julio – 2024, no se cuenta con obras que se relacione con concretos, ya que en algunas veredas aún no se han iniciado formalmente la preparación, transporte, vaciado e instalado de concretos de 3000 psi para el tema de huellas, vigas de cimentación, cunetas o bordillos para la construcción de placa huella. Para el convenio de construcción de alcantarillas se espera la pronta realización de ensayos de laboratorio de resistencia del concreto de 3000 psi para muros de pocetas, aletas, cabezales y placas de descoles. De igual forma, esta interventoría presenta la

relación de información correspondiente a los resultados de ensayos de laboratorio en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4318, correspondiente a la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4045, correspondiente a Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4346, correspondiente a la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este presente periodo del mes de julio – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4318, JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4045, Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4346, JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies, Campoalegre). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance física de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Los Aletones.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,053%	0,000%	-0,053%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	35,597%	8,036%	-27,561%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	35,750%	-	-
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	28,600%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**8,036%**	**-27,614%**

Tabla 4. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Los Aletones.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 8,036% correspondiente a $ 15.780.601,00 de pesos, contra un programado acumulado de 35,650% equivalente a $ 70.008.970,19 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Los Aletones, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -27,614% que representa en valor de $ 54.228.369,19 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado –Asojuntas Belén de los Andaquies.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA **"ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES" CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,260%	0,000%	-0,260%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	40,329%	35,239%	-5,090%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	37,674%	-	-
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	21,737%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**35,239%**	**-5,350%**

Tabla 5. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de Asojuntas Belén de los Andaquies.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 35,239% correspondiente a $ 65.251.870,00 de pesos, contra un programado acumulado de 40,589% equivalente a $ 75.159.381,90 de pesos, lo que indica que Asojuntas Belén de los Andaquies, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -5,350% que representa en valor de $ 9.907.511,90 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Campoalegre.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,044%	0,000%	-0,044%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	42,992%	7,895%	-35,097%
Agosto – 2024	30,872%	-	-

Días del 01 al 31			
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	26,092%	-	-
TOTAL	**100,000%**	**7,895%**	**-35,141%**

Tabla 6. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Campoalegre.*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 7,895% correspondiente a $ 15.770.574,19 de pesos, contra un programado acumulado de 43,036% equivalente a $ 85.966.109,06 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Campoalegre, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -35,141% que representa en valor de $ 70.195.534,87 de pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el presente periodo del mes de julio -2024, No se realizaron Actas de Comité de obra en ninguno de los convenios.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo del mes de julio -2024, se llevaron a cabo las siguientes actas de reunión:

- Acta de reunión No. 01 – JAC, Los Aletones (**Ver Anexo 8.14.1**)
- Acta de reunión No. 01 – JAC, Asojuntas Belén de los Andaquies (**Ver Anexo 8.14.2**)
- Acta de reunión No. 01 – JAC, Campoalegre (**Ver Anexo 8.14.3**)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4879 – 2023 se suscribió el día 07 de diciembre de 2023 entre el señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (**$106.174.537,00**) M/CTE, equivalente a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4879-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 106.174.537,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION SUSPENSIÓN:	31 DE MARZO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($106.174.537,00) M/CTE, equivalentes a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.200.000,00		6,00	$ 7.200.000,00
	Inspector SST	$ 1.200.000,00		0,50	$ 600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 31.540.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 74.434.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
			(7)	**(8)**	(7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	**Dia**	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	**Mes**	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	**Según comprobante por mes**	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	**Según comprobante por mes**	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	**Según comprobante por mes**	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	**Según comprobante por mes**	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	**Según comprobante por mes**	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	**Según comprobante por mes**	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 89.222.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 16.952.237,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 106.174.537,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se continúa realizando actividades de seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada una de las obras suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Acompañamiento y socialización del nuevo alcance de los proyectos de cada una de las juntas, que fueron ajustado por parte de los residentes de obra, posteriormente revisado, aprobado y avalado por esta interventoría. Esto debido a las alzas de los precios unitarios de los materiales de obra del año 2023 al presente año y ajuste de cantidades en algunos ítems o rubros del presupuesto, llegando de esta manera a disminuir la meta física.

- Revisión y aprobación de los materiales pétreos suministrados por los proveedores acordados por cada una de las juntas, donde se detalló los permisos o licencias ambientales y/o explotación minera, como también, que dichos materiales estén acordes a los materiales estipulados en los diseños de mezcla de 3.000 psi.

- Durante este periodo la interventoría realizó visitas a campo junto con los residentes de obra, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevan en las obras. Además, por parte del residente y director de interventoría realizaron recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de extenderse y compactarse el material sub-base granular. También la importancia del solado de limpieza y el atraque de concreto para la instalación de la tubería de 36”.

- Se realizó chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de la placa huella y alcantarillas.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella y alcantarillas.
(**Ver Anexo 8.15**).

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría para el presente periodo.
(**Ver Anexo 8.17**).

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4879 – 2023 a la fecha del presente periodo.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

Se anexa formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. (**Ver Anexo 8.19**).

7. CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES

- Que esta interventoría junto con los residentes de obra de la Vereda Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies y la vereda Campoalegre se socializó en lugar de sitio de obra ante la comunidad el nuevo alcance de obra y los motivos o causas que se llevó a reducir la meta física inicial del proyecto para la construcción de placa huella y alcantarillas.

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.

- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Aletones presenta para este periodo un programado acumulado del 35,650% correspondiente a $70.008.970,19 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 8,036% correspondiente a $15.780.601,00pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -27,614% correspondiente a $54.228.369,19 pesos M/CTE.

- Que la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies presenta para este periodo un programado acumulado del 40,589% correspondiente a $75.159.381,90 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 35,239% correspondiente a $65.251.870,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -5,350% correspondiente a $9.907.511,90pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre presenta para este periodo un programado acumulado del 43,036% correspondiente a $ 85.966.109,06 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 7,895% correspondiente a $15.770.574,19 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -35,141%correspondiente a $70.195.534,87 pesos M/CTE.

- Para este presente informe del mes de julio, Asojuntas Belén de los Andaquies tiene finalizado las excavaciones varias sin clasificar, la instalación del solado de limpieza, atraque de concreto y colocación de seis tubos de 36” en cada una de las cinco alcantarillas con su respectivo relleno con material seleccionado. Para, la vereda los Aletones se dio inicio físico de obra y se encuentran figurando el acero de refuerzo para elementos estructurales como lo son las huellas, viga riostras y cunetas, tal como lo indica las especificaciones técnicas del INVIAS y de la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES”.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.14. ACTAS DE REUNIÓN

8.14.1. Actas de reunión de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.14.2. Actas de reunión de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.14.3. Actas de reunión de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 - VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
03/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
29/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual junio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

031-4879

Florencia, 03 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y las Juntas de Acción Comunal - OAC, se celebró los convenios solidarios, pactando un plazo de ejecución hasta el 31/diciembre/2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, vencen el 30 de septiembre de 2024.

Atendiendo su solicitud me permito manifestarle el estado de avance de los convenios a cargo de esta interventoría:

- Convenio solidario #4045 - ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

El día 11/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 24/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

El día 01/julio/2024, se iniciaron labores de transporte de materiales a los sitios de trabajo.

- Convenio solidario #4318 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

El día 19/abril/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 26/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

- Convenio solidario #4346 - LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE

El día 17/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.


El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

Al realizar las labores de topografía se ha identificado que las coordenadas del proyecto determinadas en la minuta de convenio se ubican sobre la vía que conduce de Morelia a Valparaíso, vía que en la actualidad se encuentra pavimentada en MDC.

Es decir que las coordenadas del tramo socializado con la comunidad no coinciden con las establecidas en el convenio solidario.

Ver ubicación de la vía:
https://www.bing.com/maps?osid=c052f17e-2d12-4472-8cd9-ef1f0a5b3e46&cp=1.317491~-75.701922&lvl=16.00562&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

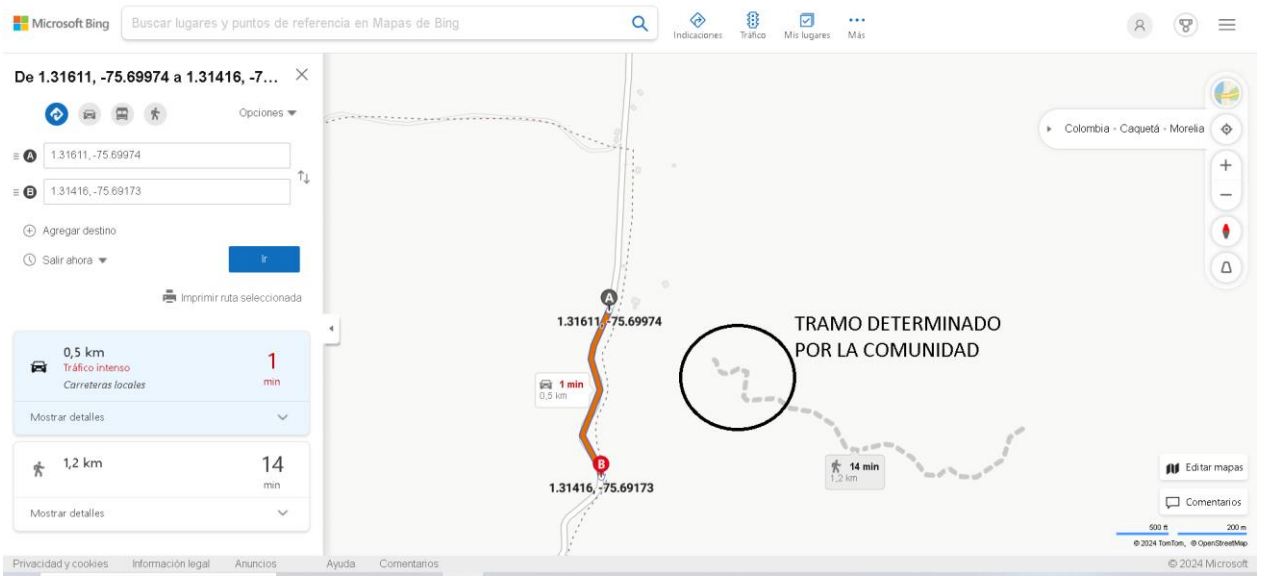

Por lo anterior solicito se realice con carácter urgente un comité técnico – jurídico donde se defina la pertinencia de ejecutar las obras, so pena de incurrir en faltas fiscales, disciplinarias o penales, por parte de los intervinientes en la ejecución del convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

032-4879

Florencia, 29 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe mensual junio de 2024

Cordial saludo;

En atención a su solicitud y en cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de junio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
03/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
29/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual junio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

031-4879

Florencia, 03 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y las Juntas de Acción Comunal - OAC, se celebró los convenios solidarios, pactando un plazo de ejecución hasta el 31/diciembre/2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, vencen el 30 de septiembre de 2024.

Atendiendo su solicitud me permito manifestarle el estado de avance de los convenios a cargo de esta interventoría:

- Convenio solidario #4045 - ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

El día 11/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 24/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

El día 01/julio/2024, se iniciaron labores de transporte de materiales a los sitios de trabajo.

- Convenio solidario #4318 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

El día 19/abril/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 26/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

- Convenio solidario #4346 - LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE

El día 17/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.


El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

Al realizar las labores de topografía se ha identificado que las coordenadas del proyecto determinadas en la minuta de convenio se ubican sobre la vía que conduce de Morelia a Valparaíso, vía que en la actualidad se encuentra pavimentada en MDC.

Es decir que las coordenadas del tramo socializado con la comunidad no coinciden con las establecidas en el convenio solidario.

Ver ubicación de la vía:
https://www.bing.com/maps?osid=c052f17e-2d12-4472-8cd9-ef1f0a5b3e46&cp=1.317491~-75.701922&lvl=16.00562&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

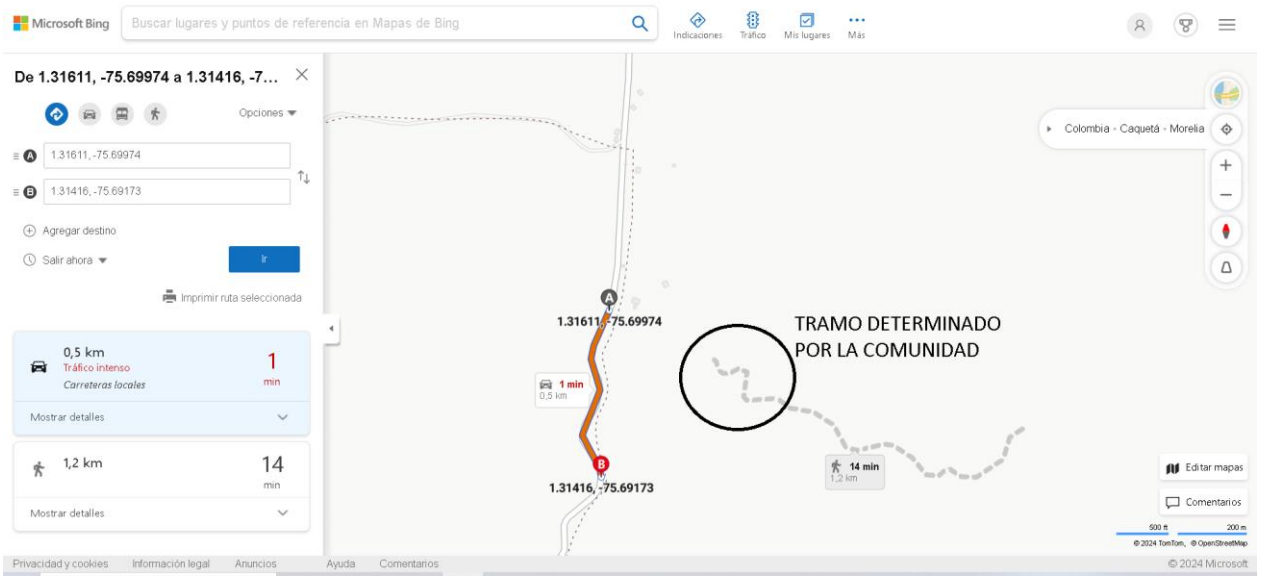

Por lo anterior solicito se realice con carácter urgente un comité técnico – jurídico donde se defina la pertinencia de ejecutar las obras, so pena de incurrir en faltas fiscales, disciplinarias o penales, por parte de los intervinientes en la ejecución del convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

032-4879

Florencia, 29 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe mensual junio de 2024

Cordial saludo;

En atención a su solicitud y en cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de junio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2024 - VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
03/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
10/07/2024	Convenio Solidario No 4346 de 2023	Atraso o incumplimiento al cronograma de obra	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JESUS OME RENTERIA. REP. LEGAL DE LA JAC CAMPOALEGRE MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO, ING. RESIDENTE DE LA JAC CAMPOALEGRE
29/07/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual junio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

031-4879

Florencia, 03 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Respuesta a comunicación 2024S-VCAQ-043408 Avance de convenios solidarios

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y las Juntas de Acción Comunal - OAC, se celebró los convenios solidarios, pactando un plazo de ejecución hasta el 31/diciembre/2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, vencen el 30 de septiembre de 2024.

Atendiendo su solicitud me permito manifestarle el estado de avance de los convenios a cargo de esta interventoría:

- Convenio solidario #4045 - ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

El día 11/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 24/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

El día 01/julio/2024, se iniciaron labores de transporte de materiales a los sitios de trabajo.

- Convenio solidario #4318 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

El día 19/abril/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.

El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

El día 26/junio/2024, se realizó la vinculación del personal (obreros) y se iniciaron labores de limpieza de los sitios de trabajo.

El día 26/junio/2024, se realizó la nueva asignación de usuarios y claves para acceso a la plataforma OCCIRED del Banco de Occidente, para poder realizar las transferencias de recursos a los proveedores. Si bien es cierto que al momento de la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos los presidentes de las OAC recibieron capacitación para el correcto uso de la plataforma, el acceso a la misma fue bloqueado por el banco por inactividad, lo que retrasó el inicio de compras de materiales.

- Convenio solidario #4346 - LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE

El día 17/mayo/2024 se aprobó por parte de esta Interventoría el personal requerido para ejecutar los trabajos a cargo de la OAC.


El día 19/junio/2024, después de un trabajo de revisión de cotizaciones, revisión de diseños y cálculo de cantidades, se suscribió acta de comité de obra #1 en la cual se definió el alcance final de las obras a ejecutarse de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el Instituto.

Al realizar las labores de topografía se ha identificado que las coordenadas del proyecto determinadas en la minuta de convenio se ubican sobre la vía que conduce de Morelia a Valparaíso, vía que en la actualidad se encuentra pavimentada en MDC.

Es decir que las coordenadas del tramo socializado con la comunidad no coinciden con las establecidas en el convenio solidario.

Ver ubicación de la vía:
https://www.bing.com/maps?osid=c052f17e-2d12-4472-8cd9-ef1f0a5b3e46&cp=1.317491~-75.701922&lvl=16.00562&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

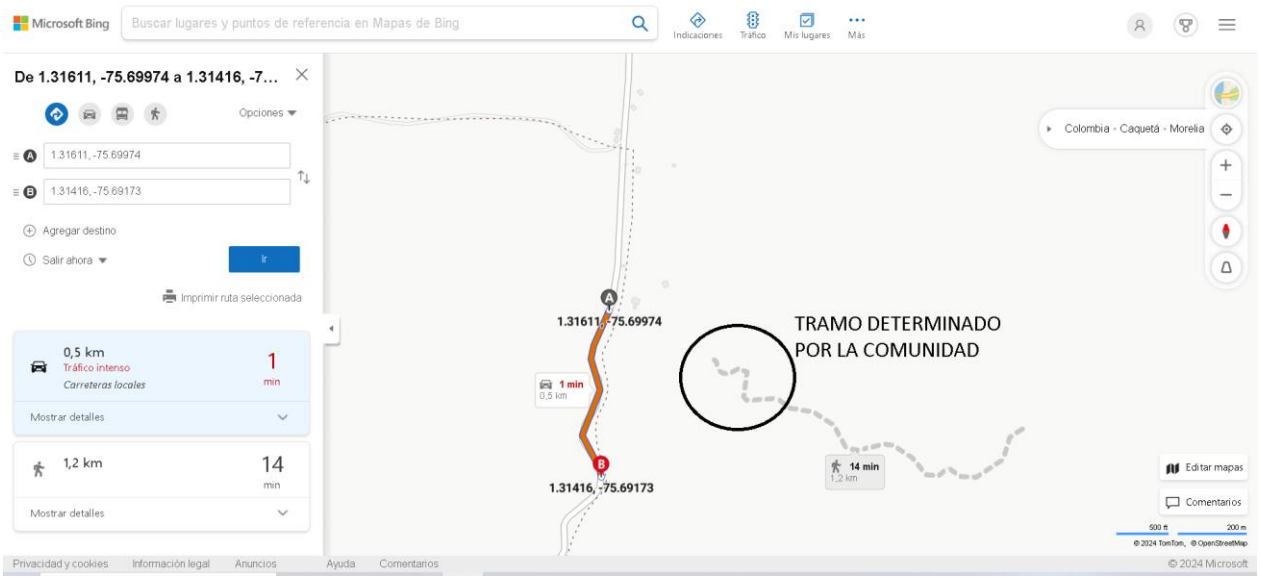

Por lo anterior solicito se realice con carácter urgente un comité técnico – jurídico donde se defina la pertinencia de ejecutar las obras, so pena de incurrir en faltas fiscales, disciplinarias o penales, por parte de los intervinientes en la ejecución del convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

IP 027 cto 4879 CS 4346 Atraso o incumplimiento del cronograma de obra

Recibidos ×



Elkin D. Ramos M. mié, 10 jul, 5:24 p.m.

para omerenteria, galloalfonso, sandraparra642, Cristian, lkrodriguez, mí, atencionciudadano

Florencia, 10 de julio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE
Sr. Jesus Ome
Presidente y Representante Legal
omerenteria@gmail.com
Ing. Manuel Alfonso Gallo Santofimio
Ingeniero Residente
galloalfonso@hotmail.com
Morelia – Caquetá

Referencia: Convenio Solidario No. 4346 de 2023
Asunto: Atraso o incumplimiento del cronograma de obra

Cordial saludo;

El pasado 19/junio/2024 se realizó comité de obra en el cual se aprobó el nuevo alcance físico de las obras a ejecutar en cumplimiento de establecido en la CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES del convenio de la referencia, el cual enuncia "la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la interventoría y el instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "requerimiento de revisión de la guía de obras menores" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del convenio".

Transcurridos 0.67 meses desde la aprobación del nuevo alcance físico de las obras a ejecutar, se tiene una inversión de obra ejecutada acumulada igual a $0, equivalentes a 0% de ejecución.

El atraso en la ejecución de los trabajos es por causas imputables al contratista, ya que a la fecha no se han realizado las compras de materiales, dotación, e insumos necesarios para la realización de los trabajos. Además, no se han realizado los exámenes de ingreso de obreros, para dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

Es por eso que se le solicita tomar las medidas pertinentes para recuperar los tiempos perdidos y garantizar el cumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado, lo anterior deberá ser reflejado en un plan de acción a presentar a esta Interventoría en un plazo no superior a 3 días. De continuar con el atraso o incumplimiento del cronograma de obra, se iniciarán los trámites pertinentes para causar las multas establecidas en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS, del convenio de la referencia.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

Copia: Ing. José Ricardo Burbano Barcenas - Director Territorial Caquetá (E) INVIAS

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

032-4879

Florencia, 29 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe mensual junio de 2024

Cordial saludo;

En atención a su solicitud y en cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de junio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO
DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ALETONES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
FECHA:31/07/2024

	
FOTOGRAFÍA 1 (Personal figurando acero de refuerzo para vigas riostras)	FOTOGRAFÍA 2 (Personal cortando acero de refuerzo para huellas y cunetas)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Figurado de acero de refuerzo para vigas riostras)	FOTOGRAFÍA 4 (Figurado de acero de refuerzo para vigas riostras)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Instalación de valla publicitaria)	FOTOGRAFÍA 6 (Acopio de material granular sobre la vía)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Desmonte zona de descole de alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 2 (Limpieza manual de zona de encole de alcantarilla)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Desmonte de zonas no boscosas margen derecha e izquierda de la vía)	FOTOGRAFÍA 4 (Limpieza manual de cuneta)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Desmonte de descole de alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 6 (Limpieza manual de alcantarilla)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 7 (Excavaciones para instalación de tubos de concreto de 36”)	FOTOGRAFÍA 8 (Excavación mecánica para poceta)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Excavación mecánica para poceta)	FOTOGRAFÍA 10 (Excavación mecánica para cabezal y aletas)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Excavación mecánica de roca en poceta)	FOTOGRAFÍA 12 (Excavaciones para instalación de tubos de concreto de 36”)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Instalación de solado de limpieza)	FOTOGRAFÍA 14 (Instalación de solado de limpieza)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Instalación de tubería de concreto reforzado de 36″)	FOTOGRAFÍA 16 (Instalación de tubería de concreto reforzado de 36″)
	
FOTOGRAFÍA 17 (Instalación de tubería de concreto reforzado de 36″)	FOTOGRAFÍA 18 (Instalación de atraque de concreto para tubería)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES **FECHA:**31/07/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 19 (Instalación de atraque de concreto para tubería)	FOTOGRAFÍA 20 (Rellenos con material seleccionado)
	
FOTOGRAFÍA 21 (Rellenos con material seleccionado)	FOTOGRAFÍA 22 (Rellenos con material seleccionado)
	
FOTOGRAFÍA 23 (Rellenos con material seleccionado)	FOTOGRAFÍA 24 (Limpieza manual de alcantarilla)

NOTA: LAS ACTIVIADES DE EXCAVACIONES PARA PLACAS DE DESCOLE, POCETAS, CABEZALES, ALETAS E INSTALACIONES DE TUBERIA, INSTALACIÓN DE SOLADOS DE LIMPIEZA, ATRAQUE DE TUBERIA Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SE REALIZARON EN LAS CINCO ALCANTARILLAS.

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventor

01/07/2024 Registo de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco

Nota: Dia festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia Intensa

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

09/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia intensas
Tarde: Lluvia moderadas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

11/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

15/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria.

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia (dominical) festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Total Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de obra
* Maestro de obra
* Ayudantes de obra (5)
* Oficial de obra
* Director de Interventoria

Maquinaria y equipo: * Polidora electrica

Actividades: Se realizaron labores de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como Vigas riostras, Huellas, Contras y bordillos.

Powered by CamScanner

-Se realizó acopio de material Pétreo y de ferretería sobre la vía

Residente de Obra

Residente de Interventoria

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Personal en obra: *Residente de Interventoria
*Residente de obra
*Maestro de obra
*Ayudantes de Obra (5)
*Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: - Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillas.

Powered by CamScanner

-Se continuaron con el acopio de material Petreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

24/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra
* Director de Interventoria

Maquinaria y equipo: Pulidora electrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.

Powered by CamScanner

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via.

-Se socializó el nuevo alcance del Proyecto ante la comunidad de la vereda los Aletones en la Caseta Comunal de la Junta, en la que asistieron el equipo de interventoria, supervisor de Invias, residente de obra y comunidad en general.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

25/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Lluvia moderada

Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Ayudante de obra (s)
* Oficial de Obra

Maquinaria y equipo: Polidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, contras y bordillos

-Se continuo con el acopio de materiales Pétreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de obra

Residente de Interventoria

26/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzos Para elementos estructurales como Vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pét y de ferretería sobre la vía.

Residente de obra

Residente de Interventoria

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
Residente de Obra
Maestro de obra
Ayudante de obra (5)
Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Polidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzos Para elementos estructurales como vigas nastras, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de obra

Residente de Interventoria

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como vigas riostra huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via

Residente de obra

Residente de Interventoria

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Personal de obra: * Residente de obra
* Residente de Interventoria
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (s)
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la vial.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (S)
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora electrica

Actividades: - Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas nostras, cunetas, y bordillos

- Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via

Residente de obra

Residente de Interventoria

NKA

Powered by CamScanner

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco

(Personal) NOTA: Día festivo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

Powered by CamScanner

* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinarias y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.
* Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de refuerzo para aletas, zarpas y cajas. Se hizó acopio de material pétreo, cemento y tulos de concreto de 36" sobre la vía en los distintos puntos de construción de las alcantarillas. Se realizó limpieza manual de alcantarilla existente. Además, se desmontó y limpio zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

Powered by CamScanner

* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra.
* Director de Interventoría

Maquinarias y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizó limpieza manual de alcantarilla existente. Además se realizó desmonte y limpieza de zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía. Se continuó con el acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" sobre la vía en los distintos puntos de construcción de las alcantarillas.

Residente de Obra: Residente de Inter:

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

(Residente de Obra)

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Ayudantes de obra. (5).

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizó desmonte y limpieza de zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía. Se continúo con el acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" sobre la vía.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5)
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Powered by CamScanner

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para elementos como cajas, aletas y zarpas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para elementos como cajas, aletas y zarpas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluia intensa.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas para pocetas, zarpas, cabezal y aletas. en una alcantarilla.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

09/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia intensa
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta

Actividades: Se continuó con las excavaciones mecánicas para poceta, zarpa, cabezal y aletas, sobre la misma alcantarilla.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continuó con las excavaciones mecánicas para poceta, zarpa, cabezal, aletas sobre las misma alcantarilla. Se continuó con el acopio de material pétreo sobre la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Powered by CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudantes de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continuo con las excavaciones mecánicas, para poceta zarpa y aleta. Se continuo con el acopio de material pétreo sobre la vía.

Residente de obra

Residente de Interv

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Llvia moderada.
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.

Powered by CamScanner

* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizó excavación mecánica para instalación de tubería. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Powered by CamScanner

Personal en obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se finaliza con el acopio de material pétreo y de ferretería sobre la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

15/01/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudantes de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizo excavación mecánica para instalación de tubería en la segunda alcantarilla. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4 de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la v

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: (Seco) Lluvia moderada

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra
* Oficial de obra.
* Ayudantes de obra (5)

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizo excavación mecanica para instalación de tubería en la tercera alcantarilla. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta

Powered by CamScanner

y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudantes de Obra (I)
* Director de Interventoría

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecanicas en la segunda alcantarilla en zona de poceta y

Powered by CamScanner

descole. Además excavaciones manuales debido a qu
el terreno se encontraba rocoso.

Residente de Obra

Residente de Interventor

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la tercera alcantarilla en zona de poceta y descole. Además excavaciones manuales debido a qu

el terreno se encontraba rocoso.

Residente de Obra Re

Residente de Interventoría

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se continuo con las excavaciones mecánicas y manuales en la poceta debido a que las condiciones del terreno se encuentra rocoso.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente Interventoría

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.

Powered by CamScanner

* Oficial de Obra
* Ayudantes de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipo:
* Mezcladora de Concreto
* Retroexcavadora.
* Vibrador.

Actividades: Se realizó excavaciones mecánicas en la cuarta alcantarilla en zona de la tubería de la alcantarilla. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizó el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de obra.
* Residente de interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipo:
* Mezcladora de concreto
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la quinta y última alcantarilla para instalación de tubería. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguió se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizó

Powered by CamScanner

el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra.
* Director de Interventoría

Maquinaria y equipo: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la cuarta alcantarilla. en zona de poceta y descole. Además excavaciones manuales debido a que el terreno se encontraba rocoso.

Powered by CamScanner

- Se socializó el nuevo alcance del proyecto ante la comunidad de Asojuntas Belén de los Andaquíes en la caseta comunal de la vereda Los Aletones en la que asistieron el equipo de interventoría, supervisor de Invías, residente de obra y comunidad en general.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

25/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la quinta alcantarilla en zona de poceta y descole.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas y manuales en los descoles de las alcantarillas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas y manuales en los descoles de las alcantarillas.

Residente de Obra. Residente de Interventori

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco

Personal en obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de obra

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se retomo actividades de figurado de acero de refuerzo faltantes en elementos como aletas y cabezal.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal de obra:
* Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: *Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de obra.

Powered by CamScanner

* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de Obra
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con el Figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco

NOTA: Día dominical.

Residente de obra

Residente de Interventoría

01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde Seco

Nota: Dia festivo

Residente de obra

Residente de interventoria

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: seco
Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Seco: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventona

Powered by CamScanner

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

Residente de obra

Residente de Interventoria

11/07/2024 Registro de lluvia: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia Moderada

Tarde: lluvia Moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

15/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia Moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Introduce el texto aquí

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de Obra

Residente de Interventoria

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Dia dominical
-Se socializó el nuevo alcance del Proyecto ante la comunidad de la vereda Campoalegre en la casa del Presidente de la

Powered by CamScanner

Junta, en la que asistieron el equipo de interventoria, residente de obra, contadora JAC y comunidad general

Residente de obra

Residente de Interventoria

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Introduce el texto aquí

Powered by CamScanner

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de Obra

Residente de Interventoria

24/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

25/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

26/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificado y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.365.826,21	1,714%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.156.120,21	1,607%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (209.706,00)	-0,107%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.260.973,21	1,661%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.156.120,00	1,607%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1,714
Meta Física Ejecutada % 1,607
Avance o Atraso Físico % -0,107

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	13,60				13,33%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	-
PULIDORA ELECTRICA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 7/07/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con las compras y búsqueda de transporte de materiales pétreos, cuantificación de materiales de ferreteria y la búsqueda de mano de obra no calificada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la compra de materiales pétreos y de ferretería.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES: -
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES: -
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.292.805,63	7,787%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.312.240,43	3,214%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.980.565,20)	-4,573%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.926.979,41	6,073%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.156.120,00	1,607%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,787
Meta Física Ejecutada % 3,214
Avance o Atraso Físico % -4,573

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	20,40				20,00%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	-
PULIDORA ELECTRICA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 14/07/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Afiliación del personal a seguridad social que va a realizar la obra y posteriormente dar inicio físico del proyecto.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	 FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.696.755,64	14,103%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.468.360,64	4,821%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.228.395,00)	-9,282%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.403.950,01	6,316%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.156.120,00	1,607%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,103
Meta Física Ejecutada % 4,821
Avance o Atraso Físico % -9,282

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	27,20				26,67%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	-
PULIDORA ELECTRICA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 21/07/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar labores físicas del proyecto como figurado de acero de refuerzo para las vigas riostras y huellas.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	N/A	**$ 196.378.598,00**		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	N/A	**$ 106.174.537,00**		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.855.444,77	24,368%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.624.480,86	6,429%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (35.230.963,91)	-17,939%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.158.689,13	10,265%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.156.120,00	1,607%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,368
Meta Física Ejecutada % 6,429
Avance o Atraso Físico % -17,939

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	34,00				33,33%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	1
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: SE SOCIALIZO EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA ALETONES EL DIA 24 DE JULIO DE 2024 EN LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EN LA QUE ASISTIERON EL EQUIPO DE INTERVENTORIA, LAS ENCARGADAS DE LA PARTE SOCIAL Y AMBIENTAL, SUPERVISOR DE INVIAS, RESIDENTE DE OBRA, PRESIDENTE Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Acopio de materiales pétreos y de ferretería.
Se socializó el nuevo alcance del proyecto ante la comunidad de la vereda Los Aletones.

Figurado de acero de refuerzo para las vigas riostras, huellas y cunetas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el figurado de acero de refuerzo de las vigas riostras, huellas y cunetas.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 70.010.016,00	35,650%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.780.601,07	8,036%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54.229.414,93)	-27,614%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.154.571,25	11,282%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.156.120,00	1,607%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 35,650
Meta Física Ejecutada % 8,036
Avance o Atraso Físico % -27,614

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40,80				40,00%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	1
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo con el acopio de materiales pétreos y de ferretería.
continuo con el figurado de acero de refuerzo para las vigas riostras y cunetas.

Se

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavaciones mecanicas del talud en el tramo a intervenir.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO No. 4045 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 185.171.800,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 185.171.800,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.966.379,96	2,142%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.248.433,00	1,754%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (717.946,96)	-0,388%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.484.933,28	1,882%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.248.433,00	1,754%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,142
Meta Física Ejecutada % 1,754
Avance o Atraso Físico % -0,388

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,67				13,3%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VOLQUETA	1	1
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales de las alcantarillas como lo son aletas, zarpas y cajas, etc. en el campamento provisional destinado para estas actividades.
Acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" en los puntos de construccion de las 5 alcantarillas.
Limpieza manual de alcantarillas existentes.
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas en margen derecha e izquierda de un tramo de la vía.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación del solado de limpieza e instalación de tubería de concreto de 36".

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO No.	4045 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4879 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.869.512,38	6,410%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16.723.530,00	9,031%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.854.017,62	2,621%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.903.132,42	4,268%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.475.096,00	7,277%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6,410 Avance o Atraso Físico %: 2,621
Meta Física Ejecutada %: 9,031

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,00				20,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VOLQUETA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Excavación mecánica e instalación del solado de limpieza. Posteriormente se instalaron 6 tubos de concreto de 36" con su respectivo atraque.
Se realizó relleno con material seleccionado con el fin de proteger la tubería.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavaciones mecanicas para las cimentaciones de la alcantarilla.
Instalación de hierros de zarpas y aletas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES**

CONVENIO No. 4045 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 185.171.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 185.171.800,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32.965.469,94	17,803%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27.870.910,00	15,051%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.094.559,94)	-2,752%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.096.040,43	11,393%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.147.380,00	6,020%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 17,803
Meta Física Ejecutada % 15,051
Avance o Atraso Físico % -2,752

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,33				26,7%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VOLQUETA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron excavaciones mecánicas e instalación del solado de limpieza en dos alcantarillas. Posteriormente se instalaron 6 tubos de concreto de 36" en cada una de ellas, con su respectivo atraque.
Se realizó relleno con material seleccionado con el fin de proteger la tubería en las dos alcantarillas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavaciones mecanicas, instalación de solado de limpieza, instalación de tuberia de concreto de 36" y relleno con material seleccionado en las dos alcantarillas faltantes.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES**

CONVENIO No. 4045 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 185.171.800,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 185.171.800,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.061.510,37	29,196%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.529.603,00	33,228%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.468.092,63	4,032%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.096.040,43	11,393%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.658.393,00	18,177%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 29,196
Meta Física Ejecutada % 33,228
Avance o Atraso Físico % 4,032

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,67				33,3%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: SE SOCIALIZO EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EL DIA 24 DE JULIO DE 2024 EN LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA ALETONES EN LA QUE ASISTIERON EL EQUIPO DE INTERVENTORIA, LAS ENCARGADAS DE LA PARTE SOCIAL Y AMBIENTAL, SUPERVISOR DE INVIAS, RESIDENTE DE OBRA, PRESIDENTE Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo en las dos alcantarillas faltantes con las excavaciones mecánicas e instalación del solado de limpieza. Posteriormente se instalaron 6 tubos de concreto de 36" en cada una de ellas, con su respectivo atraque.
Se realizó relleno con material seleccionado con el fin de proteger la tubería en las dos alcantarillas.
Se socializó el nuevo alcance del proyecto ante la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el figurado de acero de refuerzo faltante de los elementos como zarpas, aletas y cajas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES		
CONVENIO No.	4045 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4879 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.157.550,80	40,589%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65.251.870,00	35,239%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.905.680,80)	-5,350%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.096.040,43	11,393%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.722.566,00	2,010%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 40,589 Avance o Atraso Físico %: -5,350
Meta Física Ejecutada %: 35,239

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,00				40,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se volvio a reanudar el figurado de acero de refuerzo faltante de los elementos como zarpas, aletas y cajas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación del acero de refuerzo en las alcantarillas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 7/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 14 del 1/07/2024 al 7/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.727.408,67	1,866%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.153.879,00	1,579%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (573.529,67)	-0,287%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.639.516,93	1,822%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.879,00	1,579%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,866 Avance o Atraso Físico % -0,287
Meta Física Ejecutada % 1,579

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	13,60				13,33%
Ejec	-				
Prog	0,13				13,33%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con las compras y búsqueda de transporte de materiales pétreos, cuantificación de materiales de ferreteria y la búsqueda de mano de obra no calificada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la compra de materiales pétreos y de ferretería.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 14/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 15 del 8/07/2024 al 14/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.656.714,44	7,838%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.307.759,00	3,158%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.348.955,44)	-4,680%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.929.305,77	5,972%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.879,00	1,579%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,838 Avance o Atraso Físico % -4,680
Meta Física Ejecutada % 3,158

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	20,40				20,00%
Ejec	-				
Prog	0,20				20,00%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 21/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 16 del 15/07/2024 al 21/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.636.789,32	19,342%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.461.638,00	4,737%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.175.151,32)	-14,605%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.979.048,05	11,504%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.879,00	1,579%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19,342 Avance o Atraso Físico % -14,605
Meta Física Ejecutada % 4,737

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	27,20				26,67%
Ejec	-				
Prog	0,27				26,67%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: SE SOCIALIZO EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CAMPOALEGRE EL DIA 20 DE JULIO DE 2024 EN LA CASA DEL PRESIDENTE DE LA JAC, EN LA QUE ASISTIERON EL EQUIPO DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA Y CONTADORA DE LA JAC, PRESIDENTE Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria. **Se socializó el nuevo alcance del proyecto ante la comunidad de la vereda Campoalegre.**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 17 del 22/07/2024 al 28/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 64.634.384,95	32,357%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.615.517,00	6,316%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (52.018.867,95)	-26,041%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.997.754,44	13,015%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.879,00	1,579%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 32,357 Avance o Atraso Físico % -26,041
Meta Física Ejecutada % 6,316

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	34,00				33,33%
Ejec	-				
Prog	0,33				33,33%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 18 del 29/07/2024 al 4/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 85.966.139,71	43,036%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.769.396,00	7,894%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (70.196.743,71)	-35,142%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.331.595,94	10,679%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.879,00	1,579%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 43,036 Avance o Atraso Físico % -35,142
Meta Física Ejecutada % 7,894

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40,80				40,00%
Ejec	-				
Prog	0,40				40,00%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-
RETROEXCAVADORA	1	-
VOLQUETA	1	-
MEZCLADORA	1	-
Total	4	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
PULIDORA ELECTRICA			LOS ALETONES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	29,03%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	22	70,97%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE EVIDENCIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PULIDORA ELECTRICA			EL PORVENIR	I	A	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A
RETRO EXCABADORA			EL PORVENIR	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
MEZCLADORA DE CONCRETO			EL PORVENIR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			EL PORVENIR	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	3	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	2	0	3	3	2	2	1	0	0	3	3	1	1	1	1	0	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	1	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	4	1	1	2	2	3	4	4	1	1	3	3	3	3	4	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	45	36,30%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	79	63,70%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PULIDORA ELECTRICA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,000%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE EVIDENCIAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA DEBIDO A QUE LA JAC SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MAQUINARIA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHON FREDDY CUELLAR SALINAS	1119213244	OFICIAL DE OBRA	$ 1.415.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 566.000	$ 32.828	V	NUEVA EPS		$ 58.958	COLPENSIONES		$ 75.467	$ 18.867	$ 9.433	$ 14.150	
2	ARMANDO CALDERON ARTBUNDUAGA	17684183	MAESTRO DE OBRA	$ 2.315.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 926.000	$ 80.562	V	ASMET SALUD		$ 144.688	COLFONDOS		$ 185.200	$ 46.300	$ 23.150	$ 34.725	
3	FERNEY OYOLA GUEVERA	17684087	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 1.300.000	$ 30.160	V	ASMET SALUD		$ 54.167	COLPENSIONES		$ 69.333	$ 17.333	$ 8.667	$ 13.000	
4	ULDARICO QUINTERO MOSQUERA	17684623	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 1.300.000	$ 30.160	V	ASMET SALUD		$ 54.167	PORVENIR		$ 69.333	$ 17.333	$ 8.667	$ 13.000	
5	EMILIO CALDERON OME	17682547	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 1.300.000	$ 30.160	V	NUEVA EPS		$ 54.167	COLPENSIONES		$ 69.333	$ 17.333	$ 8.667	$ 13.000	
6	KEVIN MAURICIO YELA QUINTERO	1006410126	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 1.300.000	$ 30.160	V	NUEVA EPS		$ 54.167	PORVENIR		$ 69.333	$ 17.333	$ 8.667	$ 13.000	
7	JHON SEBASTIAN CANTILLO OME	1115791337	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 1.300.000	$ 30.160	V	ASMET SALUD		$ 54.167	PORVENIR		$ 69.333	$ 17.333	$ 8.667	$ 13.000	
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
20																																												
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 12/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Benito ome M
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT: 900.128.460-0

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4318 de 2023

Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:

Que el señor **BENITO OME MUÑOZ** identificado con CC # 17.683.153 expedida Belén de los Andaquies Vicepresidente de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES** identificada con Nit 900.553.557-8 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, con corte a 31/julio/2024.

Atentamente,

Diana Milena Rivera

DIANA MILENA RIVERA LOZANO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 228928-TT

Benito Ome

BENITO OME MUNOZ
C.C 17.683.153
Vicepresidente



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228928-T

DIANA MILENA
RIVERA LOZANO
C.C. 1115792507
RES. INSCRIPCION 437 DEL 26/05/2017
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233674 248234



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.115.792.507
RIVERA LOZANO
APELLIDOS
DIANA MILENA
NOMBRES
Diana Milena Rivera L
FIRMA

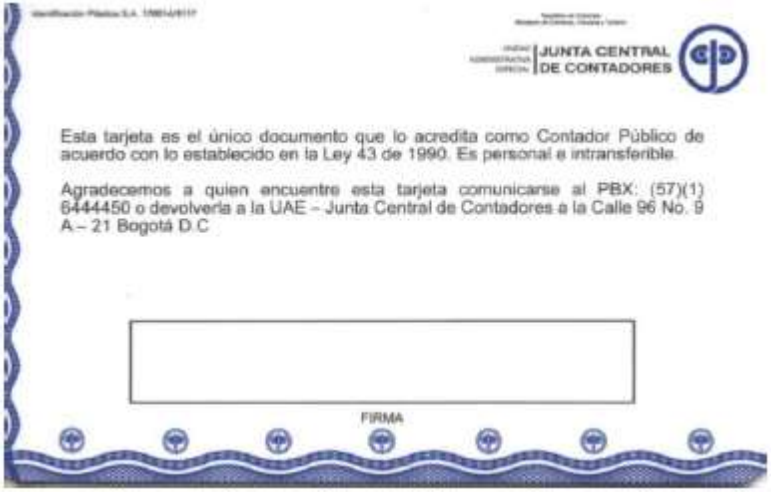

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1990
BELEN DE LOS ANDAQUIES
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | AB+ G.S. RH | F SEXO

10-JUN-2008 BELEN DE LOS ANDAQUIES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4400400-00105905-F-1115792507-20081021 0004660730A 2 25471457

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C3F5B44FF0448675

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MILENA RIVERA LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115792507 de BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 228928-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 7

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDUARDO RAMOS	17681902	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		650.000,00	$ 45.240	V			$ 78.000			$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
2	LUIS E. GALLEGO DIAZ	17683187	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.160.000,00	$ 80.736	V			$ 139.200			$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	ROBERTO A. GALLEGO ROMERO	1115790978	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		650.000,00	$ 45.240	V			$ 78.000			$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
4	JORGE L. CALDERON LOSADA	1007383825	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x -		650.000,00	$ 45.240	V			$ 78.000			$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
5	CRISTIAN L. SABI MORENO	1006410629	OFICIAL DE OBRA	$ 1.950.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		975.000,00	$ 67.860	V			$ 117.000			$ 156.000	$ 39.000	$ 19.500	$ 29.250	
6	DIEGO A. HERMIDA QUINTERO	1077840051	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		650.000,00	$ 45.240	V			$ 78.000			$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
7	YULIETH CAMILA GALLEGO CALDERON	1006410412	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		650.000,00	$ 45.240	V			$ 78.000			$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 12/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT: 900.128.460-0

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4045 de 2023

Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:

Que el señor **LUIS ELVER CANTIÑO PATIÑO** identificado con CC # 17.684.267 expedida Belén de los Andaquies representante legal de la **ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** identificada con Nit 900.128.460-0 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, con corte a 30/julio/2024.

Atentamente,

ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
Contador Publico
c.c. 1.115.793.156
T.P 279409-T

LUIS ELVER CANTIÑO PATIÑO
Representante legal
c.c. 17.684.267

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9ACDFDE62F242AC6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115793156 de BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 279409-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

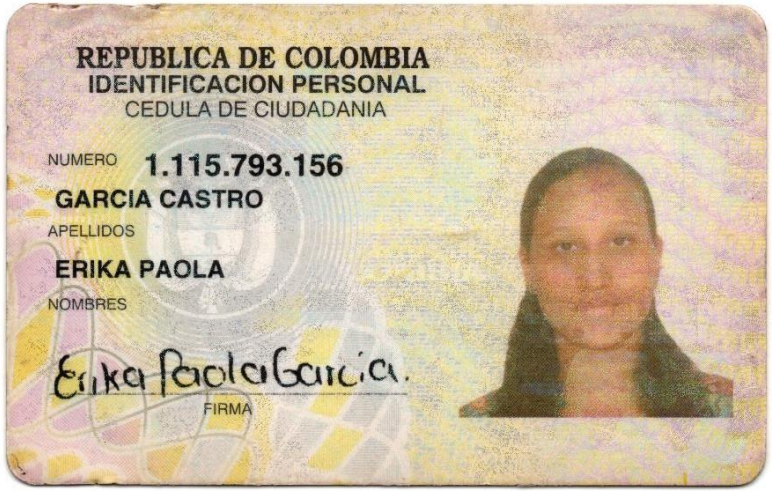

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.115.793.156

GARCIA CASTRO
APELLIDOS

ERIKA PAOLA
NOMBRES

Erika Paola Garcia.
FIRMA




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279409-T

ERIKA PAOLA
GARCIA CASTRO
C.C. 1115793156
RES. INSCRIPCION 522 DEL 05/04/2021
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

301691 315179

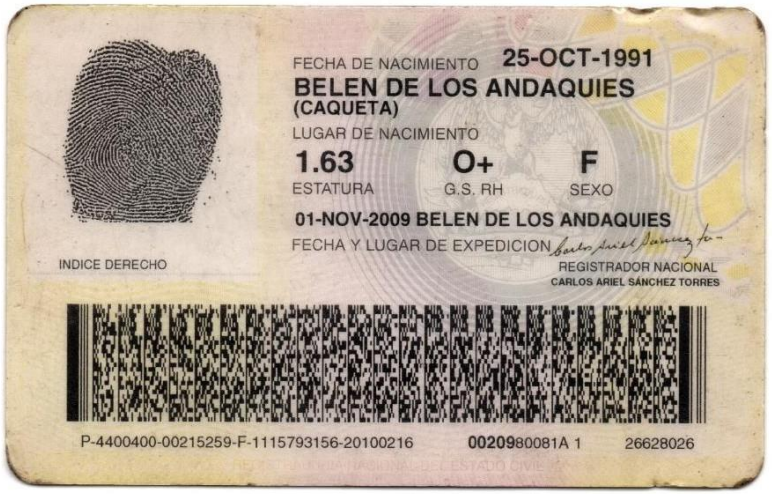

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1991
BELEN DE LOS ANDAQUIES
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-NOV-2009 BELEN DE LOS ANDAQUIES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4400400-00215259-F-1115793156-20100216 0020980081A 1 26628026

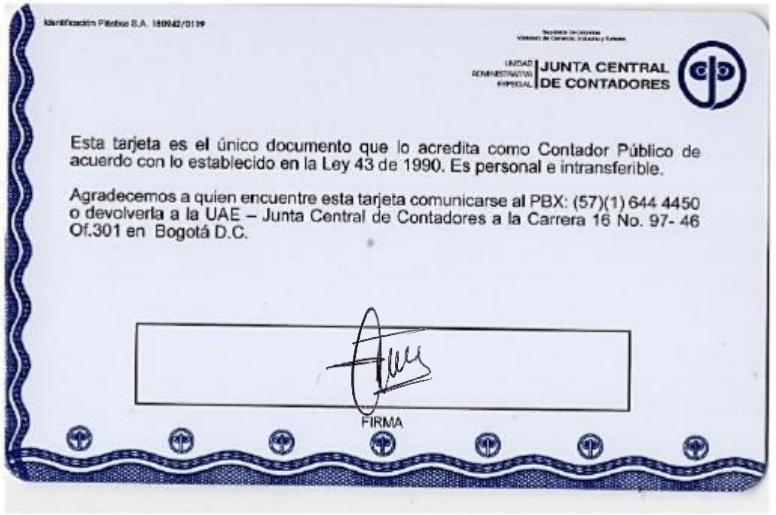

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
20																																												
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE RELACIONA PERSONAL EN EL FORMATO DEBIDO A QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MAQUINARIA.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Jesus Ome
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la
Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1298823		10	NACION	4318-0	$ 196.378.598	$ 196.378.598
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 197.378.598,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 147.760.112,00		$ 147.760.112,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.432.803,00		$ 4.432.803,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.185.683,00		$ 44.185.683,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	$ 196.378.598,00		$ 196.378.598,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1219723		10	NACION	4045-0	$ 185.171.800	$ 185.171.800
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 186.171.800,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 138.939.422,00		$ 138.939.422,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00		$ 4.168.183,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00		$ 42.064.195,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	$ 185.171.800,00		$ 185.171.800,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1297423		10	NACION	4346-0	$ 199.753.948	$ 199.753.948
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.753.948,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.067.610,00		$ 151.067.610,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00		$ 4.532.028,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00		$ 44.154.310,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	$ 199.753.948,00		$ 199.753.948,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	16	22	15	20	24	20	10	11	24	24	20	22	22	24	21	22	19	24	21	19	24	21	23	12	17	21	14	24	18	24	610
Lluvias moderadas	12	4	2	9	4	0	3	7	10	0	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	4	0	3	1	12	4	3	8	0	3	0	103
Lluvias intensas	0	4	0	0	0	0	1	7	3	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	16	22	15	20	24	20	10	11	24	24	20	22	22	24	21	22	19	24	21	19	24	21	23	12	17	21	14	24	18	24	610
Lluvias moderadas	12	4	2	9	4	0	3	7	10	0	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	4	0	3	1	12	4	3	8	0	3	0	103
Lluvias intensas	0	4	0	0	0	0	1	7	3	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	21	19	22	20	18	24	22	19	20	19	21	14	24	23	20	22	19	22	22	19	21	16	24	21	15	21	21	24	21	17	635
Lluvias moderadas	0	3	4	2	0	3	0	2	4	0	4	3	8	0	1	4	0	2	0	0	4	3	8	0	3	5	0	3	0	3	2	71
Lluvias intensas	0	0	1	0	4	3	0	0	1	4	1	0	2	0	0	0	2	3	2	2	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	5	38
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

NO SE HA DADO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA JAC SE ENCUENTRA EN BUSQUEDA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MAQUINARIA.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:


SE ANEXA DISEÑO DE MEZCLAS DE 3.000 PSI DE CONCRETO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - RE - IDC - 030

DISEÑO DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3000 PSI (210 Kgs/Cm2)

TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y EL MORTERO (DIEGO SANCHEZ DE GUZMAN)

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN	AGREGADO FINO Arena gruesa bien gradada Color carmelita claro	AGREGADO GRUESO Grava triturada Tamaño maximo 1"
Módulo de Finura	2,78	-
Tamaño Máximo	-	1"
Peso Específico Aparente (Tn/m3)	2,638	2,649
Peso Unitario Suelto (Kg/m3)	1341	1423
Forma y Textura	-	ANGULAR Y RUGOSA
Humedad %	4,91	1,47
Absorción %	1,74	1,76
Asentamiento de la Mezcla	3"	

Tabla 11,2 Procedimiento de diseño

Paso	Descripción
1	Selección del asentamiento
2	Selección del tamaño maximo del agregado
3	Estimación del contenido de aire
4	Estimación del contenido de agua de mezclado
5	Determinación de la resistencia de diseño
6	Selección de la relación agua-cemento
7	Calculo del contenido de cemento
8	Estimaciones de las proporciones de agregados
9	Ajuste por humedad de los agregados
10	Ajustes a las mezclas de prueba

GRAVA TRITURADA TAMAÑO MAXIMO 1" Y ARENA MEDIA (CANTERA LAGOS - MORELIA)
CEMENTO PORTLAND DE USO GENERAL **"CEMEX"**
JUNIO 26 DE 2024

GEOCON INGENIERIA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 210 KGS/CM2
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y EL MORTERO

1 - SELECCION DEL ASENTAMIENTO (Tabla 11.3)

Las propiedades del concreto en estado fresco (para manejarlo, colocarlo y compactarlo) son importantes, debido a que de ellas dependen en gran parte las propiedades en estado endurecido. En la selección del asentamiento se debe tener en cuenta el tamaño de la seccion que se va a construir y la cantidad y espaciamiento del acero de refuerzo.

Para esta clase de concretos el asentamiento según tablas es de un promedio de 7,62 cms = 3" de consistencia MEDIA

2 - SELECCIÓN DEL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO (Tabla 11.4)

En relacion con la geometria y el refuerzo de las estructuras, el tamaño maximo del agregado se selecciona de acuerdo con la estrechez de los espacios por los que debe desplazarce el concreto durante su colocacion, de modo que el agregado grueso no sufra obstrucciones y pueda destribuirse uniformente en todas direcciones. Para ello deben considerarse aspectos tales como lo angosto de las secciones y las distancias minimas entre las varillas del refuerzo y entre estas y el recubrimiento.

Por el tipo de construcción, el tamaño según tablas debe estar entre 1/2" y 11/2" por gradacion el tamaño máximo es de 1", lo que indica que el agregado de que se dispone es aceptable

3 - ESTIMACION DEL CONTENIDO DE AIRE (Tabla 11.5)

Como es sabido, durante la operación de mezclado queda aire naturalmente atrapado dentro del concreto. Pero cuando se prevea que habrá condiciones de exposicion severa, es conveniente incluir aire en el concreto.

Como no habrá condiciones de exposición, se usará concreto sin aire incluido, pero se estima según tabla 11,5 que para un tamaño maximo nominal de 3/4" el contenido de aire atrapado es del 4,5 % = **45** Lts

4 - CONTENIDO DE AGUA (Tablas: 11,6, 11.7, 11,8, 11,9)

El agua de mezclado cumple dos funciones principales en una mezcla de concreto: una es hidratar las particulas de cemento, y la otra, producir la fluidez necesaria. Para determinar la cantidad de agua para un asentamiento determinado, depende del requerimiento de agua del cemento y el agregado, el tamaño maximo del agregado y la forma y textura del mismo.

Se encuentra en la tabla correspondiente: Para un asentamiento de 3", tamaño máximo 1" y una forma del agregado grueso redondeado y textura lisa, el contenido de agua es de: **178** kgs por metro cúbico de concreto.

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

5 - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO (Tabla 11,12)

De acuerdo con las recomendaciones del codigo colombiano de construcciones Sismo-resistentes el concreto debe diseñarse y producirse para asegurar una resistencia a la compresion promedio (f'_c) lo suficientemente alta para minimizar la frecuencia de resultado de pruebas de resistencia por debajo del valor de la resistencia especificada del concreto.

Resistencia requerida de diseño cuando no hay datos que permitan determinar la desviacioon estandar, de acuerdo a la tabla 11,12 se considera la proyectada **210 kgs/cm^2**

$$V = \frac{\text{Variación Estándar}}{\text{Promedio de resultados de Resistencia}}$$

6 - SELECCIÓN DE LA RELACION AGUA-CEMENTO (Tabla 11.13)

Debido a que la resitencia del concreto se rige principalmente por la resistencia e interaccion de sus fases constituyentes: pasta, agregado e interfases de adherencia pasta-agregado, es comun que los diferentes agregados y cementos produzcan resistencias distintas con la misma relacion agua-cemento

Como la resistencia proyectada es de 210 Kgs/cm^2 y de acuerdo a la tabla 11,13 para concreto sin aire incluido, la relacion será. A / C = **0,5**

7 - CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO

Una vez que se a obtenido el contenido de agua de mezclado (paso 4 de la tabla 11,2) y la relacion agua-cemento (paso 6 de la tabla 11,2) el contenido de cemento por metro cubico de concreto es facilmente establecido, al dividir el contenido de agua de mezclado entre la relacion agua-cemento.

$$C = \frac{\text{Contenido estimado de agua en la mezcla}}{\text{Relación agua - cemento}} = \frac{A}{A/C}$$

$$C = \frac{178}{0,505} = \boxed{352,48}\ \text{Kg/m}^3$$

C = 352,48 divid por 3,10 = **113,70** lts

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Powered by CamScanner

8 - ESTIMACION DE LAS PROPORCIONES DE AGREGADOS

La estimacion de las proporciones de los agregados está basada en su tamaño maximo y gradación, debido a que la combinación granulometrica total de ambos agregados, finos y gruesos, es de considerable importancia en relacion con las propiedades del concreto.
Hay dos maneras distintas para la estimación de las proporciones: 1) La recomendación del metodo A.C.I. - 211 para materiales bien gradados o controlados. 2) El metodo grafico propuesto por **FULLER Y THOMPSON** para materiales no controlados o mal gradados.

Para este caso se utilizara el metodo grafico (materiales mal gradados)

En este gráfico obtenemos:

Agregado fino = 40% Agregado grueso = 60%

De tal manera se tiene lo siguiente:

MATERIAL	PESO kgs	DENSIDAD gr/cm3	VOLUMEN lts
CEMENTO	352,48	3,10	113,70
AGUA	178,00	1,00	178,00
AIRE 4,5%	-	-	45,00
		SUBTOTAL	**336,70**

VOLUMEN DE AGREGADOS =	1000	menos	336,70	=	663,30
VOLUMEN AGREGADO FINO =	40%	X	663,30	=	265,32
VOLUMEN AGREG. GRUESO =	60%	X	663,30	=	397,98

CANTIDAD DE MATERIALES POR M^3 DE CONCRETO

MATERIALES	VOLUMEN lts	DENSIDAD gr/cms3	PESO SECO Kgs
CEMENTO	113,70	3,10	352,48
AGREGADO FINO	265,32	2,638	699,90
AGREG. GRUESO	397,98	2,649	1054,43
AGUA	178,00	1,00	178,00
AIRE 4,5%	45,00		
TOTAL	**1000,00**		**2284,81**

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - RE - IDC - 030

9 - AJUSTE POR HUMEDAD

Debido a que los agregados petreos presentan cierta porosidad (poros que están conectados a la superficie de las particulas), el agua de mezclado puede ser absorvida. Por otra parte la superficie de las particulas también pueden retener agua formando una pelicula de humedad.

Peso húmedo agregado fino	=	699,90	X	1,04911363	=	734,27
Peso húmedo agreg.grueso	=	1054,43	X	1,01474734	=	1069,98

Agua libre:

Como la absorcion del agregado fino es 1,74% el agregado grueso es de 1,76%
se tiene que de la ecuación:

Humedad libre o superficial de los agregados = Humedad total menos absorción
Entonces:

H.L =	734,27	X	0,03172	=	23,29		20,26
	1070,0	X	-0,00283	=	-3,03		

Por lo tanto, el requerimiento de agua de adición debe ser:

178,00 menos 20,26 = **157,74** **lts**

PROPORCION EN PESO

CEMENTO	352,5	div.por	352,48	=	1,0
AGREGADO FINO	734,3	div.por	352,48	=	2,1
AGREGADO GRUESO	1070,0	div.por	352,48	=	3,0
AGUA	157,7	div.por	352,48	=	0,4

RELACION DE LA PROPORCION EN PESO:	**1**	**2,1**	**3,0**	**0,4**
	1	**104,2**	**151,8**	**22,4**
	Bulto cemento 50 Kgs	Kgs Arena	Kgs Grava	Lts de agua
RELACION DE LA PROPORCION EN VOLUMEN:	**1**	**2,0**	**2,8**	**Opcional**
	4	**8,1**	**11,1**	
	VALDADOS	**VALDADOS**	**VALDADOS**	

OBSERVACIONES	EL DISEÑO SE DEBERA AJUSTAR SI SE PRESENTASEN ALGUNOS CAMBIOS EN LOS AGREGADOS En la aplicación del agua, se debe tener en cuenta la humedad de los agregados
NOTA 1:	El diseño se realizó de acuerdo a muestra entregada por el contratista
GRAVA TRITURADA TAMAÑO MAXIMO 1" Y ARENA MEDIA (CANTERA LAGOS - MORELIA) CEMENTO PORTLAND DE USO GENERAL **"CEMEX"** JUNIO 26 DE 2024	

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - GR - AF - 005

ANALISIS GRANULOMETRICO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL (AGREGADO FINO)


ARTICULO 630 - 22, TABLA 630 - 2 INV. E - 213

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
MATERIAL:	Arena media bien gradada, color carmelita — **FUENTE:** CANTERA LAGOS MORELIA

P^1= 3125,4 P^2= 3015,4

TAMIZ	Peso Retenido	% Retenido	% Ret. Acumulado	% Que Pasa	NORMA		H.N
							403,6
3/8"	0,0	0,0	0,0	100,0	100		386,7
# 4	40,8	1,3	1,3	98,7	95	100	42,6
# 8	365,4	11,7	13,0	87,0	80	100	4,9
# 16	683,4	21,9	34,9	65,1	80	85	
# 30	712,4	22,8	57,7	42,3	25	60	
# 50	635,8	20,3	78,0	22,0	10	30	
# 100	485,2	15,5	93,5	6,5	2	10	
- 100	202,4	6,5	100,0	0,0			

% Modulo de Finura	2,78
Humedad Natural (%)	4,9
Resistencia Diseño Kgs/cm2	210
U.S.C.	SW
Pasa # 200	3,5

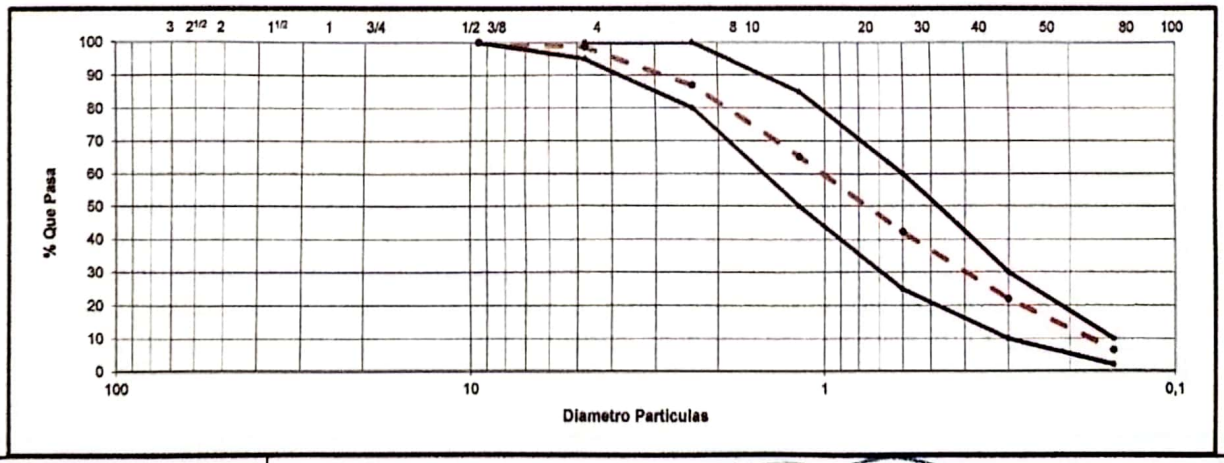

Observaciones:	**3000 PSI**
Elaboró:	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - GR - AG - 005


ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO

ARTICULO 630 - 22, TABLA 630 - 4 INV. E - 213 **(AG - 25)**

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES		
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	Grava triturada tamaño maximo 1"	**FUENTE:**	CANTERA LAGOS - MORELIA

P^1= 6175,8 **P^2= 5861,4**

TAMIZ	Peso Retenido	% Retenido	% Ret. Acumulado	% Que Pasa	NORMA		H.N		
							512,4	**Humedad natural %**	1,5
1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		505,6	**Pasa # 200**	5,1
3/4"	1055,2	17,1	17,1	82,9	95	100	44,5		
3/8"	3677,3	59,5	76,6	23,4	20	55	1,5	**Forma y Textura**	Angular y rugosa
4	1235,6	20,0	96,6	3,4	0	10			
8	61,4	1,0	97,6	2,4	0	5		**Resistenc de Diseño Kg/cm2**	**210**
-8	146,3	2,4	100,0	0,0					

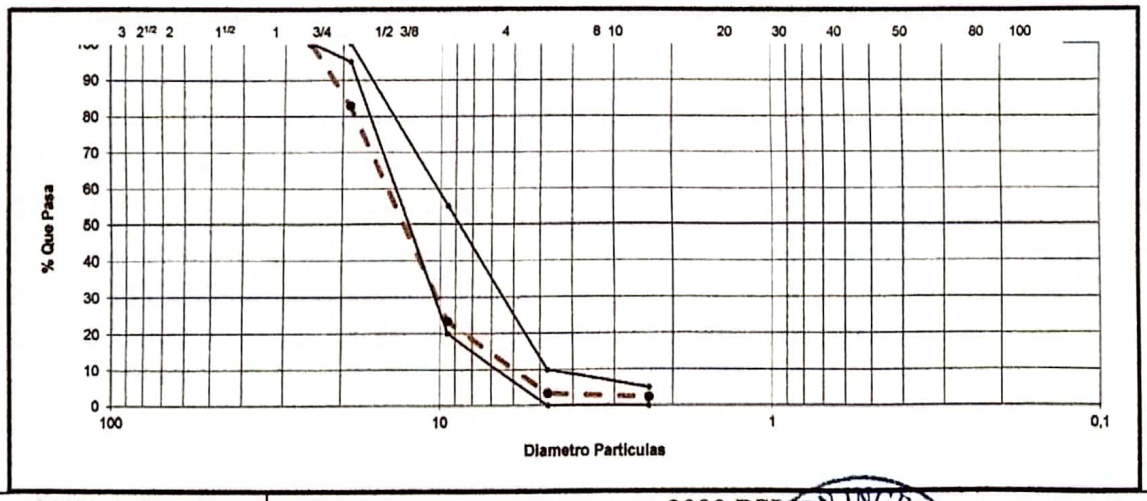

OBSERVACIONES	**3000 PSI**

Elaboró:	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6A Sur N° 18 - 18. Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - CA - PUAF - 019

INV. E - 217

PESO UNITARIO AGREGADO FINO

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES		
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	Arena media bien gradada, color carmelita claro	**FUENTE:**	CANTERA LAGOS - MORELIA

DESCRIPCION	**PESO UNITARIO SUELTO**					
Ensayo No.	1	2	3	4	5	**Promedios**
Volumen del Molde (pie3)	0,0982	0,0982	0,0982			
Numero de capas						
Peso del Molde (Gms)	1233	1233	1233			
Peso Muestra + Molde (Gms)	4962	4955	4967			
Peso Muestra (Gms)	3729	3722	3734			
Peso Unitario (Lbs/pie3)	83,7	83,6	83,8			**83,7**
Peso Unitario (Ton/M3)	1,342	1,339	1,343			**1,341**

DESCRIPCION	**PESO UNITARIO COMPACTADO**					
Ensayo No.	1	2	3	4	5	**Promedios**
Volumen del Molde (pie3)	0,0982	0,0982	0,0982			
Numero de capas	3	3	3			
Numero de chuzones/capas	25	25	25			
Peso del Molde (Gms)	1233	1233	1233			
Peso Muestra + Molde (Gms)	5445	5453	5440			
Peso Muestra (Gms)	4212	4220	4207			
Peso Unitario (Lbs/pie3)	94,6	94,7	94,4			**94,6**
Peso Unitario (Ton/M3)	1,515	1,518	1,514			**1,52**

RESULTADOS			
	SUELTO	**1,341**	Tn/M^3
	COMPACTO	**1,516**	Tn/M^3

Observaciones:	**3000 PSI**
Elaboró:	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - CA - PUAF - 019

INV. E - 217

PESO UNITARIO AGREGADO GRUESO

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES		
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
MATERIAL:	Grava triturada tamaño maximo 1"	**FUENTE:**	CANTERA LAGOS - MORELIA

DESCRIPCION	PESO UNITARIO SUELTO					
Ensayo No.	1	2	3	4	5	**PROMEDIO**
Volumen del Molde (pie3)	0,3375	0,3375	0,3375			
Numero de capas	3	3	3			
Peso del Molde (Gms)	7506	7506	7506			
Peso Muestra + Molde (Gms)	21100	21126	21075			
Peso Muestra (Gms)	13594	13620	13569			
Peso Unitario (Lbs/pie3)	88,8	89,0	88,6			**88,8**
Peso Unitario (Ton/M3)	1,423	1,426	1,420			**1,423**

DESCRIPCION	PESO UNITARIO COMPACTADO					
Ensayo No.	1	2	3	4	5	**PROMEDIO**
Volumen del Molde (pie3)	0,3375	0,3375	0,3375			
Numero de capas	3	3	3			
Numero de chuzones/capas	25	25	25			
Peso del Molde (Gms)	7506	7506	7506			
Peso Muestra + Molde (Gms)	22175	22197	22160			
Peso Muestra (Gms)	14669	14691	14654			
Peso Unitario (Lbs/pie3)	95,8	96,0	95,7			**95,8**
Peso Unitario (Ton/M3)	1,536	1,538	1,534			**1,536**

RESULTADOS		
	SUELTO	**1,423**
	COMPACTO	**1,536**

Observaciones:	**3000 PSI**
Elaboró:	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERIA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - CA - PE - AF - 017

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO FINO

INV. E - 222

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES		
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	Arena gruesa bien gradada, color carmelita claro	**FUENTE:**	CANTERA LAGOS MORELIA

PRUEBAS		1		2		**PROMEDIO**
A (Gms)		491,5		491,4		
V c.c		500,0		500,0		
W c.c		305,2		305,1		
V - W		194,8		194,9		
B (Gms)		500,0		500,0		
B - A		8,5		8,6		
(V - W) - (B - A) (Gms)		186,3		186,3		
GS Bulk : A/(V - W)		2,523		2,521		2,522
GS Bulk SSS : B/(V - W)		2,567		2,565		2,566
GS Aparente: A/(V - W) - (B - A)		2,638		2,638		2,638
ABSORCION : (B - A) x 100/A		1,73		1,75		1,74

RESULTADOS		
	GS. BULK	**2,522**
	GS. APARENTE	**2,638**
	ABSORCION	**1,74**

A. PESO EN EL AIRE DE LA MUESTRA SECA
V: VOLUMEN DEL PICNOMETRO
W: VOLUMEN DE AGUA PARA LLENAR EL PICNOMETRO CON LA MUESTRA
B: PESO DE LA MUESTRA SATURADA
GS: GRAVEDAD ESPECIFICA.

NOTA: LAS PRUEBAS NO DEBEN VARIAR
MAS DE 0.02 EN GRAVEDAD ESPECIFICA Y
NO MAS DE 0.05 EN ABSORCION

Observaciones:	**3000 PSI**
ELABORO:	LUIS ANTONIO AVILES Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERIA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILES C.C. 6.386.705

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - CA - PE - AG - 017

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO GRUESO

INV. E - 223

EMPRESA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES		
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4045 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES. DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	Grava triturada tamaño maximo 1"	**FUENTE:**	CANTERA LAGOS MORELIA

PRUEBAS	1	2	3	4	5	PROMEDIO
A (Gms)		1618,3		1756,4		
B (Gms)		1647,0		1787,0		
C (Gms)		1007,2		1093,8		
B - C		639,8		693,2		
A - C		611,1		662,6		
B - A		28,7		30,6		
GS Bulk : A/(B - C)		2,529		2,534		2,532
GS Bulk SSS : B/(B - C)		2,574		2,578		2,576
GS Aparente: A/(A - C)		2,648		2,651		2,649
ABSORCION : (B - A) x 100/A		1,77		1,74		1,76

RESULTADOS		
	GS. BULK	2,532
	GS. APARENTE	2,649
	ABSORCION	1,76

A: PESO EN EL AIRE DE LA MUESTRA SECA
B: PESO EN EL AIRE DE LA MUESTRA SATURADA EN SUPERFICIE SECA
C: PESO EN EL AGUA DE LA MUESTRA SATURADA EN SUPERFICIE SECA
GS: GRAVEDAD ESPECIFICA

NOTA: LAS PRUEBAS NO DEBEN VARIAR MAS DE 0.02 EN GRAVEDAD ESPECIFICA Y NO MAS DE 0.05 EN ABSORCION

Observaciones:	3000 PSI
ELABORO:	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Mt. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE HA INICIADO OBRA POR PARTE DE LA JAC.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.378.598,00

VALOR ACUMULADO: $ 197.378.598,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.475.719,60	17/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.868.929,90	17/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.213.579,40	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100295255

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	118%	$ 232.000.000	17/11/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073005 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 186.171.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 186.171.800,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ -		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ -		
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ -		
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO EXISTE INFORMACION CARGADA EN LA PAGINA DEL SECOP SOBRE LAS POLIZAS DE ESTE CONVENIO.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.753.948,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.753.948,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.750.189,60	14/11/2023	31/10/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.037.697,40	14/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.226.184,40	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296701

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000	17/11/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073329 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO
DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4318 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.104.062,00	$ 44.328.046,00	$ 44.328.046,00		$ 147.760.154,00	75,2%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.432.805,00		$ 4.432.805,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.674.255,00	$ 13.255.692,00	$ 13.255.692,00		$ 44.185.639,00	22,5%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 76.778.317,00	$ 57.583.738,00	$ 62.016.543,00		$ 196.378.598,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Benito Ome M
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma: Diana Milena Rivera
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Contratista

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4045 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 55.575.768,00	$ 41.681.827,00	$ 41.681.827,00		$ 138.939.422,00	75,0%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.168.183,00		$ 4.168.183,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16.825.677,00	$ 12.619.259,00	$ 12.619.259,00		$ 42.064.195,00	22,7%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 72.401.445,00	$ 54.301.086,00	$ 58.469.269,00		$ 185.171.800,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Luis Elver Cantillo P.
Nombre: LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
Contador del contratista
Apoyo Administrativo Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 279409-T

Contratista

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4346 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.427.044,00	$ 45.320.283,00	$ 45.320.283,00		$ 151.067.610,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.532.028,00		$ 4.532.028,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.661.724,00	$ 13.246.293,00	$ 13.246.293,00		$ 44.154.310,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.088.768,00	$ 58.566.576,00	$ 63.098.604,00		$ 199.753.948,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Contratista

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284714 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** JULIO DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4318 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 196.378.598,00** **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
1	9/07/2024	Luz Martha Altamar de los Reyes	Examen medico laboral	$ 240.000,00		$ 9.600,00	0	$ 230.400,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	9/07/2024	RPM suministros y dotaciones S.A.S	Suministro de dotacion	$ 2.200.000,00		$ 46.737,00	0	$ 2.153.263,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	9/07/2024	RPM suministros y dotaciones S.A.S	Suministro de dotacion	$ 662.000,00			0	$ 662.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
4	9/07/2024	Luis Antonio Avilez	Estudios de suelo	$ 1.659.000,00		$ 55.764,00	0	$ 1.603.236,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	9/07/2024	Ferretería y comercializadora G&C ZOMAC S.A.S	Compra material de ferreteria	$ 44.679.139,00		$ 235.351,00	0	$ 44.443.788,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
6	9/07/2024	Victor Manuel Garcia Garcia	Servicios de topografia	$ 2.000.000,00	$ 960.000,00	$ 80.000,00	0	$ 960.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
7	9/07/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100073005	$ 412.984,00			0	$ 412.984,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
8	9/07/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100073005	$ 221.302,00			0	$ 221.302,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
9	11/07/2024	William Gilberto Gozalez Palomo	Compra de valla	$ 349.000,99			0	$ 349.000,99	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
10	26/07/2024	DANIEL ALBERO GONZALEZ ARCILLA	compra base granular	$ 6.854.000,00		$ 144.000,00	0	$ 6.710.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
11	29/07/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100295255	$ 172.621,46			0	$ 172.621,46	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
12	29/07/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100295255	$ 208.761,70			0	$ 208.761,70	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 147.803.248,00		$ 51.533.139,00	$ 51.533.139,00	$ 96.270.109,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.434.097,00			$ -	$ 4.434.097,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.141.253,00		$ 8.125.670,15	$ 8.125.670,15	$ 36.015.582,85
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTALES	$ 196.378.598,00			$ 59.658.809,15	$ 136.719.788,85

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(JULIO) :** (Indicar el mes) $ 33.273,46 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 445.190,70 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Benito Ome
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma: Diana Milena Rivera
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. **4318 de 2023** (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	UNICO DESEMBOLSO	$ 196.378.598,00	15/12/2023		A907142		UNICO DESEMBOLSO	JAC los Aletones	900553557			JAC@GMAIL.COM								$ 196.378.598,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	001	1	MAR-5002	Examen medico laboral	Luz Martha Altamar De Los Reyes	22639487-7	CR 2 E 29 B 05	3108733760	maraltaf93@yahoo.es	$ 240.000,00		$ 240.000,00		$ 9.600,00	$ -	$ 230.400,00	$ 196.148.198,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	002	2	CRPM-134	Suministros de dotacion	RPM suministros y dotaciones S.A.S	901426432-6	CR 14 20 14 BRR LA CONSOLATA	3202627622	rpmsuministrosydotaciones@gmail.com	$ 1.869.496,00	$ 330.504,00	$ 2.200.000,00		$ 46.737,00	$ -	$ 2.153.263,00	$ 193.994.935,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	003	3	CRPM 135	Suministro de dotacion	RPM suministros y dotaciones S.A.S	901426432-6	CR 14 20 14 BRR LA CONSOLATA	3202627622	rpmsuministrosydotaciones@gmail.com	$ 556.303,00	$ 105.697,00	$ 662.000,00			$ -	$ 662.000,00	$ 193.332.935,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	004	4	FEV 579	Estudios de suelo	Luis Antonio Avilez	6886705-8	CL 6 S 18 18 BRR VILLAMONICA	3125233649	geoconingenieria@hotmail.com	$ 1.394.118,00	$ 264.882,42	$ 1.659.000,42		$ 55.764,00	$ -	$ 1.603.236,42	$ 191.729.698,58	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/07/2024	005	5	SCR 15105	Compra material de ferreteria	Ferreteria y comercializadora G&C ZOMAC S.A.S	901242314-4	CL 19 10 11 BRR LA INMACULADA	3213714066	ferreteriagomez1@hotmail.com	$ 37.656.259,68	$ 7.022.879,32	$ 44.679.139,00		$ 235.351,00	$ -	$ 44.443.788,00	$ 147.285.910,58	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	006	6	CUENTA DE COBRO	Servicios de topografia	Victor Manuel Garcia Garcia	19130460-1	CR 24 A 3 15 BRR YAPURA	4352496	victorgar50@hotmail.com	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ 960.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ 960.000,00	$ 146.325.910,58	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	007	7	72015672	Actualizacion Poliza NB-100073005	Aseguradora mundial de seguro	900531292	CLL 33 N 6B-24	3214590179	medellin@segurosmundial.com.co	$ 347.046,58	$ 65.938,85	$ 412.985,43			$ -	$ 412.985,43	$ 145.912.925,15	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/07/2024	008	8	72021050	Actualizacion Poliza NB-100073005	Aseguradora mundial de seguro	900531292	CLL 33 N 6B-24	3214590179	medellin@segurosmundial.com.co	$ 185.968,00	$ 35.334,50	$ 221.302,50			$ -	$ 221.302,50	$ 145.691.622,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/07/2024	009	9	FV-532	Compra de valla	William Gilberto Gozalez Palomo	17632735	CR 6 16 36 BRR SIETE DE AGSTO	3123500753	panamericanaimpresores1@gmail.com	$ 294.117,64	$ 55.882,35	$ 349.999,99			$ -	$ 349.999,99	$ 145.341.622,66	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/07/2024	010	10	FEDA-8	Compra base granular	DANIEL ALBERO GONZALEZ ARCILLA	1075237530	CL 5 28 06 AP 803	3226103017	juangabrielmottanunez4@gmail.com	$ 5.760.000,00	$ 1.094.000,00	$ 6.854.000,00		$ 144.000,00	$ -	$ 6.710.000,00	$ 138.631.622,66	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	011	11	72043773	Actualizacion Poliza NB-100295255	Aseguradora mundial de seguro	900531292	CLL 33 N 6B-24	3214590179	medellin@segurosmundial.com.co	$ 172.621,46		$ 172.621,46			$ -	$ 172.621,46	$ 138.459.001,20	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	012	12	72043734	Actualizacion Poliza NB-100295255	Aseguradora mundial de seguro	900531292	CLL 33 N 6B-24	3214590179	medellin@segurosmundial.com.co	$ 208.761,70		$ 208.761,70			$ -	$ 208.761,70	$ 138.250.239,50	

Firma:
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 OND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4045 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 185,171,800** **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Jesus Ome
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma:
Nombre:
Contadora de la OAC
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023

BENITO OME MUÑOZ
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	**0,00**																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 209.706,00	$ 104.853,00	$ 104.853,00														**$ 209.706,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 4.769.706,00				$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60			**$ 4.769.706,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 30.687.601,00			$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20									**$ 30.687.601,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 69.792.652,00					$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11			**$ 69.792.652,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 15.967.057,00						$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13			**$ 15.967.057,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 26.333.390,00			$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00				**$ 26.333.390,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.432.803,00													$ 1.773.121,20	$ 1.773.121,20	$ 886.560,60	**$ 4.432.803,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.185.683,00		$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	**$ 44.185.683,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 196.378.598,00	**$ 104.853,00**	**$ 3.260.973,21**	**$ 11.926.979,41**	**$ 12.403.950,01**	**$ 20.158.689,13**	**$ 22.154.571,25**	**$ 22.154.571,25**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 15.156.833,25**	**$ 4.929.241,41**	**$ 4.042.680,81**	**$ 196.378.598,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,053%	1,661%	6,073%	6,316%	10,265%	11,282%	11,282%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	7,718%	2,510%	2,059%	100,000%
	ACUMULADO	0,053%	1,714%	7,787%	14,103%	24,368%	35,650%	46,932%	55,088%	63,244%	71,400%	79,556%	87,712%	95,430%	97,940%	100,000%	
EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%										
	ACUMULADO	0,000%	1,607%	3,214%	4,821%	6,429%	8,036%										

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de Asojuntas
Belén de los Andaquies – CS#4045

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023

LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 783.252,00	$ 391.626,00	$ 391.626,00														**$ 783.252,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 178.577,00	$ 89.288,50	$ 89.288,50														**$ 178.577,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 7.274.043,00			$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60									**$ 7.274.043,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 3.830.081,00			$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20									**$ 3.830.081,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 0,00	$ 0,00															**$ 0,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 13.585.372,00				$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43						**$ 13.585.372,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 55.020.253,00				$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44				**$ 55.020.253,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY`=4200 MPA	$ 26.776.050,00			$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00				**$ 26.776.050,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 11.594.624,00				$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40			**$ 11.594.624,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÂMETRO INTERIOR	$ 19.897.170,00				$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00								**$ 19.897.170,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00													$ 1.667.273,20	$ 1.667.273,20	$ 833.636,60	**$ 4.168.183,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00		$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	**$ 42.064.195,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 185.171.800,00	**$ 480.914,50**	**$ 3.485.499,86**	**$ 7.903.015,16**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 18.875.215,63**	**$ 14.895.781,63**	**$ 14.895.781,63**	**$ 12.955.014,20**	**$ 12.955.014,20**	**$ 5.831.320,96**	**$ 4.671.858,56**	**$ 3.838.221,96**	**$ 185.171.800,00**
PROGRAMADO	**SEMANAL**		0,260%	1,882%	4,268%	11,393%	11,393%	11,393%	11,393%	10,193%	8,044%	8,044%	6,996%	6,996%	3,149%	2,523%	2,073%	100,000%
	ACUMULADO		0,260%	2,142%	6,410%	17,803%	29,196%	40,589%	51,982%	62,175%	70,219%	78,263%	85,259%	92,255%	95,404%	97,927%	100,000%	
EJECUTADO	**SEMANAL**		0,000%	1,754%	7,277%	6,020%	18,177%	2,010%										
	ACUMULADO		0,000%	1,754%	9,031%	15,051%	33,228%	35,239%										

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023

JESUS OME RENTERIA
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 397.626,00		$ 397.626,00														**$ 397.626,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 176.561,00	$ 88.280,50	$ 88.280,50														**$ 176.561,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 96.764,00				$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40			**$ 96.764,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 14.577.978,00			$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60									**$ 14.577.978,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 64.597.841,00					$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89			**$ 64.597.841,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 14.462.812,00						$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50			**$ 14.462.812,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.169.906,00			$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60				**$ 24.169.906,00**
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 1.585.458,00			$ 792.729,00	$ 792.729,00												**$ 1.585.458,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 17.417,00			$ 8.708,50	$ 8.708,50												**$ 17.417,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 543.802,00			$ 543.802,00													**$ 543.802,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 8.752.080,00				$ 4.376.040,00	$ 4.376.040,00											**$ 8.752.080,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 11.550.194,00				$ 3.850.064,67	$ 3.850.064,67	$ 3.850.064,67										**$ 11.550.194,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 MPA	$ 6.293.910,00			$ 2.097.970,00	$ 2.097.970,00	$ 2.097.970,00											**$ 6.293.910,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 487.867,00							$ 487.867,00									**$ 487.867,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 3.357.394,00				$ 3.357.394,00												**$ 3.357.394,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00													$ 1.812.811,20	$ 1.812.811,20	$ 906.405,60	**$ 4.532.028,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00		$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	**$ 44.154.310,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.753.948,00	**$ 88.280,50**	**$ 3.639.785,79**	**$ 11.929.674,99**	**$ 22.979.048,05**	**$ 25.997.754,44**	**$ 21.331.595,94**	**$ 17.969.398,27**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 13.961.756,27**	**$ 4.966.690,49**	**$ 4.060.284,89**	**$ 199.753.948,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,044%	1,822%	5,972%	11,504%	13,015%	10,679%	8,996%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	6,989%	2,486%	2,033%	100,000%
	ACUMULADO	0,044%	1,866%	7,838%	19,342%	32,357%	43,036%	52,032%	59,324%	66,616%	73,908%	81,200%	88,492%	95,481%	97,967%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%										
	ACUMULADO	0,000%	1,579%	3,158%	4,737%	6,316%	7,895%										

ANEXO 8.14.

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ANEXO 8.14.1.

Actas de comité de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 24 (Día) 07 (Mes) 24 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 **DE** 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 **DE** 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
BENITO OME MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	OAC VEREDA LOS ALETONES
RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON	RESIDENTE DE OBRA	OAC VEREDA LOS ALETONES
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN DE EL NUEVO ALCANCE DE LA META FISICA DEL PROYECTO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

✓ Dar a conocer el nuevo alcance físico del proyecto (702 ml de placa huella).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión siendo las 3:pm en la caseta comunal de la vereda los Alfanes, en primer punto se presenta el presidente de la junta y da las gracias a los asistentes. Seguidamente interviene el interventor, el ing Elkin Ramos, el cual explica el nuevo alcance del proyecto (702 ml de placa huella) debido al cambio en la actualización de precios de materiales, transporte y mano de obra en cuanto a los obreros. Continuamente se presenta el supervisor del Invias Cristian Camilo Sanz Gonzalez en el que comenta que el objetivo principal de esta reunión es dar a conocer el nuevo alcance a la comunidad, explica que ya se han iniciado laborres como la Figuración de hierro y se espera rápidamente la intervención de máquinaria pesada. Se presenta el personal encargado del manejo ambiental y Social en la que expresan sus funciones, la social resalta la inclusión de personal femenino ya sea en mano de obra no calificada o en veeduría, etc. El ing residente de la J.A.C interviene y demuestra preocupación por el estado general del tiempo y el precio de transporte de maquinarias. Por último el interventor explica que se devolvera a la junta el presupuesto que utilizaron para pólizas, que todo sera un trabajo en conjunto entre la comunidad, interventoria & Invias. También deja claro que se podra mostrar los extractos bancarios a la comunidad. Por último el interventor pregunta si tienen algunas inquietudes en la que la comunidad no tiene inquietudes. Se despide el equipo de Interventoría, la social, ambiental y el supervisor del Invias. Se finaliza la reunión.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Arelis Villa K.	Arelis V.
Blanca Lor Kinez	Blanca Lor/14
Edelmira Mosquera	Edelmira Mosquera
Lucrecia Culderon mosquera	Lucrecia
Jonathan Fabian ome culderon	
Gloria Castro M	
Yolanda Castro Hermida	
Luis Alejandro Jimenez .G	
Benito Ome	Benito
Luis Elver Castillo patiño	Luis Elver Castillo P.
ELKIN D. RAMOS	

Powered by CamScanner

ANEXO 8.14.2.

Actas de comité de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 24 (Día) 07 (Mes) 24 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 **DE** 2023

CONTRATISTA: JASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 **DE** 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS
OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN DE EL NUEVO ALCANCE DE LA META FISICA DEL PROYECTO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

✓ Dar a conocer el nuevo alcance físico del proyecto. (construcción de 5 alcantarillas de 36").

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión siendo las 3:pm en la caseta comunal de la vereda los Alotanes, en primer punto se presenta el presidente de la Asociación comunal de Juntas de Belén de los Andaquies y da gracias a los asistentes. Seguidamente interviene el interventor, el ing Elkin Ramos, el cual explica el nuevo alcance del proyecto (Construcción de 5 alcantarillas de 36'') 2 de caja (aleta por aleta) y 3 de caja - pocceta. Todo debido a la actualización de precios de materiales, transporte y mano de obra no calificada. Continuamente se presenta el supervisor del Invias Cristian Camilo Sanz Gonzalez en el que comenta que el objetivo principal de esta reunión es dar a conocer el nuevo alcance a la comunidad, explica que ya se han iniciado labores como la excavación para tuberías en las cinco alcantarillas, así com la instalación de tubos, solados de limpieza, sus respectivos atraques y rellenos. Se espera la otra semana instalación de hierros para cajas, aletas, etc. Se presenta el personal encargado del mundo social y ambiental. en la que expresan sus funciones. Por último el interventor explica que se devolvera a la Asociación el presupuesto que utilizaron para pólicas. Tambien deja clara que se podrá mostrar los extractos bancarios a la comunidad. Por último el interventor pregunta si tienen algunas inquietudes a la comunidad no tiene. Se despide el equipo de interventoría, la social, ambiental y el supervisor del Invias. Se finaliza la reunión.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Arelis Villa	Arelis V
Blanca Luz Martinez	Blanca L14
Edelmira Mosquera	Edelmira Mosquera
Lucrecia Calderon mosquera	Lucrecia
Jonathon ome calderon	
Glorio cuntes M	Glorio C.
Yolanda Castro Hermida	Yolanda
Luis Alejandro Jimenez G	Guisbert
Benito ome	Benito
Luis Elver Castello Patiño	Luis elver Castillo P.
Elkin D. Ramos	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 8.14.3.

Actas de comité de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 20 (Día) 07 (Mes) 24 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE CONVENIO SOLIDARIO No.: 4340 DE 2023

CONTRATISTA: JJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Elkin David Ramos Mosquera	Director Interventoría	Interventoría
Diego Fernando Gallego Calderón	Residente Interventoría	Interventoría
Manuel Alfonso Calle Santapimio	Residente de Obra	J.A.C Campoalegre
Jesus Omar Renteria	Presidente J.A.C	J.A.C Campoalegre
Sandra P. Parra Torres	Contadora J.A.C.	J.A.C Campoalegre.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN DE EL NUEVO ALCANCE DE LA META FISICA DEL PROYECTO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

✓ Para conocer el nuevo alcance físico del proyecto (102 ml de placa huella y 1 alcantarilla).

✓ La compra y transporte de materiales.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión siendo las 2:30 pm en la casa del presidente de la J.A.C vereda campalegre, el ing. Elkin Ramos se presenta junto con el Residente de Interventoría, Residente de Obra y contadora. El primer tema a socializar es el nuevo alcance del proyecto, el cual explica sus causas y da a conocer que su nuevo alcance sera 102ml de placa huella y 1 alcantarilla. debido a las actualizaciones de precios de materiales, transporte y mano de obra, en cuanto a los obreros. La comunidad expresa disgusto por la demora en el inicio de obra y que disminuyo su alcance, el cual el interventor vuelve a explicar sus causas con el fin de que la comunidad entienda y poder seguir con la reunión. La comunidad expresa que está complicado conseguir la mano de obra no calificada dentro de la vereda por lo que tratará de conseguir en la cabecera municipal Morelia. Lo cual el interventor agradece para podir iniciar el proyecto físicamente. El ingeniero Residente de la J.A.C comenta que ya viene trabajando junto con el presidente y contadora en la compra y transporte de materiales petreos y de ferretería. Por último el interventor pregunta a la comunidad si tienen alguna inquietud al respecto. Por lo que un miembro de la comunidad realizó dos preguntas:

1: ¿ Puede personal femenino ingresar a realizar labores de mano de obra no calificada?

2: ¿ La comunidad podrá revisar los extractos bancarios.?

El interventor a la primera pregunta afirma que si se puede que con el ingreso de personal femenino tendríamos inclusión de genero y a la segunda pregunta responde que si que sería muy bueno y esa sería una de las funciones de la veeduría para tener un control.

Se despide el equipo de interventoría y se da finalizada la reunión.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANCIZAR PINZAS LLANOS	Ancizar Pinzas
JHON FREDY CEDIEL FORERO.	JHON FREDY C.
Guillermo Ome Joven	
Cristian C. Vivas Molina	
Yuri Lediel Campos	Yuri Lediel Campos.
Maria Cecilia Joven.	
Francisco Antonio Fajardo Palomino	Francisco Fajardo
Manuel Alfonso Gelis Santafumio	
Sandra Patricia Parra Torres	
Jesus Ome	Jesus Ome
Yineth Ome Joven	Yineth Ome Joven
Yudi Vanesa ome Joven	Vanesa ome
Elkin D. Llanos	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 8.15.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONTRATO DE OBRA No. 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE OBRA No. 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO DE OBRA No. 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA CON PLACA DE MATRICULA (**HQX980**)	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA	YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA DE MATRICULA (**NSI18G**)	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

CAMIONETA: **MARCA:** MITSUBISHI **CILINDRAJE:** 2477 CC **MODELO:** 2015

MOTOCICLETA: **MARCA**: YAMAHA **CILINDRAJE:** 149 CC **MODELO:** 2024

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012318750

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HQX980	MITSUBISHI	L 200 2.5L	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.477	PLATA COOL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: 4D56UCET7305

RL.: N

VIN: MMBJNKB40FD000188

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: MMBJNKB40FD000188

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID

IDENTIFICACIÓN: C.C. 7692245

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 134

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882014000090224	I	11/07/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/07/2014	16/08/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE



LT02004137760

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029905008

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NSI18G	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E105381	N	9FKDG3619R2105381

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3619R2105381	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GALLEGO CALDERON DIEGO FERNANDO	C.C. 1006524418

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902023000136079

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/08/2023

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
31/08/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/08/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE DPTAL CAQUETA/BELEN DE LOS ANDAQUIES

LT0700252241 6

Powered by CamScanner

ANEXO 8.16.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVIN RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON	1.006.524.418	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ASMET SALUD	30566714	$ 52.000,00	PORVENIR	30566714	$ 208.000,00				
2	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.682.245	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.060.000,00			X		X					X					X		X					X		X						X	25%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 4.060.000,00	$ 282.600,00	V	SANITAS	30533418	$ 507.500,00	COLPENSIONES	30533418	$649.600,00				
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000,00			X		X					X					X		X					X		X						X	26%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.213.334,00	$ 84.500,00	V	NUEVA EPS	30566714	$ 48.600,00	PORVENIR	30566714	$ 194.200,00				
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.300.000,00			X		X					X					X		X					X		X						X	26%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.213.334,00	$ 84.500,00	V	ASMET SALUD	30566714	$ 48.600,00	COLPENSIONES	30566714	$ 194.200,00				
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL SISO	$ 1.300.000,00			X		X					X					X		X					X		X						X	26%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.213.334,00	$ 84.500,00	V	SANITAS	30566714	$ 48.600,00	PORVENIR	30566714	$ 194.200,00				
6																																													
7																																													
8																																													
9																																													
10																																													
11																																													
12																																													
13																																													
14																																													
15																																													
16																																													
17																																													
18																																													
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.260.000,00																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/07/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

Florencia, 31 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:


Que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, con corte a 31/julio/2024.

Así mismo certifico que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha realizado el pago de manera oportuna en los últimos 7 meses.

Atentamente,


VIVIANA ARBOLEDA DURANGO
Contador Público Titulado
CC. 1.117.513.231
TP 247382 – T

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
CC # 7.692.245 expedida Neiva

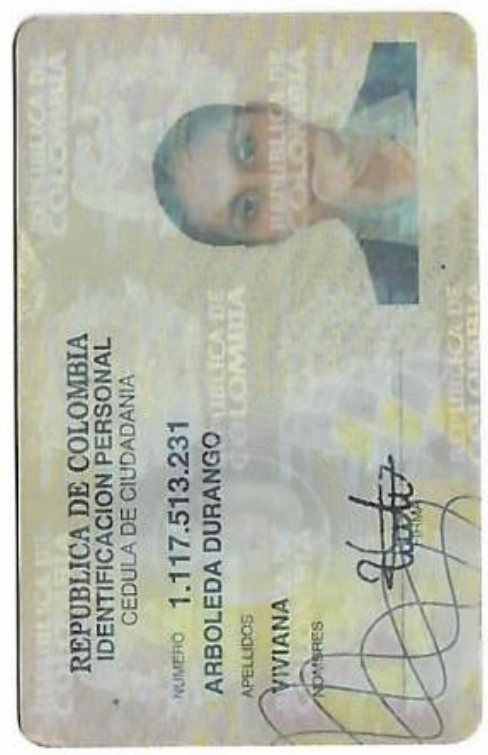
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.117.513.231
APELLIDOS ARBOLEDA DURANGO
NOMBRES VIVIANA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1990
FLORENCIA (CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O+ G.S RH
F SEXO
10-JUN-2008 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-4400100-00138191-F-1117513231-20081217 0008203784A 1 25467132


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
247382-T
VIVIANA
ARBOLEDA DURANGO
C.C. 1117513231
RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
254892
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
274071

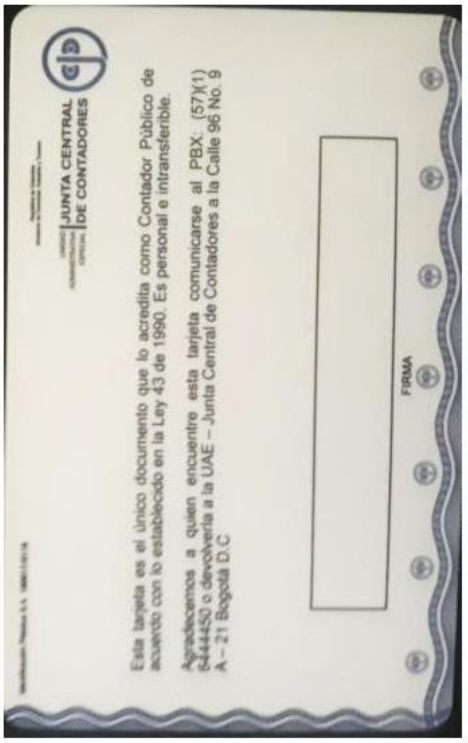
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

ANEXO 8.17.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: 4

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 4318 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4045 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
LJUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE - MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1409123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 106.174.537,00	$ 106.174.537,00
TOTAL						$ 106.174.537,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 106.174.537,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
TOTALES												


Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 89.222.300,00		$ 89.222.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 16.952.237,00	$ 16.952.237,00
VALOR TOTAL	$ 89.222.300,00	$ 16.952.237,00	$ 106.174.537,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

FECHA DE INICIO: 26-dic-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-sep-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00

VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	7/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	7/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	7/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11-dic-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	26/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	26/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	26/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/05/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/07/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/01/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/09/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/12/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506


Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.19.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ No. 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS SOLIDARIOS: CONVENIO SOLIDARIO # 4318 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4045 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA; ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE - MUNICIPIO DE MORELIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 106.174.537,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 106.174.537,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2024				AÑO 2024														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000,00			0,11	$ 550.000,00	0,11	$ 550.000,00	0,11	$ 550.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00							1,32	$ 6.600.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000,00			0,33	$ 1.333.333,33	0,33	$ 1.333.333,33	0,33	$ 1.333.333,33	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00							4,00	$ 16.000.000,00
		Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
		Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conformar esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
		Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
		Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
		Inspector	1.200.000,00		6,00	7.200.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Inspector SST	1.200.000,00		0,50	600.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -								$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						31.540.000,00				$ 33.688.000,00				$ 1.883.333,33		$ 1.883.333,33		$ 1.883.333,33		$ 9.346.000,00		$ 9.346.000,00									$ 33.688.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36							2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						74.434.400,00				$ 79.503.680,00				$ 4.444.667,00		$ 4.444.667,00		$ 4.444.667,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00							$ 79.503.680,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024				AÑO 2024														TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES		
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			12,00	$ 6.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.650.000,00	3,00	$ 1.650.000,00	3,00	$ 1.650.000,00	3,00	$ 1.650.000,00							12,00	$ 6.600.000,00
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	5.600.000,00			0,55	$ 1.533.819,92			0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 383.455,00	0,14	$ 383.455,00	0,14	$ 383.455,00	0,14	$ 383.455,00							0,55	$ 1.533.820,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	900.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		OTROS COSTOS								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	176.200,00	Según comprobante por mes	2,00	352.400,00			4,00	$ 704.800,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 176.200,00	1,00	$ 176.200,00	1,00	$ 176.200,00	1,00	$ 176.200,00							4,00	$ 704.800,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	80.000,00	Según comprobante por mes	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00							4,00	$ 320.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000,00			0,33	$ 46.666,67	0,33	$ 46.666,67	0,33	$ 46.666,67	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00							4,00	$ 560.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	115.500,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 9.718.620,00				$ 46.666,67		$ 46.666,67		$ 2.336.321,67		$ 2.429.655,00		$ 2.429.655,00		$ 2.429.655,00								$ 9.718.620,00
*		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				89.222.300,00				$ 89.222.300,00				$ 4.491.333,67		$ 4.491.333,67		$ 6.780.988,67		$ 24.486.215,00		$ 24.486.215,00		$ 24.486.215,00								$ 89.222.300,00
*		IVA = 19% * (C) = (D)				16.952.237,00				$ 16.952.237,00				$ 853.353,00		$ 853.353,00		$ 1.288.388,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00								$ 16.952.237,00
*		COSTO TOTAL = (C) + (D)				106.174.537,00				$ 106.174.537,00				$ 5.344.686,67		$ 5.344.686,67		$ 8.069.376,67		$ 29.138.596,00		$ 29.138.596,00		$ 29.138.596,00								$ 106.174.537,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN *(campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:*

•El profesional ambiental de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control al Plan de Gestión Ambiental (complejidad baja) elaborado y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
•El profesional social de la Interventoría deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión Social, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.
•El profesional social de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión Social y presentar informes durante la ejecución del proyecto.
•La Interventoría debe vincular un profesional en SST, que deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos.
En la oferta económica de la Interventoría existe un Inspector SST el cual no posee la idoneidad para responsabilizarse del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
•El profesional en SST que vincule de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y presentar informes durante la ejecución del proyecto.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
