BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

FECHA: 31-07-2024 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** _____X_____ **LUGAR**

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No 31 COP-FDLT-316-2023.

HORA DE INICIO: 07:40 a.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis Fernando Alarcón									X	Interventoría		3106803079	
Edwin Rodríguez Gutiérrez									X	Consorcio Tauri 2		3232333612	
Angie Nathaly Pedraza Otálora									x	Interventoría.		3212378607	
Sandra Milena Tejada M									x	Colaboo Tauri 2		3502714772	Sandra M
Edilberto Ramírez S									x	Consorcio Tauri 2		3168520985	
Martha Henriquez Pedroza									x	FDLT - Infraestructura		3143031071	
John Agudelo Correa		x							x	FDLT - Infraestructura	John.agudelo@gmail.com	3156789366	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Revisión compromisos acta anterior:
   - Ingreso cuadrilla San Benito: La cuadrilla ingresó el martes 23 de julio 2024
   - Entrega propuesta cierre muro estructural, el contratista envió oficio Tauri 2-OF-184-2024 sin anexo. del concepto del especialista estructural.
   - Análisis red pluvial CIV 6000530 estaba para el 22 de julio de 2024, el contratista presentó versión final el sábado 27 de julio 2024. Se encuentra en revisión de interventoría.
     Se informa a la supervisión de esta toma, en esta que el sumidero planteado en diseños, quedaba trabajando en rebose, razón por la cual se replanteó la rasante de la vía y el sumidero se trasladó al CIV 6000560
   - Cámara eléctrica Frente San Benito, se inició la adecuación y reforzamiento el viernes 26 de julio de 2024.

2- FRENTE SAN BENITO.
Se fundieron muros de la cámara eléctrica, mañana 1 de agosto 2024 fundon MR-43 de calzada. El contratista debe terminar mañana mismo el 2 de agosto 2024. Se estableció que se siembren los árboles propuestos en el diseño excepto los árboles que se superponen.
La supervisión solicita información del PMT CIV 6002157 de San Benito, el contratista responde que puede salir aprobado el jueves 1 de agosto de 2024.
La interventoría reitera al contratista presentar solución al talud que se encuentra al respaldo del muro de contención del CIV. 6001440.

3. FRENTE ISLA DEL SOL.
   3.1 TRAMO 2.
   CIV 6000446 esta pendiente terminar pozos sanitarios son 2, terminar red sanitaria y 2 pozos predio KR 66 No 63-06, CIV 6000425; el contratista indica que termina el

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CIV 6000446 entre el 12 y 16 agosto de 2024, la supervisión manifiesta que no está de acuerdo con esa fecha.

CIV 6000461 pendiente terminar filtro del muro. & iniciar paisajismo. La interventoría propone empezar con la construcción de contenedores. Igualmente está pendiente el cierre del muro estructural

CIV 6000478. pendiente terminar paisajismo y remates de sumideros, y pozos de inspección. Falta dar solución a la conexión de la red pluvial

CIV 6000485.
Pendiente solución de conexión de red pluvial construida a la existente. Se han realizado dos reuniones en obra con EAAB y esta pendiente entrega levantamiento topográfico por parte del contratista para hoy 31 de julio de 2024?.
El contratista debe verificar con CCTV la red pluvial del segmento vial en vista que se presenta flujo de agua permanente, con EAAB se revisaron sumideros y no se encontró causa y origen de salida de agua
El contratista debe hacer remates de pozos de inspección y sumideros. (cañuelas).

CIV 6000501.
Está pendiente empate de la red de acueducto construída. La interventoría solicita que se adelante la prueba de hermeticidad a la red de acueducto construida con el fin de liberar esta actividad y continuar con los rellenos de espacio público.

CIV 6000505
Pendiente terminar el espacio público. El contratista indica que entregará el segmento terminado el 10 de agosto 2024

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CIV 6000530.
Esta pendiente adelantar actividades de relleno.
Se informa que la zona izquierda de la vía queda por debajo de la rasante de la vía, con EAAB, contratista e interventoría se planteó construir un filtro para drenar las aguas lluvias. La supervisión está de acuerdo.
Igualmente se informa a la supervisión acerca de la modificación de la rasante tanto del CIV 6000530 y 6000560 teniendo en cuenta que el sumidero planteado en diseños queda por debajo del nivel del descole. Lo que implica que la red pluvial trabaje en contrapendiente y en rebose. Esta modificación debe ser radicada a la EAAB-Zona 4.

CIV 6000560
Igual que el CIV 6000530 se debe levantar la rasante para mejorar el drenaje propuesto en diseños.

CIV 6000603
La Interventoría observa al contratista por la falta de suministro de material granular. el segmento se encuentra en mejoramiento de subrasante.

CIV 6000620
El segmento se encuentra en actividad de Mejoramiento de subrasante. Se requiere al contratista el suministro oportuno de materiales.

A nivel general la interventoría solicita el suministro de mano de obra de manera simultánea, e independiente en cada segmento vial, teniendo en cuenta que se agota el plazo contractual. De la misma manera la interventoría solicita el suministro oportuno y continuo de materiales.

La supervisión solicita a Interventoría el estado de avance del contrato FDLT-316-2023. la Interventoría informa que el estado de avance es: avance físico = -11% avance financiero = -11.7%.


Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La Supervisión solicita la entrega de los informes de obra y de interventoría Números 1, 2 y 3. en vista que no se encuentran en archivos.
La supervisión indica que los informes del mes de julio de 2024 deben quedar radicados a la entidad el 5 de agosto de 2024
La supervisión* a la Interventoría y al contratista para que se termine de organizar y actualizar los expedientes de cada contrato. (*requiere) a mas tardar el 15 de agosto 2024.
La supervisión solicita al contratista que la PQRS de la señora Martha Yolanda Guerrero con el tema de daño de acometida eléctrica al predio KR 19B BIS #59-64 quede cerrada para el 02 de agosto de 2024.

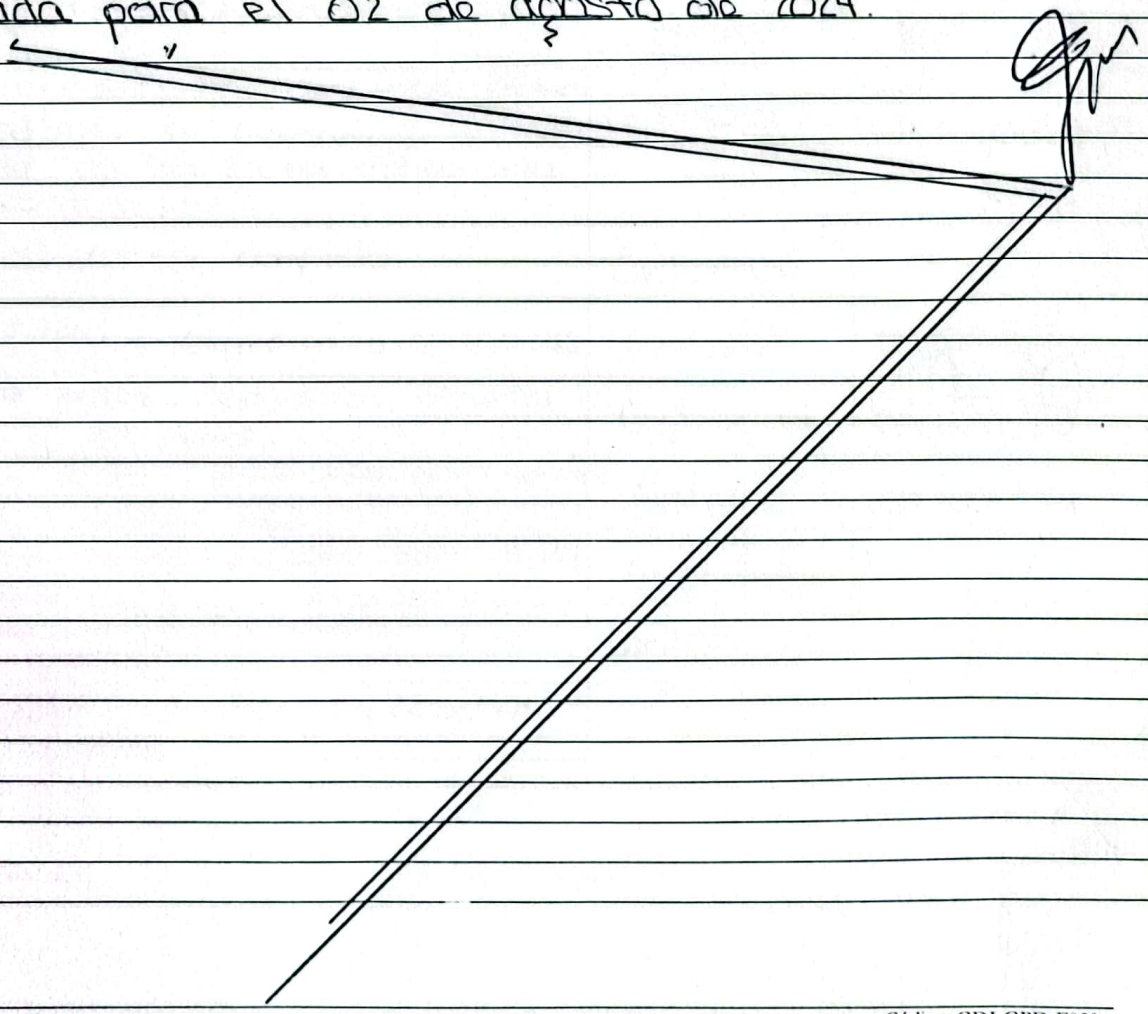

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Fundida de calzada completa CIV 6001440	Contratista	01/08/24
2.	Anexar concepto de especialista al cierre del muro del Oficio TAURIZ-OF-184-2024	Contratista	31/07/24
3.	Entregar paisajismo San Benito Completo	Contratista	08/08/24
4.	Entrega de demarcación completa CIV 6001440	Contratista	10/08/24
5.	Entrega de PMT aprobado por SDM del CIV 6002157	Contratista	02/08/24
6.	Respuesta a la interventoria sobre tratamiento a talud San Benito	Contratista	31/07/24
7.	Terminar pozos y red sanitaria CIV 6000425	Contratista	08/08/24
8.	Terminar CIV 6000446 completo, calzada espacio público. La supervisión no está	Contratista	Del 12 al 16 de Agosto 2024
	de acuerdo con la fecha estipulada por el contratista.		
9.	Terminar CIV 6000461 completo	Contratista.	
10.	Terminar Filtro y cierre muro CIV 6000461	Contratista.	09/08/24
11.	Limpieza de pozos, sumideros, remates en pozos y sumideros	Contratista	02/08/24
12.	Entrega de datos topografía para conexión red Pluvial 6000485 y 6000478	Contratista	31/07/24
13.	Revisar con CCTV la red pluvial del CIV 6000485	Contratista	
14.	Empates acueducto CIV 6000501 y prueba de presión	Contratista.	
15.	Entrega Espacio público CIV 6000501 costado izquierdo		

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
16.	Entrega espacio público CIV 6000505	Contratista	10/08/24
17.	Terminar calzada CIV 6000505	Contratista.	09/08/24
18.	Entrega plan de contingencia y programación de obra al tiempo de prorroga	Contratista	02/08/24.
19.	Cierre por San Benito Sra. Yolanda	Contratista	02/08/24
20.	Aomentar cuadrillas mano de obra		
21.	Entrega de informes a la supervisión mes de Julio	Contratista Interventoría.	05/08/24
22.	Entrega de los tres primeros informes y expecliente pendiente.	Contratista Interventoría.	15/08/24

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Viernes 9/08/24 Lugar de la próxima reunión: Isla del Sol.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner
