"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Puente 9 (K6+959 al K7+004) - Sector 1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE SAN FRANCISCO

JULIO DE 2023

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
01	**31/07/2023**	**INFORME MENSUAL**	**Consorcio Reactivación Putumayo**	**Ing. Luis José Ordoñez Salcedo**	**Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

INFORME MENSUAL No. 25 **MES O PERIODO:** jul-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado actual de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	40
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	456
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	457
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	459
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	884
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	896
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	985
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	987
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	1012
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1018
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1027
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No.977 de 2021**		1086
5.1	Información general del contrato		1086
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		1087
5.3	Informes especialistas y profesionales		1519
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1198
5.5	Informe matriz de riesgos.		1624
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1200
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A.
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		1201
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1202
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1203
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1204
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1206
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1214
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1453
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		1457
8	**Anexos**		1464
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1464
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1478
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1483
8.4	Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021		1490
8.5	Informes especialistas y profesionales		1519
8.6	Informe matriz de riesgos.		1624

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1

FECHA: 5/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** jul-23

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	114 meses
FECHA DE INICIO:	2 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de agosto de 2030
PLAZO ACUMULADO:	114 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 27.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 358.428.832,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	14,86
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	Km	22,0
Estructuras	Túneles	m	405,0
	Puentes	Un	33,0
	Pontones		
Mantenimiento		Km	7,1
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0,56	0,82
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	Km	2,05	10,89
Estructuras	Túneles	m	0	
	Puentes	Un	0	
	Pontones			
Mantenimiento		Km	0	7,1
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 544.944.728.598	$ 3.982.288.401	$ 548.927.016.999
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 36.165.963.584	$ 264.289.734	$ 36.430.253.318
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.468.040.000	$ 278.927.600	$ 1.746.967.600
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 21.925.085.689		$ 21.925.085.689
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000		$ 324.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.603.817.871	$ 4.533.544.197	$ 610.461.362.068

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 4.102.227.199	$ 29.977.814	$ 4.132.205.013	$ 24.653.537.343
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ 1.629.207.138
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 250.000.000	$ 47.500.000	$ 297.500.000	$ 1.417.365.024
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 37.241.126	$ 172.581	$ 37.413.707	$ 97.422.591
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 4.389.468.325	$ 77.650.395	$ 4.467.118.720	$ 27.797.532.096

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 47.702.699.281
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.474.683.884
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	51%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	161
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	178
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	44
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**339**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación Pavimento en Concreto Hidráulico entre el K 1+670 al K 1+805 carril derecho. VSFM-S1.



Instalación de apoyos temporales para puente No. 9. VSFM-S1.



Fundición de solado sobre el modulo 5 del muro No. 1. VSFM-S2.



Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 47+981 al PR 48+727 sobre el carril derecho. Mallama, Ruta 1002.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Mediante comunicación Putumayo04-3410-23 de fecha 21 de Junio de 2023 dirigido a DT - INVIAS con asunto: Solicitud inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento a las obligaciones de inversión estipuladas en el plan de contingencia presentado por el contratista Contrato de obra No. 1111 de 2021. Atendiendo las obligaciones de la Interventoría, derivadas de la esencia y naturaleza del contrato y de aquellas que se encuentren comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hacen parte integral de éste, nos permitimos presentar solicitud formal para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio para el Contrato de obra No. 1111 de 2021, teniendo en cuenta que a la fecha de la presente solicitud, el Contratista CONSORCIO SAN FRANCISCO. Lo anterior, teniendo en cuenta que no ha cumplido con las inversiones estipuladas en el plan de contingencia, instrumento que fue presentado y aprobado por la Interventoria como mecanismo para superar el atraso que presenta. Por su parte, tampoco ha presentado una justificación válida desde el orden técnico y jurídico para su omisión, por lo que la Interventoría recomienda a la Entidad el inicio de la actuación administrativa por el presunto incumplimiento a las obligaciones de orden contractual. A la presente solicitud se anexa el formato ALEDEJ-FR-6 y los documentos relacionados en la lista de chequeo que se tiene para este fin.

Firma
Nombre: LUIS JOSE ORDOÑEZ SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-09493 CUN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter

ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.

Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.

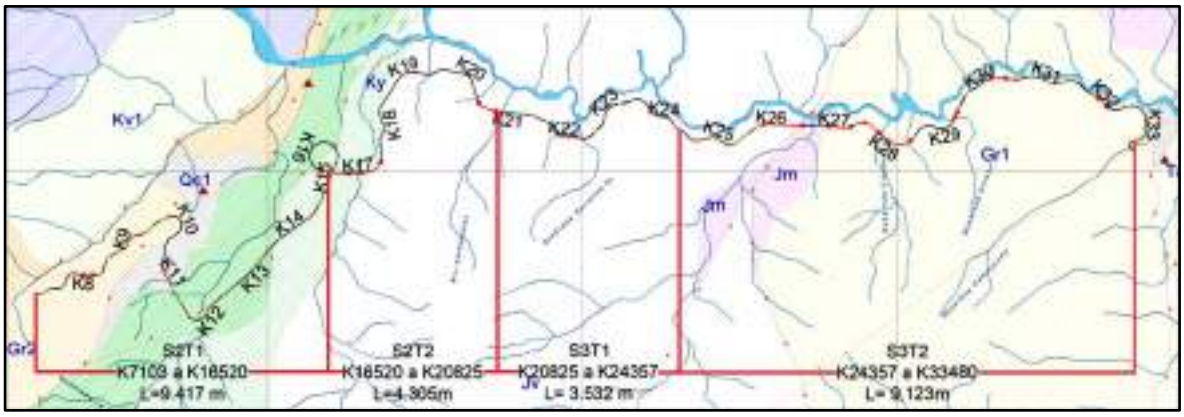


Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada



Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.

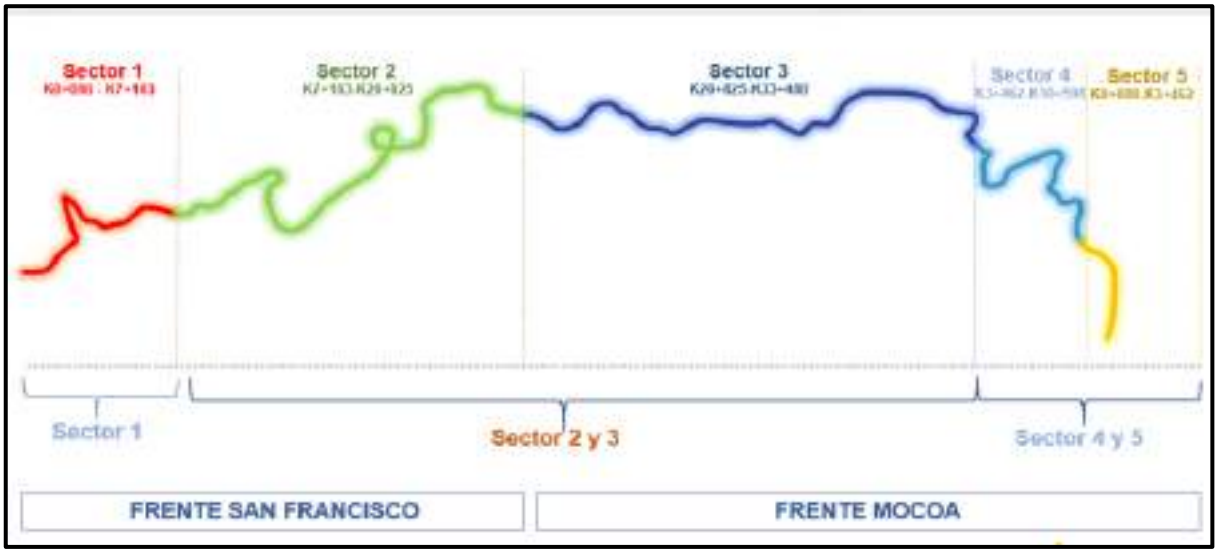


Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

Contrato 1111 de 2021 Construcción del Tramo 02 (Frente San Francisco): Comprende aproximadamente 14.0 kilómetros que como punto de inicio el K7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa), localización según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo de 2016, mediante Contrato 407 de 2010.

2.4. Características técnicas del proyecto

El proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total

aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

Licitación	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5
Integrantes:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.
Contrato de Obra Nº:	1111 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión del Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la Pavimentación con pavimento rígido en el sector 1, Construcción de 3 puentes, Construcción de 2 Muros de contención y explanación para avanzar con la vía de acceso provisional en el K7+600 del sector 2.

Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO EN JULIO DE 2023		
	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
DESCRIPCIÓN	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.468.040.000,00	$ 278.927.600,00	$ 1.746.967.600,00	$ 250.000.000,00	$ 47.500.000,00	$ 297.500.000,00
OBRA BÁSICA	$ 544.944.728.598,00	$ 3.982.288.401,00	$ 548.927.016.999,00	$ 4.102.227.199,00	$ 29.977.814,00	$ 4.132.205.013,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 36.165.963.584,00	$ 264.289.734,00	$ 36.430.253.318,00			
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000,00	$ 8.038.462,00	$ 1.108.038.462,00			
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 18.424.441.755,00	$ 3.500.643.934,00	$ 21.925.085.689,00	$ 37.241.126,00	$ 172.581,00	$ 37.413.707,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908,00	$ 51.731.092,00	$ 324.000.000,00			
TOTAL	$ 602.375.442.845,00	$ 8.085.919.223,00	$ 610.461.362.068,00			$ 4.467.118.720,00

Tabla N° 1. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO EN JULIO DE 2023		
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
DESCRIPCIÓN	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.191.063.045,00	$ 226.301.979,00	$ 1.417.365.024,00	$ 276.976.955,00	$ 52.625.621,00	$ 329.602.576,00
OBRA BÁSICA	$ 24.474.683.884,00	$ 178.853.459,00	$ 24.653.537.343,00	$ 520.470.044.714,00	$ 3.803.434.942,00	$ 524.273.479.656,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 1.617.387.766,00	$ 11.819.372,00	$ 1.629.207.138,00	$ 34.548.575.818,00	$ 252.470.362,00	$ 34.801.046.180,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7			$ -	$ 1.100.000.000,00	$ 8.038.462,00	$ 1.108.038.462,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 95.102.485,00	$ 2.320.106,00	$ 97.422.591,00	$ 18.329.339.270,00	$ 3.498.323.828,00	$ 21.827.663.098,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -	$ 272.268.908,00	$ 51.731.092,00	$ 324.000.000,00
TOTAL	$ 27.378.237.180,00	$ 419.294.916,00	$ 27.797.532.096,00	$ 574.997.205.665,00	$ 7.666.624.307,00	$ 582.663.829.972,00

Tabla N° 2. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Se identificaron actividades que requieren ejecutarse dentro del mantenimiento del sector 1 de la Variante San Francisco – Mocoa, así como actividades que no se encuentran contempladas en el presupuesto inicial para intervenir el sector de Mallama – Ricaurte, para lo cual se tiene definidos los ítems no previstos con sus respectivos valores.

Los ítems no previstos que actualmente se encuentran aprobados por la entidad son los que se requieren para la ejecución de las obras en el Sector de Mallama – Ricaurte en el Departamento de Nariño, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-km	700.697,68	$ 1.175

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$ 728.682,00
812.13.1 P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$ 74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00
600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa.

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUs como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	$ 485.988,00

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de Julio de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Se continúa con el pavimento hidráulico en este sector, en este momento se tiene losas fundidas entre el K 2+245 - K 2+290 por el carril derecho. Se avanza con la extensión de material de mejoramiento de la subrasante y subbase.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: El Contratista avanza con la excavación de los Caisson del apoyo intermedio con las siguientes profundidades de cada uno: No.3 = 8.05 m, No.2 = 9.56 m.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: A la fecha se tienen fundida la totalidad de las pilas del eje No.1 y 2 del eje No.2, es decir las pilas No.1, 2,3 y 4. El Contratista tiene fundida viga cabezal del eje No.1 y No.2 En la semana del presente informe continua la instalación de la estructura metálica de la obra falsa.

Sector 2:

- Puente 9A (K7+130 al K7+190): El Contratista avanza con la excavación de los Caisson con las siguientes profundidades de cada uno: No.1 = 11.48 m, No.3 = 18.70 m, No.4 = 17.44 m, No.5 = 17.10 m, No.6 = 11.62 m. Continua el corte del talud derecho en el eje No.1 del puente con el fin de permitir la excavación del caisson No.2.

- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: El contratista Se realiza limpieza y conformación sobre los módulos 3, 4 y 5 del muro para proceder con el armado del acero de las zapatas.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Se avanza con la excavación manual de los caisson No.3 = 5.63 m, No.4 = 4.47 m, No.5 = 1.00 m, el caisson No.2 logró la profundidad de diseño de 6 metros, se prepara la instalación de acero de refuerzo.

- Talud del K6+800 margen derecha: A la fecha se tienen instalados 3 de un total de 6 inclinómetros y 2 de 4 piezómetros, se continua tomando lecturas a los instrumentos instalados, como parte del monitoreo de este talud. Se avanza con las perforaciones en el talud contiguo K6+900 para instalar los elementos de monitoreo restantes.

- Puente 10 (K7+398 al K7+431,84): El Contratista dio inicio a la excavación de caisson No.1 = 1.63 m, No.2 = 0.40 m, No.3 = 2.53 m, No.4 = 1.28 m, se avanza con la explanación hacia mayores en el K7+500.

- Se continúa con las actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas: K 8+339, K 9+052, K9+121, K 9+157, K9+360, K 9+425, K 9+629, K9+614, K 9+700, K 9+746, K 10+000, K10+010.

- Construcción de vía de acceso temporal hasta el K7+500 en seguida del apoyo No.2 del puente 10.

Vía nacional 1003:

- Se culminó la intervención del sitio crítico del paso nacional sobre el Municipio de Sibundoy – Putumayo, se realizó la recuperación de una losa de pavimento hidráulico en el PR65+500 de la vía 1003, que comprende la intervención de uno de los dos carriles de la vía en un sentido, se habilitó nuevamente el flujo vehicular en este sitio, toda vez que se recuperó la losa afectada.

- Construcción de obras de protección al puente sobre el río San Francisco lo calzado en el PR69+1170 de la vía 1003, en este momento el contratista tiene suspendida esta actividad, decisión tomada unilateralmente por el Consorcio San Francisco.

3.4.2. FRENTE RICUAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

- Instalación de Mezcla Asfáltica MDC 19 carril derecho entre el PR 47+981 al PR 48+727.
- Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo entre PR 46+750 al PR 47+300.
- Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril derecho entre PR 46+750 al PR 46+970.
- Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril izquierdo entre PR 47+680 al PR 48+955.
- Instalación y céreo de base granular estabilizada carril izquierdo entre el PR46+800 al PR 47+510.
- Chequeo y recibido de niveles de base estabilizada, verificación de espesor de BEE, y medición de anchos entre el PR 47+460 al PR 48+410 sobre el carril izquierdo.
- Replanteo y materialización de eje, levantamiento topográfico de eje y bordes entre el PR 44+200 al PR 44+580.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

INFORMES SEMANALES, JULIO DE 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 105 del 29/06/2023 al 5/07/2023 | Último Informe Semanal: NO ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales Diaz

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUIR 14,86 Km de vía, 33 PUENTES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,191Km, 1 TUNEL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0,405 Km, 22 Km de Rehabilitación tramo Mallama - Ricaurte Ruta 1002.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se trata de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 6.7 kilómetros entre la abscisa K0+000 al K6+712 correspondiente al Sector 1, y faltan por construir 14,86 Km comprendidos entre el K6+712 al K21+572 que corresponden al sector 2, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Adicionalmente, se ejecuta la rehabilitación del tramo Ricaurte - Mallama sobre el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; UNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 139.681.662,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.860.318.338,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.093.180.249,31
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 36.208.220,69

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 30.528.000.000	$ 61.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 11.186.348.960		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 9.192.906.289		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 2.400.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 465.348.230	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 1.934.651.770	

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 81.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 6.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.056.000.000	$ 106.848.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.800.000.000	$ 5.400.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.834.034.317,20	8,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.849.985.600,00	4,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.984.048.717,20)	-4,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.337.997.840,00	5,58%
(Estudios y Diseños, ambiental, predial, social, IVA)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.027.805.989,92	8,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.187.983.440,00	3,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.839.822.549,92)	-4,56%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 238.229.282,53	0,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.211.973.811,00	0,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $ 1.926.916.182,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra No. 22 - Abril 2023 Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3225-23 de 19 de Mayo de 2023, dio entrada con Número de radicado 50466 de 23 de Mayo de 2023.
Acta de obra No. 23 y Ajustes 23 - Mayo 2023 Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3339-23 de 07 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56513 de 08 de Junio de 2023.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de julio de 2023	$ 52.027.805.989,92	8,52%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de julio de 2023	$ 24.187.983.440,00	3,96%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de julio de 2023	$ 46.834.034.317,20	8,59%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de julio de 2023	$ 22.849.985.600,00	4,19%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de Marzo de 2023	$ 14.728.137.441,00	2,41%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de marzo de 2023	$ 46.031.931.925	7,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramacion No.4 presentada en el mes de Diciembre de 2022.

* Acta Modificación de Cantidades No.04 tramitada mediante comunicado Putumayo04-2369-22 del 13/12/2022 dirigido a GGPT-INVIAS.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.694.225.066	20,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.183.861.068	19,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Abril de 2023
VALOR FACTURA: $ 546.682.870

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de Costos No. 22- Abril de 2023, Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3337-23 del 08 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56501 de 08 de Junio de 2023.

Acta de Costos No. 23- Mayo de 2023, Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3358-23 del 09 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 57418 de 13 de Junio de 2023.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-05	$ 9.694.225.065,80	20,20%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-05	$ 9.183.861.067,59	19,13%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Marzo 31 de 2023	$ 8.858.459.230,00	18,46%
Valor facturado acumulado	Marzo 31 de 2023	$ 7.429.032.909,79	15,48%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 139.681.662,00
Saldo $	$ 26.860.318.338,00

INDICADOR IC	
En el mes:	0,284
Acumulado:	0,380

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.093.180.249,31
Saldo $	$ 36.208.220,69

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/07/2023 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8,59% Avance o Atraso Físico % -4,40%

Meta Física Ejecutada % 4,19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021 y 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,86	0,19%	0,06%	Prog					0,20%
					Ejec	0,391	0,377		0,768	0,26%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	0,32%	0,05%	Prog					0,34%
					Ejec	0,555		10,55	11,10	0,66%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RIGIDO	Km	36,86	0,34%	0,17%	Prog					0,39%
					Ejec	0,340		9,66	10,00	1,04%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	5,60%	2,90%	Prog					6,90%
					Ejec					0,17%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Km	36,86			Prog					
					Ejec					
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,11%		Prog					0,11%
					Ejec					0,18%
TRANSPORTES	Km	14,86	0,16%	0,05%	Prog					0,17%
					Ejec					0,39%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 1 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		1
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2	1	
Finisher	1	1	
Carrotanque	-	1	1
Carrotanque irrigador	-	1	
Recicladora	-	2	
Camioneta	-	1	2
Minicargador	-		
Motoniveladoras:	2	2	1
Retrocargadores:	-	1	2
Cargador frontal	-		1
Vibrocompactadores:	2	3	1
Volquetas:	10	2	5
Dumper	-		1
Mixer:	-		4
Buldozer:	-		1
Camion Turbo	-	1	1
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-	1	1
Equipo de soldadura	-		
Generador Eléctrico	-		5
Equipo de oxicorte	-		
Mezcladora	-		4
Compresor	-	1	4
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR	-		1
Cortadora de disco (para pavimento)	-	1	
Planchon Grua	-		1
Motosierra	-		1
Equipo Topografia	-	1	1
Total	43	19	44

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103
TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825
TRAMO Y/O SECTOR 3: MALLAMA RICAURTE PR38+800 - PR59+600

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACION:	San Francisco - Putumayo Autorizacion Temporal N° 502337 y N°502329	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

Mediante oficio CSF-100-101587 del 21/07/2022 el contratista informa que solicito la cesión de las autorizaciones temporales a la ANM, informa que tiene disponibilidad de la mina local Chorlavi y que se encuentra en proceso la solicitud de viabilidad ambiental ante CORPOA MAZONIA cuando se requiera el uso de material sobrante de las actividades de descolmatación que se vienen planificando con la ADR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Articulo Octavo (8) al Decimo (10). Mediante oficio SS 10728 la SS-INVIAS solicita que se responda por parte de interventoría si lo que se desea con la autoridad ambiental es consultar o informar sobre el trámite de cambio menor. Mediante comunicado Putumayo04-0827-22 radicado INVIAS No. 28462 la interventoría manifiesta a la SS - INVIAS que se debe realizar el cambio menor informativo de zona de depósito de materiales estériles ante la autoridad ambiental (ANLA).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Durante este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las fichas del PAGA Versión 4.

OBSERVACIONES:

Durante este periodo se realiza la matriz de pendientes ambientales para el trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental Mediante comunicado Putumayo04-1403-22 del 14/07/2022 la interventoría solicita al contratista informar de manera oficial el uso de la Zona Industrial San Carlos, mediante oficio CSF-098-101441 del 19/07/2022 el contratista informa que se mantienen negociaciones con el Consorcio Vial del Sur para adquirir el uso de la Zona Industrial San Carlos autorizada mediante Resolución 2170 de 2008 y su modificatoria Resolución 0135 de 2013.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	335	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	294	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	41	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	277	17

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 364

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

El proyecto cuenta puntos satélites (buzones sugerencia) en la Alcaldía Mallama.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logr ado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actuali zando dicha información.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

* 1. Elaboración y entrega de informe mensual de interventoría de junio de 2023.
* 2. En revisión informes mensuales de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, a los cuales se realizaron observaciones por parte de la interventoría.
* 3. Se encuentra en revisión el informe de sostenibilidad No. 23, correspondiente al periodo 03 de mayo del 2023 al 02 junio del 2023.
* 4. En proceso de consolidación de informes trimestrales pendientes.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado 04-3442-23 del 29/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta comunicación CSF-786-114922 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-3333-23 por SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.(04-2942-23M1 2023-06-26). El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; Una vez realizada la revisión del formato presentado, se realizan observaciones y en ese orden de ideas, se solicita realizar los ajustes pertinentes al formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1, para proceder a realizar una nueva revisión y continuar con el tramite respectivo.

Mediante comunicado 04-3443-23 del 29/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Remisión oficio SS 34050 con asunto; Respuesta a Entrada No. 55309 con Fecha 5 de junio de 2023. Radicado 20234700111921 de 2023-05-31. Rta rad cambio menor 20236200029792. Por medio de la presente, se remite para su conocimiento y gestión correspondiente el oficio del asunto, para que se atienda de manera inmediata lo solicitado por la SS INVIAS en su oficio SS 34050, de igual manera reiteramos lo solicitado en nuestro comunicado Putumayo04-3370-23 de 13/06/2023. Por otra parte solicitamos de igual manera se remita el cambio menor del cambio del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Zona Industrial San Carlos, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista realizó su conexión al sistema de alcantarillado del Municipio de San Francisco, quedando inactivo el punto de vertimiento autorizado por la Resolución 2170 de 2008 y su modificatoria Resolución 0135 de 2103 teniendo en cuenta que dicho cambio menor se encuentra reglado en la siguiente actividad del Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.6.1.3. Modo terrestre carretero. 7. Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, siempre y cuando no se intervengan nuevas áreas y estos cambios garanticen las eficiencias necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se mantenga la capacidad de asimilación del cuerpo receptor. Se otorga un plazo de 3 días hábiles al recibo del presente.

Mediante comunicado 04-3444-23 del 29/06/2023 dirigido a GGO - INVIAS con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 104 Variante San Francisco – Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 104, correspondientes al periodo entre el 22 al 28 de junio de 2023, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado 04-3445-23 del 29/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-744-114086 (04-2846-23) con asunto: Entrega de informe SST - Vigencia mayo de 2023. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; Una vez realizada la revisión de la información presentada mediante el comunicado CSF-744-114086 se realizan observaciones.

Mediante comunicado 04-3449-23 del 29/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-764-114399 con radicado interno 04-2894-23M1 con asunto: "Solicitud de reprogramación del Programa de Obra y reprogramación del Programa de Inversiones". Teniendo en cuenta la comunicación del asunto, "Solicitud de reprogramación del Programa de Obra y reprogramación del Programa de Inversiones"; la interventoría realiza consideraciones sobre la información y teniendo en cuenta lo anterior no se considera procedente la solicitud de reprogramación del Programa de Obra y Programa de Inversiones No. 05.

Mediante comunicado 04-3450-23 del 29/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-793-114940 (04-2968-23M1 de 29 de junio de 2023) con asunto: Presentación hoja de vida ingeniero residente de obra para vías. En atención al comunicado del asunto, donde se remite para revisión y aprobación la hoja de vida de ingeniero HENRY ANDRES CORREA OBANDO, para ocupar el cargo de Ingeniero Residente de Vías, dada la renuncia presentada por el ingeniero JORGE IVAN COTES CASTILLA, y de acuerdo a lo solicitado en ANEXO TÉCNICO Numeral 7.1.3 Ingeniero Residente de Obras, incluido en el documento de Licitación No. LP-DT-062-2020 del contrato de obra pública para el programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" que dio origen al Contrato de Obra No. 1111 de 2021, esta Interventoría hace revisión de la información presentada. Teniendo en cuenta que la documentación presentada CUMPLE con lo exigido en el Anexo Técnico Numeral 7.1.3, se emite CONCEPTO DE APROBACIÓN de la Hoja de vida del ingeniero HENRY ANDRES CORREA OBANDO, para ocupar el cargo de Ingeniero Residente de Vías.

Mediante comunicado 04-3451-23 del 30/06/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-723-113944 (04-2809-23) con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-2951-23 Entrega de informe SST- Vigencia febrero de 2023. Una vez revisados los ajustes al informe del mes de febrero mediante comunicado CSF-723-113944 y con el fin de emitir concepto de aprobación para este informe, se solicita verificar la conformación del comité de convivencia laboral puesto que, en el acta de conformación presentada este comité se encuentra conformado por dos(2) representantes por parte del empleador con sus respectivos suplentes y un (1) representante por parte de los trabajadores y su suplente, y la resolución 1356 de 2012, establece en su artículo 3, que ..(el comité estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos(2) de los trabajadores, con sus respectivos suplementes..).

Mediante comunicado 04-3459-23 del 04/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-760-114223 (04-2883-23) con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-3271-23 con asunto Respuesta Entrega de informe SST - Vigencia abril de 2023. Mediante el presente me permito realizar las siguientes observaciones a la información remitida mediante comunicado CSF-760-114223: 1. Remitir los certificados del fabricante Cup Lock 3834 dado que los presentados en la ficha técnica no son legibles debido a su tamaño. 2. Se requiere remitir paz y salvo del señor EVER RAUL BENAVIDES donde se especifica que el empleador realizo la respectiva liquidación al trabajador, quien a su vez manifiesta haber recibido los pagos que el empleador le adeudaba derivados de la relación laboral que se terminó. El documento presentado hace referencia únicamente a la devolución de los elementos de protección y dotación.

Mediante comunicado 04-3460-23 del 04/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Reingeniería K7+103-K8+103 Tramo 2 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-728-113951 (04-2815-23) Fundaciones Puente 12. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Geotecnia, nos permitimos presentar observaciones a los diseños de fundaciones del Puente 12 localizado en el Sector 2, del K7+103 al K8+103.

Mediante comunicado 04-3461-23 del 04/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Fundaciones K5+603-K7+103 Tramo 1 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-700-113887(04-2768-23). El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Geotecnia, nos permitimos presentar las observaciones a los documentos presentados correspondientes al diseño de fundaciones para el tramo prioritario K 5+603 – K 7+103, localizado en el tramo 1

Mediante comunicado 04-3462-23 del 04/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Estructural Fundaciones apoyo adicional Puente 6 Tramo 1 San Francisco. Respuesta correo electrónico 17 de junio de 2023. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al correo del asunto; una vez revisada la documentación recibida por nuestro especialista en Estructuras, nos permitimos presentar las observaciones a los documentos presentados correspondientes a la fundación adicional del Puente 6 del tramo 1.

Mediante comunicado 04-3465-23 del 05/07/2023 dirigido a DT - INVIAS con asunto: Acta de obra No.24 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No. 024 del Cto. 1111 de 2021, correspondiente al mes de junio de 2023, para su revisión y trámites pertinentes.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

* El día 29 de junio de 2023 se asistió a reunión con CORPOAMAZONIA para realizar la revisión del paquete documental de los predios postulados por el frente San francisco para adquisición en cumplimiento de la línea de inversión No. 2 establecida mediante Resolución 1056 de 2020.

* El día 30 de junio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para iniciar el proceso de revisión del procedimiento establecido en el Manual de Interventoría 2022 para la aprobación de ITEMS NO PREVISTOS para las actividades de ahuyentamiento y rescate establecidos en las Fichas B1. B2 y B3 del Programa No. 2 Salvamento Vegetal del P.M.A.

* El día 30 de junio de 2023, se realizó la visita de seguimiento al paso urbano del municipio de Sibundoy, donde el contratista realizo la instalación de concreto de14 Mpa para mejorar la subrasante de la vía en el PR65+500 de la vía 1003, con el fin de garantizar la seguridad de los vehículos y peatones que transitan a diario por esta vía nacional.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/07/2023
	(Día / Mes / Año)

* El día 01 de julio de 2023 se realizó la formulación y entrega del Informe Mensual de la gestión Ambiental del periodo del mes de Junio de 2023.

* El día 01 de julio de 2023 se realizó recorrido a la Zona Industrial San Carlos para verificar cerramiento perimetral, adecuación de la caseta de acopio temporal de residuos sólidos, verificación del sistema de manejo de residuos líquidos domésticos, adecuación del área de planta dosificadora de concreto, seguimiento limpieza del material de arrastre acopiado y adecuación de las áreas de taller.

* El día 1 de julio de 2023, se realizó el seguimiento al avance de los trabajos en el sector 1 y 2, verificando las actividades de construcción de la vía de acceso en el K7+460, caisson del muro No.2 en el K7+360 M.I, Excavaciones de caisson en puente 9A, fundida de la viga cabezal en el eje No.1 del Puente 9, excavación, armado de acero y fundida de caisson en Muro No.1, adecuación de paso provisional en Puente 10, de igual forma se verificó el avance de la actividad de desmontaje del apoyo provisional del puente 6.

* El día 3 de julio de 2023, se realizó la visita de seguimiento al paso urbano del municipio de Sibundoy, donde el contratista realizo la fundida de la losa de pavimento en el PR65+500 de la vía 1003.

* El día 04 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones ambientales establecidas en los programas y fichas del PMA, del K0+600 hasta en el K7+400 Sector 1 y 2 de la Variante San Francisco – Mocoa.

* El día 04 de julio de 2023 se realizó seguimiento a las actividades de adecuación de la vía alterna de acceso a la ZODME Tamabioy.

* El día 04 de Julio de 2023, se realizó la reunión con el gestor social y la Direccion Territorial con el fin de socializar los avances en el proceso de consulta previa, y definir un plan de acción en el proceso consultivo, Compromisos Fijar una reunion DANC-CP.

* En la presente semana se realizó mesa de trabajo pares Especialistas GEOTECNIA, ESTRUCTURAS Y SIG de manera presencial en Invias Bogotá el día 4 de Julio de 2023, también se continuó labores de atención a observaciones de Interventoría en las diferentes áreas de Diseño Geométrico, Hidrología, Geotecnia y Estructuras Puente 11, 12,12ª, 12b y Muros 2, 3, 6, 7 y 8 en los tramos No.1 y No.2. Así como la interventoría laboro en revisión de productos ajustados presentados por el Contratista de Obra correspondientes del K8+100 al K10+100 y Puente No.6.

* El día 05 de Julio de 2023, se realizó recorrido por parte del profesional social del contratista y propietarios predios a la revisión y atención de la solicitud de la comunidad de San Pablo y así poder dar tramite de cierre a la solicitud interpuesta por los propietarios de predios de la vereda.

* El día 05 de Julio de 2023, se realizó recorrido de seguimiento al avance de los trabajos en el sector 1 y 2, verificando las actividades de construcción de la vía de acceso en el K7+460, caisson del muro No.2 en el K7+360 M.I, Excavaciones de caisson en puente 9A, armado de acero de la viga cabezal en el eje No.2 del Puente 9, excavación, armado de acero y fundida de caisson en Muro No.1, adecuación de paso provisional en Puente 10, de igual forma se verificó el avance de la actividad de adecuación de sitios críticos en la vía de acceso a la vereda San Pablo.

FRENTE SAN FRANCISCO:

AREA TÉCNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Fundición de pavimento en concreto hidráulico entre el K0+945 al K1+145 por el carril derecho.
* Arreglo de paso urbano de Sibundoy mediante fundición de losas de pavimento en el PR65+500 de la vía 1003.
* Céreo de material de mejoramiento entre el K1+900 al K2+100 y entre K2+330 al K2+500.
* En conjunto entre contratista de obra e interventoría se realizó prueba a filtros con el Carrotanque mediante la inyección de agua entre el K 2+697 al K 3+382 sobre la margen izquierda; Encontrándose que entre el K 3+223 al K 3+308 no salió agua en la parte baja, entre el K2+355 al K2+485 después de una hora no salió agua en la parte baja, por lo tanto se deben realizar actividades para restablecer su funcionamiento. Entre el K2+485 al K2+578 a los 12 minutos salió el agua (corregir el geotextil). Entre el K2+578 al K2+625 luego de 2.0 minutos salió el agua (corregir el geotextil). Entre el K2+625 al K2+697 en 18 minutos salió agua. Entre el K2+699 al K2+794 luego de 14 minutos salió agua.
* Limpieza y adecuación de cunetas entre el K 5+000 al K 5+150 por margen izquierda y entre el K 5+830 al K 6+400 por margen izquierda y derecha.
* Talud del K 6+710 - K 6+900: En este momento se tiene instalados 2 piezómetros de un total de 4 programados. Respecto a los inclinómetros se tiene instalado 3 de 6 programados. Se realizan trabajos de perforación sobre la parte superior del talud para piezómetros e inclinómetros para monitoreo y control del talud.
* Puente 6 (K5+761 - K5+828): Se continúa con la actividad de desmontaje de los apoyos temporales; Se desmontó el apoyo provisional que corresponde a la viga riostra central. La topografía del contratista replanteó la ubicación de los caissons para la construcción de la pila central del puente. Inician adecuación de plataforma para la excavación del caisson No. 2 para el apoyo central a construir.
* Puente 9 (K6+959- K7+004): Se continúa con la instalación del acero de refuerzo para la viga cabezal sobre el eje No. 2. Se realizó instalación de formaleta y colocación de concreto para viga cabezal del eje No. 1.
* Puente 9A (K7+130 - K 7+190): Continua la excavación de caisson, las profundidades son Caisson # 1,= 9.48 m, Caisson # 2= 0.00 m, Caisson # 3 = 15.00 m, Caisson # 4 = 12.74 m, Caisson # 5=15.65 m, Caisson # 6= 9.17 m.
* Muro No. 1 (K 7+293 - K 7+330) Ct: Se continúa con la excavación de caissons 3, 4, 5, 9,10 y 11; Se realizó colocación de concreto para el caisson No. 8; Se realizó el retiro de material de deslizamiento en caissons No. 1 y No. 2. Se realizó el desalojo de material de excavación de los caisson.Se realiza instalación de acero para zarpa del modulo No. 1 que comprende los caisson No. 1 y No. 2. Las profundidades de excavación a la fecha son Caisson # 3= 6.84 m, Caisson # 4=5.02 m, Caisson # 5= 6.54 m, Caisson # 9= 6.90 m, Caisson # 10= 6.39 m, Caisson # 11= 6.72 m. Caisson ya fundidos: Caisson # 1, Caisson # 2, Caisson # 6, Caisson # 7 y Caisson # 8.
* Muro No. 2 (K7+360-K7+395) Mt: Se realizó construcción de trincho en madera y se dio inicio a la actividad de excavación y fundición de anillos de los caisson No. 1, 2,3 y 4; Las profundidades son Caisson # 1= 0.00 m, Caisson # 2= 1.37 m, Caisson # 3=2.03 y Caisson # 4= 1.17m.
* Se continúa con las actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas: K 8+298, K 8+588, K 8+660, K 8+680, K 8+790, K 8+816, 8+870, K8+833, K8+989, K 8+919, K 9+720, K9+755, K9+798 y K 9+928.
* Se continúa con la explanación hasta el K 7+480 por la margen derecha.
* Laboratorio de interventoría: En el PR65+500, paso urbano del municipio de Sibundoy se realizó chequeo de porcentaje (%) de CBR a capa de sub rasante mediante ensayo de CBR inalterado y ensayo PDC obteniendo un CBR de 1 % - Se realizó control en instalación de material de mejoramiento sobre capa de sub rasante. El material instalado es un suelo concreto dosificación 50/50 materiales sub base y concreto 14Mpa, se realizó toma de muestra de pavimento instalado para verificación de cumplimiento a la resistencia a flexión. En el Puente 9 se realizó toma de muestra de concreto en fundición de viga cabezal del eje No. 1. En el K1+690 al K1+820 sobre el carril derecho se realizó chequeo del porcentaje de compactación e irregularidad en la superficie en capa de subbase mediante ensayos de densidades y planicidad, cumpliendo con lo estipulado en el art 320-13.

AREA AMBIENTAL:

* Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista
* Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.
* Se asiste a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.
* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolucion 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el proposito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.

AREA SOCIAL:

* Se continua con el seguimiento a las actividades de apertura de la vía de acceso al ZODME de Tamabioy.
* Se realizó el acompañamiento a la reunión de revisión de la propuesta de ruta metodológica realizada por el cabildo Kamentsa Biya de Sibundoy, se despejan algunas inquietudes con la metodología propuesta y como compromiso se estipula que se remitirá de manera formal al contratista antes de surtir el proceso de socializar en asamblea general.
* En esta semana se da cierre a la solicitud de Vereda San Pablo, con las actividades de mejoramiento de vía y destape de alcantarillas en la vía que dirige a la vereda San Pablo.

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 30 de Junio de 2023, Se realizó verificación de condiciones de seguridad durante reemplazo de losas de pavimento en sector urbano de Segundo, se solicita al contratista exigir al personal el uso de los elementos de protección personal durante el desarrollo de actividades de obra, dado que se evidencia personal en contacto directo con mezcla de concreto sin usar guantes, de igual manera se solicita tomar correctivos con personal que realiza actos inseguros en la parte superior de la mixer, esto con el fin de prevenir accidentes laborales.
- Se realizó capacitación en manejo de sustancias peligrosas y explosivos con el personal de interventoría, la capacitación estuvo a cargo de profesional de Arl Sura.
- Se realizó inspección a condiciones de seguridad en área de laboratorio por parte de profesional de Arl Sura.

* El día 01 de Julio de 2023, Se realizó verificación de instalación de elementos para atender emergencias en puente 9, los cuales fueron solicitados durante el recorrido del día 26 de junio, de igual manera se recomienda al contratista no realizar trabajos cuando se presente fuertes lluvias puesto que el personal puede sufrir resbalones y/o caídas. De igual manera se verifica reposición de elementos de protección personal como guantes, impermeables y botas con puntera.


* El día 04 de Junio de 2023, Se realizó capacitación en trabajo en alturas por parte de profesional de Arl Sura, durante la capacitación se trataron los siguientes temas: diligenciamiento de permisos de trabajo, normatividad vigente e inspección de elementos para trabajo en alturas. De igual manera se llevo a cabo capacitación a miembros del COPASST, durante la capacitación se desarrollaron ejercicios prácticos de investigación de accidentes laborales.

AREA PREDIAL:

* Se están generando las actividades que conllevan a adelantar la consecución de la información técnica, y jurídica de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto San Francisco – Mocoa.
* Se están ejecutando la consecución de los documentos de propiedad y la suscripción de Actas de Intervención anticipada para la disponibilidad de los primeros kilómetros.
* Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención Voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.
* Sobre los predios para inversión forzosa de no menos del 1%, se espera concepto técnico ambiental de la corporación Corpoamazonia.
* Se ha venido adelantado la identificación con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logrado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.
* Se está ejecutando la actividad de elaboración de las fichas prediales correspondientes a tramo K7+500 al K10+100,"
* Se remitiran 8 fichas prediales para revisión.
* El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 miltones con mejoras.
* Se remitieron 2 fichas prediales para revisión preliminar
002ID-T2-CMMVSFM
001ID-T2-CMMVSFM

Pasivos prediales Contrato No 407
* Radicación de expedinetes para sanear pasivos
* Ficha predial y Estudio de títulos del predio denominado como 039A-SB-D mediante comunicado con Registro: CSF-574-112593, radicado Interventoría 04-2470-23M1 del 24 de marzo de 2023 frente a lo cual, Interventoría manifiesta que ya realizó la revisión y propone una mesa de trabajo para socializar observaciones respecto a los insumos.
* Minuta de la escritura pública correspondiente al predio 019SPI, lo anterior por cuanto el señor Wilson Bravo, vocero de la señora luz Clara Delgado, manifestó que requiere finiquitar este trámite de compraventa

Predios en los que se está haciendo gestión predial:





Revisión de la sábana predial actual:



Avance de disponibilidad predial:



FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+817 al PR 51+076 sobre el carril izquierdo.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+582 al PR 49+947 sobre el carril derecho.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo entre PR48+434 al PR48+750.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho entre PR48+900 al PR49+500.
* Estabilización con emulsión asfáltica carril izquierdo entre PR48+434 al PR49+050.
* Estabilización con emulsión asfáltica carril derecho entre PR49+100 al PR49+500.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril izquierdo entre PR 49+100 AL PR 49+900.
* Instalación y céreo de base granular estabilizada carril izquierdo entre el PR48+434 al PR49+050.
* Instalación y céreo de base granular estabilizada carril derecho entre el PR49+100 al PR49+500.
* Laboratorio: Toma de Densidades y Ensayo de Planicidad sobre superficie de BEE-38 entre el PR 48+850 al PR 49+900. Extracción de Nucleos para verificación de Espesores de MDC-19 entre el PR 49+950 al PR 50+740.

AREA AMBIENTAL:

* Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de la fichas del PAGA V4, por parte del contratsita se adelantan las gestiones ante la alcaldía Municipal de Mallama para la donacion del material de fresado y se realizael seguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de tramite de la obtencion del acto administrativo para la consecion de aguas en el Rio Guabo.

AREA SOCIAL:

* En este semana no se han recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.
* Los profesionales encargados del cierre de actas de vecindad, en esta semana realizarón la trazabilidad e informe de las viviendas que no tuvieron el cierre a satisfacción, para verificar las observaciones e iniciar el plan de acción.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2023 (Día / Mes / Año)

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 29 de Junio de 2023, El contratista continua con actividades de prevención de enfermedades y/o accidentes laborales como lo son pausas activas, hidratación al personal, toma de pruebas de alcoholemia y charlas de seguridad.

* El día 30 de Junio de 2023, Durante actividad de fresado de carpeta asfáltica existente en PR 49+290 a PR 49+500, se verifica instalación de puntos de control de trafico.


* El día 4 de Julio de 2023, Se verificó elementos de emergencias en obra y en oficina, se solicita al contratista cumplir con el cronograma de inspecciones así mismo se solicita realizar inspección a extintores y los elementos de botiquín de maquinaria amarilla y todos los vehículos con el fin de mantener en buen estado dichos elementos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervisión de Actividades programadas por el contratista. (VSFM - FRENTE MALLAMA, RUTA 1002)
* Seguimiento y control para verificar cumplimiento al cronograma de ESTUDIOS Y DISEÑOS del Primer kilómetro K7+103 al K8+103..
* Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el Contratista e INVIAS.
* Seguimiento a las actividades ambientales contempladas en el PMA.
* Seguimiento a las medidas ambientales que se ejecutan en el Municipio de Mallama.
* Seguimiento ambiental a actividades mantenimiento sector 1.
* Continuar con el armado del acero de la viga cabezal del eje No.2 del puente 9.
* Continuar con la excavación de los caisson del puente 9A en los ejes No.1, No.2 y No.3.
* Continuar con la excavación, armado de acero y fundida de los caisson del Muro No.1 en los módulos 1, 2, 3, 4 y 5.
* Continuar con las actividades de perforación para instalación de instrumentación de monitoreo en el talud del K6+800 margen derecha. Toma de lecturas de los inclinó metros y piezómetros ya instalados.
* Continuar con las construcción de las obras de protección de los puentes San Francisco y San Pedro sobre la vía nacional 1003 (Construcción de gaviones).
* Continuar actividades constructivas en el sector de Mallama de pavimentación mediante Instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 desde el PR 49+817 Cl hacia menores y desde el PR 49+582 CD hacia menores.
* Conformación de base estabilizada entre PR 48+434 Cl hacia menores y desde el PR 49+100 CD hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existentes entre PR 48+450 Cl hacia menores y desde el PR 48+800 CD hacia menores.
* Se tiene programada la reunión de seguimiento semanal con participación del INVIAS, Contratista e Interventoría para el 12 de julio de 2023.
* Visita de seguimiento al frente de obra por parte del área social.
* Capacitaciones a la comunidad por parte del área social.
* Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se continuara con el seguimiento de condiciones de seguridad de actividades de alto riesgo en sector 1 y 2 san francisco y actividades en sector Mallama. Así mismo continuara con la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la diferente normativa aplicable a las actividades de obra.
* Continuar con la revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que ingresa al consorcio San Francisco.
* Continuar revisión Diseño Geométrico completo del sector No.1 y aprobación del mismo y jornadas de campo, debido a que es una longitud ya construida previamente y con puntos fijos que no se deben modificar.
* Revisión de la respuesta de los requerimientos del Acta 994 de 2022 en mesas de trabajo con el contratista.
* Revisión de la reliquidación de la inversión forzosa no menor al 1% en atención al acta 994 de 2022.
* Remisión de los cambios menores de Puente 12 A y 12 B a la SS INVIAS para radicación ante ANLA.
* Actividades de cierre del predio del PR54+600 donde se evacuo el acopio temporal de material de fresado.
* Continuar con las actividades de adecuación de vía alterna para ingreso a la ZODME Tamabioy.
* Continúan las actividades preliminares de adecuación de la ZODME Tamabioy.
* Avance del trámite de donación de material de fresado a la Alcaldía Municipal de Mallama Piedra Ancha.
* Reiterar al INVIAS solicitud de información de predios con gestiones pendientes.
* Se realizará mesa de trabajo en el INVIAS el día 6 de julio de 2023 a fin de tratar el avance de gestión y pasivos prediales.
* Se programarán reuniones recurrentes los días viernes a fin de validar los avances con la contratista.
* Revisión de la sábana predial actual
* Se deben verificar oficios a la ANT, Se debe verificar el informe de ZHF Y G, contractualmente.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

VSFM

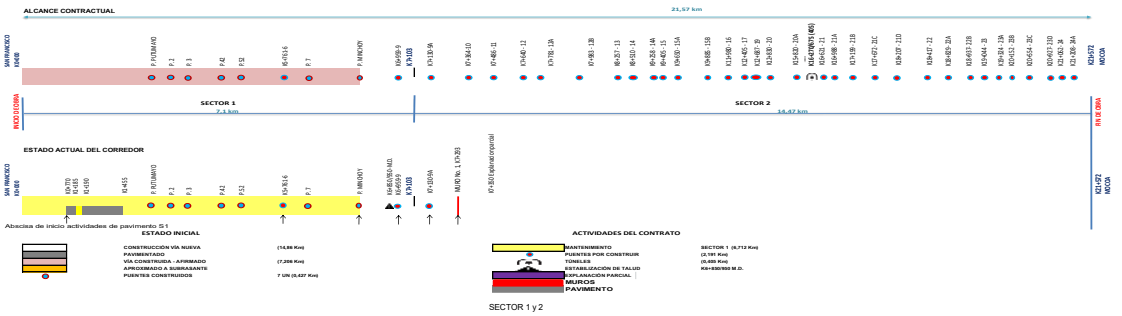

SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

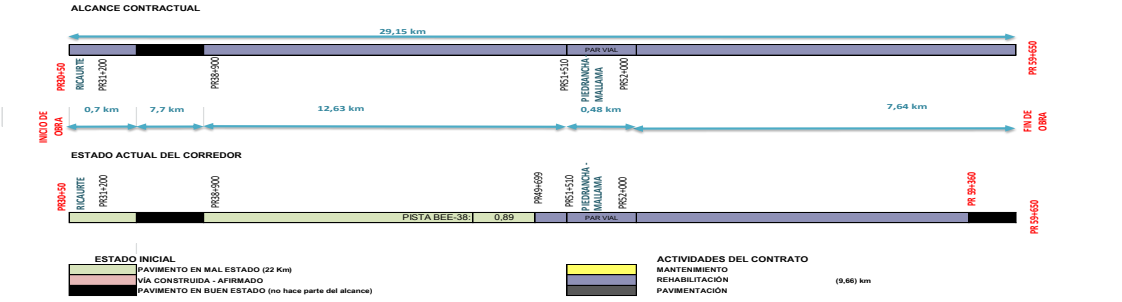

SECTOR MALLAMA - RICAURTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de Pavimento en Concreto Hidráulico entre el K 0+945 al K 1+030 carril derecho. VSFM-S1.



Excavación de caissons No. 1,2,3 y 4 de Muro No. 2. VSFM-S2



Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+817 al PR 50+605 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.
Se están emitiendo comunicaciones al contratista encaminadas a recordar las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.
Se realizan mesas de trabajo semanales, con los especialistas del Contratista e Interventoría, con el fin de avanzar de manera ágil en el tema de los estudios y diseños.
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.6, No. 8, No.9, 9A, 10, Muro 1, Muro 2, Pavimento MR45 sector 1, primer Kilómetro del sector 2 y Ruta 1002.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LUIS JOSÉ ORDOÑEZ SALCEDO

Matrícula Profesional No.: 25202-09493 CUN.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 106 del 6/07/2023 al 12/07/2023 | Último Informe Semanal: NO ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales Diaz

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUIR 14,86 Km de vía, 33 PUENTES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,191Km, 1 TUNEL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0,405 Km, 22 Km de Rehabilitación tramo Mallama - Ricaurte Ruta 1002.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se trata de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 6.7 kilómetros entre la abscisa K0+000 al K6+712 correspondiente al Sector 1, y faltan por construir 14,86 Km comprendidos entre el K6+712 al K21+572 que corresponden al sector 2, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Adicionalmente, se ejecuta la rehabilitación del tramo Ricaurte - Mallama sobre el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; UNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 139.681.662,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.860.318.338,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.093.180.249,31
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 36.208.220,69

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 30.528.000.000	$ 61.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 11.186.348.960		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 9.192.906.289		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 2.400.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 465.348.230	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$	$ 1.934.651.770	

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 81.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 6.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.056.000.000	$ 106.848.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.800.000.000	$ 5.400.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.072.263.599,73	8,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.687.642.366,00	4,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.384.621.233,73)	-4,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.337.997.840,00	5,58%
(Estudios y Diseños, ambiental, predial, social, IVA)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.329.743.933,31	8,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.025.640.206,00	4,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.304.103.727,31)	-4,47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 238.229.282,53	0,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 837.696.766,00	0,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $ 1.926.916.182,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra No. 22 - Abril 2023 Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3225-23 de 19 de Mayo de 2023, dio entrada con Número de radicado 50466 de 23 de Mayo de 2023.
Acta de obra No. 23 y Ajustes 23 - Mayo 2023 Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3339-23 de 07 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56513 de 08 de Junio de 2023.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	12 de julio de 2023	$	52.329.743.933,31	8,57%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	12 de julio de 2023	$	25.025.640.206,00	4,10%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	12 de julio de 2023	$	47.072.263.599,73	8,64%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	12 de julio de 2023	$	23.687.642.366,00	4,35%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de Marzo de 2023	$	14.728.137.441,00	2,41%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de marzo de 2023	$	46.031.931.925 7,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramacion No.4 presentada en el mes de Diciembre de 2022.

* Acta Modificación de Cantidades No.04 tramitada mediante comunicado Putumayo04-2369-22 del 13/12/2022 dirigido a GGPT-INVIAS.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.805.895.882	20,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.295.531.884	19,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Abril de 2023
VALOR FACTURA: $ 546.682.870

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de Costos No. 22- Abril de 2023, Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3337-23 del 08 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56501 de 08 de Junio de 2023.

Acta de Costos No. 23- Mayo de 2023, Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3358-23 del 09 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 57418 de 13 de Junio de 2023.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-12	$	9.805.895.882,40	20,43%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-12	$	9.295.531.884,19	19,37%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Marzo 31 de 2023	$ 8.858.459.230,00	18,46%
Valor facturado acumulado	Marzo 31 de 2023	$ 7.429.032.909,79	15,48%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 139.681.662,00
Saldo $	$ 26.860.318.338,00

INDICADOR IC	
En el mes:	0,284
Acumulado:	0,371

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.093.180.249,31
Saldo $	$ 36.208.220,69

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2023 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8,64% — Avance o Atraso Físico %: -4,29%

Meta Física Ejecutada %: 4,35%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2021 y 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo Mallama Ricaurte**	**Total**	**%**
EXPLANACIONES	Km	14,86	0,19%	0,06%	Prog					0,20%
					Ejec	0,391	0,377		0,768	0,26%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	0,32%	0,05%	Prog					0,34%
					Ejec	0,765		10,88	11,65	0,66%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RIGIDO	Km	36,86	0,34%	0,17%	Prog					0,39%
					Ejec	0,425		10,20	10,62	1,04%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	5,60%	2,90%	Prog					6,90%
					Ejec					0,17%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Km	36,86			Prog					
					Ejec					
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,11%		Prog					0,11%
					Ejec					0,18%
TRANSPORTES	Km	14,86	0,16%	0,05%	Prog					0,17%
					Ejec					0,39%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible Mallama**	**Total Disponible Tramo 1 Variante**
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		1
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2	1	
Finisher	1	1	
Carrotanque	-	1	1
Carrotanque irrigador	-	1	
Recicladora	-	2	
Camioneta	-	1	3
Minicargador	-		
Motoniveladoras:	2	3	1
Retrocargadores:	-	1	2
Cargador frontal	-		1
Vibrocompactadores:	2	3	2
Volquetas:	10	2	8
Dumper	-		1
Mixer:	-		3
Buldozer:	-		1
Camion Turbo	-	1	1
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-	1	2
Equipo de soldadura	-		1
Generador Electrico	-		7
Equipo de oxicorte	-		
Mezcladora	-		5
Compresor	-	1	5
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR	-		1
Cortadora de disco (para pavimento)	-	1	
Planchon Grua	-		1
Tractomula (Emulsión asfaltica)		1	
Motosierra	-		1
Equipo Topografia	-	1	1
Total	43	21	54

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+925

TRAMO Y/O SECTOR 3: MALLAMA RICAURTE PR38+800 - PR59+600

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Autorizacion Temporal N° 502337 y N°502329	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

Mediante oficio CSF-100-101587 del 21/07/2022 el contratista informa que solicito la cesión de las autorizaciones temporales a la ANM, informa que tiene disponibilidad de la mina local Chorlavi y que se encuentra en proceso la solicitud de viabilidad ambiental ante CORPOA MAZONIA cuando se requiera el uso de material sobrante de las actividades de descolmatación que se vienen planificando con la ADR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Articulo Octavo (8) al Decimo (10). Mediante oficio SS 10728 la SS-INVIAS solicita que se responda por parte de interventoría si lo que se desea con la autoridad ambiental es consultar o informar sobre el trámite de cambio menor. Mediante comunicado Putumayo04-0827-22 radicado INVIAS No. 28462 la interventoría manifiesta a la SS - INVIAS que se debe realizar el cambio menor informativo de zona de depósito de materiales estériles ante la autoridad ambiental (ANLA).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Durante este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las fichas del PAGA Versión 4.

OBSERVACIONES:

Durante este periodo se realiza la matriz de pendientes ambientales para el trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental. Mediante comunicado Putumayo04-1403-22 del 14/07/2022 la interventoría solicita al contratista informar de manera oficial el uso de la Zona Industrial San Carlos, mediante oficio CSF-098-101441 del 19/07/2022 el contratista informa que se mantienen negociaciones con el Consorcio Vial del Sur para adquirir el uso de la Zona Industrial San Carlos autorizada mediante Resolución 2170 de 2008 y su modificatoria Resolución 0135 de 2013.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	336	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	295	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	41	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	273	17

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 395

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

El proyecto cuenta puntos satélites (buzones sugerencia) en la Alcaldía Mallama.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	38
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logr ado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actuali zando dicha información.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

* Inventario de equipos eléctricos y electrónicos para diligenciamiento de formato de consumo de emisiones.
* Solicitud de consumos de combustibles de vehículos y maquinaria para diligenciamiento de formato de cálculo de emisiones.
* Elaboración de informe de sostenibilidad de julio de 2023 por parte del contratista.
* En revisión informes mensuales de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, a los cuales se realizaron observaciones por parte de la interventoría.
* Se encuentra en revisión el informe de sostenibilidad No. 23, correspondiente al periodo 03 de mayo del 2023 al 02 junio del 2023.
* En proceso de consolidación de informes trimestrales pendientes.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado 04-3467-23 del 06/07/2023 dirigido a GGO - INVIAS con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 105 Variante San Francisco – Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 105, correspondientes al periodo entre el 29 de junio al 05 de julio de 2023, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado 04-3469-23 del 06/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-798-114947 con radicado interno 04-2976-23M1 con asunto: "Acompañamiento técnico revisión en campo Volumen, Sector 2, Variante San Francisco - Mocoa.". Atendiendo su solicitud nos permitimos informarle que nuestro especialista en geología realizará la visita al frente San Francisco los días 13 y 14 de Julio de los presentes, esperamos también la presencia del consultor para recorrido conjunto y revisión del Volumen de Geología Parte 1 (K8.100-K8.600) entregado el pasado 23 de junio.

Mediante comunicado 04-3470-23 del 06/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a sus oficios CSF-785-114918 con recibo interno 2941 del 26/06/2023 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de junio del 2023 con sus respectivos anexos y CSF-799-114948 con recibo interno 2980 del 04/07/2023 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de junio del 2023 con sus respectivos anexos – Versión 2. Mediante la presente esta Interventoría en respuesta a los oficio del asunto, se permite manifestar el CONCEPTO DE APROBACIÓN de los Informes mensuales ambientales de PMA y PAGA del mes de junio de 2023, teniendo en cuenta que se realizaron los ajustes de los informes solicitados en mesas de trabajo del 28/06/2023. De igual manera reiteramos que los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de cumplimiento actos administrativos y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA, deben ser actualizados y ajustados de acuerdo a lo requerido en el Instructivo de Gestión Social y Ambiental del Nuevo Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución 319 de 2022 y acorde a las necesidades del proyecto en cada periodo de reporte.

Mediante comunicado 04-3472-23 del 07/07/2023 dirigido a DT - INVIAS NARIÑO con asunto: Revisión de viabilidad Donación Material de Fresado para la comunidad de Mallama. Teniendo en cuenta que el INVAS suscribió el Contrato No. 1111 del 2021 con la firma constructora Consorcio San Francisco, y que dentro del alcance del presente contrato se está ejecutando la rehabilitación sector Municipio Mallama-Piedrancha km 38+720 al 59+500, en donde se van a generar residuos de demolición tipo "fresado de pavimento", y que la comunidad de Mallama mediante oficio del 26 de Junio 2023, realizan la solicitud de donación de material para mejoramiento de lotes, de acceso y relleno para tubería de alcantarillas; solicitamos muy respetuosamente que desde la Dirección Territorial Nariño INVIAS se determine la viabilidad, o no, la donación a la comunidad del área de intervención dentro de su jurisdicción vial. Agradecemos su amable gestión y respuesta a la presente.

Mediante comunicado 04-3474-23 del 07/07/2023 dirigido a Comunidad de Mallama - Piedrancha con asunto: Respuesta a la entrada 04-2954-23 Solicitud Donación de material de fresado. Revisada la solicitud realizada a esta interventoría, se permite informar que se dio el traslado de su oficio a la Dirección territorial de Nariño, para la evaluación y viabilidad, teniendo en cuenta que se tiene que surtir el debido proceso que está estipulado en el documento ambiental que nos rige para este proyecto, apenas se tenga una respuesta de esta entidad se estará comunicando de manera formal la respuesta.

Mediante comunicado 04-3475-23 del 07/07/2023 dirigido a SS - INVIAS con asunto: Cuarto Reporte Avance parcial Atención Contingencia Talud K6+920contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016, mediante la presente nos permitimos remitir el cuarto Reporte Avance parcial Atención Contingencia Talud K6+920 en cumplimiento a los 20 días calendarios hasta la finalización de la misma, para que esta sea radicada a través de VITAL de la ANLA.

Mediante comunicado 04-3476-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Reingeniería K7+103-K8+103 Tramo 2 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-757-114215 (04-2878-23)Estructuras Muro MSA08. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Estructuras, nos permitimos presentar las observaciones de los diseños estructurales del Muro MSA08 localizado en el Sector 2, del K7+103 al K8+103.

Mediante comunicado 04-3477-23 del 07/07/2023 dirigido a SS - INVIAS con asunto: Reporte Atención Contingencia Talud K7+500 a K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco. Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 07/0607/2023 se remitió al Gestor de la SS INVIAS el formato Único para el Reporte de Atención Contingencia Talud K7+500 a K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco mientras surte el proceso de correspondencia, teniendo en cuenta el plazo establecido (24 horas) en cumplimiento al artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016, mediante la presente nos permitimos remitir los documentos del Reporte de Atención Contingencia Talud K7+500 a K7+600 para que esta sea radicada a través de VITAL de la ANLA.

Mediante comunicado 04-3478-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Estudio de Respuesta Local Puente 9 Tramo 1 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-688-113675 (04-2739-23). El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Estructuras, nos permitimos presentar APROBACIÓN, al Estudio de Respuesta Local presentados del Puente 9 del tramo 1.

Mediante comunicado 04-3479-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta entrada 04-2997-23 del comunicado CSF-811-115113 Aprobación del Informe mensual componente social mes de Junio 2023. Revisando el informe mensual del periodo relacionado en el asunto, esta interventoría se permite dar concepto de APROBACIÓN a la información contemplada en los formatos y los respectivos anexos de los informes del proyecto Variante San Francisco-Mocoa y PAGA Mallama-Ricaurte.

Mediante comunicado 04-3480-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-674-113530 con radicado interno 04-2688-23M1 con asunto: "Respuesta a comunicado Putumayo04-3112-23 del 2 de mayo de 2023 – Programa de Inversión". En atención a la comunicación del asunto y considerando lo tratado en el comité de obra llevado a cabo el día 3 de mayo de 2023, se aclaró el tema de manera que el Plan de Contingencia al cual se le ha realizado el seguimiento y control corresponde al aprobado mediante comunicado de Interventoría Putumayo04-2973-23 de fecha 4 de abril de 2023. Respecto a la inclusión de nuevas actividades en los documentos de Plan de Inversión de obra y/o Plan de Contingencia, como lo es la intervención de los pasos nacionales de Sibundoy y San Francisco, se está a la espera del pronunciamiento por parte de INVIAS, en base a los costos estimados por el Consorcio San Francisco y revisados por la Interventoría, por lo tanto, una vez la entidad contratante emita el documento al respecto se tratará el tema en conjunto por los profesionales del Contratista e Interventoría, de acuerdo a lo que establecen los documentos técnicos aplicables.

Mediante comunicado 04-3481-23 del 06/07/2023 dirigido a GGO - INVIAS con asunto: Acta de obra No.23 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No. 023 del Cto. 1111 de 2021, correspondiente al mes de Mayo de 2023, para su revisión y trámites pertinentes, con sus respectivos anexos, debidamente firmados por el Director Territorial Putumayo.

Mediante comunicado 04-3482-23 del 07/07/2023 dirigido a GGO - INVIAS con asunto: Acta de obra No.24 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No. 024 del Cto. 1111 de 2021, correspondiente al mes de Junio de 2023, para su revisión y trámites pertinentes, con sus respectivos anexos, debidamente firmados por el Director Territorial Putumayo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	12/07/2023
	(Día / Mes / Año)

Mediante comunicado 04-3483-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-809-115077 (04-2995-23M1 de 06 de julio de 2023) con asunto: Presentación hoja de vida Ingeniero Residente de Obra para Puentes. En atención al comunicado del asunto, donde se remite para revisión y aprobación la hoja de vida de ingeniero LUIS ALBERTO RESTREPO SANTACRUZ, para ocupar el cargo de Ingeniero Residente de Obra para Puentes, dada la renuncia presentada por el ingeniero YEBRAIL ANSELMO SILVA CASTRO, y de acuerdo a lo solicitado en ANEXO TECNICO Numeral 7.1.3 Ingeniero Residente de Obras, incluido en el documento de Licitación No. LP DT-062-2020 del contrato de obra pública para el programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" que dio origen al Contrato de Obra No. 1111 de 2021, esta Interventoría hace revisión de la información presentada y teniendo en cuenta que la documentación presentada CUMPLE con lo exigido en el Anexo Técnico Numeral 7.1.3, se emite CONCEPTO DE APROBACIÓN de la Hoja de vida del ingeniero LUIS ALBERTO RESTREPO SANTACRUZ, para ocupar el cargo de Ingeniero Residente de Obra para Puentes.

Mediante comunicado 04-3484-23 del 07/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Documentos de Floriberto Males Gomajoa 039A-SB-D, remitido mediante oficio CSF-668-113521(04-2676-23) -CSF-574-112593 (04-2470-23). Respecto a los insumos técnicos remitidos del predio 039A-SB-D, se requiere se incluya dentro de la ficha predial: ● Aclarar la total área total ocupada por las mejoras, No se incluyó área de bosque secundario intervenido. ● Incluir las firmas de los documentos anexos tanto del propietario como del personal técnico. ● En el plano identificar en donde se identificaban los cultivos, verificar e incluir en observaciones el área requerida teniendo cuenta que es mejora, no está clara el área intervenida ni en donde estaban las mejoras consignadas en la ficha predial. ● Incluir área de intervención del predio y polígono de linderos dentro de la tira topográfica toda vez que no hay referencia del área ni del predio. ● Incluir dentro de las fotografías adjuntas la identificación de las especies inventariadas.

Mediante comunicado 04-3485-23 del 07/07/2023 dirigido a SS - INVIAS con asunto: Remisión del Informe Trimestral Social N° 8 para el Contrato de obra No.1111 de 2021- Frente San Francisco, en el periodo comprendido entre el 01 Abril 2023 al 30 de junio 2023. Por medio de la presente, se remite el Informe Trimestral Social N° 8, los informes entregados han sido revisados y APROBADOS por la interventoría, en el cual se reportan las actividades sociales ejecutadas del proyecto Variante San Francisco-Mocoa y PAGA Mallama.

Mediante comunicado 04-3487-23 del 08/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Diseño Geométrico K0+400-K7+100 Tramo 1 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-787-114827 (04-2943-23). El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Diseño Geométrico, nos permitimos presentarle las observaciones al diseño geométrico del K0+400 al K7+100 del tramo 1.

Mediante comunicado 04-3488-23 del 10/07/2023 dirigido a SS - INVIAS con asunto: Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 7 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023. Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 7, en el cual se presentan las actividades ambientales desarrolladas para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023, de igual manera nos permitimos aclarar que se radica dentro del plazo de los 10 primeros días del periodo correspondiente para evitar conceptos de EXTEMPORANEIDAD de entrega, en caso de presentar problemas con la descarga de los archivos teniendo en cuenta que anteriores oficios por parte de la entidad se ha manifestado desde la oficina de ATENCIÓN AL USUARIO, favor indicar cuál sería el medio de reenvió de los mismos.

Mediante comunicado 04-3489-23 del 10/07/2023 dirigido a SS - INVIAS con asunto: Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 7 PAGA Mallama – Ricaurte, Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023. Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 7 PAGA Mallama – Ricaurte, en el cual se presentan las actividades ambientales desarrolladas para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023, de igual manera nos permitimos aclarar que se radica dentro del plazo de los 10 primeros días del periodo correspondiente para evitar conceptos de EXTEMPORANEIDAD de entrega, en caso de presentar problemas con la descarga de los archivos teniendo en cuenta que anteriores oficios por parte de la entidad se ha manifestado desde la oficina de ATENCION AL USUARIO, favor indicar cuál sería el medio de reenvió de los mismos.

Mediante comunicado 04-3490-23 del 10/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-792-114935 con radicado interno 04-2951-23M1 con asunto: "Respuesta a Putumayo04-3387-23, Prevención de accidentes laborales ante inestabilidad de taludes en sector 1 y 2 San Francisco.". Con respecto a su respuesta a la comunicación Putumayo04-3387-23 enviada por esta interventoría, sobre nuestra solicitud de Prevención de accidentes laborales ante inestabilidad de taludes en sector 1 y 2 San Francisco, esta interventoría realiza observaciones sobre dicha respuesta.

Mediante comunicado 04-3491-23 del 10/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Procedimiento para la donación de material de fresado. Teniendo en cuenta que han surtido diferentes solicitudes por parte de la comunidad de Mallama, con el tema de donación de material de fresado, la interventoría requirió mediante comunicación escrita a la Dirección territorial Nariño la viabilidad para el procedimiento de atención a estas solicitudes, en respuesta nos informan que de acuerdo al procedimiento establecido en la GUÍA PARA ACCEDER AL MATERIAL DE FRESADO A TRAVES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, las Administraciones Municipales son las encargadas de acceder a este tipo de material, en este sentido para su conocimiento y la atención de PQR de este asunto se informe a la comunidad el proceso que se tiene que surtir con los entes encargados. Además, se informa que la interventoría ya notificó a las Administración Municipal del procedimiento a tener en cuenta de acuerdo a la guía y la atención de solicitud radicadas a nuestra empresa.

Mediante comunicado 04-3492-23 del 10/07/2023 dirigido a la Administración Municipal de Mallama con asunto: Traslado de solicitud de donación de material de fresado a la comunidad del sector. Teniendo en cuenta que la Administración vial, mediante correo electrónico del 07 de Julio 2023, nos informa que las Administraciones Municipales, son las que tienen que "adquirir este material de fresado de pavimento asfáltico a título gratuito" de acuerdo a la GUÍA PARA ACCEDER AL MATERIAL DE FRESADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, en este sentido se da traslado a la solicitud anexa de la comunidad de Mallama, radicada a la interventoría de este proyecto.También se informa que a la comunidad peticionaria se estará remitiendo una comunicación escrita donde se informará del procedimiento que tiene la guía; además teniendo en cuenta que las comunidades han realizado varias solicitudes de manera verbal y no conocen el trámite que se tiene que realizar para acceder a este tipo de material se estará realizando mensajes radiales que permitan dar claridad a este proceso.

Mediante comunicado 04-3493-23 del 11/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-808-115076 con radicado interno 04-2994-23M1 con asunto: "Respuesta observaciones Putumayo04-3343-23. Gaviones Puente San Pedro y San Francisco.". Con su comunicación CSF-808-114106, responde a nuestro comunicado Putumayo04-3343-23, sobre el Chequeo de estabilidad Gaviones Puente San Pedro y San Francisco y hace entrega del archivo pdf (4 folios) denominado "04-2994-23_Anexo". De acuerdo a su comunicaco una vez revisada la información recibida, esta Interventoría observa que en su comunicado CSF-584-112707 se muestra una descripción visual de los materiales evidenciados en dos apiques, pero en ninguno de los archivos nombrados se anexa registros de ensayos de laboratorio o sustento técnico para determinar los datos del terreno usados en el cálculo del muro propuesto y su chequeo; Adicionalmente, se presenta la firma del ingeniero Joany Ocampo en la parte superior del anexo sin especificar que es la persona responsable del chequeo de factores de seguridad del muro propuesto. Se aclara además que todas las obras a ejecutar, deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos y con los estándares de calidad establecidos en las Especificaciones de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías y en general la normatividad contractual.

Mediante comunicado 04-3494-23 del 10/07/2023 dirigido a la Veeduría Ciudadana del Contrato 1111-2021 con asunto: Entrega de informe de Interventoría N° 24. Por medio de la presente el Consorcio Reactivación Putumayo, adjunta el informe de interventoría N°24 correspondiente al mes de Junio 2023, del avance de las actividades ejecutadas en el Proyecto "Construcción Variante San Francisco Mocoa".

Mediante comunicado 04-3496-23 del 12/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Segundo Reporte Avance parcial Atención Contingencia Talud K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016, mediante la presente nos permitimos remitir el segundo Reporte Avance parcial Atención Contingencia Talud K7+430 en cumplimiento a los 20 días calendarios hasta la finalización de la misma, para que esta sea radicada a través de VITAL de la ANLA.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

* El día 05 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones ambientales establecidas en los programas y fichas del PMA, del K0+600 hasta en el K7+400 Sector 1 y 2 de la Variante San Francisco – Mocoa.

* El día 06 de julio de 2023 se realizó recorrido a la Zona Industrial San Carlos para verificar cerramiento perimetral, adecuación de la caseta de acopio temporal de residuos sólidos, verificación del sistema de manejo de residuos líquidos domésticos, adecuación del área de planta dosificadora de concreto, seguimiento limpieza del material de arrastre acopiado y adecuación de las áreas de taller.

* Se genera reunión el viernes 7 de julio de 2023 a las 8.00am, seguimiento predial con personal del INVIAS, se deben cambiar las fichas de los predios de pasivos prediales a la versión actual 039A-SB-D Y 019SPI, así mismo obtener las declaraciones juramentadas por parte de los propietarios de las mejoras en inventarios.

* El día 07 de julio de 2023 se realizó seguimiento a las actividades de adecuación de la vía alterna de la ZODME Tamabioy y las adecuaciones preliminares de la ZODME.

* El día 7 de julio de 2023, se realizó el seguimiento al avance de los trabajos en el sector 1 y 2, verificando las actividades de construcción de la vía de acceso en el K7+460, caisson del muro No.2, Excavaciones de caisson en puente 9A, fundida de la zarpa del módulo 1 en el Muro No.1, excavación de caisson en Muro No.1.

* El día 08 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para iniciar el proceso de revisión del procedimiento establecido en el Manual de Interventoría 2022 para la aprobación de ITEMS NO PREVISTOS para las actividades de ahuyentamiento y rescate establecidos en las Fichas B1. B2 y B3 del Programa No. 2 Salvamento Vegetal del P.M.A.

* El día 8 de julio de 2023, se realizó el seguimiento a la actividad de fundida de la viga cabezal del eje No.2 del puente 9.

* El día 10 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para hacer la revisión del expediente SRF 1358 de la Dirección de Bosques y servicios eco sistémico del Min ambiente, de igual manera se realiza la primera revisión preliminar del ICA No. 23.

* El día 10 de julio de 2023, se realizó el seguimiento las actividades de fundida de pavimento en el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, entre el K 1+540 - K 1+585 por el carril derecho, de igual forma se realiza el seguimiento a la actividad de céreo de subbase entre el K2+160 - K2+200 por el carril derecho.

* El día 10 de Julio de 2023, se participa de la reunión convocada por la comunidad del Portal de Tamabioy con el fin de revisar algunas solicitudes con el mejoramiento del acceso a la vía, como es: adecuación de acceso algunas viviendas, mejorar la vía para los estudiantes del sector, realizar manejo de agua para que no se vea afecta la vía, instalación de un buzón de sugerencia para el manejo de solicitud de la comunidad; atención de punto de crítico de transitabilidad; entrega de actas de vecindad a cada propietario; por parte de la empresa contratista se informa que se estará dando atención a cada una de las solicitudes de la comunidad.

* El día 10 de Julio de 2023, se da atención a la solicitud de la comunidad que hacen parte del resguardo, donde manifiestan que no se continúe con actividades de depósito de material hasta que no se surta una reunión de socializaciones con los habitantes de sector y la autoridad tradicional, esto con fin de acordar un plan de trabajo entre la comunidad y la empresa contratista.

* El día 11 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión y presentación del cambio menor del eje del tramo K7+100 hasta K8+100, al igual que reviso las obligaciones de la Licencia ambiental y el expediente de sustracción de reserva para el trámite de cesión parcial de licencia ambiental, finalmente se hace la revisión y se acuerdan compromisos para la entrega de los ICAS No.15 A 19.

* El 11 de Julio de 2023, se realizó visita al Gobernador del Cabildo con el fin de contextualizar de la reunión con la comunidad del sector, e informar de la decisión realizada por la comunidad, de no continuar con el depósito de material, por parte del gobernador se manifiesta que se mejore el arreglo de vía y que se debe continuar con las actividades en el ZODME. Teniendo en cuenta la directriz del gobernador se continúa con las actividades constructivas en Tamabioy

* El 11 de Julio de 2023, se realizó visita en conjunto con el contratista a la vía que dirige hacia la vereda portachuelo, con el fin de verificar el estado del camino peatonal que fue afectado por una creciente de la quebrada aledaña al camino. Se observa que para recuperar la transitabilidad en este sector se debería construir un puente colgante peatonal con una longitud aproximada de 30 metros. El contratista realizará el presupuesto estimado y preentará a la interventoría dicha propuesta.

* El día 12 de julio de 2023, se realizó recorrido en zona industrial San Carlos en conjunto con Inspectora sst de contratista, durante el recorrido se verifica condiciones de seguridad en las áreas de trabajo se reitera al contratista señalizar área provisional donde se están desarrollando actividades de laboratorio, así mismo se recuerda que las diferentes sustancias que se encuentran en esta área deben estar señalizadas y debidamente almacenadas, además se debe contar con una matriz de compatibilidad de acuerdo a las sustancias que se manipularan.

FRENTE SAN FRANCISCO:

AREA TÉCNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Se realizó instalación de concreto hidráulico entre el K 1+455 al K 1+625 por el carril derecho.
* Se realizó la actividad de céreo de subbase entre el K2+100 al K2+200 por el carril derecho.
* Puente No. 6 (K5+761 - K5+828): Se da inicio a la excavación de los caisson y se funde el primer anillo de caisson No. 2 para el apoyo central del puente.
* Puente No. 9 (K6+959 - K7+004): Se realizó la instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundición de la viga cabezal del estribo No. 2.
* Puente No. 9A (K7+130 - K 7+190) : Se inicia con la apertura de vía de acceso provisional sobre el sector del puente con diseño sobre el búfer ambiental, también continua con la actividad de excavación y fundición de los anillos sobre los caissons 1, 3, 4, 5 y 6. Las profundidades de los caissons son Caisson No. 1= 11.48 m, Caisson No. 2= 0.00 m, Caisson No. 3 = 16.10 m, Caisson No. 4= 14.14 m, Caisson No. 5= 16.15 m y Caisson No. 6= 10.64 m.
* Muro No. 1 (K7+293 - K 7+330): Se realizó la instalación de acero de refuerzo encofrado y fundición de la zarpa del módulo No. 1 del muro, se continua con la actividad de excavación y fundición de anillos sobre los caissons No. 3, 4, 5, 9, 10 y 11. Las profundidades de los caissons son Caisson No. 3= 7.74 m, Caisson No. 4= 6.42 m, Caisson No. 9= 6.90 m, Caisson No. 10= 7.32 m.
* Muro No. 2 K (7+360 - K 7+395): Continúa la excavación y fundición de anillos sobre los caisson 1, 2, 3 y 4. Las profundidades de los caissons son Caisson No. 1= 2.51 m, Caisson No. 2= 4.97 m, Caisson No. 3= 2.93 y Caisson No. 4= 1.57 m.
Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Se continúa con la actividad de apertura de la brecha entre el K 7+440 al K 7+500.
* Laboratorio: Entre el K1+350 al K2+430 carril derecho, se realizó chequeo a porcentaje de compactación sobre capa de mejoramiento mediante ensayo de densidades método cono y arena cumpliendo así con lo estipulado en el art 310 – 13; Entre el K1+500 al K1+540 Carril derecho se realizó control en instalación de pavimento, verificación de asentamiento y toma de muestras de concreto. Se realizó toma de muestras de concreto y prueba de asentamiento durante la fundición de la viga cabezal sobre el eje No. 2 de puente 9.

AREA GEOTECNICA:

* Talud del K 6+710 al K 6+900: En la actualidad se encuentran terminadas las siguientes perforaciones, Piezómetros instalados 2 de 4, inclinómetros instalados 5 de 6. El contratista tenia como compromiso la instalación de la totalidad de inclinometros y piezometros hasta el día 4 de julio de 2023 segun acta de comite No. 65 de fecha 14 de junio de 2023.
* Se continúa con las actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas: 8+298, K 8+680, K8+816, K 8+870, K 8+900, K8+989 y K 9+746.

AREA AMBIENTAL:

* Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista
* Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.
* Se asiste a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.
* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolucion 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el proposito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.
* El día 07 de julio de 2023 se realizó la formulación y entrega del Informe trimestral ambiental No. 8 del PMA frente San Francisco periodo del mes de abril a junio de 2023 a la SS INVIAS.
* El día 06 de julio de 2023 se realizó la remisión cuarto Reporte Contingencia Talud K6+920 al gestor de la SS INVIAS para que se surta el proceso a través de VITAL ANLA en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1767 de 2016.
* El día 07 de julio de 2023 se realizó la remisión del Reporte Contingencia ambiental que se presentó en el Talud K7+500 hasta K7+600 al gestor de la SS INVIAS para que se surta el proceso a través de VITAL ANLA en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1767 de 2016.
* El día 07 de julio de 2023 se realizó la remisión del Segundo Reporte parcial de Contingencia ambiental del Talud K7+430 al gestor de la SS INVIAS para que se surta el proceso a través de VITAL ANLA en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1767 de 2016.
* El día 10 de julio de 2023 se realizó la formulación y entrega del Informe trimestral ambiental No. 7 del PAGA frente Mallama – Ricaurte periodo del mes de abril a junio de 2023 a la SS INVIAS.

AREA SOCIAL:

* Se continua con el seguimiento a las actividades de apertura de la vía de acceso al ZODME de Tamabioy.
* Esta semana se recepciona un DP de un trabajador retirado de la empresa, donde manifiesta la no conformidad con su retiro y una solicitud de la comunidad San pablo para que se continue con el arreglo de la via veredal.
* Se realizó visita a los puntos de solicitud de la comunidad de San Pablo.
* Se realizó recorrido con el fin de revisar la atención a la solicitud de mantenimiento de la vía veredal San Pablo, levantamiento de acta a satisfacción por parte de los peticionarios.
* Se realizó el seguimiento a las actividades de mejoramiento de la vía de acceso al ZODME Tamabioy.
* Se realizó atención oportuna a cada una de las solicitudes, participando de las reuniones convocadas por la comunidad.

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 06 de Julio de 2023, Se realiza seguimiento a capacitación para armado de andamios por parte de la empresa Con y Con Ingeniería Sas, durante la capacitación se tratan temas relacionados con normatividad, indicaciones y precauciones para el armado, además se realizo practica de pasos para un correcto armado de andamio.
* El día 07 de Julio de 2023, El contratista continua con actividad de control de trafico en sector 1 san francisco, se recomienda realizar mantenimiento e inspección a radios de comunicación de controladoras para evitar accidentes con los diferentes usuarios de esta vía, de igual manera se solicita realizar jornadas de orden y aseo en este sector.
* El día 10 de Julio de 2023, Se reitera al contratista mantener condiciones de orden y aseo adecuadas en área de trabajo de puente 9, donde se adelantan actividades de armado de acero y fundición de viga cabezal, lo anterior teniendo en cuenta que en campo se ha evidenciado restos de acero de refuerzo figurado, varillas de acero, herramientas, madera, plástico y otros materiales de construcción, por lo tanto se solicita realizar jornadas de orden y aseo constantes para evitar caídas y/o resbalones del personal que se encuentra desarrollando estas actividades.
* El día 12 de Julio de 2023, Se verifico permisos de trabajo para actividades en planta de concreto, se solicita al contratista realizar el diligenciamiento correcto de estos documentos puesto que se evidencio en campo formatos con firmas de cierre de permiso, sin haber terminado la actividad, por lo tanto se reitera el cumplimiento de lo establecido en la resolución 4272 de 2021 la cual establece los requisitos mínimos para el desarrollo de actividades de alturas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	12/07/2023
	(Día / Mes / Año)

AREA PREDIAL:

* Se están generando las actividades que conllevan a adelantar la consecución de la información técnica, y jurídica de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto San Francisco – Mocoa.
* Se están ejecutando la consecución de los documentos de propiedad y la suscripción de Actas de Intervención anticipada para la disponibilidad de los primeros kilómetros.
* Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención Voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.
* Sobre los predios para inversión forzosa de no menos del 1%, se espera concepto técnico ambiental de la corporación Corpoamazonia.
* Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logrado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales (Ver tabla 2), y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.
* Se está ejecutando la actividad de elaboración de las fichas prediales correspondientes a tramo K7+500 al K10+100,"
* Se remitiran 8 fichas prediales para revisión.
* El valor de terreno de las ZHG esta entre 5 y 10 millones con mejoras.
* Se remitieron 2 fichas prediales para revisión preliminar
002ID-T2-CMMVSFM
001ID-T2-CMMVSFM
* Pasivos prediales Contrato No 407
- Radicación de expedinetes para sanear pasivos
- Ficha predial y Estudio de títulos del predio denominado como 039A-SB-D mediante comunicado con Registro: CSF-574-112593, radicado Interventoría 04-2470-23M1 del 24 de marzo de 2023 frente a lo cual, Interventoría manifiesta que ya realizó la revisión y propone una mesa de trabajo para socializar observaciones respecto a los insumos.
- Minuta de la escritura pública correspondiente al predio 019SPI, lo anterior por cuanto el señor Wilson Bravo, vocero de la señora luz Clara Delgado, manifestó que requiere finiquitar este trámite de compraventa.

FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+076 al PR 49+817 sobre el carril izquierdo.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+246 al PR 49+582 sobre el carril derecho.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho entre PR 48+434 al PR 48+900.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho entre PR 47+800 al PR 48+415.
* Retiro de carpeta asfáltica existente entre PR 48+420 a PR 48+435 Carril derecho.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril derecho entre PR 49+100 al PR 49+500.
* Instalación y céreo de base granular estabilizada carril derecho entre el PR48+060 al PR 48+415,75 y entre el PR48+432,7 al PR49+100.
* Estabilización con emulsión asfáltica entre el PR 48+060 al PR 48+415 y PR 48+432 al PR 49+100 sobre el carril derecho.
* Toma de Briquetas con Mezcla Asfáltica MDC 19 carril izquierdo entre PR 49+076 al PR 49+462
* Toma de Densidades y Ensayo de Planicidad sobre superficie de BEE-38 carril derecho entre el PR 48+900 al PR 49+500

AREA AMBIENTAL:

* Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de la fichas del PAGA V4, por parte del contratsita se adelantan las gestiones ante la alcaldía Municipal de Mallama para la donacion del material de fresado y se realizael seguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de tramite de la obtencion del acto administrativo para la consecion de aguas en el Rio Guabo.

AREA SOCIAL:

* En este semana no se han recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.
* Los profesionales encargadas del cierre de actas de vecindad, en esta semana realizan 3 cierres de actas de vecindad.

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.


* El dia 06 de Julio de 2023, Durante actividades de Instalación de Mezcla Asfáltica MDC 19, se recomendo al contratista el uso adecuado de los elementos de protección personal puesto que se evidencia el uso de casco sobre gorras lo cual hace impide la fijación firme de este elemento y no cumple su función resultar en una reducción en la efectividad del casco de seguridad y aumentar el riesgo de lesiones.
* El dia 08 de Julio de 2023, Durante el desarrollo de actividad de Conformación y céreo BEE-38 con emulsión asfáltica y adición de cemento en PR 48+500 a PR 48+700, se solicitó al contratista reforzar la demarcación de áreas de trabajo con la implementación de delineadores tubulares compuestos de acuerdo a lo establecido en el Plan de manejo de trafico y manual de señalización vial.
* El dia 10 de Julio de 2023, el contratista continua realizando el proceso de inducción para personal nuevo, de igual manera realiza reposición de elementos de protección personal como impermeables, protección auditiva, y guantes de seguridad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervisión de Actividades programadas por el contratista. (VSFM - FRENTE MALLAMA, RUTA 1002)
* Seguimiento y control para verificar cumplimiento al cronograma de ESTUDIOS Y DISEÑOS del Primer kilómetro K7+103 al K8+103..
* Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el Contratista e INVIAS.
* Seguimiento a las actividades ambientales contempladas en el PMA.
* Seguimiento a las medidas ambientales que se ejecutan en el Municipio de Mallama.
* Seguimiento ambiental a actividades mantenimiento sector 1.
* Continuar con la excavación de los caisson del puente 9A en los ejes No.1, No.2 y No.3.
* Continuar con la excavación, armado de acero y fundida de los caisson y zarpas del Muro No.1 en los módulos 2, 3, 4 y 5.
* Continuar con las actividades de perforación para instalación de instrumentación de monitoreo en el talud del K6+800 margen derecha. Toma de lecturas de los inclinó metros y piezómetros ya instalados.
* Continuar con las construcción de las obras de protección de los puentes San Francisco y San Pedro sobre la vía nacional 1003 (Construcción de gaviones).
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 49+076 sobre el carril izquierdo hacia menores.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 49+246 sobre el carril derecho hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho desde el PR 47+800 hacia menores.
* Instalación y céreo de base granular carril derecho desde el PR 48+060 hacia menores.
* Se tiene programada la reunión de seguimiento semanal con participación del INVIAS, Contratista e Interventoría para el 19 de julio de 2023.
* Culminación de atención a observaciones y revisión de las mismas por parte de interventoría Puente No.6, No.11, No.12a y No.12b. De ser el caso se emitirán aprobaciones para inicio de construcción inmediata.
* Continuar revisión Diseño Geométrico completo del sector No.1 y aprobación del mismo y jornadas de campo, debido a que es una longitud ya construida previamente y con puntos fijos que no se deben modificar.
* Área social, reunión de seguimiento con veedurías.
* Área social, talleres con las comunidades.
* Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se continuara con el seguimiento de condiciones de seguridad de actividades de alto riesgo en sector 1 y 2 san francisco y actividades en sector Mallama. Así mismo continuara con la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la diferente normativa aplicable a las actividades de obra.
* Continuar con la revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que ingresa al consorcio San Francisco.
* Revisión de la respuesta de los requerimientos del Acta 994 de 2022 en mesas de trabajo con el contratista.
* Revisión de la reliquidación de la inversión forzosa no menor al 1% en atención al acta 994 de 2022.
* Remisión de los cambios menores de Puente 12 A y 12 B a la SS INVIAS para radicación ante ANLA.
* Actividades de cierre del predio del PR54+600 donde se evacuo el acopio temporal de material de fresado.
* Continuar con las actividades de adecuación de vía alterna para ingreso a la ZODME Tamabioy.
* Continúan las actividades preliminares de adecuación de la ZODME Tamabioy.
* Reiterar al INVIAS solicitud de información de predios con gestiones pendientes.
* Revisión de la sábana predial actual


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

VSFM

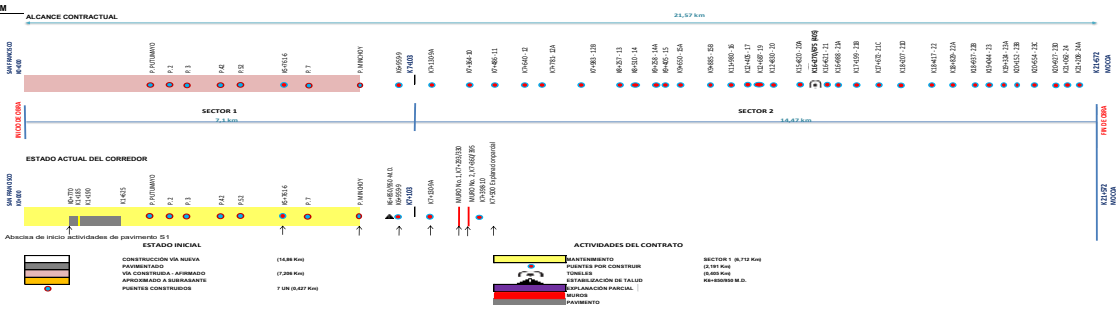

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

RUTA No. 1002

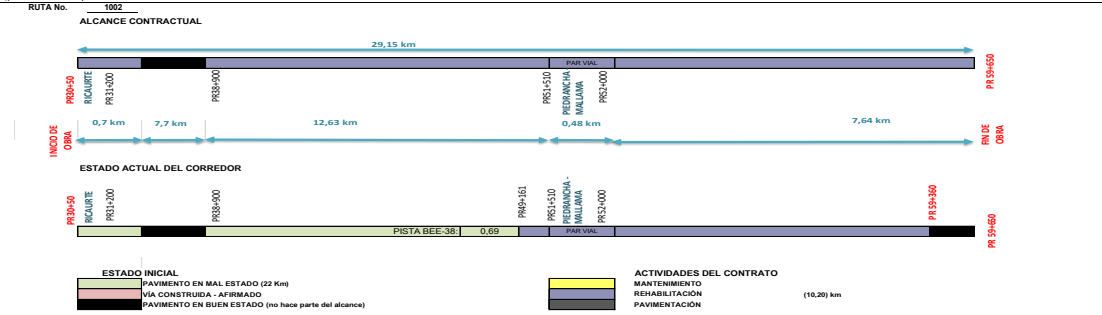

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/07/2023 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de Pavimento en Concreto Hidráulico entre el K 1+455 - K 1+585 carril derecho. VSFM-S1.



Fundición de viga cabezal sobre el eje 2. VSFM-S1.



Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 49+076 al PR 49+462 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se están emitiendo comunicaciones al contratista encaminadas a recordar las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	
Se realizan mesas de trabajo semanales, con los especialistas del Contratista e Interventoría, con el fin de avanzar de manera ágil en el tema de los estudios y diseños.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: LUIS JOSÉ ORDOÑEZ SALCEDO
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.6, No. 8, No.9, 9A, 10, Muro 1, Muro 2, Pavimento MR45 sector 1, primer Kilómetro del sector 2 y Ruta 1002.	Matrícula Profesional No.: 25202-09493 CUN.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 107 del 13/07/2023 al 19/07/2023 | Último Informe Semanal: NO ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales Diaz

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUIR 14,86 Km de vía, 33 PUENTES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,191Km, 1 TUNEL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0,405 Km, 22 Km de Rehabilitación tramo Mallama - Ricaurte Ruta 1002.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se trata de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 6.7 kilómetros entre la abscisa K0+000 al K6+712 correspondiente al Sector 1, y faltan por construir 14,86 Km comprendidos entre el K6+712 al K21+572 que corresponden al sector 2, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Adicionalmente, se ejecuta la rehabilitación del tramo Ricaurte - Mallama sobre el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; UNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 139.681.662,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.860.318.338,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.093.180.249,31
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 36.208.220,69

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 30.528.000.000	$ 61.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 11.186.348.960		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 9.192.906.289		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 2.400.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 465.348.230	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 1.934.651.770	

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 81.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 6.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.056.000.000	$ 106.848.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.800.000.000	$ 5.400.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.310.492.882,27	8,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.266.191.331,00	4,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.044.301.551,27)	-4,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.337.997.840,00	5,58%
(Estudios y Diseños, ambiental, predial, social, IVA)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.631.681.876,70	8,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.604.189.171,00	4,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.027.492.705,70)	-4,43%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 238.229.282,53	0,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 578.548.965,00	0,09%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $ 1.926.916.182,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra No. 22 - Abril 2023 Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3225-23 de 19 de Mayo de 2023, dio entrada con Número de radicado 50466 de 23 de Mayo de 2023.

Acta de obra No. 23 y Ajustes 23 - Mayo 2023 Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3481-23 de 06 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 66108 de 07 de Julio de 2023.

Acta de obra No. 24 - Junio 2023 Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3482-23 de 07 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 66139 de 07 de Julio de 2023.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de julio de 2023	$ 52.631.681.876,70	8,62%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de julio de 2023	$ 25.604.189.171,00	4,19%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de julio de 2023	$ 47.310.492.882,27	8,68%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de julio de 2023	$ 24.266.191.331,00	4,45%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de Marzo de 2023	$ 14.728.137.441,00	2,41%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de marzo de 2023	$ 46.031.931.925	7,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramacion No.4 presentada en el mes de Diciembre de 2022.
* Acta Modificación de Cantidades No.04 tramitada mediante comunicado Putumayo04-2369-22 del 13/12/2022 dirigido a GGPT-INVIAS.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.917.566.699	20,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.450.489.566	19,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Abril de 2023
VALOR FACTURA: $ 546.682.870

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de Costos No. 22- Abril de 2023, Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3337-23 del 08 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56501 de 08 de Junio de 2023.

Acta de Costos No. 23- Mayo de 2023, Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3508-23 del 13 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 68303 de 13 de Julio de

Acta de Costos No. 24- Junio de 2023, Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3510-23 del 14 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 68588 de 14 de Julio de 2023.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-19	$ 9.917.566.699,00	20,66%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-19	$ 9.450.489.565,78	19,69%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Marzo 31 de 2023	$ 8.858.459.230,00	18,46%
Valor facturado acumulado	Marzo 31 de 2023	$ 7.429.032.909,79	15,48%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 139.681.662,00
Saldo $	$ 26.860.318.338,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,284
Acumulado:	0,369

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.093.180.249,31
Saldo $	$ 36.208.220,69

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 8,68% Avance o Atraso Físico % -4,23%

Meta Física Ejecutada % 4,45%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021 y 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,86	0,19%	0,06%	Prog					0,20%
					Ejec	0,391	0,397		0,788	0,26%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	0,32%	0,05%	Prog					0,34%
					Ejec	0,900		11,72	12,62	0,66%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RIGIDO	Km	36,86	0,34%	0,17%	Prog					0,39%
					Ejec	0,560		10,52	11,08	1,04%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	5,60%	2,90%	Prog					6,90%
					Ejec					0,17%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Km	36,86			Prog					
					Ejec					
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,11%		Prog					0,11%
					Ejec					0,18%
TRANSPORTES	Km	14,86	0,16%	0,05%	Prog					0,17%
					Ejec					0,39%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 1 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		1
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2	1	
Finisher	1	1	
Carrotanque	-	1	1
Carrotanque irrigador	-	1	
Recicladora	-	2	
Camioneta	-	1	3
Minicargador	-		
Motoniveladoras:	2	3	1
Retrocargadores:	-	1	2
Cargador frontal	-		1
Vibrocompactadores:	2	3	2
Volquetas:	10	2	8
Dumper	-		1
Mixer:	-		3
Buldozer:	-		1
Camion Turbo	-	1	1
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-	1	2
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		7
Equipo de oxicorte	-		
Mezcladora	-		5
Compresor	-	1	5
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR	-		1
Cortadora de disco (para pavimento)	-	1	
Planchon Grua	-		1
Tractomula (Emulsión asfaltica)		1	
Motosierra	-		1
Equipo Topografia	-	1	1
Total	43	21	54

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103
TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825
TRAMO Y/O SECTOR 3: MALLAMA RICAURTE PR38+800 - PR59+600

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	X X	NO NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Autorizacion Temporal N° 502337 y N°502329	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	X 	NO NO X

OBSERVACIONES:
Nombre de la fuente, lugar, nombre propietario, Volumen.
Autorización temporal No. 502337, San Francisco, Consorcio CM PUTUMAYO, 20.000 M3.
Autorización temporal No. 502329, San Pedro Colon. Consorcio CM PUTUMAYO, 50.000 M3.
FTUMAIJAY Materiales de rio Putumayo y San Francisco, San Francisco - Sibundoy, Resolución No. 287 de 2020.
CHORLAVY, San Francisco, Juan Carlos Paredes Benavides.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Durante este periodo se realiza seguimiento a la implementación de los programas y fichas del PAGA Versión 4.
Continúan los tramites de donación de material de fresado con la Alcaldía municipal de Mallama Piedra Ancha.
Continúa tramite de obtención del acto administrativo que otorga captación de aguas en el Rio Guabo.

OBSERVACIONES:
De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades preliminares de adecuación de la ZODME Tamabioy.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	340	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	295	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	45	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	276	17

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 369

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:
El proyecto cuenta puntos satélites (buzones sugerencia) en la Alcaldía Mallama.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logrado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

* Elaboración de informe de sostenibilidad de junio de 2023 por parte del contratista.
* Radicación de informe de sostenibilidad de junio de 2023 por parte del contratista.
* En revisión informes mensuales de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, a los cuales se realizaron observaciones por parte de la interventoría.
* Se encuentra en revisión el informe de sostenibilidad No. 23, correspondiente al periodo 03 de mayo del 2023 al 02 junio del 2023.
* En proceso de consolidación de informes trimestrales pendientes.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado 04-3498-23 del 13/07/2023 dirigido a GGO - INVIAS con asunto:Informes Semanales de Interventoría No. 106 Variante San Francisco – Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 106, correspondientes al periodo entre el 06 de julio al 12 de julio de 2023, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado 04-3499-23 del 13/07/2023 dirigido a DT - INVIAS con asunto: Solicitud de personal y equipo Frente San Francisco - Contrato 1111 de 2021. Teniendo en cuenta que la Interventoría tiene aprobados los diseños de nuevas obras para ejecutar en el sector 1 y 2 de la Variante San Francisco Mocoa, además de la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la ruta 1002 en el municipio de Mallama - Nariño, el Consorcio San Francisco ha iniciado la ejecución de obras en nuevos frentes de trabajo con el propósito de cumplir con el plan de inversión para la vigencia 2023; Por lo anterior, y teniendo en cuenta el volumen de trabajo relacionado, se evidencia que la Interventoría debe realizar actividades de control y seguimiento en ocasiones en paralelo y fines de semana, las cuales que requieren de un acompañamiento permanente, toda vez que deben ser avalas por ésta Interventoría sin generar retrasos al Contratista, por lo cual nos permitimos solicitar la autorización para el ingreso del siguiente personal adicional para atender los frentes de trabajo del sector 1 y 2 de la Variante San Francisco – Mocoa: 1 Inspector técnico, 1 Cadenero primero, 1 Equipo completo de topografía y 1 Camioneta.

Mediante comunicado 04-3500-23 del 13/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Alcance comunicado Putumayo04-3488-23 Radicado INVIAS No. 66793 del 10/07/2023 con asunto; Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 7 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023. Por medio de la presente, nos permitimos aclarar que dando alcance al comunicado del asunto; se remitió el Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 8 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023, lo cual se puede verificar en los anexos adjuntos al comunicado referido.

Mediante comunicado 04-3501-23 del 13/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta entrada 04-2982-23 del comunicado CSF-801-114950 Adquisición de equipos para el programa manejo de arqueología. Teniendo en cuenta que mediante comunicado CSF-373-108339 del 29 de noviembre 2022 se entregó la propuesta para la implementación del Plan de Manejo Arqueológico en el sector 2 del contrato 1111/2021, La interventoría mediante comunicado 04-2949-23 del 29 de diciembre 2022, dio respuesta y de acuerdo a la justificación técnica, y presupuestal se solicitó se incluya en el Plan de inversión social, el cual se radico a la SS correspondiente al PIS v3 y mediante comunicado SS21426 con entrada interna 04-2602-23 del 19 de abril 2023 se presenta la no objeccion de la SS a la ítem de implementación PMA. Surtido el anterior proceso se da cumplimiento a cada una de la actividades que contempla la propuesta de implementación de PMA, contratando a los profesionales encargado del monitoreo y seguimiento del PMA. Para el desarrollo de las actividades en campo el contratista mediante comunicado CSF 713-113925 con recibido el 24 de mayo del 2023, solicita que a través del ítem de la propuesta monitoreo y varios, el cual se reembolsará un valor mensual de $2.532.000 (valor aprobado propuesta), requiere que se de viabilidad a la adquisición de los siguientes equipos (GPS, Tabla Munsell, cámara y escala tipo jalon) los cuales son indispensables para las actividades correspondientes al desarrollo de la fase de implementación del PMA y propone que sean descontados hasta que se cubra el costo total de las herramientas adquiridas, Revisado la documentación por parte de interventoría se da respuesta mediante comunicado 04-3302 y se solicita que de acuerdo al anexo se soporte las respectivas cotizaciones y además se entregue el análisis jurídico, técnico y financiero, con el fin revisar y evaluar la solicitud. De acuerdo al comunicado CSF-801-114950 con recibido del 04 de Julio 2023, se entrega la justificación técnica, jurídica y financiera y las cotizaciones para la adquisición de los equipos, de acuerdo a las (3) cotizaciones, esta interventoría emite aprobación de cotizaciones teniendo en cuenta criterios de seleccion e indica que como se manifestó en el comunicado 04-3302-23, el valor total de la adquisición de los equipos se reembolsara del ítem PRESUPUESTO MONITOREO VARIOS hasta que se cubra el costo total de las herramientas adquiridas, de acuerdo con la propuesta aprobada por la interventoría para la implementación del programa de arqueología y lo contemplado en el PIS V3.

Mediante comunicado 04-3502-23 del 13/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Estructural Muro aproximación Puente 9 Tramo 1 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-700-113887 (04-2768-23). El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Estructuras, nos permitimos presentar las observaciones emitidas a los documentos presentados del muro de aproximación del Puente 9 del tramo 1.

Mediante comunicado 04-3503-23 del 13/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión Reingeniería K7+103-K8+103 Tramo 2 San Francisco. Respuesta comunicación CSF-749-114105 (04-2855-23)Estructuras Muro MSA03. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando alcance al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación que se adjuntó a dicho escrito por nuestro especialista en Estructuras, nos permitimos presentar las observaciones a los diseños estructurales del Muro MSA03 localizado en el Sector 2, del K7+103 al K8+103.

Mediante comunicado 04-3504-23 del 13/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-812-115143 con radicado interno 04-3007-23M1 con asunto: "Respuesta a la comunicación Putumayo 04-3395-23, por cumplimiento funciones por parte de Residente de Vías del Consorcio San Francisco.". Frente a los hechos argumentados en la comunicación del asunto, la interventoría se permite dar claridad al respecto.

Mediante comunicado 04-3508-23 del 13/07/2023 dirigido a la GGO - INVIAS con asunto: Remisión Acta de Costos de Interventoría No 23 Mayo. Mediante la presente nos permitimos remitir para su revisión y trámite, el acta de Costos No 23 de Interventoría correspondiente al periodo mayo de 2023, debidamente firmada por el director territorial INVIAS Putumayo.

Mediante comunicado 04-3509-23 del 14/07/2023 dirigido a la DT - INVIAS con asunto: Informe mensual de Interventoría No. 24 junio de 2023 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir el Informe mensual de Interventoría No.24 correspondiente al periodo 01 al 30 de junio de 2023, para su revisión y trámites pertinentes, con sus respectivos anexos. Se remite los siguientes archivos en PDF: INFORME MENSUAL No 24 JUNIO-23 FRENTE SAN FRANCISCO (2119 FOLIOS), INFORME MENSUAL No 24 JUNIO-23 FRENTE MOCOA (1056 FOLIOS)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicado 04-3510-23 del 14/07/2023 dirigido a la DT - INVIAS con asunto: Remisión Acta de Costos de Interventoría No 24 Junio. Mediante la presente nos permitimos remitir para su revisión y trámite, el Acta de Costos de Interventoría No 24 correspondiente al periodo junio de 2023.

Mediante comunicado 04-3511-23 del 14/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-795-114943 (04-2970-23) con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-3388-23 Apremio N°1 por no entrega de requerimientos solicitados mediante comunicado Putumayo04- 1668-22 con asunto: Plan Manejo de Tráfico. Mediante el presente me permito realizar las siguientes observaciones a documento del PMT de San Francisco radicado mediante comunicado CSF-795-114943.

Mediante comunicado 04-3512-23 del 17/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Solicitud revisión Plan de Inversión Social Versión 4. Por medio del presente, nos permitimos solicitar de la manera más respetuosa se adelante por parte de la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS, la revisión, modificación y/o solicitud de ajustes al Plan de Inversión Social Versión 4 remitido mediante el comunicado Putumayo04-3393-23 con radicado a la entidad 59824 del fecha 20 de junio de 2023, para el proceso de implementación. Se anexa la trazabilidad de los radicados y soportes.

Mediante comunicado 04-3514-23 del 14/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Remisión Cambio Menor Puente 12 A y Puente 12 B Frente San Francisco Contrato 1111 de 2021. Por medio de la presente, nos permitimos remitir los documentos técnico – ambiental y cartográfico revisado, ajustado y aprobado por esta interventoría en sus áreas Técnica, Ambiental y SIG, para surtir el trámite de CAMBIO MENOR LISTADO ante la ANLA de Puente 12 A y Puente 12 B, que se sustentan en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.6.1.3. Modo terrestre carretero en el siguiente numeral: 11. Modificación, construcción y reubicación de pontones y obras de drenaje y subdrenaje transversal o longitudinal.

Mediante comunicado 04-3515-23 del 14/07/2023 dirigido a la Gerencia de Comunicaciones - INVIAS con asunto: Comunicación CSF-769-114618 con radicado Interventoría 04-2908-23M1 con asunto: "Solicitud de diseño de valla informativa para el Contrato 1111 de 2021". Respecto al comunicado del asunto, remitido por el Consorcio San Francisco a la Gerencia de Comunicaciones de INVIAS, donde solicitan el diseño de la Valla Informativa del Contrato de Obra de la referencia, de manera respetuosa y en cumplimiento de nuestras funciones como Interventoría, solicitamos nos brinden información respecto al trámite solicitado el día 14 de junio de 2023, con radicado INVIAS No. 58246 de fecha 14 de junio de 2023. Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato y Capítulo 11. Señalización, del Anexo Técnico del Proyecto.

Mediante comunicado 04-3517-23 del 14/07/2023 dirigido a la GGO - INVIAS con asunto: Solicitud pronunciamiento INVIAS frente a comunicado CSF-814-115151 con radicado interno 04-3010-23M1 con asunto: "Conclusiones reunión INVIAS martes 4 de julio de 2023 sobre la RED Geodésica del Proyecto". En la mesa de trabajo presencial del pasado Martes 4 de Julio de 2023, realizada en las instalaciones del INVIAS Bogotá, que contó con participación del Gestor de proyecto Ing. Miguel Ángel Guacales, se expuso por parte del Contratista y la Interventoría la posición en cuanto a la unificación de la red geodésica y la utilización de una ecuación de empalme en cota, sin embargo, no se logró un consenso entre las partes, teniendo como diferencia principal la ecuación de empalme entre el sector 1 y sector 2 propuesta por el Contratista, la cual reitera en el comunicado CSF-814-115151 del 8 de Julio 2023. De acuerdo a lo anterior, de manera muy respetuosa se solicita al Invias como entidad contratante, se pronuncie respecto al caso de aceptar o no la propuesta del Contratista de obra - Consorcio San Francisco, que no es acorde a lo solicitado por esta Interventoría soportado en los siguientes comunicados (Ver cuadro No.1) , y ratificado mediante comunicado Putumayo04-3412-23 de fecha 21 de Junio de 2023, es decir, entregar una red geodésica y topográfica única para los 5 Sectores del Proyecto. Quedamos atentos al pronunciamiento técnico por parte del INVIAS.

Mediante comunicado 04-3518-23 del 13/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-780-114872 con radicado interno 04-2922-23M1 con asunto: "Gestión de apu´s. Remisión de análisis de precios unitarios no previstos OE-011 "Fabricación de elementos para reforzamiento puente 6". OE-012 "Montaje de elementos de reforzamiento puente 6" y OE-012 "Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica de puente 6". Dando respuesta al oficio del asunto, donde el Contratista presenta para revisión y aprobación los precios unitarios relacionados a continuación: " OE-011 "Fabricación de elementos para reforzamiento puente 6", " OE-012 "Montaje de elementos de reforzamiento puente 6" y " OE-012 "Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica de puente 6". Nos permitimos indicar lo siguiente: 1. El día 8 de mayo de 2023, mediante correo electrónico el Ing. Héctor Fabio, Director de Obra Consorcio San Francisco, hace entrega del listado de los APUS, que a su parecer el proyecto requiere. 2. El día 9 de mayo de 2023, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre los profesionales del Contratista e Interventoría para determinar su viabilidad; en dicha reunión se dioclaridad que 2 de los APUS propuestos: " OE-011 "Fabricación de elementos para reforzamiento puente 6" y " OE-012 "Montaje de elementos de reforzamiento puente 6". Se encuentran incluidos en el presupuesto oficial del Contrato 1111 de 2021, por lo cual las actividades que ejecute el contratista en el Puente 6 serán reconocidas por los ítems relacionados a continuación: ● Ítem de pago No. 650.2 "Fabricación de estructura metálica" ● Ítem de pago No. 650.4 "Montaje de estructura metálica". Por tolo anterior, no es viable generar dos APUS particulares para las actividades que se ejecuten en el Puente 6. 3. Respecto al APU OE-012 Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica, se solicitó las memorias de cálculo en Excel para su análisis; toda vez que este ítem no previsto es el único que aplicaría, no obstante, a la fecha el Contratista no ha remitido la información solicitada.

Mediante comunicado 04-3519-23 del 14/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a su oficio CSF-825-115249 con recibo interno 3034 del 14/07/2023 con asunto; Notificación de suspensión de actividades en Zodme Tamabioy. Teniendo en cuenta el comunicado del asunto, esta interventoría solicita se informe el plan de acción que se tiene previsto con el gobernador del Cabildo Kamentsa Biya de Sibundoy, con el fin de definir la situación de los predios del ZODME tamabioy. Con respecto al tema sobre la evaluación que están realizando para subsanar las necesidades de tener un sitio de disposición acorde a los requerimientos del Contrato, remitir la respectiva información de sitios de disposición legalizada o a tramitar para realizar el acompañamiento por parte de esta interventoría. También se solicita evaluar las rutas de acceso y proceder con el transporte de material estéril de corte hacia los sitios de jarillones del canal A del río Putumayo Vereda San Félix Municipio de Sibundoy

Mediante comunicado 04-3522-23 del 14/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-823-115247 (04-3032-23)concepto técnico para la definición de profundidad del caisson 9 del muro 1 k 7+332. Sector 2 Variante San Francisco - Mocoa. Con su comunicación CSF-823-115247, entrega concepto técnico para la definición de profundidad del caisson 9 del muro 1 k 7+332. Sector 2 Variante San Francisco -Mocoa. Dicho concepto, recibido el día de hoy viernes 14/07/23 y se escaló a nuestros especialistas, quienes emitiran respuesta el dia martes 18 de julio de los presentes.

Mediante comunicado 04-3524-23 del 15/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-816-115179 con radicado interno 04-3014-23M1 con asunto: "Suspensión de actividades en la construcción de protección a los estribos de los Puentes San Francisco y San Pedro". Mediante la presente la Interventoría se permite hacer el resumen de la trazabilidad asociada a la intervención de los Puentes San Francisco y San Pedro a raíz de la emergencia registrada el 4 de julio de 2022 y con base en lo anterior, la Interventoría considera que no hay argumentos técnicos de peso que soporten la determinación unilateral del Contratista de suspender la construcción de las obras de protección de los puentes San Francisco y San Pedro. Por último se aclara que así se efectúen obras de mitigación, en el marco de la emergencia,estas deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos y estándares establecidos en las Especificaciones de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS y en general la normatividad contractual; en consecuencia, el contratista es responsable de cualquier perjuicio o evento catastrófico que pueda desencadenarse derivado de la omisión en la ejecución proyectada o mala calidad de las obras.

Mediante comunicado 04-3528-23 del 17/07/2023 dirigido a la DT - INVIAS con asunto: Acta de ajuste Definitiva No.22 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir el Acta de Ajuste Definitiva No. 22 del Cto. 1111 de 2021, correspondiente al mes de Abril de 2023, para su revisión y trámites pertinentes.

Mediante comunicado 04-3529-23 del 18/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Presentación planos obras aprobadas en magnético y físico para suscripción de firmas. Esta interventoría solicita la presentación de Planos definitivos en medio Magnético y Físico de las estructuras aprobadas para continuar con trámite de suscripción de firmas especialistas Contractuales. De igual manera para los planos del Sector No.1 se solicita retirar logo de contratista anterior e incluir logo de Consorcio San Francisco como contratista actual.

Mediante comunicado 04-3530-23 del 18/07/2023 dirigido a la DT - INVIAS con asunto: Respuesta a la entrada 04-2469-23 del comunicado DT-PUT-16476- Atención de solicitud de la vereda San Pablo. Dando alcance al comunicado del asunto, esta interventoría permite informar que se dio atención a la solicitud de adecuación y mejoramiento de la vía San Pablo, que intersecta con la variante. Se adjunta para su conocimiento el acta de conformidad del presidente de la JAC de San Pablo como el registro fotográfico de la actividad.

Mediante comunicado 04-3531-23 del 18/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Alcance respuesta a comunicación CSF-823-115247 concepto técnico para la definición de profundidad del caisson 9 del muro 1 K7+332. Sector 2 Variante San Francisco - Mocoa. Una vez revisada la documentación entregada por el Contratista en su comunicación CSF 823-115247 recibido el 14 de julio de 2023, sobre el concepto técnico para la definición de profundidad del caisson 9 del muro 1 K7+332. Sector 2 Variante San Francisco - Mocoa, se encontró que no se anexa el análisis de cargas laterales, adicionalmente se requiere que el concepto también incluye el análisis por parte del diseñador estructural. Se solicita al Contratista el envió de esta información y quedamos atentos a su entrega para poder ejecutar la revisión completa por parte de los especialistas en geotecnia y estructuras.

Mediante comunicado 04-3532-23 del 18/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Remisión GDB ICA N° 15 proyecto Construcción Variante San Francisco Mocoa expediente LAM 1358. Por medio de la presente, nos permitimos remitir el ICA N° 15 en atención parcial a Requerimiento No. 22 del Acta de Seguimiento 994 del 27 de Diciembre de 2022, cabe resaltar que esta interventoría emite concepto de aprobación bajo lo establecido en el APENDICE D Gestión Ambiental, Numeral 5 INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO, ICA E INFORME FINAL, de igual manera se cumple con la estructura documental de acuerdo los lineamientos establecidos en el APENDICE 1 del Manual de Seguimiento de Proyectos Licenciados, finalmente esta interventoría recomienda radicar este informe a la ANLA y esperar pronunciamiento por parte de esta autoridad ambiental, sin embargo para su conocimiento desde el área SIG de Interventoría se hace precisión.

Mediante comunicado 04-3535-23 del 18/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Revisión y solicitud de ajustes de informes de sostenibilidad de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023. De acuerdo a la revisión realizada de los informes de sostenibilidad de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, se emiten consideraciones para que sean atendidas por el contratista de obra.

Mediante comunicado 04-3541-23 del 18/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-789-114930 con radicado interno 04-2948-23M1 y asunto: "Gestión de apu´s. Remisión de análisis de precios unitarios no previstos OE-010 "Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/microfisurado (incluye suministro e instalación)". Revisada la información recibida, esta Interventoría emite observaciones sobre el APU presentado para la actividad: PERFORACIÓN PARA DRENES EN TALUDES CON TUBERÍA DE 2" RANURADO/MICROFISURADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN), se esta a la espera de que el contratista atienda las observaciones de interventoría.

Mediante comunicado 04-3543-23 del 18/07/2023 dirigido a la Veeduria Ciudadana del Contrato 1111-2021 con asunto: Entrega información – Intersección Ruta 1003-variante San Francisco-Mocoa. Por medio de la presente se entrega la información solicitada en la reunión de seguimiento del mes de Junio de 2023, referente al esquema de intersección de la ruta 1003 con la variante San Francisco-Mocoa, dicha información corresponde al diseño preliminar que se tiene a la fecha, razón por la cual en el momento que esta información sea actualizada o modificada se remitirá nuevamente a ustedes.

Mediante comunicado 04-3547-23 del 19/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Apremio No. 1: Selalización sector Mallama. Mediante la presente esta interventoría solicita la instalación de señalización según manual para el sector de Mallama.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

* El día 12 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones ambientales establecidas en los programas y fichas del PMA, del K0+600 hasta en el K7+400 Sector 1 y 2 de la Variante San Francisco – Mocoa.

* El día 12 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión del ICA 15 e ICA 23 y se realiza la formulación de la matriz de actos administrativos del Expediente SRF 1358 para la cesión de la sustracción de reserva forestal ante la DBBSE.

* El día 13 de julio de 2023 se realizó recorrido a la Zona Industrial San Carlos para verificar cerramiento perimetral, adecuación de la caseta de acopio temporal de residuos sólidos, verificación del sistema de manejo de residuos líquidos domésticos, adecuación del área de planta dosificadora de concreto, seguimiento limpieza del material de arrastre acopiado y adecuación de las áreas de taller.

* El día 13 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de los APUS de rescate y reubicación de especies en VEDA.

* El día 13 de julio de 2023, se realizó el seguimiento al avance de los trabajos en el sector 1 y 2, verificando las actividades de construcción de la vía de acceso en el K7+500, caisson del muro No.2, Excavaciones de caisson en puente 9A, armado de obra falsa en el puente 9, excavaciones y armado de acero en caisson del Muro No.1, excavaciones de caisson en apoyo intermedio de puente 6.

* El día 14 de julio de 2023 se realizó reunión virtual de seguimiento predial con personal del INVIAS, se deben cambiar las fichas de los predios de pasivos prediales a la versión actual 039A-SB-D Y 019SPI, así mismo obtener las declaraciones juramentadas por parte de los propietarios de las mejoras en inventarios.

* El día 14 de julio de 2023 se realizó recorrido y acompañamiento al contratista para revisión de predio en el Municipio de Sibundoy que cumple como gestor RCD, teniendo en cuenta los conflictos sociales que se tienen con parte de la comunidad indígena para el ingreso a la ZODME Tamabioy.

* El día 14 de julio de 2023 se remitió a la SS INVIAS los cambios menores de Puente 12 A y 12 B para que se surta el trámite de radicación ante la ANLA.

* El día 14 de Julio 2023, se realiza reunión con el gobernador Cabildo Inga Kamentsa de San Francisco, con el fin de atender la solicitud de revisión de propuesta para inclusión de profesionales en el tema de abordaje proceso consulta previa.

* El día 14 de julio de 2023, se realizó el seguimiento las actividades de fundida de pavimento en el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, entre el K 1+715 - K 1+760 por el carril derecho.

* El día 14 de julio de 2023, se realizo recorrido en sector 1 y 2 San Francisco durante el cual se verifico condiciones de seguridad en área de trabajo de puente 6, donde se adelantan actividades de excavación de caisson para apoyo de estructura, se evidencia falta de elementos de protección personal como gafas y mascarilla para material particulado, de igual manera no se cuenta con elementos para atención a emergencias, por lo tanto se solicita al contratista dotar esta área de trabajo con los elementos mínimos para brindar unas condiciones seguras al personal.

* El día 15 de julio de 2023, se realizó recorrido conjunto con el Geologo de la interventoria, residente de geotecnia y los consultores del contratista para la revision en campo del volumen de geologia de Parte 1 (K8.100-K8.600). El recorrido en la mañana se vio afectado por el deslizamiento del talud superior del K 7+430.

* El día 15 y 16 de julio de 2023 se realizó recorrido de campo entre pares especialistas en Geotecnia y Geología de Interventoría, Obra y Consultoría donde no hubo observación a la caracterización del suelo previamente auscultado mediante perforaciones entre el k8+100 y el k8+600.

* El día 17 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión y ajuste del documento técnico ambiental de la solicitud de cambio menor por pronunciamiento desplazamiento eje de vía K7+100 a K8+100 y se realiza una revisión conjunta de la GDB del ICA 15 para su remisión a la SS INVIAS y posterior radicación a la ANLA.

* El día 17 de julio de 2023 se realizó reunión en el cabildo indígena camentsa biya con parte de la comunidad que se opone al ingreso de los predios de la ZODME Tamabioy.

* El día 17 de julio de 2023 se realizó recorrido con personal de interventoria para la revision del estado de los taludes y el avance en las excavaciones de los caisson de Puente 6 y muro 1. Se encontró que por la alta pluviosidad, hay taludes fallados y otros que presentan amenaza de deslizamiento en el corredor, especificamente este dia fallo el talud superior del K7+200, por lo cual se reitera el requerimiento al contratista para que tome medidas efectivas de solucion temporal para minimizar el riesgo para los transeuntes.

* El día 18 de julio de 2023 se realizó acompañamiento al contratista a reunion con parte de la comunidad indígena de la comunidad camentsa biya para concertar los avances de las actividades preliminares de la ZODME Tamabioy.

* El día 18 de Julio 2023, el Gobernador del Cabildo cita a una reunión con el objetivo de socializar las actvidades a ejecutarse en el predio del ZODME Tamabioy, la comunidad en espacio con el gobernador manifiesta que es necesario realizar esa actividad en otro espacio, se manifiesta por parte del consorcio que estara pendiente de la nueva fecha para realizar estas actividades.

* Los días 17, 18 y 19 de julio de 2023, se realizó el seguimiento las actividades de atención de la emergencia presentada en la vía 1003 entre San Francisco y Mocoa debido a deslizamientos que causaron el cierre total de la vía en varios sitios debido a las fuertes lluvias registradas por la temporada invernal en la región.

* El 19 de julio de 2023 Se acompaño a recorrido a los sectores 1 y 2 de la variante que conto con la presencia de personal de INVIAS, veeduria, contratista e interventoria.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

FRENTE SAN FRANCISCO:

AREA TÉCNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Remoción de material producto de represamiento de la quebrada en el sector de Chorlaví sobre la actual vía de San Francisco - Mocoa (ruta 1003) en el PR 76+910.
* Remoción de material de deslizamiento de talud del K 2+480 margen izquierda, sector No. 1, ocasionado por las fuertes lluvias que se presentan en el sector, este material es depositado temporalmente en la zona industrial del contratista.
* Se realizó instalación de concreto hidráulico entre el K 1+625 al K 1+895 por el carril derecho.
* Se realizó la actividad de céreo de subbase entre el K2+200 al K2+570 por el carril derecho.
* Puente No. 6 (K5+761 - K5+828): Se realizó excavación de caissons No. 1 y No. 2. Se realizó fundición de anillos de caissons No. 1 y No. 2. Las profundidades son: Caisson No. 1= 4.21 m, Caisson No. 2= 4.39 m.
* Puente No. 9 (K6+959 - K7+004): A la fecha se tienen fundida la totalidad de las pilas del eje No.1 y 2 del eje No.2, es decir las pilas No.1, 2,3 y 4. El Contratista tiene fundida viga cabezal del eje No.1 y No.2 En la semana del presente informe se avanza en la instalación de la estructura metálica de la obra falsa.
* Puente No. 9A (K7+130 - K 7+190): El Contratista avanza con la excavación de los Caisson con las siguientes profundidades de cada uno: No.1 = 11.48 m, No.3 = 16.80 m, No.4 = 15.09 m, No.5 = 16.15 m y No.6 = 11.62 m. Se dio inicio al corte del talud derecho en el eje No.1 del puente con el fin de permitir la excavación del caisson No.2.
* Muro No. 1 (K7+293 - K 7+330): El contratista continua con las actividades de excavación, armado de acero y fundida de caisson No.1 = fundido, No.2 = fundido, No.6 = fundido, No.7 = fundido, No.8 = fundido, No. 11= fundido, los caisson en excavación son los siguientes No.3 = 7.99 m, No.4 = 7.67 m. Los caisson No.9 y 10 se encuentran en proceso de armado del acero de refuerzo. Además se tiene fundida de la zarpa del módulo 1 de este muro que comprende los caisson No.1 y No.2.
* Muro No. 2 K (7+360 - K 7+395): Continúa la excavación y fundición de anillos en los caissons No. 1, 2, 3 y 4. Las profundidades son No.1 = 4.61 m, No.2 = 6.02 m, No.3 = 4.43 m, No.4 = 2.97 m.
* Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): El contratista termino la construcción del paso provisional sobre la fuente hídrica, entre el K 7+380 - K 7+440, se avanza con la explanación hacia mayores en el K7+500.

AREA GEOTECNICA:

* Talud del K6+800 margen derecha: A la fecha se tienen instalados 5 de un total de 6 inclinómetros y 2 de 4 piezómetros, se continua tomando lecturas a los instrumentos instalados, como parte del monitoreo de este talud. Se continúa con las perforaciones en la corona del talud para instalar los elementos restantes.
* Se continúa con las actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas: K 8+870, K 8+900, K8+919, K 9+350, K 9+425, K9+700, K 9+800, K 9+746, los demás equipos se encuentran en traslado a los nuevos puntos de sondeo para exploración de suelos sobre el sector 2.

AREA AMBIENTAL:

* Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista
* Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.
* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolucion 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el proposito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.
* Remisión de los cambios menores de Puente 12 A y 12 B para que se surta el trámite de radicación ante la ANLA.
* Se logró consolidar y concertar con la interventoría la GDB del ICA N° 15.
* Se avanzó en la formulación de los APUS del rescate y reubicación de las especies en VEDA.
* Se avanza en la consolidación de los documentos legales y técnicos de la Cesión de licencia ambiental ante ANLA y la DBBSE.
* Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos.

AREA SOCIAL:

* Se recepciona una PQRs por parte de la comunidad con el arreglo y mantenimiento de la vía Chorlaví.
* Se realiza el acompañamiento a los diferentes acercamientos con el Gobernador del Cabildo Kamentsa Biya con el fin de revisar el tema de ZODME Tamabioy y realizar el plan de información con la comunidad del área de influencia del proyecto, de acuerdo a la directriz del gobernador.
* Atención a las diferentes reuniones con la comunidad del área de influencia del proyecto.
* Cumplimiento de la ficha GS3-Capacitaciones e Inducciones al personal vinculado al proyecto

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 13 de Julio de 2023, Se realizó seguimiento a señalización instalada en Zodme Tambioy, Zona industrial y tramo de inicio de variante san Francisco -Mocoa, se solicta al contratista verificar esta señaletica puesto que es importante que cada una de las señales se encuentre instaladas en el orden y distancias de acuerdo a esquemas presentados en el documento del PMT.
* El día 14 de Julio de 2023, Se realizo inspección a preoperacionales de maquinaria y vehiculos, evidenciando formatos que no cuentan con la informacion minima del vehiculo o maquinaria asi mismo se evidencia que algunos conductores no realican juiciosamente el pereocupacional siendo este un requerimieno que debe llevar a cavo al inicar la jornada laboral con el fin de identificar fallas en los vehiculos y maquinaria, por lo tanto se solicita al contratista implementar las medias correctivas con el personal.
* El día 17 de Julio de 2023, Se solicita al contratista instalar ventilación e iluminación en caisson de muro 2.
* El día 18 de Julio de 2023, Se realizo reunión con Coordinador SST de contratista con el fin de que se tomen las medidas necesarias ante observaciones encontradas en campo durante esta semana puesto que es muy importante que el personal cumpla con toda la parte documental que hace parte del SG SST, asi como tambien que en campo se implementen mediadas preventivas y correctivas para evitar que el personal sufra accidentes de trabajo durante el desarrollo de actividades de obra.

AREA PREDIAL:

* Se están generando las actividades que conllevan a adelantar la consecución de la información técnica, y jurídica de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto San Francisco – Mocoa.
* Se están ejecutando la consecución de los documentos de propiedad y la suscripción de Actas de Intervención anticipada para la disponibilidad de los primeros kilómetros.
* Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención Voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.
* Sobre los predios para inversión forzosa de no menos del 1%, se espera concepto técnico ambiental de la corporación Corpoamazonia.
* Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logrado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.
* Se está ejecutando la actividad de elaboración de las fichas prediales correspondientes a tramo K7+500 al K10+100,"
* Se remitiran 8 fichas prediales para revisión.
* El valor de terreno de las ZHG esta entre 5 y 10 millones con mejoras.
* Se remitieron 2 fichas prediales para revisión preliminar
002ID-T2-CMMVSFM
001ID-T2-CMMVSFM
* Pasivos prediales Contrato No 407
-Radicación de expedientes para sanear pasivos
-Ficha predial y Estudio de títulos del predio denominado como 039A-SB-D mediante comunicado con Registro: CSF-574-112593, radicado Interventoría 04-2470-23M1 del 24 de marzo de 2023 frente a lo cual, Interventoría manifiesta que ya realizó la revisión y propone una mesa de trabajo para socializar observaciones respecto a los insumos.
-Minuta de la escritura pública correspondiente al predio 019SPI, lo anterior por cuanto el señor Wilson Bravo, vocero de la señora luz Clara Delgado, manifestó que requiere finiquitar este trámite de compraventa

FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 48+953 al PR 49+076 sobre el carril izquierdo.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 48+727 al PR 49+246 sobre el carril derecho.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho entre PR 46+750 al PR 47+800.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo entre PR 48+110 al PR 48+415.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril derecho entre PR 48+100 al PR 49+100.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril izquierdo entre PR 48+950 al PR 49+100.
* Instalación y céreo de base granular estabilizada carril derecho entre el PR46+750 al PR 48+060.
* Estabilización con emulsión asfáltica entre el PR 46+750 al PR 48+060 sobre el carril derecho.
* Toma de Densidades y Ensayo de Planicidad sobre superficie de BEE (38) entre el PR 48+100 al PR 48+900 Carril Derecho.
* Replanteo, Materialización de Eje y Normales entre el PR 45+350 al PR 47+120.

AREA AMBIENTAL:

* Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de la fichas del PAGA V4, por parte del contratista se adelantan las gestiones ante la alcaldia Municipal de Mallama para la donacion del material de fresado y se realiza el seguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de tramite de la obtencion del acto administrativo para la consecion de aguas en el Rio Guabo.
* Se remite mediante correo electrónico del 14 de julio de 2023 la GUÍA PARA ACCEDER AL MATERIAL DE FRESADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, a la Alcaldía Municipal de Mallama Piedra Ancha para que organice la disposición del material de fresado.

AREA SOCIAL:

* En este semana no se han recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.
* Los profesionales encargadas del cierre de actas de vecindad para esta semana dan cierre a 30 actas.

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 13 de Julio de 2023, El contratista continúa con jornadas de hidratación al personal de obra, así como también con la realización de pausas activas y charlas de seguridad enfocadas a la prevención de accidentes laborarles durante el desarrollo de actividades de obra.
* El día 18 de Julio de 2023, Durante actividad de re proceso en conformación y céreo BEE-38 con adición de cemento, se recomienda al contratista que el personal use los elementos de protección personal para prevenir lesiones durante el desarrollo de sus funciones.
* El día 18 de Julio de 2023, Se realizo seguimiento a instalación de señalización informativa, preventiva y reglamentaria en área de ingreso a campamento y acopio de material , se evidencia que a la fecha el contratista no ha realizado la instalación de dicha señalización por lo tanto se proyecta Apremio N°1 puesto que anteriormente se ha realizado este requerimiento mediante comunicados Putumayo04-3246-23 y Putumayo04-3388-23.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervisión de Actividades programadas por el contratista. (VSFM - FRENTE MALLAMA, RUTA 1002)
* Seguimiento y control para verificar cumplimiento al cronograma de ESTUDIOS Y DISEÑOS del Primer kilómetro K7+103 al K8+103..
* Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el Contratista e INVIAS.
* Seguimiento a las actividades ambientales contempladas en el PMA.
* Seguimiento a las medidas ambientales que se ejecutan en el Municipio de Mallama.
* Seguimiento ambiental a actividades mantenimiento sector 1.
* Continuar con la excavación de los caisson del puente 9A en los ejes No.1, No.2 y No.3.
* Continuar con la excavación, armado de acero y fundida de los caisson, zarpas y vástagos del Muro No.1 en los módulos 2, 3, 4 y 5.
* Continuar con las actividades de perforación para instalación de instrumentación de monitoreo en el talud del K6+800 margen derecha. Toma de lecturas de los inclinó metros y piezómetros ya instalados.
* Continuar con las construcción de las obras de protección de los puentes San Francisco y San Pedro sobre la vía nacional 1003 (Construcción de gaviones).
* Se tiene programada la reunión de seguimiento semanal con participación del INVIAS, Contratista e Interventoría para el 26 de julio de 2023.
* Revisión de la respuesta de los requerimientos del Acta 994 de 2022 en mesas de trabajo con el contratista.
* Revisión de la reliquidación de la inversión forzosa no menor al 1% en atención al acta 994 de 2022.
* Remisión del ICA 15 a la SS INVIAS para radicación ante ANLA.
* Actividades de cierre del predio del PR5+600 donde se evacuo el acopio temporal de material de fresado.
* Continuar con las actividades de adecuación de vía alterna para ingreso a la ZODME Tamabioy.
* Continúan las actividades preliminares de adecuación de la ZODME Tamabioy.
* Mesa de trabajo conjunta con los SIG de interventoría y contratista para ajustar y concertar las GDB,s de los ICAS 16 a 19.
* Desde el área social del proyecto se realizará la reprogramación de talleres con la comunidad.
* Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se continuara con el seguimiento de condiciones de seguridad de actividades de alto riesgo en sector 1 y 2 san francisco y actividades en sector Mallama. Así mismo continuara con la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la diferente normativa aplicable a las actividades de obra.
* Continuar con la revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que ingresa al consorcio San Francisco.
* Culminación de atención a observaciones y revisión de las mismas por parte de interventoría Puente No.6 superestructura, No.11, No.12ª y No.12b. De ser el caso se emitirán aprobaciones para inicio de construcción inmediata.
* Mesa de trabajo a atención observaciones de Interventoría en Diseño Geométrico completo del sector No.1 y aprobación del mismo y jornadas de campo, debido a que es una longitud ya construida previamente y con puntos fijos que no se deben modificar.
* Reiterar al INVIAS solicitud de información de predios con gestiones pendientes.
* Revisión de la sábana predial actual
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 48+953 sobre el carril izquierdo hacia menores.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 48+727 sobre el carril derecho hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho desde el PR 46+750 hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo desde el PR 48+110 hacia menores.
* Instalación y céreo de base granular carril derecho desde el PR 46+750 hacia menores.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


VSFM

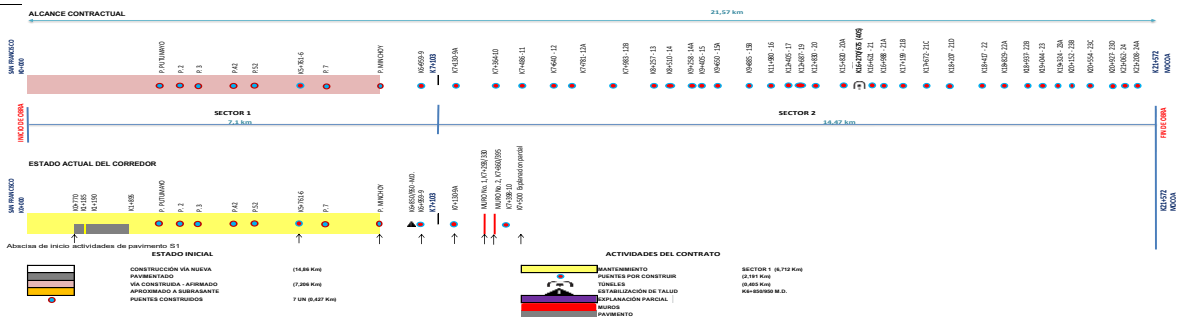

SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

RUTA No. 1002

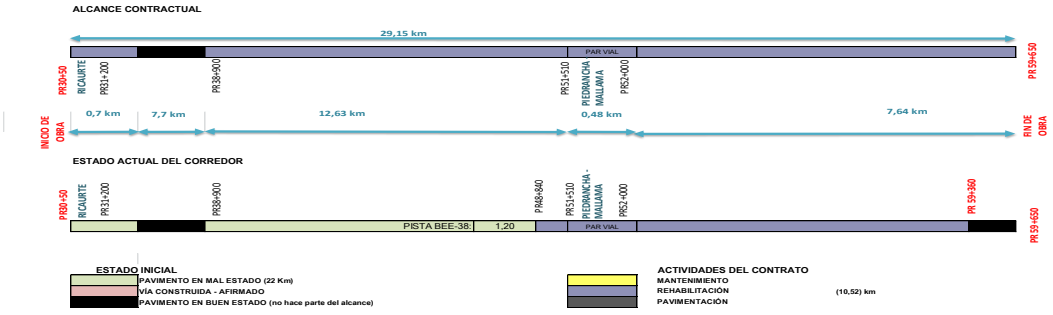

SECTOR MALLAMA - RICAURTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de Pavimento en Concreto Hidráulico entre el K 1+805 - K 1+850 carril derecho. VSFM-S1.



Instalación de apoyos temporales para puente No. 9. VSFM-S1.



Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 48+953 al PR 49+076 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se están emitiendo comunicaciones al contratista encaminadas a recordar las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	
Se realizan mesas de trabajo semanales, con los especialistas del Contratista e Interventoría, con el fin de avanzar de manera ágil en el tema de los estudios y diseños.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: LUIS JOSÉ ORDOÑEZ SALCEDO
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.6, No. 8, No.9, 9A, 10, Muro 1, Muro 2, Pavimento MR45 sector 1, primer Kilómetro del sector 2 y Ruta 1002.	Matrícula Profesional No.: 25202-09493 CUN.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 108 del 20/07/2023 al 26/07/2023 | Último Informe Semanal: NO ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales Diaz

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUIR 14,86 Km de vía, 33 PUENTES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,191Km, 1 TUNEL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0,405 Km, 22 Km de Rehabilitación tramo Mallama - Ricaurte Ruta 1002.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se trata de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 6.7 kilómetros entre la abscisa K0+000 al K6+712 correspondiente al Sector 1, y faltan por construir 14,86 Km comprendidos entre el K6+712 al K21+572 que corresponden al sector 2, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Adicionalmente, se ejecuta la rehabilitación del tramo Ricaurte - Mallama sobre el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% UNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 358.428.832,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.641.571.168,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.093.180.249,31
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 36.208.220,69

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 30.528.000.000	$ 61.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 15.506.942.054		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 4.872.313.195		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 2.400.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 465.348.230	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 1.934.651.770	

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 81.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 6.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.056.000.000	$ 106.848.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.800.000.000	$ 5.400.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.548.722.164,80	8,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.227.819.121,00	4,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.320.903.043,80)	-4,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.337.997.840,00	5,58%
(Estudios y Diseños, ambiental, predial, social, IVA)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.933.619.820,09	8,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.565.816.961,00	4,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (26.367.802.859,09)	-4,32%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 238.229.282,53	0,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 961.627.790,00	0,16%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE33 de 26 de Julio de 2023
PERIODO FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $ 1.833.308.325,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra No. 23 - Mayo 2023 con Factura FE34 de 26 de Julio de 2023 con valor de $ 2.346.376.095,00 pesos Mda/Cte

Acta de obra No. 24 - Junio 2023 Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3482-23 de 07 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 66139 de 07 de Julio de 2023.

Acta de ajustes No. 22 - Abril 2023 y No. 23 - Mayo 2023, Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3557-23 de 21 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 70908 de 21 de Julio de 2023.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de julio de 2023	$ 52.933.619.820,09	8,67%	
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de julio de 2023	$ 26.565.816.961,00	4,35%	
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de julio de 2023	$ 47.548.722.164,80	8,73%	
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de julio de 2023	$ 25.227.819.121,00	4,63%	

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de Marzo de 2023	$ 19.267.477.705,00	3,16%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de marzo de 2023	$ 46.031.931.925	7,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramacion No.4 presentada en el mes de Diciembre de 2022.

* Acta Modificación de Cantidades No.04 tramitada mediante comunicado Putumayo04-2369-22 del 13/12/2022 dirigido a GGPT-INVIAS.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.029.237.516	20,89%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.562.160.382	19,92%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 111.670.817	0,23%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Abril de 2023
VALOR FACTURA: $ 546.682.870

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de Costos No. 22- Abril de 2023, Radicada ante GGPT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3337-23 del 08 de Junio de 2023, dio entrada con Número de radicado 56501 de 08 de Junio de 2023.

Acta de Costos No. 23- Mayo de 2023, Radicada ante GGO-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3508-23 del 13 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 68303 de 13 de Julio de 2023

Acta de Costos No. 24- Junio de 2023, Radicada ante DT-INVIAS con oficio No. Putumayo04-3510-23 del 14 de Julio de 2023, dio entrada con Número de radicado 68588 de 14 de Julio de 2023.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-26	$ 10.029.237.515,60	20,89%	
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	2023-07-26	$ 9.562.160.382,38	19,92%	

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Marzo 31 de 2023	$ 8.858.459.230,00	18,46%
Valor facturado acumulado	Marzo 31 de 2023	$ 7.429.032.909,79	15,48%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 358.428.832,00
Saldo $	$ 26.641.571.168,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,298
Acumulado:	0,360

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.093.180.249,31
Saldo $	$ 36.208.220,69

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/07/2023 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 8,73% — Avance o Atraso Físico %: -4,10%

Meta Física Ejecutada %: 4,63%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021 y 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,86	0,19%	0,06%	Prog					0,20%
					Ejec	0,391	0,397		0,788	0,26%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	0,32%	0,05%	Prog					0,34%
					Ejec	1,005		12,17	13,17	0,66%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RIGIDO	Km	36,86	0,34%	0,17%	Prog					0,39%
					Ejec	0,668		10,52	11,18	1,04%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	5,60%	2,90%	Prog					6,90%
					Ejec					0,17%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Km	36,86			Prog					
					Ejec					
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,11%		Prog					0,11%
					Ejec					0,18%
TRANSPORTES	Km	14,86	0,16%	0,05%	Prog					0,17%
					Ejec					0,39%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 1 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		1
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2	1	
Finisher	1	1	
Carrotanque	-	1	1
Carrotanque irrigador	-	1	
Recicladora	-	2	
Camioneta	-	1	3
Minicargador	-		
Motoniveladoras:	2	3	1
Retrocargadores:	-	1	2
Cargador frontal	-		1
Vibrocompactadores:	2	3	2
Volquetas:	10	2	8
Dumper	-		1
Mixer:	-		3
Buldozer:	-		1
Camion Turbo	-	1	1
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-	1	2
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		7
Equipo de oxicorte	-		
Mezcladora	-		5
Compresor	-	1	5
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR	-		1
Cortadora de disco (para pavimento)	-	1	
Planchon Grua	-		1
Tractomula (Emulsión asfaltica)		1	
Motosierra	-		1
Equipo Topografia	-	1	1
Total	43	21	54

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103
TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825
TRAMO Y/O SECTOR 3: MALLAMA RICAURTE PR38+800 - PR59+600

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO			
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Autorizacion Temporal N° 502337 y N°502329	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X			

OBSERVACIONES:
Nombre de la fuente, lugar, nombre propietario, Volumen.
Autorización temporal No. 502337, San Francisco, Consorcio CM PUTUMAYO, 20.000 M3.
Autorización temporal No. 502329, San Pedro Colon. Consorcio CM PUTUMAYO, 50.000 M3.
FTUMAIJAY Materiales de rio Putumayo y San Francisco, San Francisco- Sibundoy, Resolución No. 287 de 2020.
CHORLAVY, San Francisco, Juan Carlos Paredes Benavides.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:
Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Durante este periodo se realiza seguimiento a la implementación de los programas y fichas del PAGA Versión 4.
Continúan los tramites de donación de material de fresado con la Alcaldía municipal de Mallama Piedra Ancha.
Continúa tramite de obtención del acto administrativo que otorga captación de aguas en el Río Guabo.

OBSERVACIONES:
De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades preliminares de adecuación de la ZODME Tamabioy.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	339	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	295	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	44	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	277	17

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 368

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:
El proyecto cuenta puntos satélites (buzones sugerencia) en la Alcaldía Mallama.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	38
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:
Se ha venido adelantando la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

* Seguimiento al consumo de combustible para toda la maquinaria y equipos, al igual que se hizo la revisión del inventario de equipos y electrodomésticos de los frentes de obra y oficinas.
* Revisión de informe de sostenibilidad de junio de 2023 por parte de la interventoría.
* En revisión informes mensuales de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, a los cuales se realizaron observaciones por parte de la interventoría.
* En proceso de consolidación de informes trimestrales pendientes.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-3548-23 del 19/07/2023 dirigido a la GGO - INVIAS con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 107 Variante San Francisco – Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 107, correspondientes al periodo entre el 13 de julio al 19 de julio de 2023, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-3553-23 del 21/07/2023 dirigido a DT - INVIAS con asunto: Respuesta a comunicado DTPUT 40422 con radicado interno 04-3037-23 con asunto: "Respuesta a entrada 68154 con fecha 13/07/2023". En atención al comunicado DTPUT 40422 de fecha 14 de julio de 2023, que dio respuesta al comunicado Putumayo04-3499-23 de fecha 13 de julio de 2023, donde la Interventoría solicitó el ingreso de un personal para el frente de obra de San Francisco, solicitamos tener en cuenta las condiciones observadas durante la visita de campo realizada entre Contratista, Interventoría e INVIAS el día 19 de julio de 2023, donde se pudo corroborar que se tienen frentes de obra activos de acuerdo a la relación presentada por la interventoría para cada sector, S1, S2 y Mallama.

Mediante comunicado Putumayo04-3556-23 del 21/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Solicitud presentación de documentos para la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE). En atención a las solicitudes realizadas por los funcionarios de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) en reunión del día miércoles 19/07/2023, se requiere al contratista entregar en la estructura de datos del ministerio las actividades realizadas. En el Dataset de contingencias crear una capa en la cual se indiquen las zonas en las cuales se han presentado las contingencias, y en el dataset de proyecto presentar las actividades realizadas y proyectadas para atender cada una de las contingencias. Igualmente remitir un documento con la información de los reportes presentados en la plataforma VITAL para cada una de las contingencias. Esta información se debe remitir a la interventoría a más tardar el día lunes 31/07/2023.

Mediante comunicado Putumayo04-3557-23 del 21/07/2023 dirigido a la GGO - INVIAS con asunto: Acta de ajuste Definitiva No 22 y No.23 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa. Por medio de la presente nos permitimos remitir las Actas de Ajuste Definitivas No. 22 y No.23 del Cto. 1111 de 2021, correspondientes a los meses de Abril y Mayo de 2023 respectivamente, debidamente firmadas por el Director Territorial Putumayo.

Mediante comunicado Putumayo04-3560-23 del 21/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Respuesta su oficio SS 37888 recibo interno 04-3057-2023 del 18/07/2023 con asunto; Respuesta a Entrada No. 59238 con Fecha 16 de junio de 2023. Remisión GDB,s ICAS No 4 y 5 Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco. Por medio de la presente se informa: 1. las observaciones de ANLA, 2. Criterios de aprobación de la GDB por parte de la Interventoría, 3. No se modificaron los documentos del ICA puesto que la ANLA no efectuó ningún requerimiento.

Mediante comunicado Putumayo04-3561-23 del 21/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta comunicación CSF-838-115311 con asunto: Hechos presentados Julio 18 de 2023 en Mallama (04-3067-23M1 20230719). Dando respuesta a los hechos manifestados en la comunicación del asunto, es preciso indicar que efectivamente se deben tomar correctivos del caso por las buenas relaciones que deben existir y por normal desarrollo del proyecto; No obstante, frente a lo manifestado se da claridad, para evitar especulaciones que generan ambientes tensos entre las partes.

Mediante comunicado Putumayo04-3562-23 del 21/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta comunicación CSF-803-114954 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-3442-23 por SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA. (04-2986-23M1 2023-07-04). Una vez realizada la revisión del formato presentado, y teniendo en cuenta que se dio alcance a las observaciones y ajustes solicitados por interventoría, se emite concepto de APROBACIÓN del documento denominado REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA, para lo cual se remite el formato en su versión No. 2 debidamente firmado por el RL de Consorcio Reactivación Putumayo.

Mediante comunicado Putumayo04-3565-23 del 24/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-806-114958 (04-2989-23) con asunto: Entrega de informe SST - Vigencia junio de 2023. Mediante el presente el Consorcio Reactivación Putumayo se permite realizar observaciones al informe de junio radicado mediante comunicado CSF-806-114958 para que sean atendidas por el contratista.

Mediante comunicado Putumayo04-3576-23 del 24/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Respuesta a sus oficios SS 32595 recibo interno 04-2888-2023 del 09/07/2023 con asunto; Remisión Respuesta al comunicado CSF-VSF-FSF-S2-IA DOC-IF-CM-007-010-3 radicado ANLA 20236200029792 del 24 de abril de 2023 y Oficio SS 34050 recibo interno 04-2935-2023 del 23/07/2023 con asunto; Respuesta a Entrada No. 55309 con Fecha 5 de junio de 2023. Radicado 20234700111921 de 2023-05-31. Rta radicación cambio menor 20236200029792. En atención a la información remitida en los oficios SS 32595 y SS 34050 mediante la presente nos permitimos remitir los documentos técnico ambiental y cartográfico atendiendo a la sugerencia de ANLA en su oficio 20234700111921 del 31/05/2023, se optó teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.6.1.7. Trámite de las modificaciones menores o ajustes normales. PARÁGRAFO 1. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un proyecto específico de infraestructura sujeto a licencia ambiental o plan de manejo ambiental el titular considere que una actividad puede ser un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad este deberá solicitarle a la autoridad ambiental competente el respectivo pronunciamiento conforme al procedimiento señalado para el otorgamiento de licencias ambientales la norma que lo modifique o sustituya. Para el efecto la autoridad ambiental se pronunciará mediante oficio. Por consiguiente se solicita pronunciamiento respecto si el desplazamiento del eje de la vía dentro de la franja ambiental entre el K7+100 al K8+100 corresponde a un ajuste normal dentro del giro ordinario o a un cambio menor, en este orden de ideas se solicita a la entidad tramitar la liquidación para el pago de la consulta ante la autoridad ambiental ANLA para que el contratista realice los respectivos trámites de pago.

Mediante comunicado Putumayo04-3577-23 del 24/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta su comunicado CSF-843-115351 con recibido 04-3076-23M1 con asunto "Respuesta al comunicado Putumayo04-3518-23 / Remisión de precios unitarios no previstos". Respecto al comunicado del asunto, la Interventoría se permite aclarar que las afirmaciones expuestas por el Contratista no corresponden a la realidad, toda vez que nunca se ha negado el reconocimiento de las actividades ejecutadas por el Consorcio San Francisco y que cumplen con la calidad establecida en la normatividad vigente y documentos técnicos del Contrato de obra. Se informa que se citará a reunión para tratar estas diferencias de interpretación con participación del Invias. Respecto a la notificación de suspensión unilateral por ustedes informada, esta será trasladada al Invias con copia del comunicado del asunto para fines pertinentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26/07/2023
	(Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-3579-23 del 24/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicación CSF-842-115350 con radicado interno 04-3075-23M1 con asunto: "Aplicación de procedimiento contractual para la ejecución de obras complementarias". Dando respuesta al oficio del asunto, donde el Contratista hace referencia a la aprobación de APUS no previstos, y solicita dar aplicación a lo establecido en el numeral 13.15 del Apéndice técnico 1 adenda 2, con lo cual argumenta la suspensión de las obras que "no tengan convenida su compensación económica"; nos permitimos manifestar lo pertinente.

Mediante comunicado Putumayo04-3581-23 del 25/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta comunicación CSF-840-115339 con asunto: Normalizar el flujo de recursos para restablecer ejecución en el corto plazo (04-3074-23M1 20230721). Mediante la presente acusamos recibo de su comunicación y frente a los hechos que se manifiestan, la interventoría Consorcio Reactivación Putumayo se permite dar claridad al respecto.

Mediante comunicado Putumayo04-3582-23 del 25/07/2023 dirigido al Contratista con asunto: Respuesta a comunicado CSF-845-115369 (04-3079-23M1) con asunto Radicación Desembolso N°15. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y en relación al comunicado del asunto, se permite informar que una vez se ha revisado la solicitud de desembolso de anticipo No. 15 y soportes, se determina que los documentos presentados son acordes y por lo tanto se da aprobación para continuar con el trámite respectivo.

Mediante comunicado Putumayo04-3583-23 del 25/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Reporte Atención Contingencia Talud K7+100 a K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco. Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 25/07/2023 se remitió al Gestor de la SS INVIAS el formato Único para el Reporte de Atención Contingencia Talud K7+500 a K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco mientras surte el proceso de correspondencia, teniendo en cuenta el plazo establecido (24 horas) en cumplimiento al artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016, mediante la presente nos permitimos remitir los documentos del Reporte de Atención Contingencia Talud K7+100 a K7+250 para que esta sea radicada a través de VITAL de la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-3586-23 del 25/07/2023 dirigido a la GGO - INVIAS con asunto: Remisión copia comunicado CSF-843-115351, Notificación del Consorcio San Francisco de Suspensión Unilateral de actividades representativas de Obra. Con la presente remitimos copia del comunicado CSF-843-115351 con recibido 04-3076-23M1 del 24-07-2023, donde el Consorcio San Francisco manifiesta su inconformidad por el no cambio de 2 Apus contractuales por nuevos Apus y estar en trámite un 3er Apu que si es no previsto. Por tanto el Consorcio Contratista de Obra Informa dentro del comunicado del asunto la suspensión Unilateral de actividades del Puente No.6 que a su vez está en ruta crítica de ejecución y en seguimiento de la Contraloría. Adicional a lo anterior se anexa copia del comunicado Putumayo04-3577-23 como respuesta al oficio del asunto, donde se le invita a la parte Contratista a participar en reunión para tratar estas diferencias de interpretación con participación del INVIAS.

Mediante comunicado Putumayo04-3591-23 del 26/07/2023 dirigido a la DT - INVIAS con asunto: Respuesta comunicación DT-PUT-42533 (04-3082-23) con asunto: Respuesta a Entrada No. 70030 con fecha 19/07/2023. Recibida la comunicación de asunto, en virtud de los hechos manifestados el día 18 de julio de 2023 por parte del contratista de obra, la Interventoría Consorcio Reactivación Putumayo se permite dar claridad sobre lo manifestado.

Mediante comunicado Putumayo04-3592-23 del 25/07/2023 dirigido a la SS - INVIAS con asunto: Remite el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social del mes de Julio 2023. Por medio de la presente, nos permitimos remitir para su revisión y concepto de no objeción, el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Acta de Inversión social del mes de julio 2023 del Contrato de obra No. 1111 de 2021 con sus respectivos anexos, la cual se encuentra aprobada por la Interventoría, toda vez que las actividades y valores registrados corresponden a los aprobados en el Plan de Inversión Social Versión 3.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

* El día 19 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra en acompañamiento con la veeduría ciudadana para verificar los avances de obra y la implementación de las acciones ambientales establecidas en los programas y fichas del PMA, del K0+600 hasta en el K7+400 Sector 1 y 2 de la Variante San Francisco – Mocoa.

* El 19 de Julio 2023, se desarrolló la reunión de seguimiento con la veeduría ciudadana, donde se visitó los frentes de obra, posteriormente la socialización de los avances en de las áreas técnica, social y ambiental. Por parte de los participantes se resalta el avance que se tiene en los diferentes frentes de obra, y solicitan el apoyo para una reunión citada por la contraloría en el frente Mocoa de participación ciudadana.

* El día 19 de julio de 2023 se realizó socialización de los avances de gestión ambiental del proyecto a la veeduría ciudadana.

* El día 21 de julio de 2023, se realizó el seguimiento las actividades de fundida de pavimento en el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, entre el K 1+925 - K 1+970 por el carril derecho.

* El día 21 de julio de 2023 se realizó acompañamiento al contratista a visita a predio en el Municipio de Sibundoy en el barrio el cedro sobre la vía nacional donde se tramita un Gestor RCD.

* El día 21 de julio de 2023 se realizó recorrido a la Zona Industrial San Carlos para verificar cerramiento perimetral, adecuación de la caseta de acopio temporal de residuos sólidos, verificación del sistema de manejo de residuos líquidos domésticos, adecuación del área de planta dosificadora de concreto, seguimiento limpieza del material de arrastre acopiado y adecuación de las áreas de taller.

* El 21 de Julio de 2023, se realizó visita al gobernador del cabildo de Sibundoy con el fin de conocer los resultados de la reunión interna con la comunidad para el tema del ZODME Tamabioy, y requerir la continuidad a las actividades que se iniciaron en el predio del ZODME esto con el fin de atender las solicitudes escritas de los propietarios.

* El día 21 de julio de 2023, se realizo reunión conjunta entre residente de geotecnia de interventoría y residente de Geotecnia de obra para revisar acta de corte con respecto al ítem de exploración geotécnica. Se concretó revisión de Ensayos de laboratorio de sondeos.

* El día 22 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de los APUS de rescate y reubicación de especies en VEDA.

* El día 24 de julio de 2023 se remitió a la SS INVIAS el trámite de cambio menor de desplazamiento del eje del tramo del K7+100 a K8+100 en atención a lo solicitado por la ANLA.

* El día 24 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo jornada completa, con especialista ambiental de interventoría y contratista para revisión de las Obligaciones de la licencia ambiental y los 22 Actos administrativos para el trámite de cesión de licencia ambiental.

* El día 24 de julio de 2023, se realizo reunión conjunta entre residente de geotecnia de interventoría y residente de Geotecnia de obra para continuar la revisión de acta de corte con respecto al ítem de exploración geotécnica. Se concretó revisión de Ensayos de laboratorio de material de apiques.

* El día 25 de julio de 2023, se realizó el seguimiento al avance de los trabajos en el sector 1 y 2, verificando las actividades de construcción de la vía de acceso en el K7+500, caisson del muro No.2, Excavaciones de caisson en puente 9A, armado de obra falsa en el puente 9, excavaciones y armado de acero y fundida de caisson del Muro No.1, excavaciones de caisson en apoyo intermedio de puente 6.

* El día 25 de julio de 2023 se realizó mesa de trabajo jornada completa con los especialistas ambientales del contratista e interventoría para la revisión, ajuste de las obligaciones y requerimientos para el trámite de cesión de sustracción de reserva forestal ante la Dirección de Bosques, biodiversidad y servicios eco sistémicos (DBBSE), al igual que se realiza la revisión y ajustes de las respuestas del Acta de seguimiento 994 de 2022 para radicarse ante la ANLA.

* Reuniones entre pares de Geotecnia con participación remota de especialistas para determinar fronteras de suelo y Roca en exploración para temas de pago dentro de acta Parcial No.25 que corresponde al mes de Julio de 2023.

* El día 26 de julio del 2023 se realizó recorrido de revisión de excavaciones y taludes en el corredor de obra.

* El día 26 de julio de 2023, se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal No. 68 al Contrato de obra, con la participación de INVIAS, Contratista e Interventoría, donde se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y avance del proyecto. Los compromisos adquiridos con su respectiva fecha de cumplimiento se presentan a continuación:

1. Entrega de plan de intervención de sitios a corregir en tramo 1 del pavimento de Mallama. --- 27/07/2023.
2. Mesa de trabajo - obras ejecutadas a la fecha en el frente Mallama - Ricaurte. --- 27/07/2023.
3. Informe de lo ejecutado a la fecha en el frente Mallama - Ricaurte. --- 3/08/2023.
4. Reunión APUs no previstos con participación de Invias a las 8 am. --- 1/08/2023.
5. Informe de las lecturas de los instrumentos de monitoreo del talud del K 6+800 M.D. --- Apartir del proximo comite, semanalmente.
6. Reunión para reprogramación de Plan de Contingencia y Programa de Obra del Contrato 1111-2021. --- 1/08/2023.

FRENTE SAN FRANCISCO:

AREA TÉCNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Pavimento sector 1: Se continúa con la instalación de pavimento en concreto hidráulico en este sector, desde el K 1+850 al K 2+110 margen derecha, en este momento se tiene losas fundidas entre el K 0+770 al K 2+110 por el carril derecho (existe un salto desde el K1+185 al K1+190). Se avanza con la extensión de material de mejoramiento de la subrasante, al momento se tiene dicho mejoramiento desde el K 0+770 al K 3+250 por margen derecha y subbase desde el K 0+770 al K 2+780 por margen derecha.
* Puente 6 - K5+761 - K5+828: El Contratista avanza con la excavación de los Caisson del apoyo intermedio con las siguientes profundidades de cada uno: No.1 = 6.63 m, No.2 = 7.72 m.
* Puente 9 - K6+959 al K7+004: A la fecha se tienen fundida la totalidad de las pilas del eje No.1 y 2 del eje No.2, es decir las pilas No.1, 2,3 y 4. El Contratista tiene fundida viga cabezal del eje No.1 y No.2 En la semana del presente informe continua la instalación de la estructura metálica de la obra falsa.
* Puente 9A (K7+130 al K7+190): El Contratista avanza con la excavación de los Caisson con las siguientes profundidades de cada uno: No.1 = 11.48 m, No.3 = 18.55 m, No.4 = 17.00 m, No.5 = 16.35 m, No.6 = 11.62 m. Continua el corte del talud derecho en el eje No.1 del puente con el fin de permitir la excavación del caisson No.2.
* Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: El contratista continúa con la instalación de acero de refuerzo para pilote sobre el caisson 5, también se realiza la demolición de los anillos falsos y excavación a nivel de fundación de zarpa en los módulos 3, 4 y 5 del muro.
* Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Se avanza con la excavación manual de los caisson No.1 = 5.69 m, No.3 = 5.63 m, No.4 = 4.07 m, el caisson No.2 logró la profundidad de diseño de 6 metros, se prepara la instalación de acero de refuerzo.
* Puente 10 (K7+398 al K7+431,84): El Contratista dio inicio a la excavación de caisson en el eje No.1 caisson No.1 = 0.60 m y No. 2 = 0,00 m, en el eje No.2 caisson No.3 = 2.19 m y No.4 = 0.00 m, se avanza con la explanación hacia mayores en el K7+500.

AREA GEOTECNICA:

*Talud del K6+800 margen derecha: A la fecha se tienen instalados 5 de un total de 6 inclinómetros y 2 de 4 piezómetros, se continua tomando lecturas a los instrumentos instalados, como parte del monitoreo de este talud. Se avanza con las perforaciones en el talud contiguo K6+900 para instalar los elementos de monitoreo restantes.
* Se continúa con las actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas: K 8+330, K 8+350, K9+426, K 9+650, K9+700, K 9+746, K 9+446, K10+000, K10+077.

AREA AMBIENTAL:

* Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista
* Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.
* Se asiste a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.
* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolucion 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el proposito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.
* Se realiza la revision de los documentos tecnicos y ambientales para el tramite de cesion de licencia ambiental y cesion de sustraccion de reserva.
* El dia 25 de julio de 2023 se presentó contingencia ambiental en los taludes del K7+100 hasta K7+200, el contratista atendió de manera oportuna y realizo el retiro del material de derrumbe hacia la ZODME Tamabioy.
* Remisión a la SS INVIAS del trámite de solicitud de pronunciamiento cambio menor por desplazamiento del eje del tramo del K7+100 a K8+100 en atención a lo solicitado por la ANLA.
* Se realizó acompañamiento a recorrido de obra y se socializo los avances de gestión ambiental a la veeduría ciudadana.
* Se avanzó en la formulación de los APUS del rescate y reubicación de las especies en VEDA.
* Se avanza en la consolidación de los documentos legales y técnicos de la Cesión de licencia ambiental ante ANLA y la DBBSE.
* Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos.

AREA SOCIAL:

* En este semana se ha recepcionado solicitudes por parte de la Alcaldia para entrega de información en cuanto a tema ZODME Tamabioy.
* Se dio atención a las reuniones solicitadas por la comunidad, y visita de seguimiento al cabildo de Sibundoy con el tema de ZODME Tamabioy.
* Se realizó acompañamiento a recorrido de obra y se socializo los avances de gestión social a la veeduría ciudadana.
* El 21 de Julio 2023, se realiza visita al gobernador del cabildo de sibundoy con el fin de conocer los resultados de la reunión interna con la comunidad para el tema del ZODME Tamabioy, y requerir la continuidad a las actividades que se iniciaron en el predio del ZODME esto con el fin de atender las solicitudes escritas de los propietarios

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.

* El día 21 de Julio de 2023, Se realizó verificación a condiciones de seguridad durante actividad de excavación para estudios de suelos, es importante que antes de iniciar labores se realice inspeccion de áreas de trabajo puesto que estás se encuentran en taludes los cuales pueden presentar deslizamientos de tierra teniendo en cuenta las fuertes lluvias presentadas durante la época de invierno.
* El día 22 de Julio de 2023, El contratista continúa con instalación de apoyos temporales en puente 9, se verìa apertura de permisos de trabajo y se reitera mantener condiciones de orden y aseo en este sector.
* El día 24 de Julio de 2023, Se verifica el uso de elementos de protección personal durante instalación de concreto hidráulico, se solicita al contratista que el personal use sus elementos de manera correcta y constante durante el desarrollo de esta actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2023 (Día / Mes / Año)

AREA PREDIAL:

* Se están generando las actividades que conllevan a adelantar la consecución de la información técnica, y jurídica de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto San Francisco – Mocoa.
* Se están ejecutando la consecución de los documentos de propiedad y la suscripción de Actas de Intervención anticipada para la disponibilidad de los primeros kilómetros.
* Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención Voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.
* Sobre los predios para inversión forzosa de no menos del 1%, se espera concepto técnico ambiental de la corporación Corpoamazonia.
* Se ha venido adelantado la identificación predial con la ayuda de juntas de acción comunal y moradores, con lo que hemos logrado establecer de manera preliminar, que entre el K7+100 al K21+600 existen 38 posibles afectaciones prediales y al momento nos encontramos verificando y actualizando dicha información.
* Se está ejecutando la actividad de elaboración de las fichas prediales correspondientes a tramo K7+500 al K10+100,"
* Se remitiran 8 fichas prediales para revisión.
* El valor de terreno de las ZHG esta entre 5 y 10 millones con mejoras.
* Se remtieron 2 fichas prediales para revisión preliminar
002ID-T2-CMMVSFM
001ID-T2-CMMVSFM
* Pasivos prediales Contrato No 407

-Radicación de expedientes para sanear pasivos
-Ficha predial y Estudio de títulos del predio denominado como 039A-SB-D mediante comunicado con Registro: CSF-574-112593, radicado Interventoría 04-2470-23M1 del 24 de marzo de 2023 frente a lo cual, Interventoría manifiesta que ya realizó la revisión y propone una mesa de trabajo para socializar observaciones respecto a los insumos.
-Minuta de la escritura pública correspondiente al predio 019SPI, lo anterior por cuanto el señor Wilson Bravo, vocero de la señora luz Clara Delgado, manifestó que requiere finiquitar este trámite de compraventa

FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo entre PR 47+300 al PR 48+110.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril derecho entre PR 46+970 al PR 48+100.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril izquierdo entre PR 48+433 al PR 48+950.
* Instalación y céreo de base granular estabilizada carril izquierdo entre el PR47+610 al PR 48+415.
* Estabilización con emulsión asfáltica entre el PR 47+510 al PR 48+415 sobre el carril izquierdo.
* Limpieza y desalojo de material sobre cunetas entre el PR 49+000 a PR 51+000 y PR 47+440 a PR 47+640, sobre el carril izquierdo.
* Levantamiento topográfico sobre carpeta Asfáltica Instalada entre el PR 48+950 al PR 51+510.
* Replanteo y Materialización de Eje, levantamiento topográfico de Eje y Bordes entre el PR 44+580 al PR 45+350.
* Control en instalación de base estabilizada BEE38 y toma de muestra para caracterización en el laboratorio, PR 47+610 al PR 47+510 Carril izquierdo.

AREA AMBIENTAL:

* Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de la fichas del PAGA V4, por parte del contratsita se adelantan las gestiones ante la alcaldia Municipal de Mallama para la donacion del material de fresado y se realizael seguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de tramite de la obtencion del acto administrativo para la consecion de aguas en el Rio Guabo.
* Se realizó reunión virtual con Alcaldía Municipal de Mallama Piedra Ancha para atender las peticiones por parte del Señor Alcalde en cuanto al trámite de donación de material de fresado a las comunidades organizadas para el arreglo de los caminos rurales.

AREA SOCIAL:

* En este semana no se recepciona solicitudes de la comunidad
* Los profesionales encargadas del cierre de actas de vecindad para esta semana cerraron 78 actas.

AREA SST:

Desde el área SST se continúa con la revisión previa de certificados de afiliaciones de seguridad social del personal de contratista que ingresara durante el periodo.


* El día 21 de Julio de 2023, Se realizó verificación de uso de elementos de protección personal durante actividad de confirmación y cereo de BEE, se recuerda al contratista realizar inspección constante a estos elementos y de esta manera llevar a cabo una oportuna reposición de los mismos.
* El día 22 de Julio de 2023, Se continúa verificando instalación de señalización en puntos de control de tráfico, se solicita al contratista reforzar demarcación de áreas de trabajo con dispositivos de canalización como lo son los delineadores tubulares compuestos de acuerdo al manual de señalización vial.
* El día 24 de Julio de 2023, Se recuerda al contratista la realización de los preoperacionales a los vehículos y maquinaria en obra, los cuales son diarios, esto con el fin de identificar fallas y prevenir accidentes con el personal durante actividades de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Supervisión de Actividades programadas por el contratista. (VSFM - FRENTE MALLAMA, RUTA 1002)
* Seguimiento y control para verificar cumplimiento al cronograma de ESTUDIOS Y DISEÑOS del Primer kilómetro K7+103 al K8+103..
* Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el Contratista e INVIAS.
* Seguimiento a las actividades ambientales contempladas en el PMA.
* Seguimiento a las medidas ambientales que se ejecutan en el Municipio de Mallama.
* Seguimiento ambiental a actividades mantenimiento sector 1.
* Continuar con la excavación de los caisson del puente 9A en los ejes No.1, No.2 y No.3.
* Continuar con la excavación, armado de acero y fundida de los caisson, zarpas y vástagos del Muro No.1 en los módulos 2, 3, 4 y 5.
* Continuar con las actividades de perforación para instalación de instrumentación de monitoreo en el talud del K6+800 y K6+900 margen derecha. Toma de lecturas de los inclinó metros y piezómetros ya instalados.
* Continuar con las construcción de las obras de protección de los puentes San Francisco y San Pedro sobre la vía nacional 1003 (Construcción de gaviones).
* Se tiene programada la reunión de seguimiento semanal con participacion del INVIAS, Contratista e Interventoria para el 2 de agosto de 2023.
* Continuar con la excavación de los caisson del Muro No.2 en los módulos No.1 y No.2.
* Remisión de la respuesta de los requerimientos del Acta 994 de 2022 a la SS INVIAS para radicación ante la ANLA.
* Revisión de la reliquidación de la inversión forzosa no menor al 1% en atención al acta 994 de 2022.
* Mesas de trabajo conjuntas con los profesionales SIG de contratista e interventoria para la revisión de las GDB,s de los ICAS 16 a 19.
* Remisión de los documentos legales, técnicos y ambientales de la cesión parcial de licencia ambiental a la SS INVIAS.
* Continuar con las actividades de seguimiento de la implementación de las medidas ambientales en el frente de obra y Zona Industrial San Carlos.
* Mesa de trabajo conjunta con los especialistas ambientales de interventoria y contratista para concertar los APUS de veda.
* Culminación de atención a observaciones y revisión de las mismas por parte de interventoría Puente No.6 superestructura, No.11, No.12ª y No.12b. De ser el caso se emitirán aprobaciones para inicio de construcción inmediata.
* Mesa de trabajo a atención observaciones de Interventoría en cierre de Diseños del Sector No.1 en construcción de Pavimento.
* En el área social, reprogramación de talleres con las comunidad
* En el área social, capacitación al Personal de obra.
* Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se continuara con el seguimiento de condiciones de seguridad de actividades de alto riesgo en sector 1 y 2 san francisco y actividades en sector Mallama. Así mismo continuara con la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la diferente normativa aplicable a las actividades de obra.
* Continuar con la revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que ingresa al consorcio San Francisco.
* Revisión de la sábana predial actual
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 48+953 sobre el carril izquierdo hacia menores.
* Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 desde el PR 48+727 sobre el carril derecho hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho desde el PR 46+750 hacia menores.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril izquierdo desde el PR 47+300 hacia menores.
* Instalación y céreo de base granular carril derecho desde el PR 46+750 hacia menores.
* Instalación y céreo de base granular carril izquierdo desde el PR 47+610 hacia menores.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

VSFM

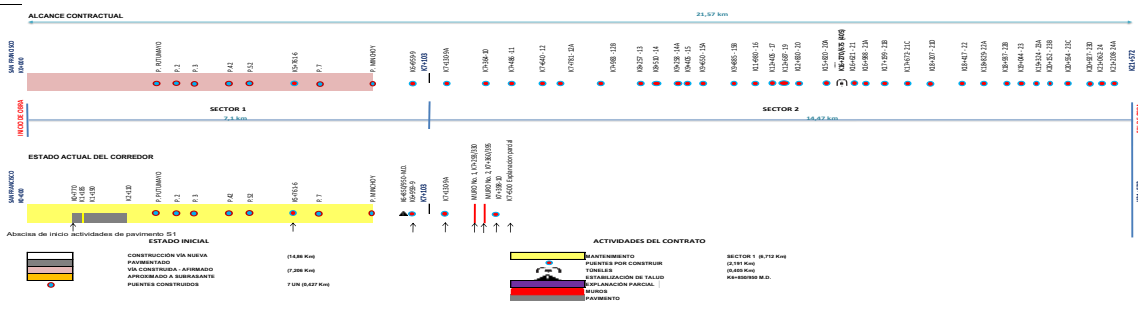


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2023 (Día / Mes / Año)

RUTA No. 1002

ALCANCE CONTRACTUAL

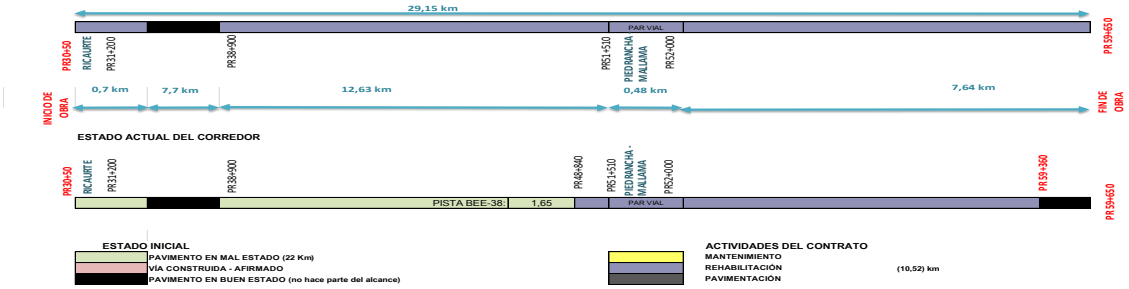

ESTADO INICIAL

- PAVIMENTO EN MAL ESTADO (22 Km)
- VÍA CONSTRUIDA - AFIRMADO
- PAVIMENTO EN BUEN ESTADO (no hace parte del alcance)

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

- MANTENIMIENTO
- REHABILITACIÓN (10,52) km
- PAVIMENTACIÓN

SECTOR MALLAMA - RICAURTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de Pavimento en Concreto Hidráulico entre el K 1+970 - K 2+015 carril derecho. VSFM-S1.



Instalación de apoyos temporales para puente No. 9. VSFM-S1.



Fresado de carpeta asfáltica existente entre el PR 47+300 al PR 48+110 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se están emitiendo comunicaciones al contratista encaminadas a recordar las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	
Se realizan mesas de trabajo semanales, con los especialistas del Contratista e Interventoría, con el fin de avanzar de manera ágil en el tema de los estudios y diseños.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: LUIS JOSÉ ORDOÑEZ SALCEDO
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.6, No.9, 9A, 10, Muro 1, Muro 2, Pavimento MR45 sector 1, primer Kilómetro del sector 2 y Ruta 1002.	Matrícula Profesional No.: 25202-09493 CUN.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30 / 7 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: julio - 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DIAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
CAMION CHEVROLET	CHEVROLET	NKR	T-VLC-433	XMC-433	3000 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	R	R		
CAMION GRUA	CHEVROLET	KODIAK 241	T-CGC-678	XMD-678	3 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061	5 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437	5 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	T-VLT-060	HHT-060	5 PSJ	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
COMPRESOR	ATLAS COPCO	XAT350CU T2	C-CTA-378	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
COMPRESOR	COMPAIR	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806	16500 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547	16500 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VCK-509	SPT509	16500 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848	16500 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555	16500 Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
GENERADOR	CPG	C12D6 15KVA	T-PEC-000	N/A	12 KW	San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163	16500Kg	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MS-EMTC19	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
VOLQUETA ARTICULADA	JCB	714	C-MDJ-436	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Excavadora	KOBELCO	SK210LC	A-EOK-234	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A		
Excavadora	CATERPILLAR	320 C	A-EOC-431	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A																							
Excavadora	KOBELCO	SK210LC-8	A-REK-531	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A						
Excavadora	CATERPILLAR	330D2L	A-EOC-051	N/A		San Francisco										A	A	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A		
Retrocargador	CATERPILLAR	420 F	A-REC-872	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Retrocargador	CATERPILLAR	416 E	A-REC-163	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Retrocargador	CATERPILLAR	420	A-REC-285	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Vibrocompactador	CATERPILLAR	CS10GC	A-VCC-213	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Motoniveladora	KOMATSU		A-MNK-582	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Carrotanque Agua	INTERNATIONAL		A-CTI-263	VXJ-263		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Mixer	MACK	GRANITE	A-CMM-830	UFJ-830	2 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	R	R	R	R		
Mixer	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	A-CMI-475	SLK-475	2 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
V.Dobletroque	CHEVROLET	BT221	A-VDC-913	TKE-913	2 PSJ	San Francisco	A	I	A	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Compresor	INGERSOLL RAND	D	A-CTI-703	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	R	R	R	R	R	R		
Compresor	INGERSOLL RAND	185 IR	A-CTI-234	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Compresor	ATLAS COPCO	XA598KDSQE	A-CTA-197	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A		
Bomba de concreto	PUTZMEISTER	TK 40	A-BCP-388	N/A		San Francisco																															
						TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	34	33	33	0	0		
						TOTAL ACTIVO	31	0	30	31	31	31	29	29	15	29	29	28	30	29	28	4	30	29	29	14	30	28	1	28	28	26	27	26	26	0	0		
						TOTAL EN REPARACIÓN	2	2	2	2	2	2	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	3	1	2	3	2	3	3	4	4	5	5	0	0		
						TOTAL INACTIVO	2	33	3	2	2	2	2	3	17	3	3	3	3	3	4	29	3	3	3	20	3	4	32	4	4	4	3	2	2	0	0		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	73%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	3	9%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	6	18%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA 30 7 2023
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPUESTO EN FRENTE DE OBRA SAN FRANCISCO.

Los días 2,3,9,16,20,23 y 30 de julio donde los equipos están marcados con la letra I (inactivos) son los equipos que no laboraron porque no hubo programación de trabajo.

El equipo E-BOC-396 el día 15 de julio estuvo I (inactivo) ya que no tuvo operador.

El equipo C-CTA-378 Compresor atlas Copco desde el día 20 hasta el 29 de junio se encuentra marcado con la letra R (reparación) ya que es un equipo que se está esperando el cambio de equipo por garantía por parte de proveedor.

El equipo A-VDK-312 desde el día 8 hasta el 30 de julio se encuentra I (inactivo) ya que sufrió siniestro de volcamiento al descargar el viaje de material.

El equipo A-VDK-547 el día 7 se encuentra en R (reparación) por mantenimiento preventivo y los días 18 y19 de julio por fuga de aire en válvula relay

El equipo T-VCH-12C los días 14 y 15 estuvo en R(reparación) en taller por limpieza de tanque y líneas de combustible.

Planta eléctrica T-PEC-000 se encuentra marcada con la letra R (reparación) desde el día 20 al 29 de junio presentando un problema de bajo amperaje y bajo voltaje en el generador.

Volqueta articulada C-MDJ-436 se encuentra marcada con la letra R (reparación) desde el 1 de julio hasta el 29 de julio debido a que presenta un problema de servotransmisión.

El equipo A-EOK-234 el día 10 estuvo en R(reparación) por mantenimiento preventivo y el día 22 por extracción de tornillos en tren de rodaje.

El equipo A-EOC-431 el día 10 sale del proyecto

El equipo A-REK-531 el día 12 estuvo en R(reparación) por daño en el tren de translación

Camioneta T-VLT-060 está en I (inactiva) desde el dia 1 hasta el 28 de julio, está en espera para a ser retirada del proyecto.

El equipo A-CTI-263 los días 8, 9 y 10 estuvo en R(reparación) por daño en cardan de diferencial.

El equipo XMC-433 los días 28 y 29 se encuentra en R(reparación) por daño en la rosca en pernos de rueda delantera

El equipo A-EOC-051 ingreso al proyecto el día 10 de julio, el día 12 estuvo en R(reparación) por mantenimiento preventivo y del 22 al 26 de julio estuvo I(inactiva) sin operador.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: GERMAN GUERRERO ACOSTA
Lider de Integración.
Matricula Profesional No. 5220281016NRÑ

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30 / 7 / ### (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: julio - 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Camioneta	Chevrolet	5 personas	Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Carro tanque irrigador	International	10000 LT	Mallama	A			A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	I	A	A	A			A	A	A	A	A		
Recicladora de Pavimento 1	Cat RR250		Mallama	R			A	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			I	A	A	A	R		
Recicladora de Pavimento 2	Cat RR250		Mallama	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	I	I	A	R		
Motoniveladora 1	Cat 120 H		Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Motoniveladora	Cat 120 H		Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	I	A	A		
Carro tanque agua	Chevrolet	10000 LT	Mallama	A			A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Compactador neomatico	Cat PS150c		Mallama	A			A	A	A	I	I		I	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
Compatador doble rodillo	Cat CB 335I		Mallama	A			A	A	A	I	I		I	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
Finisheir	Cat 1000B		Mallama	A			A	A	A	I	I		I	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
Vibro Compactador 2	Dynapac 124		Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	R	R	R	R		R	R	R	R	R			R	R	R	I	A		
Vibro Compactador	Caterpillar		Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Retrocargador	Cat 416	64 Kw	Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Camión Turbo	Chevrolet TAN 038		Mallama	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
Planta Luminaria	Kasser		Mallama	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
Compresor	Kaeser		Mallama	A			A	A	A	I	I		A	A	A	A	I	I		A	A	A	I	I			R	R	R	R	R		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				16	0	0	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	0	0
TOTAL ACTIVO				14	0	0	15	15	14	9	8	0	11	15	14	14	10	10	0	11	10	11	10	10	0	0	9	9	8	10	9	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	2	2	2	1	3	0	0
TOTAL INACTIVO				1	0	0	1	1	2	7	8	0	5	1	1	1	5	5	0	4	5	4	5	5	0	0	5	5	6	5	4	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	8	67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	3	25%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES:

Carro tanque irrigador: Los dias que dice inactivo (I) es porque estuvo disponible en obra

Recicladora de Pavimento 1: Los dias que dice (R)es porque estuvo en reparación en obra - los dias que dice I (inactivo) es porque estuvo disponible en obra

Recicladora de Pavimento 2: Los dias que dice (R)es porque estuvo en reparación en obra - los dias que dice I (inactivo) es porque estuvo disponible en obra

Carro tanque de agua: los dias que dice (I) inactivo es porque estuvo disponible en obra

Compactador neomatico: los dias que dice (I) inactivo es porque no hubo instalación de mezcla

Compatador doble rodillo: los dias que dice (I) inactivo es porque no hubo instalación de mezcla

Finisheir: los dias que dice (I) inactivo es porque no hubo instalación de mezcla

Vibrocompactador 2 : los dias que dice (R) es porque estuvo en reparación

Planta Luminaria: los dias que dice (I) inactivo es porque estuvo disponible en campamento

Compresor: Los dias que dice (I)es porque estuvo disponible en obra y los dias que dice R (reparación) es porque estuvo en mantemiento

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: GERMAN GUERRERO ACOSTA
Lider de Integración
Matricula Profesional No.: 52202 81016 NRÑ

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS ENRIQUEZ
Residente de Interventoría Frente Mallama, Ruta 1002.
Matricula Profesional No.: 52202-127171 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
CONSORCIO SANFRANCISCO																																										
1	SANCHEZ QUINTERO HECTOR FABIO	10.271.146	DIRECTOR DE OBRA	$ 16.526.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 18.178.000	$ 1.265.200	6,96%	EPS SURA	9453583115	$ 2.272.300	PROTECCION	9453583115	$ 3.090.300	$ 727.200	$ 909.000		
2	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	11.812.331	ESP. SOSTENIBILIDAD	$ 3.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.575.000	$ 248.900	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 143.000	PROTECCION	9453583115	$ 572.000	$ 143.000	$ 0	$ 0	
3	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.630.000	$ 252.700	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 145.200	PROTECCION	9453583115	$ 580.800	$ 145.200	$ 0	$ 0	
4	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.050.000	$ 351.000	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 242.100	PROTECCION	9453583115	$ 1.029.100	$ 242.100	$ 0	$ 0	
5	DIAZ OSPINA ULBRAINER	94.323.088	PROF. JURÍDICO PREDIAL	$ 5.000.000																														901591251	$ 3.333.000	$ 0	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 133.400	PORVENIR	9453583115	$ 533.500	$ 0	$ 0	$ 0	INCAPACITADO
6	BOLAÑOS BRAVO HUGO FERNANDO	98.382.884	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.805.000	$ 121.800	6,96%	AIC	9453583115	$ 112.300	PORVENIR	9453583115	$ 449.000	$ 112.300	$ 0	$ 0	
7	BRAVO PANTOJA ANA CAROLINA	37.082.895	PROFESIONAL GESTIÓN HUMANA	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 120.000	PORVENIR	9453583115	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
8	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.499.000	$ 104.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 60.000	PORVENIR	9453583115	$ 239.900	$ 60.000	$ 0	$ 0	
9	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	AUX. COMPRAS	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.750.000	$ 191.400	6,96%	EPS SURA	9453583115	$ 110.000	COLPENSIONES	9453583115	$ 440.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	
10	MARTINEZ LENIN RICARDO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.672.000	$ 116.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 66.900	PORVENIR	9453583115	$ 267.600	$ 66.900	$ 0	$ 0	
11	BURBANO ARAUJO WILLIAM LIBARDO	87.550.526	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.245.000	$ 295.500	6,96%	CONFENALCO	9453583115	$ 169.800	PORVENIR	9453583115	$ 679.200	$ 169.900	$ 0	$ 0	
12	CASARRUBIA ORLYS	78.766.783	CADENERO 2°	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.029.000	$ 141.300	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 81.200	PORVENIR	9453583115	$ 324.700	$ 81.200	$ 0	$ 0	
13	MEDINA TREJO JOSE MARIO	1.120.218.230	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.861.000	$ 129.600	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 74.500	PORVENIR	9453583115	$ 297.800	$ 74.500	$ 0	$ 0	
14	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	1.131.084.775	OFICIAL PILERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.059.000	$ 143.400	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 82.400	PORVENIR	9453583115	$ 329.500	$ 82.400	$ 0	$ 0	
15	CHAMORRO RODRIGUEZ ALVARO JAVIER	5.292.860	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.527.668	$ 95.600	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 61.200	PORVENIR	9453583115	$ 244.500	$ 55.000	$ 0	$ 0	
16	MADROÑERO ANDINO ERASMO EDILBERTO	5.293.292	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.540.000	$ 107.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 61.600	PORVENIR	9453583115	$ 246.400	$ 61.600	$ 0	$ 0	
17	PANTOJA MARCILLO CAROL ADRIAN	1.086.895.902	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.622.000	$ 112.900	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 64.900	PORVENIR	9453583115	$ 259.600	$ 64.900	$ 0	$ 0	
18	CASTRO GUERRERO MAYERLI ALEJANDRA	1.007.796.633	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.451.000	$ 101.000	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 58.100	PORVENIR	9453583115	$ 232.200	$ 58.100	$ 0	$ 0	
19	JORGE PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.794.000	$ 194.500	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 111.800	PORVENIR	9453583115	$ 447.100	$ 111.800	$ 0	$ 0	
20	CUESTAS LAOS CARMEN ALICIA	1.085.908.481	INSPECTOR SST	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.222.000	$ 154.700	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 88.900	PORVENIR	9453583115	$ 355.600	$ 88.900	$ 0	$ 0	
21	LOPEZ ESCOBAR DIEGO FERNANDO	97.480.717	INSPECTOR SST	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.029.000	$ 210.900	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 121.200	PORVENIR	9453583115	$ 484.700	$ 121.200	$ 0	$ 0	
22	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.205.000	$ 83.900	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 48.200	PORVENIR	9453583115	$ 192.800	$ 48.300	$ 0	$ 0	
23	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.602.000	$ 111.500	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 64.100	PORVENIR	9453583115	$ 256.400	$ 64.100	$ 0	$ 0	
24	MORAN CERON ANDREA PATRICIA	1.086.896.854	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.453.000	$ 101.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 58.200	PORVENIR	9453583115	$ 232.500	$ 58.200	$ 0	$ 0	
25	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 3.961.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.357.000	$ 252.800	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 174.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 697.200	$ 174.400	$ 0	$ 0	
26	GARSEZ GRANDA CLAUDIA MILENA	27.192.294	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.458.000	$ 101.500	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 58.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 233.300	$ 58.400	$ 0	$ 0	
27	GARRIDO MOLINA MARIA VICTORIA	1.085.298.394	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.458.000	$ 101.500	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 58.400	PROTECCION	9453583115	$ 233.300	$ 58.400	$ 0	$ 0	
28	LOSA ORTEGA ROSA HELENA	69.055.589	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.850.000	$ 268.000	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 154.000	PORVENIR	9453583115	$ 616.000	$ 154.000	$ 0	$ 0	
29	ARTURO NARVAEZ MARCO AURELIO	98.395.859	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.569.000	$ 109.300	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 62.800	PORVENIR	9453583115	$ 251.100	$ 62.800	$ 0	$ 0	
30	VELASQUEZ RAMIREZ JULIO CESAR	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION GEOGRAFICA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.750.000	$ 191.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 110.000	PORVENIR	9453583115	$ 440.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	
31	SOLARTE OTAYA IGNACIO EDWIN	97.481.162	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.989.000	$ 125.100	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 79.700	COLFONDOS	9453583115	$ 318.400	$ 71.900	$ 0	$ 0	
32	ROSERO MONTALVO HENRRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.059.000	$ 143.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 82.400	PORVENIR	9453583115	$ 329.500	$ 82.400	$ 0	$ 0	
33	GONZALEZ HERNANDEZ JAIVER	18.155.773	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.843.000	$ 128.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 73.800	PORVENIR	9453583115	$ 294.900	$ 73.800	$ 0	$ 0	
34	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.141.000	$ 149.100	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 85.700	PORVENIR	9453583115	$ 342.600	$ 85.700	$ 0	$ 0	
35	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.916.000	$ 119.500	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 76.700	PORVENIR	9453583115	$ 306.600	$ 68.700	$ 0	$ 0	
36	BURGOS VILLAREAL FREDDY ARTURO	1.120.218.408	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.951.000	$ 135.800	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 78.100	PORVENIR	9453583115	$ 312.200	$ 78.100	$ 0	$ 0	
37	PAZ CHAVEZ JHON JAIRO	97.481.170	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.951.000	$ 135.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 78.100	PORVENIR	9453583115	$ 312.200	$ 78.100	$ 0	$ 0	
38	SALCEDO DIAZ OSCAR WILLIAM ANDRES	97.480.722	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.861.000	$ 129.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 74.500	PORVENIR	9453583115	$ 297.800	$ 74.500	$ 0	$ 0	
39	ANACONA GUACA ALBEIRO	10.317.114	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.519.000	$ 105.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 60.800	PORVENIR	9453583115	$ 243.100	$ 60.800	$ 0	$ 0	
40	JOANY OCAMPO GARCIA	1.053.771.454	ESPECIALISTA DE GEOTECNIA	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 7.700.334	$ 410.900	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 308.100	COLFONDOS	9453583115	$ 1.309.400	$ 308.100	$ 525.000	$ 0	
41	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.080.000	$ 214.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 123.200	PORVENIR	9453583115	$ 492.800	$ 123.200	$ 0	$ 0	
42	MORENO RICARDO	12.134.582	TOPOGRAFO	$ 2.800.000	X	X	X	X	X																									901591251	$ 3.891.000	$ 240.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 155.700	PORVENIR	9453583115	$ 622.600	$ 155.700	$ 0	$ 0	
43	CIFUENTES BENAVIDEZ JUAN DIEGO	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 4.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.000.000	$ 417.600	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 240.000	PORVENIR	9453583115	$ 1.020.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	
44	DIAZ QUIROS CARLOS HUMBERTO	5.329.171	CADENERO 1°	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.646.000	$ 114.600	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 65.900	PORVENIR	9453583115	$ 263.400	$ 65.900	$ 0	$ 0	
45	PANTOJA MARCILLO WILLIAM	1.086.896.198	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.583.000	$ 110.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 63.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 253.300	$ 63.400	$ 0	$ 0	
46	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.166.000	$ 81.200	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 46.700	PORVENIR	9453583115	$ 186.600	$ 46.700	$ 0	$ 0	
47	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.800.000	$ 264.500	6,96%	SALUD TOTAL	9453583115	$ 152.000	PROTECCION	9453583115	$ 608.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	
48	JAIRO FERNANDO ARCOS CALVACHE	97.472.472	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.922.000	$ 133.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 76.900	PORVENIR	9453583115	$ 307.600	$ 76.900	$ 0	$ 0	
49	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.240.000	$ 86.400	6,96%	ENMSANAR	9453583115	$ 49.600	PROTECCION	9453583115	$ 198.400	$ 49.600	$ 0	$ 0	
50	BENICIO MANSINSOY PEJENDINO	5.203.631	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.141.000	$ 149.100	6,96%	ENMSANAR	9453583115	$ 85.700	PORVENIR	9453583115	$ 342.600	$ 85.700	$ 0	$ 0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
51	PEDRO ANDRES LOPEZ BENAVIDES	12.746.863	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.458.000	$ 95.700	6,96%	FAMISANAR	9453583115	$ 55.000	PORVENIR	9453583115	$ 233.500	$ 55.000	$ 0	$ 0	
52	JHON EDISSON MORA MORA	1.120.216.061	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X																										901591251	$ 1.545.000	$ 107.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 61.800	PORVENIR	9453583115	$ 247.200	$ 72.200	$ 0	$ 0	RETIRO Y AUSENCIA EN JULIO
53	HUBER JAIRO MONTALVO CAÑON	97.480.451	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.774.000	$ 118.700	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 68.200	PROTECCION	9453583115	$ 283.900	$ 68.300	$ 0	$ 0	
54	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.925.000	$ 134.000	6,96%	FAMISANAR	9453583115	$ 77.000	PORVENIR	9453583115	$ 308.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	
55	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.934.000	$ 134.700	6,96%	AIC	9453583115	$ 77.400	PORVENIR	9453583115	$ 309.500	$ 77.400	$ 0	$ 0	
56	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.300.000	$ 229.700	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 132.000	COLPENSIONES	9453583115	$ 528.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	
57	FREDDY ALBERTO MARRIAGA LOPEZ	72.261.383	OPERADOR PLANTA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.471.000	$ 130.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 98.900	COLPENSIONES	9453583115	$ 395.400	$ 98.900	$ 0	$ 0	
58	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18.195.093	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.934.000	$ 134.700	6,96%	FAMISANAR	9453583115	$ 77.400	PORVENIR	9453583115	$ 309.500	$ 77.400	$ 0	$ 0	
59	JHON EDUARDO CEBALLOS	1.120.217.989	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					901591251	$ 1.890.000	$ 121.700	6,96%	AIC	9453583115	$ 70.000	COLFONDOS	9453583115	$ 302.500	$ 70.000	$ 0	$ 0	
60	JAIR CUELLA CHILA	12.209.049	JEFE DE TALLER	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.703.000	$ 257.800	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 148.200	PORVENIR	9453583115	$ 592.500	$ 148.200	$ 0	$ 0	
61	CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.867	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.166.000	$ 81.200	6,96%	FAMISANAR	9453583115	$ 46.700	PORVENIR	9453583115	$ 186.600	$ 46.700	$ 0	$ 0	
62	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.594.000	$ 111.000	6,96%	FAMISANAR	9453583115	$ 63.800	PORVENIR	9453583115	$ 255.100	$ 63.800	$ 0	$ 0	
63	GONZALO SOFONIAS CUARAN ROJAS	98.385.430	OFICIAL PILERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.879.000	$ 130.800	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 75.200	PORVENIR	9453583115	$ 300.700	$ 75.200	$ 0	$ 0	
64	NELSON DARIO ROSERO PINCHAO	1.124.316.732	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.576.000	$ 109.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 63.100	PORVENIR	9453583115	$ 252.200	$ 63.100	$ 0	$ 0	
65	WILLIAM ALEXANDER JAMIOY MITICANOY	97.472.805	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.934.000	$ 134.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 77.400	PORVENIR	9453583115	$ 309.500	$ 77.400	$ 0	$ 0	
66	PEDRO FRANCISCO CHINDOY CEBALLOS	1.120.216.067	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.293.000	$ 90.000	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 51.800	PORVENIR	9453583115	$ 206.900	$ 51.800	$ 0	$ 0	
67	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.835.000	$ 127.800	6,96%	AIC	9453583115	$ 73.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 293.600	$ 73.400	$ 0	$ 0	
68	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHAZOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.338.000	$ 93.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 53.600	COLFONDOS	9453583115	$ 214.100	$ 53.600	$ 0	$ 0	
69	LUIS ALBERTO DEJOY	1.122.782.284	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 46.400	PORVENIR	9453583115	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
70	MILTON ANTONIO BURGOS RIASCOS	97.480.602	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.835.000	$ 127.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 73.400	PROTECCION	9453583115	$ 293.600	$ 73.400	$ 0	$ 0	
71	JHON JAIRO CHACHINDOY BUESAQUILLO	1.124.313.445	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		901591251	$ 1.735.000	$ 120.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 69.400	PORVENIR	9453583115	$ 277.600	$ 69.500	$ 0	$ 0	
72	JHON ALEXANDER ERAZO RIASCOS	1.120.217.806	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.166.000	$ 81.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 46.700	COLPENSIONES	9453583115	$ 186.600	$ 46.700	$ 0	$ 0	
73	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.300.000	$ 239.500	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 172.000	COLFONDOS	9453583115	$ 688.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	
74	OSCAR RENE ENRIQUEZ LOPEZ	5.292.712	OPERADOR IRRIGADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.008.000	$ 139.800	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 80.400	PORVENIR	9453583115	$ 321.300	$ 80.400	$ 0	$ 0	
75	BETTO RODRIGO OTERO ALEGRIA	1.144.147.644	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.502.000	$ 104.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 60.100	PORVENIR	9453583115	$ 240.400	$ 60.100	$ 0	$ 0	
76	JUAN CARLOS GUANGA	87.551.553	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.496.000	$ 104.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 59.900	PROTECCION	9453583115	$ 239.400	$ 59.900	$ 0	$ 0	
77	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 120.000	PORVENIR	9453583115	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
78	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.746.000	$ 191.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 109.900	COLPENSIONES	9453583115	$ 439.400	$ 109.900	$ 0	$ 0	
79	ALIRIO ALVEIRO PUJIMUY JACANAMEJOY	97.480.834	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													901591251	$ 1.184.000	$ 82.500	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 47.400	COLFONDOS	9453583115	$ 189.500	$ 47.400	$ 0	$ 0	
80	DIEGO FERNANDO AGUIRRE SANTIUSTY	5.255.430	RESIDENTE OBRA	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.500.000	$ 250.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 180.000	PORVENIR	9453583115	$ 720.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	
81	WILLIAM RICARDO SUAREZ MENDOZA	1.049.603.450	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									901591251	$ 4.500.000	$ 313.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 180.000	PORVENIR	9453583115	$ 720.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	
82	LUIS GIRALDO BENAVIDEZ ORTIZ	1.121.506.218	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.051.000	$ 142.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 82.100	COLFONDOS	9453583115	$ 328.200	$ 82.100	$ 0	$ 0	
83	VICTOR HUGO GARCIA MEJIA	1.006.815.997	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.159.000	$ 150.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 86.400	PORVENIR	9453583115	$ 345.500	$ 86.400	$ 0	$ 0	
84	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.987.000	$ 138.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 79.500	PORVENIR	9453583115	$ 318.000	$ 79.500	$ 0	$ 0	
85	ALVARO FAUBRICIO JOSA CAÑON	1.120.217.581	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													901591251	$ 1.843.000	$ 128.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 73.800	COLPENSIONES	9453583115	$ 294.900	$ 73.800	$ 0	$ 0	
86	EDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.150.000	$ 149.700	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 86.000	COLFONDOS	9453583115	$ 344.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	
87	BRAYAN JAMILTON MAIGAL BOTINA	1.120.218.487	AYUDANTE	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.178.000	$ 82.000	6,96%	AIC	9453583115	$ 47.200	PORVENIR	9453583115	$ 188.500	$ 47.200	$ 0	$ 0	
88	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.166.000	$ 81.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 46.700	PORVENIR	9453583115	$ 186.600	$ 46.700	$ 0	$ 0	
89	NILSON HERNEY ASCUNTAR BRUGOS	97.480.684	CADENERO 1°	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.158.000	$ 150.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 86.400	PORVENIR	9453583115	$ 345.300	$ 86.400	$ 0	$ 0	
90	ELIAS MARCIAL ARAUJO ROSERO	1.086.896.866	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.640.000	$ 114.200	6,96%	AIC	9453583115	$ 65.600	COLPENSIONES	9453583115	$ 262.400	$ 65.700	$ 0	$ 0	
91	OSCAR BENJAMIN VELASQUEZ	18.125.647	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.669.000	$ 116.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 66.800	COLFONDOS	9453583115	$ 267.100	$ 66.800	$ 0	$ 0	
92	CARLOS ANDRES ESCOBAR	5.292.749	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.423.000	$ 99.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 57.000	PORVENIR	9453583115	$ 227.700	$ 57.000	$ 0	$ 0	
93	EIDER ARMANDO OLIVA CAIPE	1.089.295.299	AUXILIAR DE INGENERIA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.766.000	$ 123.000	6,96%	AIC	9453583115	$ 70.700	PORVENIR	9453583115	$ 282.600	$ 70.700	$ 0	$ 0	
94	ANGEL MARTIN ORTEGA	5.292.174	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.380.000	$ 96.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 55.200	PORVENIR	9453583115	$ 220.800	$ 55.200	$ 0	$ 0	
95	GERMAN DAVID MARIN DURAN	1.006.461.220	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.644.334	$ 109.100	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 65.800	COLPENSIONES	9453583115	$ 263.200	$ 62.700	$ 0	$ 0	
96	JAVIER MARIN DURAN	14.801.664	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.664.000	$ 115.900	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 66.600	COLFONDOS	9453583115	$ 266.300	$ 66.600	$ 0	$ 0	
97	JESUS YOMAR CUASTUMAL	1.004.596.679	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.531.000	$ 106.600	6,96%	AIC	9453583115	$ 61.300	PORVENIR	9453583115	$ 245.000	$ 61.300	$ 0	$ 0	
98	JOSE FERNANDO ALTAMIRANO BRAVO	98.136.698	CADENERO 1°	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.550.000	$ 107.900	6,96%	AIC	9453583115	$ 62.000	PORVENIR	9453583115	$ 248.000	$ 69.100	$ 0	$ 0	
99	MARLON FERNANDO JURADO MORALES	1.004.592.587	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.566.000	$ 109.000	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 62.700	PORVENIR	9453583115	$ 250.600	$ 62.700	$ 0	$ 0	
100	GUIDO ARMANDO DIAZ CORDOBA	1.081.593.331	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.427.000	$ 99.400	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 57.100	COLPENSIONES	9453583115	$ 228.400	$ 57.100	$ 0	$ 0	
101	JUAN JOSE CASTRO BUCHELY	1.120.218.245	PROFESIONAL FORESTAL	$ 2.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.659.000	$ 185.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 106.400	PORVENIR	9453583115	$ 425.500	$ 106.400	$ 0	$ 0	
102	ALETH JARVI ARTEGA DIAZ	1.120.217.905	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.313.000	$ 91.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 52.600	PORVENIR	9453583115	$ 210.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	
103	CRISTIAM ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS	1.120.218.470	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.971.000	$ 127.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 73.200	COLPENSIONES	9453583115	$ 315.500	$ 73.200	$ 0	$ 0	
104	CRISTIAM ALEJANDRO DELGADO AUPAZ	1.006.679.621	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.178.000	$ 82.000	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 47.200	COLFONDOS	9453583115	$ 188.500	$ 47.200	$ 0	$ 0	
105	SERGIO ANTONIO GUAICAL MURIEL	1.085.349.096	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.381.000	$ 96.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 55.300	PORVENIR	9453583115	$ 221.000	$ 55.300	$ 0	$ 0	
106	ORLANDO SILVIO RIVERA ROJAS	13.071.630	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													901591251	$ 1.251.668	$ 73.700	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 50.200	PORVENIR	9453583115	$ 200.400	$ 42.400	$ 0	$ 0	
107	LUIS ARMANDO GUAICAL MURIEL	1.085.349.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.338.000	$ 93.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 53.600	PORVENIR	9453583115	$ 214.100	$ 53.600	$ 0	$ 0	
108	CRISTIAN CAMILO PEJENDIDO CAMUEZ	1.006.679.622	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.393.000	$ 97.000	6,96%	AIC	9453583115	$ 55.800	COLPENSIONES	9453583115	$ 222.900	$ 55.800	$ 0	$ 0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
109	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.455.000	$ 101.300	6,96%	NUEVA E.P.S.	9453583115	$ 58.200	COLFONDOS	9453583115	$ 232.800	$ 58.200	$ 0	$ 0	
110	JESUS HERMINSUL CUASPUD MONCAYO	98.326.791	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.669.000	$ 112.700	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 64.800	PORVENIR	9453583115	$ 267.100	$ 64.800	$ 0	$ 0	
111	ANGIELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.659.000	$ 185.100	6,96%	NUEVA E.P.S.	9453583115	$ 106.400	PORVENIR	9453583115	$ 425.500	$ 106.400	$ 0	$ 0	
112	LAURA CUASQUEN GUERRERO	1.087.424.442	ALMACENISTA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.767.000	$ 123.000	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 70.700	PORVENIR	9453583115	$ 282.800	$ 70.700	$ 0	$ 0	
113	CRISTIAN ALBEIRO BUESAQUILLO JACANAMEJOY	1.122.786.457	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.280.000	$ 89.100	6,96%	NUEVA E.P.S.	9453583115	$ 51.200	COLFONDOS	9453583115	$ 204.800	$ 51.200	$ 0	$ 0	
114	ANDERSON ALEXIS RODRIGUEZ URRESTI	1.120.217.827	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.465.000	$ 98.900	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 56.800	PORVENIR	9453583115	$ 234.400	$ 56.800	$ 0	$ 0	
115	HARVEY ALEXANDER SOLARTE MUTUMBAJOY	1.122.785.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.916.000	$ 133.400	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 76.700	PORVENIR	9453583115	$ 306.600	$ 76.700	$ 0	$ 0	
116	JUAN PABLO MATABANCHOY JOSA	1.121.507.315	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.966.000	$ 136.900	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 78.700	PORVENIR	9453583115	$ 314.600	$ 78.700	$ 0	$ 0	
117	JUAN CARLOS ESCOBAR CERON	1.120.216.499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									901591251	$ 1.785.000	$ 124.300	6,96%	NUEVA E.P.S.	9453583115	$ 71.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 285.600	$ 71.500	$ 0	$ 0	
118	ORLANDO CHARRY LOPEZ	1.075.253.362	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.870.000	$ 130.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 74.800	COLFONDOS	9453583115	$ 299.200	$ 74.800	$ 0	$ 0	
119	DEMIS IVAN IBARRA CRUZ	98.396.762	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.074.000	$ 144.400	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 83.000	PORVENIR	9453583115	$ 331.900	$ 83.000	$ 0	$ 0	
120	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.978.000	$ 131.500	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 79.200	PORVENIR	9453583115	$ 316.500	$ 75.600	$ 0	$ 0	
121	RAUL HERNANDO DIAZ MUTUMBAJOY	97.472.667	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.983.000	$ 138.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 79.400	PORVENIR	9453583115	$ 317.300	$ 79.400	$ 0	$ 0	
122	FEDIRNANDO LOPEZ SOLARTE	97.480.214	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.568.000	$ 109.200	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 62.800	COLPENSIONES	9453583115	$ 250.900	$ 62.800	$ 0	$ 0	
123	BENJAMIN ANDRES CRIOLLO CHACHINOY	1.123.205.750	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.532.000	$ 106.700	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 61.300	COLFONDOS	9453583115	$ 245.200	$ 61.300	$ 0	$ 0	
124	REIVER ALEXANDER ALVAREZ CAÑON	1.120.217.766	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X																							901591251	$ 1.568.000	$ 109.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 62.800	PORVENIR	9453583115	$ 250.900	$ 62.800	$ 0	$ 0	
125	LUIS ARNULFO ROSERO BURBANO	1.122.783.830	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.433.334	$ 90.500	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 55.100	PORVENIR	9453583115	$ 229.400	$ 52.100	$ 0	$ 0	
126	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.405.000	$ 97.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 56.200	PORVENIR	9453583115	$ 224.800	$ 56.300	$ 0	$ 0	
127	MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ	5.345.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.421.000	$ 99.000	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 56.900	COLPENSIONES	9453583115	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
128	CRISTIAM ANDRES MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.789	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.294.000	$ 90.100	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 51.800	COLFONDOS	9453583115	$ 207.100	$ 51.800	$ 0	$ 0	
129	EDINSON BLADYMIR LOPEZ RIASCOS	14.605.110	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.025.000	$ 141.000	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 81.000	PORVENIR	9453583115	$ 324.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	
130	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.330.000	$ 162.200	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 93.200	PORVENIR	9453583115	$ 372.800	$ 93.300	$ 0	$ 0	
131	DANIEL OVIDIO MONCAYO LASSO	10.296.559	BIOLOGO	$ 4.254.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.254.000	$ 296.100	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 170.200	PORVENIR	9453583115	$ 680.700	$ 170.200	$ 0	$ 0	
132	GUIDO FLORIBERTO MADRIÑAN	18.112.846	OFICIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.114.000	$ 147.200	6,96%	EMSSANAR	9453583115	$ 84.600	COLPENSIONES	9453583115	$ 338.300	$ 84.600	$ 0	$ 0	
133	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.671.000	$ 116.400	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 66.900	PORVENIR	9453583115	$ 267.400	$ 66.900	$ 0	$ 0	
134	LEYDI TATIANA MAVISOY IBAMCHI	1.120.217.810	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.612.000	$ 112.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 64.500	PORVENIR	9453583115	$ 258.000	$ 64.500	$ 0	$ 0	
135	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1.120.218.542	DESPACHADORA DE MATERIALES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.545.000	$ 107.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 61.800	COLFONDOS	9453583115	$ 247.200	$ 61.900	$ 0	$ 0	
136	JIMMY ALEJANDRO JOJOA CORAL	1.006.679.642	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.704.000	$ 118.600	6,96%	AIC	9453583115	$ 68.200	PORVENIR	9453583115	$ 272.700	$ 68.200	$ 0	$ 0	
137	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.100.000	$ 146.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 84.000	PORVENIR	9453583115	$ 336.000	$ 84.100	$ 0	$ 0	
138	NADER STIVEN CORAL ALPAZ	1.120.216.190	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.382.000	$ 96.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 55.300	PORVENIR	9453583115	$ 221.200	$ 55.300	$ 0	$ 0	
139	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.178.000	$ 82.000	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 47.200	PORVENIR	9453583115	$ 188.500	$ 47.200	$ 0	$ 0	
140	JHON FREDY GAVIRIA MAIGUAL	1.120.218.525	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X																							901591251	$ 1.184.000	$ 82.500	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 47.400	PORVENIR	9453583115	$ 189.500	$ 47.400	$ 0	$ 0	
141	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.561.000	$ 108.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 62.500	PORVENIR	9453583115	$ 249.800	$ 62.500	$ 0	$ 0	
142	EDITH JANETH BURBANO ORTIZ	69.055.176	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.619.000	$ 112.700	6,96%	AIC	9453583115	$ 64.800	PROTECCION	9453583115	$ 259.100	$ 64.800	$ 0	$ 0	
143	JHON JAIRO ENRIQUE ANDRADE MUTUMBAJOY	1.122.782.722	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.843.000	$ 128.300	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 73.800	PORVENIR	9453583115	$ 294.900	$ 73.800	$ 0	$ 0	
144	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	ADMINISTRADOR DE OBRA	$ 5.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.100.000	$ 284.000	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 204.000	PORVENIR	9453583115	$ 867.000	$ 204.000	$ 0	$ 0	
145	JAIME DE JESUS PUERTA TABORDA	3.669.472	SUPERVISOR DE EQUIPOS	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.600.000	$ 245.500	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 184.100	PORVENIR	9453583115	$ 736.100	$ 184.100	$ 0	$ 0	
146	JOSE DANILO VERA NARVAEZ	1.086.895.723	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.339.000	$ 232.400	6,96%	SURA	9453583115	$ 133.600	PORVENIR	9453583115	$ 534.300	$ 133.600	$ 0	$ 0	
147	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.966.000	$ 136.900	6,96%	SURA	9453583115	$ 78.700	PROTECCION	9453583115	$ 314.600	$ 78.700	$ 0	$ 0	
148	GUILLERMO DUVAN DIAGO ESCOBAR	1.120.217.540	OPERADOR MIXER	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901591251	$ 2.286.000	$ 159.200	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 91.500	PORVENIR	9453583115	$ 365.800	$ 91.500	$ 0	$ 0	
149	LUIS MIGUEL CHALPARIZAN CORAL	1.120.218.172	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.897.000	$ 132.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 75.900	PORVENIR	9453583115	$ 303.600	$ 75.900	$ 0	$ 0	
150	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1.120.217.344	AUXXILIAR SST	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.920.000	$ 133.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 76.800	COLPENSIONES	9453583115	$ 307.200	$ 76.900	$ 0	$ 0	
151	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.447.000	$ 170.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 97.900	PROTECCION	9453583115	$ 391.600	$ 97.900	$ 0	$ 0	
152	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR MINDUMPER	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.933.000	$ 134.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 77.400	PORVENIR	9453583115	$ 309.300	$ 77.400	$ 0	$ 0	
153	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.585.000	$ 180.000	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 103.400	PORVENIR	9453583115	$ 413.600	$ 103.500	$ 0	$ 0	
154	GIOVANNI ALEXANDER FAJARDO JIMENEZ	13.068.620	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.816.000	$ 126.400	6,96%	AIC	9453583115	$ 72.700	PORVENIR	9453583115	$ 290.600	$ 72.700	$ 0	$ 0	
155	GERMAN ANDRES GUERRERO ACOSTA	98.392.440	DIRECTOR DE PUENTES Y VIAS	$ 12.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 12.500.000	$ 725.100	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 1.562.600	PORVENIR	9453583115	$ 2.125.300	$ 500.100	$ 625.100	$ 0	
156	LUIS EDUARDO GAMBOA	98.345.484	MAESTRO DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.486.000	$ 242.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 139.500	PORVENIR	9453583115	$ 557.800	$ 139.500	$ 0	$ 0	
157	ANDRES FABIAN CEBALLOS GUERRA	1.006.679.943	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.613.000	$ 112.300	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 64.600	PORVENIR	9453583115	$ 258.100	$ 64.600	$ 0	$ 0	
158	CRISTAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.556.000	$ 108.300	6,96%	SANISTAS	9453583115	$ 62.300	PROTECCION	9453583115	$ 249.000	$ 62.300	$ 0	$ 0	
159	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.024.000	$ 140.900	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 81.000	PORVENIR	9453583115	$ 323.900	$ 81.000	$ 0	$ 0	
160	FABIO ANDRES GAMBOA SEGOVIA	1.087.960.595	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.507.000	$ 166.700	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 95.800	PROTECCION	9453583115	$ 401.200	$ 95.800	$ 0	$ 0	
161	JHON JAIRO AGRED AGREDA	1.006.907.572	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.667.000	$ 116.100	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 66.700	PORVENIR	9453583115	$ 266.800	$ 66.700	$ 0	$ 0	
162	HECTOR ALFONZO VILLACREZ CORAL	1.120.216.082	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.890.000	$ 131.600	6,96%	AIC	9453583115	$ 75.600	PORVENIR	9453583115	$ 302.400	$ 75.600	$ 0	$ 0	
163	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	1.113.669.585	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.727.000	$ 112.300	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 64.600	PORVENIR	9453583115	$ 276.500	$ 64.600	$ 0	$ 0	
164	OMAIRA MARGOTH MARTINEZ ORDOÑEz	27.474.976	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.375.000	$ 95.700	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 55.000	PORVENIR	9453583115	$ 220.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	
165	HERNAN RUBINTHON CARLOSAMA	97.480.610	OFICAL DE PÁVIMENTO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.583.000	$ 110.200	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 63.400	PORVENIR	9453583115	$ 253.300	$ 63.400	$ 0	$ 0	
166	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.808.000	$ 125.900	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 72.400	PORVENIR	9453583115	$ 289.300	$ 72.400	$ 0	$ 0	
167	RICHARD ESTEBAN PINCHAO	1.149.189.370	ELECTRICO	$ 1.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.148.000	$ 149.600	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 86.000	COLPENSIONES	9453583115	$ 343.700	$ 86.000	$ 0	$ 0	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
168	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.709.000	$ 119.000	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 68.400	COLPENSIONES	9453583115	$ 273.500	$ 68.400	$ 0	$ 0	
169	JOSE LUIS BARRERA JULIO	1.040.493.032	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.727.000	$ 120.200	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 69.100	PORVENIR	9453583115	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
170	WILMER ARLEY JACANAMEJOY JAMIOY	1.124.315.991	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.552.000	$ 108.100	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 62.100	PORVENIR	9453583115	$ 248.400	$ 62.100	$ 0	$ 0	
171	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.987.000	$ 138.300	6,96%	COOSALUD	9453583115	$ 79.500	PORVENIR	9453583115	$ 318.000	$ 79.500	$ 0	$ 0	
172	OSCAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.771.000	$ 123.300	6,96%	AIC	9453583115	$ 70.900	PORVENIR	9453583115	$ 283.400	$ 70.900	$ 0	$ 0	
173	BRAYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.209.000	$ 81.500	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 46.800	PROTECCION	9453583115	$ 193.500	$ 46.800	$ 0	$ 0	
174	FREDY ARLEY MUCHAVISOY	1.122.784.113	OFICIAL DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.951.000	$ 135.800	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 78.100	PORVENIR	9453583115	$ 312.200	$ 78.100	$ 0	$ 0	
175	LUIS ALEXNADER VIVAS MONTILLA	1.124.316.935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.502.000	$ 104.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 60.100	PORVENIR	9453583115	$ 240.400	$ 60.100	$ 0	$ 0	
176	HERNAN DARIO MAIGUAL CARLOSAMA	1.120.216.700	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.727.000	$ 120.200	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 69.100	PORVENIR	9453583115	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
177	FRANCISCO JAVIER JACANAMIJOY JACANAMIJOY	97.472.985	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.727.000	$ 120.200	6,96%	MALLAMAS	9453583115	$ 69.100	PORVENIR	9453583115	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
178	JAIRO HERNAN SURA GUERRA	18.126.224	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.564.000	$ 103.500	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 59.500	PORVENIR	9453583115	$ 250.400	$ 59.500	$ 0	$ 0	
179	VICTOR DANILO RODRIGUEZ GARCIA	1.006.679.694	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.359.000	$ 94.600	6,96%	AIC	9453583115	$ 54.400	PORVENIR	9453583115	$ 217.500	$ 54.400	$ 0	$ 0	
180	LUIS ALFREDO RIASCOS RAMOS	97.472.346	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.591.000	$ 110.800	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 63.700	PORVENIR	9453583115	$ 254.600	$ 63.700	$ 0	$ 0	
181	OSCAR EDUARDO MOMTALVO BECERRA	97.481.163	OPERADOR DE PLANTA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.283.000	$ 158.900	6,96%	EMSANAR	9453583115	$ 91.400	PORVENIR	9453583115	$ 365.300	$ 91.400	$ 0	$ 0	
182	HERNAN SEBATIAN CARLOSAMA RAMIREZ	1.120.218.610	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.239.000	$ 86.300	6,96%	AIC	9453583115	$ 49.600	PORVENIR	9453583115	$ 198.300	$ 49.600	$ 0	$ 0	
183	BLANCA LUCI BURGOS ENRIQUEZ	69.055.368	DIGITADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.232.000	$ 85.800	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 49.300	PORVENIR	9453583115	$ 197.200	$ 49.300	$ 0	$ 0	
184	DUILMER ALEXANDER ZAMBARNO RUALES	1.123.325.902	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.073.000	$ 213.900	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 123.000	PORVENIR	9453583115	$ 491.700	$ 123.000	$ 0	$ 0	
185	JHON FREDY CONTRERAS BOLAÑOS	18.146.509	APAREJADOR CAMION GRUA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.090.000	$ 145.500	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 83.600	PORVENIR	9453583115	$ 334.400	$ 83.600	$ 0	$ 0	
186	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.428.000	$ 99.400	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 57.200	PORVENIR	9453583115	$ 228.500	$ 57.200	$ 0	$ 0	
187	EDUWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.583.000	$ 110.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 63.400	PORVENIR	9453583115	$ 253.300	$ 63.400	$ 0	$ 0	
188	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUX MECANICO	$ 1.377.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.691.000	$ 117.700	6,96%	AIC	9453583115	$ 67.700	PORVENIR	9453583115	$ 270.600	$ 67.700	$ 0	$ 0	
189	KAREN JACKELINE MONCAYO TREJO	1.085.305.644	AUXILIAR TECNICO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.500.000	$ 104.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 60.000	PORVENIR	9453583115	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	
190	ANGIE LIZETH MELO ANDRADE	1.085.331.452	AUXILIAR TECNICO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.500.000	$ 104.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 60.000	PORVENIR	9453583115	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	
191	JOSE ALIRIO ESPAÑA JACANAMEJOY	97.471.951	OFICIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							901591251	$ 1.473.000	$ 102.600	6,96%	AIC	9453583115	$ 59.000	COLPENSIONES	9453583115	$ 235.700	$ 59.000	$ 0	$ 0	
192	GUILLERMO RAMIREZ LOPEZ	1.123.331.096	MECANICO	$ 1.377.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.102.000	$ 73.500	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 42.300	PORVENIR	9453583115	$ 176.400	$ 42.300	$ 0	$ 0	
193	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 946.000	$ 65.900	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 37.900	PORVENIR	9453583115	$ 151.400	$ 37.900	$ 0	$ 0	
194	CARLOS ALBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUX LABORATORIO	$ 1.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.125.000	$ 78.300	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 45.000	PORVENIR	9453583115	$ 180.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	
195	JUAN CARLOS MEDINA MELENDEZ	1.120.218.353	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 928.000	$ 64.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 37.200	PORVENIR	9453583115	$ 148.500	$ 37.200	$ 0	$ 0	
196	ANGIE MELISA IMBACHI BASTIDAS	1.120.217.974	ANOTADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.094.000	$ 76.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 43.800	PORVENIR	9453583115	$ 175.100	$ 43.800	$ 0	$ 0	
197	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOS	1.120.216.260	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 928.000	$ 64.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 37.200	PORVENIR	9453583115	$ 148.500	$ 37.200	$ 0	$ 0	
198	ALVARO RUIZ OBANDO	1.085.546.186	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									901591251	$ 946.000	$ 65.900	6,96%	SALUD TOTAL	9453583115	$ 37.900	PORVENIR	9453583115	$ 151.400	$ 37.900	$ 0	$ 0	
199	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 928.000	$ 64.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 37.200	COLPENSIONES	9453583115	$ 148.500	$ 37.200	$ 0	$ 0	
200	JOSE ANDRES AGREDA YELA	1.120.218.468	AUX DE ALMACEN	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.020.000	$ 71.000	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 40.800	PORVENIR	9453583115	$ 163.200	$ 40.800	$ 0	$ 0	
201	WILMER BALDOMIRO ERAZO DIAZ	1.124.312.809	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.360.000	$ 94.700	6,96%	AIC	9453583115	$ 54.400	PORVENIR	9453583115	$ 217.600	$ 54.400	$ 0	$ 0	
202	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 928.000	$ 64.600	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 37.200	PORVENIR	9453583115	$ 148.500	$ 37.200	$ 0	$ 0	
203	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.109.000	$ 77.200	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 44.400	PORVENIR	9453583115	$ 177.500	$ 44.400	$ 0	$ 0	
204	AURELIANO GOMEZ JUAGIBIOY	97.472.554	OPERADOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.459.000	$ 101.600	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 58.400	PORVENIR	9453583115	$ 233.500	$ 58.400	$ 0	$ 0	
205	MARCOS MARCIAL ANDINO MADROÑERO	1.086.895.785	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.025.000	$ 71.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 41.000	PORVENIR	9453583115	$ 164.000	$ 41.000	$ 0	$ 0	
206	ALBERT SIGIFREDO NARVAEZ CANTICUS	1.004.730.002	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.025.000	$ 71.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 41.000	PORVENIR	9453583115	$ 164.000	$ 41.000	$ 0	$ 0	
207	JAVIER ALFONZO ZARATE MEDINA	10.294.248	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.800.000	$ 125.300	6,96%	SALUD TOTAL	9453583115	$ 72.000	PORVENIR	9453583115	$ 288.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	
208	MARIO ANFRES MARTINEZ	87.066.710	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.695.000	$ 85.500	6,96%	NUEVA EPS	9453583115	$ 67.900	PROTECCION	9453583115	$ 271.300	$ 67.900	$ 0	$ 0	
209	BRANDON DAMIAN PEJENDINO MATABAJOY	1.053.856.957	AUX DE INGENIERIA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.047.000	$ 72.900	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 41.900	PORVENIR	9453583115	$ 167.600	$ 41.900	$ 0	$ 0	
210	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	CONDUCTOR TURBO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 650.000	$ 45.300	6,96%	SANITAS	9453583115	$ 26.000	PORVENIR	9453583115	$ 104.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	
211	EYDER ALEXANDER BENAVIDES CEBALLOS	1.122.785.561	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 580.000	$ 40.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 23.200	PORVENIR	9453583115	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	
212	JEISSON MAURICIO NARVAEZ BENAVIDES	1.004.437.656	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 580.000	$ 40.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 23.200	PORVENIR	9453583115	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	
213	CARLOS ALBERTO ESPAÑA JACAMEJOY	1.122.782.673	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X																							901591251	$ 580.000	$ 40.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 23.200	PORVENIR	9453583115	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	
214	JESUS ALBEIRO PANTOJA OLVA	1.004.592.687	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 580.000	$ 40.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 23.200	PORVENIR	9453583115	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	
215	JAIRO FERNANDO VITERI RODRIGUEZ	1.085.906.646	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 580.000	$ 40.400	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 23.200	PORVENIR	9453583115	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	
216	BRAYAN EDILSON ESCOBAR ESCOBAR	1.086.896.983	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 580.001	$ 37.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 21.700	PORVENIR	9453583115	$ 92.900	$ 21.700	$ 0	$ 0	
217	DAYRA AMANDA ESCOBAR ZAMBARNO	1.120.216.914	INSPECTORA SST	$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 440.000	$ 30.700	6,96%	EMMSANAR	9453583115	$ 17.600	PORVENIR	9453583115	$ 70.400	$ 17.600	$ 0	$ 0	
218	MARIA EMPERZTRIZ BURGOS RIASCOS	27.474.850	CONTROLADOR DE TRAFICO	$ 1.160.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
219	JAIME ALBERTO CARDONA PEREZ	1.045.136.564	CADENERO 1°	$ 1.500.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	COOSALUD	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
220	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
221	HENRY ANDRES CORREA OBANDO	87.063.510	RESIDENTE VIAS	$ 4.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
222	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.160.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	0	$ 0	COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
223	CHRISTIAN ANDRES ORTIZ POTOSI	1.085.287.914	CADENERO PRIMERO	$ 1.160.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
224	RODRIGO ALEXNADER LOPEZ ARBOLEDA	97.481.130	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
225	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
226	JHON JAIRO YANDAR PARRA	1.085.282.234	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.750.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
227	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS	0	$ 0	COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
228	JORGE FRANKLIN CHICAIZZA BIRBANO	12.980.518	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.500.000																									X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	ASMET SALUD	0	$ 0	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
JOYCO																																															
229	RONCANCIO BAQUERO JUAN SEBASTIAN	1.019.115.387	GEOLOGO	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900676433	$ 3.500.000	$ 243.600	6,96%	COMPENSAR	9453491517	$ 140.000	COLPENSIONES	9453491517	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ -	
230	MARTINEZ INSUASTI ERIKA MAYRIN	1.122.783.751	INSPECTOR SST	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900676433	$ 2.500.000	$ 174.400	6,96%	EMSSANAR	9453491517	$ 100.000	PORVENIR	9453491517	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ -	
231	ROSERO AZAIN JHON FREDY	18.112.852	CADENERO 2°	$ 1.225.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900676433	$ 1.225.000	$ 85.300	6,96%	NUEVA EPS	9453491517	$ 49.000	COLPENSIONES	9453491517	$ 196.000	$ 49.000	$ 0	$ -	
JH PERFORACIONES																																															
232	MARTINEZ CORDOBA JOSE MOISES	98.354.692	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SANITAS	9453342491	$ 46.400	COLPENSIONES	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
233	ARISTIZABAL WALTHER DE JESUS	70.696.448	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SANITAS	9453342491	$ 46.400	COLPENSIONES	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
234	ASCUNTAR BURGOS BRAYAN ALEXANDER	1.120.218.181	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SALUD TOTAL	9453342491	$ 46.400	COLPENSIONES	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
235	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	97.480.695	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
236	ASCUNTAR HECTOR EMANUEL	1.120.218.512	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
237	MUÑOZ ASCUNTAR DIEGO FERNANDO	1.120.216.182	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
238	BURGOS CALDERON JHON FREDY	1.006.679.967	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
239	BOTINA DELGADO YIMI ARLEY	1.120.216.661	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	AIC	9453342491	$ 46.400	COLPENSIONES	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
240	ANDERSON YESID PAZ ORDOÑEZ	1.002.874.570	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
241	CRISTIAN ALEJANDRO MUÑOZ ERAZO	1.006.679.857	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
242	ONEY JHASMANY LOPEZ ORTIZ	1.120.217.355	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
243	MANUEL FERNANDO FLOREZ MANRIQUE	1.106.785.742	PERFORADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	FAMISANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
244	HENRY ARMANDO TREJO MEDINA	97.481.059	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
245	OSCAR DUVAN ARTEAGA BOTINA	1.125.412.591	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
246	YEISSON DANILO SOLARTE ARTEAGA	1.120.218.071	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	FAMISANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
247	KEVIN ANDRES LUNA VALLES	1.120.218.401	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
248	CARLOS ALEXIS MEZA MEZA	1.087.128.687	OPERADOR PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
249	JORGE ALEXNADER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
250	YAMIL OVIDIO GUERRA DELGADO	97.480.569	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	FAMISANAR	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
251	WILSON YAMIT ACUNTAR BIRGOS	1.120.217.106	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	FAMISANAR	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
252	JAMER DAVID NARVAEZ ACOSTA	97.481.113	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	ENMSANAR	9453342491	$ 46.400	COLFONDOS	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
253	JOSE YANEIRO AREIZA GIRALDO	15.297.068	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SALUD TOTAL	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
254	OSCAR FAVIAN MORALES PARRA	1.023.947.825	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	NUEVA EPS	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
255	JHONYS ANTONIO LAZCANO CALZETA	12.629.872	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	FAMISANAR	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
256	JIMMY ANDERSON ASCUNTAR ASCUNTAR	1.006.679.714	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
257	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	AIC	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
258	JALTIDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1.120.216.038	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ -	
259	LUIS CARLOS ANGULO LANDAZURI	1.080.837.650	OPERADOR DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SALUD TOTAL	9453342491	$ 46.400	PORVENIR	9453342491	$ 185.600	$ 33.200	$ 0	$ -	
260	ADRIAN SEBASTIAN MEDINA TREJO	1.120.217.789	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 889.334	$ 61.900	6,96%	EMMSANAR	9453342491	$ 35.600	PORVENIR	9453342491	$ 142.300	$ 35.600	$ 0	$ -	
261	YONNY FERNEY SALAS PORTILLO	1.007.254.199	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.160.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900775402	$ 734.667	$ 51.200	6,96%	NUEVA EPS	9453342491	$ 29.400	PORVENIR	9453342491	$ 117.600	$ 29.400	$ 0	$ -	
ROCAS Y DERIVADOS DE OCCIDENTES S.A.S																																															
262	JHON BENAVIDES	1.013.585.557	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	NUEVA EPS	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
263	IVAN DARIO LOPEZ	1.006.054.209	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	NUEVA EPS	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
264	HECTOR ELIAZAR GALARRAGA	5.293.553	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
265	FREDI ARLEY BRAVO LUNA	97.481.158	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
266	FABIO ANDRES DAZA GELPUD	1.085.307.360	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	NUEVA EPS	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
267	ELEMER JAIRSON BASTIDAS RUIZ	1.082.658.555	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900608304	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	68914466	$ 46.400	PORVENIR	68914466	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
NOVA SEGURIDAD VIGILANCIA																																															
268	JAMIOY JAMIOY MARCIAL	1.120.216.422	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.462.334	$ 168.900	6,96%	NUEVA EPS	9453376708	$ 97.100	PORVENIR	9453376708	$ 388.300	$ 97.100	$ 0	$ 0	
269	ANGULO BASANTE MARIA ISABEL	27.333.519	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.402.648	$ 167.300	6,96%	EMSSANAR	9453376708	$ 96.200	PORVENIR	9453376708	$ 384.500	$ 96.200	$ 0	$ 0	
270	CUASQUER BENAVIDES JAIRO ESTEBAN	1.086.897.021	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 1.712.208	$ 119.200	6,96%	EMSSANAR	9453376708	$ 68.500	PORVENIR	9453376708	$ 274.000	$ 68.500	$ 0	$ 0	
271	LUIS EDUARDO CAYAPO	76300132	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.299.217	$ 77.334	6,96%	NUEVA EPS	9453376708	$ 92.000	PORVENIR	9453376708	$ 367.900	$ 92.000	$ 0	$ 0	
272	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1.120.217.487	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.190.466	$ 152.500	6,96%	AIC	9453376708	$ 87.700	PORVENIR	9453376708	$ 350.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	
273	FRANCISCO JAVIER CUAQUER	1.086.896.607	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 1.301.134	$ 90.600	6,96%	NUEVA EPS	9453376708	$ 52.100	PORVENIR	9453376708	$ 208.200	$ 52.100	$ 0	$ 0	
274	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18.195.460	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.411.590	$ 167.900	6,96%	MALLAMAS	9453376708	$ 96.500	PORVENIR	9453376708	$ 385.900	$ 96.500	$ 0	$ 0	
275	JANETH CAROLINA CARDENAS FERREIRA	1.006.679.752	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 1.856.000	$ 129.200	6,96%	EMMSANAR	9453376708	$ 74.300	PORVENIR	9453376708	$ 297.000	$ 74.300	$ 0	$ 0	
276	ANDERSON WALDOMIRO PORTILLA ROJAS	1.085.931.458	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 1.911.825	$ 133.100	6,96%	SANITAS	9453376708	$ 76.500	PORVENIR	9453376708	$ 305.900	$ 76.500	$ 0	$ 0	
277	WILMER ARLEY CORAL ROBLES	1.120.218.162	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 999.049	$ 69.600	6,96%	EMMSANAR	9453376708	$ 40.000	PROTECCION	9453376708	$ 159.900	$ 40.000	$ 0	$ 0	
278	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18.195.278	VIGILANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 350.175	$ 24.400	6,96%	EMMSANAR	9453376708	$ 14.100	COLPENSIONES	9453376708	$ 56.100	$ 14.100	$ 0	$ 0	
279	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1.006.680.023	VIGILANTE	$ 1.160.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	9453376708	$ 0	PORVENIR	9453376708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
280	JHON JAIRO BACENAS CHALACAN	1.124.314.321	VIGILANTE	$ 1.160.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS	9453376708	$ 0	PORVENIR	9453376708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
281	JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ	97.472.744	VIGILANTE	$ 1.160.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	9453376708	$ 0	PORVENIR	9453376708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
282	CRISTIAN ALBEIRO BUESAQUILLO JACANAMEJOY	1.122.786.457	VIGILANTE	$ 1.160.000																														X	X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS	9453376708	$ 0	PORVENIR	9453376708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
INGECOL S.A.S																																															
283	ZABEDRA BELTRAN MARDOQUEO	17.287.647	OPERADOR RECILADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900499470	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	SALUD TOTAL	38389099	$ 250.000	PORVENIR	38389099	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
284	MAROQUIN LUIS ARTURO	3.111.274	OPERADOR RECILADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900499470	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	FAMISANAR	38389099	$ 250.000	PORVENIR	38389099	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
285	JHON SEBASTIAN LOPEZ PINILLA	1.086.896.540	OPERADOR RECILADORA	$ 2.000.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900499470	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
SAS JR																																															
286	DIEGO ANTONIO BRAVO LUNA NO ESTA LA PLANILLA	1.120.216.140	OPERADOR RETROEXCABADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901612747	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	NUEVA EPS	38389099	$ 145.000	PORVENIR	38389099	$ 185.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	
DOLY PADILLA																																															
287	NIXON HUMBERTO ERAZO RIASCO	1.086.894.757	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900929173	$ 1.160.000	$ 80.736	6,96%	EMSSANAR	25868751	$ 46.400	COLPENSIONES	25868751	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
ASFACON																																															
288	DIGMAR INSUSATY INSUSATY	98.346.565	OPERADOR	$ 2.535.219								X	X	X			X	X																		901168800	$ 2.535.219	$ 176.500	6,96%	SANITAS	26947703	$ 101.500	PORVENIR	26947703	$ 405.700	$ 101.500	$ 0	$ 0	
289	EDWIN EDGARDO INSUASTY INSUASTY	98.345.743	TORNILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	SANITAS	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
290	HORACIO CHAVEZ GUILLERMO	98.345.350	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	FAMISANAR	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
291	ALFONSO CORDOBA LIBARDO	98.345.900	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	NUEVA EPS	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
292	RODRIGO LIBARDO CHAVEZ RIASCOS	87.490.264	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	SANITAS	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
293	FABIAN EMILIANO PONCE CEBALLOS	98.346.022	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	SANITAS	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
294	PEDRO FERNANDO RINCONES ROSERO	1.087.958.070	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	FAMISANAR	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
295	ILDEFONSO EDILSON PORTILLA PORTILLO PORTILLO	98.346.633	RASTRILLERO	$ 1.421.232								X	X	X			X	X																		901168800	$ 1.421.232	$ 99.000	6,96%	NUEVA EPS	26947703	$ 56.900	PORVENIR	26947703	$ 227.400	$ 56.900	$ 0	$ 0	
ESTYMA																																															
296	JUAN GABRIEL ALZATE OSPINA	1.036.937.216	INGENIERO PLANEACION	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800014246	$ 6.000.000	$ 417.600	6,96%	NUEVA EPS	64532940	$ 240.000	PORVENIR	64532940	$ 960.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	
297	NESTOR AUGUSTO CORREAL RODRIGUEZ	140.119.928	CONTROL DE PROYECTO	$ 9.895.756	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800014246	$ 9.895.756	$ 688.800	6,96%	NUEVA EPS	64532940	$ 1.237.000	PORVENIR	64532940	$ 1.583.400	$ 395.800	$ 198.000	$ 296.900	
298	MIGUEL ANGEL MERA QUIMBAYO	1.114.728.857	OPERADOR DE ZONDA	$ 2.545.348	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800014246	$ 4.576.324	$ 318.600	6,96%	NUEVA EPS	64532940	$ 183.100	PORVENIR	64532940	$ 732.300	$ 183.100	$ 0	$ 0	
MUNDIAL DE TRANSPORTE SAS																																															
299	JHON JAIRO BURGOS BURGOS	1.122.782.893	CONDUCTOR CARRO TANQUE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901090940	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	AIC	27068698	$ 145.000	PORVENIR	27068698	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
FRANKLIN EDMUNDO																																															
300	JOSE LUIS ALVAREZ VALENCIA	98139061	OPERADOR EXACAVADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12969530	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	SANITAS	8625681034	$ 46.400	PROTECCIÓN	8625681034	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
AGRESUR																																															
301	CELIMO IBARRA	98.325.977	OPERDADOR VIBRO COMPACTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 1.886.000	$ 131.300	6,96%	NUEVA EPS	27035557	$ 75.500	PORVENIR	27035557	$ 301.800	$ 75.500	$ 0	$ 0	
302	JOSE GUILLERMO LUCANO VILLOTA	5.262.788	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 2.228.000	$ 155.100	6,96%	NUEVA EPS	27035557	$ 89.200	PORVENIR	27035557	$ 356.500	$ 89.200	$ 0	$ 0	
303	ALEXANDER OVIEDO	98.215.850	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMMSANAR	9454453180	$ 46.400	PORVENIR	9454453180	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	
304	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98.326.466	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 1.917.000	$ 133.500	6,96%	NUEVA EPS	27035557	$ 76.700	PROTECCION	27035557	$ 306.800	$ 76.700	$ 0	$ 0	
305	IVAN FERNANDO BURBANO ORTEGA	98.325.386	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 503.000	$ 35.100	6,96%	NUEVA EPS	27035557	$ 20.200	COLPENSIONES	27035557	$ 80.500	$ 20.200	$ 0	$ 0	
306	OSCAR RENE PEJENDINO	1.120.217.604	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.160.000																													X	X	X	X	900031078			6,96%	SANITAS			PORVENIR				$ 0	$ 0	
GSG																																															
307	LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO	4.613.319	GERENTE OPERATIVO	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 5.500.000	$ 382.800	6,96%	SURA	9453400914	$ 220.000	PROTECCIÓN	9453400914	$ 935.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	
308	IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO	76.314.345	PERFORADOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 3.343.750	$ 238.200	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 133.800	COLPENSIONES	9453400914	$ 535.000	$ 133.800	$ 0	$ 0	
309	JUAN GABRIEL USUGA OLIVEROS	8.085.511	PERFORADOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 3.562.500	$ 248.000	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 142.500	PORVENIR	9453400914	$ 570.000	$ 142.500	$ 0	$ 0	
310	JESUS ARLEY TAPIAS JIMENEZ	1.039.688.290	TECNICO DE PERFORACION	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 3.031.250	$ 211.100	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 121.300	PORVENIR	9453400914	$ 485.000	$ 121.300	$ 0	$ 0	
311	JHON ALEJAN DRO ARANGO UPEGUI	8.016.014	MECANICO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 4.156.200	$ 289.300	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 166.300	PROTECCIÓN	9453400914	$ 665.000	$ 166.300	$ 0	$ 0	
312	JORGE MAURICIO AGUEDLO MONSALVE	3.539.711	SUPERVISOR	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 4.575.000	$ 318.500	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 183.000	PROTECCIÓN	9453400914	$ 732.000	$ 183.000	$ 0	$ 0	
313	EVINSON PEREA PALACIOS	1.003.984.003	OPERADOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 3.031.250	$ 211.000	6,96%	SURA	9453400914	$ 121.300	PORVENIR	9453400914	$ 485.000	$ 121.300	$ 0	$ 0	
314	VERANIA ALEJANDRA GOMEZ PRADO	1.124.855.138	RESIDENTE SST	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 4.112.500	$ 286.300	6,96%	SURA	9453400914	$ 164.500	COLPENSIONES	9453400914	$ 658.000	$ 164.500	$ 0	$ 0	
315	DANIEL ANDRES ESTRADA MEZA	71.266.227	DIRECTOR TECNICO DE GEOLOGIA	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 4.500.000	$ 313.200	6,96%	COOSALUD	9453400914	$ 180.000	COLPENSIONES	9453400914	$ 720.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	
316	ELKIN ALFONSO PULGARIN SUAREZ	98.471.027	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 2.137.500	$ 148.800	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 85.500	COLPENSIONES	9453400914	$ 342.000	$ 85.500	$ 0	$ 0	
317	MANUEL PEREGRINO SOLARTE ACOSTA	97.480.994	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 1.687.500	$ 117.500	6,96%	EMMSANAR	9453400914	$ 67.500	PORVENIR	9453400914	$ 270.000	$ 67.500	$ 0	$ 0	
318	HENRY FABIO TAPIA CHANA	97.481.106	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 2.268.750	$ 158.000	6,96%	AIC	9453400914	$ 90.800	PORVENIR	9453400914	$ 363.000	$ 90.800	$ 0	$ 0	
319	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1.123.324.445	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 2.031.250	$ 141.400	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 81.300	PORVENIR	9453400914	$ 325.000	$ 81.300	$ 0	$ 0	
320	HERMAN PABLO MAIGUAL CAICEDO	97.480.496	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 2.495.938	$ 173.800	6,96%	EMMSANAR	9453400914	$ 99.900	COLPENSIONES	9453400914	$ 399.400	$ 99.900	$ 0	$ 0	
321	JORGE IVAN OSORIO VASQUEZ	71.175.414	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 450.000	$ 31.400	6,96%	NUEVA EPS	9453400914	$ 18.000	PORVENIR	9453400914	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	
322	OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA	97.472.252	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 500.000	$ 34.800	6,96%	AIC	9453400914	$ 20.000	PROTECCCION	9453400914	$ 80.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	
323	FREDY ALBEIRO FUENMAYO SALCEDO	1.120.217.227	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 500.000	$ 34.800	6,96%	EMMSANAR	9453400914	$ 20.000	PROTECCION	9453400914	$ 80.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	
324	MESIAS MONTERO TRUJILLO	1.082.128.722	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901666469	$ 550.313	$ 34.800	6,96%	ENMSANAR	9453400914	$ 20.000	PORVENIR	9453400914	$ 80.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	
LUIS FERNANDO BRAVO CAÑON																																															
325	LUIS FERNANDO BRAVO CAÑON	97.481.152	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	97481152	$ 1.160.000	$ 80.800	6,96%	EMSANAR	9453400914	$ 145.000	PORVENIR	9453400914	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	
TRANSTUMACO																																															
326	JHON FREDY ROMO PATIÑO	1.086.896.558	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900876755	$ 812.000	$ 35.400	6,96%	NUEVA EPS	69294140	$ 101.500	PORVENIR	69294140	$ 130.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	
CONSTRUCONCRETO																																															
327	JOSE GUILLERMO BUITRAGO ZAMBRANO	1.124.859.604	CONDUCTOR MIXER	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901438750	$ 1.400.000	$ 97.500	6,96%	NUEVA EPS	9454290872	$ 56.000	PORVENIR	9454290872	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	
328	RONALO ANDRES MONSALVE GURRUTE	1.083.918.459	CONDUCTOR MIXER	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901438750	$ 1.400.000	$ 97.500	6,96%	NUEVA EPS	9454290872	$ 56.000	COLPENSIONES	9454290872	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	
CONCONCRETO																																															
329	WILFER YADIR LONDOÑO ARDILA NO HAY PLANILLA	98.708.908	ASESOR TECNICO	$ 1.160.000							X	X	X	X																						890901110	$ 1.160.000	$ 0	6,96%	EPS SURA		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
HONDAS PERFORACIONES																																															
330	CARLOS HERNAN PACHECO TRIGOS	1.064.838.354	OPERADOR DE PERFORACION	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900774322	$ 886.667	$ 61.000	6,96%	EPS SURA	64401620	$ 35.500	PORVENIR	64401620	$ 141.900	$ 35.500	$ 0	$ 0	
331	ALVEIRO RICHARD RINCON PACHECO	1.092.174.387	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900774322	$ 1.220.129	$ 85.000	6,96%	ASME SALUD	64401620	$ 48.900	PORVENIR	64401620	$ 195.300	$ 48.900	$ 0	$ 0	
332	DIEGO JOSE CARDENAS TRILLOS	1.064.841.694	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900774322	$ 1.313.934	$ 91.500	6,96%	SALUD TOTAL	64401620	$ 52.600	PORVENIR	64401620	$ 210.300	$ 52.600	$ 0	$ 0	
333	MARIO ANDRES NATI PASTAS	122.782.544	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.400.000	X	X	X	X																												900774322	$ 373.334	$ 26.000	6,96%	EMMSANAR	64401620	$ 48.900	PORVENIR	64401620	$ 195.300	$ 48.900			
334	LIBARDO ASCUNTAR MAYA	97.480.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900774322	$ 0	$ 0	6,96%	AIC	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		1
		PÁGINA 1
		FECHA 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN_FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
WN CONSTRUCCIONES																																																	
335	BRANDON LUIS LOPEZ NAVARRO	1.004.236.174	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 32.000	6,96%	NUEVA EPS	69255964	18.800	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800	$ 0	$ 0	
336	LUIS ALIRIO DUARTE SUAREZ	18.195.388	OFICAL DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 32.000	6,96%	SANITAS	69255964	18.800	PROTECCION	69255964	$ 74.300	18.800	$ 0	$ 0	
337	OMAR JESUS NAVARRO	12.749.534	MAESTRO DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 800.000	$ 55.700	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 128.000	$ 32.000			
338	EDUARDO SEBASTIAN ROJAS SUAREZ	1.120.218.440	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
339	LUIS ALFONSO ARTEAGA DELGADO	97.480.296	OFICIAL DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
340	WILSON GIOVANY NAVARRO	80.252.216	GERENTE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 8.000.000	$ 556.800	6,96%	EPS SURA	69283389	320.000	PROTECCION	69283389	$ 1.280.000	320.000			
341	JESUS ANDRES LOPEZ	1.085.262.316	OFICIAL DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
342	JANIER ADRIAN DIAZ TIMARAN	1.006.851.022	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 480.000	$ 30.700	6,96%	EMMSANAR	69255964	17.600	PORVENIR	69255964	$ 76.800	17.600			
343	DUVAN ARLEY MONSALVE	1.193.208.524	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 484.001	$ 30.900	6,96%	SALUD TOTAL	69255964	17.800	PORVENIR	69255964	$ 77.500	17.800			
344	CRISTIAN GUILLERMO MORALES ARRIETA	73.194.296	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
345	LUIS EDUARDO RIVERA VITOLA	1.108.759.900	AYDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	SALUD TOTAL	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
346	JUAN DAVID MUÑOZ CARMONA	1.068.583.844	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 1.500.000	$ 87.000	6,96%	EPS SURA	69255964	60.000	PORVENIR	69255964	$ 240.000	60.000			
347	CRISTIAN DANILO MADERA TORRES	1.002.299.763	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 464.000	$ 17.100	6,96%	EMMSANAR	69255964	32.000	PORVENIR	69255964	$ 74.300	18.800			
348	KRIS KIMBERLYN ROMERO LLAMAS	1.047.377.132	COORDINADORA SST	$ 1.160.000					X	X	X	X	X	X	X																					901245322		$ 0	6,96%	SURA	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
349	BRYON JHONATAN PUCHANA PUCHANA	1.086.225.026	ARMADOR DE ESTRUCTURA PUENTES	$ 1.160.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	SANITAS	$ 0	$ 0	COLPENSIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
350	GERMAN STIVEN BUSTAMANTE MONTALVO	1.004.302.208	ARMADOR DE ESTRUCTURA PUENTES	$ 1.160.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	SALUD TOTAL	$ 0	$ 0	COLPENSIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
351	ANDERSON ALEJANDRO MADROÑERO NAVARRO	1.086.225.750	ARMADOR DE ESTRUCTURA PUENTES	$ 1.160.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	EMMSANAR	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
352	OSCAR LIBARDO CARLOZAMA NAVARRO	1.086.222.392	ARMADOR DE ESTRUCTURA PUENTES	$ 1.160.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	EMMSANAR	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
353	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	INSPECTOR SST	$ 1.160.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
354	LUIS MARTIN GAMBOA URBINA	98.325.385	ENCARGADO DE OBRA	$ 1.160.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	SURA	$ 0	$ 0	COLPENSIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
355	WILFREDO RAMIREZ ARBOLEDA	94.287.235	AYUDANTE	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
356	YORMIN PEREZ TORRES	180.106.722	OFICIAL PILERO	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
357	ANTONIO WILLIAM TISOY CHASOY	97.480.900	AYUDANTE	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0	6,96%	AIC	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
358	YAKELINE ELIZABETH MEDINA TREJO	1.120.217.623	AUX SST	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322		$ 0		AIC	$ 0	$ 0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CONSTRUCCIONES JEA																																																	
359	JESUS ALFREDOI DE LA CRUZ ORTIZ	1.086.224.463	OFICIAL	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
360	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1.120.218.600	AYUDANTE	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
361	EIDER MAURICIO CERON	97.481.136	INSPECTOR SST	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
362	DUVAN ARLEY PUCHANA PUCHANA	1.086.225.444	OFICIAL DE OBRA	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
363	DIEGO ANDRES DORADO NAVARRO	1.007.301.570	OFICIAL DE OBRA	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
364	JHON BERNARDO URBINA	1.086.223.306	GERENTE OPERATIVO	$ 1.160.000																								X	X	X	X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
365	LUIS REINALDO PEREZ PEREZ	98.650.547	OFICIAL DE OBRA	$ 1.160.000																											X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
366	GUILLERMO ANDRES JOSA SUAREZ	1.120.218.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000																											X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
367	ROBIN ANDRES RIOS GOMEZ	11.251.890.346	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000																											X	X	X	X	X	901245322	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	$ 0	0	PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El señor JHON FREDY ROMO PATIÑO identificado con cedula N°1.086.896.558, quien se desempeña como conductor en frente Mallama, realiza un aporte a ARL con riesgo 4, por lo tanto el contratista deberá realizar el cambio a riesgo 5 de manera inmediata dado que el trabajador al realizar el transporte de personal en los frentes de obra se encuentra expuesto a riesgos asociados a la actividad de construcción de obras civiles.

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre : HECTOR FABIO SANCHEZ QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
Matrícula No.: 17202-44540

Firma

Nombre: LUIS JOSE ORDOÑEZ SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-09493 CUN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, LUIS JOSÉ ORDÓÑEZ SALCEDO, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030., CERTIFICO que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901476840-1, realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco de acuerdo con lo relacionado en la planilla N° 9453583115 con fecha de pago el día 14 de julio de 2023, la cual fue presentada a Interventoría junto con la certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscrita para el periodo del mes de junio con el pago de ARL, CCF y AFP, y para el mes de julio con el pago de salud.

Lo anterior con excepción del señor JHON FREDY ROMO PATIÑO identificado con cedula N°1.086.896.558, quien se desempeña como conductor en frente Mallama y realiza un aporte a ARL con riesgo 4, por lo tanto el contratista deberá realizar el cambio a riesgo 5 dado que el trabajador al realizar el transporte de personal en los frentes de obra se encuentra expuesto a riesgos asociados a la actividad de construcción de obras civiles.

Se expide el certificado el día 8 de agosto de 2023.

LUIS JOSE ORDÓÑEZ SALCEDO
Matrícula Profesional No. 25202-09493 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio San Francisco** identificado con nit 901.591.251 - 5, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, certifica que el consorcio en mención se encuentra al día del Periodo Junio CCF AFP ARL y EPS Julio a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (29) veintinueve días del mes de Julio de 2023.

Cordialmente,

Camilo Ángel Machado.
Representante legal.
Consorcio San Francisco
