Ingeniero:
RICARDO BÁEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de Mayo del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$125.139.313,00 (Hasta el mes de mayo)		
SALDO POR AMORTIZAR:	$26.641.571.168,00 (Hasta el mes de Mayo)		
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de Agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	$ 6,403,484,402
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	$ 16,723,445,008
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	$ 133,000,000
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	$ 3.740.070.590
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	$ 4.349.941.438
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	$4.419.652.085
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	$67.930.851
TOTAL						**$** 50.781.362.068	**$** 33.837.524.374

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$ 4.103.487	$ 29.987	$ 4.133.474
Acta de Ajuste Provisional No. 1	$ 37.301	$ 273	$ 37.574
Acta de Ajuste Definitiva No.1	$ 23.923	$ 175.00	$ 24.098
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$146.804.000	$ 27.892.760	$ 174.696.760
Acta de Ajuste Definitiva No. 2	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$ 83.540.800	$ 15.872.752	$ 99.413.552
Acta de Ajuste Definitiva No. 3	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$ 73.402.000	$ 13.946.380	$ 87.348.380
Acta de Ajuste Definitiva No. 4	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 143.837.978	$ 14.461.104	$ 158.299.082
Acta de Ajuste Provisional No. 5	$ 1.233.477	$ 9.014	$ 1.242.491
Acta de Ajuste Definitiva No.5	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	$ 1.804.851.793	$ 40.009.263	$ 1.844.861.056
Acta de Ajuste Provisional No.6	$ 36.175.479	$ 264.359	$ 36.439.838
Acta de Ajuste Definitiva No.6	$ 2.802.978	$ 20.483	$ 2.823.461
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$204.973.305	$1.497.882	$ 206.471.187
Acta de Ajuste Definitiva No. 7	$ 3.879.503	$ 28.350	$ 3.907.853
Acta de Recibo Parcial definitivo No.8	$ 23.704.000	$ 173.222	$ 23.877.222
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	$ 8.843.072	$ 64.622	$ 8.907.694
Acta de Recibo Parcial de obra No.10	$ 285.669.557	$ 2.087.585	$ 287.757.142
Acta de Ajuste Provisional No.10	$ 5.053.041	$ 36.926	$5.089.967
Acta de Recibo Parcial de obra No.11	$31.008.428	$226.600	$ 31.235.028
Acta de Recibo Parcial de obra No.12	$34.853.377	$254.698	$35.108.075
Acta de Recibo Parcial de obra No.13	$326.848.178	$2.388.506	$329.236.648
Acta de Recibo Parcial de obra No.14	$184.987.646.00	$1.351.833	$186.339.479
Acta de Recibo Parcial de obra No.15	$702.748.741,00	$5.135.472,00	$707.884.213,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.16	$156.403.176,00	$1.142.946,00	$157.546.122,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.16	$1.483.763.831,00	$10.842.890,00	$1 .494.606.721,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.17	$542.182.771,00	$3.962.105,00	$546.144.876,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.17	$968.550.355,00	$7.077.868,00	$975.628.223,00
Acta de Ajuste Definitiva No.17	$150.598.904,00	$1.100.530,00	$151.699.434,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.18	$ 2.615.705.213,00	$ 19.114.769,00	$2.634.819.982,00
Acta de Ajuste Definitiva No.18	$213.962.099,00	$1.563.569,00	$ 215.525.668,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.23 de fecha 1 hasta el 31 , para el periodo de Mayo , Se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 45.404.658.622,00	8,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 17.043.742.216,00	3,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.245.567.695,00	5,19%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$18.289.309.911,00	3,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 27.000.000.000,00
Amortizado	$ 139.681.662,00
Saldo	$ 26.860.318.338,00

1.4.3. FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **8,33%**

Meta física ejecutada %: **3,13%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **8,33%** **$**45.404.658.622,00 (hasta 31 de Mayo de 2023)

% Básico ejecutado acumulado: **3,13%** **$**17.043.742.216,00 (hasta 31 de Mayo de 2023)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

*En este mes no se presentaron novedades.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **Mayo** de 2023, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518 emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, aun cuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Poliza de Cumplimiento y Anexo 1 Poliza RCE mediante MEMORANDO No.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	$1.424.177.119,91
TOTAL						**$9.399.892.900**	

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 julio 2021	$ 55.775.509	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71
Acta Mensual de Costos No. 2 agosto 2021	$ 111.391.256	$ 21.164.338,64	$ 133.555.594,64
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2021	$ 171.906.690	$ 32.662.271,10	$ 171.906.690,00
Acta Mensual de Costos No. 4 octubre 2021	$ 168.729.017	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23
Acta Mensual de Costos No. 5 noviembre 2021	$201.685.143	$ 38.320.177,17	$ 240.005.320,17
Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2021	$252.459.724	$ 47.967.347,56	$ 300.427.071,56
Acta Mensual de Costos No.7 enero 2022	$1.569.504.467,46	$27.718.990,15	$ 173.608.411,99
Acta Mensual de Costos No.8 febrero 2022	$ 289.963.955,65	$55.093.151,57	$ 345.057.107,22
Acta Mensual de Costos No.9 marzo 2022	$ 311.380.258	$ 59.162.249,02	$ 370.542.507,02
Acta Mensual de Costos No.10 abril 2022	$ 321.306.802	$ 61.048.292,38	$ 382.355.094,38
Acta Mensual de Costos No.11 mayo 2022	$ 301.508.710	$ 57.286.654,90	$ 358.795.364,90
Acta Mensual de Costos No.12 junio 2022	$ 304.824.900	$ 57.916.731,00	$ 362.741.631,00
Acta Mensual de Costos No.13 julio 2022	$ 347.201.900	$ 65.968.361,00	$413.170.261,00
Acta Mensual de Costos No.14 agosto 2022	$362.022.100,00	$68.784.199,00	$430.806.299,00
Acta Mensual de Costos No.15 septiembre 2022	$ 370.972.663,55	$ 70.484.806,07	$ 441.457.469,62
Acta Mensual de Costos No.16 octubre 2022	$ 364.756.540,00	$ 69.303.742,60	$ 434.060.282,60
Acta Mensual de Costos No.17 noviembre 2022	$ 400.550.939,20	$ 76.104.678,45	$ 476.655.617,65
Acta Mensual de Costos No.18 Diciembre 2022	$ 382.577.918,40	$72.689.804,50	$455.267.722,90
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.2. Mayo 2023	$460.461.879,20	$ 87.487.757,05	$ 547.949.636,25

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.093.180.249,31
Valor Saldo por Amortizar	$ 36.208.220,69

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 De fecha de 1 al 31 para el período, Mayo del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 9.293.055.358 19,36**%**
Total, inversión ejecutada: $ 9.087.587.433 18,93**%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

-En comunicación Putumayo04-0022-21 del 13 de Julio de 2021 se radica a la Dirección de Contratación Grupo Asuntos Contractuales de INVIAS la Actualización de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en razón a la Orden de Inicio (Anexo 4). Pendiente Acta de aprobación deGarantías con Orden de Inicio (Anexo 4).

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
2769	DT-PUT 28625	19-may-23	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Su comunicación putumayo04-2749-23. Solicitud verificación – Diseños Mallama Ricaurte.
2837	DT-PUT30803	31-may-23	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	PQR Vehículo INVIAS Chevrolet DIMAX JNZ-073
2838	DT-PUT30857	31-may-23	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Traslado petición JHERSON ORLANDO SOTO ORTIZ

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
3148	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Acta de obra No.22 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
3269	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Reiteración nuestro comunicado Putumayo04-2760-23 radicado INVIAS N° 18468 del 24/02/2023 con asunto; Respuesta su oficio DT-PUT-7997 con recibo interno 04-2292-23 del 21/02/2023 con asunto; SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEOBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Céreo de material de subrasante entre K1+400 al K1+490.

* Céreo de material de subbase entre el K 1+100 al K1+400 margen derecha, en varios puntos de este sector se presentan hundimientos y se realiza reproceso de material con la adición de cemento.

* Instalación de MR45 entre el K 0+770 al K 0+815 por el carril derecho.

* Desalojo de material acopiado en varios puntos sobre el sector 1 entre el K 4+800 al K 6+200 producto de la limpieza de cunetas y es acopiado en la zona industrial del contratista de obra.

* Actividades de perforación como parte de la exploración geotécnica en las siguientes abscisas K 8+298, K 8+ 393, K 8+512, K 8+ 544 y K 8+699.

* Puente 6 (K5+761 al K5+828): Continua revisión de Diseño de Apoyo Intermedio Puente No.6, se requirió realizar levantamiento topográfico conjunto Obra e interventoría de lo ya construido y terreno. Se realizó levantamiento topográfico viga riostra puente # 6.

* Puente No. 8 (K6+620 - K6+712): Se realizan trabajos en la parte baja del puente en apoyo No. 2, perforación, instalación e inyección de concreto en 10 pernos e instalación de 10 drenes longitudinales.
* Talud del K 6+710 al K 6+900 margen derecho: Se continua con los trabajos de perforación para instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y control del mismo.

* Puente No. 9 (K6+959 - K7+004): Se realiza fundición de caisson No 1 del eje 1 y caisson 3 y 4 eje 2, posteriormente se realiza instalación de acero para pila en los caissons 1 y 2 del eje No 1.

* Puente No. 9A (K7+130-K7+190): Se continúa con la actividad de excavación y fundición de los anillos sobre los caisson´s 1, 3, 4, 5 y 6, las profundidades son 4.88 m, 8.61 m, 6.44 m, 11.00 m, 5.92 m respectivamente.

* Muro No 1 (K 7+293 - K 7+330): Se continua con la actividad de excavación y fundición de anillos falsos y reales sobre los caisson's No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, las profundidades son 6.91 m, 7.52 m, 1.73 m, 0.68 m, 1.53 m, 6.18 m, 6.37 m, 5.68 m, 2.98 m, 0.54 m y 0.17m respectivamente.

* Puente 10 (K7+350 al K7+380): Se avanza con la actividad de adecuación manual de la plataforma del estribo No.2, para posteriormente localizar e iniciar la excavación de los caisson.

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

* Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista

* Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.

* Se asiste a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.

* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el propósito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.

3.2 SOCIALES

* Se recepciona una solicitud DP del propietario del predio 019 sector 1, con el fin de agilizar el proceso de escrituración.

* El profesional social realiza el cierre de las PQR- 51 Solicitud de entrega de información del camino sachamates, 44 Solicitud de intervención del camino Chorlavi.

* El 30 de mayo 2023, se realiza el recorrido con la JAC, Oficina de Planeación, área técnica y social del contratista e interventoría con el fin de evaluar los puntos a intervenir para el arreglo de la vía y la descolmatación de la Bocatoma, compromiso el contratista entregará un plan presupuestal para ser revisado y evaluado por la interventoría y la entidad, y dar una respuesta a la solicitud de la comunidad.

* Se realiza las capacitaciones al personal de obra en temas de áreas social, ambiental, SST y arqueología.

4. FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Fresado de pavimento carril derecho entre PR57+580 al PR57+600 y entre el PR 51+000 al PR51+504.

* Imprimación con emulsión asfáltica carril derecho entre PR57+390 al PR57+610 y entre el PR 59+200 al PR 59+360.

* Instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 carril derecho entre PR 57+416 a PR 57+620 y entre PR59+000 a PR59+360.

* Instalación de base granular estabilizada carril derecho entre el PR57+560 al PR57+600 y entre el PR52+952 al PR53+030.

* Instalación de base granular estabilizada carril izquierdo entre el PR52+940 al PR53+030.

* Corte, limpieza, e imprimación de junta longitudinal entre el PR 57+390 al PR 57+610.

* Toma de Densidades y ensayo de Planicidad entre PR 59+200 al PR 59+360 CD, PR 57+390 al PR 57+600 CD, PR 52+952 al PR 53+030 CD y entre PR 52+940 al PR 53+030 CI.

* Replanteo, marcación de eje y materialización de normales entre PR 48+900 al PR 51+510.

4.1 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de la fichas del PAGA V3, por parte del contratista se adelantan las gestiones ante la alcaldía Municipal de Mallama para la donación del material de fresado y se realiza el seguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de trámite de la obtención del acto administrativo para la concesión de aguas en el Rio Guabo.

4.2 SOCIALES

* no se han recepcionado PQR por parte de la comunidad.

* Por parte del área social se hace seguimiento con el fin de verificar los tramos ya intervenidos para el cierre de actas de vecindad.


5. PREDIALES

* En elaboración de las Fichas prediales para los predios 260-I-T4-CMMVSFM, 264-I-T4-CMMVSFM, 264-SPI, 285-SPI, 286-SPI, 288-SPI

* En elaboración de los estudios de títulos para los predios 260-I-T4-CMMVSFM, 264-I-T4-CMMVSFM, 264-SPI.

Predios en los que se está haciendo gestión predial:

No. FICHA PREDIAL	No. CEDULA POSEEDOR O PROPIETARIO	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	GESTION DE AVACE
001-D-M-T3-CMMVSFM	27.354.914	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
002-D-M-T3-CMMVSFM	5.297.533	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
004-D-M-T3-CMMVSFM	18.106.245	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
005-D-M-T3-CMMVSFM	27.355.196	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
008-D-M-T3-CMMVSFM	18.125.188	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
009-D-M-T3-CMMVSFM	5.297.292	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
010-D-M-T3-CMMVSFM	1.105.781.093	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
011-D-M-T3-CMMVSFM	12.820.263	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
012-D-M-T3-CMMVSFM	18.126.911	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
013-D-M-T3-CMMVSFM	18.125.188	LA NACION/MEJORATAR	Permiso de intervención
264-SPI	12.820.106 12.820.263	MARINO LUCIO MONCAYO	Pasivo predial
264A-SPI	69007175	NUBIA YANURY NARVAEZ DUARTE	Pasivo predial
264A-SPI	69007175	NUBIA YANURY	Pasivo predial
285- SPI	5.297.974 27.354.052	HERNANDO PEDROSO PEZ	Pasivo predial
286-SPID	18.126.036	PEDRO MAURO BOTINA GUERRERO	Pasivo predial
288-SPI	5.297.488 27.352.761	VICTORIANO ADONAIS APRÁEZ	Pasivo predial
291-D-T4-CMMVSFM (291-SPI)	18.123.365	JUAN CUCHO VALLEJO	Pasivo predial
314 -D– T4-CMMVSFM	18.125.858	ABEL SAUL AVILA GOMEZ	Pasivo predial
338 D	27.351.903	RAQUEL ALVAREZ DE TEY	Pasivo predial

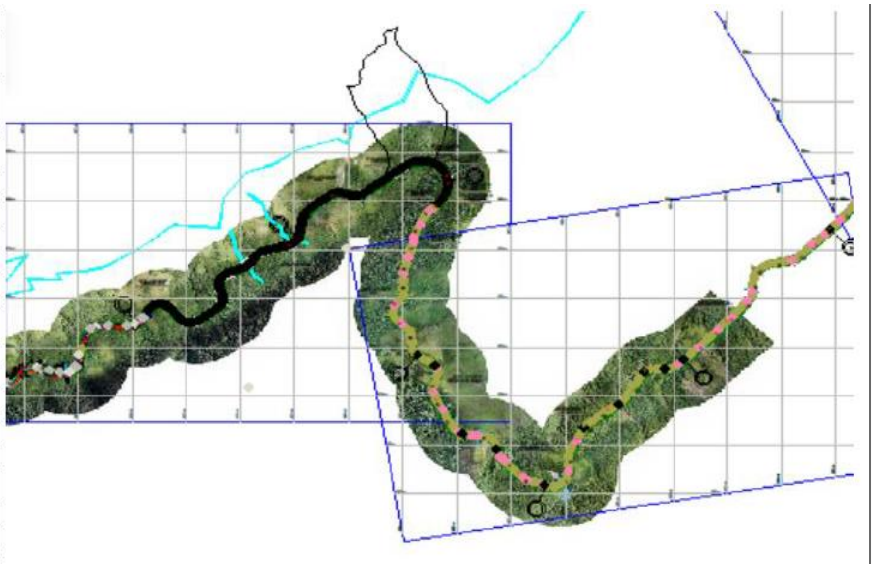

6. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

* Elaboración de informe mensual mayo 2023 de sostenibilidad de interventoría.

* El 25 de mayo el contratista da respuesta a las comunicaciones CSF-424-109117 (04-2128- 23), CSF-485-110157(04-2257-23), CSF-566 – 112504 (04-2449-23), CSF-620-113232 (04-2576-23), donde se realizaron observaciones a los Informes mensuales de Sostenibilidad No. 18, 19, 20 y 21, los cuales se encuentran en revisión.

* En proceso de consolidación informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

7. ASPECTOS JURÍDICOS

- Revisión del Diagnostico Predial Sector 2 y Diagnostico predial del sector 1

- Revisión de la Respuesta a su oficio SS 23935 (04-2722-23). Respuesta a Entrada No. 38064 con Fecha 18 de abril de 2023. Remisión de los ajustes de los ICAS No 15,16, 17.

- 6. Revisión de la comunicación Apremio No.1 Red geodésica única. Respuesta a comunicación CSF-698 -113884 con radicado interno 04-2765-23M1 con asunto: "Ecuación de empalme topográfico Sectores 1 y 2"

- Revisión a la respuesta Comunicado CSF-691-113679, con radicado interno 04-2754-23M1, con asunto "Respuesta al comunicado Putumayo 04-3147-23, Apremio No. 3 "Atraso en obra frente al Plan de contingencia vigente y otras irregularidades en obra".

8. ASPECTOS DMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

*****No se presentaron novedades aspectos administrativos.

9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**

Durante este periodo no se presentaron comisiones.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Inicio actividades de pavimento en el K1+160 al K1+290. VSFM-S1	 Instalación de acero de refuerzo para los caissons 1 y 2 de puente 9. VSFM-S2.	 Mezcla asfáltica MDC19 entre el PR57+114 al PR57+266 CI.
SEMANA #2	 Instalación y cereo de subbase entre el K0+770 al K1+000 CD. VSFM-S1	 Instalación de acero de refuerzo para caissons 3 y 4 de puente 9. VSFM-S2	 Mezcla asfáltica MDC19 entre el PR 57+834 AL 58+030 CD.
SEMANA #3	 Instalación y cereo de subbase entre el K1+000 al K1+200 CD. VSFM-S1.	 Colocación de concreto en caisson No. 2, Puente 9. VSFM-S1	 Mezcla asfáltica MDC19 entre el PR58+310 al PR58+611 CD.
SEMANA #4	 Instalación de MR45 entre el K 0+770 -K 0+815 CD. VSFM-S1.	 Colocación de concreto en caisson No. 4 eje No. 2, Puente 9. VSFM-S1	 Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 PR 57+416 al PR 57+620 CD. Mallama, Ruta 1002

2. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó la revisión y está en trámite de aprobación el acta de costos N°22 correspondiente del mes de Abril de 2022.
- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021.
- Se realizo el trámite de las actas de obra No.21 del mes de abril.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra durante el periodo de Mayo.

3. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- En el marco de los contratos para el sector 2 y 3, no se han tramitado ante las autoridades ambientales solicitud de permisos o autorizaciones, hasta tanto no se tenga la reingeniería de los sectores 2 y 3. Una vez se tenga ladefinición de la reingeniería se solicitará una modificación de la licencia ambiental ante ANLA y una ampliación del polígono de sustracción de la RFPCARM ante la DBBSE.
- Para el sector de San Francisco en este periodo se reportó una contingencia en el talud del K 6.
- Se encuentra a la espera de los ajustes a diseños mencionados tanto en el frente San Francisco como en el frente Mocoa, relacionados con cada uno de los documentos revisados y las observaciones realizadas en los mismos. Esto mientras se realizan revisiones a otras obras entregadas.
- A la fecha se revisó y dio aval por parte del área técnica de pavimentos de la interventoría a los informes del pre diseño pavimentos del sector 2 y sector 3 de los frentes Mocoa y San Francisco.
- Se cuenta con documento de metodología para el desarrollo de los estudios y diseños de pavimentos fase III para el sector 2 Mocoa y sector 3 San Francisco.
- Se cuenta con aprobación del informe de estudios y diseño del sector entre el k10.6 hasta el al k13.6 y del K2 al K4 sector 4 y el tramo del sector 1, de igual forma está aprobado el diseño del sector del k7 al k8+100. Queda pendiente que el contratista entregue o atienda las observaciones del informe de pavimentos del sector de empalme entre el sector 1 y 2.

- Aunque la definición del estado de actividad de la Falla del Frente San Francisco no es del alcance el componente estructural, éste lo deberá tener en cuenta para definir las implicaciones en el análisis sísmico de las estructuras que lo requieran en la Fase 3 del proyecto. Ver artículo 3.10.2 – Amenaza sísmica – del Código Colombiano de diseño sísmico de Puentes – 2014. (CCP-14).

  - Con relación al proceso social de la intervención del camino de Sachamates, es importante mencionar que se debe tener en cuenta las recomendaciones que se han dejado en los distintos espacios de reuniones y concertaciones, en el entendido que es un tema de interés no solo para el tema de comunidades campesinas sino también la relevancia desde el punto de vista cultural para las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto.

  - Con relación a los procesos de consultas previas, se hace necesario continuar los acercamientos internos con las dos comunidades en aras de poder avanzar por lo menos en la consolidación de una propuesta borrador de ruta metodológica, la cual permita orientar los respectivos procesos y permitir avanzar con este requisito para la posible modificación de la Licencia Ambiental.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: Eliana Alexandra Hortua NofuyaApoyo DTP
