3289

6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

PRELIMINARES DEMOLICIONES



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 26-06-2024

ITEM: COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 29-06-2024

ITEM: COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans

PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 28-06-2024

OBSERVACIONES FRENTE A LA SEÑALIZACIÓN EN CAMPO



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 28-06-2024

VERIFICACIÓN DE BOTIQUÍN, EXTINTOR Y CAMILLA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3291

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

PERSONAL DE INTERVENTORIA RECORRIDO EN OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 02-07-2024
RECORRIDO Y VERIFICACIÓN EN OBRA



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 5-07-2024
RECORRIDO Y VERIFICACIÓN EN OBRA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 05-07-2024
RECORRIDO Y VERIFICACIÓN EN OBRA



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 08-07-2024
RECORRIDO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 31 / 7 / 2024 D M A
TIPO CONTRATO INTERVENTORIA	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER** INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		**SUPERVISOR** ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 04-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 04-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 04-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 04-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 31 / 7 / 2024 D M A
TIPO CONTRATO INTERVENTORIA	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER** INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		**SUPERVISOR** ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 11-07-2024
COMITÉ CAMPO



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 11-07-2024
COMITÉ CAMPO



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 11-07-2024
COMITÉ CAMPO



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 11-07-2024
COMITÉ CAMPO

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
		31 / 7 / 2024 (D / M / A)
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3295

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
		31 / 7 / 2024 (D / M / A)
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 7 A: 2024
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
COMITÉ OFICINA DE INTERVENTORIA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 01-07-2024

ITEM: EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vías-



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 05-07-2024

ITEM: EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vías-

EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 08-07-2024

ITEM: RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 12-07-2024

ITEM: RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS

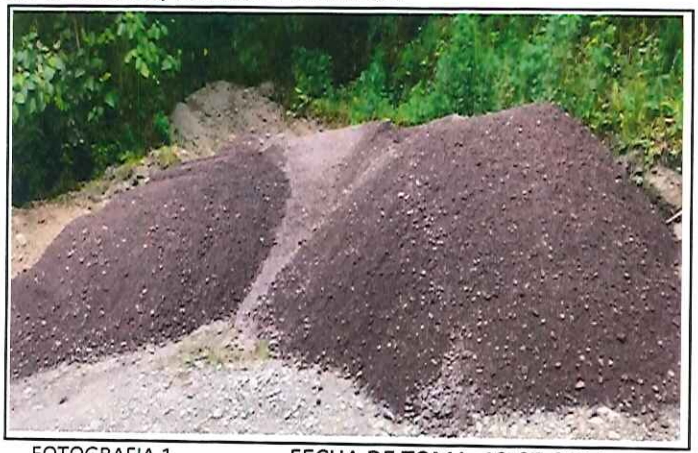

FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 13-07-2024


ITEM: SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 15-07-2024

ITEM: SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km

EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS

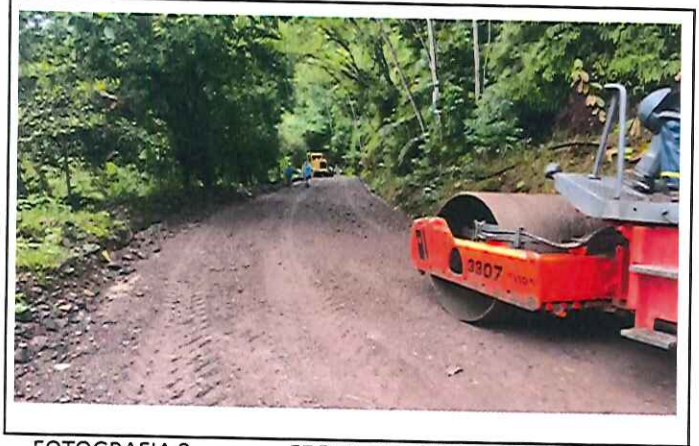

FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 16-07-2024

ITEM: SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 17-07-2024

ITEM: SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3299

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	SECRETARIA LIDER		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 19-07-2024
ITEM: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa,(4200 kg/cm2,G60)



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 20-07-2024
ITEM: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa,(4200 kg/cm2,G60)

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 22-07-2024
ITEM: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa,(4200 kg/cm2,G60)



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 23-07-2024
ITEM: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa,(4200 kg/cm2,G60)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3.300

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 26-07-2024

ITEM:PLACA HUELLA(20.7Mpa,3000psi)e=0.15m.Inc hierro.



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 27-07-2024

CONCRETO VIGA CIMENTA. 20,7MPa,(3000 PSI)

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 28-07-2024

ITEM:PLACA HUELLA(20.7Mpa,3000psi)e=0.15m.Inc hierro.



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 29-07-2024

ITEM:PLACA HUELLA(20.7Mpa,3000psi)e=0.15m.Inc hierro.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3301

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 13-07-2024

ITEM: EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL Incl. retiro 5 kms



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 14-07-2024

ITEM: CONCRETO PIEDRA PEGADA. 20.7 MPa (3000 p.s.i)

PLACA HUELLA Y CUNETAS



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 15-07-2024

ITEM: CONCRETO PIEDRA PEGADA. 20.7 MPa (3000 p.s.i)



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 16-07-2024

ITEM: CONCRETO PIEDRA PEGADA. 20.7 MPa (3000 p.s.i)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3302

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

CONTROL ACTIVIDADES DE BORDILLO - CUNETA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 28-07-2024
ITEM: CONC BERM-CUNET SEGUN DISEÑ(20.7Mpa,3000psi
.NO incluye hierro



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 29-07-2024
ITEM: CONC BERM-CUNET SEGUN DISEÑ(20.7Mpa,3000psi
.NO incluye hierro

CONTROL ACTIVIDADES DE BORDILLO - CUNETA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 30-07-2024
ITEM: CONC BERM-CUNET SEGUN DISEÑ(20.7Mpa,3000psi
.NO incluye hierro



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 31-07-2024
ITEM: CONC BERM-CUNET SEGUN DISEÑ(20.7Mpa,3000psi
.NO incluye hierro

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3303

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

CONTROL ACTIVIDADES DE OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 28-07-2024
ITEM: EXCAVACION MECÁNICA EN CONGLOMERADO (No incluye retiro)



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 29-07-2024
ITEM: CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR.

CONTROL ACTIVIDADES DE OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 30-07-2024
ITEM: ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAV H=<2 MTS



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 31-07-2024
ITEM: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3364

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	SECRETARIA LIDER		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

CONTROL DE MAQUINARIA EN OBRA



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: 05-07-2024



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: 13-07-2024

CONTROL DE MAQUINARIA EN OBRA



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: 21-07-2024



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: 29-07-2024

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3305

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

CONTROL IMPLEMENTACIÓN PMA



FOTOGRAFIA 1 — FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)



FOTOGRAFIA 2 — FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)

CONTROL IMPLEMENTACIÓN PMA



FOTOGRAFIA 3 — FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)



FOTOGRAFIA 4 — FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3307

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

CONTROL IMPLEMENTACIÓN PMT



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)

CONTROL IMPLEMENTACIÓN PMT



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: (26-06-2024 al 31-07-2024)

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3309

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

DESLIZAMIENTO TRAMO 6



FOTOGRAFIA 1

DESCRIPCIÓN: DESLIZAMIENTO A LA FECHA EN TRAMO 6



FOTOGRAFIA 2

DESCRIPCIÓN: DESLIZAMIENTO A LA FECHA EN TRAMO 6

DESLIZAMIENTO TRAMO 6



FOTOGRAFIA 3

DESCRIPCIÓN: CONTINUA PEQUEÑOS DESLIZAMIENTOS A LA FECHA EN TRAMO 6



FOTOGRAFIA 4

DESCRIPCIÓN: CONTINUA PEQUEÑOS DESLIZAMIENTOS A LA FECHA EN TRAMO 6

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3316

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

ALCANTARILLA P8 - TRAMO 7



FOTOGRAFIA 1
DESCRIPCION: PERDIDA DE BANCADA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA P8

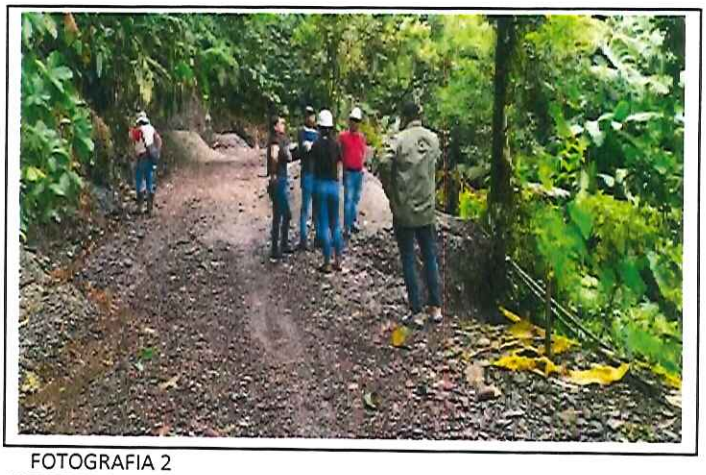

FOTOGRAFIA 2
DESCRIPCION: PERDIDA DE BANCADA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA P8

ALCANTARILLA P8 - TRAMO 7



FOTOGRAFIA 3
DESCRIPCIÓN: PERDIDA DE BANCADA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA P8



FOTOGRAFIA 4
DESCRIPCIÓN: PERDIDA DE BANCADA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA P8

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3311

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3154 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"	**SECRETARIA LIDER**		
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**		
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

FISURAS Y PERDIDA DE BANCADA TRAMO 7



FOTOGRAFIA 1

DESCRIPCIÓN: SE PRESENTAN FALLAS SOBRE PLACA HUELLA DEBIDO A FALLA GEOLOGICA O MOVIMIENTOS DE TALUD.



FOTOGRAFIA 2

DESCRIPCIÓN: SE PRESENTAN FALLAS SOBRE PLACA HUELLA DEBIDO A FALLA GEOLOGICA O MOVIMIENTOS DE TALUD.

FISURAS Y PERDIDA DE BANCADA TRAMO 7



FOTOGRAFIA 3

DESCRIPCIÓN: ESTUDIOS EN SOCAVACION DE TRAMO 7



FOTOGRAFIA 4

DESCRIPCIÓN: SE PRESENTA SOVACACIÓN DE PLACA HUELLA POR DESPLAZAMIENTO NATURAL DE TALUD.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3312

8.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

3313

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	23				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	07	06	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	CONFERENCIA VIRTUAL		
HORA DE INICIO:	7:00 AM	HORA FINAL:	9:00 AM
CONVOCA:	SUPERVISIÓN		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,020,826,948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
FECHA TERMINACION	28 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		


3314

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 2

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
1. Socialización puntos críticos respecto a deslizamientos y fallas geológicas.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR			
	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	N.A	N.A	N.A


LOCALIZACION DEL PROYECTO

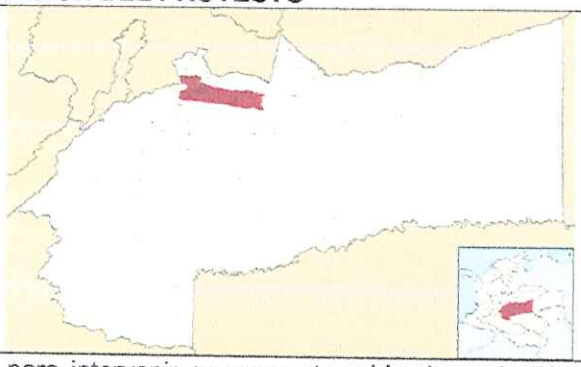






La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.

ALCANCE DEL PROYECTO

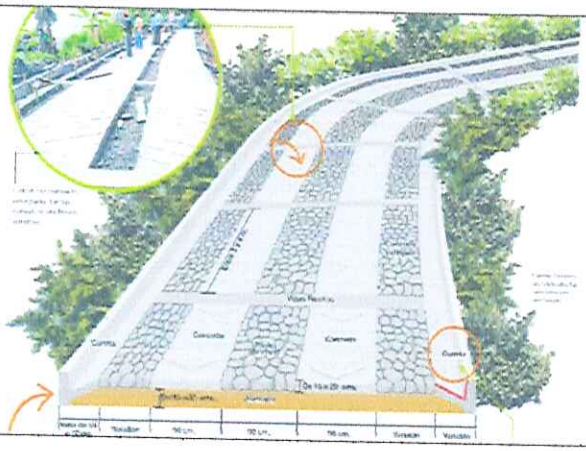

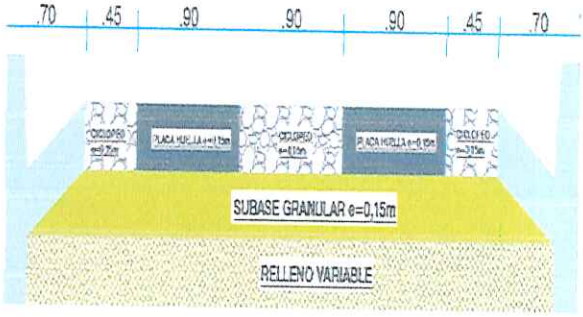

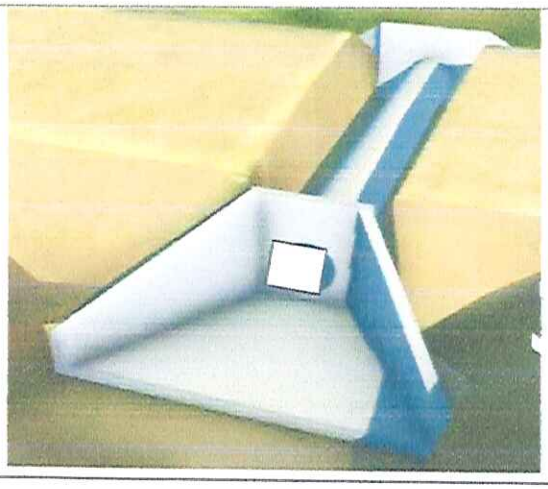

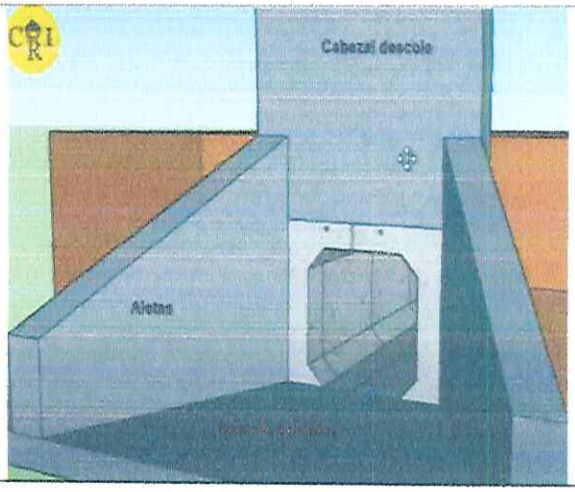

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 6 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES

Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	


TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1

Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	

3316

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.468.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.636,00	100,00%

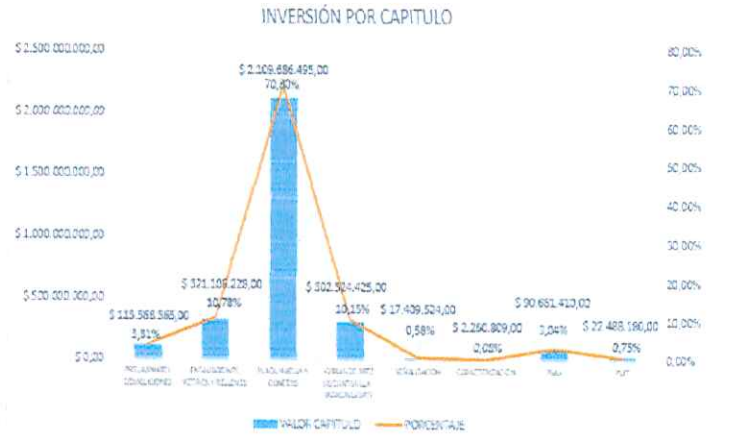

ANALISIS PROGRAMACION



MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO				PROGRAMADO MENSUAL	
				MENSUAL		ACUMULADO			
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	1,07%	$ 58.242.151,00
	SEMANA 2	4/02/2024	10/02/2024	0,04%	$ 1.880.650,00	0,04%	$ 1.880.650,00		
	SEMANA 3	11/02/2024	17/02/2024	0,12%	$ 5.646.774,00	0,17%	$ 7.527.424,00		
	SEMANA 4	18/02/2024	24/02/2024	0,72%	$ 31.469.455,00	0,89%	$ 38.996.879,00		
	SEMANA 5	25/02/2024	2/03/2024	1,01%	$ 31.834.472,00	1,90%	$ 70.831.351,00		
2	SEMANA 6	4/03/2024	9/03/2024	3,14%	$ 94.965.834,00	5,04%	$ 165.796.185,00	10,37%	$ 565.348.962,00
	SEMANA 7	11/03/2024	16/03/2024	4,44%	$ 131.137.639,00	9,54%	$ 296.933.824,00		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,58%	$ 130.990.780,50	14,10%	$ 427.210.442,00		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,67%	$ 145.136.303,60	18,97%	$ 565.346.961,00		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,67%	$ 143.130.303,60	23,64%	$ 708.487.331,00	44,26%	$ 1.319.393.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,60%	$ 144.531.445,00	28,24%	$ 853.018.764,00		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,88%	$ 143.014.184,00	33,04%	$ 996.032.948,00		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,35%	$ 158.870.300,00	38,39%	$ 1.154.903.248,00		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,45%	$ 162.470.676,00	44,26%	$ 1.319.393.924,00		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,43%	$ 163.034.040,00	49,77%	$ 1.482.417.178,00	45,11%	$ 1.952.049.988,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,49%	$ 163.734.043,00	55,27%	$ 1.646.151.221,00		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,17%	$ 154.060.302,00	60,44%	$ 1.800.211.523,00		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,05%	$ 151.110.406,00	65,50%	$ 1.952.049.988,00		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,75%	$ 141.500.514,00	70,26%	$ 2.093.550.502,00	43,62%	$ 2.434.002.992,00
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,32%	$ 128.677.357,00	74,58%	$ 2.222.226.359,00		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,26%	$ 127.450.857,00	78,84%	$ 2.349.677.216,00		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,17%	$ 124.324.567,60	83,02%	$ 2.474.002.992,00		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,16%	$ 124.660.500,00	87,18%	$ 2.598.724.562,00	100,30%	$ 2.979.705.636,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,16%	$ 124.617.307,00	91,34%	$ 2.723.226.690,00		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,45%	$ 132.647.491,00	95,80%	$ 2.855.564.182,00		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,19%	$ 123.721.500,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00		


ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6.0 meses	Plazo Meses:	6.0 meses
Meses transcurridos:	3,67 meses	Meses transcurridos:	3,67 meses
% transcurrido en tiempo:	56,91%		
Avance programado Acum. S16	$ 1.646.851.221,00	Avance programado Acum. S16	$ 1.646.851.221,00
Avance ejecutado Acum S16 $:	$ 679.750.028,18	Avance ejecutado Acum S16 $:	$ 679.750.028,18
Atraso o avance S16	$ 967.101.192,82	Atraso o avance S16	$ 967.101.192,82

3317

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 5



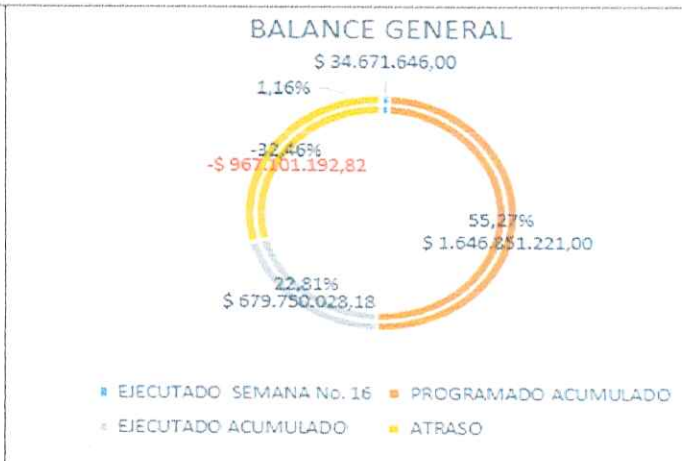

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.965,00	3,81%	$ 75.080.625,00	66,11%	$ 56.837.695,00	40,76%	-$ 18.543.130,00	$ -	-16,33%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,76%	$ 260.464.940,00	90,10%	$ 92.863.673,00	28,92%	-$ 196.621.267,00	$ -	-65,23%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.486,00	70,80%	$ 1.054.815.907,00	61,42%	$ 465.657.040,00	23,48%	-$ 589.258.867,00	$ -	-27,93%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BORDILLEVERT)	$ 302.924.425,00	10,15%	$ 133.515.348,00	44,13%	$ 0,00	0,00%	-$ 133.515.348,00	$ -	-44,13%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.624,00	0,58%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.800,00	0,08%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 90.601.410,00	3,04%	$ 91.249.400,00	98,52%	$ 25.378.419,00	27,99%	-$ 25.864.981,00	$ -	-28,53%
8	PMT	$ 22.468.180,00	0,75%	$ 12.710.711,00	56,62%	$ 9.413.201,18	41,90%	-$ 3.297.509,82	$ -	-14,66%
		$ 2.979.705.696,00	100,00%	$ 1.646.251.221,00	55,27%	$ 679.750.028,18	22,81%	-$ 967.101.192,82	$ 0,00	-$ 967.101.192,82
										-32,46%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

Personal en obra

.esidentes
1 Social
1 SST

Frentes de trabajo

N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia el comité convocado por la entidad contratante en atención a conocer las alternativas de intervención de lo que se denomina el punto P8 el cual es una estructura hidráulica que tiene como alcance la demolición total y construcción nueva de la edificación y que presenta un punto de riesgo debido a la limitación del ancho de la vía y a la erosión e inestabilidad del talud donde se proyecta la estructura de descole.

Para todos los efectos la entidad solicita que se proyecten las diapositivas para que de manera gráfica y visual los asistentes entiendan y dimensionen la situación presentada.

La interventoría realiza un contexto de lo que se presenta en este punto objeto de la reunión pero que además se permite manifestar que más allá de este punto, existen otros puntos que requieren la misma o quizá más preocupación por las partes debido a lo presentado, como lo es el tramo 6, punto donde se presentó el deslizamiento, y lo que es el tramo 7 y a continuación relata la situación no conocida por parte de la entidad debido a que surge ese día en horas de la mañana, para todos los efectos comenta que se presenta un desplazamiento de un material que evidentemente esta comprometiendo la estabilidad del sistema de placa huella ya existente y que en lo que se respecta es más importante tratar y considerar intervenir debido a que es más crítico actualmente ya atenta contra un espacio ya construido según en el tramo 7 del precio y además manifiesta la necesidad de más allá de contar con propuestas ya expuestas en todos los espacios buscar las acciones finales para tratar la patología.

Acto seguido por el contratista de obra, manifiesta que esta situación se evidencian y que es preocupante, solicita a la entidad la toma de acciones al respecto y requiere que los procesos sean más diligentes y eficaces debido a que se ha entregado dichas propuestas en repetidas ocasiones y a la fecha aún se está a la espera de lo que defina la entidad a raíz de las directrices de DNP y REGALÍAS en cuando a lo que se deba estimar, así las cosas finiquita diciendo que estas propuestas han sido tomadas de conceptos básicos y de visitas de obra sin tener como soporte los estudios y/o diseños que respalden estas.

A continuación, el contratista de obra expone punto a punto las problemáticas presentadas en la vía tipo placa huella objeto del contrato de obra, dando inicio por la patología presentada en P8 y seguidamente exponiendo las de tramo 7, tramo 6 y tramo 9.

Se anexa a la presente la ayuda audiovisual descrita, se expone para todos los efectos lo mencionado y se tiene que como alternativas de solución de intervención en la obra hidráulica P8 las siguientes:

1. En el evento de que se continue con la decisión de construcción de conformidad con las condiciones actuales previstas, es necesario generar una intervención para la estabilización de talud y la contención de las obras, permitiendo que la implantación y construcción de la placa huella y del box en su integralidad se puedan desarrollar teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y estabilidad y calidad de las mismas, para lo cual es necesario desarrollar los estudios y diseños que identifiquen los detalles de intervención adecuada a implementar.

2. Teniendo en cuenta que actualmente la sección de la vía en ese punto no permite la construcción total de la obra hidráulica, se propone generar una intervención parcial a la estructura, ejecutando el nuevo encole y el cajón del BOX con la instalación de la tubería requerida para su conexión, sin desarrollar la estructura de descole, debido a la erosión del talud y la inestabilidad que se presenta.

3. Como propuesta más aterrizada se sugiere suspender la construcción de la obra hidráulica y claramente del sistema de placa huella en un tramo de 3 módulos (aproximadamente 9.00 metros) segmentando el tramo de intervención, a fin de no construir esta obra hidráulica y no intervenir el punto debido a la necesidad de construcción con garantías adecuadas que debe contar el contrato y que se ven afectadas por la situación.

4. Adelantar adicional a la intervención ya prevista (construcción del BOX con encole y descole y construcción del sistema de placa huella) la construcción de una estructura de descarga tipo disipador de energía que ayude a evacuar el agua que caerá del Box y así evitar que el punto se siga erosionando, por otra parte se debe construir una estructura de contención que pueda ser capaz de resistir los empujes a los que se verá sometido durante su vida útil y así evitar que se siga perdiendo la banca de la vía, para esta alternativa se requieren adicionar los detalles, estudios y/o diseños que determinen cuantías y alcances y cumplimiento técnico en su integralidad.

Finalmente se expone que las propuestas no están adelantadas en el marco del soporte requerido y por parte del contratista de obra la opción mas viable corresponde a la NO ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL PREVISTA de no ser que se cuente con toda la consultoría para tal fin. Así mismo se manifiesta que estas alternativas ya se han generado con anterioridad y no son un desconocimiento de las partes y que se exponen nuevamente las mismas en el cumplimiento de las necesidades de la entidad.

Seguidamente se da exposición a las demás situaciones no menos importantes, que se presentan el desarrollo del contrato. Las cuales alarman la estabilidad de las obras y se requiere se determine una solución aterrizada para las mismas.

1. Con relación al tramo 6.

Del deslizamiento presentado en el TRAMO 6, a la fecha este punto se encuentra habilitado para tránsito vehicular debido a las labores de remoción presentadas por el contratista de obra que fueron del casi 90% del control y manejo de la situación y en donde finalmente se presenta atención con otras horas maquina atendidas por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, sin embargo es preciso mencionar que en este punto y debido a las lluvias paulatinas y fuertes presentadas en la zona, existe un riesgo constante de deslizamiento y remoción de la montaña y que a la fecha no se encuentra diagnosticado desde el punto de vista técnico por parte de quien corresponda.

2. TRAMO 7 - DESPLAZAMIENTO DE BANCADA Y AFECTACIÓN A PLACA HUELLA

En este segmento de construcción de placa huella se originan dos situaciones que han sido debidamente informadas a las partes involucradas, inicialmente se presenta un DESPLAZAMIENTO DE BANCADA Y AFECTACIÓN A PLACA HUELLA K3+ 280 A K3+220 TRAMO 7, POR ACTIVACIÓN DE UNA FALLA al parecer de movimiento del terreno, en la cual se presentan una fisuras que según verificación constante del contratista, han ido evolucionando, además de esto se ha presentado desplazamientos longitudinales que están poniendo en riesgo el sistema de placa huella, por lo cual de conformidad con la recomendación de los especialistas se seguirá haciendo el seguimiento correspondiente a dichas lesiones del sistema de la placa huella y de la banca de la vía, sin embargo es de aclarar que no se cuenta con el diagnóstico real para dimensionar dicha patología.

Así mismo se presentó caída de la ladera que sostiene la banca de la vía, la cual a la fecha no se tiene diagnostico alguno, en el tramo que se ubica entre las abscisas K3+347.96 al K3+365.96 que se estima se

ocasiona a raíz de la filtración de agua que se conduce por debajo de la rasante de la vía.

3. TRAMO 9 - AFECTACIÓN A PLACA HUELLA

Se ha evidenciado una situación en el tramo 9 en donde se presentan unas fisuras transversales en los elementos de huella, ciclópeo y cuneta bordillo, así como en las vigas riostras de características similares a las presentadas en tramo 7, las cuales están en estudio constante del comportamiento que manifiesta a fin de llevar los reportes para efectos del diagnóstico real.

ante lo anterior se da por terminada la explicación de las patologías, se manifiesta que es importante para estas situaciones de inestabilidad, el contratista de obra informa de manera oportuna, sin embargo nuevamente reitera que si bien es cierto es necesario tomar acciones inmediatas en ánimo de salvaguardar la estructura de vía, es claro que dicha situación no fue prevista desde la concepción del proyecto y que para efectos de atender temporal o definitivamente dicha emergencia, se debe contar con el apoyo y la decisión de la administración municipal en cuanto a la toma de decisiones y finalmente a la inversión de recursos en ánimo de estabilizar este punto.

Así mismo se manifiesta que la administración con relación a la situación de bloqueo por deslizamiento de tramo 6 hizo presencia, pero no se cuenta con los conceptos o informes generados por su parte, por lo cual es importante que se definan las cosas debido a que desde aproximadamente el 17 de mayo, fecha en la que se dio notificación por trazabilidad de correspondencia, sin mencionar que se ha tocado en los diferentes comités técnicos, no se tiene respuesta alguna de las acciones que se deben desarrollar para todos los fines.

La interventoría técnica del proyecto interviene y solicita que la entidad defina si se cuenta con la voluntad administrativa y la capacidad financiera para considerar adicionar recursos a dichas problemáticas, manifiesta que si bien es cierto se tiene un rubro no comprometido del proyecto este no sería suficiente para tales fines, así mismo menciona la necesidad de que dichos soportes técnicos requeridos para cada casi puntual expuesto, se conciban desde la capacidad técnica de muestras de campo y ensayos de laboratorio, desde el marco de una consultoría que permita realmente dimensionar el costo que representara y la necesidad de cada caso.

La interventoría, manifiesta que es necesario que la entidad tome las decisiones de forma rápida y que entiendan que cada accionar requiere de la inversión de recursos adicionales al contratista de obra para la garantía de la ejecución de las obras.

Por parte de la entidad se solicita se estimen costos de las intervenciones, para ellos poder exponer a DNP y detallar las situaciones presentadas, por lo cual solicitan se realicen unos modelos de presupuesto de las propuestas de p8 y se establezcan intervenciones técnicas de las alternativas de solución de los otros puntos de riesgo presentado.

Finalmente el contratista de obra reitera que todas estas posibles sugerencias de solución, son solo, sugerencias técnicas basadas en los conocimientos de desarrollo de obras, pero que establecer un presupuesto es no determinar tal vez actividades requeridas o no aterrizar cantidades toda vez que se dan sugerencias para que la entidad defina si por su parte se tomaran acciones que realmente desarrollen la necesidad de duchas actividades, por lo determina que la necesidad real y responsable es iniciar con el

procesos de consultoría que permita, diagnosticar la real solución a las necesidades dadas a raíz de estas situaciones presentadas en el desarrollo del contrato, por lo cual el compromiso que se toma es el de realizar una cotización de lo que podría costar a grandes rasgos los estudios y diseños de estos puntos donde se deba estabilizar y garantizar la seguridad de las obras y así poder tener un estimado del costos únicamente de esta actividad de la cual se derivara el alcance técnico y financiero de la intervención en cada punto.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Radicar la cotización de los estudios y diseños	Se compromete el contratista de obra a presentar una cotización con las características vagas de lo que se cuenta a la fecha en atención a conocer el costo de los estudios y diseños que permitan determinar la intervención real de las problemáticas presentadas en los puntos referenciarías en la reunión.	Contratista de Obra	11/06/2024
2	Determinar las acciones que se requieran y lo que se tome desde DNP	Se requiere conocer por parte de la entidad contratante los lineamientos y pasos a seguir de las acciones que se tomen y los alcances de intervención, así como la financiación que se deriven de estas para la atención a los puntos de riego que se presentan.	Entidad contratante	Sin fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




3322

ASISTENCIA

Reunión virtual.



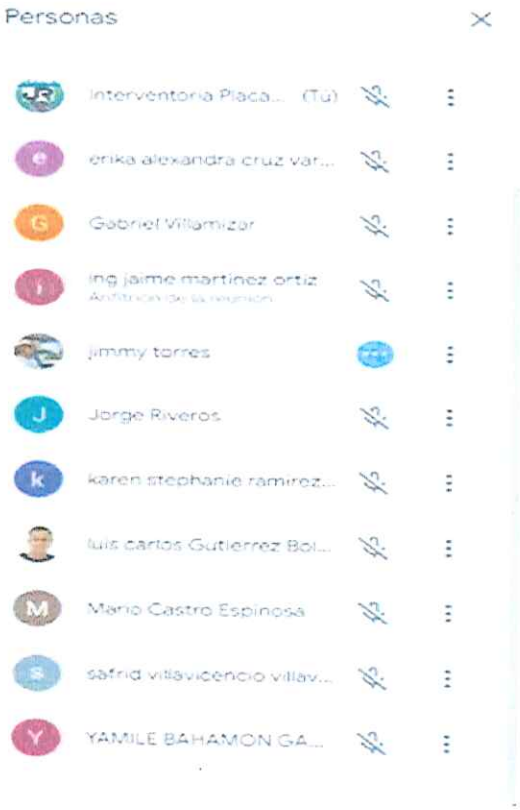

3323

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	24				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	15	06	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	CONFERENCIA VIRTUAL		
HORA DE INICIO:	7:00 AM	HORA FINAL:	12:00 AM
CONVOCA:	INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,020,826,948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
FECHA TERMINACION	28 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		


3324


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 2

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
1. Visita técnica por parte del especialista en geotecnia

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR			
	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	N.A	N.A	N.A


LOCALIZACION DEL PROYECTO

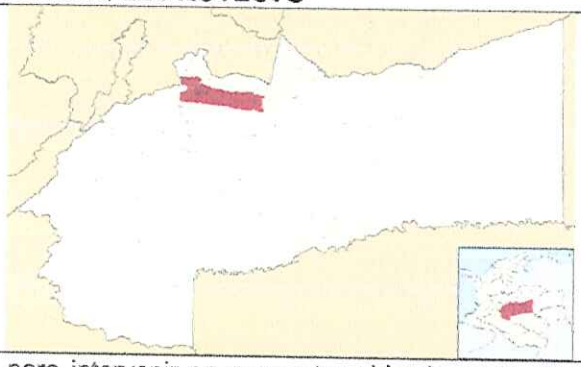


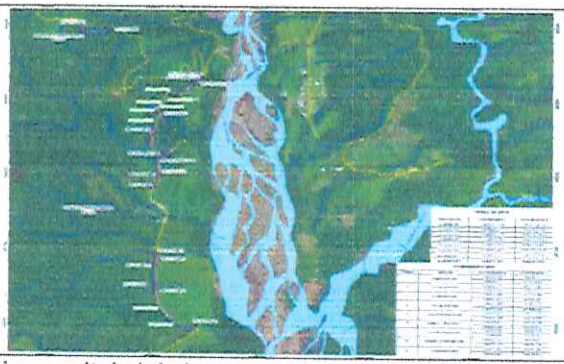


La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.


ALCANCE DEL PROYECTO

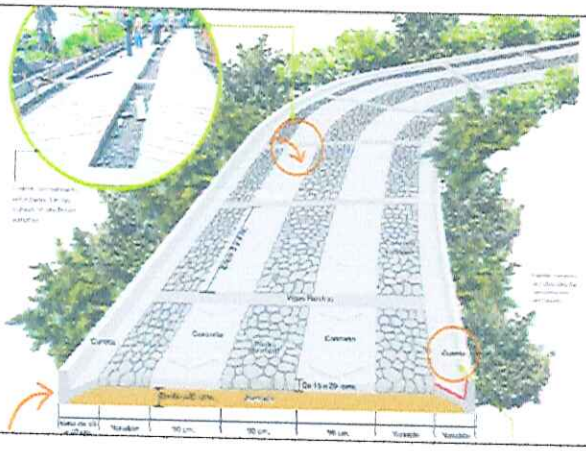

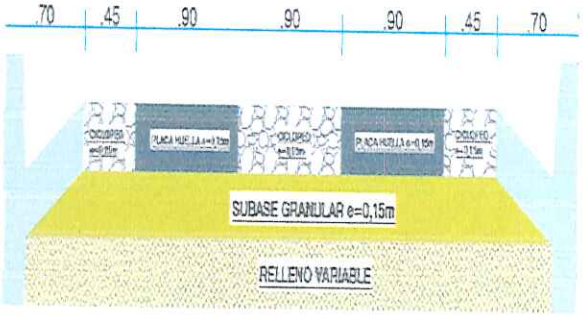

3325

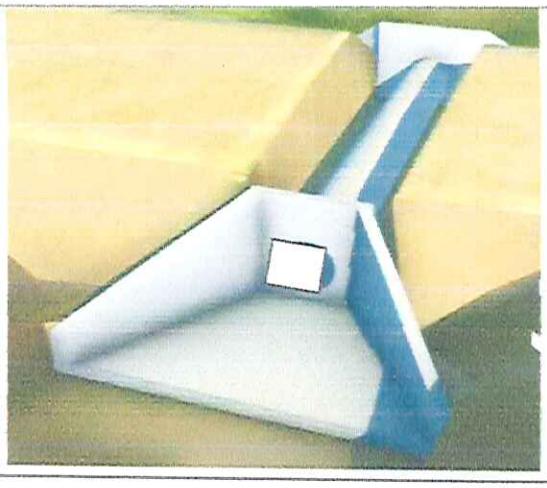

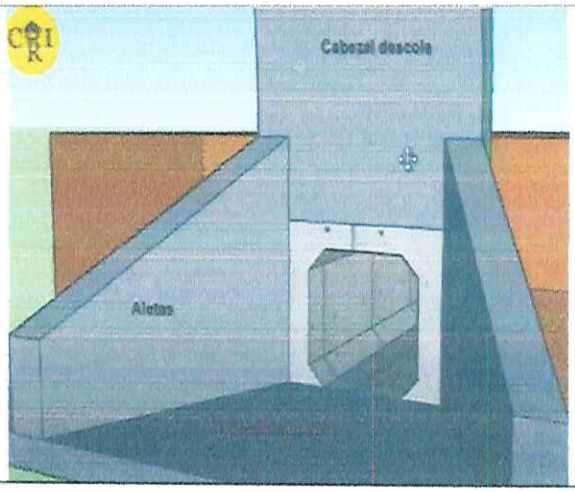

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 6 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES

Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	


TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1

Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	


3326

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.105.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.468.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.636,00	100,00%

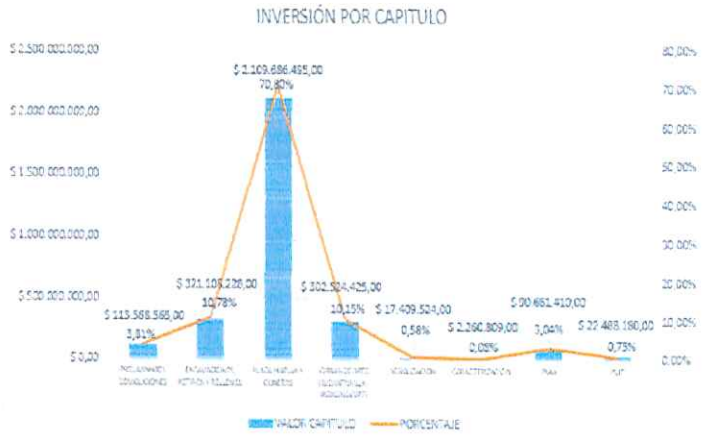

ANALISIS PROGRAMACION

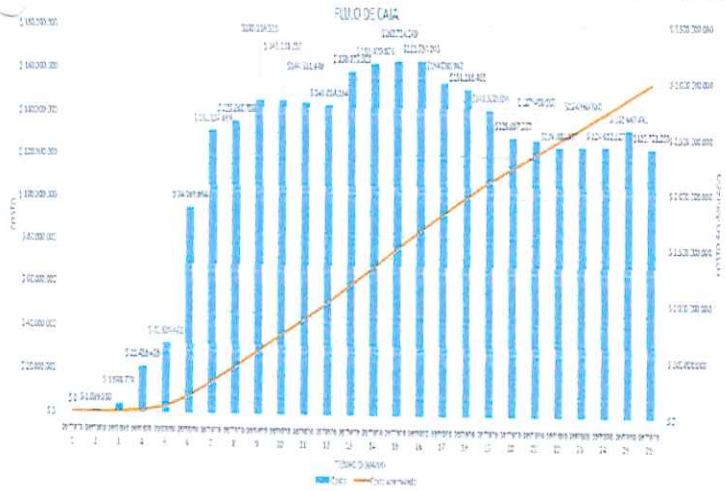


MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO				PROGRAMADO MENSUAL	
				INDIVIDUAL		ACUMULADO			
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	1,03%	$ 58.242.151,00
	SEMANA 2	5/02/2024	10/02/2024	0,04%	$ 1.099.650,00	0,04%	$ 1.099.650,00		
	SEMANA 3	12/02/2024	17/02/2024	0,13%	$ 3.648.774,00	0,17%	$ 4.748.424,00		
	SEMANA 4	19/02/2024	24/02/2024	0,30%	$ 21.459.455,00	0,48%	$ 26.407.879,00		
	SEMANA 5	26/02/2024	2/03/2024	1,01%	$ 31.834.472,02	1,48%	$ 58.242.351,00		
2	SEMANA 6	4/03/2024	9/03/2024	3,14%	$ 94.960.854,00	4,63%	$ 153.203.205,00	20,57%	$ 582.348.502,00
	SEMANA 7	11/03/2024	16/03/2024	4,46%	$ 131.137.639,00	9,54%	$ 284.340.844,00		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,58%	$ 136.000.786,50	14,18%	$ 420.223.403,00		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,67%	$ 145.118.323,60	18,87%	$ 565.341.907,00		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,67%	$ 145.158.267,00	23,54%	$ 710.487.110,00	44,26%	$ 1.319.383.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,65%	$ 144.531.446,00	28,19%	$ 855.016.764,00		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,39%	$ 143.014.184,00	32,58%	$ 998.032.948,00		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,31%	$ 158.979.305,00	37,89%	$ 1.156.512.253,00		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,49%	$ 162.470.876,00	44,26%	$ 1.319.383.129,00		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,49%	$ 163.734.048,00	49,77%	$ 1.483.117.176,00	49,11%	$ 1.952.649.988,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,49%	$ 163.734.043,00	55,27%	$ 1.646.851.221,00		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,17%	$ 154.080.362,80	60,44%	$ 1.800.931.583,80		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,07%	$ 151.118.405,00	65,51%	$ 1.952.049.988,80		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,75%	$ 141.580.814,60	70,26%	$ 2.093.630.802,40	93,02%	$ 2.474.061.981,00
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,32%	$ 128.677.297,00	74,58%	$ 2.222.228.139,00		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,26%	$ 127.460.037,00	78,84%	$ 2.349.679.036,00		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,17%	$ 124.382.867,00	83,01%	$ 2.474.061.981,00		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,18%	$ 124.560.592,00	87,21%	$ 2.598.724.943,00	100,70%	$ 2.979.705.636,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,18%	$ 124.617.307,00	91,40%	$ 2.723.116.693,10		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,46%	$ 132.647.491,00	95,85%	$ 2.855.764.183,10		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,15%	$ 123.731.201,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00		


ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6,0 meses	Plazo Meses:	6,0 meses
Meses transcurridos:	3,67 meses	Meses transcurridos:	3,67 meses
% transcurrido en tiempo:	56,91%		
Avance programado Acum. S16	$ 1.646.851.221,00	Avance programado Acum. S16	$ 1.646.851.221,00
Avance ejecutado Acum S16 $:	$ 679.750.028,18	Avance ejecutado Acum S16 $:	$ 679.750.028,18
Atraso o avance S16	$ 967.101.192,82	Atraso o avance S16	$ 967.101.192,82

3327

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 5

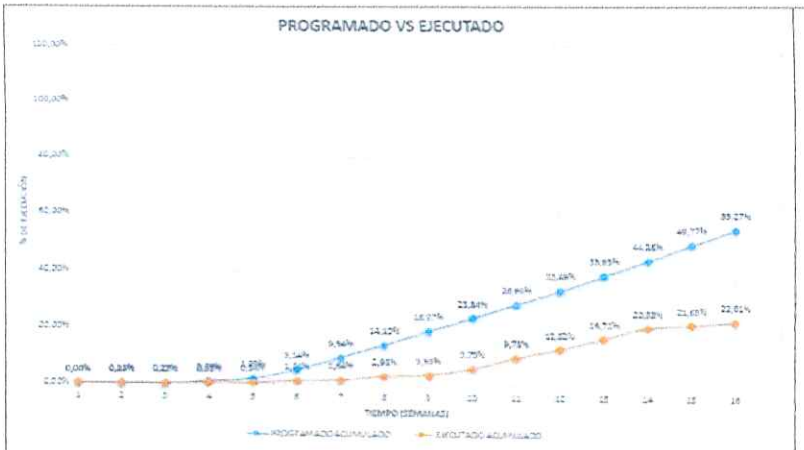

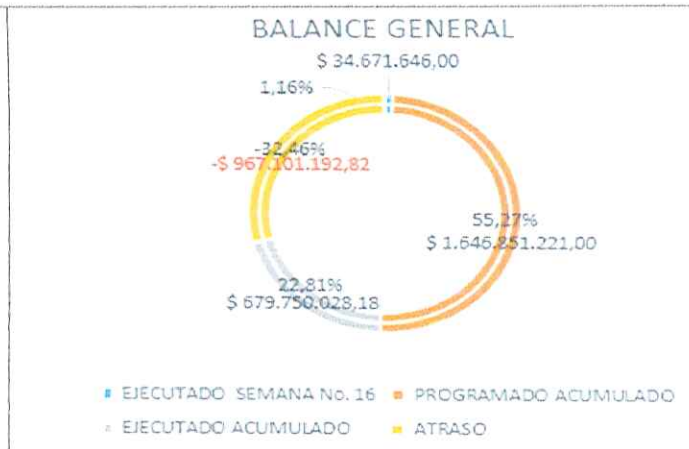

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE	VALOR PROYECTADO CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.958.960,00	3,81%	$ 76.060.825,00	66,11%	$ 56.037.695,00	49,16%	-$ 18.543.130,00	$ -	-16,33%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.226,00	10,76%	$ 280.484.040,00	90,15%	$ 92.868.673,00	28,92%	-$ 196.621.267,00	$ -	-61,23%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.668.496,00	70,60%	$ 1.624.816.997,00	61,42%	$ 496.037.040,00	23,40%	-$ 589.258.957,00	$ -	-27,93%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.524.425,00	10,13%	$ 133.515.348,00	44,13%	$ 0,00	0,00%	-$ 133.515.348,00	$ -	-44,13%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.824,00	0,58%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.800,00	0,08%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%	$ 51.249.400,00	56,52%	$ 25.378.419,00	27,99%	-$ 25.864.981,00	$ -	-28,53%
8	PMT	$ 22.409.190,00	0,75%	$ 12.710.711,00	56,72%	$ 9.413.201,10	41,99%	-$ 3.297.509,82	$ -	-14,66%
		$ 2.979.705.956,00	100,00%	$ 2.646.833.221,00	88,81%	$ 679.750.028,18	22,81%	-$ 967.101.192,82	$ 0,00	-$ 967.101.192,82
										-32,46%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

Personal en obra

Residentes
1 Social
1 SST

Frentes de trabajo

N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia el comité convocado por la interventoría en atención a conocer el concepto técnico por parte del especialista en geotecnia, respecto a los puntos críticos: tramo 7 - desplazamiento de bancada y afectación a placa huella, deslizamiento presentado en el tramo 6 y perdida de bancada en tramo 8, por lo que inicia con un recorrido punto a punto.

1. Se realiza una inspección a lo largo de todo el proyecto, dando inicio desde la zona de tramo 9 en la vereda Santa María Alta, en donde se precisan las patologías presentadas. Seguidamente se realiza traslado a tramo 8, donde el contratista de obra expone la presencia de riesgo por la no continuidad de la placa huella entre la finalidad de tramo 7 en la abscisa K3+432 y el inicio de tramo 8 en la abscisa K3+447 toda vez que se presenta una obra hidráulica existente, que obliga a que se presente una reducción en el ancho de la calzada que presenta riesgo a los usuarios y la cual no está contemplada dentro del objeto del contrato desde la estructuración del proyecto y que a la fecha la entidad no estipula la intervención de esta zona.

Para efectos de esto se presenta registro de la zona.



2. Se continua con inspección del tramo 7 donde se presenta el desplazamiento de bancada y afectación a placa huella, en este punto el especialista en geotecnia indica que, la profundidad horizontal de la socavación a la fecha es de 1.2m, se evidencia en voladizo únicamente la sección de la cuneta y bordillo, sin embargo proyecta que en un lapso de tiempo más esta profundidad horizontal de la socavación estaría sobre 1.5m exponiendo en voladizo los elementos de ciclópeo piedra pegada y placa huella, manifiesta que la altura de la socavación corresponde a 2.4m, indica continuar con la restricción de paso, se debe realizar un manejo de aguas en ese tramo, se debe realizar un sondeo con el fin de conocer la capacidad portante para realizar un muro en gaviones, sin embargo, se debe realizar una cama filtrante con material de 3" dándole salida al talud. Indica que intervenir la ladera en la zona superior no es pertinente, toda vez que la filtración de agua se presenta hasta la zona baja del talud. Adicionalmente indica que se presenciaron rellenos orgánicos y la unión entre el material orgánico y el material de la zona genera una discontinuidad estructural la cual se acomoda con el tiempo, por estos motivos se sugiere realizar una contención con una estructura tipo gavión que permita generar estabilidad, se recomienda rellenar el gavión con piedra y concreto para llenar los vacíos y se estiman las características de esta intervención

como una atención inmediata a la patología presentada, para efectos de lo anterior se espera el documento de cotización del concepto y de diseño de estas obras temporales de mitigación.



3. Con relación al tramo 7, además se evidencian la presencia de grietas que se generaron en relación a una falla o movimiento presentado sobre el suelo, el cual afecto el sistema de placa huella, el especialista en geotecnia indica que se evidencian fisuras transversales y longitudinales de las cuales es preciso conocer el origen y la cinemática con el fin de evidenciarse el riesgo que se presenta en el agrietamiento sobre tramo 7, adicionalmente propone materializar mojones en cuadricula y solicita realizar la toma de topografía por medio de 5 mojones en la ladera sobre la zona alta y 5 mojones sobre la zona baja, para que el contratista de obra relacione los movimientos presentados con el fin de realizar un seguimiento cada semana para evidenciar los vectores de desplazamiento a los cuales se encuentra propenso dicha zona.

   El especialista en geotecnia indica que los hechos sucedidos no son consecuencia por acción del contratista en la zona, más bien son efectos naturales sobre la ladera donde se ejecuta la placa huella, debido a estos movimientos que se generan en el suelo, recomienda que se generen estudios de detalles a fin de determinar el verdadero origen de estas fallas y que sin esa información no se podrá contar con un diagnóstico real del hecho presentado.

   Para todos los efectos se presenta el siguiente registro fotográfico a efectos de ilustrar lo comentado, donde se evidencia un agrietamiento en un punto donde se ubicada un campamento y en donde se aprecia un poco mejor las fisuras objeto del asunto.

3330



4. Se continua el recorrido y sobre la abscisa K3+210, aproximadamente, ubicada en tramo 7, se evidencia un nuevo punto que se encuentra en riesgo, toda vez que este punto se encuentra propenso a una socavación similar a la problemática expuesta en el punto 2 del presente informe, el especialista indica que este punto tiene una terraza ladera abajo el cual sirve como base para realizar la respectiva estructura de gaviones como alternativa de contención. Adicionalmente indica que la situación presentada en el punto 2 y 4, son afectaciones que repercuten en el paso del tiempo, es decir que a medida del paso del tiempo la afectación se volverá más grande, por tal motivo indica que estas zonas se deben intervenir de manera inmediata. Sin embargo, es importante recalcar que el especialista en geotecnia recomienda realizar una consultoría de estudios y diseños que permita determinar las características exactas de diseño, sin embargo según la propuesta sugerida se puede mitigar a través de estas estructuras de gavión.

   A continuación se muestra el punto mencionado.



5. Con relación al punto denominado P8 el cual se encuentra ubicado en tramo 7 y en donde se contempla intervención para una estructura hidráulica, se evidencia que el terreno se encuentra un poco estable, no se evidencia posible socavación, sin embargo al momento de realizar la intervención del Box Coulvert en P8 es posible que se presente una problemática conforme a la escorrentía de agua, debido al descontrol que se pueda presentar al momento de ejecutar las

actividades de excavación, por lo cual se requiere contemplar en la estructura de descole una disipación de caída del agua que evite la erosión en el pie de montaña. Además se recomienda realizar un anclaje con una geomembrana impermeable a la ladera en la zona baja con el fin de evitar la filtración de la caída de agua del descole directamente al terreno y así evitar a futuro una socavación y como solución para la perdida de bancada se recomienda implementar tierra armada.



6. Para el punto de deslizamiento en tramo 6 la ladera en la zona alta, el especialista en geotecnia india que se evidencian rasgos bastantes significativos de erosión por lo cual se debe revegetalizar el área afectada, posiblemente con un bio manto o con un lanzado de concreto con construcción de pernos pasivos, es importante que adicional a todo lo contemplado se ejecute la instalación de una geomembrana para los zurcos y zanjas de coronación con la finalidad de que no se genere filtración sobre el talud, sin embargo, manifiesta que esto sería una intervención masiva y costosa, adicionalmente se debe realizar una limpieza de la vegetación existente en la corona del talud ya que debido a esta carga se puede generar un nuevo movimiento lo cual provocaría un nuevo deslizamiento.

   Además se manifiesta que estas opciones son sugerencias a las necesidades vistas desde la visita de campo y se plantea además la posibilidad de realizar un muro de contención con pilotes de 6 a 8metros, atendiendo un proceso constructivo segmentado que permita garantizar la estabilidad del talud en el momento de la ejecución, además que también se puede realizar una pantalla dinámica sin rellenar atrás, por si se presenta un nuevo deslizamiento se tenga espacio para abarcar el material residual.

   Es de mencionar que las intervenciones requieren de estudios y diseños dado que se debe contemplar factores adicionales que permitan aterrizar las propuestas antes descritas.

3332



Sin otro particular, finaliza el comité.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Realizar la cotización de los estudios y diseños	Se compromete la interventoría a presentar una cotización en atención a conocer el costo de los estudios y diseños que permitan determinar la intervención real de las problemáticas presentadas en los puntos referenciarías en la reunión, conforme a los conceptos generados por el especialista en geotecnia.	Interventoría	Sin fecha.
2	Realizar entrega de topografía de los puntos críticos	Materializar mojones de referencia tipo cuadricula aleatorio con el fin de verificar por medio de la topografía los vectores de desplazamiento y los movimientos generados en los cuatro puntos críticos.	Contratista de Obra	Sin fecha.
3	Solicitud dirigida a entidad contratante	Solicitud de recomendación de la seguridad por la no continuidad de la placa huella entre tramo 7 y 8 por estrechamiento de sección de vía.	Contratista de Obra	Sin fecha.

3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO










	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 12



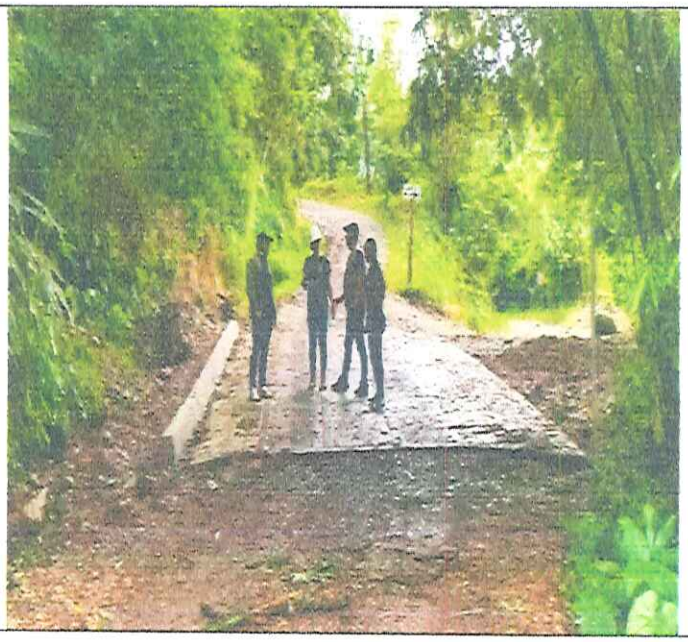

ASISTENCIA

N.A.

3335

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	28				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	04	07	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	CAMPAMENTO DE OBRA		
HORA DE INICIO:	2:00 PM	HORA FINAL:	6:40 PM
CONVOCA:	INTERVENTORIA		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,020,826,948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
FECHA TERMINACION	28 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE MAYO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		

3336


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Avance de obra a la semana No.18
2. Proceso constructivo de estructuras tipo Box Coulvert
3. Oficio de situación de riesgo del paso entre tamo 7 y tramo 8.
4. Tema social
5. Observaciones frente al informe de obra No.3

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	Acta suministro de agua		
2.	Informe mensual No.4		
3.	Modificatoria No.2		


LOCALIZACION DEL PROYECTO

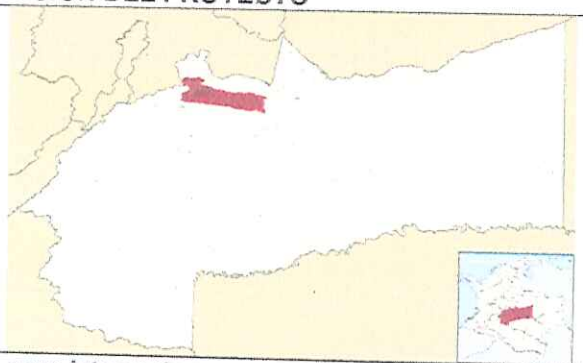


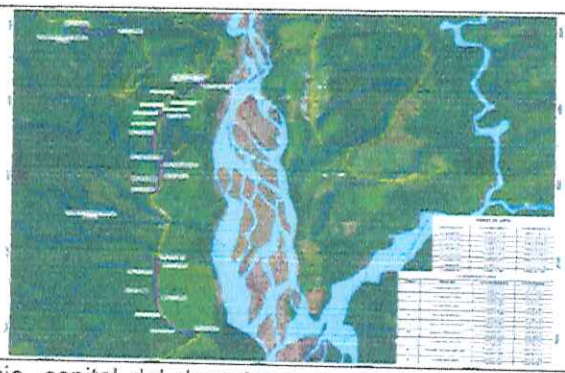



La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.

ALCANCE DEL PROYECTO

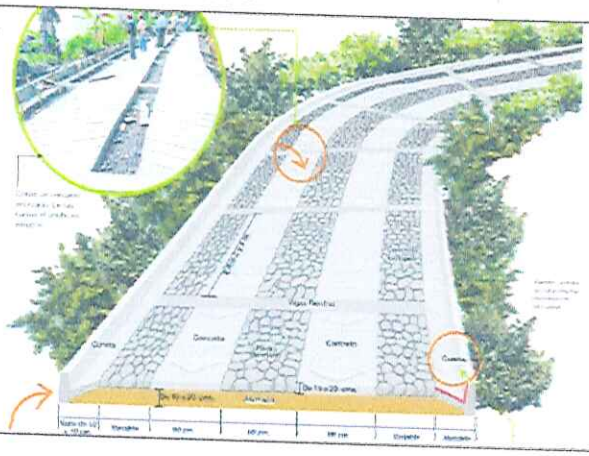

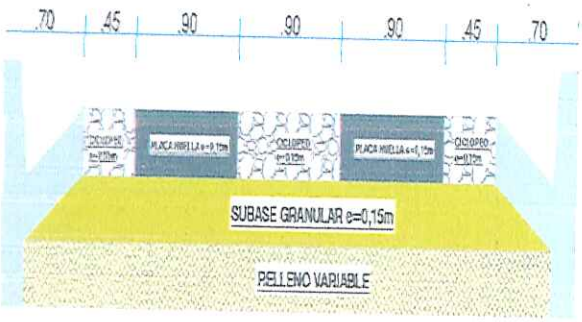

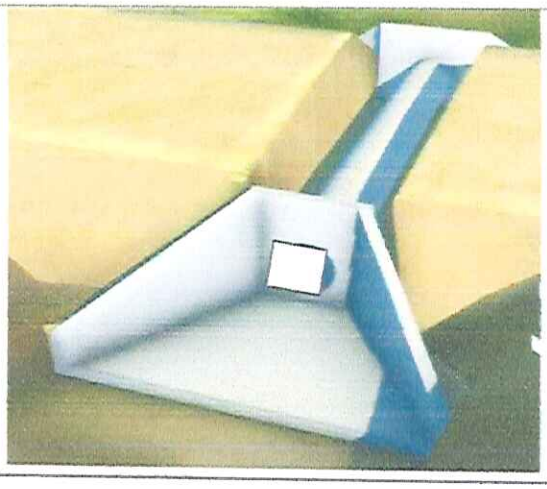

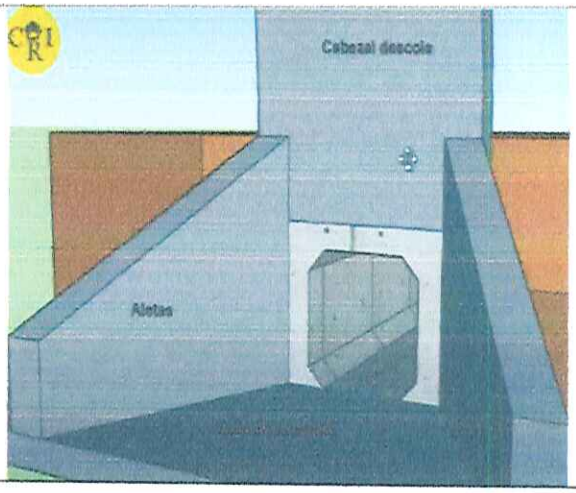

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 4 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX/CUELVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.488.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.836,00	100,00%

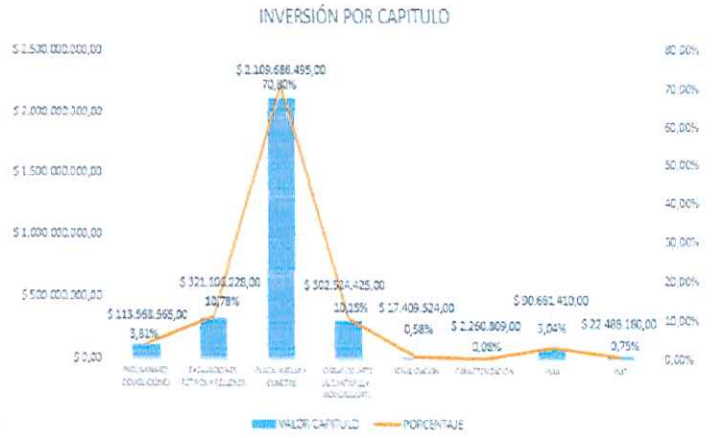

ANALISIS PROGRAMACION

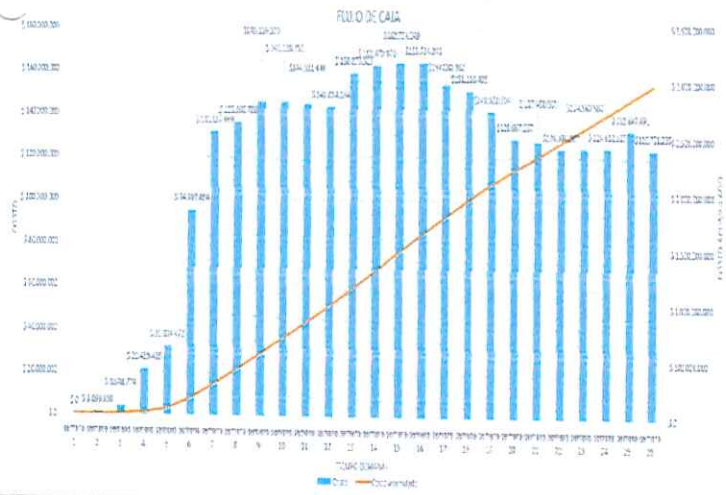


MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO SEMANAL		PROGRAMADO ACUMULADO		PROGRAMADO MENSUAL	
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,03%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	1,05%	$ 30.242.351,00
	SEMANA 2	3/02/2024	10/02/2024	0,04%	$ 1.000.000,00	0,04%	$ 1.000.000,00		
	SEMANA 3	12/02/2024	17/02/2024	0,13%	$ 3.048.774,00	0,17%	$ 4.048.434,00		
	SEMANA 4	19/02/2024	24/02/2024	0,22%	$ 21.459.455,00	0,39%	$ 26.407.889,00		
	SEMANA 5	26/02/2024	2/03/2024	1,07%	$ 31.634.472,00	1,45%	$ 58.042.361,00		
2	SEMANA 6	4/03/2024	9/03/2024	3,19%	$ 94.963.834,00	4,64%	$ 153.006.195,00	13,97%	$ 402.348.907,00
	SEMANA 7	11/03/2024	16/03/2024	4,48%	$ 131.137.639,00	9,12%	$ 284.143.834,00		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,98%	$ 126.898.798,00	14,10%	$ 410.242.632,00		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,67%	$ 145.158.259,00	18,77%	$ 555.200.891,00		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,87%	$ 145.158.259,00	23,64%	$ 700.487.116,00	44,28%	$ 1.274.368.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,65%	$ 144.531.448,00	28,29%	$ 845.018.564,00		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,80%	$ 143.014.164,00	33,09%	$ 988.032.728,00		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,39%	$ 168.879.305,00	38,48%	$ 1.156.912.251,00		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,48%	$ 782.478.878,00	44,28%	$ 1.315.503.129,00		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,48%	$ 163.734.049,00	49,77%	$ 1.483.237.178,00	64,54%	$ 1.952.649.988,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,49%	$ 163.734.049,00	55,25%	$ 1.646.971.226,00		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,17%	$ 154.930.362,00	60,44%	$ 1.801.901.588,00		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,07%	$ 151.118.405,00	65,51%	$ 1.953.019.993,00		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,75%	$ 141.500.814,00	70,26%	$ 2.094.520.807,00	83,03%	$ 2.474.043.982,00
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,32%	$ 128.677.257,00	74,58%	$ 2.223.198.064,00		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,28%	$ 127.459.457,00	78,86%	$ 2.349.673.096,00		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,17%	$ 124.304.887,00	83,03%	$ 2.474.043.983,00		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,18%	$ 124.968.589,00	87,21%	$ 2.598.724.563,00	100,00%	$ 2.979.705.836,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,16%	$ 124.412.327,00	91,40%	$ 2.723.136.890,00		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,45%	$ 132.647.491,00	95,85%	$ 2.855.784.381,00		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,15%	$ 123.721.455,00	100,00%	$ 2.979.705.836,00		


ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6,0 meses	Plazo Meses:	6,0 meses
Dias transcurridos:	121 Días	Meses transcurridos:	4,03 meses
% transcurrido en tiempo:	66,85%		
Avance programado Acum. S18	$ 1.952.049.988,00	Avance programado Acum. S18	65,51%
Avance ejecutado Acum S18 $:	$ 1.004.546.747,18	Avance ejecutado Acum S18 $:	33,71%
Atraso o avance S18	$ 947.503.240,82	Atraso o avance S18	31,80%

3339

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 5

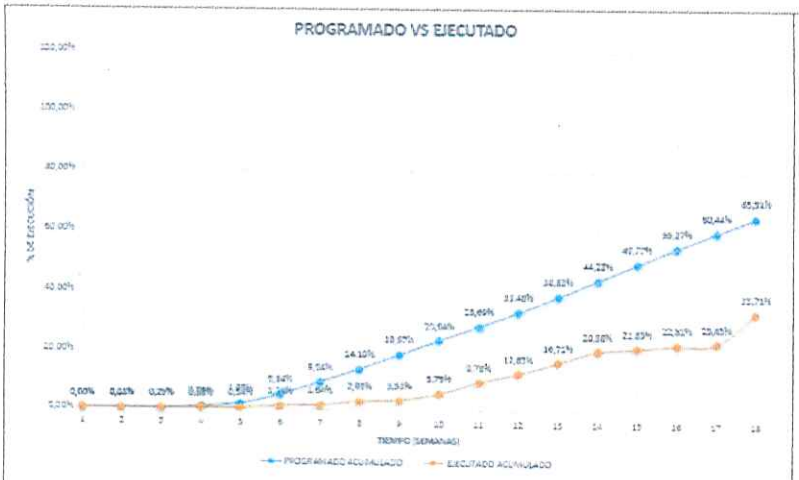

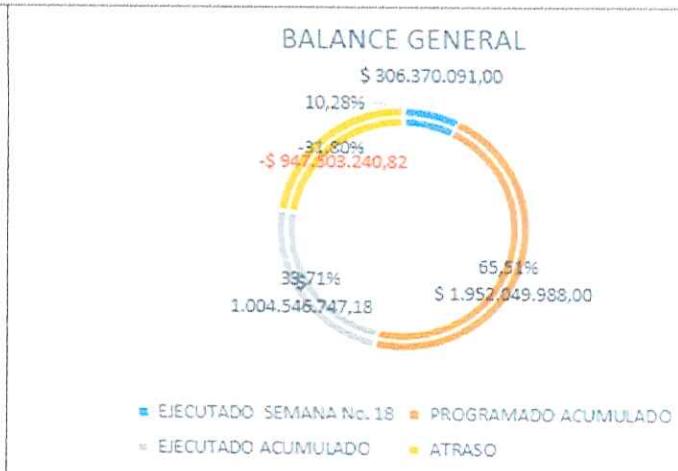

	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.566,00	3,81%	$ 82.778.373,00	72,89%	$ 62.660.542,00	55,17%	-$ 20.127.831,00	$ -	-17,72%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.108.228,00	10,78%	$ 300.395.628,00	93,71%	$ 152.768.388,00	47,73%	-$ 147.627.240,00	$ -	-45,97%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%	$ 1.289.790.069,00	61,14%	$ 735.409.569,00	34,86%	-$ 554.380.529,00	$ -	-26,28%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%	$ 204.792.682,00	67,69%	$ 0,00	0,00%	-$ 204.792.682,00	$ -	-67,69%
5	SEÑALIZACION	$ 17.469.524,00	0,59%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.800,00	0,08%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%	$ 59.127.002,00	65,22%	$ 38.522.919,00	42,49%	-$ 20.604.083,00	$ -	-22,73%
8	PMT	$ 22.469.180,00	0,75%	$ 14.666.265,00	65,22%	$ 14.695.329,18	65,35%	$ -	$ 29.124,18	0,13%
		$ 2.979.765.836,00	100,00%	$ 1.952.049.988,00	65,51%	$ 1.004.546.747,18	33,71%	-$ 947.503.368,00	$ 29.124,18	-$ 947.503.240,82
										-31,80%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

Personal en obra

2 Residentes
1 Social
1 SST
1 maestro
1 contramaestro
30 ayudantes

Frentes de trabajo

Tramo 6
Tramo 5
Tramo 4

3340

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia el comité donde se realiza una descripción de las generalidades del contrato, alcance del contrato de obra No. 3233 de 2023, se indica que una vez reiniciado el contrato se evidencia por parte del contratista de obra el aumento de la mano de obra no calificada, la apertura de 3 frentes de trabajo de manera simultanea lo que genera un mayor avance para la semana No.18, se genera además un balance de cantidad de personal, avance a la fecha y se revisa compromisos administrativos pendientes de acuerdo a los requeridos para el desarrollo del contrato.

Para efectos de lo que trata el tema de las obras hidráulicas, el proceso constructivo de estructuras tipo Box Coulvert el contratista de obra manifiesta que para cuando se realicen excavaciones y posterior armado de acero se usaran tablones en madera de aproximadamente 10cm de espesor para dar paso vehicular a motocicletas, ciclistas y vehículos de paso liviano o tipo camioneta, mitigando la falta de comunicación de la población con el casco urbano de la ciudad.

Seguidamente interviene la entidad contratante y manifiesta que existe un contrato que está próximo a dar acta de inicio el cual corresponde a la optimización de la estación de bombeo de puente Abadía, se encuentra kilómetros arriba de los tramos de intervención del contrato de obra No. 3233 de 2023, por lo tanto indica que se debe realizar un comité en conjunto con los dos contratistas con el fin de organizar y llegar a un acuerdo respecto a los tiempos y cronogramas de trabajo establecidos en relación a la armonización para el desarrollo de ambos proyectos, por lo que la entidad se compromete a informar con el respectivo tiempo la fecha y hora de reunión, espacio donde se abordaran los temas de la acción de permitir el paso a maquinaria y transporte que sea necesario para la ejecución del contrato de optimización de la estación de bombeo.

Ante esto la interventoría indica que a la fecha se han llevado a cabo mesas de trabajo en conjunto con la entidad contratante, empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio y los contratistas de obra e interventoría del contrato de optimización de la estación de bombeo de puente Abadía y de obra e interventoría del proyecto de placa huella de la vereda santa maría, espacio donde se han tratado temas de cronograma y tiempos, siendo uno de los compromisos para el contratista de obra CONSORCIO VIAL ARDISAF Contrato No.3233 de 2023, presentar un concepto estructural en conformidad al tiempo de curado del contrato, el cual dio cumplimiento, sin embargo a la fecha no se ha obtenido alguna otra invitación a mesas de trabajo.

La entidad concluye que próximamente las obras estarán en ejecución de manera simultánea y se deberá dar manejo al tema de los tiempos y pasos para la ejecución de las obras.

Para lo anterior, el contratista de obra manifiesta la preocupación sobre el paso de vehículos de carga toda vez que esto afecta la calidad de los elementos que componen el sistema de placa huella, y que entendiendo que se deba generar las armonías del caso en el desarrollo de los proyectos, asistirá a las mesas de trabajo propuestas a efectos de ver la posibilidad de coordinar los trabajos sin afectar las obras que desarrolla el CONSORCIO VIAL ARDISAF.

De conformidad al Oficio de situación de riesgo del paso entre tamo 7 y tramo 8 elevado por el CONSORCIO VIAL ARDISAF, la interventoría indica que por medio del comité No.24 que se llevó a cabo el 15 de junio de 2024, se informó el riesgo con el que se cuenta en este espacio, zona que no hacer parte del alcance del contrato de obra debido a la segmentación de la placa huella a desarrollar, especificamente esta situación se ubica en la abscisa K3+432 y el inicio de tramo 8 en la abscisa K3+447 toda vez que se presenta una obra hidráulica existente, que obliga a que se presente una reducción en el ancho de la calzada que representa un riesgo a los usuarios, ante esto se deja claridad que este tramo no

está contemplado dentro del objeto del contrato desde la estructuración del proyecto y que a la fecha la entidad no estipula la intervención de esta zona. Adicionalmente el contratista de obra manifiesta que se genera una alerta toda vez que a la fecha se han generado dos accidentes donde los vehículos quedan atrapados en las alcantarillas existentes.

Donde interviene la entidad y manifiesta que se encuentra realizando la estructuración de respuesta para dicho oficio y que la misma se notificara una vez surjan los procesos administrativos internos.

En consecuencia, a los temas sociales que incurren en el contrato No. 3233 de 2023, se conoce que existe un video publicado por el presidente de la junta de acción comunal el señor Cristian Romero, quien ha dado a conocer unas observaciones que se están presentando supuestamente en el desarrollo del contrato, es de resaltar por parte del contratista de obra que a la fecha estas no han sido notificadas formalmente y/o a través de algún derecho de petición o veeduría como manifiesta en el espacio virtual, para todos los efectos lo expuesto corresponde a lo siguiente:

- Varillas en exposición.
- Punto ecológico – no cuentan con manejo de residuos.
- Hidratación - no cuentan con puntos de hidratación.
- Dotación – Los trabajadores no cuentan con dotación completa.
- Extintor – Extintor vencido y en mal estado.
- Botiquín – Botiquín en mal estado.
- Baños – Se requiere un baño por cada quince trabajadores.

Ante lo anterior el CONSORCIO VIAL ARDISAF genera una explicación de forma general de las acusaciones recibidas, enunciando primeramente que esta persona hace uso de las instalaciones destinadas por el consorcio para el desarrollo del contrato, sin contar con autorización alguna y sin el previo consentimiento del personal de obra, así mismo manifiesta que es claro que esta persona extralimita las acciones que puede desarrollar en el marco de veedor comunal, presidente de junta de acción comunal o ciudadano y que esto lleva una acción de abuso ante la intervención que esta persona tenga para con el proyecto, finalmente manifiesta que a la fecha se ha desarrollado el contrato acorde a lo pactado con la entidad y en compañía siempre de las partes, dando cumplimiento a las acciones y obligaciones determinadas, así mismo no se ha desconocido las recomendaciones de la comunidad y en atención a la molestia por el desarrollo de las obras, se ha tenido en cuenta las acciones de seguridad atendidas desde las funciones del profesional del área, sin embargó es claro que la ejecución de las obras limita el desplazamiento en algunos puntos toda vez que se restringen áreas y se ocasionan molestias al transitar, situación que es difícil de controlar, finalmente con el contenido publicado, a la fecha no existe pronunciamiento puntual del CONSORCIO teniendo en cuenta que estas acusaciones no tienen el sustento del caso y que no se ejercen de forma precisa con solicitudes para dar a conocer las acciones desarrolladas en el marco del contrato de obra.

Con respecto a los informes mensuales de obra, la entidad manifiesta que requiere un argumento técnico en los informes especialistas de obra, por lo que procederá a realizar la respectiva devolución del informe mensual No.3 por medio de un oficio formal, con la finalidad de que el contratista de obra acate las respectivas recomendaciones y observaciones por parte de la entidad, para esto se solicita que dicho documento sea especifico a fin de trasladar a cada profesional las observaciones que presenta la entidad.

Finalmente según lo previsto, se realiza un recorrido de obra con el fin de verificar el avance en ejecución física del contrato y se finaliza con este para dar inicio al comité de socialización del proyecto, solicitado por la comunidad en el marco de su proceder de intervención al proyecto, durante el mismo se pacta como

compromiso que es el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Santa María Baja quien suscribirá el acta de comité, previa revisión por las partes y se adjuntara el documento al presente como complemento del cumplimiento de las acciones del contrato.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	ENTREGAR CRONOGRAMA INTERVENCIÓN BOX COULVERT	ENTREGAR CRONOGRAMA DE FEHCAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS TIPO BOX COULVERT PARA REUNIÓN CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLACICENCIO EN CONFORMIDAD A LA OBRA QUE TENDRA INICIO KILOMETROS ARRIBA DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA	CONTRATISTA DE OBRA	PENDIENTE DE DEFINIR
	ENTREGA DE COMITÉ No.26 Y No.27	REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA DE LOS COMITES No. 26 Y 27 EN CONFORMIDAD A LOS TEMAS TRATADOS RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA ZONA.	ENTIDAD CONTRATANTE	PENDIENTE DE DEFINIR
3	COMITÉ EN CONJUNTO CON EL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO	GESTIONAR E INFORMAR FECHA PARA COMITÉ EN CONJUNTO CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	ENTIDAD CONTRATANTE	PENDIENTE DE DEFINIR
4	COMPROMISO CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	ENTREGA DE ACTAS DE COMITÉ ANTERIORES DONDE LA COMUNIDAD FUE PARTICIPE A PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	INTERVENTORIA	PENDIENTE DE DEFINIR
5	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE CIERRES VIALES	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE CIERRES VISLES PARA LOS TRAMOS 1,2 Y 3 A PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	CONTRATISTA DE OBRA	08/07/204
6	PROGRAMAR REUNIÓN PARA REALIZAR RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD	PROGRAMAR REUNIÓN PARA REALIZAR RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA MARIA BAJA	PENDIENTE DE DEFINIR
7	ENTREGA DE PRESENTE ACTA	ENTREGA DE PRESENTE ACTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA MARIA BAJA	PENDIENTE DE DEFINIR

REGISTRO FOTOGRÁFICO








3344





ASISTENCIA

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNION:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591.6; TRAMO 4 K2+100 A K2+200; TRAMO 5 K2+315 A K2+434.392; TRAMO 6 K2+452.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431.96; TRAMO 8 K3+446.725 A K3+461.435; TRAMO 9 K1+620 A K1+690 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
FECHA: 04/07/2024	HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINALIZACION:
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	Mabelle Tejada	[illegible]	Interventoría	Apoyo	[signature]	3126004421	
	[illegible]	[illegible]	Apoyo (a)	Sisa	[signature]	[illegible]	
	Erika Cruz Ventura	1.121.881.259	SISA	[illegible]	[signature]	[illegible]	
	Robinson Pineda Cortes	1015849741	Contratista	T S	[signature]	[illegible]	
	Karen S Ramirez P.	1121949958	Contratista obra	Residente	[signature]	3208356434	
	Diego Fernando D	[illegible]	Contratista	Residente	[signature]	[illegible]	

1010-F-GCT-59-V1 Fecha de Vigencia: 12-07-2017

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 11

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+621.6; TRAMO 4 K2+100 A K2+280; TRAMO 5 K2+316.4 K2+434.589; TRAMO 6 K2+461.776 A K2+610; TRAMO 7 K2+660 A K3+431.96; TRAMO 8 K3+649.725 A K3+461.495; TRAMO 9 K1+300 A K1+540 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
FECHA: 04/07/2024	HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDAD

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
1	Floya Tapiero	21754492	comunidad	Notary		3169260273	
2	Hector Gustavo Diaz	4275542	EDIL	Secretario		3177418405	
3	Rosa Giudette L.	21755691	Secretaria de Infraestructura	Apoyo		3137411966	
4	Yuvit Beltran.	1018720424	Comunidad		Yuvit Beltran	3173159956	
	Gilberto Romero	6058092	comunidad			3165688836	
	Luis Eduardo Suarez	17311449	comunidad	Social		3195960464	
	Apolinario Flores	7166621	comunidad			3165720241	
	Maria Teresa P.	21755132	Comunidad			3046760138	
	Olga Lucia Cardenas	21754980	Comunidad			3136565615	
	Maria Valeria Rico	31237477	Comunidad	Presidenta			
	Ana Ariana Cardenas	1006120781	Comunidad	Vocal		3229190735	
	Ricardo Gonzalez	3216470	Comunidad				
	Amalia Hernandez	22334620	Comunidad	Junta			
	Hugo Ferney Rivera	7729476073	Comunidad	Junta		3165240407	
	Cristian Ramos Garcia	1121888388	Presidente JAC	Presidente		3115802949	

Departamento Planeación Secretaría de Infraestructura

IRENE BELTRAN RINCON 1033685373 MARIA BAJA IRENE BR 3154126422

Betancourt Victor M. 1112462985 3163346893

Nelson Matias Da 1122558003

Juan Nava. M 1135685103 3155615556

3346

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	29				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	11	07	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	4:00 PM	HORA FINAL:	PM
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,020,826,948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
FECHA TERMINACION	28 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE MAYO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		

334


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Avance de obra a la semana No.19
2. Avances en las propuestas de estudios y diseños de estabilización y la adición de recursos.
3. Temas sociales.
4. Modificatoria No.2
5. Acta parcial No.1
6. Prorroga No.1
7. Compromisos anteriores.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	Acta suministro de agua	0%	
2.	Informe mensual No.4	0%	
3.	Modificatoria No.2 Por parte de interventoria	100%	Sin embargo, no se ha radicado por falta de reprogramación por parte de obra
4.	Entrega de comité No. 26 y No.27	50%	
5.	Comité Acueducto	0%	
6.	Reunión comunidad	50%	Ya se realizó la programación del comité por parte de entidad
7.	Entrega de acta por parte del presidente de la junta de Acción comunal.	0%	
8.	Cronograma Cierres viales	100%	Oficio-0106-COP 3233-2024 del 8 de julio de 2024
9.	Respuesta oficio P7-P8	0%	

LOCALIZACION DEL PROYECTO

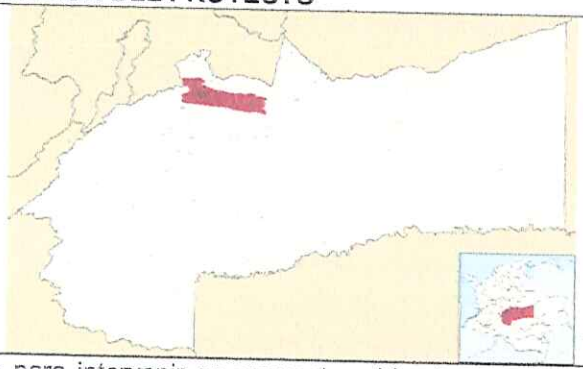

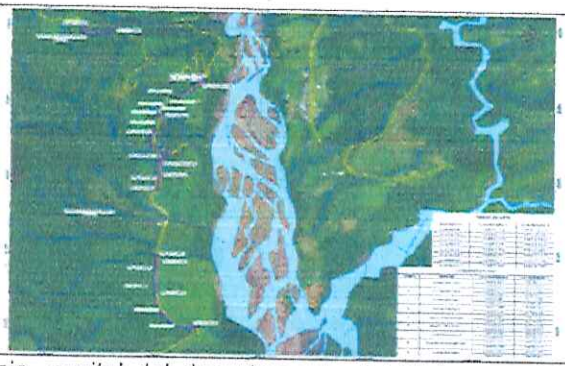



La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.


3348


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 3

ALCANCE DEL PROYECTO

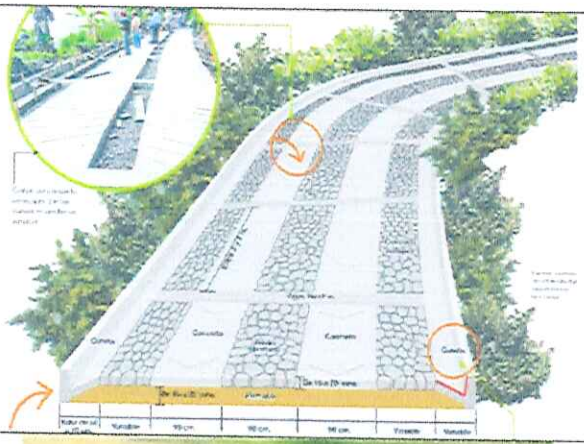

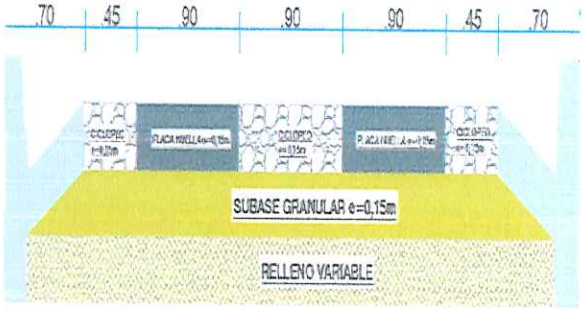

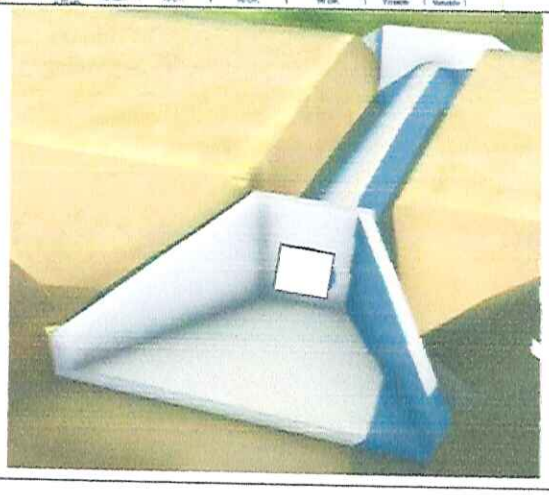

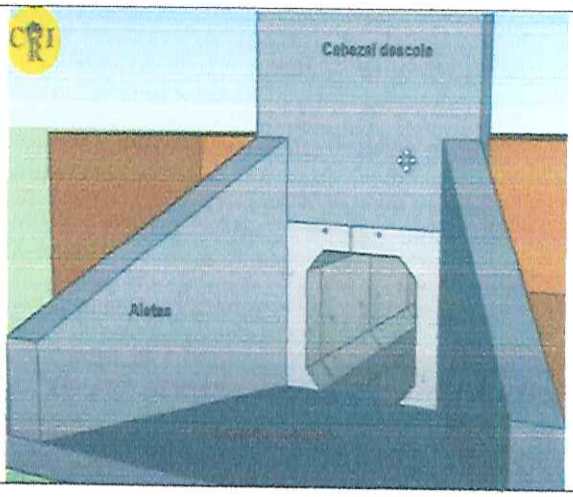

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 4 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

3349

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.468.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.636,00	100,00%

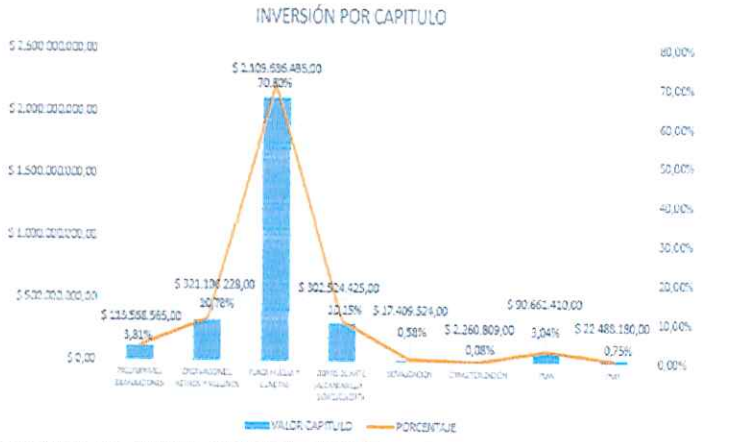

ANALISIS PROGRAMACION

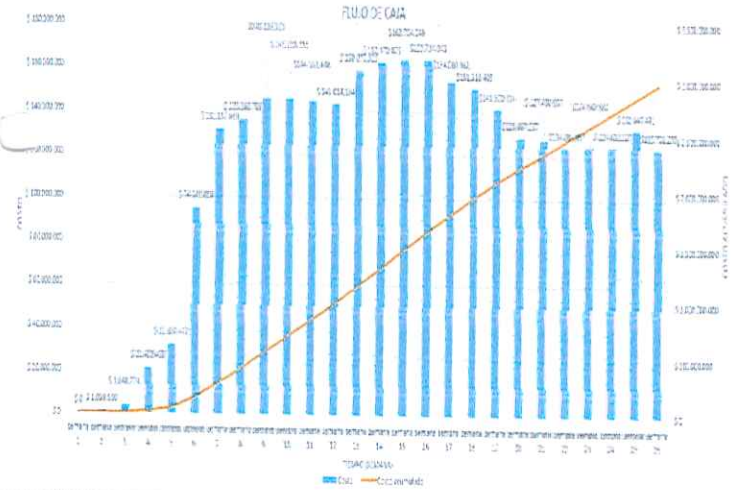


MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO				PORCENTAJE MENSUAL	
				MENSUAL		ACUMULADO			
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	1,95%	$ 58.240.351,00
	SEMANA 2	4/02/2024	10/02/2024	0,04%	$ 1.099.650,00	0,04%	$ 1.099.650,00		
	SEMANA 3	11/02/2024	17/02/2024	0,08%	$ 2.348.774,00	0,12%	$ 3.448.424,00		
	SEMANA 4	18/02/2024	24/02/2024	0,72%	$ 21.488.425,00	0,85%	$ 24.937.079,00		
	SEMANA 5	25/02/2024	2/03/2024	1,06%	$ 31.634.472,00	1,91%	$ 56.242.351,00		
2	SEMANA 6	3/03/2024	9/03/2024	3,14%	$ 94.963.654,00	5,14%	$ 151.206.105,00	13,37%	$ 398.348.802,00
	SEMANA 7	10/03/2024	16/03/2024	4,40%	$ 131.137.650,00	9,58%	$ 284.343.824,00		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,56%	$ 130.898.786,00	14,10%	$ 400.242.810,00		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,47%	$ 145.158.353,00	18,57%	$ 545.343.963,00		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,67%	$ 145.106.353,00	23,24%	$ 690.487.260,00	49,29%	$ 1.338.383.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,85%	$ 144.521.440,00	28,09%	$ 835.074.394,00		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,86%	$ 143.914.154,00	32,48%	$ 980.100.408,00		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,03%	$ 120.679.305,00	36,90%	$ 1.156.942.253,00		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,45%	$ 162.478.876,00	44,26%	$ 1.319.383.129,00		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,45%	$ 163.734.048,00	49,72%	$ 1.481.117.176,00	65,53%	$ 1.952.049.888,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,45%	$ 162.734.045,00	55,17%	$ 1.643.851.221,00		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,27%	$ 154.039.352,00	60,44%	$ 1.809.891.503,00		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,07%	$ 151.115.405,00	65,51%	$ 1.952.049.888,00		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,75%	$ 141.500.814,00	70,26%	$ 2.093.550.690,00	83,02%	$ 2.474.043.963,00
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,52%	$ 128.077.207,00	74,50%	$ 2.221.627.897,00		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,28%	$ 127.450.037,00	78,86%	$ 2.349.078.259,00		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,27%	$ 124.964.807,00	83,02%	$ 2.474.043.963,00		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,18%	$ 124.660.953,00	87,21%	$ 2.598.704.561,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,16%	$ 124.612.207,00	91,40%	$ 2.723.316.898,00		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,43%	$ 132.647.491,00	95,85%	$ 2.855.964.389,00		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,15%	$ 123.741.247,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00		

ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6,0 meses	Plazo Meses:	6,0 meses
Días transcurridos:	121 Días	Meses transcurridos:	4,03 meses
% transcurrido en tiempo:	66,85%		
Avance programado Acum. S19	$ 2.093.550.802,00	Avance programado Acum. S19	70,26%
Avance ejecutado Acum S19 $:	$ 1.299.915.289,18	Avance ejecutado Acum S19 $:	43,63%
Atraso o avance S19	$ 793.635.512,32	Atraso o avance S19	26,63%



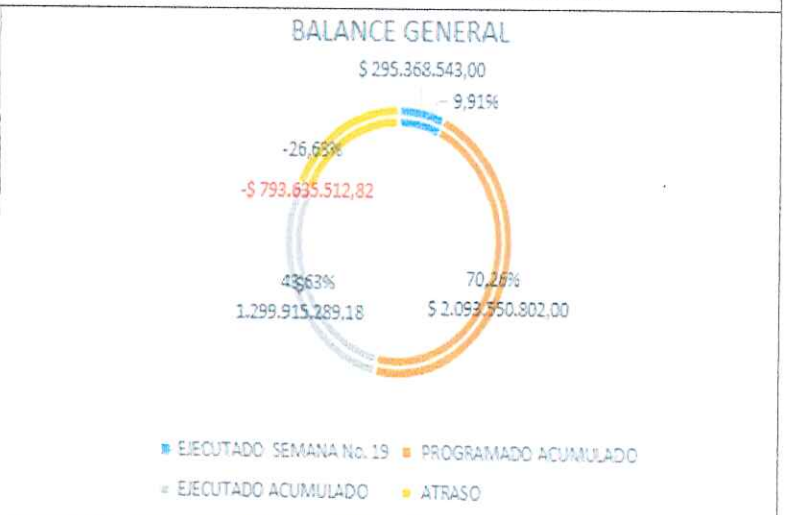

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%	$ 66.627.147,00	76,26%	$ 66.389.351,00	58,46%	-$ 20.237.796,00	$ -	-17,82%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.229,00	10,78%	$ 303.421.953,00	94,49%	$ 227.903.961,00	70,97%	-$ 75.517.992,00	$ -	-23,52%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.696.495,00	70,80%	$ 1.392.277.148,00	65,99%	$ 952.403.729,00	45,14%	-$ 439.873.419,00	$ -	-20,85%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.324.425,00	10,15%	$ 232.511.799,00	76,86%	$ 0,00	0,00%	-$ 232.511.799,00	$ -	-76,86%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.200.509,00	0,07%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%	$ 63.063.903,00	69,57%	$ 38.522.919,00	42,49%	-$ 24.545.884,00	$ -	-27,07%
8	PMT	$ 22.483.180,00	0,75%	$ 15.643.952,00	69,57%	$ 14.696.329,18	65,36%	-$ 948.622,82	$ -	-4,22%
		$ 2.979.705.036,00	100,00%	$ 2.093.550.802,00	70,26%	$ 1.299.915.289,18	43,63%	-$ 793.635.512,82	$ 0,00	-$ 793.635.512,82
										-26,63%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

3351

Personal en obra	Frentes de trabajo
2 Residentes 1 Social 1 SST 1 maestro 1 contramaestro 30 ayudantes	Tramo 6 Tramo 5 Tramo 4 Tramo 3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Se da inicio al comité No. 29, donde para tratar el tema 1 propuesto se realiza la respectiva descripción del alcance del contrato, los tramos a intervenir, se realiza la socialización del análisis de distribución presupuestal conforme a la modificatoria No.1 la cual esta vigente a la fecha, se manifiesta el análisis de avance de obra conforme a la semana No. 19 donde la interventoría manifiesta que el avance ha progresado en relación a las semanas anteriores, se dictan los materiales en obra y el personal actual con el que cuenta el contratista de obra.

En conformidad al punto 2, en relación a los avances en las propuestas de estudios y diseños de estabilización y la adición de recursos, el contratista de obra manifiesta que en relación a la socavación de tramo 7 se han venido haciendo las respectivas verificaciones de los movimientos del talud mediante tomas de topografía por medio de los mojones instalados según sugerencias del especialista en geotécnica diego duque, por lo cual el contratista de obra ha realizado el reporte de 3 tomas de movimientos, para finalmente realizar un cuarto reporte. Indica que en relación al tramo 9 donde de igual manera se presentan fisuras, iniciaron con la instalación de mojones y tomas de topografía esto también con la finalidad de observar el movimiento que presenta el talud, así mismo se realizaran los respectivos reportes. Lo que concierne a la estructura hidráulica P8 la cual se encuentra ubicada en tramo 7, se indica que es un punto el cual a la fecha aun no se ha intervenido y sigue en proceso de seguimiento, en relación a tramo 6 el contratista de obra indica que el realizar un reajuste a los diseños implica un costo mayor y la intervención podría costar mas del 50% del valor de la obra, es por esto que solicita la no intervención de las abscisas (K2+673.193 – K2+810) ubicadas en la zona de deslizamiento de tramo 6. El contratista de obra manifiesta que el geotecnista ya cuenta con la información pertinente y ya está iniciando con los estudios y diseños por lo que se Indica que por sugerencias del especialista en geotecnia para la estabilización del terreno se requiere lo siguiente:

-Para tramo 7 punto donde se presenta la socavación de la placa huella como acción inmediata se requiere un muro con Geobloques, toda vez que el movimiento de talud continua, en nueva visita técnica se observa una gran grieta en el terreno que encuentra debajo de la placa huella, adicionalmente manifiesta que hace un mes a fecha de hoy la socavación aumento en 20cm y la altura de igual manera, en la primer visita se tenia una altura de 2.1m y a fecha de hoy se tiene 2.7m, adicionalmente indica que la zona esta influenciada por dos fallas geológicas, las cuales generan fisuras como se observa en tramo 7.
-Para la estructura hidráulica P8, ubicada en tramo 7 manifiesta que es un punto en el cual se presenta gran cantidad de afloramiento de agua, y que adicionalmente se presenta un azufre de color amarillo que baja por todo el talud de la zona, adicionalmente indica que se requiere de un mayor análisis donde se deben realizar perforaciones toda vez que existe una perdida de bancada o realizar mas estudios con el fin de saber si el talud es apto para excavar y ganar espacio para banca de vía.

Por lo que se concluye que se deben realizar estudios y diseños y que el tiempo que se requiere para estos estudios es un tiempo de aproximadamente 4 semanas, donde el contratista de obra realizara la entrega de los estudios para tramo 7 y estructura hidráulica p8 y el presupuesto de obra para la

estabilización de los taludes nombrados anteriormente. Adicionalmente indica que aun asi aumentando el valor del presupuesto en un 50% no alcanza para estabilizar las zonas afectadas (tramo 6, estructura hidráulica p8 y tramo 7).

Donde interviene la entidad y manifiesta que la posición de ellos sigue siendo la misma, el alcance físico del proyecto no se puede modificar ni reducir toda vez que es un contrato financiado por el sistema generar de regalías.

Por lo que interviene la interventoría y manifiesta que se pueden plantear 3 alternativas las cuales hacen referencia a:

-Plantear los estudios y diseños y la intervención física por medio de dos fases, para que en el actual proyecto se ejecute fase 1 y posterior a la entrega se realice todo el tramite y posteriormente se ejecute la estabilización de tramo 6.
-Realizar mesa de trabajo con el Sistema de Gestión de regalías y los demás entes que así lo requieran, en compañía de la interventoría y del contratista de obra, con el fin de justificar las razones por las cuales es algo imposible intervenir tramo 6.
-Esperar que llegue el verano para poder intervenir, lo cual no es una solución viable toda vez en el próximo invierno se puede generar una perdida de vía lo cual generaría un detrimento publico para todas las partes.

Interviene el contratista de obra y exponen de igual manera 3 alternativas, las cuales se describen a continuación:

-Dejar una ventana en tramo 6 y no ejecutar la zona de influencia del derrumbe toda vez que a la fecha aun se generan pequeños deslizamientos, realizar los respectivos estudios y diseños para tramo 7 y alcantarilla p8 y la respectiva intervención de manera inmediata.
-Realizar monitoreos hasta lograr culminar los estudios y diseños y definir cual es el tipo de intervención que requiere esta zona, ya que es de gran magnitud.
-Concuerda con intervenir por fases, se pueden establecer los estudios y diseños en fase 1 y para fase dos una vez culminado el contrato 3233 de 2023 se apertura una licitación para la estabilización del talud de tramo 6.

Por lo que interviene la entidad y manifiesta que requiere una mesa de trabajo para escalar a secretaria de planeación municipal con el fin de plantearle las alternativas y realizar las respectivas consultas con el fin de que indiquen el proceder, por lo que solicita un plazo de 10 días para tal consulta. Por lo que manifiesta al contratista detener los estudios y diseños que esta próximo a realizar toda vez que planeación municipal puede tomar otras decisiones por lo que planteara ante planeación municipal las siguientes alternativas:

-Realizar un mejoramiento a la socavación de tramo 7 sin realizar alguna adicional.
-Generar una consultoría para la realización de estudios y diseños de la estabilización de los taludes críticos, y una licitación publica para la ejecución de la obra
-Generar un adicional para intervenir tramo 7 y estructura hidráulica p8, sin la intervención de tramo 6.

Por lo que respecta como última intervención a este punto, la entidad contratante manifiesta detener por 10 dias los estudios y diseños que ya habian iniciado hasta que planeación municipal dicte una directriz.

En relación al punto 3, donde se manifiesta lo relacionado con la problemática social, en cuanto a las quejas puestas por el presidente de la junta de acción comunal por medio de redes sociales de manera informal, la interventoría indica que ha realizado oficios al contratista de obra, con el fin de dar respuesta

3353

con los respectivos soportes a la interventoría, por lo que interviene el contratista de obra y manifiesta que realizaron un oficio donde indican que se encuentran en la respectiva elaboración de un informe social donde darán respuesta a cada uno de los puntos con los respectivos soportes.

En lo que concierne al punto 4 en referencia a la modificatoria No.2 la interventoría manifiesta que por parte del contratista de obra falta la entrega de la programación de obra y que en conformidad a los demás documentos por parte de interventoría están ok en su revisión.

Donde interviene el contratista de obra y manifiesta que acabo de realizar él envió de la documentación requerida e interviene el contratista de interventoría y manifiesta que será revisada y si lo referente a la programación esta ok se radicara el día 12 de julio de 2024.

En referencia al punto 5 el contratista de obra manifiesta que realizó la respectiva radicación de proyección de acta parcial No.1, sin embargo, interviene la interventoría y manifiesta que primero deben ponerse al día con los pendientes como informe mensual No.3 y 4, modificatoria No.2, sin esta modificatoria estar aprobada, esta interventoría no podría radicar la parcial No.1, además indica que se debe radicar la solicitud de parcial conforme como lo indica la lista de chequeo.

En relación a la prórroga No.1 la interventoría manifiesta que se debe realizar una nueva acta conforme a la prórroga, cumpliéndose la lista de chequeo exigida por la entidad, y este tramite surgirá una vez la modificatoria No.2 sea aprobada por la entidad contratante.

Para finalizar se da lectura a los compromisos de actas anteriores.


Sin otro particular, finaliza el comité.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	REUNIÓN CON PLANEACIÓN	La entidad manifiesta compromiso de elevar reunión con planeación con el fin de definir la intervención o no intervención de tramo 6, temas de estudios y diseños y adicional de recursos para socavación en tramo 7 y perdida de bancada en estructura hidráulica P8.	ENTIDAD	22-07-2024
2	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.3 E INFORME MENSUAL No.4	El contratista de obra manifiesta que se compromete a realizar la respectiva entrega de las observaciones del informe mensual No.3 y entrega del informe mensual No.4	CONTRATISTA DE OBRA	16-07-2024
3	ENTREGA DE PARCIAL No.1	El contratista de obra manifiesta que se compromete a realizar la respectiva entrega de la parcial No.1	CONTRATISTA DE OBRA	SIN FECHA

3354

REGISTRO FOTOGRÁFICO

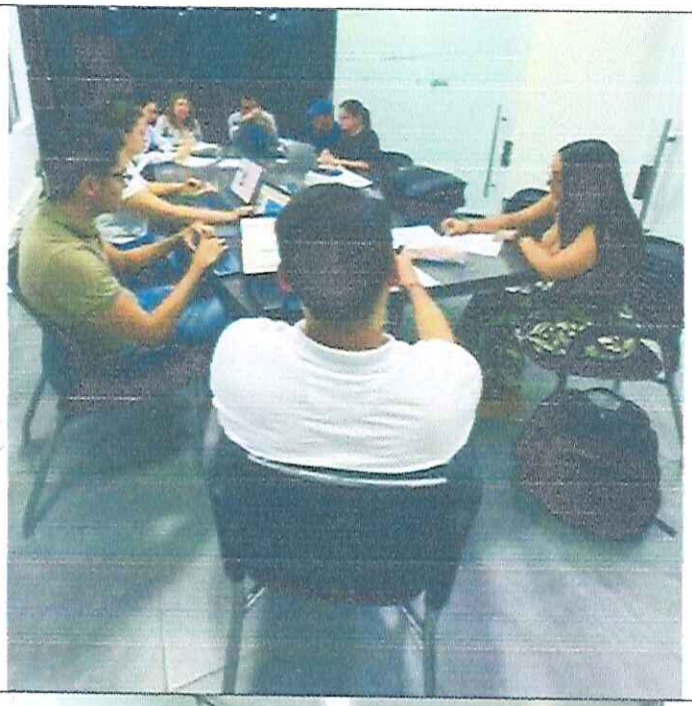







3355

ASISTENCIA

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453,736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+481,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
FECHA: 11/07/2024	HORA INICIO: 4:00 PM HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Anabelle Trujillo	1006200096	Interventoria	Apoyo		3220044421	interventoriavillas@gmail.com
2	DIEGO OTALORA	1010724876	CONTRATISTA	SIG ambiental		3107743165	
3	KAREN TOVAR	1121904970	CONTRATISTA OBRA	Ing residente		3202356239	
4	WILMAN ANDRES VERA	1121906722	INTERVENTORIA	DIRECTOR		3198100926	ingwilmervera@gmail.com
5	MARIO CASTRO	1121841464	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR		3138220250	
6	JAIME MARTINEZ G	1121898261	SIM	APOYO (S)		3208537549	
7	ENRIQUE VARGAS	1.121.881.309	SIM	DIRECTIVO		3138004148	
8	Ricardo Palomeque	14.274.149	ARDISAF			316 2744634	
9	Miguel Alejandro [illegible]	1022424460	ARDISAF	R legal		3125691995	
10	DIEGO DUARTE	1.121.[illegible]	Geotecnia	Geotecnia			
11	JENNIE PEREZ	60290072	CONTRATISTA ARDISAF	DIRECTOR OBRA		3024132981	

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-84-V1

3356

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	30				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	17	07	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
HORA DE INICIO:	2:30 PM	HORA FINAL:	6:30 PM
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,020,826,948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
FECHA TERMINACION	28 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE MAYO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Avance de obra a la semana No.20
2. Avances tramites de puntos criticos.
3. Compromisos anteriores.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	Acta suministro de agua	0%	24/07/2024
2.	Informe mensual No.3 y 4	0%	18/07/2024
3.	Modificatoria No.2 Por parte de interventoría	100%	
4.	Entrega de comité No. 26 y No.27	50%	23/07/2024
5.	Comité Acueducto	0%	26/07/2024
6.	Reunión comunidad	50%	Ya se realizó la programación del comité por parte de entidad
7.	Entrega de acta por parte del presidente de la junta de Acción comunal.	0%	
8.	Respuesta oficio APUS	0%	23/07/2024
9.	Respuesta oficio P7-P8	0%	23/07/2024
10.	Reunión con planeación.	100%	17/07/2024
11.	Entrega parcial No.1	0%	23/07/2024

LOCALIZACION DEL PROYECTO

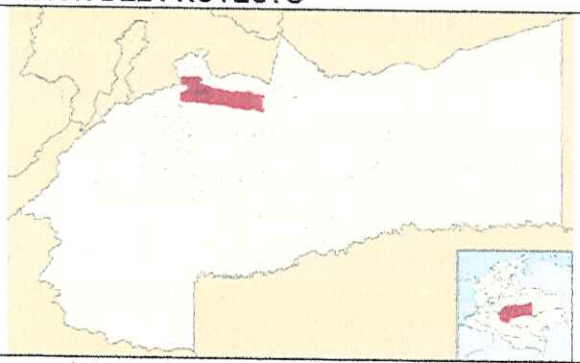





La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.


3358

ALCANCE DEL PROYECTO



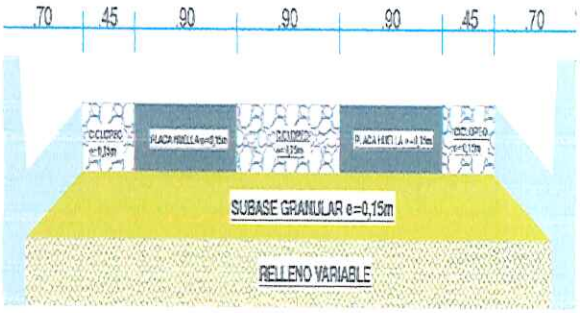

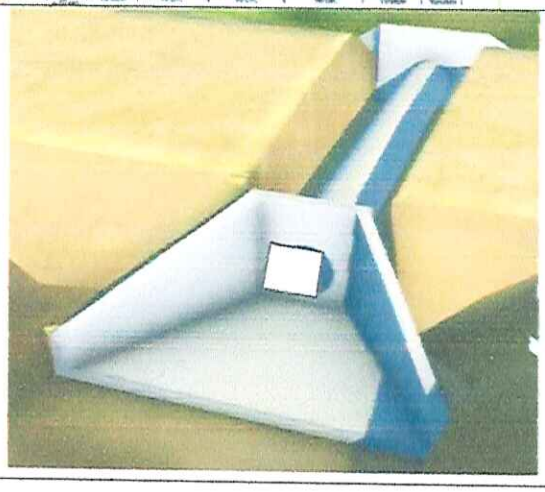

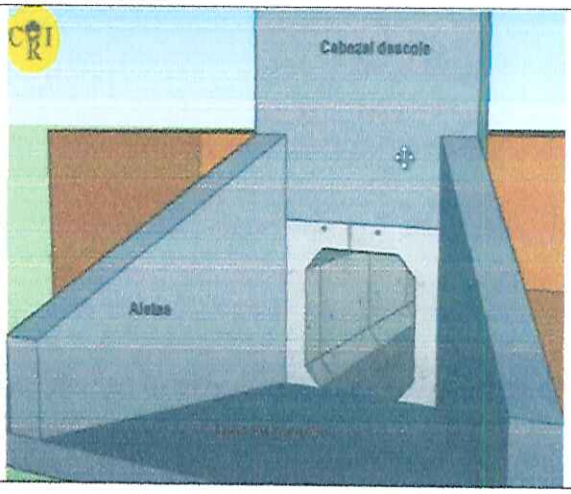

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 4 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.488.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.636,00	100,00%

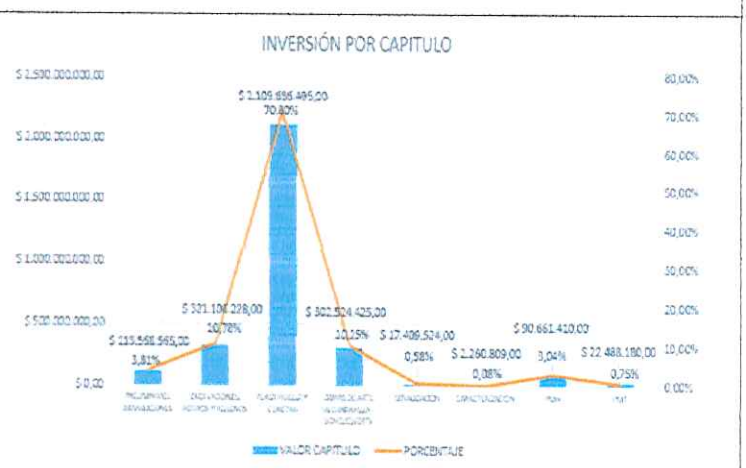

ANALISIS PROGRAMACION

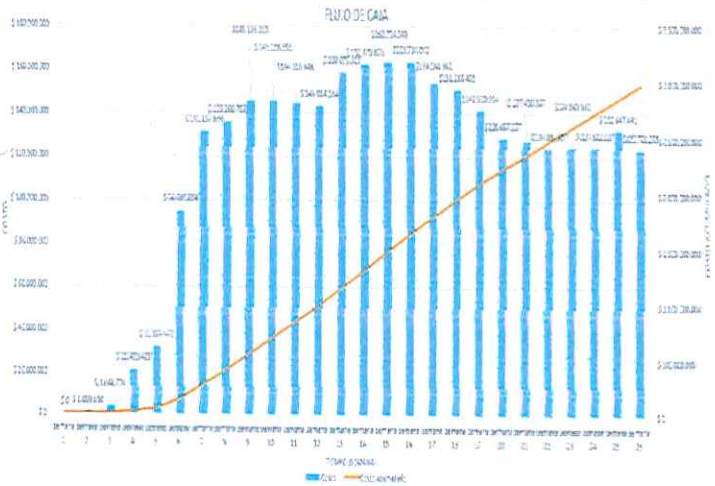

MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO				PROGRAMADO MENSUAL	
				MENSUAL		ACUMULADO			
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	3,90%	$ 58.242.151,00
	SEMANA 2	5/02/2024	10/02/2024	0,04%	$ 1.099.600,00	0,04%	$ 1.099.600,00		
	SEMANA 3	12/02/2024	17/02/2024	0,32%	$ 9.648.774,00	0,37%	$ 9.648.424,00		
	SEMANA 4	19/02/2024	24/02/2024	0,70%	$ 21.459.456,00	0,89%	$ 26.407.879,00		
	SEMANA 5	26/02/2024	2/03/2024	1,07%	$ 31.834.272,00	1,95%	$ 58.242.151,00		
2	SEMANA 5	4/03/2024	9/03/2024	3,19%	$ 94.902.854,00	5,14%	$ 153.206.165,00	10,37%	$ 309.242.903,00
	SEMANA 7	11/03/2024	16/03/2024	4,80%	$ 121.197.920,00	9,94%	$ 296.343.024,00		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,56%	$ 135.069.799,00	14,50%	$ 431.213.823,00		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,87%	$ 145.198.925,00	19,37%	$ 576.362.960,00		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,87%	$ 145.128.263,00	24,24%	$ 721.497.207,00	44,26%	$ 1.318.383.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,85%	$ 144.531.448,00	29,09%	$ 866.316.764,00		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,96%	$ 147.674.164,00	34,04%	$ 1.013.990.928,00		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,01%	$ 149.079.305,00	39,05%	$ 1.163.070.233,00		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,05%	$ 150.670.896,00	44,09%	$ 1.313.741.129,00		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,40%	$ 161.754.040,00	49,49%	$ 1.475.495.169,00	43,13%	$ 2.852.049.408,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,40%	$ 161.734.043,00	54,89%	$ 1.637.229.212,00		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,17%	$ 154.080.322,00	60,06%	$ 1.791.309.534,00		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,07%	$ 151.118.405,00	65,13%	$ 1.942.427.939,00		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,75%	$ 141.300.814,00	70,78%	$ 2.083.728.753,00	33,10%	$ 2.478.902.963,60
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,52%	$ 134.677.207,00	74,30%	$ 2.218.405.960,00		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,29%	$ 127.468.937,00	79,59%	$ 2.345.874.897,00		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,17%	$ 124.354.287,00	83,76%	$ 2.474.001.983,00		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,18%	$ 124.980.560,00	87,91%	$ 2.598.724.543,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,16%	$ 124.612.207,00	92,40%	$ 2.771.134.800,00		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,40%	$ 122.647.491,00	95,85%	$ 2.855.994.187,00		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,15%	$ 123.711.350,00	100,00%	$ 2.979.705.636,00		


3359

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 5

ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6,0 meses	Plazo Meses:	6,0 meses
Días transcurridos:	135 Días	Meses transcurridos:	4,5 meses
% transcurrido en tiempo:	74,95%		
Avance programado Acum. S20	$ 2.222.228.159,00	Avance programado Acum. S20	74,58%
Avance ejecutado Acum S20 $:	$ 1.474.992.415,00	Avance ejecutado Acum S20 $:	49,50%
Atraso o avance S20	$ 747.235.744,00	Atraso o avance S20	25,08%



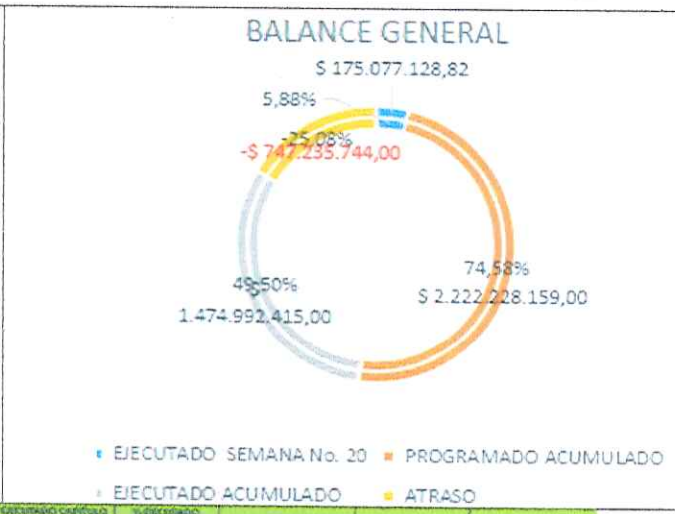

Nº	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PONDERADO	VALOR VENTA POR CAPITULO	% PROG	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.866,00	3,81%	$ 90.475.921,00	79,67%	$ 72.396.329,00	63,75%	-$ 18.079.592,00	$ -	-15,92%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%	$ 305.948.278,00	95,28%	$ 242.064.519,00	75,38%	-$ 63.883.759,00	$ -	-19,89%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.696.496,00	70,80%	$ 1.494.764.193,00	70,85%	$ 1.107.313.313,00	52,49%	-$ 387.450.879,00	$ -	-18,37%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%	$ 247.407.459,00	81,78%	$ 0,00	0,00%	-$ 247.407.459,00	$ -	-81,78%
5	SEÑALIZACION	$ 17.408.624,00	0,58%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.200.809,00	0,08%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 90.861.412,00	3,04%	$ 67.310.504,00	74,07%	$ 39.502.919,00	43,48%	-$ 28.487.585,00	$ -	-31,42%
8	PMT	$ 22.488.180,00	0,76%	$ 16.621.698,00	73,91%	$ 14.695.329,00	65,36%	-$ 1.926.370,00	$ -	-8,57%
		$ 2.979.705.036,00	100,00%	$ 2.222.228.159,00	74,58%	$ 1.474.992.415,00	49,50%	-$ 747.235.744,00	$ 0,00	-$ 747.235.744,00
										-25,08%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

Personal en obra	Frentes de trabajo
2 Residentes 1 Social 1 SST 1 maestro 1 contramaestro 30 ayudantes	Tramo 6 Tramo 5 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia el comité de obra donde se realiza la respectiva descripción del alcance del contrato, tramos a intervenir, se realiza una descripción del avance en ejecución a la semana No. 20 del contrato, donde se evidencia el porcentaje de avance programado versus el porcentaje de avance ejecutado y cual es el atraso marcado a la fecha.

Dando continuidad al punto dos Interviene entidad contratante y manifiesta que van a exponer las alternativas que tienen como secretaria de infraestructura para tener un punto de partida e indica que, de acuerdo a la mesa de trabajo con planeación, la entidad socializo cada uno de los tramites, solicitudes, comités y oficios que se han realizado entre las partes, contratista de obra, interventoría y entidad contratante sobre los puntos críticos que se presentan en el contrato en ejecución No. 3233 de 2023. Adicionalmente se expuso en la mesa de trabajo las alternativas que quedaron plasmadas en el comité No. 29 el cual se llevo a cabo el 11 de julio de 2024 en la secretaria de infraestructura. Donde indican que desde la secretaria de planeación municipal recuerda que al ser un contrato financiado por el Sistema General de Regalías no se puede modificar ni el objeto contractual ni la meta producto del contrato, por lo tanto, manifiesta que el tramo 6 donde ocurrió la remoción en masa se debe intervenir, así como todos los puntos críticos que se tienen en el contrato.

Así mismo, manifiestan que la secretaria de planeación municipal dio viabilidad a la adición de recursos para la intervención de tramo 7 y dio viabilidad para que la oficina de gestión del riesgo apoye con los estudios y diseños, adicionalmente la entidad contratante realizó una mesa jurídica para la intervención de tramo 7 con las propuestas planteadas por el contratista de obra, realizando un análisis de la matriz de riesgos del contratista por parte de la ya mencionada dependencia de jurídica en busca de alternativas, por lo que al realizar la valoración de la matriz de riesgos y las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato No. 3233 de 2023, se identificaron dos ítems con asignación de riesgos al contratista de obra las cuales hacen referencia al tema de estudios y diseños para el numeral 36 y 37 como de describe a continuación:



Proceso Gestión de la Contratación
MODELO DE ANÁLISIS DEL RIESGO

subcontratistas, profesionales, especialistas, salarios y seguridad social o la pérdida de empleados claves en la ejecución del contrato.

36. Presencia durante la ejecución del contrato de zonas inestables no identificadas o tipos de suelos diferentes a los estudios y diseños.

37. Riesgo por la variación en estimación de las actividades para el cumplimiento del contrato (pe: mayor o menor costo para ensayos de laboratorio, viáticos, implementación de jornadas nocturnas, implementación señales de seguridad de la obra, implementación del plan de movilidad entre otros).

Donde para finalizar lo expuesto en la matriz de riesgos la abogada de la entidad, manifiesta que son condiciones desde la etapa precontractual y que durante la licitación ningún proponente refuto sobre los riesgos adquiridos.

Así mismo, por parte de la abogada de la entidad enuncia la clausula 10, numeral 31 y 32 donde se requiere hacer unos ajustes nuevos, el contratista de obra deberá hacerlos para validación y aprobación como se muestra a continuación.

31. Si se requiere de realizar ajustes a los diseños o diseños nuevos a los presentados por la entidad el contratista de obra deberá realizarlos a su costo debidamente avalados por profesionales competentes y deberá remitirlos a la interventoria y la entidad para su validación y aprobación.
32. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del contratista. Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño y construcción.

Por lo que interviene el contratista de obra e indica que se deben establecer de que condiciones iniciales hablan, adicionalmente manifiesta que han realizado los respectivos ajustes y diseños de placa huella. Manifiesta que la situación que se presenta en la zona donde se ejecuta el contrato de obra es netamente ajeno a las voluntades de las partes y así mismo, ni interventoría ni entidad ni contratista de obra debe asumir ninguna responsabilidad conforme a lo sucedido, toda vez que como ya se menciono son hechos ajenos y de carácter netamente de la naturaleza. Por lo que por parte del contratista de obra manifiesta que continúan avanzando con los estudios y diseños para tramo 7 en conformidad a la viabilidad del adicional de recursos para la estabilización del talud de los puntos críticos.

Interviene la entidad e indica que lo descrito por la dependencia de jurídica son las situaciones reales del contrato, adicionalmente manifiesta que se llevará a cabo una reunión con Gobernación del Meta, el día viernes 19 de julio de 2024 para poder llegar a alguna solución posible, buscando un punto intermedio donde la obra no se vea afectada económicamente y la entidad e interventoría no se afecten disciplinaria y penal.

Por lo que interviene la interventoría y manifiesta que conoce de las obligaciones del contratista de obra y afirma que es cierto que la entidad entrego diseños en cuanto a la placa huella, diseños de cunetas, de box Coulvert, mas no entrego diseños de estabilización de taludes, indica que esta de acuerdo en que las partes involucradas no son culpables de los sucesos de puntos críticos, son hechos ajenos y de carácter natural donde se presento una falla por estabilidad de talud, son hechos impredecibles, así mismo, manifiesta que el contratista de obra si ha generado rediseños, toda vez que se han basado para placa huella en los diseños tipo invias y adicionalmente la entidad entrego diseños sobredimensionados de las estructuras hidráulicas tipo Box Coulvert donde el contratista efectuó los rediseños para hacerlos mas eficientes, de igual manera sucedió con la implementación geométrica, donde el contratista de obra tuvo que realizar el levantamiento topográfico de todos los tramos y realizar el rediseño geométrico. Aclara que los estudios y diseños que refieren en la matriz de riesgo los cuales le competen al contratista de obra hacen referencia a diseños de placa huella, mas no a estudios y diseños de estabilización de talud los cuales presentan un precio entre 250.000.000,00 y 300.000.000,00 de pesos moneda corriente, lo que concierne aproximadamente el 10% del costo total del contrato.

352

Para finalizar la intervención de la interventoría manifiesta que en lo posible no llegar a instancias jurídicas, ya que nosotros como técnicos entremos si es imputable o no imputable solo con los hechos que hemos presenciado a lo largo de la ejecución del contrato.

Por lo que la entidad manifiesta que busquen soluciones temporales con bioingeniería, y realicen el respectivo modificatorio para la inclusión de ítems no previstos para la estabilización de talud.

La directora de obra manifiesta revisar en la matriz de riesgos el numeral 27 donde aclarar la imposibilidad de ejecutar el contrato.

Por lo que interviene la abogada de la entidad y manifiesta que este ítem no es de competencia, además está asignado al contratista de obra.

Interviniente el Magister en Geotecnia el ingeniero Diego Duque y realiza una intervención donde manifiesta que se realizo una visita donde se identificaron los procesos morfodinámicos para así diagnosticar la estabilización de la placa huella. Manifiesta que el contratista de obra ha realizado el monitoreo de los movimientos del talud mediante la topografía, insumos que fueron entregados para los respectivos estudios y diseños, manifiesta que para tramo 7 no es una pequeña socavación sino es un movimiento en masa global morometricamnete cateterizado y morfodinámico activo.

Por lo que el magister en geotecnia procede a realizar una explicación de tramo 7 manifestando que se deben tomar acciones inmediatas ya que se corre el riesgo de perdida de bancada, por lo que adjunto a este comité se anexan las diapositivas presentadas por parte del ingeniero Diego Duque el cual hace parte del equipo del contratista de obra.

Para finalizar el comité la interventoría solicita que el contratista de obra realice la entrega del concepto materializado en un informe y solicitud de diseños y Análisis de precios unitarios para la aprobación del filtro francés que se requiere realizar.


Sin otro particular, finaliza el comité.


COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1.		Reunión con gobernación	Entidad	19 de julio de 2024
2.		Oficio de solicitud de filtro francés	Contratista de obra	18 de julio de 2024

3363

REGISTRO FOTOGRÁFICO

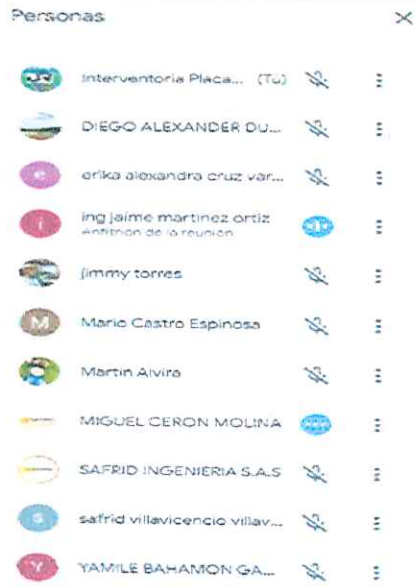

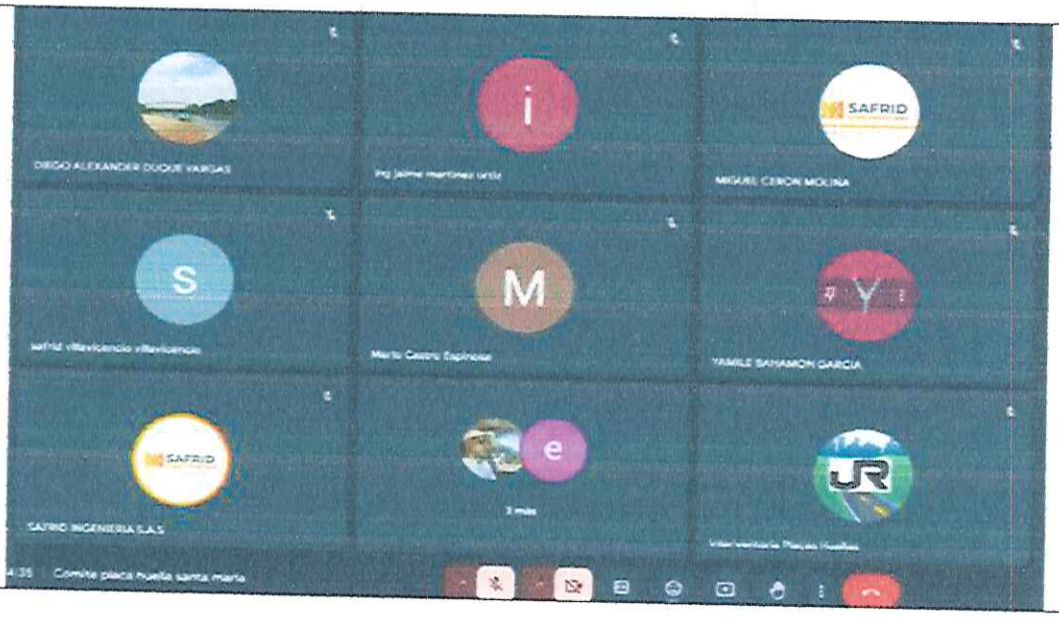

ASISTENCIA

COMITÉ VIRTUAL

3364

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

COMITÉ No.	31				DD	MM	AA
CONTRATO No	3233	DE	2023	FECHA ACTA	19	07	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	RECORRIDO DE OBRA		
HORA DE INICIO:	3:00 PM	HORA FINAL:	7:00 PM
CONVOCA:	COMUNIDAD – PRESIDNETE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL S. B		
VALOR INICIAL:	TRES MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.020.826.948.00)		
VALOR ACUTALIZACO MODIFICATORIA:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
VALOR TOTAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,979,705,636.00)		
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATO INTER No	3154 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	N/A		
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE		
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
APOYO SUPERVISION	JAIME MARTINEZ		

3365

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

ORDEN DEL DIA DESCRITO EXACTAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA MARIA BAJA


1. Iniciar con el tramo 9 para realizar la revisión de cabezote de alcantarilla y saber ¿cuándo será la terminación de la misma?
2. En el tramo 8, revisión de los 19 metros construidos.
3. En el tramo 7, revisión de la zona de afectación que ha generado la socavación producto del fenómeno natural del nacedero de agua. Para ello es importante saber ¿qué obra se va a realizar para ese punto?, terminación de bordillos, voskulver, así como la explicación técnica de la fisura del concreto y concepto de parte de interventoría del concreto que está en mal estado. Revisión y concepto técnico de los 50 metros de placa huella que no se ha terminado.
4. Tramo 6. Terminación del tramo (puente militar) y sugerencias de construir cunetas en V, para el retorno del bus escolar y automóviles (turistas) que transitan en tiempos de sequía.
5. Tramo 5. Definir las ramplas (terminación de la placa huella).
6. Tramo 4. Definir ramplas, cunetas anchas para el ingreso de viviendas y fincas.
7. Tramo 3. Revisión de la placa huella sobre el puente.
8. Tramo 2. ¿Cuál va ser la Intervención de la cuneta del margen derecho de la vía que recoge bastante agua en tiempos de lluvias? Se sugiere hacer hace cuneta en V amplia y pedimos concepto de interventoría sobre ese tramo.
9. Tramo 1. Revisión de terreno y posible fecha de terminación de obra.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1.	Entrega de acta por parte del presidente de la junta de Acción comunal del comité del 4 de julio de 2024.	0%	
2.			
3.			

LOCALIZACION DEL PROYECTO




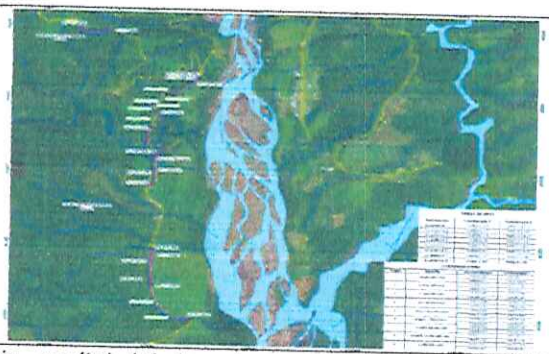



La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del rio Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona urbana y se caracteriza por una topografía escarpada.


3366

ALCANCE DEL PROYECTO

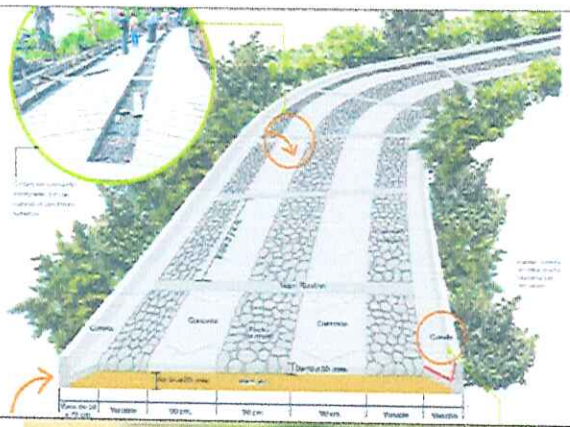

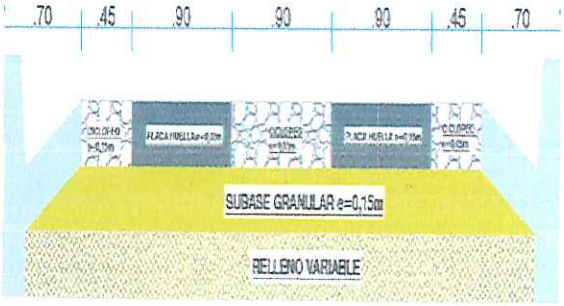

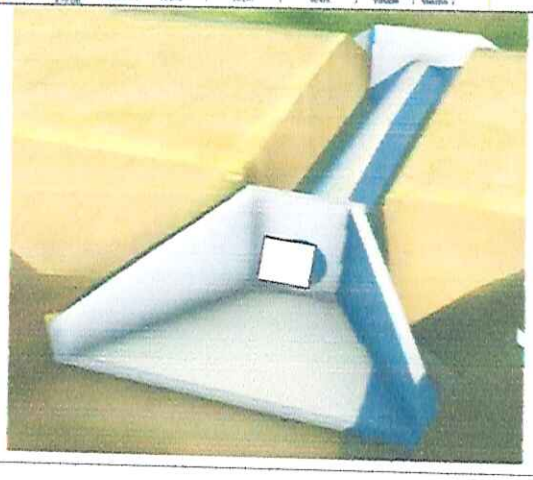

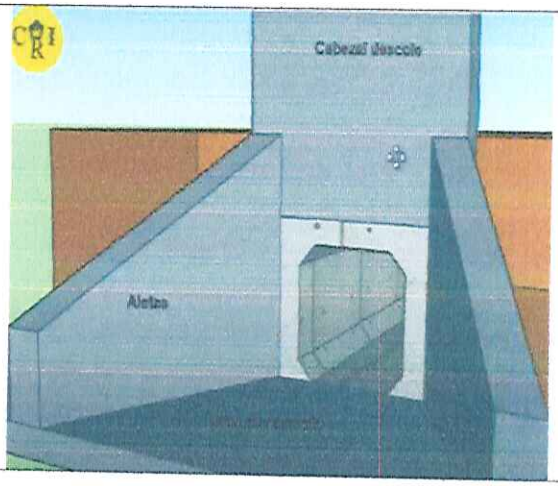

1. Se realizará la construcción de aproximadamente 1.9 Km de placa huella.
2. Se realizará la construcción de placa huella con un ancho entre bordillo y bordillo de 5m
3. Se realizará la construcción de 4 Box Culvert
4. Se realizará la construcción de 8 aletas
5. Se realizará la demolición de 6 alcantarillas tubulares
6. Se realizará la excavación de aproximadamente 935.22 M3 de material sobrante para caja vía.
7. Se realizará el relleno de aproximadamente 1550.05 M3 de material Tamaño Max 2"
8. Se realizará el suministro, extendido y compactación de aproximadamente 1320.62 M3 de Subbase granular de rio seleccionado Tamaño Max 2".
9. Se realizará el sobre acarreo de 16936,95 M3-MK de material, 20% compactado.
10. Se realizará el suministro y vaciado de 523.47 M3 de concreto de piedra pegada de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0,15m
11. Se realizará la construcción de 3485.60 M2 de placa huella de 20.7 MPa (3000 psi) con e=0.15m incluye hierro
12. Se realizará la construcción de 611.08 M3 de concreto para la berma y cuneta de 20.7 MPa (3000 psi)
13. Se realizará la excavación de 235,67 M3 de material para los box culvert
14. Se realizará el suministro y amarre de 16006.20 kg de acero de refuerzo figurado 412 Mpa para los box culvert
15. Se realizará la instalación de 44 unidades de señal V SP/SR/SI

3367

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES INICIALES


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	400,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	180,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1899,10	

TRAMOS PARA INTERVENIR CONDICIONES MODIFICAOTRIA No.1


Tramo	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Ancho (m)
1	K 0 + 900	K 1 + 300	380,00	5,00
2	K 1 + 340	K 1 + 520	160,00	5,00
3	K 1 + 540	K 1 + 592	51,60	5,00
4	K 2 + 190	K 2 + 290	100,00	5,00
5	K 2 + 310	K 2 + 435	124,51	5,00
6	K 2 + 454	K 2 + 810	356,26	5,00
7	K 2 + 960	K 3 + 432	471,96	5,00
8	K 3 + 447	K 3 + 461	14,77	5,00
9	K 1 + 690	K 1 + 890	200,00	5,00
		Total	1859,10	

ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL – CONDICIONES MODIFICATORIA No.1

Id	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.565,00	3,81%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.106.228,00	10,78%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.495,00	70,80%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%
5	SEÑALIZACION	$ 17.409.524,00	0,58%
6	CARACTERIZACIÓN	$ 2.260.809,00	0,08%
7	PMA	$ 90.661.410,00	3,04%
8	PMT	$ 22.488.180,00	0,75%
		$ 2.979.705.636,00	100,00%

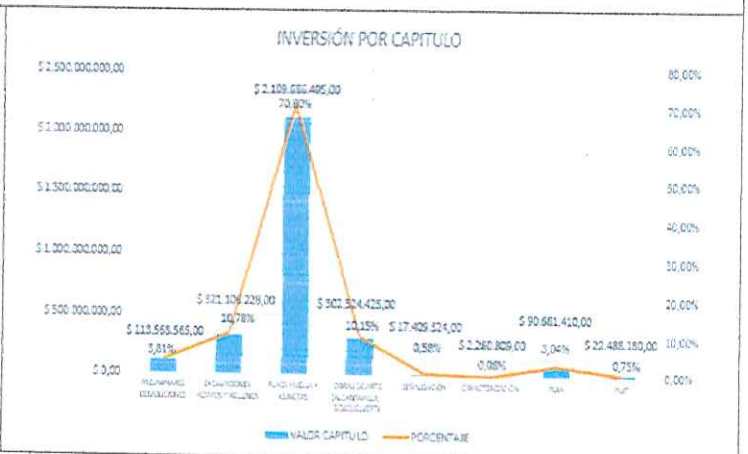

ANALISIS PROGRAMACION

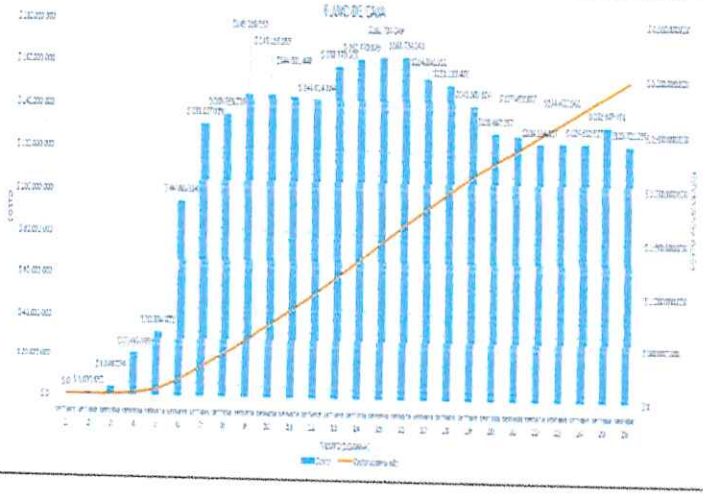


MES	SEMANA	INICIO	FIN	PROGRAMADO				PROGRAMADO MENSUAL	
				MENSUAL		ACUMULADO			
1	SEMANA 1	29/01/2024	3/02/2024	0,02%	$ 0,00	0,02%	$ 0,00	1,35%	$ 38.342.251,04
	SEMANA 2	5/02/2024	10/02/2024	0,09%	$ 1.086.430,28	0,11%	$ 1.086.430,28		
	SEMANA 3	12/02/2024	17/02/2024	0,13%	$ 3.842.774,36	0,17%	$ 4.929.204,63		
	SEMANA 4	19/02/2024	24/02/2024	0,72%	$ 21.459.455,00	0,89%	$ 26.388.659,63		
	SEMANA 5	26/02/2024	2/03/2024	0,81%	$ 24.304.451,40	1,70%	$ 50.693.111,03		
2	SEMANA 6	4/03/2024	9/03/2024	3,33%	$ 94.963.854,00	5,04%	$ 145.656.965,03	16,47%	$ 585.348.965,00
	SEMANA 7	11/03/2024	16/03/2024	4,43%	$ 132.107.159,00	9,47%	$ 277.764.124,03		
	SEMANA 8	18/03/2024	23/03/2024	4,55%	$ 135.896.796,00	14,02%	$ 413.660.920,03		
	SEMANA 9	25/03/2024	30/03/2024	4,60%	$ 146.159.230,00	18,62%	$ 559.820.150,03		
3	SEMANA 10	1/04/2024	6/04/2024	4,82%	$ 143.731.339,00	23,44%	$ 703.551.489,03	46,20%	$ 1.324.393.129,00
	SEMANA 11	8/04/2024	13/04/2024	4,82%	$ 144.521.448,00	28,26%	$ 848.072.937,03		
	SEMANA 12	15/04/2024	20/04/2024	4,82%	$ 143.814.134,00	33,08%	$ 991.887.071,03		
	SEMANA 13	22/04/2024	27/04/2024	5,28%	$ 158.676.030,00	38,36%	$ 1.150.563.101,03		
	SEMANA 14	29/04/2024	4/05/2024	5,43%	$ 162.470.076,00	44,20%	$ 1.313.033.177,03		
4	SEMANA 15	6/05/2024	11/05/2024	5,43%	$ 165.154.049,00	49,63%	$ 1.478.187.226,03	65,51%	$ 1.952.044.903,00
	SEMANA 16	13/05/2024	18/05/2024	5,43%	$ 163.734.045,00	55,07%	$ 1.641.921.271,03		
	SEMANA 17	20/05/2024	25/05/2024	5,11%	$ 154.909.202,00	60,18%	$ 1.796.830.473,03		
	SEMANA 18	27/05/2024	1/06/2024	5,07%	$ 151.149.426,00	65,25%	$ 1.947.979.899,03		
5	SEMANA 19	3/06/2024	8/06/2024	4,95%	$ 147.460.824,00	70,20%	$ 2.095.440.723,03	98,25%	$ 2.926.560.903,00
	SEMANA 20	10/06/2024	15/06/2024	4,82%	$ 143.677.917,00	75,02%	$ 2.239.118.640,03		
	SEMANA 21	17/06/2024	22/06/2024	4,23%	$ 127.420.920,00	79,25%	$ 2.366.539.560,03		
	SEMANA 22	24/06/2024	29/06/2024	4,17%	$ 124.354.937,00	83,42%	$ 2.490.894.497,03		
6	SEMANA 23	1/07/2024	6/07/2024	4,25%	$ 126.863.000,00	87,67%	$ 2.617.757.497,03	101,75%	$ 3.031.939.103,00
	SEMANA 24	8/07/2024	13/07/2024	4,15%	$ 124.412.527,00	91,82%	$ 2.742.170.024,03		
	SEMANA 25	15/07/2024	20/07/2024	4,18%	$ 125.497.497,00	96,00%	$ 2.867.667.521,03		
	SEMANA 26	22/07/2024	27/07/2024	4,00%	$ 119.773.709,00	100,00%	$ 2.987.441.230,03		


3368

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 5

ANALISIS AVANCE DE OBRA

Fecha de inicio:	29 de enero de 2024		
Fecha de terminación:	28 de julio de 2024		
Plazo Meses:	6,0 meses	Plazo Meses:	6,0 meses
Días transcurridos:	135 Días	Meses transcurridos:	4,5 meses
% transcurrido en tiempo:	74,95%		
Avance programado Acum. S20	$ 2.222.228.159,00	Avance programado Acum. S20	74,58%
Avance ejecutado Acum S20 $:	$ 1.474.992.415,00	Avance ejecutado Acum S20 $:	49,50%
Atraso o avance S2089iu	$ 747.235.744,00	Atraso o avance S20	25,08%

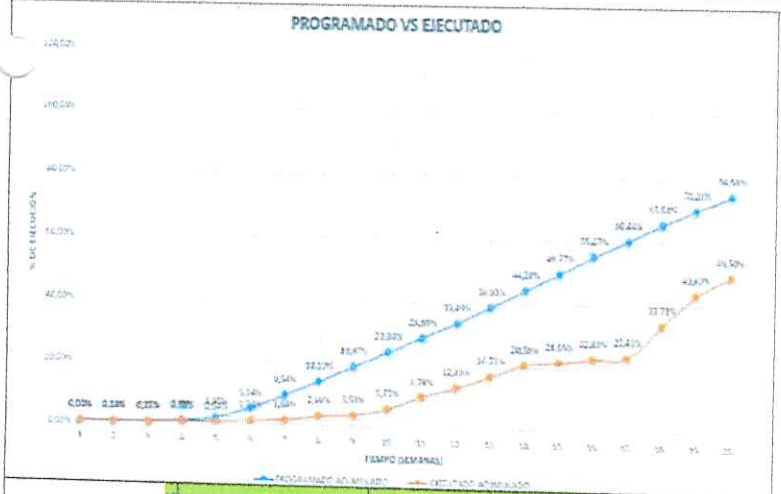

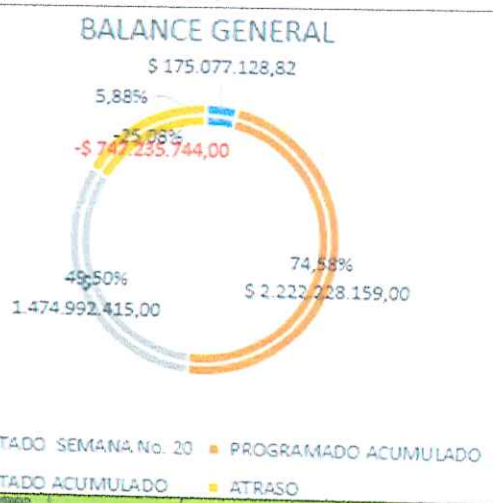

	CAPITULO	VALOR CAPITULO	PORCENTAJE	VALOR PROGRAMADO (CAPITULO)	% FISICO	EJECUTADO CAPITULO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO	ADELANTO	%
1	PRELIMINARES DEMOLICIONES	$ 113.568.686,00	3,81%	$ 90.475.921,00	79,67%	$ 72.396.329,00	63,75%	-$ 18.079.592,00	$ -	-15,92%
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	$ 321.100.228,00	10,76%	$ 309.948.278,00	96,53%	$ 246.064.519,00	76,36%	-$ 63.883.759,00	$ -	-19,89%
3	PLACA HUELLA Y CUNETAS	$ 2.109.686.496,00	70,68%	$ 1.494.764.198,00	70,85%	$ 1.107.313.319,00	52,49%	-$ 387.450.879,00	$ -	-18,37%
4	OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX CULVERT)	$ 302.524.425,00	10,15%	$ 247.407.459,00	81,78%	$ 0,00	0,00%	-$ 247.407.459,00	$ -	-81,78%
5	SEÑALIZACION	$ 37.409.624,00	0,93%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
6	CARACTERIZACION	$ 2.060.909,00	0,08%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	$ -	0,00%
7	PMA	$ 93.661.410,00	3,04%	$ 67.010.604,00	73,91%	$ 38.522.919,00	42,48%	-$ 28.487.685,00	$ -	-31,42%
8	PMT	$ 22.468.192,00	0,75%	$ 16.621.699,00	73,91%	$ 14.685.205,00	65,36%	-$ 1.936.970,00	$ -	-8,57%
		$ 2.979.705.486,00	100,00%	$ 2.222.228.159,00	74,58%	$ 1.474.992.415,00	49,50%	-$ 747.235.744,00	$ 0,00	-25,08%

Materiales en obra

Acero figurado	Señales verticales
Material de relleno	Señalización en trípode
Material de sub base	Maletines
Grava	Señalización en banner
Arena	Mezcladoras de concreto
Cemento	
Mezcladoras de concreto	

Maquinaria en obra

1	Pajarita
1	Vibrocompactador de 7 TON
1	Planta eléctrica
4	Volquetas

Personal en obra	Frentes de trabajo
2 Residentes 1 Social 1 SST 1 maestro 1 contramaestro 30 ayudantes	Tramo 7 Tramo 6 Tramo 5 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia recorrido en tramo 9, se realiza una presentación de los asistentes y a las dependencias a las cuales corresponden.

Interviene interventoría y manifiesta que conforme al punto 1 del orden del día en conformidad a la duda que la comunidad tiene respecto a la alcantarilla en sentido Santa María Baja a Santa María Alta margen derecho, se manifiesta que es una alcantarilla la cual no esta contemplada dentro del alcance del contrato, sin embargo, se están realizando los tramites pertinentes en relación a un balance de mayores y menores cantidades con la finalidad de incluir la intervención de esta alcantarilla con un levantamiento de muros laterales y guardarruedas, así mismo se manifiesta de igual manera no estaba dentro del alcance del contrato realizar el descole del margen izquierdo, sin embargo, pensando en las necesidades de la comunidad, se intervino este punto.

Interviene la comunidad y manifiesta visualización de grietas sobre la placa huella en tramo 9

Por lo que interviene la interventoría y manifiesta que estas grietas ya fueron oficiadas por parte de esta interventoría al contratista de obra, se solicitó realizar la instalación de mojones sobre el terreno con la finalidad de realizar tomas de topografía para observar si se trata de una falla de proceso constructivo o una falla de movimientos de talud natural, a la fecha el contratista de obra continua con la toma de datos y se han evidenciado movimientos los cuales se asocian a movimientos del terreno en el talud, sin embargo, una vez se finalicen las tomas de datos, el contratista de obra realizará un informe tenido detallado de la situación presentada, este será revisado, verificado y en su defecto aprobado por esta interventoría.

Interviene la Veeduría del Meta y manifiesta que sobre la margen izquierda donde se realizo la construcción de centros de acopios se encontraban especies arbóreas y estas fueron taladas por parte del contratista de obra, adicionalmente manifiesta que va a realizar un derecho de petición en conformidad a lo presentado toda vez que el señor Néstor Carrillo Veedor del Meta indica que tiene las pruebas contundentes donde se evidencian las especies arbóreas

Por lo que interviene el señor Gustavo Torres edil del corregimiento 3 y un participante de la comunidad y manifiestan que habitan en esta zona hace muchos años y que en la margen derecha donde el señor Néstor Castillo Veedor del Meta indica la tala de árboles, nunca ha habido especies arbóreas.

Por lo que interviene la entidad contratante y manifiesta que, si el señor Veedor cuenta con las pruebas contundentes, se recibirán las solicitudes y se realizará el trámite pertinente para que el contratista de obra se haga responsable de tal hecho.

3370

Interviene interventoria y manifiesta que conforme al punto 2 del orden del día en relación a que la comunidad requiere una revisión de este tramo, se manifiesta que en este punto se denomina tramo 8, cuenta con una longitud de 17,77m, se indica que en este tramo se realizó la modificación con aprobación por parte de la interventoría de la margen derecha en cuanto al bordillo por que como es visible en esta zona se encuentra una vía tipo Y a la cual hay que dar paso, y al realizar la construcción tipo INVIAS estaríamos cerrando el paso vehicular y el acceso a la finca de la margen derecha. De igual manera se socializa que entre cada tramo se encuentran ventanas sin construcción las cuales no se encuentran dentro del alcance del contrato por lo que no será posible intervenir por parte del contratista de obra.

Interviene la comunidad y manifiesta que se encuentran inconformes con esta situación de las ventanas sin construcción en vez de realizar una construcción total de placa huella. Sin embargo, la comunidad comprende que esto no es de competencia del contratista sino de la planificación del contrato

Interviene la interventoría y manifiesta que conforme al punto 3 del orden del día en relación a que la comunidad requiere una revisión de zona de afectación que ha generado la socavación producto del fenómeno natural del nacedero de agua, explicación técnica de la fisura del concreto y concepto técnico de los 50 metros de placa huella que no se ha terminado, se manifiesta lo siguiente:

- Como es de conocimiento de la comunidad la socavación que se presenta en la placa huella en tramo 7, es a causa de una falla geológica natural, cabe recalcar que los puntos críticos por fenómenos naturales se encuentran en mesas de trabajo hace mas de dos meses, toda vez que se esta buscando una solución para la intervención de estos puntos críticos, sin embargo, en especifico lo que se busca es realizar los estudios y diseños que determinen el tipo de obra necesario para realizar la estabilización del talud y la posterior intervención de obra. Se manifiesta que se ha tenido acompañamiento de un magister en Geotecnia el cual ha sido el asesor para estos puntos críticos, por lo que se están realizando estudios mediante sondeos y esto tomaría aproximadamente un mes y medio, seguidamente se realizaran mesas de trabajo para la buscar la fuente de financiación. Sin embargo, en aras de ayudar a que el proceso de socavación sea un poco mas lento, el contratista de obra por recomendación del magister en geotecnia solicito realizar un filtro francés sobre el margen izquierdo con la finalidad de disminuir la filtración de agua y ayudar a tener un proceso mas lento para la socavación, por lo que esta solicitud está en revisión de interventoría y correcciones por parte del contratista de obra.

- En relación a las fisuras presentadas en tramo 7 las cuales se encuentran metros abajo de la socavación presentada se indica que el especialista en Geotecnia manifestó que estas fisuras son en función de dos fallas que afectan la zona del talud en intervención por lo que de igual manera como en tramo 9, se solicitó realizar la instalación de mojones para la revisión de movimientos del terreno por medio de la comisión topográfica, se indica a la comunidad y se muestran las grietas tanto en terreno como en la placa huella, se manifiesta que estas grietas iniciaron aproximadamente de 1mm y a hoy se encuentran aproximadamente de 2cm, así mismo se manifiesta que las grietas de tramo 7 iniciaron tal cual como en este momento se evidencian en tramo 9, por lo que es uno de los índices que nos evidencia que posiblemente la situación presentada en tramo 7 se presentará en tramo 9. Una vez se realice la toma de datos el contratista de obra deberá emitir un informe final con la situación presentada el cual será revisado por la interventoría.

- En conformidad a los 50m que no se han construido corresponden a la denominada alcantarilla P8 la cual es un punto crítico del contrato toda vez que en esta zona se presenta una pérdida de bancada, por lo que como ya lo mencionamos todos los puntos críticos se encuentran en mesa de trabajo con la finalidad de realizar estudios y diseños que determinen el tipo de obra de

estabilización a realizar para generar valga la redundancia la estabilización del talud y volver a ganar la banca de vía.

Por lo que interviene la comunidad y manifiesta que en relación al punto de la alcantarilla P8 solicitan participar en mesas de trabajo

Interviene la entidad y manifiesta que podría ser posible la participación en alguna mesa de trabajo, sin embargo, manifiesta que la mayoría de mesas de trabajo son a puerta cerrada.

Interviene el Veedor del Meta el señor Néstor Castillo y manifiesta que en la zona donde se presentan las grietas el contratista de obra acopio material y este se ha ido rodando por el talud metros abajo por lo que indica que el rodar 1 sola piedra hace que rueden 3 o mas piedras del talud y por eso se esta generando un proceso de socavación del talud.

Por lo que interviene la interventoría y manifiesta que el magister en geotecnia indico que esa zona es afectada por fenómenos naturales, fallas geológicas y la socavación presentada es netamente por fenómenos geológicos, adicionalmente indico que el magister e geotecnia manifiesta que la misma naturaleza expulsa el material que no es orgánico.

Sin embargo, no conforme con la respuesta técnica en este punto el Veedor del Meta continúa insinuando que la socavación es provocada por el contratista de obra, solicita realizar una solicitud para definir si se presenta o no se presenta una afectación en ese punto.

Mediante la creación de la presente acta es importante manifestar por esta interventoría que se debe cumplir un conducto regular antes de llegar a las entidades, es decir, primeramente, se debe oficiar al contratista de obra, lo cual para la fecha del 31 de julio de 2024 ya fue oficiado al contratista de obra, estas líneas de texto en conformidad a que el acta será de conocimiento a todas las partes.

Interviene interventoría y manifiesta que conforme al punto 4 del orden del día en relación a que la comunidad requiere construir cunetas en V, para el retorno del bus escolar y automóviles (turistas) que transitan en tiempos de sequía, inicialmente se dirigen al punto del derrumbe en tramo 6 donde aun no se ha ejecutado placa huella se manifiesta que también es un punto crítico del contrato al cual se le deben realizar estudios y diseños con la finalidad de saber cuál es la obra de estabilización para el talud, se indica que intervenir este punto es demasiado costoso. En relación a la construcción de cunetas en V, se atienden las sugerencias de los tramos a construir esta cuneta debido a las necesidades de toda la comunidad de la Vereda Santa María Baja y Santa María Alta, por lo cual se toman los puntos. Se indica que todo es proceso, primero el contratista de obra debe realizar los diseños, luego la solicitud formal a la interventoría y por último visto bueno por la entidad y aprobación por la interventoría.

Interviene la interventoría y manifiesta que conforme al punto 5 y 6 del orden del día en relación a que la comunidad requiere definir ramplas de terminación de placa huella y cunetas para el ingreso de viviendas y fincas, se manifiesta que en relación a las ramplas de acceso y descenso de la placa huella no se encuentran contempladas dentro del alcance del contrato, sin embargo, encontramos puntos los cuales se encuentran con mayor diferencia de alturas los cuales pueden ser revisados para una siguiente modificatoria, inicialmente se debe realizar una solicitud con el diseño por parte del contratista de obra a esta interventoría. En relación a los accesos de viviendas son acatadas las recomendaciones de la comunidad y serán descritas por medio de una solicitud ante la interventoría para posterior aprobación.

3372

Interviene la interventoria y manifiesta que conforme al punto 7 del orden del día en relación a que la comunidad requiere revisión de la placa huella sobre el puente y manifiesta que no esta dentro de los tramos a intervenir, se muestra en plano los alcances con las abscisas y les indica los metros de placa huella.

Interviene la interventoría y manifiesta que conforme al punto 8 y 9 del orden del día en relación a que la comunidad requiere saber cuál es la intervención de cuneta en tramo 2 y 1 en el margen derecho de la vía toda vez que recoge bastante agua en tiempos de lluvia, por lo que se indica que se maneja la sección tipo INVIAS que se está interviniendo en todos los tramos construidos.

Interviene la comunidad y manifiesta que requieren que se rellene una cuneta realizada a mano, con Geotextil y viajes de material.

Por lo que interviene la entidad y manifiesta que esto no esta dentro del alcance del contrato y adicionalmente puede generar una afectación al predio y a la placa huella ya que generaría empozamientos de agua generando inundaciones.

Por lo que el contratista de obra manifiesta que como recomendación técnica el presidente de la Junta de Acción comunal debería gestionar una obra ya que lo mas factible para el punto es una canalización.

Interviene la entidad y manifiesta que se pueden acercar con el secretario de infraestructura los días viernes hasta las 4pm para comentar dicha situación, sin embargo, se irán haciendo los acercamientos y poniendo en contexto al secretario de infraestructura.

Sin otro particular, finaliza el comité.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Diseño de Box Coulvert tramo 9	Entregar a la comunidad diseño de Box Coulvert en tramo 9 una vez sea aprobado por interventoría en modificatoria.	CONTRATISTA DE OBRA	Una vez sea incluido en modificatoria
2	Afectación ambiental	Informar afectación ambiental en tramo 7.	INTERVENTORIA	Sin fecha
3	Comunicación con el secretario de infraestructura.	Comunicación con el secretario de infraestructura sobre rellenos cerca de tramo1 y 2.	ENTIDAD	Sin fecha
4	Oficio	Oficio de afectación ambiental en tramo 9, indica evidenciar pruebas del antes y después.	VEEDURIA DEL META	Sin fecha
5	Oficio	Solicitud de toma de muestras en tramo 9, por fisuras en placa huella.	VEEDURIA DEL META	Sin fecha

3393

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 9



TRAMO 8



TRAMO 7



TRAMO 7



TRAMO 7



TRAMO 6

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 11



TRAMO 6



TRAMO 5



TRAMO 4



TRAMO 3



TRAMO 2



TRAMO 1

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 12

ASISTENCIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META				
FECHA:	19/07/2024	HORA INICIO:	3:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDAD				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	Miguel Garzon	17344533	comunidad	Edil 3		3222659308	
	Edilma Arenas	40391902	comunidad	Edil 3		3166410226	Parradoarenas@gmail.com
	Gustavo Torres	475848	comunidad	Edil		3177485805	
	Jose Cruz	1026475858	comunidad	Edil		3105704677	
	Lis Edgar Pauba	1231074149	Santa maria	cisca		3195600881	
	Deanira Parrado	1120369901465	Santa Maria Baja	Comunidad		3167575513	deaniraparrado@gmail.com
	Carmen Romero	1122048383	JAC	Presidente		3115022999	juntaccionalmaria@gmail.com
	Nestor Ovalle	86064689	V/MEVA	Interventor		3153127688	nestor2990@GMAIL.com
	Gilberto Garcia	1121858857	Meta			3102235857	
	Diego F. Ovalle O.	1026562864	Contratista	Ing. Residente		3102342164	
	Pedro Pineda	1121844761	Consorcio	T. S		3165619000	
	Jaime Martinez	1121848827	SIM	Apoyo		3209592554	ing.jamartinez@gmail.com
	Michelle Trujillo	1006816685	Interventoria	Apoyo		3226605021	Mic.Paola.Rodriguez@gmail.com
	Oscar Castellanos	79837995	"	"		3133473611	

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG. 17-07-2017

3376

8.3 INFORMES SEMANALES

337

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 18 DEL 26/06/2024 AL 29/06/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 1/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,5; TRAMO 4 K2+100 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,503; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+860 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,405; TRAMO 9 K1+600 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 3233 DE 2023**

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,5; TRAMO 4 K2+100 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,503; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+860 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,405; TRAMO 9 K1+600 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.763.960-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	9.658.796-1
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29	DE 1	DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	27	DE 5	DE 2024		
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26	DE 6	DE 2024		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	27	DE 6	DE 2024		

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.020.826.848,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatoria No.1	$ 2.979.705.636,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	121,00	% TIEMPO DÍAS	66,85%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	4,03	% TIEMPO MES	66,85%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	5,07%	65,51%	Obra Ejecutada	10,28%	33,71%
Valor de la Obra Programada	$ 151.118.405,00	$ 1.952.040.088,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 306.370.091,00	$ 1.004.546.747,18

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACION	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	72,89%	55,17%	-17,72%	Este capitulo hace referencia a la topografia, retiro de sobrantes y demolición, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	93,71%	47,73%	-45,97%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreacarreo,durante la semana el contratista realizo excavación, extendido de relleno y subbase y sobreacarreo para tramo 7, 8 y 9
PLACA HUELLA Y CUNETAS	61,14%	34,86%	-26,28%	Este capitulo hace referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de soldados, concreto de viga, concreto de berma-cuneta y aceros, durante la semana el contratista de obra realizo construcción y amarre de acero para placa huella, conformación de piedra pegada, vaciado de concreto para viga ciclo con el respectivo amarre de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo con el respectivo amarre de acero para los tramos 7,8 y 9, presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	67,89%	0,00%	-67,89%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, presenta atraso.
CARACTERIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterizacion de la via, presenta un atraso
PMA	65,22%	42,49%	-22,73%	A la fecha el contratista se encuentra en implementación del plan de manejo ambiental
PMT	65,22%	65,35%	0,13%	A la fecha el contratista ha instalado señalización del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construccion de 1.800 ml de placa huella en la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía escarpada, la dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de cimentacion de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion trasnversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra fisica del contrato, no obstante se han venido trabajando actividades administrativas del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

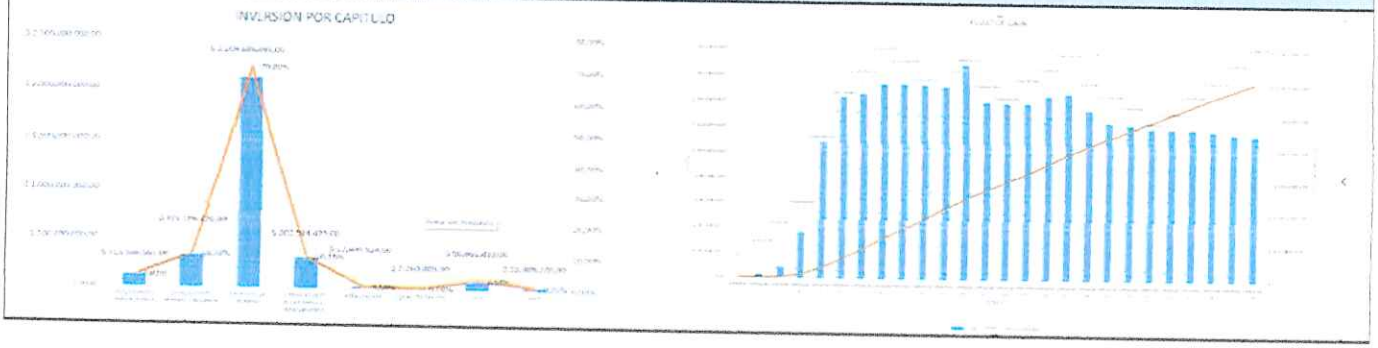

3378

PERIODO No. 18 DEL 26/06/2024 AL 29/06/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 1/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografía a lo largo del tramo 7, 6 y 5 de vereda Santa María Baja y Santa María Alta.



El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas





El contratista realiza excavación, extendido de relleno para tramo 6 y 5



El contratista realiza extendido y compactación de material de Subbase para tramo 6 y 5



El contratista de obra realiza la construcción de piedra pegada para tramo 7 y 6





El contratista de obra realiza la el armarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 7 y 6





3379

PERIODO No. 18 DEL 26/06/2024 AL 29/06/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 1/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 7 y 6



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavación y extendido y volquetas para sobreacarreo de material de relleno y subbase para tramo 6 y 5



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se sugiere al contratista lo siguiente:

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los DOS (2) días del mes de JULIO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

338

PERIODO No. 19 DEL 1/07/2024 AL 6/07/2024
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 8/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,503; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,06; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+300 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 3233 DE 2023**

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,503; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,06; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+300 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.763.960-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	9.658.796-1
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	28 DE 1 DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	27 DE 5 DE 2024		
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26 DE 6 DE 2024		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	27 DE 8 DE 2024		

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.020.826.848,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatoria No.1	$ 2.979.705.536,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	128,00	% TIEMPO DÍAS	70,72%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	4,27	% TIEMPO MES	70,72%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACION SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,57%	70,26%	Obra Ejecutada	9,91%	43,63%
Valor de la Obra Programada	$ 141.500.814,00	$ 2.093.550.802,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 295.368.543,00	$ 1.299.015.289,16

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	76,28%	58,46%	-17,82%	Este capitulo hace referencia a la topografia, retiro de sobrantes y demolicion, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	94,49%	70,97%	-23,52%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreacarreo,durante la semana el contratista realizo excavación, extendido de relleno y subbase y sobreacarreo para tramo 6, 5, 4 y 3
PLACA HUELLA Y CUNETAS	65,99%	45,14%	-20,85%	Este capitulo hace referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de soladas, concreto de viga, cordelo de berma-cuneta y aceros, durante la semana el contratista de obra realiza construccion y amarre de acero para placa huella, conformacion de piedra pegada, vaciado de concreto para viga cinta con el respectivo amarre de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo con el respectivo amarre de acero para los tramos 6, 5 y 4, presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	76,66%	0,00%	-76,66%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, presenta atraso.
CARACTERIZACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterizacion de la via, presenta un atraso
PMA	69,57%	42,49%	-27,07%	A la fecha el contratista se encuentra en implementación del plan de manejo ambiental
PMT	69,57%	65,35%	-4,22%	A la fecha el contratista ha instalado señalizacion del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construccion de 1.893 ml de placa huella en la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía escarpada, la dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de cimentacion de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion transversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra fisica del contrato, no obstante se han venido trabajando actividades administrativas del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

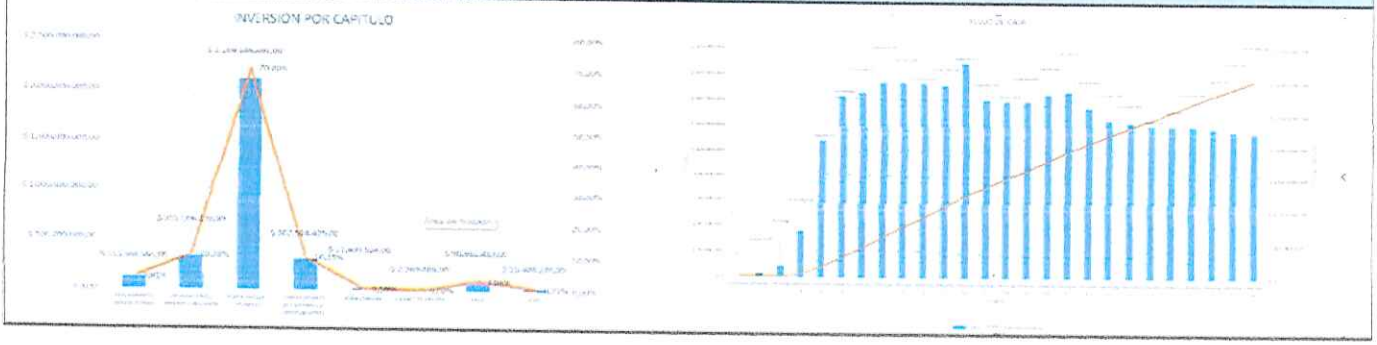

330

PERIODO No. 19 DEL 1/07/2024 AL 6/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 8/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografía a lo largo del tramo 6, 5, 4 y 3 de vereda Santa María Baja y Santa María Alta.



El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas



El contratista realiza excavación, extendido de relleno para tramo 5, 4 y 3



El contratista maliza extendido y compactación de material de Subbase para tramo 5, 4 y 3



El contratista de obra realiza la construcción de piedra pegada para tramo 6, 5 y 4




El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 6,5 y 4



382

PERIODO No. 19 DEL 1/07/2024 AL 6/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 8/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 6, 5 y 4

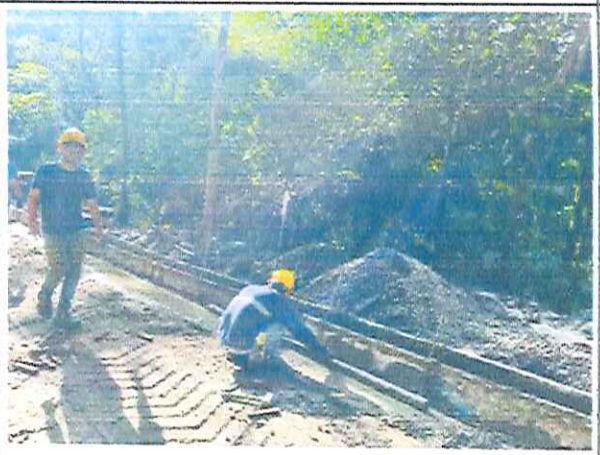

El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavacion y extendido y volquetas para sobreacarreo de material de relleno y subbase para tramo 5,4 y 3



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El contratista de obra ha venido implementando el Plan de Contingencia, por lo tanto se observa que se ha generado un mayor avance por semana.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

DOS 8 días del mes de JULIO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

3383

PERIODO No. 20 DEL 8/07/2024 AL 13/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 15/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+180 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 3233 DE 2023**

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+180 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.763.960-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	9.658.796-1
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29 DE 1 DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	27 DE 5 DE 2024		
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26 DE 6 DE 2024		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	27 DE 8 DE 2024		

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.020.826.846,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatoria No.1	$ 2.979.705.636,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS	135,00	% TIEMPO DIAS	74,59%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	4,50	% TIEMPO MES	74,58%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACION SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,32%	74,58%	Obra Ejecutada	5,88%	49,50%
Valor de la Obra Programada	$ 128.677.357,00	$ 2.222.228.150,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 175.077.128,82	$ 1.474.002.415,00


FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	79,67%	63,75%	-15,92%	Este capitulo hace referencia a la topografia, retiro de sobrantes y demolición, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, y ha realizado la demolición de concreto de box coulvert, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	95,28%	75,38%	-19,89%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreacarreo,durante la semana el contratista realizo excavación, extendido de relleno y subbase y sobreacarreo para tramo 4, 3, 2 y 1
PLACA HUELLA Y CUNETAS	70,85%	52,48%	-18,37%	Este capitulo hace referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de soleras, concreto de viga, concreto de berma-cuneta y aceros, durante la semana el contratista de obra realiza construccion y amarre de acero para placa huella, conformación de piedra pegada, vaciado de concreto para viga cinta con el respectivo amarre de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo asi mismo el amarre de acero para los tramos 6, 5 y 4, 3 presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	81,78%	0,00%	-81,78%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
CARACTERIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterizacion de la via, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
PMA	73,91%	42,49%	-31,42%	A la fecha el contratista se encuentra en implementacion del plan de manejo ambiental
PMT	73,91%	65,35%	-8,57%	A la fecha el contratista ha instalado señalización del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construccion de 1.800 ml de placa huella en la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía escarpada, la dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de cimentacion de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion trasnversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra fisica del contrato, no obstante se han venido trabajando actividas administrativas del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

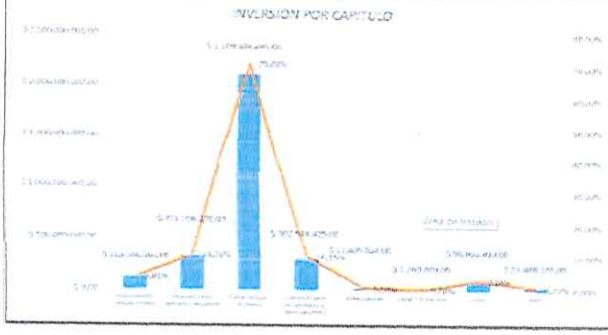

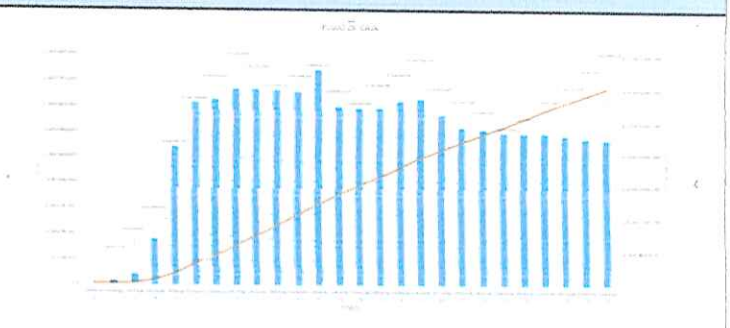

3384

PERIODO No. 28 DEL 8/07/2024 AL 13/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 15/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografía a lo largo del tramo 4, 3, 2 y 1 de vereda Santa María Baja y Santa María Alta.



El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas



El contratista realiza excavación, extendido de relleno para tramo 4, 3, 2 y 1



El contratista realiza extendido y compactación de material de Subbase para tramo 4, 3, 2 y 1



El contratista de obra realiza la construcción de piedra pegada para tramo 5, 4 y 3



El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 5, 4 y 3



3385

PERIODO No. 20 DEL 8/07/2024 AL 13/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 15/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3194 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 6, 5 y 4



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavación y extendido y volquetas para sobreacarreo de material para tramo 4, 3, 2 y 1



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El contratista de obra ha venido implementando el Plan de Contingencia, por lo tanto se observa que se ha generado un mayor avance por semana.

A la presente fecha el contratista de obra presenta un atraso del 25,08% equivalente a $ 747.235.744,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 21 DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 22/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,5; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 3233 DE 2023**

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,5; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.763.960-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	9.858.796-1
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29	DE	1	DE	2024
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	27	DE	5	DE	2024
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26	DE	6	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	27	DE	6	DE	2024

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.020.826.848,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatorio No.1	$ 2.979.705.536,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS	142,00	% TIEMPO DIAS	78,45%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	4,73	% TIEMPO MES	78,45%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACION SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,28%	78,86%	Obra Ejecutada	5,83%	55,43%
Valor de la Obra Programada	$ 127.450.937,00	$ 2.340.670.096,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 176.504.418,00	$ 1.651.588.832,00


FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACION	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	83,06%	67,04%	-16,02%	Este capitulo hace referencia a la topografia, retiro de sobrantes y demolición, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	96,07%	75,38%	-20,68%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreacarreo,durante la semana el contratista realizo mejoras a extendido subbase y sobreacarreo para tramo 2 y 1, el sobreacarreo presenta atraso, excavación, relleno y subbase ha culminado
PLACA HUELLA Y CUNETAS	75,71%	58,89%	-16,82%	Este capitulo hace referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de solados, concreto de viga, concreto de berma-cuneta y aceras, durante la semana el contratista de obra realiza construccion y amarre de acero para placa huella, conformación de piedra pegada, vaciado de concreto para viga cinta con el respectivo amarre de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo así mismo el amarre de acero para los tramos 3 y 2, presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	85,30%	12,48%	-73,81%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, en la presente semana el contratista realizo la respectiva excavación, manejo de aguas, amarre de acero y vaciado de concretos para alcantarilla P1 P2 y P3, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
CARACTERIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterizacion de la via, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
PMA	76,26%	42,49%	-33,77%	A la fecha el contratista se encuentra en implementacion del plan de manejo ambiental
PMT	78,26%	65,35%	-12,91%	A la fecha el contratista ha instalado señalización del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construccion de 1.600 ml de placa huella en la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía escarpada, la dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de cimentacion de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion trasnversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra fisica del contrato, no obstante se han venido trabajando actividas administrativas del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

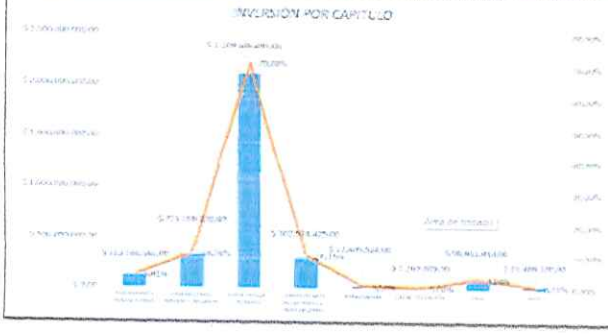

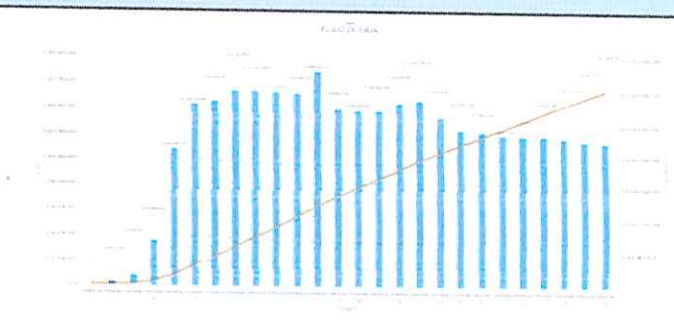

3387

PERIODO No. 21 DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 22/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografia a lo largo del tramo 2 y 1 de vereda Santa Maria Baja y Santa Maria Alta.



El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas



El contratista realiza extendido y compactación de material de Subbase para tramo 2 y 1



El contratista de obra realiza la construcción de piedra pegada para tramo 5, 4 y 3



El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 3 Y 2



El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 3 Y 2



3388

PERIODO No. 21 DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 22/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 6, 5 y 4



El contratista de obra realiza la excavación para box Coulvert P1, p2y P3



El contratista de obra realiza el amarre de aceros para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra realiza el entibado para box Coulvert P1, p2 y P3



3389

PERIODO No. 21 DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 22/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza el vaciado de concreto para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavación y extendido y volquetas para sobreacarreo de material para tramo2 y 1



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El contratista de obra ha venido implementando el Plan de Contingencia, por lo tanto se observa que se ha generado un mayor avance por semana.

A la presente fecha el contratista de obra presenta un atraso del 23,43% equivalente a $ 698,082,264.00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

VEINTIDOS 22 días del mes de JULIO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

3390

PERIODO No. 27 DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 29/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520, TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453,735 A K2+810; TRAMO 7 K2+950 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+600 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 3233 DE 2023

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453,735 A K2+810; TRAMO 7 K2+950 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+600 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.753.980-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	9.656.798-1
SUPERVISIÓN DIRECCION DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29 DE 1 DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	27 DE 5 DE 2024		
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26 DE 6 DE 2024		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	27 DE 8 DE 2024		

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.006.830.948,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatoria No 1	$ 2.979.705.636,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS	142,00 % TIEMPO DIAS 78,45%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	4,73 % TIEMPO MES 78,45%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,17%	20,03%	Obra Ejecutada	3,09%	58,42%
Valor de la Obra Programada	$ 124.364.557,00	$ 2.474.063.963,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 89.204.740,00	$ 1.740.601.573,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	86,44%	70,33%	-16,11%	Este capitulo hace referencia a la recoyeria, retiro de sobrantes y demolición, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	96,85%	75,38%	-21,47%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreacarreo,durante la semana el contratista realizo mejoras a cobertizo subbase y sobreacarreo para tramo 1, el sobreacarreo presenta atraso, excavación, relleno y subbase ha culminado
PLACA HUELLA Y CUNETAS	80,57%	61,15%	-19,42%	Este capitulo trata referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de solados, concreto de viga, concreto de bermas-cunetas y alcantarillas, durante la semana el contratista de obra realizo construcción y armado de acero para placa huella, conformación de piedra pegada, vaciado de concreto para viga cuneta con el respectivo armado de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo del mismo el armado de acero para los tramos 2 y 1, presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOX/CUELVERT)	89,80%	15,33%	-74,47%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, en la presente semana el contratista realizo la respectiva excavación, manejo de aguas, armado de acero y vaciado de concreto box alcantarilla P1-P2 y P3, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
CARACTERIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterizacion de la via, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
PMA	82,61%	68,53%	-14,08%	A la fecha el contratista se encuentra en implementacion del plan de manejo ambiental
PMT	82,61%	90,58%	7,97%	A la fecha el contratista ha realizado señalizacion del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construccion de 1.800 ml de placa huella en la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicados en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía escarpada, las dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de cimentacion de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion trasnversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra física del contrato, no obstante se han venido trabajando aspectos administrativos del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

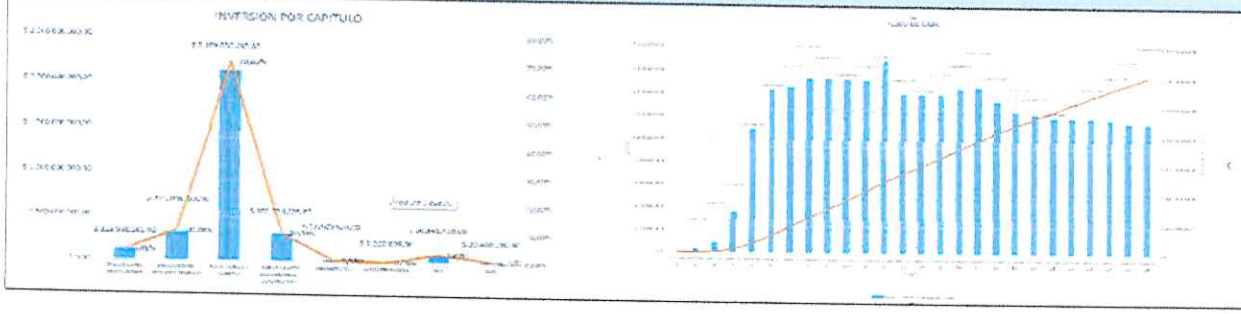

3391

PERIODO No. 22 DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 29/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografia a lo largo del tramo 1 de vereda Santa María Baja y Santa María Alta.



El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas



El contratista realiza extendido y compactación de material de Subbase para tramo 1



El contratista de obra realiza la construcción de piedra pegada para tramo 2 Y 1



El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 1



El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 1



Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservacion De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

3302

PERIODO No. 22 DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 29/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 6, 5 y 4



El contratista de obra realiza el amarre de aceros para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra realiza el vaciado de concreto para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavación y extendido y volquetas para sobreacarreo de material para tramo 1



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El contratista de obra ha venido implementando el Plan de Contingencia, por lo tanto se observa que se ha generado un mayor avance por semana.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los VEINTISIETE (27) días del mes de JULIO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

323 93

PERIODO No. 23 DEL 29/07/2024 AL 3/08/2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 5/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+100 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453,736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+800 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 3233 DE 2023

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+000 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+100 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,500; TRAMO 6 K2+453,736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+800 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARDISAF R/L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	NIT	901.783.960-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	NIT	5.858.798-1
SUPERVISIÓN DIRECCION DE OBRAS CIVILES:	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29	DE	1	DE	2024
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	27	DE	5	DE	2024
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	26	DE	6	DE	2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	27	DE	8	DE	2024

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 3.020.830.668,00	Valor Inicial	$ 258.143.040
Valor Actualizado - Modificatoria No.1	$ 2.970.705.636,00	Valor Actualizado	$ 258.143.040
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS	156,00 % TIEMPO DIAS 86,19%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	5,20 % TIEMPO MES 86,19%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3233 DE 2023


PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,88%	85,20%	Obra Ejecutada	5,68%	90,96%
Valor de la Obra Programada	$ 145.386.620,42	$ 2.538.588.231,64	Valor de la Obra Ejecutada	$ 175.077.128,82	$ 1.335.168.200,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
PRELIMINARES DEMOLICIONES	97,06%	91,20%	-5,86%	Este capitulo hace referencia a la topografia, retiro de sobrantes y demolición, en la presente semana el contratista ha realizado actividades de localizacion topografica, presenta atraso
EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS	98,42%	84,85%	-13,57%	Este capitulo hace referencia a excavaciones, relleno, subbase y sobreancho,durante la semana el contratista realizo mejoras a viviendas subbase y sobreancho para tramo 1, el sobreancho presenta atraso, excavación, relleno y subbase ha culminado
PLACA HUELLA Y CUNETAS	91,20%	67,73%	-23,47%	Este capitulo hace referencia a piedra pegada, concreto placa huella, concreto de solados, concreto de viga, concreto de bermacunetas y aceras, durante la semana el contratista de obra realiza construcción y armure de acero para placa huella, conformación de piedra pegada, vaciado de concreto para viga cinta con el respectivo armure de acero, vaciado de concreto para la berma y bordillo del mismo el armure de acero para los tramos 2 y 1, presenta atraso
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA - BOXCUELVERT)	8,27%	23,80%	15,62%	Este capitulo hace referencia a actividades de excavaciones, manejo de aguas, aceros, concretos, en la presente semana el contratista realizo la respectiva excavación, manejo de aguas, armure de acero y vaciado de concretos para alcantarilla P1 PO y P3, presenta atraso
SEÑALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	Este capitulo hace referencia a la instalacion de señales verticales, a la fecha el contratista no ha realizado actividades referentes a este capitulo, esta actividad se realiza al finalizar la obra.
CARACTERIZACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	A la fecha el contratista no ha realizado la caracterización de la via, esta actividad se realiza a finalizar la obra.
PMA	73,33%	68,53%	-4,80%	A la fecha el contratista se encuentra en implementacion del plan de manejo ambiental, presenta atraso
PMT	73,33%	90,58%	17,24%	A la fecha el contratista ha instalado señalización del plan de manejo de transito

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra corresponde a la construcion de 1.800 ml de placa huella en la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento del municipio de Villavicencio el cual presenta una topografía accidentada, las dimensiones de los elementos estructurales consiste en una subbase de 15 cms, una placa y piedra pegada de 15 cms, una viga de dimensiones de 20x30 cms, las dimensiones de la seccion trasnversal son 70 cms de cuneta, 45 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 90 cms de piedra pegada, 90 cms de placa huella, 45 cms de piedra pegada y 70 cms de cuneta, a la fecha no se ha iniciado la ejecucion de obra física del contrato, no obstante se han venido trabajando actividades administrativas del mismo.

4. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y FLUJO DE CAJA

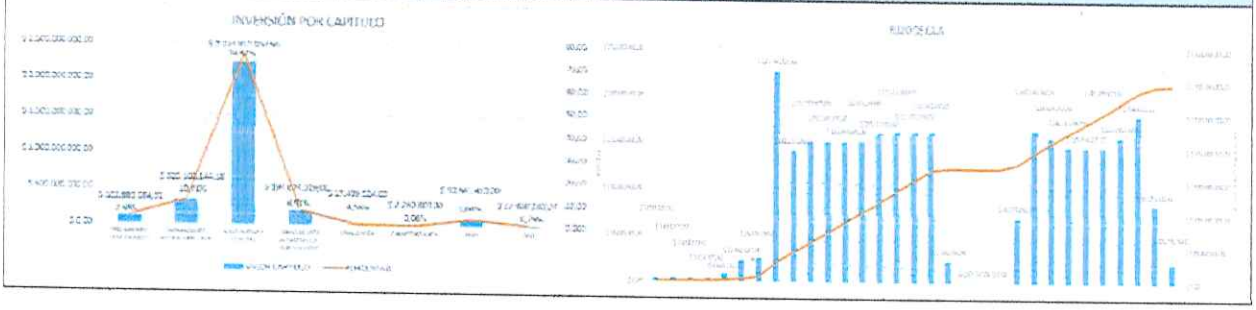

3394

PERIODO No. 23 DEL 29/07/2024 AL 3/08/2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 5/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista de obra realiza actividades de topografia a lo largo del tramo 1 de vereda Santa Maria Baja y Santa Maria Alta.	El contratista de obra cuenta con material en obra para realizar las actividades constructivas
	
El contratista realiza extendido y compactación de material de Sublase para tramo 1	El contratista de obra realiza la construccion de piedra pegada para tramo 2 Y 1
	
El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 1	El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para placa huella y viga riostra en tramo 1
	

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISION SEMANAL

3395

PERIODO No. 23 DEL 28/07/2024 AL 3/08/2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 5/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3154 DE 2023

El contratista de obra realiza la el amarre de acero y vaciado de concreto para bordillos y cunetas en tramo 5



El contratista de obra realiza el amarre de aceros para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra realiza el vaciado de concreto para box Coulvert P1, p2 y P3



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental



El contratista de obra se encuentra realizando la implementación del Plan de Manejo de Transito



El contratista de obra cuenta con maquinaria en el tramo de ejecución de obra para realizar las actividades de excavación y extendido y volquetas para sobreacarreo de material para tramo 1



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se solicita al contratista de obra, presentar plan de contingencia.

Presenta un anticipo del 18,24% equivalente a $543.419.041,64

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los CINCO (5) días del mes de AGOSTO de 2024

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
