SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.


INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	**SEPTIEMBRE / 2024**	Numero de contrato:	**CD-12-2024-4778**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	REYNALDO OLIVA BABILONIA C.C. 8.731.664		
Periodo del informe:	Informe al 30 de septiembre de 2024.	Informe número:	1
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: DIEZSINUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 19.000.000,oo)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

Durante este periodo comprendido hasta el 30 de septiembre del 2024 se realizó asesoría a la supervisión administrativa, técnica, a los proyectos que se relaciona en el siguiente informe.

1-Realizar y gestionar oficios para empresas de servicio público, solicitando los diseños, planos y memorias de las vías de los programas: barrios a la obra 8 etapa, ampliaciones viales carreras: 49C, 50, calle 79 y 98. Canalización del arroyo en carrera 18 entre 39 a la calle 47 (la cordialidad).



S-2024-02467

Triple A S.A. E.S.P.

Radicado Externo No.: S-2024-02467
Rad. Interno No.: **GP-2120-02467**

MC-GD-FR-1. V.1

Señores
EDUBAR
MANUEL MANOTAS
Ingeniero de apoyo técnico
Barranquilla, Atlántico.

Asunto: **"ENTREGA DE INFORMACIÓN TECNICA - CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN (PARES VIALES CR 49C, CR 50, CL 79)"**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en este mes de Junio de 2024 se iniciaron los trabajos de intervención de vías y se requiere la instalación de las respectivas reposiciones de los sistemas de acueducto y

2-Visitas de campos a la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), para la supervisión de la canalización de las aguas lluvias en esta vía con el contratista Unión Temporal Gran Vía R90 e interventoría EDUBAR SA, para revisar los diseños de la tubería de alcantarillado y acueducto existente así:

2.1-El avance de la reposición de la tubería para el alcantarillado existentes entre calles 39 a la 47 (cordialidad) con la carrera 18, se reporta que se ha instalado los colectores en los diámetros de 20,24 y 8 pulgadas desde la calle 39 a la 45. Se le volvió a recordar en campo y comite semanal la instalación o colocación de las tapas provisionales en los pozos existentes para evitar taponamiento en el sistema por material al sistema de saneamiento básico existente y en funcionamiento. La empresa Triple A SA ESP ha asistido al contratista en el mantenimiento con equipos de succión presión. Adicionalmente.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.



FOTO No. 01: tapas provisionales para los pozos existentes de inspección del sistema de alcantarillado.



FOTO No.02: Carro de succión presión asistencia para destapar tuberías con material suelto del terreno.

En el avance de sistema pluvial se informa que el avance de construcción del boxcoulvert en concreto reforzado con acero y lleva un avance de 70%. Aguas abajos, es decir desde la unión de ésta estructura con el canal existente del arroyo se realizó, y aguas arriba donde termina el boxcoulvert y se une con la tubería de 60 pulgadas desde a calle 39 hasta la 41B, hace falta la unión entre estos elementos y detalles. Al cierre del informe se esta trabajando en el primer carril de la calle 45 en la instalación de tubos de 60 pulgadas para sistema pluvial.



FOTO No.03: Construccion del boxcoulvert carrare 18 entre calles 40 a la 41B.



FOTO No.04: Construccion de canal en concreto reforzado entre calle 40b a la 41B con carrera18.



FOTO No.05: Instalación de tubería PVC 24 – 20 - 8 pulgadas instaladas en paralelo con la construcción del canal reforzado en concreto.



FOTO No.06: Conexión de tubería para alcantarillado en PVC 20 y 24 pulgadas.

Con respecto al tramo de la calle 47 o vía la cordialidad con la carrera 18 se informa que se realizó la instalación de la tubería de 56 pulgadas para captación pluvial y la construcción de sus respectivas cajas de inspección y giro o cambio de dirección de la canalización, ver fotos No. 7 y 8. El avance en la reposición de las tuberías para los sistemas de: acueducto es de 98% y en el alcantarillado en 95%, pero el sistema está prestando el servicio de recolección de las aguas servidas y el suministro de agua potable permanente pendiente por la detalles y entrega de información de planos y memorias de las redes cambiadas a la empresa prestadora de servicio la Triple A SA ESP.



FOTO No.07: En la calle 47(cordialidad) carrera 18, instalación de tubería PVC diámetro 56 pulgadas entre 46 a la 46B.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.



FOTO No.08: carrera 18 calle 47 a 46B instalación de tubería PVC 56 pulgadas para sistema pluvial carrera 18.

Con respecto a la vía la calle 47 (cordialidad) entre las carreras 13 a la 23. Sigue pendiente liberación de predios. Aunque se ha liberados los que han llegado a un acuerdo con el distrito y el contratista ha retomado labores en zonas muy puntuales. Se sigue apoyando en la supervisión de las redes de acueducto y alcantarillado para este sector del proyecto. La Triple a brinda apoyo cuando el sistema de alcantarillado colapsa por obstrucción y acueducto por fuga de las redes.



FOTO No. 09: Redes de del sistema de acueducto y alcantarillado nuevo a la espera de ser instalado en la franja de terreno que adquirirá el distrito para subterranizar.



(a)



(b)

FOTO No.10: vista (a) franja de predios por negociar , la vista (b) se observa la línea de propiedad se debe mover hacia el predio para instalar redes de alcantarillado.







FOTO No.11: Tuberías pendientes subterranizar acueducto y la tubería de alcantarillado por instalar en franja por compra de Distrito en gestión con propietarios.

3- <u>En barrios a la obra 8 etapa</u>. Se coordinó seguimiento al programa barrios a la obra etapa 8 con EDUBAR, INTERVENTORIA. Se estableció las vías priorizadas por cada módulo, fechas de entrega de cada una. Se entregaron los diseños de acueducto y alcantarillado solicitados a la Triple A ESP ESP,



Foto No.12. reunión de seguimiento al programa barrios a la obra 8 etapa, Modulo 1 al 5, para reinducción de los diseños de los sistemas de acueducto y alcantarillado en las vias priorizadas para este módulo.

El módulo uno ,M1,Se informa que el módulo uno, ha iniciado con la parte administrativa del proyecto, se han realizado reuniones para explicarles de las vías priorizadas los diseños de los sistemas de acueducto y alcantarillado con la empresa prestadora del servicio Triple A; por lo anterior se informa que el contratista tiene tres frentes de trabajo, sin embargo, el de la carrera 16A entre calle 5 y diagonal 5, ha presentado inconvenientes con las redes nuevas existentes tales como: taponamiento de los tubos con material de terreno arrastrados por agua de escorrentía por las lluvias y no prever su ingreso al sistema; también, las roturas de accesorios como derivaciones domiciliarias y la tubería con retroexcavadora. La empresa prestadora de servicio asistió al contratista en limpieza y volver a dejar operando el sistema de saneamiento. Se entregaron los esquemas pendientes. El contratista se le adelanta un proceso por no cumplimiento de cronograma, la audiencia quedo aplazada por contratiempo en representante del contartista. Se adelantara la cita para la primera a segunda semana de octubre.

El modulo dos ,M2, tiene y tres vías en el barrios de simón bolívar y La via que se entregó 02 de agosto no se ha realizado las conexiones de las redes de acueducto nuevas, se realizó reunión con la Triple A SA ESP, para detallar los faltantes y ajustes al trabajo pendiente se estima que para la primera semana

del mes próxima se realizarían los pendientes, los cuales son: lavado, desinfección, prueba hidrostática y el empalmes, estos últimos son por fuera del la zona nueva.
Ver fotos No.13, (a) y (b). El andén peatonal de los predios de la pared de la escuela de policía será zona verde desde el borde interno del andén a la pared. Ver foto No.13.



(a)



(b)

Foto No.13. barrio Simón Bolívar, carrera 7A entre calles 17E y 19, inauguración de esta vía última agosto 02 del 2024. (a) panorámica de la carrera 7A , (b) Carrera 7A calle 17E,

La calle 18 entre carreras 7Ay la 6B, el contratista labora subsanado las dudas y resuelto la omision de la empresa prestadora con el alcantarilladlo. En la carrera 6C con 27B y 28 tiene un avance del 95%, pendiente andenes , bordillos y resanes. Pendiente que la Triple A defina punto de conexión de las nuevas tuberías para el sistema de acuedcto. Adicionalmente la SDOP, le autorizo hacer la calle 28 entre las carreras 6B y 6C, para complementar corredor vial de la carrera 8 entre calle 30 a la calle 19 (bulevar de simón Bolívar). La interventoría y el contratista CS San Charmel sas, deben adicionar el ítem no previsto NP del cruce de vio en tubería PVC de 2 pulgadas para las acometidas domiciliarias para acueducto como también el de las domiciliarias para el sistema de acueducto, SDOP se reunión con Edubar ing. Juan Samper y José Sarmiento para la gestión de los NP mencionados. Ver foto No. 14.



FOTO No. 14: carrera 6C entre calle 27B a la 28, barrio simón bolívar,

Las vías del barrio me quejo carrera 24 calle 82C y 82F, tiene un avance del 85%, las redes de ambos sistemas de acueducto y alcantarillado están buen estado y funcionando de acuerdo oficio de la empresa prestadora de servicio. Se estima que para la última semana de septiembre se reperen ejecuten 100 metros de vía. Ver foto No. 15.

FOTO No. 15: Barrios a la obra 8 etapa, modúlo x,

Barrio santuario la calle 46B entre carreras 7D a la /F y la carrera 7C entre calles 45B a la 46B, tiene un avance de tubería de un 90% en el sistema de alcantarillado que realiza el contratista ejecutado la instalación la carrera 7C y k calle 46B entre carreras 7C a la 7F, falta cambio de un tramo que será el último por procesos constructivos para poder realizar la obra. En pavimento se le ha realizado la estabilización del terreno con una piedra ciclópea. Se tiene previsto inauguración segunda semana de octubre, Ver foto No.16. Con Respecto a la carrera 3E entre calle 19 a la 30, el contratista presento el PMT ante la secretaria de transito y fue devuelto por no haber realizado la socialización de la pavimentación del sector, la cual se realizo el día 28 de septiembre. Se prevé que el contratista inicie labores la primera semana de octubre, los trbajos están coordinados con la Triple A para la instalación de las redes de conducción de agua potable de 20 pulgadas.



(a)



(b).

Foto N.16: barrio Santuario calle 45B a la 46B carrera7C. (a). instaladas redes de acueducto por la Triple a y las de alcantarillado por el contratista pendiente dos pozos y los registro domiciliarios de las casas. Se observa en la foto (b) el mejoramiento del terreno para la base del pavimento. (c) calle 46B entre carreras 7C y 7F.

Para el módulo 4 barrio la ciudadela y 7 abril, el contratista Consorcio G3 Pavimentar SAS, se desarrolla las vías con un avance del 95%, las tubería s de acueducto se están reubicando las de diámetro de 90 mm en polietileno a 110 mm consenso con la Triple A. Para la segunda semana de 0ctubre se tiene programación de inauguración de la primera vía, calle 50D entre carreras 4 y 5 sur.
El modulo 5, zona norte urbanización la playa, las obras se desarrollan con un avance del 90% las instalaciones de alcantarillado se han realizado con el cambio tubería PVC de 8 pulgadas y las acometidas domiciliarias. Adicionalmente se nicio la calle 50 en barrio abajo, la Triple A entrego los diseñoa ajustados al alcance del las vias a pavimentar

4- El avance a los tres pares viales de la carrera 49C – 50 entre calle 76 a la 88 y la calle 79 entre carreras 43 a la 53, y calle 98, se realizó comité de seguimiento con Interventoría proyectos de interventoría SAS, Edubar , SDOP. Ver foto No.18.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.



Foto No.18, reunión EDUBAR. INTERVENTORIA , SDOP.

En la calle 98 entre vía 40 y la carrera 75ª, módulo seis, M6, el consorcio vías quillas 2024, lleva de iniciado el proyecto más de los 100 días y en los cuales, Por lo anterior se tiene para final del mes los diseños geométricos, hidráulico de la cuenca del sector, muro divisorio de la empresa pactia, mezcla del material de sitio y la protección del talud donde está la tubería de Promigas. Los anteriores diseños están en fase de prediseño, a la cierre del informe todos están en revisión por parte de la interventoría y resolver los ajustes por parte del contratista; se le solicito a la gerencia de proyecto Edubar tener los disseños para la primera semana de octubre para que la secretaria de obra de su concepto a los diseños finales. También, La SDOP lidera la coordinación de la topografía dela urbanización ARGOS SA, quien viene construyendo la calle 98 y su urbanismo del barrio villa carolina XI etapa y llega a la rotonda de la carrera 75A. Por otro lado la empresa TECNOGLASS SAS está ejecutando la prolongación de la carrera 75ª que viene desde el monumento denominado la ventana del mundo hasta la rotonda de la calle 98. La glorieta o rotonda será construida por una partes (50%) ARGOS SA, y la otro 50% por Tecnoglass, por lo anterior el Distrito con su proyecto del módulo 6 debe llegar a la glorieta; y empalmar estas tres vías, Para lo cual se notificó y coordino con las diferentes comisiones topográficas del contratista e interventoría mas los actores mencionados anteriormente. Se observo por las cotas topográficas y el desarrollo urbanístico de la zona de la empresa Argos. esta zona se debe rellenar con material del nivel actual hasta 1,80 metros de material. Por lo anterior, los vecinos colindantes de bodegas (pactia) quedarían a desnivel con el desarrollo urbanístico y los proyectos viales de la carrera 75ª y calle 98, por lo anterior, se están ajustando y verificando por la empresa Argos las cotas topográficas entre proyectos a la llegada a la glorieta. Al final de mes de septiembre se tiene fundido 99 metros de pavimento.

El señor alcalde mayor de la ciudad visito el proyecto el dia 20 de agosto 2024 y se programo que para la tercera semana de septiembre se tiene la meta de tener los primera placas de concretos de la vía, lo cual se cumplio con 99 metros lineales fundidos, como se aprecia en las foros siguientes (b) y (d).



(a)



(b)



(C).



(d)



(e)

FOTO No.19: (a) equipo de supervisión de la SDOP en comité semanal con interventoria , edubar contratista para atender inquietudes a los diseños y validar avance, el estado de la obras en sus 100 dias.(b) vaciado de los 42 m pavimeto (c) coordinación de la SDOP para cotas topógrafia de las vias en la rotonda de la carrera 75ª. (d) via calle 98 fundida de plcas 99 metros del caril (e) corte de materia de la calle 98 con vía 40.

En la calle 79 entre carrera 43 a la 52, módulo siete, M7; el contratista inicio obras desde la carrera 52 hacia la carrera 51B, debido a que por la carrera 43 a 43B los vecinos manifestaron oposición al proyecto de ampliación de la calle 79, porque le solicitaban que primero se canalizaran las aguas lluvias que bajan por la carrera 43. El contratista quedo en entregar solución hidráulica del sector mencionado anteriormente para el 30 de septiembre para ser revisado por interventoría, educar y la SDOB. Los trabajos de ampliación desde la carrera 51 a la 53 para el 30 de septiembre como se había comprometido el contratista no se cumplirá en esta fecha.



FOTO No.20. suministro para el cambio de las tuberías de alcantarillado en la ampliación de la calle 79 entregado por Triple A, poramica de la calle 79 con carrera 52-

En la carrera 49C: modulo ocho, M8, el contratista presenta un atraso en el desarrollo de la obra de un (-)12.92% de lo programado; por lo anterior, la interventoría oficio al gerente del proyecto EDUBAR al incumplimiento del contratista. A la cierre del informe el contratista tiene el avance de obra entre la calle 76 a la 79 con la instalación de todas las redes con excepción de la proyección de las redes de alumbrado público que está en proceso de aprobación por la empresa prestadora de este servicio aires. El contratista presenta cambio constante de mano de obra en la instalación de redes por no tener acuerdos económicos rentables para los instaladores de tubería. La zona de parqueaderos, (lado impar), esta en suelo cemento en un 70%, presenta atraso. Para el lado impar donde se ampliará la vía se estiman tener fluido para la primera última semana de septiembre. El contratista tiene los isumos de losetas en el sitio. La interventoria ha solicitado plan de contingencia para estar según la programación estimada para este proyecto. El contratista tiene que retirar la última semana de septiembre los suministros de tubería para los sistemas de alcantarillado en la Triple A, se le aviso e informo de hacer esta gestión desde la 3 semana de agosto. La empresa gases del caribe decidió cambiar las redes de distribución por la cantidad de afectaciones hechas a la red durante la parte de demolición y excavación de las zonas duras. Se le ha recomendado al contratista e interventoría. El contratista instala bancos de ducto y alcantarillado entre las calle 80 a la 82. Al cierre del informe el contratista no ha aumentado la fuerza de mano de obra.





FOTO No.19: imágenes del carrera 49C, Adecuación de subbase para fluido para instalación de losetas en lado imoar entre calles 76 a la 79.





(a). (b).

FOTO NO. 20: (a) carrera 50 entre calle 87 a 86.lado par, zona ampliación con fluido para loseta y subbase para concreto. (b) lado impar zona de parquederos vaciado de concreto y zona de loseta en sub base.

Para la carrera 50, modúlo nueve,M9, el contratista presenta un atraso en el desarrollo de la obra de un (-)7.65% un avance de 8.85% y debería ser del 16.50% según lo programado; por lo anterior, la interventoría oficio al gerente del proyecto EDUBAR al incumplimiento del contratista. A la cierre del informe el contratista tiene dos frentes de trabajo desde la calle 87 a la 85; en donde de la 87 a la 86 se ha fundido solado para loseta y el fluido para el concreto se vacia la ultima semana de agosto. La zona de parqueadero lado impar se ha vacia concreto para las rmpas y bahías de parqueaderos. Se han presentado dos daños grandes en las troncales de gas, las cuales han sido por negligencia del operador de la retroexcavadora del contratista. El otro frente de trabajo del contraista es carrera 50 entre calle 76 a la 79. El avance demolio zonas duras y esta en la instalación de ductos de redes secas. Se debe resaltar que el contratista retiro sin autorización den la empresa de servicio, ni del usuario, tampoco de la interventoría los medidores de agua potable de ls predios; por consiguiente la Triple A menciono el hecho con consecuencias de reclamo por parte del usuario en su consumo, el cual el contratista deberá asumir las consecuencias por este hecho, daño em medidores y perdidas de cajillas para medidores.

.

5-Asesoria y coordinación técnica: para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con: el Contratista **Unión Temporal Gran Vía R90**, La Triple A SA ESP, la interventoría **EDUBAR SA** y la SDOB. Se coordino el arreglo de fuga de acueducto y alcantarilladlo con la empresa Triple A. se realizo asistencia a las fugas reportadas por el contratista en ejecución de los trabajos. Ala espera de liberación de predios para instalar redes en esos espacios. El contratista trabaja para la instalación de tubería de 20 pulgadas Ver fotos No.11





.

FOTO No.18: Imágenes de personal de la triple A asistiendo al contratista en la redes de alcantarillado y acueducto en la calle 47, y arreglo de fugas existentes por daños ala red distribución y vertimiento de agua servida por taponamiento en la tubería por falta de tapas provisional.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

5.1-Asesoria y coordinación técnica al sistema de saneamiento básico en el barrio san salvador, calle 86 entre carreras 80 a la 81, carrera 80 entre calles 85 a la 86, carrera 81 entre calle 85 a la 86, por pavimentación de las vías mencionadas. La secretaria Distrital de Obras Públicas adelantará la construcción del pavimento, pero la junta de aciin comunal del barrio solicito que la empresa prestadora del servicio de saneamiento básico revisara el estado de las redes nuevas instaladas por el contratista de pavimento. La revisión la realizó la Triple A SA ESP, como la unidad remota de inspección la cual encontró unas anomalías que el contratista esta realizando los correctivos respectivos y supervisados por SDOP, la Triple A y Edubar.

6. Visita Técnica y recorrido al proyecto del intercambiador vial de la carrera 43 calle 110 (circunvalar). En donde la empresa de prestación de servicio público La Triple A SA ESP, instalará tubería de conducción en polietileno de 315 mm (12”), en la zona de anden lado impar de la carrera 43. Se informa que al cierre del informe del mes la empresa no ha enviado oficio con los requerimientos solicitados por la SDOP. Ver Foto No. 19.



Foto No. 19, carrera 43 acceso desde la circunvalar al barrio Miramar, adecuación de zona intervenidas por la AAA.

7. Elaboración y planificación de listados del las vías priorizadas en los modulos de barios a la obra con la ejecución según directrices ces de la SDOP.


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA					
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, Y V EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.					
OBRA No	DIRECCION	LONGITUD EN METROS	BARRIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
MODULO 1					
1	CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	450	LA LUZ	DISTRITO	DISTRITO
2	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	160	REBOLO	DISTRITO	DISTRITO
3	CARRERA 26 ENTRE CALLES 9 Y 17	500	REBOLO	DISTRITO	TRIPLE A
4	CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 17B	200	LA LUZ	TRIPLE A	DISTRITO
5	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 Y 27	250	REBOLO	-	COLECTOR 52"
6	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 Y 30	280	REBOLO	TRIPLE A	DISTRITO

8.Cordinacion con la Triple A SA ESP, para asistenciaa las redes de los sistemas de acueducto y alcanarillado del sector del al intercambiador de la carrera 43 calle 110. Sector alamaeda.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 01 al 30 SEPTIEMBRE 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

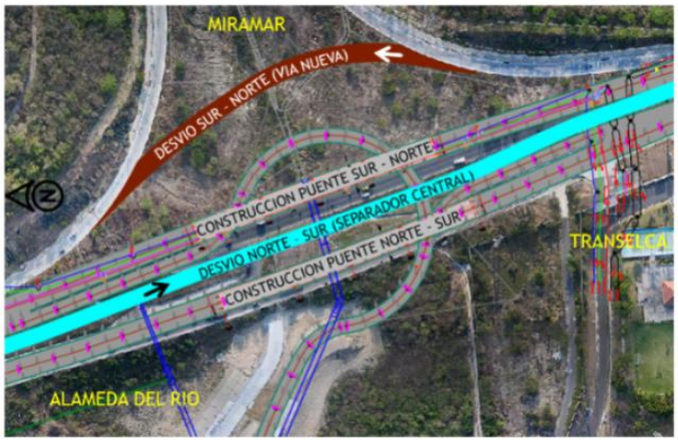

09. Coordinación, asistencia técnica, a la SDOP como enlace entre la gerencia administrativa del programa barrios a la obra 8 etapa que realiza EDUBAR SA con la empresa prestadora de servicio Triple A SA ESP. y los contratista que ejecutaran las vías.

MODULO	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-003-2024	CONSORCIO VIAS BAREM	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
2	SA-EDU-007-2024	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	CARLOS KARLO COTES MADERA
3	SA-EDU-008-2024	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	JAVIER AUGUSTO MOLINA RODRIGUEZ
4	SA-EDU-009-2024	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO
5	SA-EDU-010-2024	CONSORCIO EDUBAR 2024	ENETH TALINA AVENDAÑO
6	SA-EDU-023-2024	CONSORCIO VIAS QUILLA	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
7	SA-EDU-004-2024	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	ALVARO HERNANDO CALDERON TORO
8	SA-EDU-011-2024	CONSORCIO DP 2024	ROBERTO CARLO DONADO ARCE
9	SA-EDU-005-2024	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	OLEARIS ALONSO HERNANDEZ ORELLANO
INTERVENTORIA			
MODULO		CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-021-2024	CONSORCIO DS	ALEJANDRO ALBA QUINTERO
2	SA-EDU-022-2024	PI S.A.S	WILSON GIOVANNI URREA URREA

Atentamente,

REYNALDO OLIVA BABILONIA
C.C. 8.731.664 de Barranquilla
