INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	159 DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO M&J INGENIERIA
IDENTIFICACION	Nit 901.838.931-8
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	Pago parcial del 24 de julio al 23 de septiembre de 2024

El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente, en concordancia con lo normado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, manual de contratación y supervisión del Municipio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		

Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato			X
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.			X
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
El contratista desarrollo sus actividades acordes a las obligaciones durante el periodo.

En nuestra calidad de supervisores, certificamos que el contratista durante la ejecución del contrato y/o Convenio realizó las obligaciones específicas, estipuladas en el contrato, de manera oportuna, con calidad y eficiencia, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas; durante el periodo del presente informe.

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de planeación el día Veintisiete (27) del mes de septiembre de 2024.

SUPERVISORES,

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Planeación

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ
Director De Obras Publicas
Secretaria de Planeación

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director De Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NUMERO 159 DE 2024					
PAGO	No. 1	FECHA	DIA	MES	AÑO
			27	09	2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	CONSORCIO M&J INGENIERIA	Nit 901.838.931-8
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2024000088 25/01/2024 2024000089 25/01/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO Y FECHA	2024000392 19/06/2024

ACTAS DEL CONTRATO	
ADICION EN VALOR	No aplica
PRORROGA EN TIEMPO	No aplica
SUSPENSION	No aplica
REINICIO	No aplica
MODIFICACION	No aplica

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 324.420.765,76**	Valor Anticipo	**$0**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$0**	Amortización:	**$0**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$119.328.564,52**	Amortización:	**$0**
SALDO:	**$205.092.201,24**		

GENERALIDADES DEL PAGO								
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial	X	Terminación		
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO		FV No 1				DIA	MES	AÑO
					FECHA	27	09	2024
PERIODO A PAGAR		Pago parcial del 24 de julio al 23 de septiembre de 2024						

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.3.2402042.2022250350039.2.3.2.02.02.005.183.8210146	Estudios y diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías rurales, caminos reales y puentes y pontones del municipio de Anapoima	8210146	CONVENIO ICCU 1257 DE 2023 MEJORAMIENTO VIA VDA LA ESMERALDA CON LA VDA PANAMA	$ 42.467.257,74
2.3.2402042.2022250350039.2.3.2.	Estudios y diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y	8210145	CONVENIO ICCU 1256 DE 2023 MEJORAMIENTO	$ 76.861.306,78

02.02.005.183.82 10145	rehabilitación de vías rurales, caminos reales y puentes y pontones del municipio de Anapoima		VIA VDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VDA PROVIDENCIA GARCIA	
			Valor total a pagar	$119.328.564,52

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A

NÚMERO PLANILLA (persona natural)			N/A		
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (persona natural)			SI		NO X
COPIA DE PLANILLAS APORTE (persona natural)			SI		NO X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA (persona natural)			SI		NO X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ( )			SI	X	NO
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)			SI	X	NO

Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley

DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ		
Secretario De Despacho Secretaria De Planeación		
		FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ		
Director De Obras Publicas Secretaria De Planeación		
		FIRMA

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director De Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario De Despacho	

CONTRATO 159 DE 2024
PERIODO DE INFORME (24 DE JULIO DE 2024 – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024)
INFORME PARCIAL 1

ASUNTO:	INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA DEL INFORME:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
INFORME REALIZADO POR:	ANDRES MAURICIO GONZALEZ – PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION, DIRECCION DE OBRAS-SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023
VALOR:	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($324,420,765.76)

CONTENIDO

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 2
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 2
   2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 2
   2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL TRAMO 3
3. AVANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL 4
   3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO 5
   3.2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADAS 6
4. AVANCE DE OBRA 7
5. AVANCE FINANCIERO 13

DESARROLLO DEL INFORME

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El periodo de corte correspondiente al presente informe tiene como alcance desde el 24 de julio de 2024 al 24 de septiembre del 2024, se realiza avance de informe según supervisión realizada por parte del Municipio, y el cual hace referencia a las actividades realizadas en el proceso de contratación de acuerdo con los compromisos adquiridos.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Anapoima está ubicado al sur occidente del Departamento de Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, en las estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera oriental. A mitad del camino entre los altiplanos interandinos del centro - oriente del país (como el cundí-boyacense) y más concretamente entre las frías y fértiles tierras de la Sabana de Bogotá y el valle cálido interandino del rio Magdalena (y por implicación con algunos puertos fluviales como Guataqui y Girardot)

en un territorio que hoy puede ser considerado como uno de los corredores o de los conglomerados turísticos más importantes del centro del país.



Ilustración 1. Ubicación Municipio de Anapoima

2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Las veredas La Esmeralda y Panamá se encuentran ubicadas al oriente del municipio de Anapoima, en cercanías al Centro Poblado de Patio Bonito, el proyecto beneficiara a las comunidades de las veredas anteriormente mencionadas en el sector Caballerizas, beneficiando así no solo a dichos sectores, sino a la comunidad anapoimuna en general. Ilustración 2. Ubicación general Vereda La Esmeralda Y Panamá.

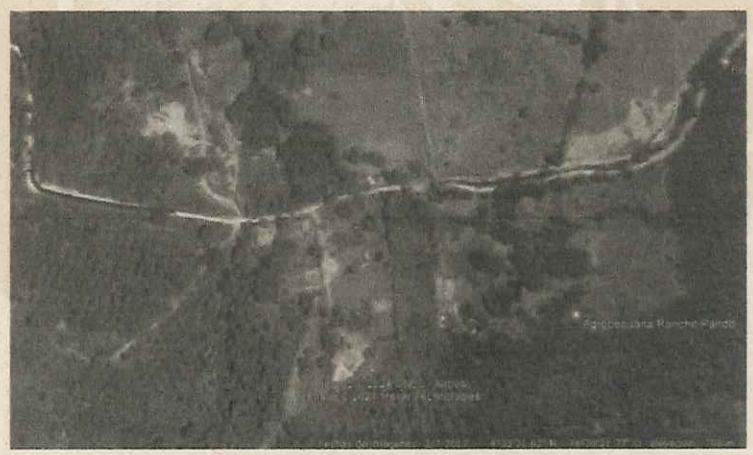


Ilustración 2 Ubicacion Placa huella sector Caballeriza

Y las veredas Providencia Mayor y Providencia García se encuentran ubicada al oriente del municipio de Anapoima, en cercanías al Club Mesa de Yeguas, el proyecto beneficiara a las comunidades de las veredas anteriormente mencionadas en el sector Sharing Club, beneficiando así no solo a dichos sectores, sino a la comunidad anapoimuna en general.

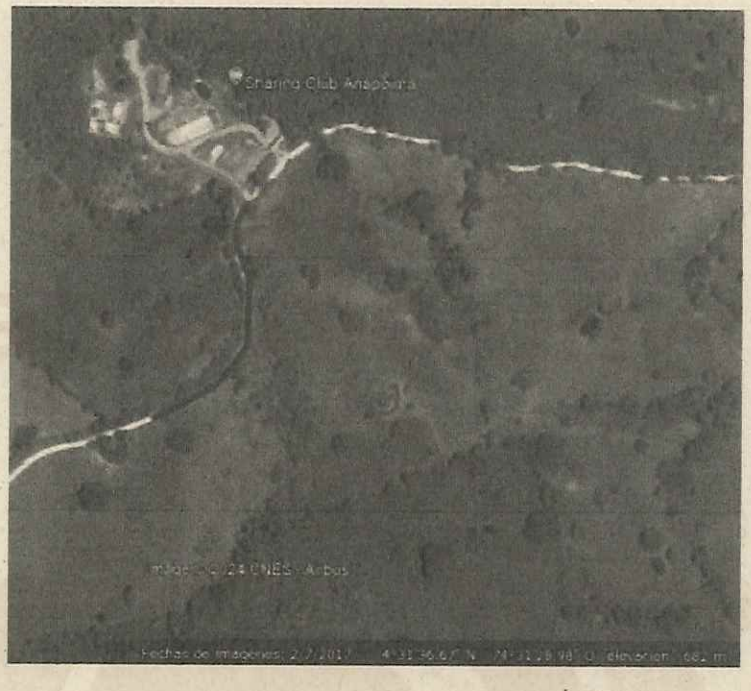


Ilustración 3 Ubicación placa huella sector Sharing Club

3. AVANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL

A la fecha, el Municipio llevo a cabo las gestiones necesarias para la incorporación de recursos en el presupuesto municipal, se solicitaron los Certificados de Disponibilidad correspondientes, así mismo, se completó el Anexo Técnico, así como la elaboración de los pliegos tipo por parte de la Dirección de Obras Públicas y los demás trámites administrativos para realizar la respectiva adjudicación del contrato derivado.

Consecuente con los procesos anteriormente mencionados se adjudicó el contrato No 159-2024 el cual tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023". Y para el cual se dio acta de inicio del 24 de julio de 2024.

3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

3.2. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

Modalidad: Selección abreviada – Menor Cuantía

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 159 DE 2024

CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN:	Nit 890.680.097-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 1.072.961.140 expedida en Anapoima Alcalde Municipal

CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO M&J INGENIERIA.
IDENTIFICACIÓN:	Nit 901.838.931-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 79.912.994 expedida en Bogota D.C
DIRECCIÓN:	Carrera 58 No. 90-53 Bogotá D.C. Celular/Teléfono: +57(304)3790061 Correo electrónico: licitaciones@ryjingenieria.com

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023.

VALOR: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($324,420,765.76).

SUPERVISORES: **JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**
Secretario de Despacho

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ
Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION.

3.3. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA

CONDICIONES ORIGINALES							MAYORES O MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL	CANT.	V/R. TOTAL	CANT.	V/R. TOTAL
CONVENIO 1256 DE 2023 SECTOR SHARING CLUB.									Longitud: 180 + 3 mts de rampas	
1.1	600.4 P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INC. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,35	52.697,00	1.019.686,95	2,90	$152.821,10	22,25	$1.172.508,25
1.1	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c= 3000 psi (losas)	M3	72,08	657.093,00	47.363.261,44	16,64	$10.934.027,52	88,72	$58.297.290,96
1.1	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	65,84	439.465,00	28.934.375,60	-29,10	-$12.786.769,43	36,74	$16.147.606,17
1.1	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	43,55	553.459,00	24.103.139,45	-8,45	-$4.676.728,55	35,10	$19.426.410,90
1.1	640.1	SUMINISTRO FUGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7202,65	6.898,00	49.683.879,70	924,42	$6.376.649,16	8127,07	$56.060.528,86
					SUB-TOTAL	$ 151.104.345,14		$ 0,00	SUB-TOTAL	$ 151.104.345,14
		ADMINISTRACIÓN	A	25,00%		$ 37.776.086,29		$ 0,00		$ 37.776.086,29
		IMPREVISTO	I	5,00%		$ 7.555.217,26		$ 0,00		$ 7.555.217,26
		UTILIDAD	U	3,00%		$ 4.533.130,35		$ 0,00		$ 4.533.130,35
		TOTAL A.I.U		33,00%		$ 49.864.433,90		$ 0,00		$ 49.864.433,90
		VALOR TOTAL CONVENIO 1256				$ 200.968.779,04		$ 0,00		$ 200.968.779,04

CONVENIO 1257 DE 2023 SECTOR CABALLERIZA.									Longitud: 108 + 3 mts de rampas	
1.1	600.4 P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INC. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12	52.697,00	632.364,00	1,13	$59.547,61	13,13	$691.911,61
1.1	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c= 3000 psi (losas)	M3	43,81	657.093,00	28.787.244,33	10,26	$6.741.774,18	54,07	$35.529.018,51
1.1	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	39,33	439.465,00	17.284.158,45	-14,61	-$6.421.399,84	24,72	$10.862.558,61
1.1	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	26,25	553.459,00	14.528.298,75	-5,19	-$2.872.452,21	21,06	$11.655.846,54
1.1	640.1	SUMINISTRO FUGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4579,44	6.898,00	31.588.977,12	361,37	$2.492.730,26	4940,81	$34.081.707,38
					SUB-TOTAL	$ 92.821.042,65		-$ 0,00	SUB-TOTAL	$ 92.821.042,65
		ADMINISTRACIÓN	A	25,00%		$ 23.205.260,66		-$ 0,00		$ 23.205.260,66
		IMPREVISTO	I	5,00%		$ 4.641.052,13		-$ 0,00		$ 4.641.052,13
		UTILIDAD	U	3,00%		$ 2.784.631,28		-$ 0,00		$ 2.784.631,28
		TOTAL A.I.U	U	33,00%		$ 30.630.944,07		-$ 0,00		$ 30.630.944,07
		VALOR TOTAL CONVENIO 1257				$ 123.451.986,72		-$ 0,00		$ 123.451.986,72
		VALOR TOTAL CONTRATO				$ 324.420.765,76		-$ 0,00		$ 324.420.765,76

4. AVANCE DE OBRA

A la fecha del presente informe, y luego de haber presentado el acta parcial, se han realizado las actividades constructivas de la obra, el cual representa la construcción de las placa base en los sectores mencionados, sector caballeriza y sector sharing club. El proceso realizado para la construcción de la placa huella se detalla a continuación:

Actividades Realizadas

1. **Conformación de la Vía**:
   - **Descripción**: Se ha llevado a cabo la preparación y conformación de la vía, estableciendo la base para las estructuras posteriores en el sector de caballeriza y en el sector de sharing club.
   - **Estado Actual**: Completado.
2. **Vaciado de Módulos Centrales**:
   - **Descripción**: El sector de caballeriza correspondiente a 108 metros lineales, se encuentra ejecutado 9 módulos centrales de concreto clase D y concreto ciclópeo clase G, correspondiente a la ejecución de 25,65 metros lineales. En el sector de Sharing club correspondiente a de 180 metros lineales, se finalizó el vaciado de módulos centrales y los módulos laterales utilizando tanto concreto reforzado como concreto ciclópeo.
   - **Progreso**: En ejecución
3. **Vaciado de Cunetas:**
   - **Descripción**: En el sector de sharing club y en el sector de caballeriza se encuentra el figurado de las cunetas sin aun haberse realizado el vaciado del concreto
   - **Progreso**: En ejecución

Avance Actual

- **Progreso Total**: Actualmente, se presenta un avance de obra del 36,78%.

Cronograma de Actividades

- **Fecha de Finalización**: En el sector de Caballeriza como en el sector de sharing club se tiene una fecha de finalización del contrato el 23 de Octubre del presente año.

Registro Fotográfico

A continuación, se incluye un registro fotográfico que muestra los avances de obra hasta la fecha. Estas imágenes documentan el progreso y ayudan a visualizar el estado actual del proyecto:

SECTOR SHARING CLUB



IMAGEN 1

Ilustración 4 Conformación de la placa huella

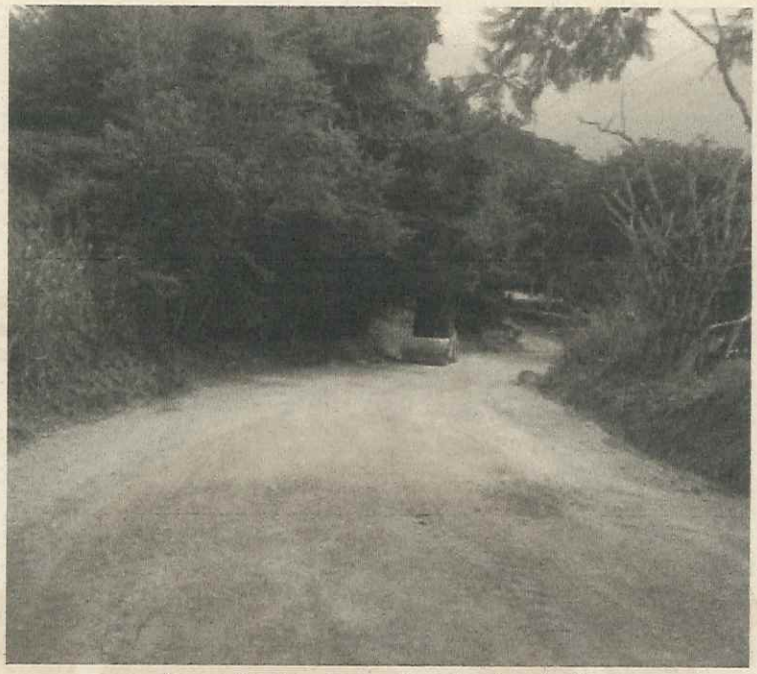


Ilustración 5 Conformación de la placa huella

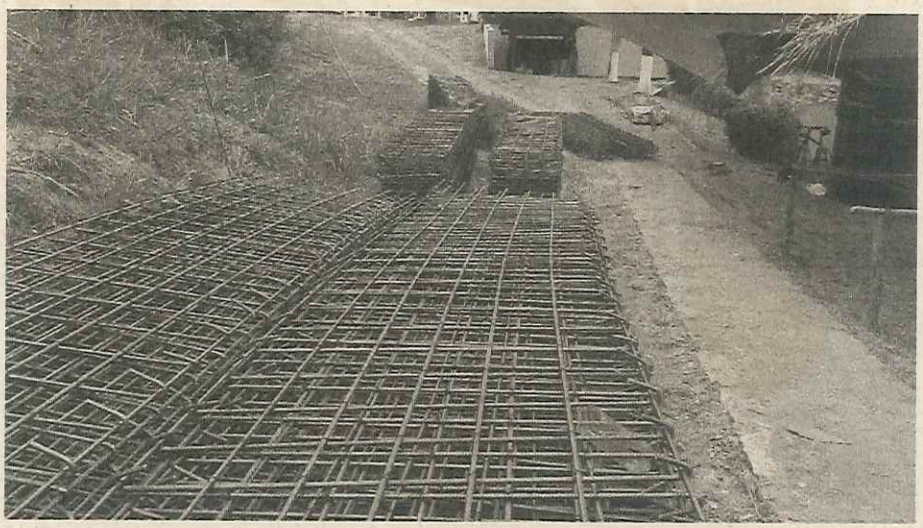


Ilustración 6 Figurado del acero

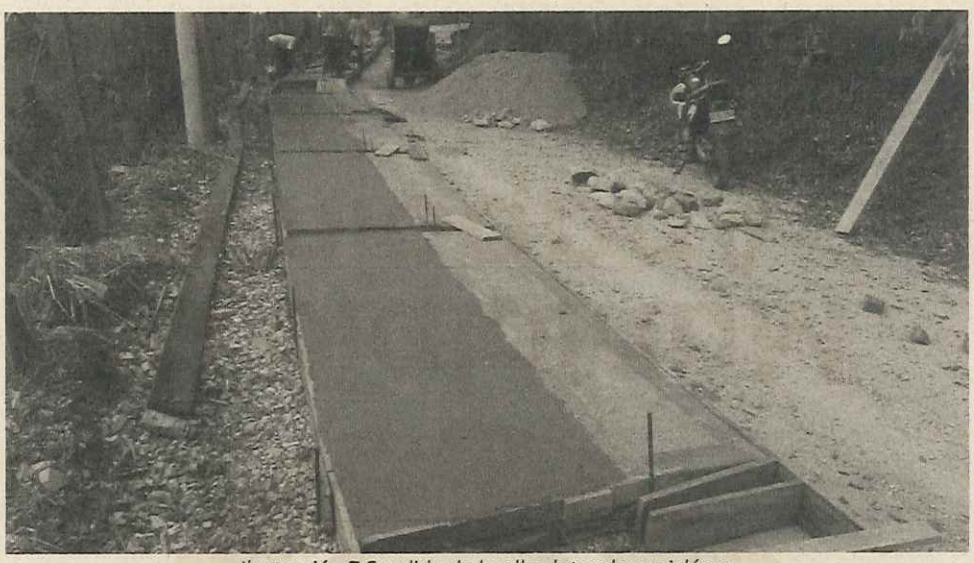


Ilustración 7 Fundida de huellas laterales y ciclópeo

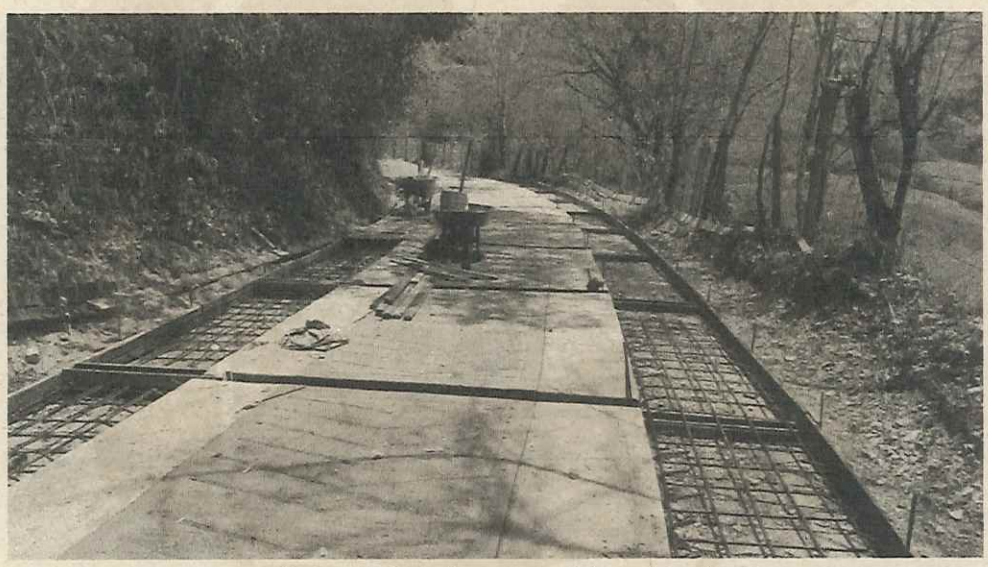


Ilustración 8 Huella central y ciclópeo lateral

SECTOR EL SALVIAL

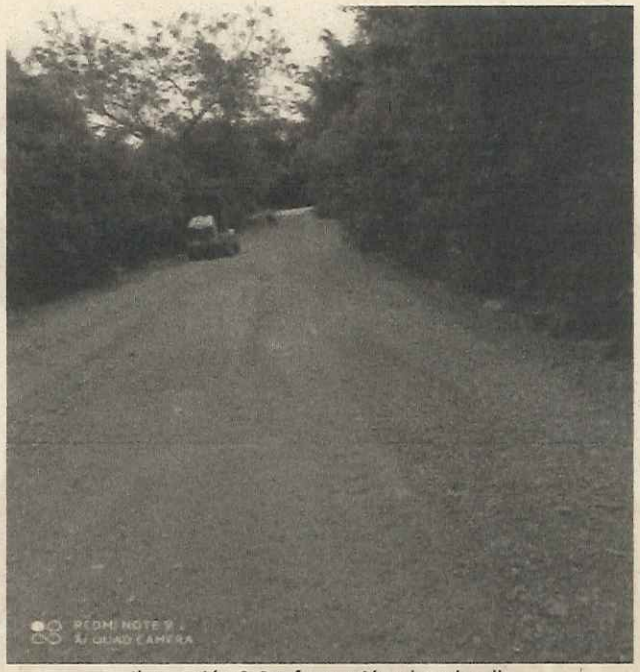


Ilustración 9 Conformación placa huella

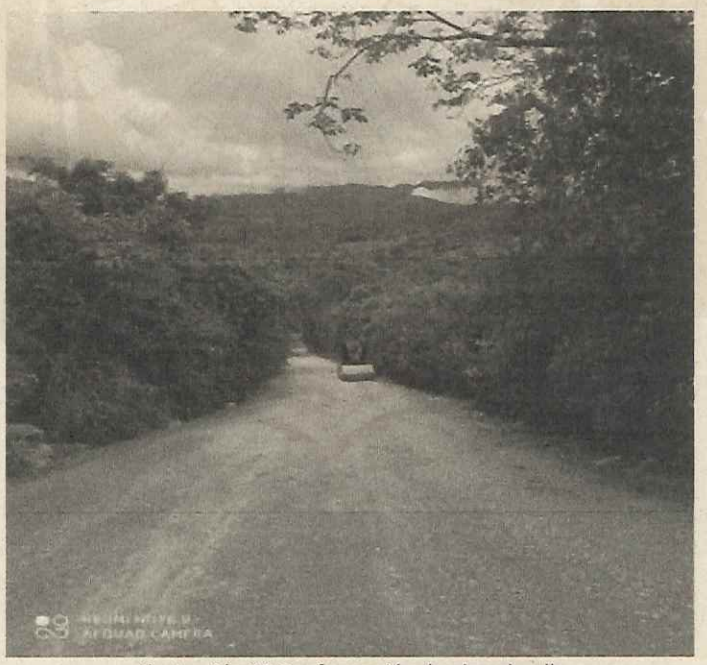


Ilustración 10 Conformación de placa huella

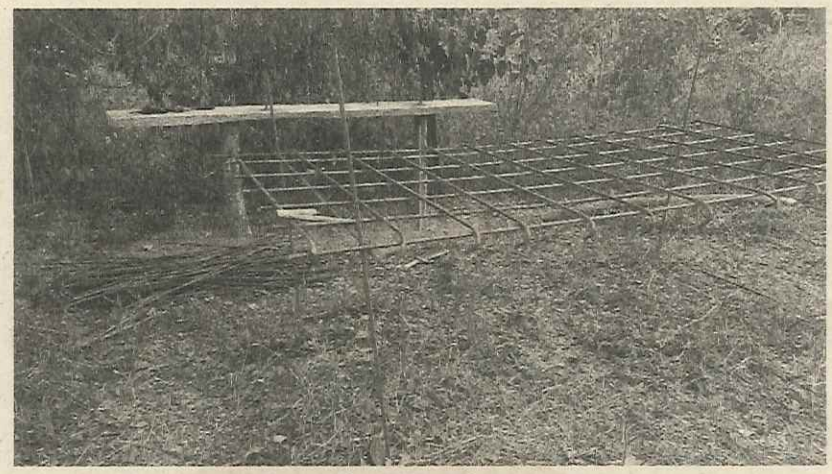


Ilustración 11 Figurado del acero

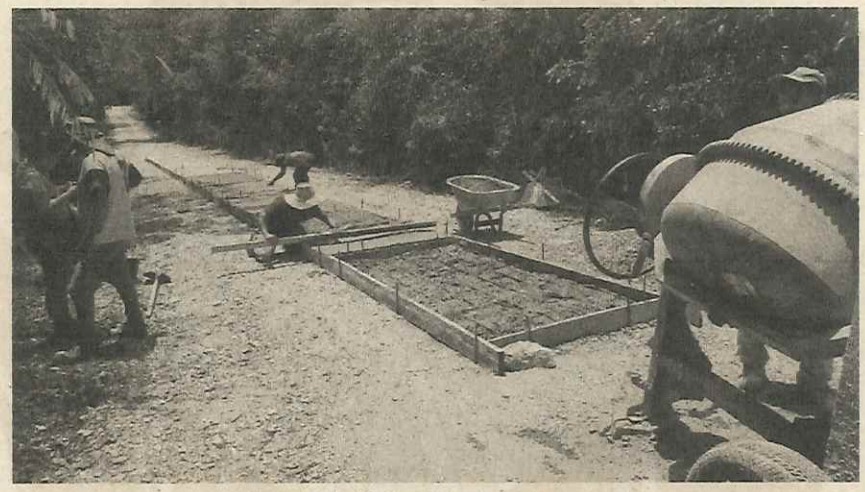


Ilustración 12 Fundida de huella central

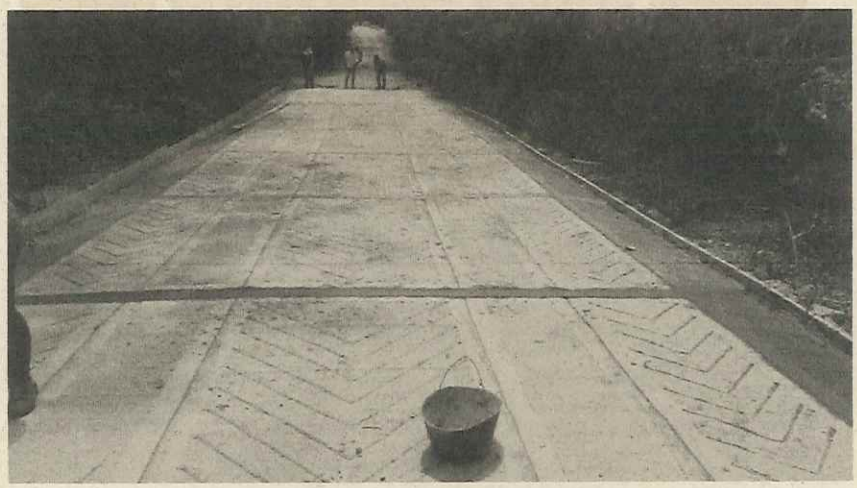


Ilustración 13 Módulos placa base

5. AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe, el contratista ha radicado el acta parcial ante el municipio de Anapoima como único cobro y pago realizado al contratista hasta la fecha. Sin otra particularidad de muestra el estado de la cuenta del contrato de obra 159 de 2024:

AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR SHARING CLUB	38.24%
AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR CABALLERIZA	34.4%
TOTAL AVANCE	36.32%
VALOR DEL TOTAL CONTRATO 159-2024	$324,420,765.76
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119,328,564.52
VALOR TOTAL POR COBRAR	$205,092,201.24

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Planeación

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
Director De Obras Públicas –
Secretaría de Planeación

Proyectó: Andres Mauricio González Guzmán/Profesional Contratista/DOP/SP
