CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3323-2023

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO".

INFORME DE SUPERVISION

PERIODO: 01/MAYO/2024 AL 31/MAYO/2024

San Juan de Pasto, Mayo de 2024.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	31 de mayo de 2024.	CON CORTE :	31 de mayo de 2024.

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO DE CONTRATACION:	Contratación Directa.
CONVENIO MACRO No:	Convenio Interadministrativo.
CONVENIO No.:	Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 2023.

CDP No.:	2023060415. Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.	FECHA: 14 de junio de 2023.	$ 2.900.000.000,00
REGISTRO No:	2023061318. Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.	FECHA: 28 de junio de 2023.	$ 2.839.026.698,88

OBJETO DEL CONTRATO:	"Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo".

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

MODIFICACION No. 01-2023:	No. y fecha: 01 del 11 de agosto de 2023.	Detalle: Aclaratorio de textos en cláusulas contractuales

CONTRATISTA DE OBRA:	Municipio de San Pablo. Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo. NIT 800.099.143-2. Contratista de Obra Civil: Diego Reinel Fernandez Ordoñez.
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	Municipio de San Pablo. Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo. NIT 800.099.143-2. Contratista de Interventoría: Antonio José rosada Bedoya.
SUPERVISOR:	Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre. Secretario de Infraestructura y Minas.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA TECNICA:	Ing. Ana Cristina Vela Perdomo. Profesional Universitaria SIMD.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA JURIDICA:	Dra. Diana Burbano. Abogada Contratista SIMD.
META FISICA	Muro de contención de Longitud = 202 metros.
VALOR DEL CONVENIO:	$ 2.844.026.698,88
APORTE DEPARTAMENTO:	$ 2.839.026.698,88
OBRA CIVIL:	$ 2.653.806.566,58
INTERVENTORIA:	$ 185.220.132,30
APORTE MUNICIPIO:	$5.000.000,00 - Estudios y Diseños del Muro de Contención.
FECHA DE INICIACION:	31 de julio de 2023.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

PLAZO DEL CONVENIO:	Catorce (14) meses.			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 de mayo de 2024.			
FECHA DE TERMINACION FINAL:	30 de septiembre de 2024.			
SUSPENSION:	-			
REINICIO:	-			
PORCENTEJE ANTICIPO:	40%			
TOTAL ANTICIPO:	$ 1.135.610.679,55			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 1.850.361.224,99			
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria.			
Póliza No.:	436-47-994000058928.			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	97,02%	% EJECUTADO:	97,02%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	90,98%	% EJECUTADO	90,98%
META FISICA A LA FECHA	1	Atención de emergencia - Muro de Contención.		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS:

El Departamento de Nariño suscribió con el municipio de San Pablo el Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 2023 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo", por un término de diez (10) meses, iniciando el 31 de julio de 2023 hasta el 30 de mayo de 2024.

El municipio de San Pablo como ejecutor del proyecto adelantó la contratación de los contratos de Obra Civil e Interventoría derivados del convenio.

- Obra Civil con el Contratista Diego Reinel Fernandez Ordoñez, con quien se suscribió el Confiato de Obra No. UM 103.1-2D-10-16 del 11 de agosto de 2023, par valor de S2.653.806.566,58. con un plazo de ejecución de 10 meses y con una iniciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses.

- Interventoría con el Contratista Antonio José Rosada Bedoya, con quien se suscribió el Contrato de Interventoría No. UM 130.1-20-10-17 del 11 de agosto de 2023, por valor de $185.220.132,30, con un plazo de ejecución de 10 meses y con una inİciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses.

Según Informe de Interventoría Semanal, la obra civil lleva una ejecución del 97,02%.

Interventoría informa en los Informes Semanales y Mensual, a la Secretaría de Infraestructura y Minas, los avances de la obra civil del muro de protección en ua longitud de 202,00 metros lineales, así:

- Desvío de la quebrada Bateros, el cual se ha realizado en su totalidad, es decir en una longitud de 202 metros lineales. Las lluvias presentes en la región han ocasionado que el Contratista de Obra vuelva a realizar el Desvio del cauce de la quebrada Bateros y se haya generado daños en la nivelación del terreno y formaletas que se habían realizado para la fundición del concreto ciclópeo. Interventoría informa que ésta actividad por el invierno presentado ha generado en varias oportunidades dificultades en los trabajos y ha sido necesario realizar nuevamente el desvio de la quebrada en los sectores de la obra. A la fecha, se trabaja nuevamente en el cauce inicial de la quebrada, donde fue necesario el uso de explosivos controlados ya que en el recorrido se encontraron rocas de gran tamaño quer impedían el paso de la maquinaria, las rocas fueron llevadas sobre el muro con el fin de dar protección al mismo.

- Excavaciones en Conglomerado: 1.153,43 M3 y en Roca: 641,03 M3.
- Demolición de estructuras.
- Transporte de material sobrante de la obra.
- Concreto Ciclópeo para cimentación: 240,04 M3.
- Concreto Reforzado, resistencia 4.000 PSI, para zarpas, cuerpo de muro: 685,45 M3.
- Acero de refuerzo Fy 420 Mpa, para cimentación, zarpas y cuerpos de muro: 68.458,48 Kgs.
- Entibado para Muro.
- Relleno para estructuras: 1.395,53 M3.

Interventoría recuerda e informa que las estructuras de contención y protección de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros, ya fue realizada por sus propietarios, evitando de esta manera el riesgo de caída y así atenten con sus vidas.

1. Se recordó a la Secretaria de Planeación Municipal Ing. Jinna Andrea Muñoz Ibarra, continuar con la gestión de tomar las medidas necesarias respecto a los residuos sólidos evacuados por las viviendas aledañas a la quebrada Bateros y a la construcción del muro de protección, toda vez que esta situación genera graves afectaciones medioambientales debido a los desechos evacuados. quienes evacuan sus aguas residuales a la quebrada Bateros, generando erosiones en los taludes aledaños a la quebrada.

2. Se recordó al Contratista tano de la Obra Civil como de Interventoría continuar con la información a las comunidades junto con el Comité Veedor del proyecto para el seguimiento del proyecto de Construcción del muro de protección aledaño a la quebrada Bateros en el municipio de San Pablo.

3. El Municipio de San Pablo, allegará a la Secretaría de Infraestructura y Minas, la documentación técnica y legal requerida para el trámite del Segundo Desembolso.

Además, Interventoría informa que el Personal tanto de Obra Civil como de Interventoría aprobados para la ejecución del contrato se mantiene con su vinculación a Salud, Pensión y Riesgos.

Que en la obra se ha utilizado equipos como: rotomartillos para la demolición de rocas, retroexcavadora de orugas y herramienta menor.

A los concretos empleados se han tomado muestras de laboratorio para ensayos de compresión en los concretos de las zapatas, y cuerpo del muro de protección, documentos solicitados que sean presentados en los Informes Mensuales presentados por Interventoría.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Se tramitó por parte del Municipio de San Pablo el pago del Anticipo del Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 por valor del Cuarenta por ciento (40%) que equivale a: Mil ciento treinta y cinco millones seiscientos diez mil seiscientos setenta y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos ($1.135.610.679,55), a través del cargue del aplicativo Siscar Nariño; Así como también el Pago Parcial No. 01 el 29 de noviembre de 2023 por valor total de Mil ciento noventa y un millones doscientos cincuenta mil novecientos nueve pesos con siete centavos ($1.191.250.909,07) para un valor neto de Setecientos catorce millones setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos ($714.750.545,44) y una amortización por valor de Cuatrocientos setenta y seis millones quinientos mil trescientos sesenta y tres pesos con sesenta y tres centavos ($476.500.363,63), previa entrega de los documentos técnicos y legales requeridos para realizar los pagos.

El Municipio de San Pablo adelanta el trámite para Pago Parcial No. 2, por valor de Mil doscientos veinte millones ochocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con veintinún centavos M/Cte. ($1.220.880855,21), para un valor neto de Setecientos treinta y dos millones quinientos veintiocho mil quinientos trece pesos con trece centavos M/Cte. ($732.528.513,13) y una amortización por valor de Cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos con ocho centavos ($488.352.342,08).



PÁGINA 1 DE 2

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

Egresos Tesorería

No. 2023010051
Fecha: 22/09/2023

A Favor de:	MUNICIPIO DE SAN PABLO	CC, O Nit:	800099143
Dirección:	CL 3 5 ESQ BRR BOLIVAR	Telefonos:	321780103
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 108460008756		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	Por valor de: $	1,135,810,879.55
Valor en letras:	UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCOCTVS. MC.		
Detalle:	ANTICIPO 40% CONVENIO 3323-2023 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUCCION MURO. Cons. O.Pago 2023010233		
Concepto:	ORDEN DEPAGO 2023014543 DEL 19-09-2023, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.		

Orden de pago No.: COM-2023010233

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000415	2023001315	2.2.2.02.02.009.04.2402	Construcción y ampliación de la infraestructura para uso vial	1,135,810,879.55
			TOTAL	1,135,810,879.55


MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1110205111001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinacion	0.00	1,135,810,879.55

10

MIRIAMCORTES

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

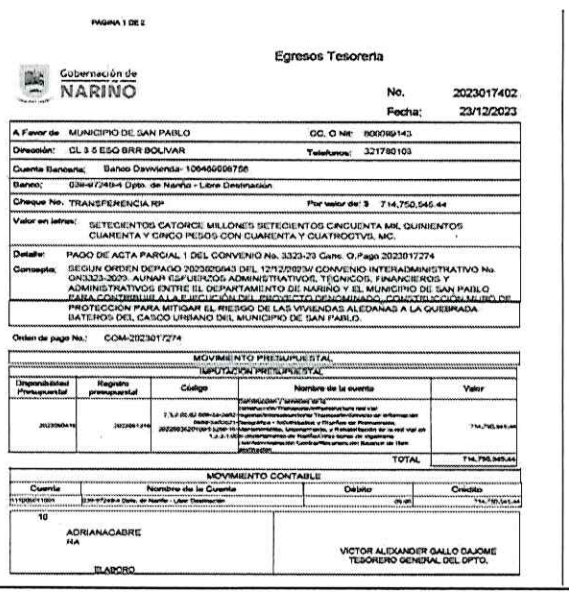

PÁGINA 1 DE 2

Gobernación de NARIÑO

Egresos Tesorería

No. 2023017402
Fecha: 23/12/2023

A Favor de:	MUNICIPIO DE SAN PABLO	CC, O Nit:	800099143
Dirección:	CL 3 5 ESQ BRR BOLIVAR	Telefonos:	321780103
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 108460008756		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	Por valor de: $	714,750,545.44
Valor en letras:	SETECIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATROCTVS. MC.		
Detalle:	PAGO DE ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO No. 3323-23 Cons. O.Pago 2023017274		
Concepto:	SEGUN ORDEN DEPAGO 2023020943 DEL 12/12/2023/ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3323-2023. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.		

Orden de pago No.: COM-2023017274

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000476	2023001498	1.3.2.02.02.009.04.2402	Construcción y ampliación de la infraestructura para uso vial	714,750,545.44
			TOTAL	714,750,545.44

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1110205111001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinacion	0.00	714,750,545.44

10

ADRIANACABRE

VICTOR ALEXANDER GALLO CAJOME
TESORERO GENERAL DEL DPTO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

El Departamento de Nariño suscribió en el mes de agosto de 2023 el Modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 con el objeto de aclarar textos de cláusulas del Convenio Inicial, el cual ya se encuentra legalizado y cargado en la pltaforma Secop II, y radicada la información física en el Departamento Administrativo de Contratación de Nariño - DAC.

ASPECTOS LEGALES :

Se encuentra en legalización el Modificatorio No. 03 de 2023 al Convenio Interadministrativo No. GN3323- 2023, en el Departamento Administrativo de Contratación de Nariño - DAC, con Adición en Tiempo.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recordó a Interventoría continuar con el control y seguimiento a las actividades contratadas, llevando bitácora de trabajo suscrita por Contratista de Obra Civil y de Interventoría, además del Personal de los Contratistas.

- Se recordó y solicitó al Municipio de San Pablo y a Interventoría la entrega de los Informes Semanales y del Informe Mensual con cinco (05) días de antelación para revisión.

Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD.
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo.
Sub-Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD.
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Ana Cristina Vela Perdomo.
Profesional Universitaria - SIMD.
Gobernación de Nariño.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Suministro e instalación de formaleta para fundición muro final.



Foto 2: Fundición muro de H = 6,00 metros entre las abscisas K0+080,30 al K0+067,60.



Foto 3: Suministro e instalación de icopor en dilatación del muro de protección.



Foto 4: Cerramiento de seguridad a muro de protección sobre quebrada Bateros.



Foto 5: Acopio de material para relleno de muro.

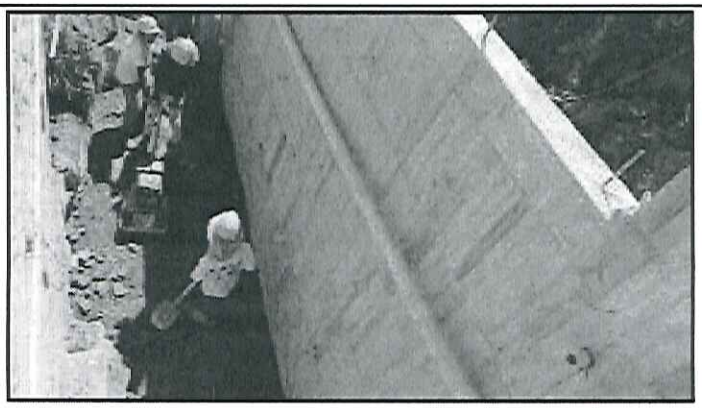


Foto 6: Relleno de muro entre las abscisas K0+047 al K0+070.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

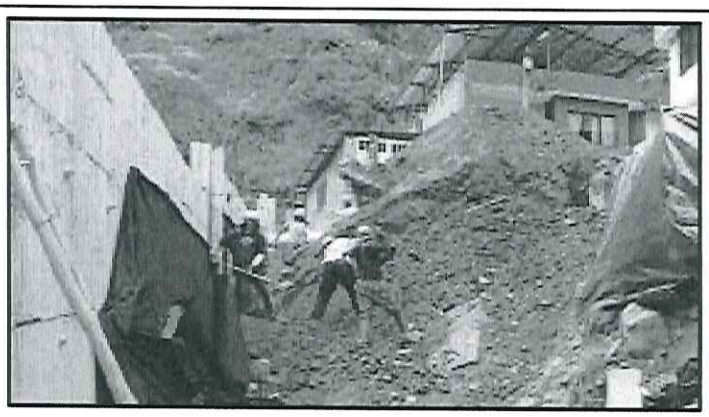


Foto 11: Riego de material de forma manual para el relleno del muro.



Foto 12: Acopio de material de relleno para muro de protección.



Foto 13: Muro de Protección sobre quebrada Bateros en el municipio de San Pablo, Nariño.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**GN3323-2023.**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
Anticipo 40%.	22 de septiembre de 2023.	$ 1.135.610.679,55				$ 1.135.610.679,55	$ 0,00	2023010051	22 de septiembre de 2023.
Acta Pago Parcial No. 01.	29 de noviembre de 2023.	$ 1.191.250.909,07	$ 2.326.861.588,62	$ 476.500.363,63	$ 714.750.545,44	$ 714.750.545,44	$ 476.500.363,63	2023017402	23 de diciembre de 2023.
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
		$ 1.191.250.909,07		**$ 476.500.363,63**	**$ 714.750.545,44**	**$ 1.850.361.224,99**	**$ 476.500.363,63**		

AVANCE FISICO	97,02%
AVANCE FINANCIERO PAGADO	65,00%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No.: GN3323-2023.

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
Póliza No.:	436-47-994000058928.

ANEXO 0			**FECHA APROBACION:**	26/07/2023	**FECHA EXPEDICION:**	30/06/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	28-jun-23	28-oct-24	Actualización según Acta de Inicio.	103
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	28-jun-23	28-oct-24	Actualización según Acta de Inicio.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 1			**FECHA APROBACION:**	1/08/2023	**FECHA EXPEDICION:**	1/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Acta de Inicio.	136
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Acta de Inicio.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 2			**FECHA APROBACION:**	Sin aprobación 23/08/2023	**FECHA EXPEDICION:**	18/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	28-jun-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	136
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	28-jun-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 3			**FECHA APROBACION:**	4/09/2023	**FECHA EXPEDICION:**	4/09/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	136
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-7
Gobernación de Nariño		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONVENIO No.:	GN3323-2023.

CAP.	ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1.01	Particular 1	Desvio temporal de cause quebrada bateros con material seleccionado recubierto con estopas de polietileno.	$ 26.176.755,80	$ 26.176.755,80	$ -	0%
1.02	Particular 2	Excavación en material conglomerado.	$ 45.232.375,63	$ 45.232.375,63	$ -	0%
1.03	210.2.1 P	Excavación en roca.	$ 58.516.211,05	$ 58.516.211,05	$ -	0%
1.04	201.7	Demolición de estructuras incluye desalojo.	$ 7.587.211,31	$ 7.587.211,31	$ -	0%
1.05	900.2.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	$ 13.667.475,28	$ 13.667.475,28	$ -	0%
1.06	630.1.7 P	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI - 40% Rajón, mezclado in situ.	$ 134.355.119,42	$ 134.355.119,42	$ -	0%
1.07	630.1.3.1 P	Concreto reforzado resistencia 4000 PSI, mezclado in situ.	$ 877.506.587,88	$ 877.506.587,88	$ -	0%
1.08	640.1	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	$ 711.889.138,79	$ 711.889.138,79	$ -	0%
1.09	Particular 3	Entibado para muro.	$ 43.371.242,85	$ 43.371.242,85	$ -	0%
1.10	610.2	Relleno para estructuras con recebo.	$ 321.127.277,41	$ 321.127.277,41	$ -	0%
1.11	673.2	Material granular drenante para filtro.	$ 24.129.006,10	$ 24.129.006,10	$ -	0%
1.12	673.1.1 P	Geotextil NT 2500.	$ 15.623.250,24	$ 15.623.250,24	$ -	0%
1.13	663.1 P	Tubería de plástico tipo PVC 2" para lagrimales.	$ 3.549.361,66	$ 3.549.361,66	$ -	0%
1.14	663.1 P	Tubería de plástico tipo PVC perforada 4".	$ 9.346.459,20	$ 9.346.459,20	$ -	0%
1.15	Particular 4	Desmonte de puentes en madera existentes Ancho=1.3 m, longitud 20 metros incluye desalojo.	$ 2.849.542,80	$ 2.849.542,80	$ -	0%
1.16	Particular 5	Desmonte de muro en ladrillo y malla de cerramiento en mal estado incluye desalojo.	$ 3.869.299,20	$ 3.869.299,20	$ -	0%
1.17	Particular 6	Cerramiento en malla eslabonada h=1,5 m, con tuberia metálica, angulos de 1" para borde de la malla, columnetas en concreto h=0,5m y muro en ladrillo comun a la vista.	$ 46.156.510,40	$ 20.000.000,00	$ (26.156.510,40)	-57%
1.18	Particular 7	Puertas metálicas en malla de cerramiento de 1 m x 2 m y tubo de 1 1/2".	$ 1.389.661,00	$ -	$ (1.389.661,00)	-100%
1.19	Particular 8	Andenes en concreto de 3000 PSI, espesor 0,1 m (incluye malla electrosoldada 5mm).	$ 20.775.955,20	$ -	$ (20.775.955,20)	-100%
2.01	201.7	Demolición de estructuras de pavimento incluye desalojo.	$ 14.383.082,84	$ -	$ (14.383.082,84)	-100%
2.02	310.1	Conformación de la calzada existente.	$ 818.602,20	$ -	$ (818.602,20)	-100%
2.03	210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales incluye escombrera.	$ 7.979.822,92	$ -	$ (7.979.822,92)	-100%
2.04	900.2.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	$ 2.920.602,10	$ 2.920.602,10	$ -	0%
2.05	311.1	Mejoramiento a través de afirmado.	$ 41.143.620,86	$ -	$ (41.143.620,86)	-100%
2.06	330.3.2	Base granular clase C gradación gruesa.	$ 13.483.766,79	$ -	$ (13.483.766,79)	-100%
2.07	500.1.2 P	Pavimento en concreto hidráulico - NT1 - MR 3,8 Mpa.	$ 91.701.077,83	$ -	$ (91.701.077,83)	-100%
2.08	672.1	Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo (0,20 x 0,15 m).	$ 10.776.438,40	$ -	$ (10.776.438,40)	-100%
2.09	640.1	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	$ 3.177.151,80	$ -	$ (3.177.151,80)	-100%
2.10	710.1.1	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lámina retrorreflectiva tipo IV (75x75 cm).	$ 1.585.032,80	$ -	$ (1.585.032,80)	-100%
2.11	700.1	Línea de demarcación con pintura en frio.	$ 922.761,84	$ -	$ (922.761,84)	-100%
		Implementar PAGA.	$ 60.821.042,54	$ 59.008.575,47	$ (1.812.467,07)	-3%
		Implementar Plan de Manejo Ambiental.	$ 36.975.122,46	$ 35.873.263,81	$ (1.101.858,65)	-3%
		Interventoría.	$ 185.220.132,30	$ 179.700.572,36	$ (5.519.559,94)	-3%
		COSTO TOTAL	**$ 2.839.026.698,88**	**$ 2.596.299.328,35**	$ (242.727.370,53)	-9%

