UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	7/06/2024
Semana No	**1**	**Del :**	31/05/2024	AL:	7/06/2024
Plazo Total	30	760	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		0,92%			
Nombre del Supervisor :	ARQ. SANDRA PATRICIA GARCIA CRUZ				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

PUERTO CARREÑO- VICHADA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje avance**	**0,00%**
				Valor avance	**0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO AERO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO INSACO INTERVENTORES
Contrato No:	23001173 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001290 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 13.113.904.730	**Valor total contrato:**	$ 2.822.657.438
Valor actualizado:	$ 13.113.904.730	**Valor actualizado:**	$ 2.822.657.438
Plazo inicial:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	**Plazo inicial:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
Plazo actualizado:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	**Plazo actualizado:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
Fecha de iniciación:	31-may-24	**Fecha de iniciación:**	31-may-24
Fecha de vencimiento:	30-jun-26	**Fecha de vencimiento:**	30-jun-26
Nueva fecha de terminación	30-jun-26	**Nueva fecha de terminación**	30-jun-26
Valor total contrato	$ 13.113.904.730	**Valor total contrato**	$ 2.822.657.438

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


OBSERVACIONES

SEMANA ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024	Al contrato de obra 230017773 H3 de obra y al 23001290 H3 de interventoría se le emitió orden de inicio el 31/05/24, la entidad remitió los formatos de acta para ser diligenciados y suscritos por la el contratista de obra el CONSORCIO AERO SAFKA y la interventoría CONSORCIO INSACO INTERVENTORES. En el comité de seguimiento realizado el 06/06/2024 la supervisión solicitó la remisión de las actas suscritas, el contratista y la interventoría informaron que se tenía una reunión programada para revisar el tema y poder remitir la información solicitada.
	Por otra parte, se informa por parte de la supervisión del contrato de interventoría la visita programada a la obra entre el 24 al 28 de junio de 2024.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Conforme al programa de inversiones entregado por el contratista las actividades de obra se encuentran programadas una vez terminado la etapa preconstructiva, toda vez que se requiere realizar una revisión al detalle de las obras a recibir, el estado de la infraestructura y equipos, las conexiones pendientes entre otras. Igualmente, a través de la realización de los diseños de los componentes de urbanismo se podrá definir las obras a ejecutar. En este primera semana el plazo del contrato consumido es menor al 1%.

Curva S (Programado Vs Ejecutado)

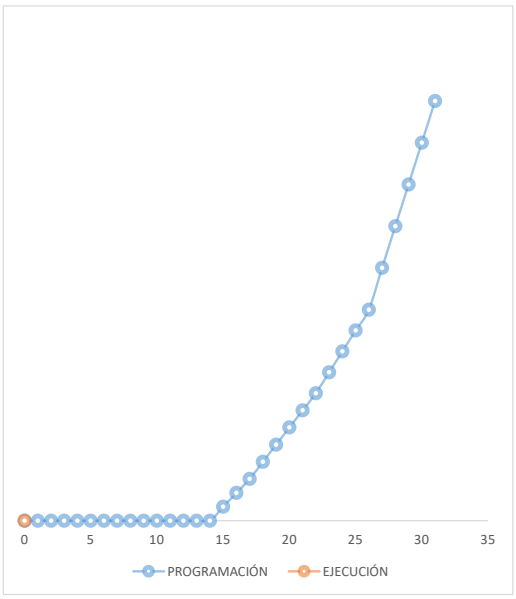

COMUNICADOS

A través del comunicado INSACO-001-2024 del 06/06/24 la interventoría remitió las hojas de vida de los profesionales propuestos para el proyecto.

AREAS PROBLEMÁTICAS

COMPROMISOS

PERSONAL DE OBRA

OBRA			
Director de obra	1		
Ingeniero de Apoyo	1		
TOTAL PERSONAL	**2**		
INTERVENTORÍA			
Director de obra	1		
Ingeniero de Apoyo	1		
TOTAL PERSONAL	**2**		

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		$ -
4		$ -
5		$ -
6		$ -
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 13.113.904.730
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		$ -
4		$ -
5		$ -
6		$ -
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 2.822.657.438,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
