Melgar, Tolima 12/09/2024

70- 001915 12 SET 2024

Ingeniero

WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA

Secretario de Infraestructura y desarrollo físico

Alcaldía Municipal

Asunto: Cuenta de Cobro N° 5

Cordial saludo

Mediante la presente envío cuenta de cobro para solicitud desembolso Acta Parcial N.° 5 del contrato N.° 051 Del 01 de Febrero 2024, y que tiene por objeto, ***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.: PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.***

Los valores objeto del cobro, deberán ser consignados en la Cuenta de ahorros N° 446000294368 del Banco Davivienda denominada **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 051 2024 ALUMBRADO**

Agradezco su amable y diligente colaboración.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR
NIT. 890701933-4
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
RECIBÍ: Julian Pedraza
FECHA: 12/09/24 HORA: 3:50 pm
FOLIOS: ANEXOS:

JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Director Técnico
EMPUMELGAR E.S.P

Proyectó: Lizet Valentina Llanos Ruiz – Prof Mision - 12/09/2024
Reviso: Jhon Freddy Suarez Betancourth - Director Técnico -12/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS CO20/962285

Melgar, Tolima 12/09/2024

Cuenta de cobro N°.005

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR-TOLIMA
NIT 890.701.933-4

DEBE A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR

EMPUMELGAR E.S.P

NIT 809.001.720-4

La suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($376.133.870.91)**, correspondiente al valor del cuarto desembolso del contrato N° 051 DEL 01 de febrero del 2024, contrato entre la alcaldía de melgar y la empresa de servicios públicos empumelgar e.s.p., para desarrollar el programa de mantenimiento, operación, modernización y ampliación de cobertura de la red de alumbrado público en el municipio de melgar para la vigencia 2024.

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS
Gerente
EMPUMELGAR E.S.P

Proyectó: Lizet Valentina Llanos Ruiz – Prof Mision - 12/09/2024
Reviso: Jhon Freddy Suarez Betancourth -Director Tecnico-12/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

CO20/962285

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-017
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
	FORMATO	ACTA PARCIAL	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	18/03/2024

MUNICIPIO DE MELGAR	PROYECTO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024	CONTRATO No	631 DE 2024
			VALOR CONTRATADO	$2.841.520.756,77
	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	VALOR ADICIONAL	N/A
			VALOR EJECUTADO ACTUAL	$ 376.133.870,91
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INTERVENTOR		PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
			FECHA INICIO	01 DE FEBRERO DE 2024
			FECHA SUSPENSION No 1	N/A
			FECHA REINICIO No 1	N/A
	CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	N/A
			FECHA ACTA DE REINICIO No 2	N/A
			FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	N/A
			FECHA PRESENTE ACTA	11/09/2024

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA 04		ACUMULADO ACTA 03		ACUMULADO ACTA 02		ACUMULADO ACTA 01		POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
I	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO																
1.1	Reparación de lámparas 70w	Und	230,0	$ 363.750,13	$ 83.662.643,13		$ -	41,00	$ 14.913.775,53	153,00	$ 57.836.348,99	30,00	$ 10.912.518,68			0,00	$ -
1.2	Reparación de lámparas 150w	Und	230,0	$ 377.132,75	$ 86.740.418,14		$ -	-	$ -	191,00	$ 72.032.260,38	39,00	$ 14.708.157,86			0,00	$ -
1.3	Reparación de lámparas 250w	Und	230,0	$ 531.208,42	$ 122.177.936,47	26,00	$ 14.073.835,74	11,00	$ 5.843.272,63	1,00	$ 531.208,42					190,00	$ 100.929.599,69
1.4	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1383,4	$ 119.466,53	$ 153.691.935,57	610,00	$ 72.864.642,43	128,00	$ 32.794.385,71	325,00	$ 38.501.653,75	81,00	$ 9.595.796,73			249,44	$ 30.735.446,88
1.5	Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg	Und	20,0	$ 1.382.112,72	$ 27.642.240,55	7,00	$ 9.674.784,92	1,00	$ 1.382.112,62		$ -					12,00	$ 16.585.344,21
1.6	Suministro e instalación de poste de 10m 510Kg	Und	10,0	$ 2.007.611,52	$ 20.076.115,19	6,00	$ 12.045.681,11		$ -		$ -					4,00	$ 8.030.454,08
1.7	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W con fotocelda azul	Und	200,0	$ 142.951,70	$ 28.590.340,33	50,00	$ 7.147.563,08	38,00	$ 5.432.145,56	35,00	$ 5.003.293,06	18,00	$ 2.573.121,63			59,00	$ 8.434.120,90
1.8	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W con fotocelda azul	Und	200,0	$ 152.710,33	$ 30.542.066,37	17,00	$ 2.596.075,64	21,00	$ 3.206.916,97	57,00	$ 8.704.488,32	8,00	$ 916.261,99			99,00	$ 15.118.922,85
				COSTOS DIRECTOS	$ 563.323.615,61												$ 179.833.268,61
II	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS																
2.1	Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	370,0	$ 120.434,72	$ 44.557.145,13	131,00	$ 15.773.637,87	$ 156,00	$ 18.786.255,79		$ -	12,00	$ 1.445.056,60			71,00	$ 8.550.154,88
2.2	Suministro e instalación de luminarias Led AP [Clasificación M4-M5] 60w	Und	300,0	$ 1.133.857,60	$ 113.385.760,01	48,00	$ 54.425.164,80	$ 49,00	$ 55.559.022,40		$ -	-				3,00	$ 3.401.572,80
2.3	Suministro e instalación de luminarias Led AP [Clasificación M3] 80w	Und	160,0	$ 1.459.882,50	$ 233.581.215,02	58,00	$ 84.673.190,81	$ 58,00	$ 84.753.425,61		$ -	-				45,00	$ 67.154.599,60
2.4	Suministro e instalación de luminarias Led AP [Clasificación M3] 150w	Und	120,0	$ 1.693.507,60	$ 203.620.913,01	33,00	$ 55.955.750,83	$ 72,00	$ 121.212.547,21		$ -	9,00	$ 15.151.568,40			6,00	$ 10.101.045,60
				COSTOS DIRECTOS	$ 595.545.033,17												$ 89.207.372,88
III	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CASCO/TA)																
3.1	Localización y replanteo	Ml	1000,0	$ 9.567,58	$ 9.567.583,33	1.000,00	$ 9.567.583,33		$ -		$ -					0,00	$ -
3.2	Excavación de postes y retenidas	Und	33,0	$ 229.328,95	$ 7.567.855,52		$ -		$ -		$ -					33,00	$ 7.567.855,52
3.3	Suministro e instalación de Poste de 12 m 510 Kgf	Und	33,0	$ 2.249.580,80	$ 74.238.146,29		$ -		$ -		$ -					33,00	$ 74.238.146,29
3.4	Pintura para poste de 10m 510 kg	Und	33,0	$ 81.181,41	$ 2.678.986,58		$ -		$ -		$ -					33,00	$ 2.678.986,58
3.5	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	15,0	$ 525.399,91	$ 7.877.998,59		$ -		$ -		$ -					15,00	$ 7.877.998,59
3.6	Suministro e instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Und	1000,0	$ 72.251,15	$ 72.251.152,00		$ -		$ -		$ -					1.000,00	$ 72.251.152,00

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
	FORMATO	ACTA PARCIAL	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	19/07/2023

3,7	Suministro e instalacion de red de media tension	Und	150,0	$ 109.921,26	$ 16.488.188,64		$ -		$ -		$ -						150,00	$ 16.488.188,64
3,8	Suministro e instalacion de transformador monofasico	Und	1,0	$ 7.135.553,77	$ 7.135.553,77		$ -		$ -		$ -						1,00	$ 7.135.553,77
3,9	Suministro e instalacion de luminaria led AP	Und	33,0	$ 1.362.439,62	$ 44.960.507,56		$ -		$ -		$ -						33,00	$ 44.960.507,56
3,10	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado público	Und	8,0	$ 506.831,66	$ 4.054.653,31		$ -		$ -		$ -						8,00	$ 4.054.653,31
3,11	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y Acompañamiento	Glb	1,0	$ 27.272.728,00	$ 27.272.728,00	0,25	$ 6.818.182,00		$ -		$ -						0,75	$ 20.454.546,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 274.133.653,57													$ 237.747.853,64
IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																	
4,1	Gastos Administrativos	Glb	1,00	$ 688.020.455,68	$ -						$ -	(-1)	$ 688.020.455,68	1,00	$ 688.020.455,68		0,00	$ -
4,2	Suministro de Elementos de Protección personal y Dotacion para cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,00	$ 93.671.003,37	$ -						$ -						0,00	$ -
4,3	Poda, tanqueo, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera autorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UNO	260,00	$ 432.615,65	$ 112.480.329,00	71,00	$ 30.715.792,15	$ 131,00	$ 52.336.614,65	$ 29,00	$ 12.545.682,85	39,00	$ 16.872.549,35				0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 112.480.329,00													$ -
V	VEHICULOS																	
5,1	Alquiler de Vehiculo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 379.500.000,00	$ -					(-0,50)	-$ 189.750.000,00	0,25	$ 94.875.000,00	0,25	$ 94.875.000,00	0,00	$ -
5,2	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, bomeo y volco	Glb	1,0	$ 280.500.000,00	$ -					(-0,50)	$ 140.250.000,00	0,25	$ 70.125.000,00	0,25	$ 70.125.000,00	0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ -													$ -
NP	NO PREVISTOS																	
NP 01	Gastos de implementacion administrativa - Costos de organizacion y planificacion- Gastos Organizacionales	Glb	1,0	$ 645.661.427,15	$ 645.661.427,15							1,00	$ 645.661.427,15			0,00	$ -
NP 02	Adquisición de Implementos de Protección Personal y Dotación para el Personal	Glb	1,0	$ 86.910.031,20	$ 86.910.031,20							1,00	$ 86.910.031,20			0,00	$ -

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	ACTA PARCIAL	VIGENTE DESDE	10/03/2020

NP 03	Servicio de Alquiler de Vehículos para Transporte de Insumos, Materiales y Equipos de Cuadrillas de Alumbrado Público	Glb	1,0	$ 360.466.666,67	$ 360.466.666,67		$ -	$ 0,25	$ 90.116.666,67	$ 0,75	$ 270.350.000,00					0,00	$ -
NP 04	Alquiler de Camión Doble Cabina con Grúa Articulada Certificada (capacidad mínima de carga de 3000 kg). Equipado con Canasta, Barreno y Volquete"	Glb	1,0	$ 255.000.000,00	$ 255.000.000,00		$ -	$ 0,25	$ 63.750.000,00	$ 0,75	$ 191.250.000,00		$ -			0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 1.348.038.125,02												$ 526.788.550,14
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 2.891.530.756,77		$ 376.133.870,91		$ 527.697.170,82		$ 326.755.135,27		$ 261.725.573,66		$ 853.020.455,88		$ 526.788.550,14
	A.I.U %																
	AJUSTE AL PESO				$ -												
	TOTAL OBRA				$ 2.891.530.756,77		$ 376.133.870,91		$ 527.697.170,82		$ 326.755.135,27		$ 261.725.573,66		$ 853.020.455,88		

	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 2.891.530.756,77														$ 2.891.530.756,77
	TOTAL OBRA				$ 2.891.530.756,77														$ 2.891.530.756,77
	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA																		$ 376.133.870,91
	VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN + PRESENTA ACTA																		$ 2.364.733.206,64
	SALDO POR EJECUTAR																		$ 526.788.550,14

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 2.891.520.756,77
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL	$ 376.133.870,91
VALOR ACTA N° 4	$ 527.697.170,82
VALOR ACTA N° 3	$ 326.755.135,27
VALOR ACTA N° 2	$ 261.725.573,66
VALOR ACTA N° 1	$ 853.020.455,88
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR NETO CANCELADO ACTAS PARCIALES	$ 2.364.732.206,64
VALOR NETO A CANCELAR ACTA FINAL	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 526.788.550,14

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

ING. WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SUPERVISOR CONTRATOS, DSDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ING. JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
DIRECTOR TECNICO EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

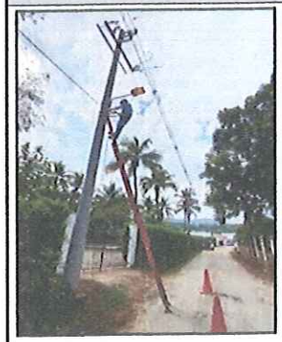
ING. SEBASTIAN HENAO MORALES
PROF. APOYO A LA SUPERVISON

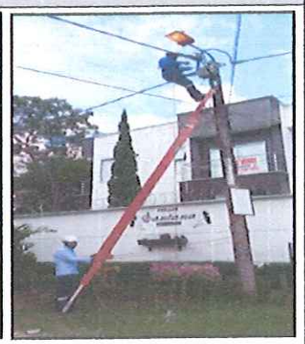
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR, PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACION AQUÍ CONTENIDA, TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A, LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR HOJAS SEPARADAS.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE Nº	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM Nº.	1,3	DESCRIPCION ITEM	Reparación de lámparas 250w UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
KM 5 VIA CARMEN DE APICALA - 29244 - J				UND	1	1
CEBORUCO FRENTE CASA DE LA PRESIDENTE JAC - 29271 -J				UND	1	1
VEREDA CEBORUCO FINCA BLANCA - 28898 -J				UND	2	2
FINCA LA TRINIDAD VEREDA LA PRIMAVERA - 28477 -J				UND	1	1
VEREDA EL SALERO EL PALMAR - 29399 - J				UND	1	1
MZ A CASA 1 ETAPA 1 EL BOSQUE - 28343 - J				UND	1	1
BOSQUE MZ A CASA 5 ETAPA III - 27016 - J				UND	1	1
VEREDA CHIMBI POSADA CAMPESTRE - 29134 - R				UND	15	15
HERRADURA VALLE VERDE - 29036 -M				UND	2	2
VEREDA CHIMBI RINCON DE LOS GOMEZ - 29154 -R				UND	1	1
GUACAMAYAS AGUA FRIA - 29048 - R				UND	2	2
						0
						0
						0
				SUBTOTAL		28
				VIENEN		
				TOTAL		28

OBSERVACIONES:

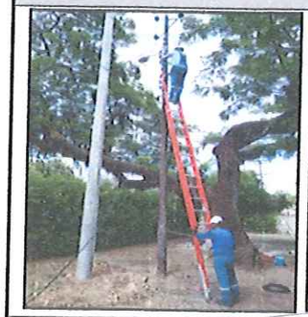
Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACENPARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1,4	DESCRIPCION ITEM	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	UND	UND
VEREDA EL SALERO KM 92 - 29351 - J				ML	104	104		
CLL 7#50 RESACAS - 29149 - YN				ML	189	189		
CRA 50 RESACAS - 29150 - YN				ML	106	106		
VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA- 29240 - YN				ML	30	30		
VEREDA BOMBOTE - 29047 - R				ML	50	50		
VEREDA ARABIA - 29267 - R				ML	121	121		
CRA 54 #1-62 RINCONC DEL CARACOLI - 29319 - M				ML	10	10		
							SUBTOTAL	610
							VIENEN	
							TOTAL	610

OBSERVACIONES:

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:

FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1,5	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LA CAJITA QUEBRADITAS II - 29261 - YN				UND	2	2
CAJITA SECTOR FINCA SOL Y LUNA - 29285 - YN				UND	3	3
VEREDA ARABIA - 29267 - R				UND	2	2
				SUBTOTAL		7
				VIENEN		
				TOTAL		7

OBSERVACIONES:

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:

FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		abr-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1,6	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de poste de 10m 510Kg	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
KM 5 VIA EL CARMEN - 29244 - J				UND	1	1
CRA 50 RESACAS - 29150 - YN				UND	4	4
BOCATOMA - 29107 - M				UND	1	1
				SUBTOTAL		6
				VIENEN		
				TOTAL		6

OBSERVACIONES:

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1,7	DESCRIPCION ITEM: Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 70W Con Fotocelda Azul	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	M	L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CEBORUCO AL LADO DE LASA CASA ABANDONADAS - 28542 - J				UND	1	1
VEREDA AGUILA BAJA - 28882 - J				UND	1	1
VEREDA SAN CRISTOBAL - 27600 - J				UND	2	2
VEREDA EL SALERO EL PALMAR - 29399 - J				UND	1	1
BOSQUE CLL 14 A N°12C-60 - 28889 - J				UND	1	1
HUERTAS CASA 41 - 29342 - J				UND	2	2
MZ C CASA 6 ETAPA 3 EL BOSQUE - 27338 - J				UND	1	1
EL MIRADOR - 29277 - J				UND	2	2
BALNEARIO EL BAMBU SAN CRISTOBAL - 29357 - J				UND	2	2
CLL 31#12-2A GALAN - 29417 - YN				UND	1	1
VEREDA GUACAMAYAS - 29202 - R				UND	3	3
VEREDA BOMBOTE - 29234 - R				UND	2	2
VEREDA ARABIA - 29267 - R				UND	1	1
VEREDA BOMBOTE - 29047 -R				UND	3	3
RINCON DE LOS GOMEZ CHIMBI - 29221 - R				UND	3	3
VEREDA CHIMBI RINCON DE LOS GOMEZ - 29154 - R				UND	12	12
GUACAMAYAS QUINTA LA ESPERANZA - 27735 - R				UND	2	2
GUACAMAYAS AGUA FRIA -29048 - R				UND	9	9
VEREDA LA REFORMA PARTE BAJA - 28411 - M				UND	1	1
				SUBTOTAL		50
				VIENEN		
				TOTAL		50

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1,8	DESCRIPCION ITEM: Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 150W Con Fotocelda Azul	UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VEREDA EL SALERO FINCA EL PALMAR - 28558 - J				UND	1	1
VEREDA EL SALERO BOBA TEXACO - 29405 - J				UND	6	6
SAN JOSE DE LA COLORADA - 29302 - J				UND	2	2
CLL 12#10-76 ICACAL - 29431 - YN				UND	4	4
LAGUNA SECTOR LIBERTADORES - 28855 -YN				UND	2	2
VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M				UND	2	2
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
			SUBTOTAL			17
			VIENEN			
			TOTAL			17

OBSERVACIONES:

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:

FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

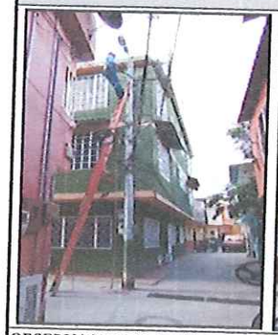
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	2,1	DESCRIPCION ITEM: Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	M	L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J				UND	25	25
CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J				UND	9	9
CLL 12 N°12A-142 ICACAL - 29200 - J				UND	2	2
MZ B CASSA 13 ETAPA 3 EL BOSQUE - 28905 - J				UND	1	1
ROJAS PINILLA DIAGONAL 12 CASA 81 - 29205 - J				UND	2	2
VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR VILLA SAMARIA - 29247 -				UND	2	2
CRA 50 RESACAS - 29150 - YN				UND	8	8
CRA 11 B #7C - 101 FLORIDA PARABOLICA - 29243 - YN				UND	2	2
VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA - 29240 - YN				UND	3	3
VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN				UND	3	3
MZ A CASA 4 V/CARMENZA - 29449 - YN				UND	1	1
CRA 16#7B-60 VERSALLES - 27033 - YN				UND	1	1
CRA 27B #11A - 28 GALAN - 29332 - YN				UND	1	1
VEREDA BOMBOTE - 29047- R				UND	8	8
				SUBTOTAL		68
				VIENEN		
				TOTAL		68

OBSERVACIONES: La diferencia entre las cantidades de desmontes y el total de las instalaciones de luminarias Led, obedece a luminarias que fueron instaladas en postes que carecian de iluminación denominado "Poste sin luminaira" pero que requeria dicha instalación para un optimo servicio.


Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

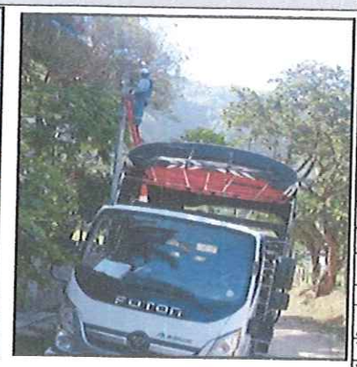
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACENPARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR					
	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO		CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	03
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA		PÁGINA	1 DE 1
				VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2		
ITEM N°.	2,1	DESCRIPCION ITEM	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS
			Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes. UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VEREDA INALI SECTOR LA ESCUELA - 29195 - R				UND	1	1
VEREDA BUENA VISTA - 29206 - R				UND	2	2
BARRIO LA PAZ - 28668 - R				UND	8	8
BARRIO LA PAZ ANTES DEL PORTON LA ACADEMIA - 28445 - R				UND	9	9
VEREDA BOMBOTE - 29234 -R				UND	1	1
VIA AL BALSO LOS RUISEÑORES - 28570 - R				UND	1	1
VILLA CARACOLI CASA 5 - 29059 - R				UND	2	2
VEREDA BOMBOTE - 29047 - R				UND	2	2
VEREDA BOMBOTE - 29234 -R				UND	4	4
BOMBOTE POR LA ENTRADA DE LA HACIENDA SANTA SOFIA - 29100 - R				UND	3	3
BOCATOMA - 29107 - M				UND	3	3
VEREDA LA REFORMA EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR TERRITORIO - 29158 - M				UND	7	7
VEREDA LA REFORMA - 29173 - M				UND	2	2
VEREDA LA REFORMA SECTOR LOS BELLOS - 29179 - M				UND	2	2
				SUBTOTAL		47
				VIENEN		
				TOTAL		47

OBSERVACIONES: La diferencia entre las cantidades de desmontes y el total de las instalaciones de luminarias Led, obedece a luminarias que fueron instaladas en postes que carecian de iluminación denominado "Poste sin luminaira" pero que requeria dicha instalación para un optimo servicio.

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACENPARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2		
ITEM N°.	2,1	DESCRIPCION ITEM	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS
			Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes. UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	M	L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SECTOR SIROMA CUALAMANA - 29354 - M				UND	1	1
PTAP EMPUMELGAR - 29262- M				UND	7	7
VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M				UND	4	4
CENTRO CRA 26N°2-75 - 27018 - M				UND	2	2
CRA 28 N°5-22 CENTRO - 28848 - M				UND	1	1
CLL 5 N°37-06 SICOMORO - 29341 - M				UND	1	1
				SUBTOTAL		16
				VIENEN		
				TOTAL		16

OBSERVACIONES: La diferencia entre las cantidades de desmontes y el total de las instalaciones de luminarias Led, obedece a luminarias que fueron instaladas en postes que carecian de iluminación denominado "Poste sin luminaira" pero que requeria dicha instalación para un optimo servicio.

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

REVISO:

FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

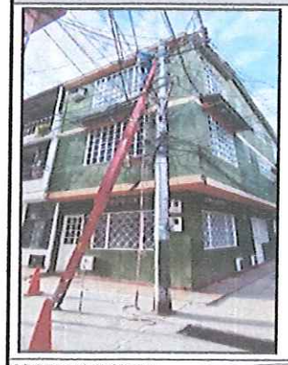
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACENPARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE Nº	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	2,2	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J				UND	16	16
CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J				UND	8	8
CLL 2A N 27-56 LAS VEGAS - 29178 - J				UND	1	1
CLL 12 N°12A-142 ICACAL - 29200 - J				UND	2	2
VEREDA BOMBOTE - 29047 - R				UND	5	5
VEREDA BUENA VISTA - 29206 - R				UND	2	2
BOCATOMA EMPUMELGAR - 29107 - M				UND	3	3
VEREDA LA REFORMA EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR TERRITORIO - 29158 - M				UND	8	8
VEREDA LA REFORMA - 29173 - M				UND	1	1
SECTOR SIROMA CUALAMANA - 29354 - M				UND	2	2
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
			SUBTOTAL			48
			VIENEN			
			TOTAL			48

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	2,3	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J				UND	6	6
CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J				UND	1	1
CLL 2A N 27-56 LAS VEGAS - 29178 - J				UND	2	2
CRISTALES FRENTE A FUERZA AEREA - 29178 -J				UND	1	1
MZ B CASA 13 ETAPA 3 EL BOSQUE - 28905 - J				UND	1	1
CRA 50 #7-229 ALFONSO URIBE - 28801 -J				UND	2	2
ROJAS PINILLA DIAGONAL 12 CASA 81 - 29205 - J				UND	2	2
CRA 11B #7C - 101 FLORIDA PARABOLICA - 29243 - YN				UND	2	2
VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA - 29240 - YN				UND	4	4
VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN				UND	1	1
MZ A CASA 4 VILLA CARMENZA - 29449 - YN				UND	1	1
VEREDA LA CAJITA - 29450 - YN				UND	1	1
CRA 27 B #11A - 28 GALAN - 29332 - YN				UND	1	1
VEREDA BOMBOTE - 29047 - R				UND	3	3
VEREDA INALI SECTOR LA ESCUELA - 29195 - R				UND	1	1
BARRIO LA PAZ - 28668 - R				UND	8	8
				SUBTOTAL		37
				VIENEN		
				TOTAL		37

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	2,3	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	UND: UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	BARRIO LA PAZ ANTES DEL PORTON LA ACADEMIA - 28445 - R				UND	1	1
	VEREDA BOMBOTE - 29234 - R				UND	1	1
	VEREDA ARABIA - 29267 - R				UND	1	1
	BOCATOMA EMPUMELGAR - 29107 -M				UND	4	4
	VEREDA LA REFORMA PARTE BAJA- 28411 - M				UND	1	1
	PTAP EMPUMELGAR - 29262 - M				UND	6	6
	VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M				UND	3	3
	CENTRO CRA 26 N°2-75 - 27018 - M				UND	2	2
	CRA 28 N°5-22 CENTRO - 28848 - M				UND	1	1
	CLL 5 N°37-06 SICOMORO - 29341 - M				UND	1	1
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					SUBTOTAL		21
					VIENEN		
					TOTAL		21

OBSERVACIONES:

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

REVISO:

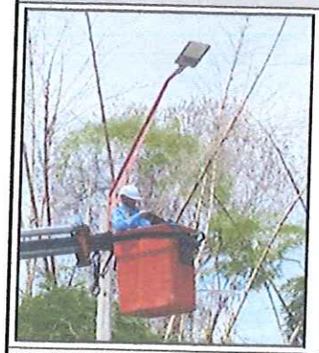
FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2		
ITEM N°.	2,4	DESCRIPCION ITEM	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 150w

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
								
		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			M	M	L			
		VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR VILLA SAMARIA - 29247 -				UND	2	2
		VEREDA SAN CRISTOBAL - 28857 - J				UND	1	1
		CRA 50 RESACAS - 29150 - YN				UND	13	13
		CRA 50 RESACAS - 29228 - YN				UND	2	2
		VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN				UND	2	2
		LA CAJITA 2 SECTOR QUEBRADITAS - 29298 - YN				UND	1	1
		TANQUE DE BOMBEO - 29437 - YN				UND	1	1
		CRA 16 #7B-60 VERSALLES - 27033 - YN				UND	1	1
		VIA AL BALSO LOS RUISEÑORES - 28570 - R				UND	1	1
		VILLA CARACOLI CASSA 5 - 29059 - R				UND	2	2
		SICOMORO CRA 33 N° 28 - 05 - 29274 - R				UND	1	1
		VEREDA BOMBOTE - 29047 - R				UND	2	2
		BOMBOTE POR LA ENTRADA DE LA HACIENDA SANTA SOFIA - 29100 - R				UND	3	3
		PLANTA TRATAMIENTO CAJITA - 29370 - M				UND	1	1
						SUBTOTAL		33
						VIENEN		
						TOTAL		33

OBSERVACIONES:

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PAGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.			CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO				scp-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA				
CAPITULO:	3		AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)		
ITEM N°.	3,1	DESCRIPCION ITEM	Localización y replanteo	UND	UND

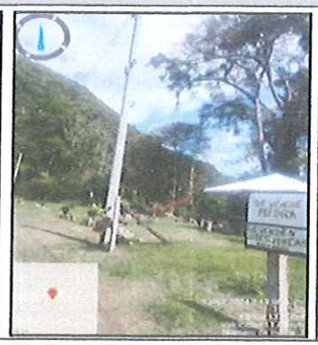
PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	Localizacion y Replanteo				ML	1000	1000
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		1000
					VIENEN		
					TOTAL		1000

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.			CORTE Nº	5	
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO				sep-24	
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA					
CAPITULO:	3		AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)			
ITEM Nº.	3,11		DESCRIPCION ITEM	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y Acompañamiento	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y Acompañamiento				GLB	0,25	0,25
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		0,25
					VIENEN		
					TOTAL		0,25

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PR ESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		sep-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	4	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
ITEM N°.	4,3	DESCRIPCION ITEM	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Vereda La Reforma / 29164				UND	20	20
Vereda La Paz / 29227				UND	15	15
Barrio El Rojas / 29248				UND	15	15
Barrio Galan 1 / 28875				UND	5	5
Barrio Florida / 28719				UND	1	1
Barrio La Herradura /29037				UND	6	6
Via Balso / 29092				UND	2	2
Vereda Arabia / 28142				UND	4	4
Vereda La Reforma / 29182				UND	1	1
Barrio Galan Sector II / 28843				UND	2	2
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				UND		0
				SUBTOTAL		71
				VIENEN		
				TOTAL		71

OBSERVACIONES:

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: PROF. APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
EMPUMELGAR E.S.P.

HACE CONSTAR QUE:

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Melgar E.S.P "EMPUMELGAR E.S.P", Identificada con Nit 809.001.720-4, durante el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2024, la empresa efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, según planillas Febrero 9463991019 (17.612.500,00), Marzo 9464950554 (19.167.400,00), Abril 9466522398 (22.027.800,00) Mayo 9468053747 (21.992.800,00) Junio 9469280805 (21.591.000,00) Julio 9470806507 (22.120.000,00) Agosto 9472175507 (22.072.300,00) para un total de **(146.583.800,00).**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Melgar - Tolima, a los once (11) días del mes de Septiembre del 2024, se expide a solicitud de la Administración Municipal como cuenta de cobro del acta parcial N°05 a la Alcaldía de Melgar del Contrato Interadministrativo 051 del 01 de Febrero de 2024 entre la Alcaldía de Melgar y Empumelgar E.S.P., Cuyo oobjeto: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.**

LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
johanna.toro@empumelgaresp.com
Profesional de apoyo a la Gestión-
Contador TP191173-T

Proyectó: Libia Johanna Toro Herrera- profesional de apoyo a la gestión-11/09/2024
Revisó: Angie Julliet Florez León- profesional de apoyo a la gestión-11/09/2024
Revisó: Miltón Hernán Díaz Ángel-director administrativo y financiero-11/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

CO20/962285

INFORME DE ACITIVIDADES N°5
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 051-2024
ALUMBRADO PUBLICO

DIRECCION TECNICA

MELGAR-TOLIMA
2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1. CONTENIDO

CONTENIDO 2

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVO 4

OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 5

4. AVANCE DE EJECUCIÓN 6

5. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 8

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 11

7. ACTIVIDADES PARA EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . 33

8. RECURSO HUMANO APOYO ALUMBRADO PUBLICO 34

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS MANEJO DE VEGETACIÓN 36

10. VEHICULOS 38

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe de ejecución y avance del contrato interadministrativo N° 051 del 2024 Alumbrado Público tiene como propósito principal ofrecer información detallada del progreso alcanzado en la ejecución en relación con los aspectos técnicos, financieros y administrativos, se destacan cuatro aspectos fundamentales: mantenimiento correctivo y preventivo, modernización, ampliación y optimización. Cada uno de estos aspectos es crucial para garantizar el funcionamiento eficiente y confiable de la infraestructura de alumbrado público, así como para satisfacer las necesidades de la comunidad y promover el desarrollo sostenible de la región.

Adicional en este informe, se analizarán los avances realizados en cada área, destacando las acciones llevadas a cabo, los logros alcanzados y las dificultades en el proceso inicial del contrato interadministrativo N° 051 entre la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P y la Alcaldía Municipal de Melgar Tolima.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 GESTIÓN CERTIFICADA SGS CO20/962285

3. OBJETIVO

Evaluar el progreso y la ejecución del contrato de Alumbrado Público, centrándose en los aspectos de mantenimiento, modernización, ampliación y optimización, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente y confiable del sistema de alumbrado público y satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas durante el periodo establecido, identificando áreas de mejora y proponiendo medidas correctivas según sea necesario.
- Analizar el progreso de las iniciativas de modernización implementadas en el sistema de alumbrado público, incluyendo la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia energética para el Municipio y la calidad de iluminación.
- Evaluar el impacto delas actividades de ampliación del sistema de alumbrado público en términos de cobertura en zona rural del Municipio.
- Analizar los resultados de las acciones de optimización realizadas con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir los mantenimientos correctivos.

Por lo anterior podemos tener una guía a la evaluación exhaustiva del progreso y la ejecución del contrato de alumbrado público, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas y la implementación de mejoras continuas en el sistema.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
CONTRATISTA	EMPUMELGAR E.S.P
SUPERVISION	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
VALOR DEL CONTRATO	$2.891.520.756,77
FECHA INICIO	01 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

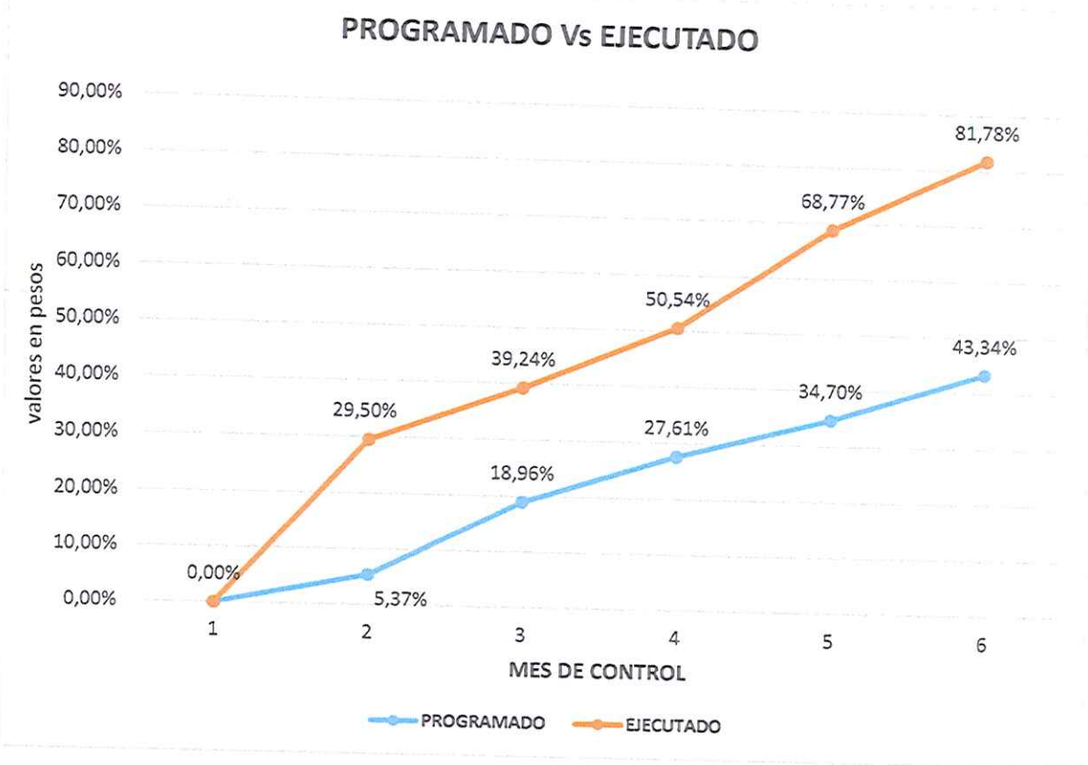
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

6. AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA PRESENTE ACTA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS				EJECUTADO PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	CANT.	AVANCE FISICO	CANT.
I	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO					
1,1	Reparación de lámparas 70w	Und	230,0	-	0%	-
1.2	Reparación de lámparas 150w	Und	230,0	-	0%	-
1.3	Reparación de lámparas 250w	Und	230,0	28,00	12%	190,00
1,4	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1247,4	610,00	49%	259,44
1.5	Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg	Und	10,0	7,00	70%	12,00
1.6	Suministro e instalación de poste de 10m 510Kg	Und	10,0	6,00	60%	4,00
1,7	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W con fotocelda azul	Und	200,0	50,00	25%	59,00
1.8	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W con fotocelda azul	Und	200,0	17,00	9%	99,00
II	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	UNIDAD	CANT.	CANT.	AVANCE FISICO	CANT.
2.1	Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Público Existentes.	Und	370,0	131,00	35%	71,00
2.2	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	Und	100,0	48,00	48%	3,00
2.3	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 80w	Und	160,0	58,00	36%	46,00
2.4	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 150w	Und	120,0	33,00	28%	6,00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO20/962285

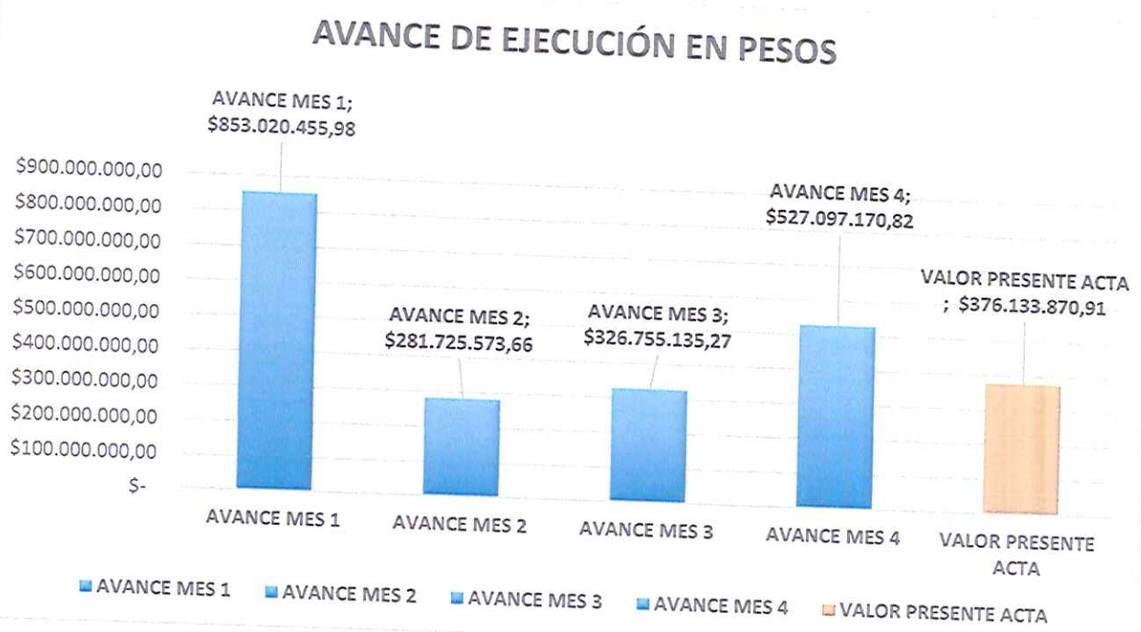


- Actas Parciales

AVANCE DE EJECUCIÓN EN PESOS	
DETALLE	**VALOR**
AVANCE MES 1	$ 853.020.455,98
AVANCE MES 2	$ 281.725.573,66
AVANCE MES 3	$ 326.755.135,27
AVANCE MES 4	$ 527.097.170,82
VALOR PRESENTE ACTA	$ 376.133.870,91
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$2.891.520.756,77**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285



7. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	EJECUTADO A LA FECHA	AVANCE PORCENTUAL
I	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO				
1.1	Reparación de lámparas 70w	Und	230	230	100%
1.2	Reparación de lámparas 150w	Und	230	230	100%
1.3	Reparación de lámparas 250w	Und	230	40	17%
1.4	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1383	1124	81%
1.5	Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg	Und	20	8	40%
1.6	Suministro e instalación de poste de 10m 510Kg	Und	10	6	60%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

1.7	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W con fotocelda azul	Und	200	141	71%
1.8	Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W con fotocelda azul	Und	200	101	51%
II	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS				
2.1	Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	370	299	80,81%
2.2	Suministro e instalación de luminaria led AP (Clasificación M4-M5)	Und	100	97	97,00%
2.3	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3)	Und	150	114	76,00%
2.4	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3) - Vias anchas principales	Und	120	114	95,00%
III	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)				
3.1	Localización y replanteo	Ml	1000	1000	100%
3.2	Excavación de postes y retenidas	Und	33	0	0
3.3	Suministro e instalacion de poste de 10 m 510 kgf	Und	33	0	0
3.4	Pintura para poste de 10m 510 kg	Und	33	0	0
3.5	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	15	0	0
3.6	Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	mts	1000	0	0
3.7	Suministro e instalacion de red de media tensión	mts	150	0	0
3.8	Suministro e instalacion de transformador monofasico	Und	1	0	0
3.9	Suministro e instalacion de luminaria led AP	Und	33	0	0
3.10	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8	0	0
3.11	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento	Glb	1	0,25	25%
IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
4.1	Gastos Administrativos	Glb	0	0	-

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

4.2	Suministro de Elementos de Protección personal y Dotación para cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	0	0	-
4.3	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera autorizada) Manejo de Vegetación redes de Alumbrado Publico	UND	260	260	100%
V	VEHICULOS				
5.1	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1	1	100%
5.2	Alquiler de Vehículo tipo camión doble cabina con grua articulada certificada (capacidad mínima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volcó	Glb	1	1	100%
VI	NO PREVISTOS				
NP 01	Gastos de implementación administrativa y Organizacionales	Glb	1	1	100%
NP 02	Adquisición de Implementos de Protección Personal y Dotación para el Personal	Glb	1	1	100%
NP 03	Servicio de Alquiler de Vehículos para Transporte de Insumos, Materiales y Equipos de Cuadrillas de Alumbrado Público	Glb	1	1	100%
NP 04	Alquiler de Camión Doble Cabina con Grúa Articulada Certificada (capacidad mínima de carga de 3000 kg), Equipado con Canasta, Barreno y Volquete"	Glb	1	1	100%

Es importante resaltar que también se desarrollan actividades de reconocimiento del sector, visitas técnicas, apoyos logísticos institucionales (Alcaldía de Melgar), y actividades como Empumelgar Juntos Construyendo un Mejor territorio.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

REGISTRO FOTOGRAFICO



EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNSTO UN MEJOR TERRITORIO.

APOYO CUADRILLA ALUMBRADO Y DESPEJE DE VEGETACIÓN PARA ACTIVIDAD DE EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR TERRITORIO BARRIO

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1 Reparación de 70W. (N/A)

1.2 Reparación de 150W. (N/A)

1.3 Reparación de 250W.

1,3 REPARACION LUMINARIAS 250W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	KM 5 VIA CARMEN DE APICALA - 29244 - J	UND	1	1
2	CEBORUCO FRENTE CASA DE LA PRESIDENTE JAC - 29271 -J	UND	1	1
3	VEREDA CEBORUCO FINCA BLANCA - 28898 -J	UND	2	2
4	FINCA LA TRINIDAD VEREDA LA PRIMAVERA - 28477 -J	UND	1	1
5	VEREDA EL SALERO EL PALMAR - 29399 - J	UND	1	1
6	MZ A CASA 1 ETAPA 1 EL BOSQUE - 28343 - J	UND	1	1
	BOSQUE MZ A CASA 5 ETAPA III - 27016 - J	UND	1	1
7	VEREDA CHIMBI POSADA CAMPESTRE - 29134 - R	UND	15	15
8	HERRADURA VALLE VERDE - 29036 -M	UND	2	2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO20/862285

9	VEREDA CHIMBI RINCON DE LOS GOMEZ - 29154 -R	UND	1	1
10	GUACAMAYAS AGUA FRIA - 29048 - R	UND	2	2
	TOTAL			28

Registro Fotográfico

1.3 REPARACIÓN DE 250W

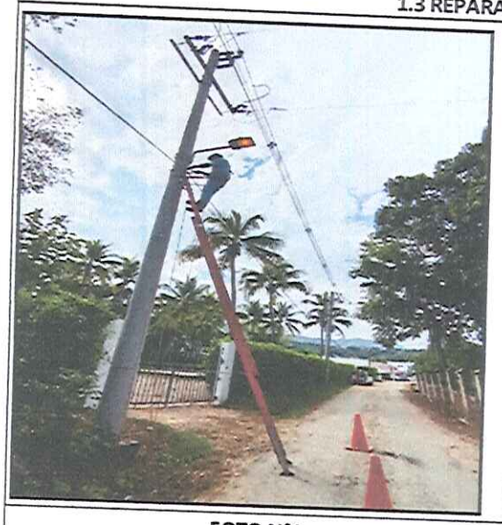


FOTO N°1



FOTO N°2

1.3 REPARACIÓN DE 250W



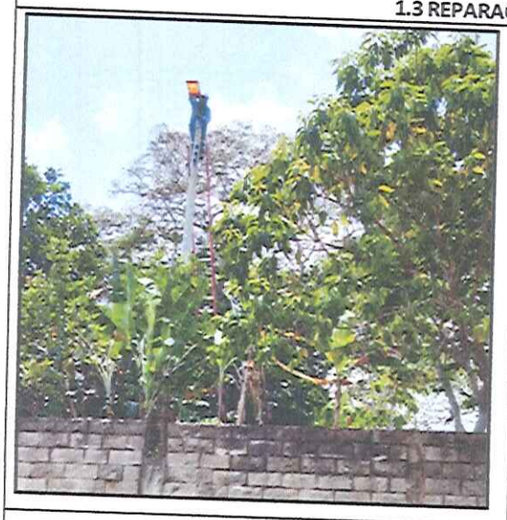
FOTO N°3



FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.3 REPARACIÓN DE 250W	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

1.4 Reparación de Red de baja tensión en cable trenzado

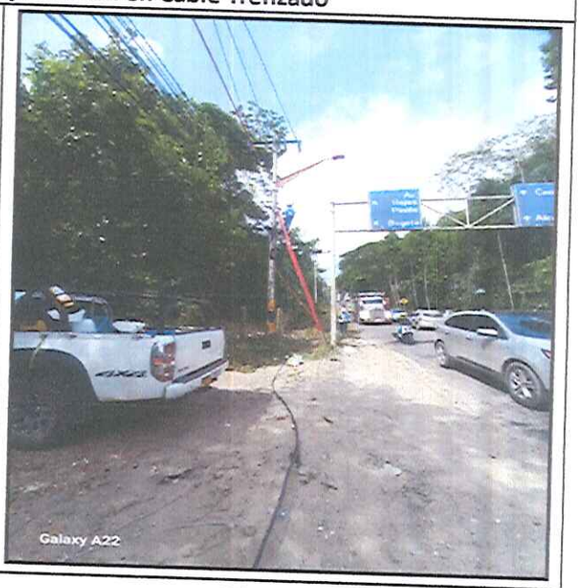
1,4 Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	VEREDA EL SALERO KM 92 - 29351 - J	MTS	104	104
2	CLL 7#50 RESACAS - 29149 - YN	MTS	189	189
3	CRA 50 RESACAS - 29150 - YN	MTS	106	106
4	VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA- 29240 - YN	MTS	30	30
5	VEREDA BOMBOTE - 29047 - R	MTS	50	50
6	VEREDA ARABIA - 29267 - R	MTS	121	121
7	CRA 54 #1-62 RINCONC DEL CARACOLI - 29319 - M	MTS	10	10
TOTAL				610

Registro Fotográfico

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

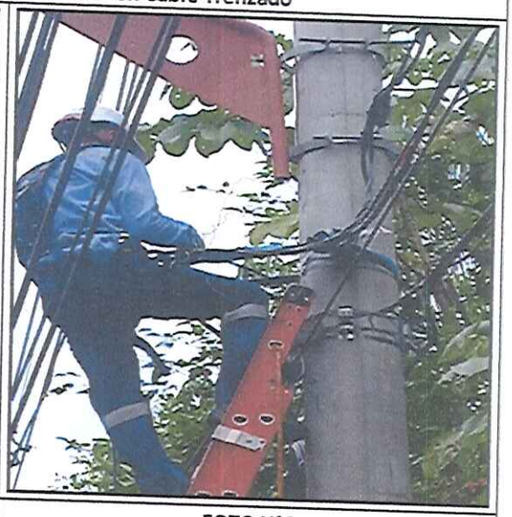
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.4 Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

1.4 Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.4 Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

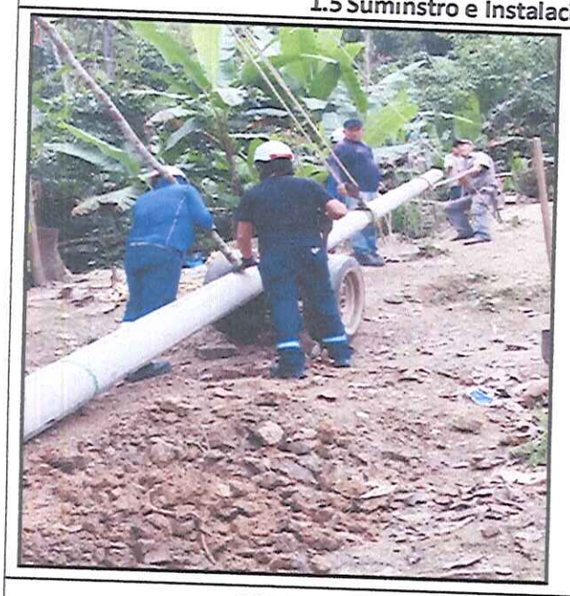
1.5 Suministró e instalación de Poste 8mts 510kg

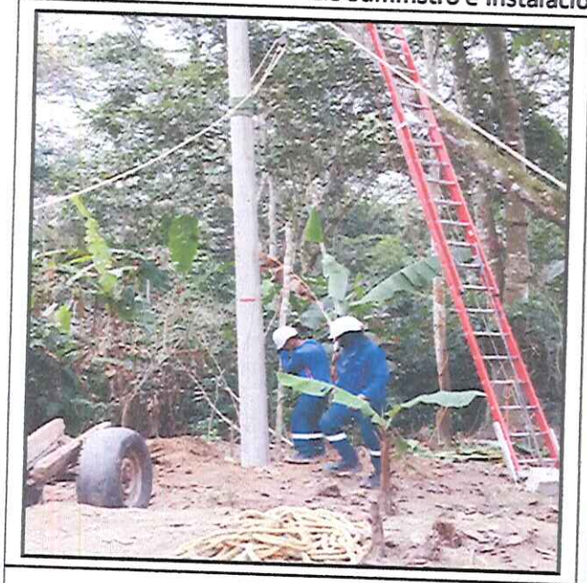
1,5 Suministro e Instalación de Poste de 8mts				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	LA CAJITA QUEBRADITAS II - 29261 - YN	UND	2	2
2	CAJITA SECTOR FINCA SOL Y LUNA - 29285 - YN	UND	3	3
3	VEREDA ARABIA - 29267 - R	UND	2	2
TOTAL				7

Registro Fotográfico

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285

1.5 Suminstro e Instalación de Poste de 8mts 510KG	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

1.5 Suminstro e Instalación de Poste de 8mts 510KG	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

1.5 Suminstro e Instalación de Poste de 8mts 510KG	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

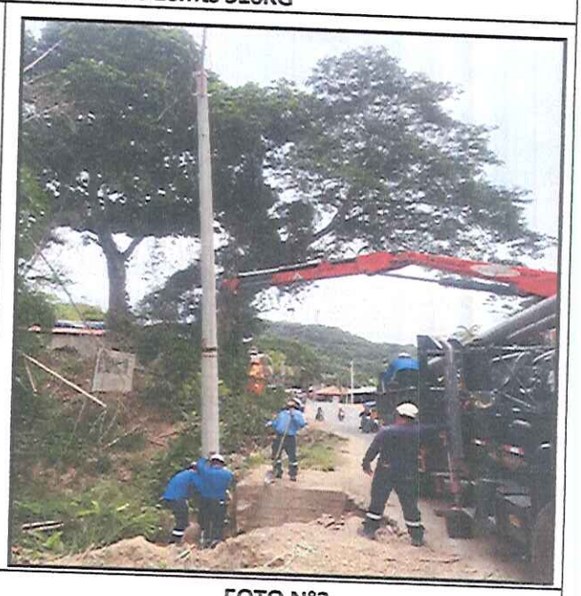
1.6 Suministró e instalación de Poste 10mts 510kg

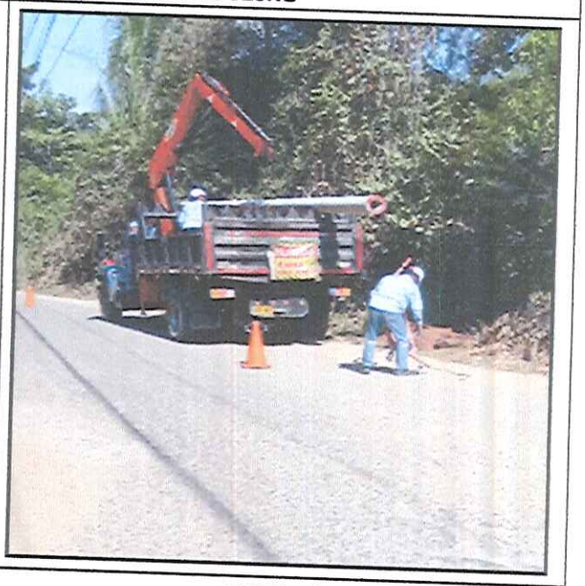
1,6 Suministro e Instalación de Poste de 10mts				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	KM 5 VIA EL CARMEN - 29244 - J	UND	1	1
2	CRA 50 RESACAS - 29150 - YN	UND	4	4
3	BOCATOMA - 29107 - M	UND	1	1
TOTAL				6

Registro Fotográfico

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

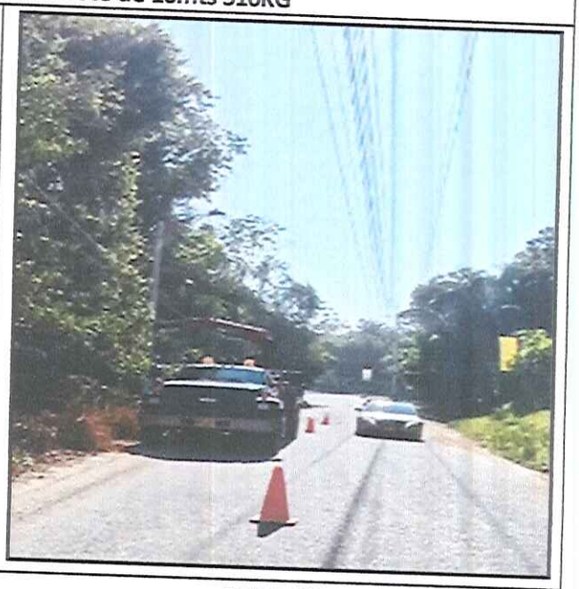
ISO 9001 SGS CO20/962285

1.6 Suminstro e Instalación de Poste de 10mts 510KG	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

1.6 Suminstro e Instalación de Poste de 10mts 510KG	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

1.6 Suminstro e Instalación de Poste de 10mts 510KG	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

1.7 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio de 70W Con fotocelda Azul

1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO 70W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	VEREDA AGUILA BAJA - 28882 - J	UND	1	1
2	VEREDA SAN CRISTOBAL - 27600 - J	UND	2	2
3	VEREDA EL SALERO EL PALMAR - 29399 - J	UND	1	1
4	BOSQUE CLL 14 A N°12C-60 - 28889 - J	UND	1	1
5	HUERTAS CASA 41 - 29342 - J	UND	2	2
6	MZ C CASA 6 ETAPA 3 EL BOSQUE - 27338 - J	UND	1	1
7	EL MIRADOR - 29277 - J	UND	2	2
8	BALNEARIO EL BAMBU SAN CRISTOBAL - 29357 - J	UND	2	2
9	CLL 31#12-2A GALAN - 29417 - YN	UND	1	1
10	VEREDA GUACAMAYAS - 29202 - R	UND	3	3
11	VEREDA BOMBOTE - 29234 - R	UND	2	2
12	VEREDA ARABIA - 29267 - R	UND	1	1
13	VEREDA BOMBOTE - 29047 -R	UND	3	3
14	RINCON DE LOS GOMEZ CHIMBI - 29221 - R	UND	3	3
15	VEREDA CHIMBI RINCON DE LOS GOMEZ - 29154 - R	UND	12	12

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

16	GUACAMAYAS QUINTA LA ESPERANZA - 27735 - R	UND	2	2
17	GUACAMAYAS AGUA FRIA -29048 - R	UND	9	9
18	VEREDA LA REFORMA PARTE BAJA - 28411 - M	UND	1	1
	TOTAL			49

Registro Fotográfico

1.7 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 70W Con Fotocelda Azul



FOTO N°1

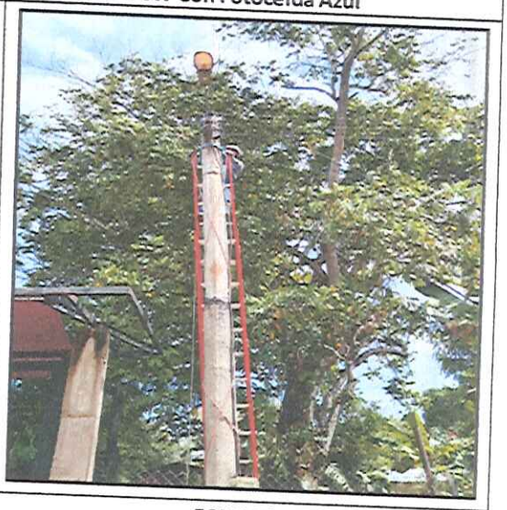


FOTO N°2

1.7 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 70W Con Fotocelda Azul



FOTO N°3

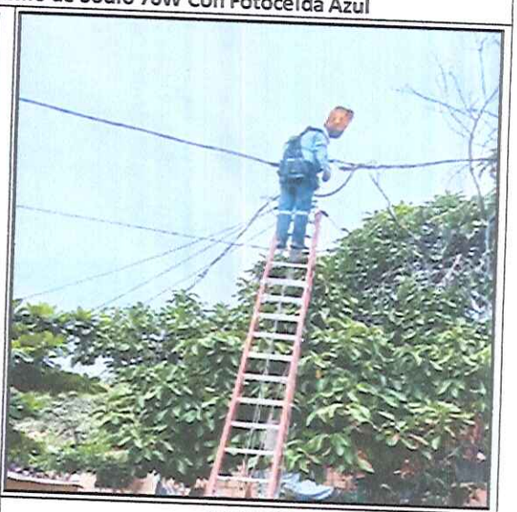
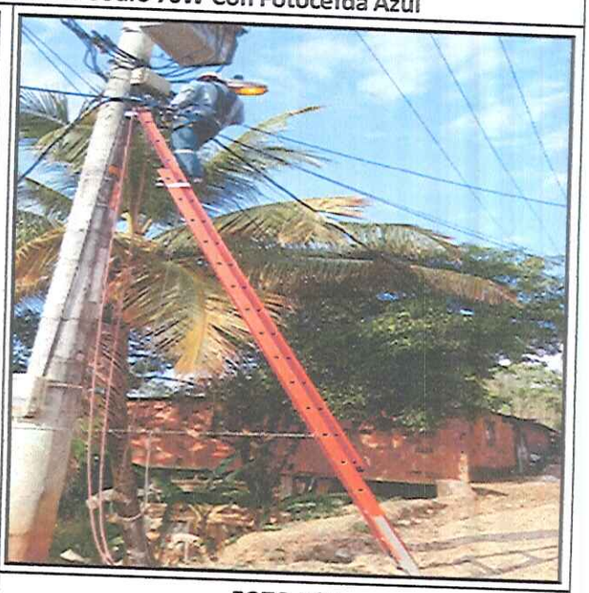


FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.7 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 70W Con Fotocelda Azul	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

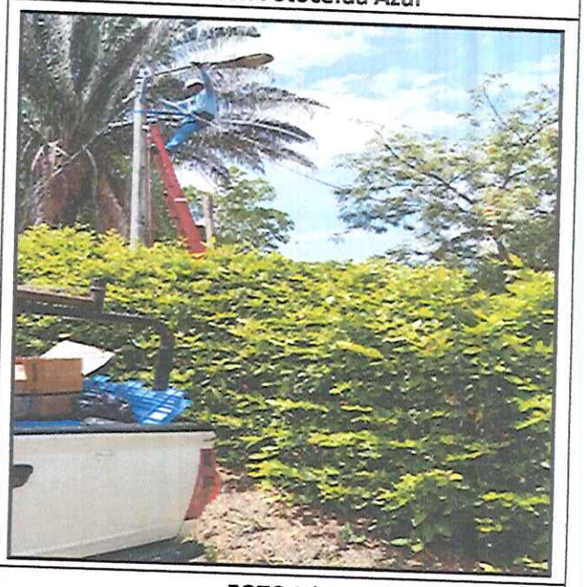
1.8 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio de 150W Con fotocelda Azul

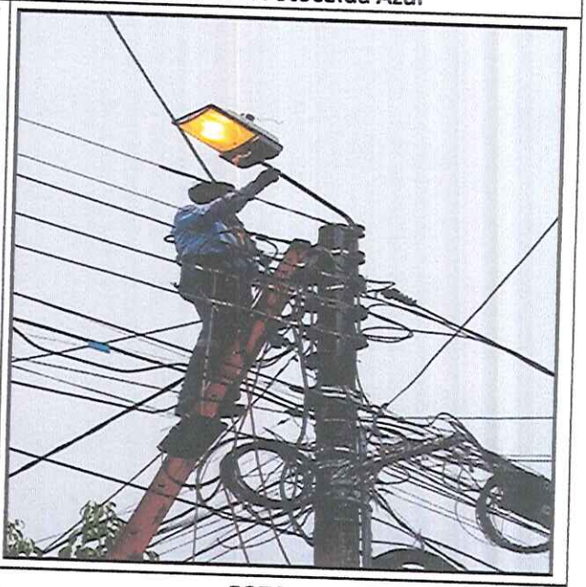
1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO 150W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	VEREDA EL SALERO FINCA EL PALMAR - 28558 - J	UND	1	1
2	VEREDA EL SALERO BOBA TEXACO - 29405 - J	UND	6	6
3	SAN JOSE DE LA COLORADA - 29302 - J	UND	2	2
4	CLL 12#10-76 ICACAL - 29431 - YN	UND	4	4
5	LAGUNA SECTOR LIBERTADORES - 28855 -YN	UND	2	2
6	VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M	UND	2	2
TOTAL				17

Registro fotográfico

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

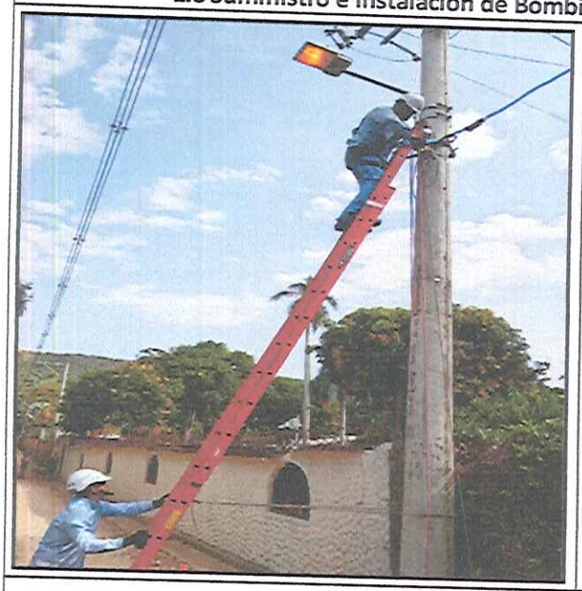
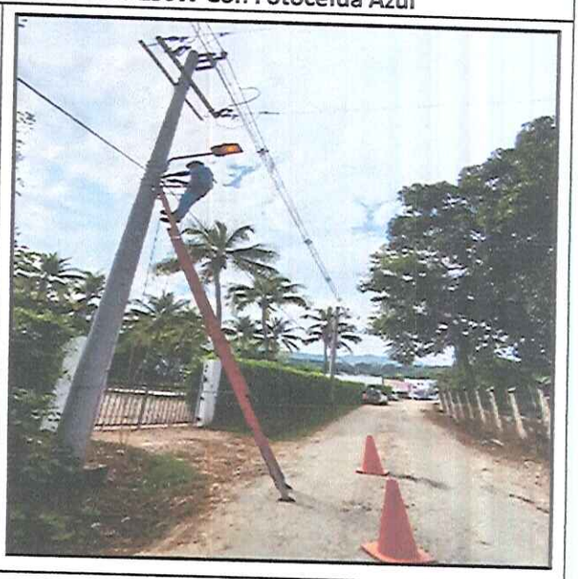
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.8 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 150W Con Fotocelda Azul	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

1.8 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 150W Con Fotocelda Azul	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1.8 Suministro e Instalación de Bombillo de Sodio 150W Con Fotocelda Azul	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

2.1 Desconexión y desmontes de luminarias de Alumbrad Publico Existentes

2,1 Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J	UND	25	25
2	CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J	UND	9	9
3	CLL 12 N°12A-142 ICACAL - 29200 - J	UND	2	2
4	MZ B CASSA 13 ETAPA 3 EL BOSQUE - 28905 - J	UND	1	1
5	ROJAS PINILLA DIAGONAL 12 CASA 81 - 29205 - J	UND	2	2
6	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR VILLA SAMARIA - 29247 - J	UND	2	2
7	CRA 50 RESACAS - 29150 - YN	UND	8	8
8	CRA 11 B #7C - 101 FLORIDA PARABOLICA - 29243 - YN	UND	2	2
9	VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA - 29240 - YN	UND	3	3
10	VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN	UND	3	3
11	MZ A CASA 4 V/CARMENZA - 29449 - YN	UND	1	1
12	CRA 16#7B-60 VERSALLES - 27033 - YN	UND	1	1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

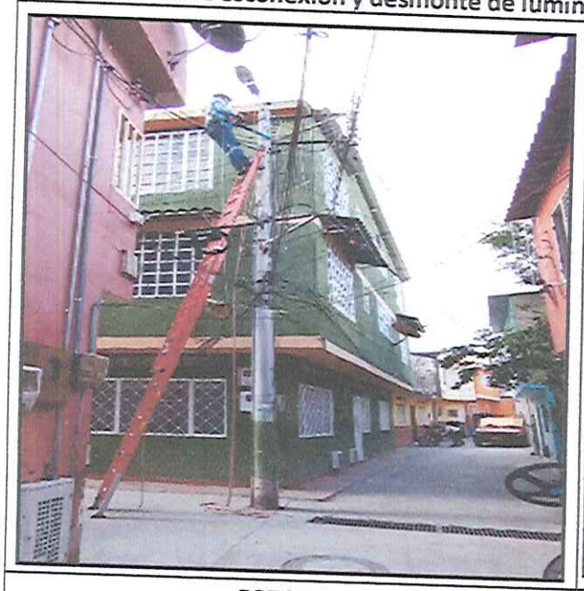
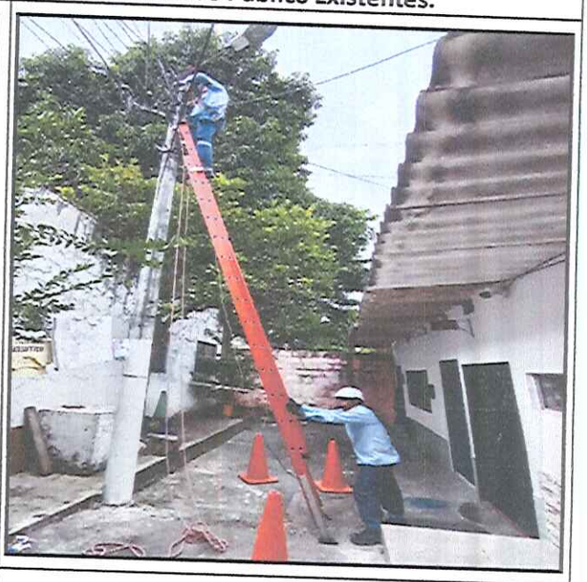
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

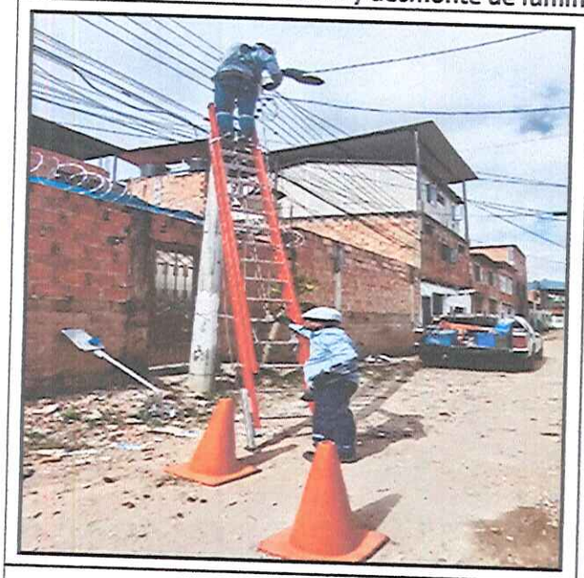
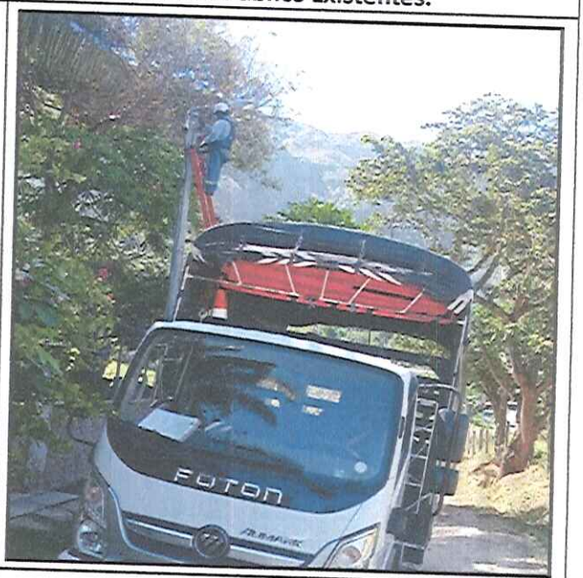
13	CRA 27B #11A - 28 GALAN - 29332 - YN	UND	1	1
14	VEREDA BOMBOTE - 29047- R	UND	8	8
15	VEREDA INALI SECTOR LA ESCUELA - 29195 - R	UND	1	1
16	VEREDA BUENA VISTA - 29206 - R	UND	2	2
17	BARRIO LA PAZ - 28668 - R	UND	8	8
18	BARRIO LA PAZ ANTES DEL PORTON LA ACADEMIA - 28445 - R	UND	9	9
19	VEREDA BOMBOTE - 29234 -R	UND	1	1
20	VIA AL BALSO LOS RUISEÑORES - 28570 - R	UND	1	1
21	VILLA CARACOLI CASA 5 - 29059 - R	UND	2	2
22	VEREDA BOMBOTE - 29047 - R	UND	2	2
23	VEREDA BOMBOTE - 29234 -R	UND	4	4
24	BOMBOTE POR LA ENTRADA DE LA HACIENDA SANTA SOFIA - 29100 - R	UND	3	3
25	BOCATOMA - 29107 - M	UND	3	3
26	VEREDA LA REFORMA EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR TERRITORIO - 29158 - M	UND	7	7
27	VEREDA LA REFORMA - 29173 - M	UND	2	2
28	VEREDA LA REFORMA SECTOR LOS BELLOS - 29179 - M	UND	2	2
29	SECTOR SIROMA CUALAMANA - 29354 - M	UND	1	1
30	PTAP EMPUMELGAR - 29262- M	UND	7	7
31	VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M	UND	4	4
32	CENTRO CRA 26N°2-75 - 27018 - M	UND	2	2
33	CRA 28 N°5-22 CENTRO - 28848 - M	UND	1	1
34	CLL 5 N°37-06 SICOMORO - 29341 - M	UND	1	1
TOTAL				131

Registro fotográfico

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285

2.1 Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

2.1 Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

2.1 Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.

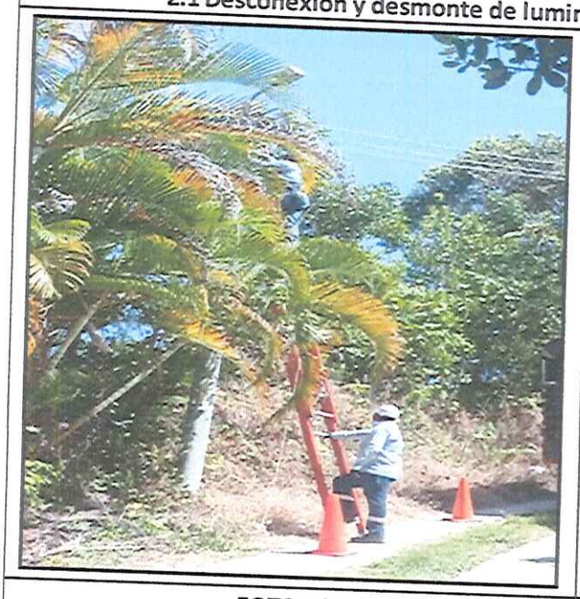


FOTO N°5



FOTO N°6

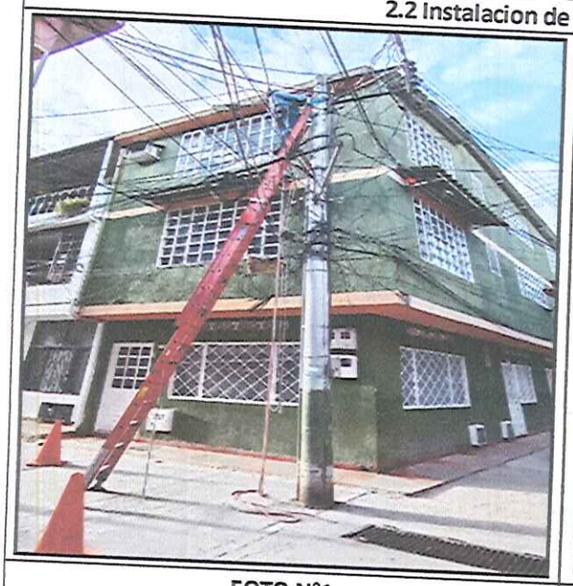
2.2 Suministro e Instalación Luminaria Led 40W

2,2 Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5) LED 40W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J	UND	16	16
2	CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J	UND	8	8
3	CLL 2A N 27-56 LAS VEGAS - 29178 - J	UND	1	1
4	CLL 12 N°12A-142 ICACAL - 29200 - J	UND	2	2
5	VEREDA BOMBOTE - 29047 - R	UND	5	5
6	VEREDA BUENA VISTA - 29206 - R	UND	2	2
7	BOCATOMA EMPUMELGAR - 29107 - M	UND	3	3
8	VEREDA LA REFORMA EMPUMELGAR CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR TERRITORIO - 29158 - M	UND	8	8
9	VEREDA LA REFORMA - 29173 - M	UND	1	1
10	SECTOR SIROMA CUALAMANA - 29354 - M	UND	2	2
TOTAL				48

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS CO20/962285

Registro fotográfico

2.2 Instalacion de Luminaria Led 40w	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

2.2 Instalacion de Luminaria Led 40w	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

2.2 Instalacion de Luminaria Led 40w

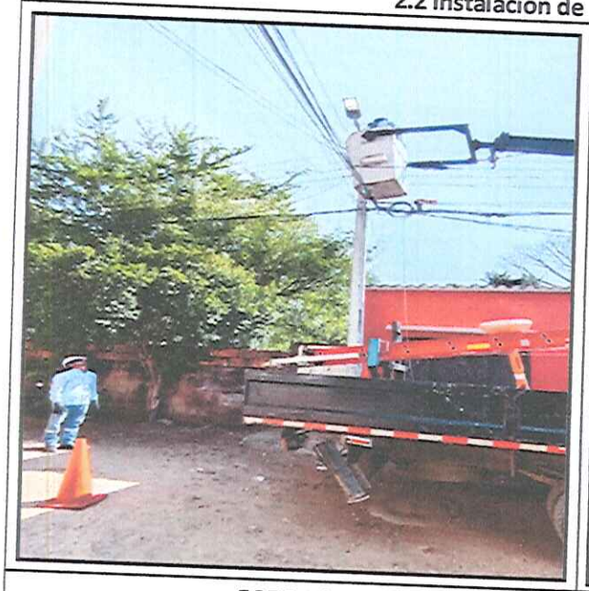


FOTO N°5

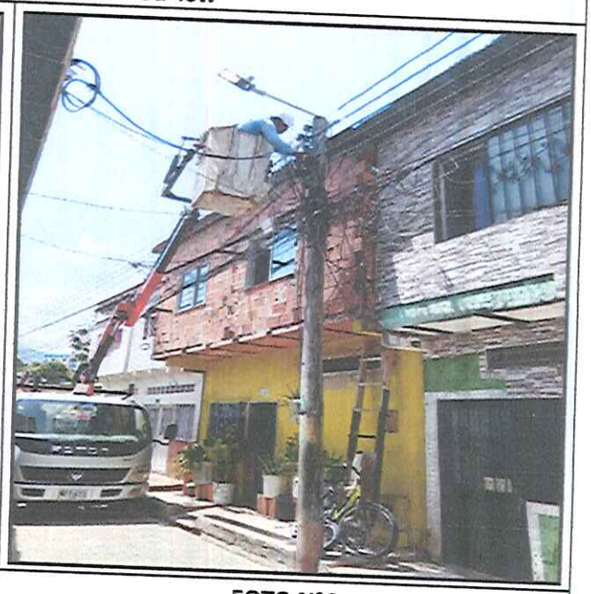


FOTO N°6

2.3 Suministro e Instalación Luminaria Led 80W

2,3 Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificación M4-M5) LED 80W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	CLL 1A #27-90 LAS VEGAS - 29129 - J	UND	6	6
2	CLL 1A #27-9 LAS VEGAS - 29165 - J	UND	1	1
3	CLL 2A N 27-56 LAS VEGAS - 29178 - J	UND	2	2
4	CRISTALES FRENTE A FUERZA AEREA - 29194 -J	UND	1	1
5	MZ B CASA 13 ETAPA 3 EL BOSQUE - 28905 - J	UND	1	1
6	CRA 50 #7-229 ALFONSO URIBE - 28801 -J	UND	2	2
7	ROJAS PINILLA DIAGONAL 12 CASA 81 - 29205 - J	UND	2	2
8	CRA 11B #7C - 101 FLORIDA PARABOLICA - 29243 - YN	UND	2	2
9	VEREDA MALACHI SECTOR LA BASCULA - 29240 - YN	UND	4	4
10	VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN	UND	1	1
11	MZ A CASA 4 VILLA CARMENZA - 29449 - YN	UND	1	1
12	VEREDA LA CAJITA - 29450 - YN	UND	1	1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

13	CRA 27 B #11A - 28 GALAN - 29332 - YN	UND	1	1
14	VEREDA BOMBOTE - 29047 - R	UND	3	3
15	VEREDA INALI SECTOR LA ESCUELA - 29195 - R	UND	1	1
16	BARRIO LA PAZ - 28668 - R	UND	8	8
17	BARRIO LA PAZ ANTES DEL PORTON LA ACADEMIA - 28445 - R	UND	1	1
18	VEREDA BOMBOTE - 29234 - R	UND	1	1
19	VEREDA ARABIA - 29267 - R	UND	1	1
20	BOCATOMA EMPUMELGAR - 29107 -M	UND	4	4
21	VEREDA LA REFORMA PARTE BAJA- 28411 - M	UND	1	1
22	PTAP EMPUMELGAR - 29262 - M	UND	6	6
23	VEREDA AGUILA MEDIA - 29268 - M		3	3
24	CENTRO CRA 26 N°2-75 - 27018 - M	UND	2	2
25	CRA 28 N°5-22 CENTRO - 28848 - M	UND	1	1
26	CLL 5 N°37-06 SICOMORO - 29341 - M	UND	1	1
TOTAL				58

Registro fotográfico

2.3 Instalacion de Luminaria Led 80w

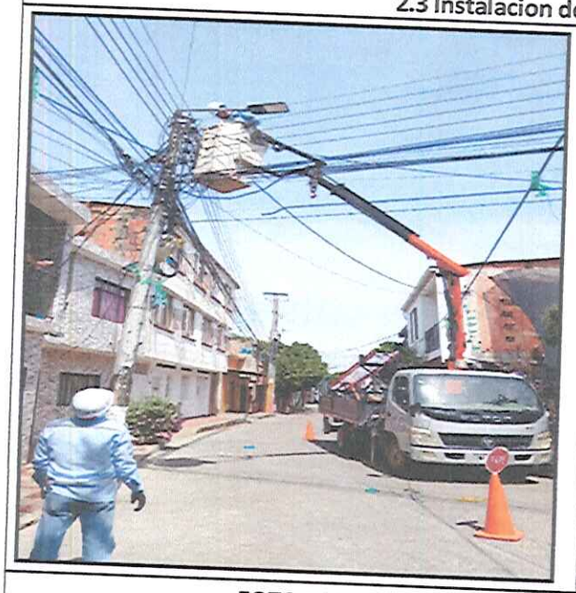


FOTO N°1



FOTO N°2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/862285

2.3 Instalacion de Luminaria Led 80w	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

2.3 Instalacion de Luminaria Led 80w	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

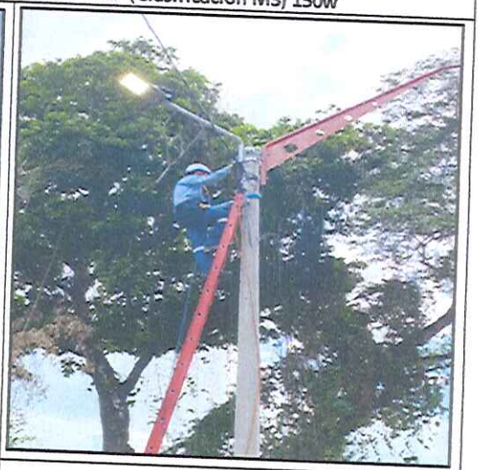
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

2.4 Suministro e Instalación Luminaria Led 150W

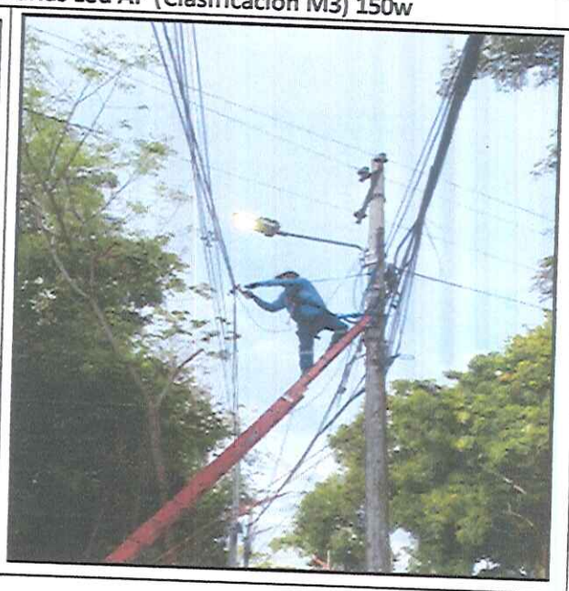
2,4 Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5) LED 150W				
ID	LOCALIZACION	UND	CANT	CANT TOTAL
1	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR VILLA SAMARIA - 29247 -J	UND	2	2
2	VEREDA SAN CRISTOBAL - 28857 - J	UND	1	1
3	CRA 50 RESACAS - 29150 - YN	UND	13	13
4	CRA 50 RESACAS - 29228 - YN	UND	2	2
5	VILLA RECREO ETAPA 1 Y 2 - 29275 - YN	UND	2	2
6	LA CAJITA 2 SECTOR QUEBRADITAS - 29298 - YN	UND	1	1
7	TANQUE DE BOMBEO - 29437 - YN	UND	1	1
8	CRA 16 #7B-60 VERSALLES - 27033 - YN	UND	1	1
9	VIA AL BALSO LOS RUISEÑORES - 28570 - R	UND	1	1
10	VILLA CARACOLI CASSA 5 - 29059 - R	UND	2	2
11	SICOMORO CRA 33 N° 28 - 05 - 29274 - R	UND	1	1
12	VEREDA BOMBOTE - 29047 - R	UND	2	2
13	BOMBOTE POR LA ENTRADA DE LA HACIENDA SANTA SOFIA - 29100 - R	UND	3	3
14	PLANTA TRATAMIENTO CAJITA - 29370 - M	UND	1	1
TOTAL				33

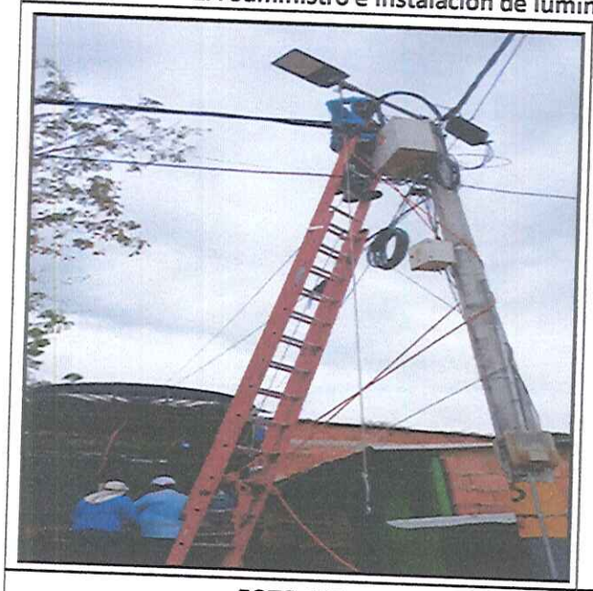
Registro fotográfico

2.4 Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 150w	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/862285

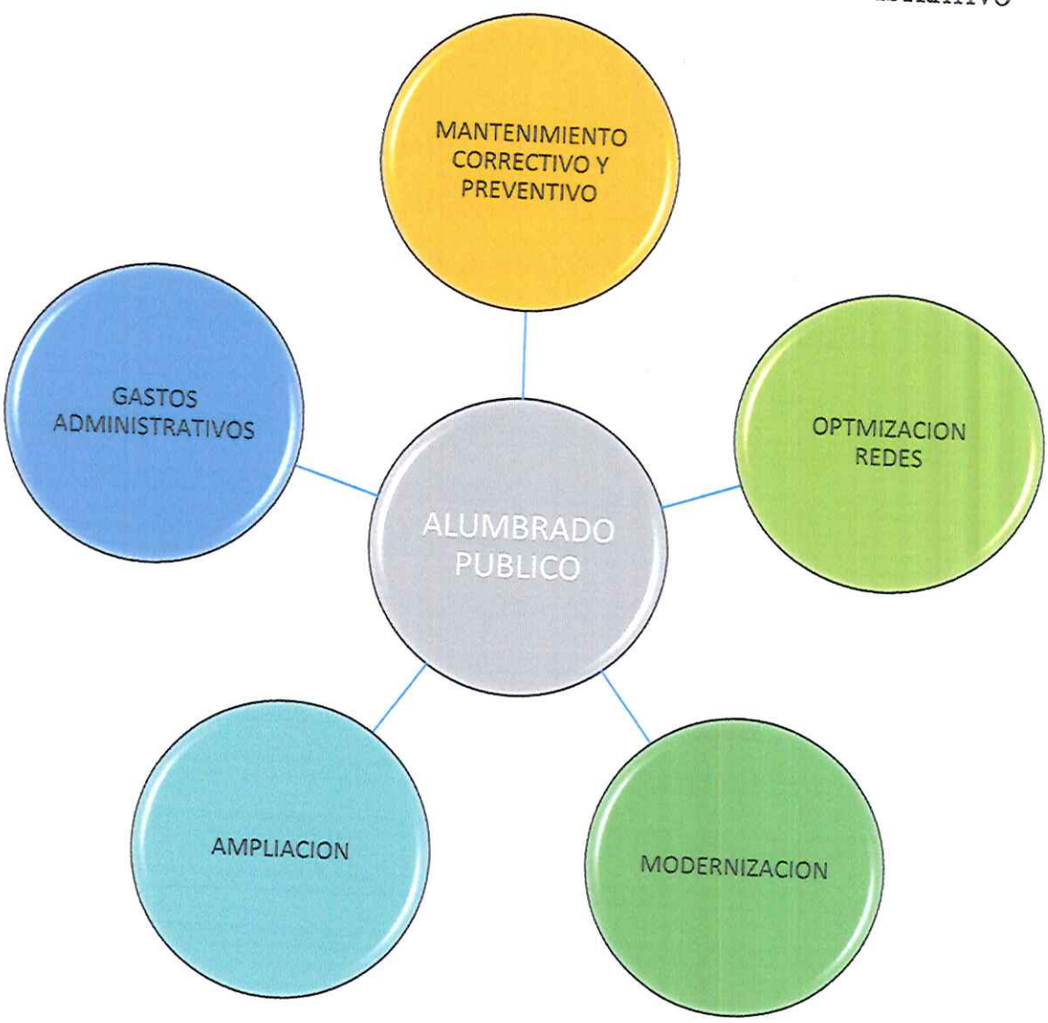
2.4 Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 150w	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

2.4 Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3) 150w	
	
FOTO N°5	FOTO N°6

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

9. ACTIVIDADES PARA EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

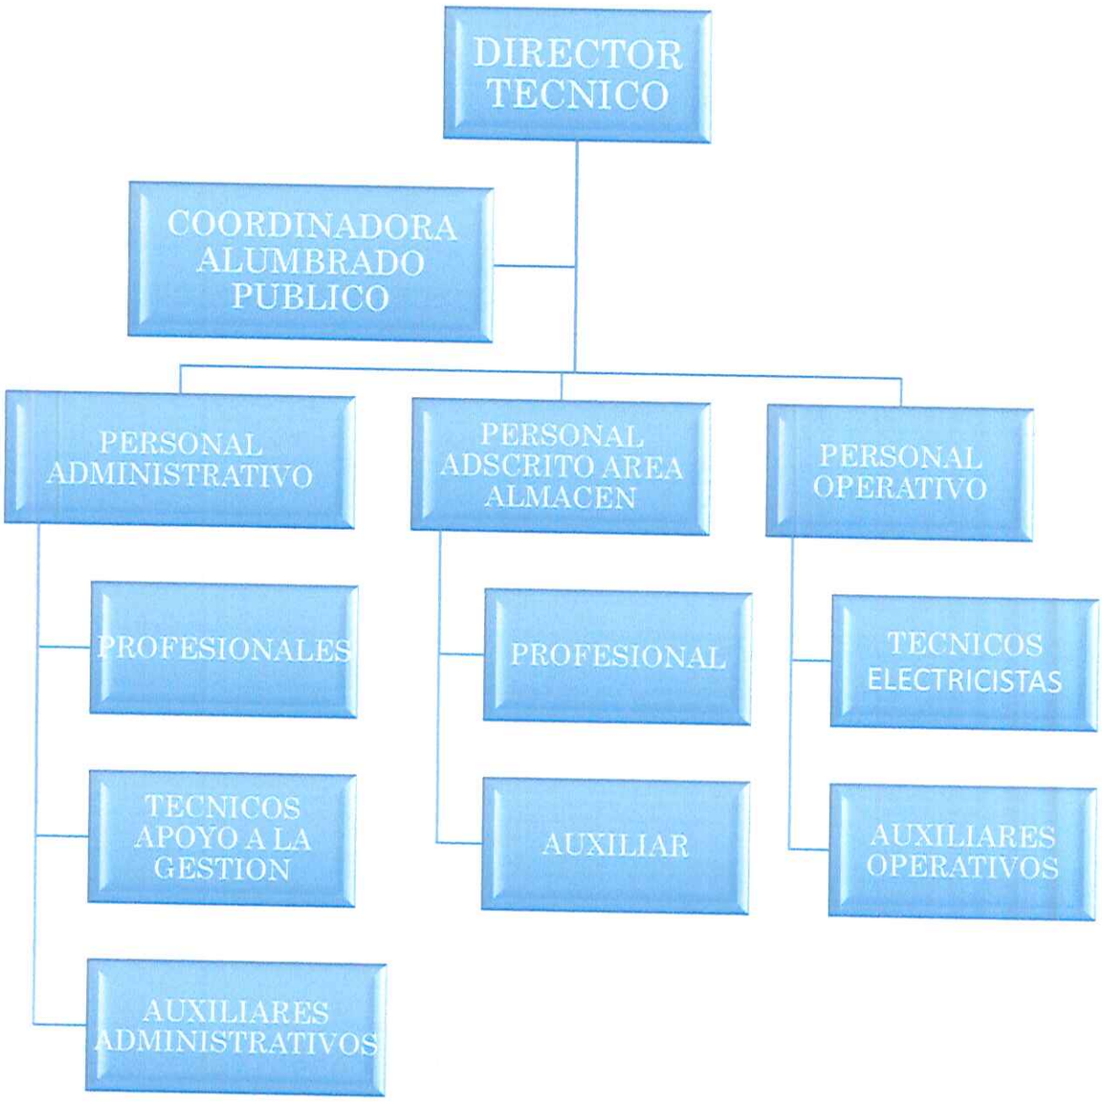


Fuente: Empumelgar e.s.p

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS CO20/962285

10. RECURSO HUMANO APOYO ALUMBRADO PUBLICO



Fuente: Empumelgar e.s.p

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

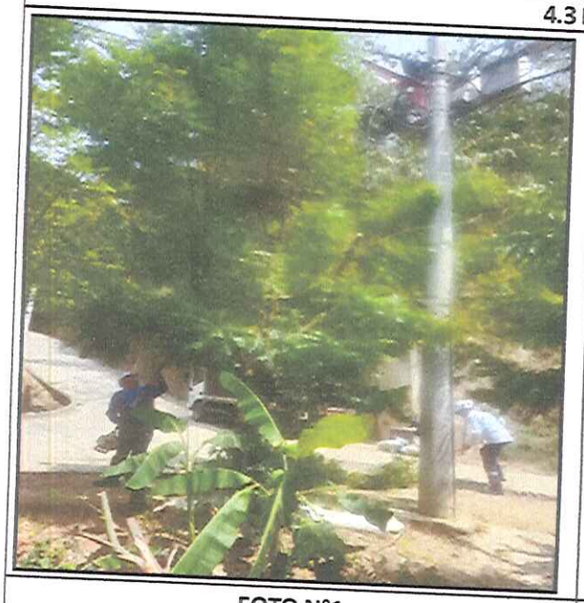
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

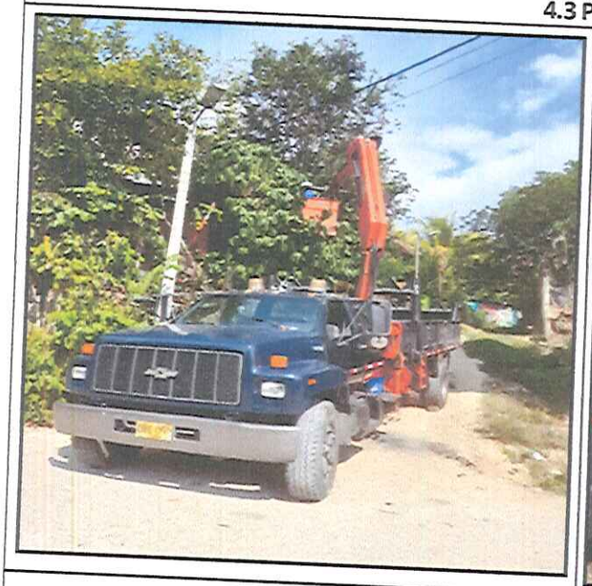
PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO 2024		
N°	NOMBRE	CARGO
1	AGUILAR MORALES YINETH	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
2	ARBOLEDA X HELLEN PILAR	ASISTENTE CUMPLI MISION
3	AREVALO GALINDO LEONARDO ALFONSO	OPERARIO AUXILIAR MISION
4	AREVALO PANTOJA MARY LUZ	TECNICO DE APOYO A LA GESTION
5	BARAHONA OSORIO HECTOR FABIAN	OPERARIO AUXILIAR MISION
6	BLANCO RODRIGUEZ YNDER MAN	TECNICO OPERATIVO MISION
7	CASTELBLANCO BAUTISTA MANUEL ANDRES	TECNICO OPERATIVO MISION
8	CORTES MARTINEZ CESAR OSWALDO	OPERARIO AUXILIAR MISION
9	CUELLAR X HELVER	ASISTENTE CUMPLI MISION
10	CUEVAS MONTEALEGRE CRISTIAN CAMILO	OPERARIO AUXILIAR MISION
11	DIAZ CAICEDO LEIDY PAOLA	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
12	ELIZALDEZ HURTADO JOSE WILLINGTON	OPERARIO AUXILIAR MISION
13	ESPINOSA BARRERO LUIS OCTAVIO	OPERARIO AUXILIAR MISION
14	FERNANDEZ CALIMAN OSCAR ENRIQUE	OPERARIO AUXILIAR MISION
15	GARCIA MUR ANDRES FELIPE	OPERARIO AUXILIAR MISION
16	GUALTEROS RODRIGUEZ ALEX	OPERARIO AUXILIAR MISION
17	GUZMAN ROBLEDO JORGE ORLANDO	TECNICO OPERATIVO MISION
18	HERNANDEZ X MAURICIO ALEXANDER	OPERARIO AUXILIAR MISION
19	LLANOS RUIZ LIZET VALENTINA	PROFESIONAL MISION
20	MENDEZ ORTIZ FERNANDO	OPERARIO AUXILIAR MISION
21	ORTIZ MONROY JOSE JAVIER	OPERARIO AUXILIAR MISION
22	PARRA CASTRO RAFAEL ANTONIO	TECNICO OPERATIVO MISION
23	PERILLA COBOS MONICA MARIA	ASISTENTE CUMPLI MISION
24	PINZON SUAREZ PATROCINIO	OPERARIO AUXILIAR MISION
25	PRECIADO GONZALEZ LUIS ALBERTO	OPERARIO AUXILIAR MISION
26	REYES CADENA MARCOS AURELIO	OPERARIO AUXILIAR MISION
27	RICO ZABALA VICTORIA EUGENIA	ASISTENTE CUMPLI MISION
28	RIVERA RODRIGUEZ SHIRLEY JOHANNA	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
29	RIVEROS QUINTERO SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
30	ROJAS RICO MAURICIO	OPERARIO AUXILIAR MISION
31	RUIZ MOLINA CATHERINE	PROFESIONAL MISION
32	SALAZAR VARGAS DANY	OPERARIO AUXILIAR MISION
33	SANCHEZ PATARROYO JOSE MANUEL	OPERARIO AUXILIAR MISION
34	SANCHEZ PEDREROS VALENTINA	PROFESIONAL MISION
35	VASQUEZ MARIA DEL PILAR	TECNICO DE APOYO A LA GESTION

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS CO20/962285

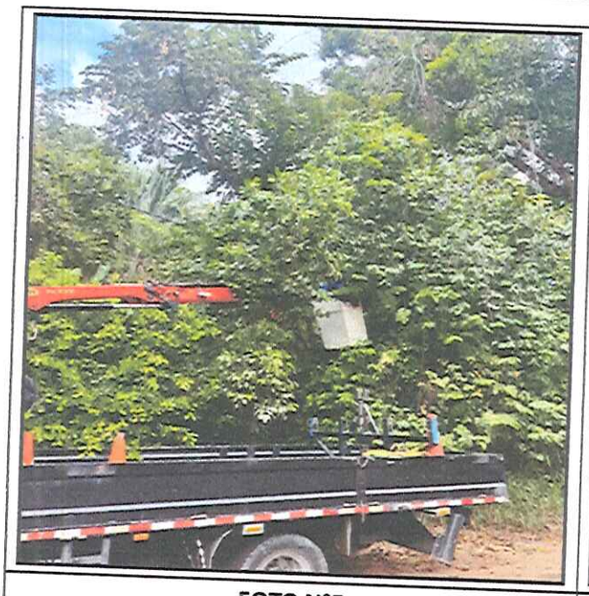
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís
SGS CO20/962285

4.3 PODA	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

4.3 PODA	
	
FOTO N°3	FOTO N°4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

	
FOTO N°5	FOTO N°6

12. VEHICULOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 026 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y UN MILLONES QUINIESTOS MIL PESOS M/CTE ($71.500.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO VEHICULO
MARCA: Mazda BT 50
PLACA: HDR 343
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10020782641
AÑO: 2014
NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR TORRES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 027 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: JOSE EFRAIN CASTRO OBANDO

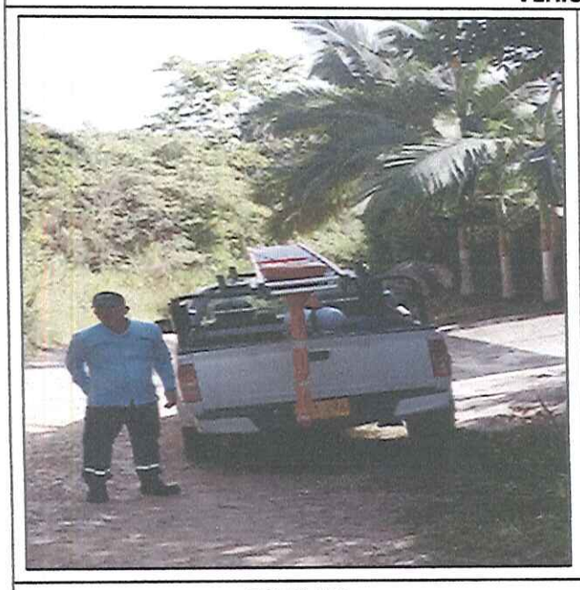
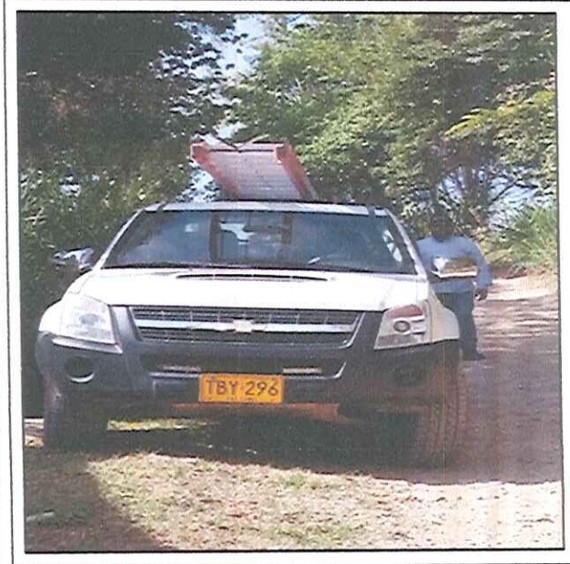
VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y UN MILLONES QUINIESTOS MIL PESOS M/CTE ($71.500.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS CO20/962285

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO VEHICULO
MARCA: Chevrolet LUV DMAX
PLACA:
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10023624188
AÑO: 2011
NOMBRE DEL CONDUCTOR: LIBARDO SÁNCHEZ CHÁVEZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 029 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: EDUAR SEBASTIAN QUEVADO ESPITIA

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($81.600.000)

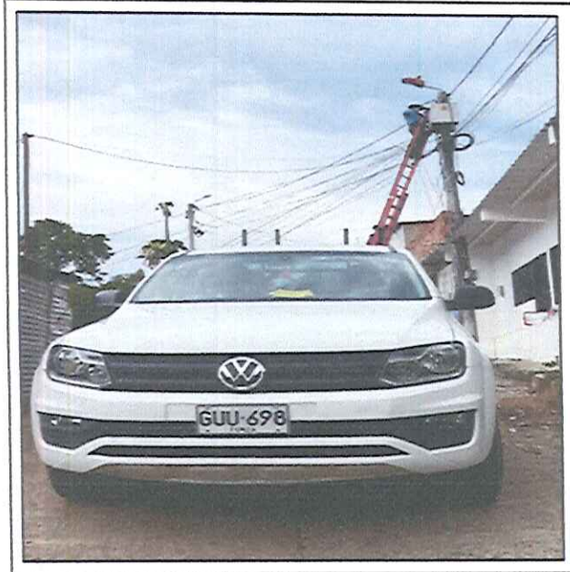
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO VEHICULO
MARCA: VOLKSWAGUEN AMAROKTRENDLINE
PLACA: GUU698
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10020468674
AÑO: 2014
NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDWARD SEBASTIÁN QUEVEDO ESPITIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 028 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: YIASID MARTIN RODRIGUEZ DAVILA

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.900.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO CAMIONETA TIPO ESTACAS CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR Y EMPRESA DE SERVICIO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

PUBLICO EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OPERACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO CAMION FOTON
MARCA: FOTON BJ044V9JD4-F1
PLACA: JVM020
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10022263821
AÑO: 2021
NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS EDUARDO PEDREROS RODRÍGUEZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 033 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: GRUPO INCA

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000)

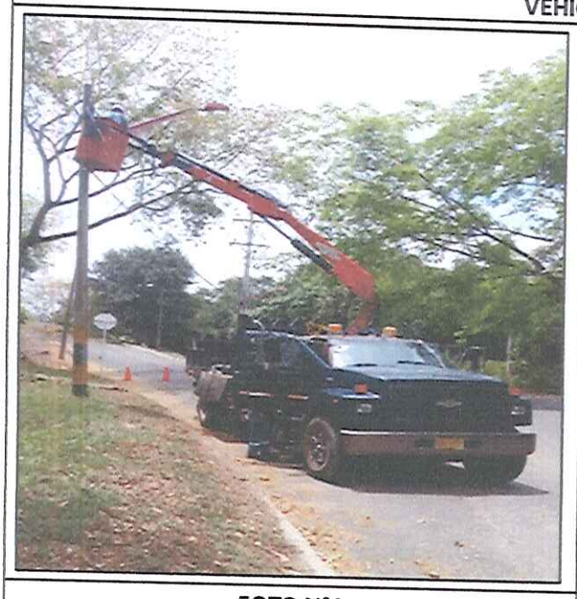
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE GRAN DIMENSION, EN UN VEHICULO TIPO GRUA – PLATAFORMA – DOBLE CABINA, CON SERVICIOS DE BRAZO HIDRAULICO CERTIFICADO, CANASTA PARA TRABAJOS EN ALTURAS,

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS CO20/962285

BARRENO PARA APERTURA DE HOYOS, VOLCO Y OPERADOR - CONDUCTOR, CON EL FIN DE APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No-I 051 01 FEBRERO DE 2024, Y A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO CAMION FOTON
MARCA: KODIAK
PLACA: OBE - 050
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10021423835
AÑO: 1997
NOMBRE DEL CONDUCTOR: DORIAN AGUDELO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 032 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: GRUPO INCA

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000)

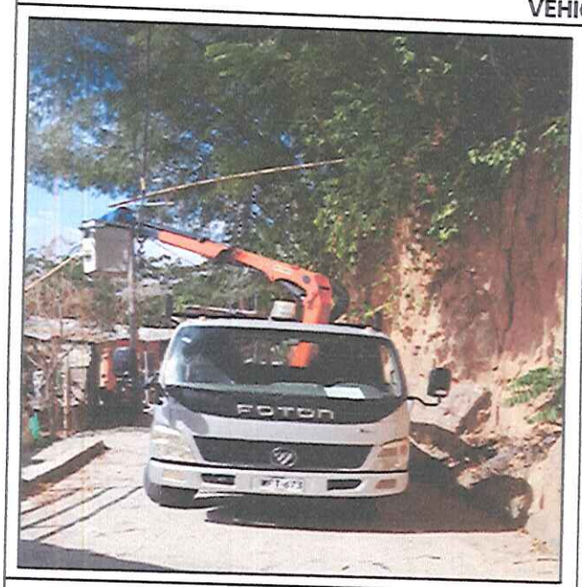
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE GRAN DIMENSION, EN UN VEHICULO TIPO GRUA – PLATAFORMA – DOBLE CABINA, CON SERVICIOS DE BRAZO HIDRAULICO CERTIFICADO, CANASTA PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BARRENO PARA APERTURA DE HOYOS, VOLCO Y OPERADOR - CONDUCTOR, CON EL FIN DE APOYAR

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No-I 051 01 FEBRERO DE 2024, Y A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO GRUA-PLATAFORMA
MARCA: FOTON
PLACA: WFT673
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10009772526
AÑO: 2015
NOMBRE DEL CONDUCTOR: NELSON QUEVEDO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285

13. RELACION DE CONTRATACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO N°	OBJETO	VALOR	ESTADO
ORDEN DE SERVICIO N° 001 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024	Orden de servicio para la realización de examenes medicos ocupacionales de ingreso y periodicos para el personal administrativo y operativo vinculado al contrato interadministrativo n°051 del 01 febrero del 2024 suscrito con la alcaldia municipal de Melgar y la Empresa de Servicios Publicos EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR	$ 2.956.000,00	EJECUTADO
ORDEN DE COMPRA N° 01 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024	Orden de Compra para el Suministro de Papelería para las actividades administrativas enmarcadas dentro del contrato interadministrativo N° 051 del 01 de febrero del 2024- entre Alcaldía de Melgar y la empresa de servicios públicos de melgar Empumelgar E.S.P	$ 10.300.000,00	EJECUTADO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO N° 057 DEL 27 DE MARZO DEL 2024	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS LOS INSUMOS, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA LOCALIZADA EN EL POLIDEPORTIVO COLISEO LAS VEGAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C-I 051 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 y DE ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA CON ARMAS NO LETALES).	$ 153.000.000,00	EN EJECUCION
CONTRATO N° 059 DEL 27 DE MARZO DEL 2024	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EPP PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 051 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.	$58'589.977,25	EJECUTADO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

ISO 9001 SGS CO20/962285

ORDEN DE COMPRA N° 03 DEL 15 DE ABRIL DEL 2024	ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 051 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024- ENTRE ALCALDIA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR ESP.	$14.000.000.00	EJECUTADO
CONTRATO N° 064 DEL 20 DE ABRIL DEL 2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, CONFORME A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 051 01 FEBRERO DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.	$646'106.037,5	EJECUTADO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO N° 066 DEL 21 DE MAYO DEL 2024	CONTRATO DE SUMINISTRO DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 051 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.	$32'114.096	EN EJECUCION
CONTRATO N° 073 DEL 08 DE JULIO DEL 2024	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PERTENECIENTE AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO N°051 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P	$7'000.000.00	EN EJECUCION

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ICONTEC CERTIFICACIÓN ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO N° 80 DEL 23 DE JULIO DEL 2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEMELGAR TOLIMA.	$28'691.495	EJECUTADO
CONTRATO N° 102 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONTINUIDAD EFECTIVA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 051 DE 01 DE FEBRERO DE 2024SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. EL CUAL TIENE POR OBJETO DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	$115'755.822	EN EJECUCION

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO N° 107 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS, FOTOMETRICOS, TRAMITES PERTINENTES CON EL OPERADOR DE RED, LOCALIZACION- REPLANTEO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA EJECUCIÓN, PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 051 de 2024	$36'700.000	EN EJECUCIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Lizet Valentina Llanos Ruiz	Jhon Freddy Suarez Betancourth	Jhon Freddy Suarez Betancourth
FIRMA:			
CARGO:	Profesional Cumplimiento Mision	Director Técnico	Director Técnico
FECHA:	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

ISO 9001 SGS CO20/962285
