	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 2313-2314-2315-2696-3024-3042-3064-3066 **Contratista:** COOP. COLONOS- COOP. LEJANOS-COOP. CENTRAL VIAS LETICIA - COOP. SUREÑA

Contrato de Interventoría No. 2702 **Interventoría:** CONSORCIO SLG VIAL

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** septiembre-2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		11
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		15
3.1.	**Contrato 2313 de 2019**		15
3.1.1.	Información general del contrato		15
3.1.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		16
3.1.3.	Seguimiento indicadores		16
3.1.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
3.2.	**Contrato 2314-1 de 2022**		16
3.2.1.	Información general del contrato		16
3.2.2.	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		16
3.2.3.	Seguimiento indicadores		17
3.2.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
3.3.	**Contrato 2315-1 de 2022**		17
3.3.1.	Información general del contrato		17
3.3.2.	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		17
3.3.3.	Seguimiento indicadores		17
3.3.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
3.4.	**Contrato 1421 de 2023**		18
3.4.1.	Información general del contrato		18
3.4.2.	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		18
3.4.3.	Seguimiento indicadores		18
3.4.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		18
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	42
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	51
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	59
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	60
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**		68
5.1	Información general del contrato		68
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		68
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		91
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	92
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	93
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	94
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	95
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		96
8	**Anexos**		97
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		97
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		111

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0117 de 2023 de fecha 01 de septiembre de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 2313 DE 2019

OBJETO: Mantenimiento rutinario de vías a cargo del INVIAS D.T. Caquetá R6504 San Vicente del Caguán a Mina Blanca, PR 52+0000 - PR81+00922 y R3002 Perlas III a Mina Blanca PR96+000 - PR 111+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

PLAZO INICIAL:	32 meses
FECHA DE INICIO:	16/12/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/09/2023
PLAZO ACUMULADO:	45

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,282,662,262.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 524,673,574.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1,807,335,836.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	44
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	44	44
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1.776.648.261,00	30.687.575,00	1.807.335.836,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.807.335.836,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	22.706.708,00	392.207,00	23.098.915,00	1.807.335.836,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				1.807.335.836,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1,807,335,836.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,807,335,836.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R6504 PR73+0487 LIMPIEZA DE OBRAS



R3002 PR99+0320 LIMPIEZA DE CUNETAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 2314 DE 2019

PLAZO INICIAL: 32 meses
FECHA DE INICIO: 16/12/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 45

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.344.176.174,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 549.285.873,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.893.462.047,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

OBJETO: Mantenimiento rutinario de vías a cargo del INVIAS D.T. Caquetá R3002 Santo Domingo a Perlas III PR57+0500 - PR 96+0000
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	39
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	39	39
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1.861.312.104,00	32.149.943,00	1.893.462.047,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.893.462.047,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	23.746.526,00	410.167,00	24.156.693,00	1.893.462.046,68
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				1.893.462.046,68

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.893.462.046,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.893.462.046,68
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R3002 PR91+0700 ROCERIA



R3002 PR88+0925 LIMPIEZA DE CUNETA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma
Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 2315 DE 2019

OBJETO: Mantenimiento rutinario de vías a cargo del INVIAS D.T. Caquetá R8501 Leticia a Tarapacá PR4+0386 - PR 25+0000

CONTRATISTA: PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

PLAZO INICIAL: 32 meses
FECHA DE INICIO: 16/12/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 45

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 503.911.959,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 205.544.902,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 709.456.861,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	20
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	20	20
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	9.074.735,00	0,00	9.074.735,00	709.456.861,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				709.456.861,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 709.456.861,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 709.456.861,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R8501 PR13+0000 PODA



R8501 PR10+0000 RETIRO DE ARBOL

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 8 AGOSTO A 8 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 2696 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA VÍA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN SECTOR PR 0+0000 - PR52+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

PLAZO INICIAL: 1
FECHA DE INICIO: 8/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 8/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 1

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 58.129.870,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 58.129.870,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	52
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	52	52
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	57.142.857,00	987.013,00	58.129.870,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			58.129.870,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	57.142.857,00	987.013,00	58.129.870,00	58.128.870,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				58.128.870,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 58.128.870,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 58.128.870,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R6504 PR22+0900 BACHEO



R6504 PR5+0960 PARCHEO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 8 AGOSTO A 8 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3024 DE 2023
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6504 PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUÁN, PR 0+0000 - PR 52+0" LOTE 7.
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 231.995.316,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 231.995.316,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	52
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	52	52
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	19.004.680,00	328.263,00	19.332.943,00	19.332.943,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				19.332.943,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 19.332.943,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.332.943,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8,33%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R6504 PR21+0250 LIMPIEZA DE CUNETAS



R6504 PR7+0030 DESPEJE DE SEÑALES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3042 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUÁN - MINA BLANCA, PR 52+0000 - PR 81+0092/3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 - PR 111+0000. LOTE 8.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE INICIO: 21/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 4

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 182.211.140,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 182.211.140,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	44
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	44	44
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	179.117.296,00	3.093.844,00	182.211.140,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			182.211.140,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	14.926.442,00	257.820,00	15.184.262,00	15.184.262,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				15.184.262,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 15.184.262,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.184.262,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R6504 PR65+0980 ROCERÍA



R6504 PR67+0530 DESPEJE DE DERRUMBES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma
Nombre: **HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3064 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 8501 LETICIATARAPACÁ, PR 4+0386 - PR 25+0000, LOTE 10.

CONTRATISTA: PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 71.031.792,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 71.031.792,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	20
Otros (Especificar cuales)			

5.919.316
5.919.316

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	20	20
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	5.919.316,00		5.919.316,00	5.919.316,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				5.919.316,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.919.316,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 5.919.316,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R8501 PR6+0000 ROCERIA



R8501 PR7+0100 LIMPIEZA DE CUNETAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 21 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3066 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR 57+0500 - PR96+0000" LOTE 9

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 190.697.803,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 190.697.803,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Rutinario	KM	39
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Rutinario	KM	39	39
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	187.459.860,00	3.237.943,00	190.697.803,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			190.697.803,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	15.621.655,00	269.829,00	15.891.484,00	15.891.484,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				15.891.484,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 15.891.484,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.891.484,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): $ 1,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R3002 PR58+0530 LIMPIEZA DE CALZADA



R3002 PR72+0720 LIMPIEZA DE SEÑALES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NA

Firma

Nombre: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL

SEPTIEMBRE DE 2023

ADMINISTRACIN VIAL GRUPO 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ



RETIRO MATRIAL DE DERRUMBE PARA HABILITAR PASO A UN CARRIL

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

SEPTIEMBRE

2023

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio SLG VIAL, con NIT. 901.734.940-7 (Integrado por SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO con C.C. No. 55.181.920, con un porcentaje de participación del 90%; y GIA INGENIERÍA S.A.S. identificada con NIT. No. 900.617.340-3, con un porcentaje de participación del 10%) encargado de la Administración Vial grupo 3, de la Territorial INVIAS Caquetá, que tiene por Objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3", presenta el informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Durante el presente mes se realizó la programación y seguimiento a las actividades de los contratistas de Mantenimiento Rutinario y se reprogramaron actividades de acuerdo según las necesidades de cada una las vías. En este mes se terminaron los contratos 2313, 2314, 2315 y 1421. El día 21 de septiembre se imparte orden de inicio a los contratos 3024, 3042, 3066 y 3064.

Se procesaron las actas de la Cooperativas de Trabajo Asociado La Sureña, Los Colonos, Los Lejanos y Pre Cooperativa Central Vías de Leticia, de acuerdo a formatos actualizados del manual de Interventoría y a los valores efectivamente causados.

Se enviaron informes a la Dirección Territorial Caquetá, solicitando atención de sitios críticos con el Contrato 991 de 2021, en la Vía 3002, con maquinaria para desalojo de aproximadamente 46 derrumbes, que acumulan un volumen de más de 2.780 m3, con distancia de acarreo superior a 2 km. Se reportaron los mismos con paso restringido a un carril. De igual manera se envió informe de afectaciones y hundimientos en la vía 3002.

Se ha señalizado con cinta amarilla los sitios críticos, participando activamente en la prevención de riesgos, se ha informado oportunamente la existencia de sitios críticos, se realizó inspección visual de los puentes. Se ha realizado el reporte diario del estado de las vías del GRUPO AMV 3 LOTE 3.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del INVIAS en la Territorial Caquetá, comprende una serie de actividades incluidas en el pliego de condiciones y en los contratos celebrados, las cuales se califican con indicadores, el objetivo de estas actividades es mantener la transitabilidad permanente y en condiciones óptimas, brindar al usuario las condiciones para viajar con confort y seguridad y además cuidar el medio ambiente en el entorno de las vías. En el presente mes se cumplieron los indicadores y también se atendieron emergencias como; retiro de árboles y retiro de derrumbes a mano.

Las empresas Contratistas deben garantizar la vecindad de los trabajadores, de tal forma que la respuesta ante un evento que altere el tránsito normal, se atienda de forma rápida y a cualquier hora del día.

Igualmente se realizan labores de ornato como la siembra de árboles y labores preventivas como el mantenimiento de puentes.

Se evalúa semanalmente los indicadores de mantenimiento rutinario y se hacen programaciones semanales.

2.1 Localización:

El Contrato 2313 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Cooperativa e Trabajo Asociado Los Colonos, se ejecuta en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la vía 6504 desde el PR 52+0000 hasta el PR 81+0092, que comunica al Municipio con la ciudad de Florencia, incluyendo el paso urbano por San Vicente del Caguán y en la vía 3002, desde el PR 96+0000 hasta el PR 111+0000, que comunica al Departamento con la ciudad de Neiva. Este contrato 2313, se ejecutó hasta el día 15 de septiembre de 2023.

El Contrato 3042 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Cooperativa e Trabajo Asociado Los Colonos, se ejecuta en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la vía 6504 desde el PR 52+0000 hasta el PR 81+0092, que comunica al Municipio con la ciudad de Florencia, incluyendo el paso urbano por San Vicente del Caguán y en la vía 3002, desde el PR 96+0000 hasta el PR 111+0000, que comunica al Departamento con la ciudad de Neiva. Este contrato 3042, inicia su ejecución el día 21 de septiembre de 2023 y tiene plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

El Contrato 2314 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Lejanos, se ejecuta en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la vía 3002, desde el PR 57+0500 hasta el PR 96+0000, zona rural que comprende desde la vereda Santo Domingo (Lucitania), Las Morras, La Campana, Puerto Amor, Perlas III. Este contrato 2314, se ejecutó hasta el día 15 de septiembre de 2023.

El Contrato 3066 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Lejanos, se ejecuta en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la vía 3002, desde el PR 57+0500 hasta el PR 96+0000, zona rural que comprende desde la vereda Santo Domingo (Lucitania), Las Morras, La Campana, Puerto Amor, Perlas III. Este contrato 3066, inicia su ejecución el día 21 de septiembre de 2023 y tiene plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

El contrato 2315 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Precooperativa Central Vías de Leticia, se ejecuta en el Municipio de Leticia en la vía 8501, desde el PR 4+0386 hasta el PR 25+0000, que comunica al municipio de Leticia con Tarapacá en el Departamento de Amazonas. Este contrato 2315, se ejecutó hasta el día 15 de septiembre de 2023.

El contrato 3064 de Mantenimiento Rutinario, celebrado con la Precooperativa Central Vías de Leticia, se ejecuta en el Municipio de Leticia en la vía 8501, desde el PR 4+0386 hasta el PR 25+0000, que comunica al municipio de Leticia con Tarapacá en el Departamento de Amazonas. Este contrato 3064, inicia su ejecución el día 21 de septiembre de 2023 y tiene plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

El Contrato 1421 de Mantenimiento Rutinario celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sureña, se ejecuta entre los Municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán en la vía 6504, desde el PR 0+0000 hasta el PR 52+0000, que comunica al municipio de Puerto Rico con el municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo el paso urbano en el barrio Villa Norte, municipio de San Vicente del Caguán. Este contrato 1421, se ejecutó hasta el día 08 de septiembre de 2023.

El Contrato 3024 de Mantenimiento Rutinario celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sureña, se ejecuta entre los Municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán en la vía 6504, desde el PR 0+0000 hasta el PR 52+0000, que comunica al municipio de Puerto Rico con el municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo el paso urbano en el barrio Villa Norte, municipio de San Vicente del Caguán. Este contrato 3024, inicia su ejecución el día 21 de septiembre de 2023 y tiene plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución

Los Municipios de la zona de influencia son: Puerto Rico y San Vicente del Caguán en Caquetá y Leticia en el Amazonas.

Algunos de los beneficios son: se genera empleo, se mantienen los corredores viales en buenas condiciones de transitabilidad, se proyecta una buena imagen corporativa del INVIAS, se atienden emergencias rápidamente y se genera sentido de pertenencia en los trabajadores hacia las vías que tienen a cargo.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Contrato 2313, que terminó el día 15 de septiembre de 2023 y Contrato 3042, con orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, tiene a cargo la vía 6504, desde el PR 52+0000 hasta el PR 81+0092. Tramo que tiene superficie de rodadura con subbase en asfalto natural en regular estado, señales verticales en regular y mal estado, señales horizontales y demarcación en mal estado. Tiene un sitio crítico en el PR71+0000 por hundimiento y un paso malo en PR78+0400 con baches. El inventario de señales verticales y obras de drenaje debería estar subido en la plataforma Hermes V2. Se incluye el paso nacional por casco urbano de San Vicente del Caguán. El tramo de la R3002 entre Perlas III a Mina Blanca presenta el tramo del PR98 al PR106 en mal estado, con paso a un carril en el PR 98+0660 por hundimiento en la calzada, el resto en regular estado.

Contrato 2314, que terminó el día 15 de septiembre de 2023 y Contrato 3024, con orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, tiene a cargo la vía 3002, desde el PR 57+0500 hasta el PR 96+0000. Tramo que la superficie de rodadura es una sub base en asfalto natural con un 50% en mal estado, señales verticales en regular y mal estado, señales horizontales y demarcación en mal estado, tiene varios sitios críticos con movimientos en masa activos y paso a un carril como: PR 58+0500, PR 59+0420, PR 60+0740, PR 61+0760, PR 62+0240, PR 62+0540, PR 63+0240, PR 63+0510, PR 64+0430, PR 64+0580, PR 67+0210, PR 67+0470, PR 68+0380, PR 68+0520, PR 68+0590, PR 68+0630, PR 69+0220, PR 69+0700, PR 70+0060, PR 70+0150, PR 70+0680, PR 71+0160, PR 71+0220, PR 71+0280, PR 71+0500, PR 71+0640, PR 71+0690, PR 71+0920, PR 72+0110, PR 72+0190, PR 72+0250, PR 72+0350, PR 73+0110, PR 73+0170, PR 73+0310, PR 73+0370, PR 73+0850, PR 73+0940, PR 74+0090, PR 74+0140, PR 74+0260, PR 74+0320, PR 74+0530, PR 74+0640, PR 74+0890, PR 74+0970, PR 75+0160, PR 75+0400, PR 75+0770, PR 75+0880, PR 76+0260, PR 85+0340, PR 87+0220, PR 89+0020, PR 93+0880, PR 94+0560, PR 95+0150.

Contrato 2315, que terminó el día 15 de septiembre de 2023 y Contrato 3064, con orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, tiene a cargo la vía 8501, desde el PR 4+0386 hasta el PR 25+0000. Tramo que es pavimentado en concreto hidráulico con ancho de 5,5 metros en un 99% de su longitud y el resto se intervino con las mismas características. Presenta buen estado, señales verticales y horizontales en regular estado. Presenta sitio crítico en el PR15+0420 y daño en el pavimento en el PR 21+0200.

Contrato 1421, que terminó el día 08 de septiembre de 2023 y Contrato 3024, con orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, tiene a cargo la vía 6504, desde el PR 0+0000 hasta el PR 52+0000. Tramo que tiene superficie de rodadura con subbase en asfalto natural en mal estado, señales verticales en regular y mal estado, señales horizontales y demarcación en muy mal estado. Tiene varios sitios críticos entre ellos PR4+0800 pontón colapsado, con paso a un carril, actualmente se construye una obra nueva el contrato 991 de 2021, PR 7+0995 perdida de banca, PR 12+0100 inestabilidad del terreno perdida cabezote alcantarilla, PR 16+0400 derrumbe paso a un carril, PR 28+0680 perdida de

banca paso a un carril, PR 30+0900 hundimiento de calzada, PR 32+0000 hundimiento de calzada, PR 32+0750 hundimiento de calzada, PR 32+0800 hundimiento de calzada, PR33+0300 perdida de la banca por colapso de muro en gaviones paso a un carril, PR 33+0350 perdida un metro de la banca, PR 33+0500 hundimiento de la vía, PR 36+0850 hundimiento de la vía con paso a un carril, PR 38+0200 hundimiento en la vía. Actualmente el contrato 991 de 2021, labora en Mejoramiento con tres frentes de trabajo PR 2+0560 paso a un carril por construcción de alcantarilla y pavimentación, PR 4+0800 paso a un carril por construcción de alcantarilla de cajón, PR 40+0760 puente la Ceiba, PR 45+0500 paso a un carril por construcción de alcantarilla de cajón.

2.4 Características técnicas del proyecto

Las actividades más recurrentes dentro del proyecto y que se asocian a un indicador específico son:

Bacheo
Parcheo
Limpieza de cunetas y de berma cuneta
Limpieza de encoles y descoles
Limpieza de obras de drenaje
Mantenimiento de puentes
Desalojo de derrumbes menores a mano
Limpieza de calzada
Rocería, el indicador es mantener la cobertura vegetal en menos de 30 cm
Retiro de árboles caídos
Limpieza de señales
Vigilancia de la vía y monitoreo de puentes y sitios críticos
Construcción de obras menores con materiales y dirección técnica dadas por la Administración Vial.

3. INFORMACION CONTRATOS DE OBRA

3.1 Contrato 3024 del 21 de agosto de 2023

3.1.1 Información General: el servicio de mantenimiento rutinario a cargo de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sureña, comprende el sector de la RUTA 6504, desde Puerto Rico a San Vicente del Caguán, entre los PR 0+0000 hasta el PR52+0000. Se imparte orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023. El contrato 1421, terminó su ejecución el día 08 de septiembre de 2023.

3.1.2 Descripción actividades ejecutadas en el mes

- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Limpieza de obras de drenaje y descoles
- ✓ Siembra de árboles
- ✓ Parcheo con asfaltita paso urbano San Vicente hasta puente la Siberia
- ✓ Bacheo con asfalto natural
- ✓ Vigilancia, señalización y monitoreo de sitios críticos
- ✓ Mantenimiento de puentes
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano
- ✓ Retiro de árboles caídos, poda de árboles
- ✓ Señalización de sitios críticos
- ✓ Inventario de vía

3.1.3 Seguimiento de indicadores

Los indicadores de mantenimiento rutinario de los ítems contractuales se cumplen de acuerdo al desarrollo de las actividades.

3.1.4 Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Se mantienen indicadores, la interventoría solicita enfatizar en el uso de la señalización preventiva durante ejecución de labores, en especial la de rocería. Se verificó cumplimiento de pólizas de garantía.

3.2 Contrato 3042 del 21 de agosto de 2023

3.2.1 Información General: el servicio de mantenimiento rutinario a cargo de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Colonos, comprende el sector de la RUTA 6504, desde San Vicente del Caguán a Mina Blanca, incluyendo el paso urbano por San Vicente del Caguán entre el PR 52+0000 hasta el PR 81+0092 y sector de la RUTA 3002, Perlas III a Mina Blanca, desde el PR 96+0000 hasta el PR111+0000. Se imparte orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre 2023. El contrato 2313, terminó su ejecución el día 15 de septiembre de 2023.

3.2.2 Descripción actividades ejecutadas en el mes

Rocería

- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Limpieza de obras de drenaje y descoles
- ✓ Poda de árboles
- ✓ Bacheo con material de préstamo
- ✓ Parcho con asfalto natural (asfaltita)
- ✓ Vigilancia, señalización y monitoreo de sitios críticos

- ✓ Limpieza de señales
- ✓ Limpieza de defensas metálicas
- ✓ Mantenimiento de vivero
- ✓ Poda y/o retiro de árboles caídos

3.2.3 Seguimiento de indicadores

Los indicadores de mantenimiento rutinario de los ítems contractuales se cumplen de acuerdo al desarrollo de las actividades.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Se hace programación, la interventoría solicita enfatizar en bacheo, rocería y limpieza de cunetas. Se verificó cumplimiento de las pólizas de garantía.

3.3 Contrato 3066 del 31 de agosto de 2023:

3.3.1 Información general: el servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Lejanos, comprende el sector de la RUTA 3002, desde Santo Domingo – Las Morras hasta Perlas III, desde el PR 57+0500 hasta el PR 96+0000, Lote 9. Se imparte orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre 2023. El contrato 2314, terminó su ejecución el día 15 de septiembre de 2023.

3.3.2 Descripción actividades ejecutadas en el mes

- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Limpieza de obras de drenaje y descoles
- ✓ Poda y/o corte de árboles
- ✓ Vigilancia, señalización y monitoreo de sitios críticos
- ✓ Mantenimiento y limpieza de puentes
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano y habilitación de paso a un carril PR58+0500 en tres ocasiones.
- ✓ Retiro de árboles caídos
- ✓ Atención de emergencia por árboles caídos
- ✓ Bacheo con material del sitio
- ✓ Limpieza de señales verticales

3.3.3 Seguimiento de indicadores

Los indicadores de mantenimiento rutinario de los ítems contractuales se cumplen de acuerdo al desarrollo de las actividades.

3.3.4 Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Se les suministrará cinta de señalización para que se instale en los sitios críticos con paso restringido a un carril.

3.4 Contrato 3064 del 31 de agosto de 2023

3.4.1 Información general: el servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Pre Cooperativa de Trabajo Asociado Central de Vías de Leticia, comprende el sector de la RUTA 8501, desde Leticia hasta Tarapacá, en el Departamento del Amazonas, desde el PR 4+0386 hasta el PR25+0000, Lote 10. Se imparte orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre 2023. El contrato 2313, terminó su ejecución el día 15 de septiembre de 2023.

3.4.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada y ciclo ruta
- ✓ Limpieza de cunetas
- ✓ Limpieza de encoles y descoles
- ✓ Limpieza de obras de drenaje y canales en tierra
- ✓ Poda y/o corte y retiro de árboles
- ✓ Limpieza de señales verticales
- ✓ Vigilancia, señalización y monitoreo de sitios críticos
- ✓ Disponibilidad para atención de emergencias

3.4.3 Seguimiento de indicadores

Los indicadores de mantenimiento rutinario de los ítems contractuales se cumplen de acuerdo al desarrollo de las actividades.

3.4.4 Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Se recibe reporte de afectación del pavimento por parte del contratista, que tenía plazo de ejecución hasta 31 de agosto de 2023.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATOS DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Se anexan en el formato correspondiente los informes semanales de los contratos 2313, 2314,2315 y 1421 del mes de septiembre y los informes semanales de los contratos 3024, 3042, 3066 y 3064 del mes de septiembre.

4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra

Se anexa en una sola hoja los vehículos para transporte de herramienta con los que cuentan los contratos 2313 de CTA Los Colonos, 2314 de CTA Los Lejanos, 3042 de CTA Los Colonos y 3066 de CTA Los Lejanos, que se utilizaron y permanecieron disponibles durante el mes, el contrato 2315 y 3064 de CTA Central de Vías de Leticia, dispone de un motocarro.

4.3 Personal, control de aportes legales y seguridad social obra

Se incluye el formato en donde se verifica que el contrato 1421, que terminó el día 8 de septiembre de 2023 y los contratos 2313, 2314 y 2315, que terminaron el día 15 de septiembre de 2023, cumplen con la normatividad respecto al pago de aportes parafiscales, de seguridad y de salud. De igual manera para los contratos 3024, 3042, 3066 y 3064, que iniciaron el día 15 de septiembre de 2023.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Se anexa formato mensual del estado presupuestal y financiero de los contratos 2313, 2314, 1421 y 2315.

4.5 Estado General del tiempo

Se incluye el formato y se puede concluir que, durante el mes de septiembre, se presentó regularmente tiempo seco en la Vía 3002, en la Vía 6504 y en la Vía 8501.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

El formato No Aplica, ya que, dentro de las labores contractuales no se incluyen ítems a los cuales se les tenga que realizar ensayos o control de calidad.

4.7 Seguimiento garantías y seguro contratos de obra

Continúan vigentes las garantías presentadas al inicio de los contratos 2313, 2314, 1421 y 2315, las condiciones iniciales cambiaron en plazo y monto de los contratos. Para los contratos 3024, 3042, 3066 y 3064, con orden de inicio del 21 de septiembre de 2023, la aprobación de Pólizas se efectuó el día 20 de septiembre de 2023.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contratos de obra

Este formato No Aplica, porque contractualmente no se tienen ítems que requieran ensayos de laboratorio.

4.9 Otros documentos

Se actualizó el directorio de emergencias.

Se inicia trabajos para inventario vial y de recolección de información para el informe vial con criterio técnico.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	3

FECHA	12	SEPTIEMBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 6504 SAN VICENTE-MINA BLANCA, PR52+0000-PR81+0092 Y 3002 PERLAS III-MINA BLANCA PR96+000-PR111+0000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: 1 del 1/09/2023 al 10/09/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUAN - MINA BLANCA, PR 52+0000 - PR 81+0092 Y 3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR 96+0000 - PR 111+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 44 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MANTENER LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL EN CONDICIONES ACEPTABLES PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% , GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	2313 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 1.282.662.262	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	16-dic-19	VALOR ADICIONES:	$ 524.673.574	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.807.335.836	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	ADICIONAL 2313-1 DE 2022 ADICIONAL 2313-2 DE 2022 ADICIONAL 2313-4 DE 2023 ADICIONAL 2313-5 DE 2023 ADICIONAL 2313-6 DE 2023 2313-7 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.125.453	$ 434.584.208	$ 473.296.667	$ 292.655.934	$ 524.673.574,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 82.125.453	$ 434.584.208	$ 473.296.667	$ 292.655.934,00	$ 501.574.659,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.098.915,00
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.776.648.273,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.769.079.358,00	99,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.769.079.358,00	99,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.769.079.358,00	99,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.769.079.358,00	99,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.596.463,73	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.596.463,73	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO DE 2023
VALOR FACTURA: $ 46.197.830,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	6	10
MOTOSIERRA	1	1
CAMIONETA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN: N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A. POR CLASIFICACION COMO MINIMO IMPACTO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA COOPERATIVA GENERA 11 EMPLEOS QUE SON SUS ASOCIADOS, ADEMAS DEL CONTADOR Y EL SISO; INDIRECTOS UN MECANICO AUTOMOTRIZ, UN MECANICO MAQUINAS GUADAÑADORAS Y DEMAS, Y UN PARQUEADERO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ROCERIA PR 55+0000 AL PR 59+0300, LIMPIEZA DE SEÑALES PR 56+0000 AL PR 57+0300, LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS PR 58+0120 AL PR 58+0200, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 55+0000 AL PR 58+0000, MANTENIMIENTO DE VIVERO PR 56+0400, PARCHEO PR 53+0500 AL PR 58+0000 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


PARCHEO, ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS VIALES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 6504



RUTA 3002



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO





PR104+0100 VIA 3002: PODA





PR73+0487 VIA 6504: LIMPIEZA DE OBRA





PR60+0551 VIA 6504: LIMPIEZA DE OBRA





PR99+0100 VIA 3002: LIMPIEZA DE CUNETAS





PR99+0320 VIA 3002: LIMPIEZA DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	12	SEPTIEMBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR57+0500-PR96+000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: **1** del 1/09/2023 al 10/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA,

EN EL SECTOR 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS- PERLAS III, PR 57+0500 - PR 96+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 39 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	2314 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 1.344.176.174	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	16-dic-19	VALOR ADICIONES:	$ 549.285.873	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.893.462.047	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	########	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	########	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	ADICIONAL 2314-2 DE 2022 2314-3 DE 2022 2314-5 DE 2023 2314-6 DE 2023 2314-7 DE 2023 2314-8 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.064.025	$ 455.425.989	$ 495.995.029	$ 306.691.131	$ 549.285.873,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 86.064.025	$ 455.425.989	$ 495.995.029	$ 306.691.131,00	$ 525.129.180,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.156.693,00
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.861.312.104,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	1.853.396.593,00	99,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	1.853.396.593,00	99,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	1.853.396.593,00	99,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.853.396.593,00	99,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	11.081.714,00	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	11.081.714,00	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO DE 2023
VALOR FACTURA: $ 48.313.385,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RETIRO DE ARBOL PR 89+0800 AL PR 90+0650, LIMPIEZA DE CALZADA PR 83+0810 AL PR 94+0650, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 74+0080 AL PR 74+0090, PR 80+0500 AL PR 80+0510, PR 93+0500 AL PR 96+0000, DESPEJE DE DERRUMBES PR 80+0500, PR 74+0080, PR 83+0810, SEÑALIZACION PR 64+0580, ROCERIA PR 93+0000 AL PR 96+0000, LIMPIEZA DE BERMA PR 93+0500 AL PR 96+0000 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA DE BERMAS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERIA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS VIALES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 3002

PR 57+0500 PR76+000 PR 96+0000

PR 57+0500 PR76+000 PR 96+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR64+0580: SEÑALIZACION





PR94+1060: ROCERIA





PR 93+1000: LIMPIEZA DE CUNETAS





PR 83+0810: DESPEJE DE DERRUMBE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 8501 LETICIA - TARAPACÁ, PR 04+0386 - PR 25+0000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: 1 del 1/09/2023 al 10/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 8501 LETICIA - TARAPACA, PR 4+0386 - PR 25+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 20 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	2315 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 503.911.959	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	16-dic-19	VALOR ADICIONES:	$ 205.544.902	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 709.456.861	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	CTO ADICIONAL 2315-1 DE 2022 2315-2 DE 2022 2315-4 DE 2023 2315-5 DE 2023 2315-6 DE 2023 2315-7 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 32.821.433	$ 170.175.241	$ 185.941.272	$ 114.974.013	$ 205.544.902
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.821.433	$ 170.175.241	$ 185.941.272	$ 114.974.013	$ 196.470.167
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.074.735
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	709.456.861,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	706.431.949,00	99,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	706.431.949,00	99,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	706.431.949,00	99,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	706.431.949,00	99,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.234.876,00	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.234.876,00	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO DE 2023
VALOR FACTURA: $ 18.149.469,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RETIRO DE ARBOL PR 16+0000, PR 17+0400, ROCERIA PR 14+0100 AL PR 16+0500Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS, ROCERIA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 8501

PR 4+0386 PR15+0000 PR 25+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR15+0500: RETIRO DE ARBOL





PR14+0100: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL





PR14+0400: RETIRO DE ARBOL





PR14+0000: ROCERIA





PR14+0500: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE, PR 00+0000 - PR 52+0000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: 1-FINAL del 1/09/2023 al 8/09/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DT CAQUETA VIA 6504-SAN VICENTE DEL CAGUAN PR0+0000-PR 52+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 52 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA		INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%
CONTRATO No.	2696 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 58.129.870	CONTRATO No.	2702 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	8-ago-23	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8-sep-23	VALOR ACUMULADO: $ 58.129.870	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8-sep-23	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -		VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -		SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.129.870
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.129.870
	SALDO DE VIGENCIA	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	57.142.857,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	57.142.857,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	57.142.857,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	57.142.857,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	57.142.857,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	12.891.666,00	22,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.891.666,00	22,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	6	10
MOTOSIERRA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

BACHEO PR 13+0000 AL PR 16+0000, PR 22+0900 AL PR 23+0000, ROCERIA PR 23+0500 AL PR 28+0000, PODA DE ARBOL PR 2+0800 AL PR 3+0980, SENALIZACION PR 12+0100, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 17+0500 AL PR 19+0380, LIMPIEZA DE BERMA PR 19+0410 AL PR 19+0480 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZA CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 8501 [redacted]

PR 0+0000 PR 52+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR19+0060: LIMPIEZA DE CUNETAS



PR22+0480: BACHEO



PR19+0410: LIMPIEZA DE BERMA



PR12+0750: BACHEO



PR5+0960: BACHEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 18 SEPTIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 6504 SAN VICENTE-MINA BLANCA, PR52+0000-PR81+0092 Y 3002 PERLAS III-MINA BLANCA PR96+000-PR111+0000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: 2-FINAL del 11/09/2023 al 15/09/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUAN - MINA BLANCA,

PR 52+0000 - PR 81+0092 Y 3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR 96+0000 - PR 111+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 44 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MANTENER LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL EN CONDICIONES ACEPTABLES PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2313 DE 2019 — VALOR INICIAL: $ 1.282.662.262
FECHA DE INICIO: 16-dic-19 — VALOR ADICIONES: $ 524.673.574
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 — VALOR ACUMULADO: $ 1.807.335.836
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO SLG VIAL
INTEGRANTES: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%
CONTRATO No. 2702 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 395.471.546
FECHA DE INICIO: 1/09/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	ADICIONAL 2313-1 DE 2022 ADICIONAL 2313-2 DE 2022 ADICIONAL 2313-4 DE 2023 ADICIONAL 2313-5 DE 2023 ADICIONAL 2313-6 DE 2023 2313-7 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.125.453	$ 434.584.208	$ 473.296.667	$ 292.655.934	$ 524.673.574,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 82.125.453	$ 434.584.208	$ 473.296.667	$ 292.655.934,00	$ 524.673.574,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.776.648.273,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.776.648.273,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.776.648.273,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ - -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.776.648.273,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.776.648.273,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.596.463,73	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.596.463,73	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 23.098.915,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	6	10
MOTOSIERRA	1	1
CAMIONETA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A. POR CLASIFICACION COMO MINIMO IMPACTO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA COOPERATIVA GENERA 11 EMPLEOS QUE SON SUS ASOCIADOS, ADEMAS DEL CONTADOR Y EL SISO; INDIRECTOS UN MECANICO AUTOMOTRIZ, UN MECANICO MAQUINAS GUADAÑADORAS Y DEMAS, Y UN PARQUEADERO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARCHEO PR 52+0000 AL PR 54+0000, PR 57+0500 AL PR 61+0300, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CALZADA PR 55+0400 AL PR 57+0000, PR 98+0800 AL PR 106+0000, PODA PR 105+0800 AL PR 106+0000, LIMPIEZA DE SEÑALES PR 53+0000 AL PR 59+0000, MANTENIMIENTO DE VIVERO PR 56+0400 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZA CONTRATO 2313 DE 2019

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 6504
PR 52+0000 — PR70+0000 — PR 81+0092

RUTA 3002
PR 96+0000 — PR102+0000 — PR 111+0000

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PR98+0940 VIA 3002: LIMPIEZA DE CUNETAS



PR52+0080 VIA 6504: PARCHEO



PR58+0020 VIA 6504: PARCHEO



PR58+0060 VIA 6504: LIMPIEZA DE SEÑALES



PR56+0400 VIA 6504: MANTENIMIENTO DE VIVERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	18	SEPTIEMBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR57+0500-PR96+000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: **2-FINAL** del 11/09/2023 al 15/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA,

EN EL SECTOR 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS- PERLAS III, PR 57+0500 - PR 96+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 39 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	2314 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 1.344.176.174	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	16-dic-19	VALOR ADICIONES:	$ 549.285.873	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.893.462.047	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	########	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	########	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	ADICIONAL 2314-2 DE 2022 2314-5 DE 2023 2314-8 DE 2023	2314-3 DE 2022 2314-6 DE 2023 2314-7 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.064.025	$ 455.425.989	$ 495.995.029	$ 306.691.131	$	549.285.873,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 86.064.025	$ 455.425.989	$ 495.995.029	$ 306.691.131,00	$	549.285.872,68
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$	0,32
		2023					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA						
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$	-

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.861.312.104,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	1.861.312.103,68	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	1.861.312.103,68	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	1.861.312.103,68	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.861.312.103,68	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	11.081.714,00	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	11.081.714,00	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 24.156.693,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LIMPIEZA DE CUNETAS PR 88+0500 AL PR 93+0700, ROCERIA PR 88+0000 AL PR 93+0400, LIMPIEZA DE CALZADA PR 88+0500 AL PR 93+0700, ARBORIZACION (SIEMBRA) PR 81+0000, BACHEO PR 89+0050 AL PR 90+0920, DESPEJE DE DERRUMBE PR 88+0850, PR 85+0400 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZA CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 3002

[redacted]

PR 57+0500 PR76+000 PR 96+0000

[redacted]

PR 57+0500 PR76+000 PR 96+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR93+0200: ROCERIA





PR92+0060: LIMPIEZA DE CUNETAS





PR 88+0225: LIMPIEZA DE CUNETAS





PR 72+0400: RETIRO DE ARBOL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	3

FECHA	18	SEPTIEMBRE	2023
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 8501 LETICIA - TARAPACÁ, PR 04+0386 - PR 25+0000

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ SEMANA No.: 2-FINAL del 11/09/2023 al 15/09/2023 Último Informe Semanal SI ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 8501 LETICIA - TARAPACA, PR 4+0386 - PR 25+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 20 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	2315 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 503.911.959	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	16-dic-19	VALOR ADICIONES:	$ 205.544.902	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 709.456.861	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	CTO ADICIONAL 2315-1 DE 2022 2315-2 DE 2022 2315-4 DE 2023 2315-5 DE 2023 2315-6 DE 2023 2315-7 DE 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 32.821.433	$ 170.175.241	$ 185.941.272	$ 114.974.013	$ 205.544.902
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.821.433	$ 170.175.241	$ 185.941.272	$ 114.974.013	$ 205.544.902
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	709.456.861,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	709.456.861,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	709.456.861,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	709.456.861,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	709.456.861,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.234.876,00	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.234.876,00	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 9.074.735,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PODA PR 13+0000 AL PR 14+0000, ROCERIA PR 4+0386 AL PR 7+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 4+0386 AL PR 7+0000 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZA CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 8501

PR 4+0386 PR15+0000 PR 25+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR13+0000: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL





PR4+0386: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL MARGEN IZQUIERDA





PR5+0000: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL





PR4+0386: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL MARGEN DERECHA





PR10+0000: RETIRO DE ARBOL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	3	OCTUBRE	2023
				(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 6504 SAN VICENTE-MINA BLANCA, PR52+0000-PR81+0092 Y 3002 PERLAS III-MINA BLANCA PR96+000-PR111+0000

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — SEMANA No.: 1 del 21/09/2023 al 1/10/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUÁN - MINA BLANCA, PR 52+0000 - PR 81+0092/3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 -PR 111+0000. LOTE 8,

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 44 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MANTENER LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL EN CONDICIONES ACEPTABLES PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	3042 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 182.211.140	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	21-sep-23	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 182.211.140	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 182.211.140				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.211.140				
		2023	2024	2025	2026	2027
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	179.117.296,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	16.419.085,47	9,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	16.419.085,47	9,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	16.419.085,47	9,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	16.419.085,47	9,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	6	10
MOTOSIERRA	1	1
CAMIONETA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A. POR CLASIFICACION COMO MINIMO IMPACTO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA COOPERATIVA GENERA 11 EMPLEOS QUE SON SUS ASOCIADOS, ADEMAS DEL CONTADOR Y EL SISO; INDIRECTOS UN MECANICO AUTOMOTRIZ, UN MECANICO MAQUINAS GUADAÑADORAS Y DEMAS, Y UN PARQUEADERO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE DESDE EL PR 104+0590 AL PR 105+0730, PODA DE ARBOLES PR 62+0000 AL PR 77+0060, PR 105+0000 AL PR 107+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 69+0400 AL PR 70+0000, PR 105+0000 AL PR 105+0600, LIMPIEZA DE CALZADA PR 69+0400 AL PR 70+0000, PR 105+0000 AL PR 105+0600, PARCHEO PR 59+0300 AL PR 60+0700, PR 62+0300 AL PR 74+0000, ROCERIA PR 61+0400 AL PR 70+0000, MANTENIMIENTO PUENTE LA SIBERIA PR 63+0427, PUENTE LA DANTA PR 102+0900, PUENTE EL PESCADOR PR 98+0269, PUENTE EL PATO PR 97+0518, APOYO A LA AMV INVENTARIANDO SITIOS CRITICOS, SEÑALIZACION DE SITIOS CRITICOS, DESPEJE DE DERRUMBE PR 67+0520 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


PARCHEO, ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS VIALES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 6504



RUTA 3002



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR105+0300 VIA 3002: PODA





PR59+0680 VIA 6504: PARCHEO





PR65+0980 VIA 6504: ROCERIA





PR73+0800 VIA 6504: PARCHEO





PR67+0530 VIA 6504: DESPEJE DE DERRUMBE Y LIMPIEZA DE CUNETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	3	OCTUBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR57+0500-PR96+000

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ | SEMANA No.: 1 del 21/09/2023 al 1/10/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR 57+0500 - PR96+0000" LOTE 9

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 39 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	3066 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 190.697.803	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	21-sep-23	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 190.697.803	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	########	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	########	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2025	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 190.697.803				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 190.697.803				
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	187.459.860,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	17.183.820,50	9,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	17.183.820,50	9,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	17.183.820,50	9,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	17.183.820,50	9,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	10.935.158,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.935.158,00	5,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


DESPEJE DE DERRUMBES PR 58+0460, LIMPIEZA DE CALZADA PR 58+0460 AL PR 58+0520, LIMPIEZA DE SEÑALES PR 69+0500 AL PR 73+0300, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 87+0300 AL PR 88+0500 Y VIGILANCIA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA DE BERMAS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERIA, PODA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS VIALES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 3002



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







PR58+0530: LIMPIEZA DE CALZADA







PR73+0280: PODA







PR 88+0520: LIMPIEZA DE CUNETAS







PR 81+0220: RETIRO DE ARBOL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	3	OCTUBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 8501 LETICIA - TARAPACÁ, PR 04+0386 - PR 25+0000

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — SEMANA No.: 1 del 21/09/2023 al 1/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 8501 LETICIA - TARAPACA, PR 4+0386 - PR 25+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 20 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% ,GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	3064 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.031.792	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	21-sep-23	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.031.792	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.031.792				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 71.031.792				
		2023				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	71.031.792,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.511.247,60	9,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	6.511.247,60	9,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.511.247,60	9,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.511.247,60	9,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.143.521,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.143.521,00	5,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LIMPIEZA DE CALZADA DEL PR 6+0000 AL PR 7+0500, ROCERIA PR 6+0000 AL PR9+0000, PODA PR 4+0386 AL PR 5+0500, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 7+0000 AL PR 8+0000, PR 18+0000 AL PR 19+0000 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS, ROCERIA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 8501

PR 4+0386 PR15+0000 PR 25+0000

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR6+0000: LIMPIEZA DE CALZADA





PR7+0100: LIMPIEZA DE CUNETAS







PR4+0800: PODA







PR6+0000: ROCERIA







PR7+0100: RETIRO DE ARBOL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	3	OCTUBRE	2023
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE, PR 00+0000 - PR 52+0000

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — SEMANA No.: 1 del 21/09/2023 al 30/09/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6504 PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUÁN, PR 0+0000 - PR 52+0" LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 52 KM

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA			INTERVENTOR:	CONSORCIO SLG VIAL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO,C.C. 55.181.920 PARTICIPACIÓN 90% GIA INGENIERIA S.A.S. NIT 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 10%		
CONTRATO No.	3024 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 231.995.316	CONTRATO No.	2702 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 395.471.546
FECHA DE INICIO:	21-sep-23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/09/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 231.995.316	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 395.471.546
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-23		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 231.995.316
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 231.995.316
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 395.471.546
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.471.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	228.056.164,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	20.905.148,37	9,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	20.905.148,37	9,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	20.905.148,37	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	20.905.148,37	9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	12.891.666,00	5,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.891.666,00	5,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	395.471.546,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	6	10
MOTOSIERRA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	N.A.	PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

BACHEO PR 13+0270 AL PR 25+0470, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 20+0020 AL PR 21+0300, ROCERIA PR 32+0600 AL PR 39+0300, LIMPIEZA DE BERMA PR 8+0060 AL PR 8+0870, PR 11+0000 AL PR 11+0595, PR 20+0510 AL PR 21+0610, LIMPIEZA DE SEÑALES PR 4+0060 AL PR 8+0650, LIMPIEZA DE CALZADA PR 11+0000 AL PR 11+0400, PR 17+0870 AL PR 17+0910, MANTENIMIENTO DE PUENTE PR 20+0490, APOYO A LA ADMINISTRACION VIAL PR 0+0000 AL PR 19+0000 Y VIGILANCIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE BERMAS, PODA, MANTENIMIENTO DE PUENTES, LIMPIEZA DE SEÑALES, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EMERGENCIAS VIALES

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA 8501 [redacted]

PR 0+0000 PR 52+0000

[redacted]

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR4+0060: LIMPIEZA DE SEÑAL





PR22+0880: BACHEO





PR17+0870: LIMPIEZA DE CALZADA





PR25+0350: BACHEO





PR8+0510: LIMPIEZA DE BERMA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 2/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DEL CAQUETA A CARGO DE INVIAS

CONTRATO No. 2313 DE 2019 -2314 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA COLONOS - COOPERATIVA LEJANOS

3042 DE 2023 - 3066 DE 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2702 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SLG VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
COLONOS																																		
CAMIONETA 2 CABINA	TOYOTA 2008	5 P; 1,5 TON	SAN VICENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
LEJANOS																																		
FURGONETA	CHANA 2009	2 P ; 2 TON	PR 81 R3002	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: sin novedad

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Hermogenes Montenegro
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
NIT. 828.000.747-7
HERMOGENES MONTENEGRO VERA
Representante Legal
CC N° 17.774.382 De San Vicente del Caguán -Caqueta

Firma: DUBER IJAJI
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS
NIT. 828.001.249-5
DUBER IJAJI
Representante Legal
CC N° 17,774,117 De San Vicente del Caguán

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA 3 OCTUBRE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3024 de 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 21 al 30 de septiembre de 2023 **PROYECTO:** VIA 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA SECTOR PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN PR00+0000 - PR52+0000, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BETANCOURT JHONNIER	1.006.419.853	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	COLPENSIONES	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
2	BETANCOURT JUAN	17.669.461	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	NUEVA E.P.S.	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
3	MILTON DANIEL CARDOZO OSPINA	1.193.337.877	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	COLPENSIONES	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
4	GARCIA DARWIN	1.115.946.126	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	NUEVA E.P.S.	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
5	JOSE ALIRIO GARCIA RAMIREZ	1.117.820.850	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	NUEVA E.P.S.	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
6	JOSE ALBEIRO GUTIERREZ GOMEZ	17.788.895	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	COLPENSIONES	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
7	JARAMILLO JHONATAN	1.115.944.080	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	ASMET SALUD EPS SAS	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
8	FERNANDO MEDINA OSPINA	1.022.991.384	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	COLPENSIONES	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
9	JOSE ORLINSON MONSALVE	17.702.965	REPRESENTANTE LEGAL	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	COLFONDOS	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
10	MONTOYA GIOVANNI	1.115.941.300	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	ASMET SALUD EPS SAS	9438029026	$ 46.400	PROTECCIÓN	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
11	PEREZ LINCER	1.115.947.869	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
12	QUICENO ARCY	96.361.328	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
13	VALENCIA EDINSON	17.710.041	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	ASMET SALUD EPS SAS	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
14	VALENCIA RAUL	1.115.942.856	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	ASMET SALUD EPS SAS	9438029026	$ 46.400	PROTECCIÓN	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
15	VEGA EDWIN	1.115.951.728	COOPERATIVO	$1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA	$ 1.160.000	$ 80.800	IV	SANITAS	9438029026	$ 46.400	PORVENIR	9438029026	$ 185.600	$ 46.400	0	0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA
NIT. 828.001.298-6
JOSÉ ORLINSON MONSALVE
Representante Legal
C.C. No. 17.702.965 de Puerto Rico

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901734940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 3 OCTUBRE 2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3042 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 21 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** VIA 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA SECTOR SAN VICENTE - MINA BLANCA PR52+0000 - PR81+0092 Y VIA 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA SECTOR PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 - PR111+0000, DTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARLIO BETANCOURT SANCHEZ	1.116.254.626	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	PORVENIR	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
2	OSWALDO BURBANO RODRIGUEZ	96.351.112	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	SANITAS	9455971810	$ 46.400	COLPENSIONES	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
3	JOHN JAIRO CUNACUE ALVAREZ	1.117.816.852	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	PROTECCIÓN	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
4	SAMIR JAVIER DEVIA CESPEDES	1.117.818.115	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	PORVENIR	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
5	DIOMEDES JIMENEZ AVILES	17.690.753	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	PORVENIR	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
6	HERMOGENES MONTENEGRO VERA	17.774.382	REPRESENTANTE LEGAL	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	COLPENSIONES	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
7	LUIS FERNANDO OSSA PINTO	17.773.592	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	COLPENSIONES	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
8	DANIEL ENRIQUE PARRA TRIVIÑO	1.117.816.791	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	PROTECCIÓN	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
9	DUVERNEY PASCUAS CAPERA	1.117.823.146	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	ESSAC ASMET SALUD	9455971810	$ 46.400	PORVENIR	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
10	NELSON TROCHEZ ITACUE	17.672.627	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9455971810	$ 46.400	COLPENSIONES	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
11	OSCAR FABIAN UBAQUE GRANADOS	1.117.821.480	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS	$1.160.000	$ 50.500	IV	ESSC ASMET SALUD	9455971810	$ 46.400	PORVENIR	9455971810	$ 185.600	$ 46.400	0	0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Hermogenes Montenegro

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
NIT. 828.000.747-7
HERMOGENES MONTENEGRO VERA
Representante Legal
C.C. No. 17.774.382 de San Vicente del Caguán - Caquetá

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901734940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 3 OCTUBRE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3064 DE 2023 **CONTRATISTA:** PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 21 al 30 de septiembre de **PROYECTO:** VIA 8501 LETICIA - TARAPACÁ SECTOR LETICIA - TARAPACÁ PR4+0386 - PR25+0000, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2702 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAFAMAZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDSON AHUE CUELLAR	18.050.894	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.	9457500409	$ 145.000	COLPENSIONES	9457500409	$ 185.600	$ 46.400	$ 34.800	$23.200	
2	JUAN GARDEL CAHUACHE FALCON	6.565.668	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.	9457500409	$ 145.000	COLPENSIONES	9457500409	$ 185.600	$ 46.400	$ 34.800	$23.200	
3	JAIRO ALBERTO CRUZ ALVEZ	15.877.033	REPRESENTANTE LEGAL	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.	9457500409	$ 145.000	PORVENIR	9457500409	$ 185.600	$ 46.400	$ 34.800	$23.200	
4	MISAEL HEREDIA CURICO	6.566.507	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.	9457500409	$ 145.000	PORVENIR	9457500409	$ 185.600	$ 46.400	$ 34.800	$23.200	
5	WILDER BRANDEZ SALES MATAPI	6.567.712	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.	9457500409	$ 145.000	COLPENSIONES	9457500409	$ 185.600	$ 46.400	$ 34.800	$23.200	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
PRECOOPERA PRECOOPI PRECOOPERATI PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA
NIT. 900,256,6! NIT. 900,25 NIT. 900,256,694- NIT. 900,256,694-5
JAIRO ALBER JAIRO ALB JAIRO ALBERTO JAIRO ALBERTO CRUZ ALVEZ
Representante Representa Representante Le Representante Legal
CC: 15.877.03 CC: 15.877. CC: 15.877.033 d CC: 15.877.033 de Leicia - Tarapaca

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901734940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3066 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA SECTOR SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III PR57+0500 - PR96+0000, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
																																				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HILDE ALFONSO BALLEN VILLADA	7.717.007	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	COOMEVA EPS	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
2	VICTOR ALFONSO CARDOZO ROMERO	1.081.155.103	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	MEDIMAS EPS	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
3	JOSE LOEIDER ERAZO DAZA	1.089.905.582	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	ESSC ASMET SALUD	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
4	ARGEMIRO ESPINOSA NARVAEZ	1.610.913	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	COOMEVA EPS	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
5	BERNABE GAITAN BUITRAGO	14.125.016	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
6	JOSE MARIA GALLEGO GRAJALES	18.599.627	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	MEDIMAS EPS	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
7	DUBER IJAJI	17.774.117	REPRESENTANTE LEGAL	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	MEDIMAS EPS	9457259331	$ 46.400	PORVENIR	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
8	JHON JADIR LOPEZ ARCOS	1.117.823.603	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	ESSC ASMET SALUD	9457259331	$ 46.400	PORVENIR	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
9	EMILIO SANCHEZ HERNANDEZ	17.672.959	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	MEDIMAS EPS	9457259331	$ 46.400	PORVENIR	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
10	LENIN SANCHEZ PEREZ	4.887.549	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9457259331	$ 46.400	COLPENSIONES	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
11	ESTEVAN TIMANA PATIÑO	17.672.831	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	NUEVA E.P.S. S.A.	9457259331	$ 46.400	PORVENIR	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
12	JOSE RAFAEL TIMANA PATIÑO	17.773.951	COOPERATIVO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS	$ 1.160.000	$ 50.500	IV	MEDIMAS EPS	9457259331	$ 46.400	PORVENIR	9457259331	$ 185.600	$ 46.400	0	0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma DUBER IJAJI
DUBER IJAJI
Representante Legal
CC: 17,774,117 de San Vicente del Caguán
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS
NIT. 828,001,249-5

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901734940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 18 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2313 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1204319	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 82.125.453	
2020	159820	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 434.584.208	
2021	172421	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 473.296.667	
2022	203922	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 292.655.934	
2022	817422	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2313-1 DE 2022	$ 135.406.338	
2022	1331022	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2313-2 DE 2022	$ 51.563.189	
2023	65623	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO ADICIONAL 2313-4 DE 2023	$ 83.615.982	
2023	305823	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2313-5 DE 2023	$ 184.791.320	
2023	137223	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2313-6 DE 2023	$ 46.197.830	
2023	992423	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2313-7 DE 2023	$ 23.098.915	
		TOTAL				**$ 1.807.335.836**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.807.335.836,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1204319 De (12/12/2019) - No. 159820 De (13/02/2020)- No 172421 De (19/2/2021)-No. 203922 De (9/2/2022) No 178122 De (18/7/2022) No 1331022 De (23/12/2022) No 65623 De (25/1/2023) No 305823 De (24/3/2023) No. 992423 De (1/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									$ 82.125.453		**$ 1.807.335.836**				Registro presupuestal año 2019
1		Diciembre 16 de 2019 -Enero 15 de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 45.910.102	$ 45.910.102	$ 1.771.120.485		X		
2		16 a 31 de Enero de 2020	$ 17.800.218	$ 307.458	$ 18.107.676		$ 18.107.676		$ 27.802.426	$ 27.802.426	$ 1.753.012.809		X		
									$ 434.584.208						Registro presupuestal año 2020
3		Febrero de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 426.171.283	$ 426.171.283	$ 1.716.797.458		X		
4		Marzo de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 389.955.932	$ 389.955.932	$ 1.680.582.107		X		
5		Abril de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 353.740.581	$ 353.740.581	$ 1.644.366.756		X		
6		Mayo de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 317.525.230	$ 317.525.230	$ 1.608.151.405		X		
7		Junio de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 281.309.879	$ 281.309.879	$ 1.571.936.054		X		
8		Julio de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 245.094.528	$ 245.094.528	$ 1.535.720.703		X		
9		Agosto de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 208.879.177	$ 208.879.177	$ 1.499.505.352		X		
10		Septiembre de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 172.663.826	$ 172.663.826	$ 1.463.290.001		X		
11		Octubre de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 136.448.475	$ 136.448.475	$ 1.427.074.650		X		
12		noviembre de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 100.233.124	$ 100.233.124	$ 1.390.859.299		X		
13		diciembre de 2020	$ 35.600.434	$ 614.917	$ 36.215.351		$ 36.215.351		$ 64.017.773	$ 64.017.773	$ 1.354.643.948		X		
14		enero de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 24.576.385	$ 24.576.385	$ 1.315.202.560		X		
									$ 473.296.667						Registro presupuestal año 2021
15		febrero de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 458.431.664	$ 458.431.664	$ 1.275.761.172		X		
16		marzo de 2021	$ 38.771.696	$ 669.693	$ 39.441.389		$ 39.441.389		$ 418.990.275	$ 418.990.275	$ 1.236.319.783		X		
17		abril de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 379.548.887	$ 379.548.887	$ 1.196.878.395		X		
18		mayo de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 340.107.499	$ 340.107.499	$ 1.157.437.007		X		
19		junio de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 300.666.111	$ 300.666.111	$ 1.117.995.619		X		
20		julio de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 261.224.723	$ 261.224.723	$ 1.078.554.231		X		
21		agosto de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 221.783.335	$ 221.783.335	$ 1.039.112.843		X		
22		septiembre de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 182.341.947	$ 182.341.947	$ 999.671.455		X		
23		octubre de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 142.900.559	$ 142.900.559	$ 960.230.067		X		
24		noviembre de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 103.459.171	$ 103.459.171	$ 920.788.679		X		
25		diciembre de 2021	$ 38.771.695	$ 669.693	$ 39.441.388		$ 39.441.388		$ 64.017.783	$ 64.017.783	$ 881.347.291		X		
26		enero de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 22.209.792	$ 22.209.792	$ 839.539.300		X		
									$ 292.655.934						Registro presupuestal año 2022
27		febrero de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 273.057.735	$ 273.057.735	$ 797.731.309		X		
28		marzo de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 231.249.744	$ 231.249.744	$ 755.923.318		X		
29		abril de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 189.441.753	$ 189.441.753	$ 714.115.327		X		
30		mayo de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 147.633.762	$ 147.633.762	$ 672.307.336		X		
31		junio de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 105.825.771	$ 105.825.771	$ 630.499.345				
									$ 135.406.338						Adicional 2313-1 de 2022
32		julio de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 199.424.118	$ 199.424.118	$ 588.691.354		X		
33		agosto de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 157.616.127	$ 157.616.127	$ 546.883.363		X		
34		septiembre de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 115.808.136	$ 115.808.136	$ 505.075.372		X		
35		octubre de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 74.000.145	$ 74.000.145	$ 463.267.381		X		
36		noviembre de 2022	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 32.192.154	$ 32.192.154	$ 421.459.390		X		
37		diciembre de 2022	$ 28.905.675	$ 499.280	$ 29.404.955		$ 29.404.955		$ 2.787.199	$ 2.787.199	$ 392.054.435		X		
									$ 51.563.189						Adicional 2313-2 de 2022
									$ 83.615.982						Adicional 2313-4 de 2023
38		enero de 2023	$ 53.427.549	$ 922.839	$ 54.350.388		$ 54.350.388		$ 83.615.982	$ 83.615.982	$ 337.704.047		X		
39		febrero de 2023	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 41.807.991	$ 41.807.991	$ 295.896.056		X		
									$ 184.791.320						Adicional 2313-5 de 2023
40		marzo de 2023	$ 41.098.114	$ 709.877	$ 41.807.991		$ 41.807.991		$ 184.791.320	$ 184.791.320	$ 254.088.065		X		
41		abril de 2023	$ 45.413.416	$ 784.414	$ 46.197.830		$ 46.197.830		$ 138.593.490	$ 138.593.490	$ 207.890.235		X		
42		mayo de 2023	$ 45.413.416	$ 784.414	$ 46.197.830		$ 46.197.830		$ 92.395.660	$ 92.395.660	$ 161.692.405		X		
43		junio de 2023	$ 45.413.416	$ 784.414	$ 46.197.830		$ 46.197.830		$ 46.197.830	$ 46.197.830	$ 115.494.575				
									$ 46.197.830						Adicional 2313-6 de 2023
44		julio de 2023	$ 45.413.416	$ 784.414	$ 46.197.830		$ 46.197.830		$ 46.197.830	$ 46.197.830	$ 69.296.745		X		
									$ 23.098.915						Adicional 2313-7 de 2023
45		agosto de 2023	$ 45.413.416	$ 784.414	$ 46.197.830		$ 46.197.830		$ 23.098.915	$ 23.098.915	$ 23.098.915				
46-FINAL		1 al 15 septiembre de 2023	$ 22.706.708	$ 392.207	$ 23.098.915		$ 23.098.915		$ -	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 1.776.648.261**	**$ 30.687.575**	**$ 1.807.335.836**		**$ 1.807.335.836**		**$ -**	**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 1.776.648.261**	**$ 30.687.575**	**$ 1.807.335.836**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 1.776.648.261**	**$ 30.687.575**	**$ 1.807.335.836**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
NIT. 828.000.747-7
HERMOGENES MONTENEGRO VERA
Representante Legal
CC N° 17.774.382 De San Vicente del Caguán -Caqueta

Firma

CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 18 9 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2314 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

MES INFORME MENSUAL: 1 A 15 SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1204219	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 86.064.025,00	
2020	159620	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 455.425.989,00	
2021	170221	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 495.995.029,00	
2022	204222	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 306.691.131,00	
2022	951522	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2314-2 DE 2022	$ 141.900.160,00	
2022	1330822	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2314-3 DE 2022	$ 54.036.057,00	
2023	83923	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO ADICIONAL 2314-5 DE 2023	$ 87.626.038,00	
2023	306223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	NACION	CONTRATO ADICIONAL 2314-6 DE 2023	$ 193.253.540,00	
2023	137223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	NACION	CONTRATO ADICIONAL 2314-7 DE 2023	$ 48.313.385,00	
2023	990823	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2314-8 DE 2023	$ 24.156.693,00	
			TOTAL			**$ 1.893.462.047,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.893.462.047,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.120419 De (12/12/2019) - No. 159620 De (13/02/2020)-No. 170221 De(19/02/2021)-No 204222 De(9/2/2022)-No 206622 De(8/2/2022) No 1330822 De(23/12/2022) No 83923 (30/1/2023)No 306223 (24/3/2023) No. 990823 (1/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 86.064.025,00		**$ 1.893.462.047**				Registro presupuestal año 2019
1		Diciembre 16 de 2019 - Enero 15 de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 48.111.859,00	$ 48.111.859,00	$ 1.855.509.881,00		X		
2		16 a 31 de Enero de 2020	$ 18.653.880,00	$ 322.203,00	$ 18.976.083,00		$ 18.976.083,00		$ 29.135.776,00	$ 29.135.776,00	$ 1.836.533.798,00		X		
									$ 455.425.989,00						Registro presupuestal año 2020
3		Febrero de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 446.609.599,00	$ 446.609.599,00	$ 1.798.581.632,00		X		
4		Marzo de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 408.657.433,00	$ 408.657.433,00	$ 1.760.629.466,00		X		
5		Abril de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 370.705.267,00	$ 370.705.267,00	$ 1.722.677.300,00		X		
6		Mayo de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 332.753.101,00	$ 332.753.101,00	$ 1.684.725.134,00		X		
7		Junio de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 294.800.935,00	$ 294.800.935,00	$ 1.646.772.968,00		X		
8		Julio de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 256.848.769,00	$ 256.848.769,00	$ 1.608.820.802,00		X		
9		Agosto de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 218.896.603,00	$ 218.896.603,00	$ 1.570.868.636,00		X		
10		Septiembre de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 180.944.437,00	$ 180.944.437,00	$ 1.532.916.470,00		X		
11		Octubre de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 142.992.271,00	$ 142.992.271,00	$ 1.494.964.304,00		X		
12		noviembre de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 105.040.105,00	$ 105.040.105,00	$ 1.457.012.138,00		X		
13		diciembre de 2020	$ 37.307.759,00	$ 644.407,00	$ 37.952.166,00		$ 37.952.166,00		$ 67.087.939,00	$ 67.087.939,00	$ 1.419.059.972,00		X		
14		enero de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 25.755.020,00	$ 25.755.020,00	$ 1.377.727.053,00		X		
									$ 495.995.029,00						Registro presupuestal año 2021
15		febrero de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 480.417.130,00	$ 480.417.130,00	$ 1.336.394.134,00		X		
16		marzo de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 439.084.211,00	$ 439.084.211,00	$ 1.295.061.215,00		X		
17		abril de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 397.751.292,00	$ 397.751.292,00	$ 1.253.728.296,00		X		
18		mayo de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 356.418.373,00	$ 356.418.373,00	$ 1.212.395.377,00		X		
19		junio de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 315.085.454,00	$ 315.085.454,00	$ 1.171.062.458,00		X		
20		julio de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 273.752.535,00	$ 273.752.535,00	$ 1.129.729.539,00		X		
21		agosto de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 232.419.616,00	$ 232.419.616,00	$ 1.088.396.620,00		X		
22		septiembre de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 191.086.697,00	$ 191.086.697,00	$ 1.047.063.701,00		X		
23		octubre de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 149.753.778,00	$ 149.753.778,00	$ 1.005.730.782,00		X		
24		noviembre de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 108.420.859,00	$ 108.420.859,00	$ 964.397.863,00		X		
25		diciembre de 2021	$ 40.631.109,00	$ 701.810,00	$ 41.332.919,00		$ 41.332.919,00		$ 67.087.940,00	$ 67.087.940,00	$ 923.064.944,00		X		
26		enero de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 23.274.921,00	$ 23.274.921,00	$ 879.251.925,00		X		
									$ 306.691.131,00						Registro presupuestal año 2022
27		febrero de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 286.153.033,00	$ 286.153.033,00	$ 835.438.906,00		X		
28		marzo de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 242.340.014,00	$ 242.340.014,00	$ 791.625.887,00		X		
29		abril de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 198.526.995,00	$ 198.526.995,00	$ 747.812.868,00		X		
30		mayo de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 154.713.976,00	$ 154.713.976,00	$ 703.999.849,00		X		
31		junio de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 110.900.957,00	$ 110.900.957,00	$ 660.186.830,00		X		
32		julio de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 67.087.938,00	$ 67.087.938,00	$ 616.373.811,00		X		
33		agosto de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 23.274.919,00	$ 23.274.919,00	$ 572.560.792,00		X		
									$ 141.900.160,00						Contrato adicional 2314-2 de 2022
34		septiembre de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 121.362.060,00	$ 121.362.060,00	$ 528.747.773,00		X		
35		octubre de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 77.549.041,00	$ 77.549.041,00	$ 484.934.754,00		X		
36		noviembre de 2022	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 33.736.022,00	$ 33.736.022,00	$ 441.121.735,00		X		
37		diciembre de 2022	$ 30.291.930,00	$ 523.224,00	$ 30.815.154,00		$ 30.815.154,00		$ 2.920.868,00	$ 2.920.868,00	$ 410.306.581,00		X		
									$ 54.036.057,00						Contrato adicional 2314-3 de 2022
									$ 87.626.038,00						Contrato adicional 2314-5 de 2023
38		enero de 2023	$ 55.989.828,00	$ 967.097,00	$ 56.956.925,00		$ 56.956.925,00		$ 87.626.038,00	$ 87.626.038,00	$ 353.349.656,00		X		
39		febrero de 2023	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00	$ 43.813.019,00	$ 309.536.637,00		X		
									$ 193.253.540,00						Contrato adicional 2314-6 de 2023
40		marzo de 2023	$ 43.069.098,00	$ 743.921,00	$ 43.813.019,00		$ 43.813.019,00		$ 193.253.540,00	$ 193.253.540,00	$ 265.723.618,00		X		
41		abril de 2023	$ 47.493.050,00	$ 820.335,00	$ 48.313.385,00		$ 48.313.385,00		$ 144.940.155,00	$ 144.940.155,00	$ 217.410.233,00		X		
42		mayo de 2023	$ 47.493.050,00	$ 820.335,00	$ 48.313.385,00		$ 48.313.385,00		$ 96.626.770,00	$ 96.626.770,00	$ 169.096.848,00		X		
43		junio de 2023	$ 47.493.049,74	$ 820.335,00	$ 48.313.384,74		$ 48.313.384,74		$ 48.313.385,26	$ 48.313.385,26	$ 120.783.463,26		X		
									$ 48.313.385,00						Contrato adicional 2314-7 de 2023
44		julio de 2023	$ 47.493.049,94	$ 820.335,00	$ 48.313.384,94		$ 48.313.384,94		$ 48.313.385,32	$ 48.313.385,32	$ 72.470.078,32		X		
									$ 24.156.693,00						Contrato adicional 2314-8 de 2023
45		agosto de 2023	$ 47.493.050,00	$ 820.335,00	$ 48.313.385,00		$ 48.313.385,00		$ 24.156.693,32	$ 24.156.693,32	$ 24.156.693,32		X		
46-FINAL		1 al 15 septiembre 2023	$ 23.746.526,00	$ 410.167,00	$ 24.156.693,00		$ 24.156.693,00		$ 0,32	$ 0,32	$ 0,32				
TOTALES			**$ 1.861.312.103,68**	**$ 32.149.943,00**	**$ 1.893.462.046,68**		**$ 1.893.462.046,68**		**$ 0,32**	**$ 0,32**	**$ 0,32**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 1.861.312.103,68**	**$ 32.149.943,00**	**$ 1.893.462.046,68**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 1.861.312.103,68**	**$ 32.149.943,00**	**$ 1.893.462.046,68**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS
NIT. 828.001.249-5
DUBER IJAJI
Representante Legal
CC Nº 17.774.117 De San Vicente del Caguán

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 18 9 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2315 DE 2019 **CONTRATISTA:** PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1202419	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 32.821.433	
2020	159220	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 170.175.241	
2021	171821	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 185.941.272	
2022	204422	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 114.974.013	
2022	840222	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2315-1 DE 2022	$ 52.615.778	
2022	1330622	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2315-2 DE 2022	$ 20.257.326	
2023	65323	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO ADICIONAL 2315-4 DE 2023	$ 32.849.718	
2023	301023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2315-5 DE 2023	$ 72.597.876	
2023	137223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2315-6 DE 2023	$ 18.149.469	
2023	992423	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2315-7 DE 2023	$ 9.074.735	
		TOTAL				**$ 709.456.861**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 709.456.861,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1202419 De (12/12/2019) - No. 159220 De (13/02/2020)-No 171821 De (19/2/2021) - No. 204422 De 09/02/2022 No. 840222 De (27/07/2022) No. 1330622 De (23/12/2022) No 65323 De (25/1/2023) No 301023 De (24/3/2023) No. 992423 De (1/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									$ 32.821.433		**$ 709.456.861**				Registro presupuestal año 2019
1		Diciembre 16 de 2019 - Enero 15 de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 18.640.163	$ 18.640.163	$ 695.275.591		X		
2		16 a 31 de Enero de 2020	$ 7.090.635		$ 7.090.635		$ 7.090.635		$ 11.549.528	$ 11.549.528	$ 688.184.956		X		
									$ 170.175.241						Registro presupuestal año 2020
3		Febrero de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 167.543.499	$ 167.543.499	$ 674.003.686		X		
4		Marzo de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 153.362.229	$ 153.362.229	$ 659.822.416		X		
5		Abril de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 139.180.959	$ 139.180.959	$ 645.641.146		X		
6		Mayo de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 124.999.689	$ 124.999.689	$ 631.459.876		X		
7		Junio de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 110.818.419	$ 110.818.419	$ 617.278.606		X		
8		Julio de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 96.637.149	$ 96.637.149	$ 603.097.336		X		
9		Agosto de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 82.455.879	$ 82.455.879	$ 588.916.066		X		
10		Septiembre de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 68.274.609	$ 68.274.609	$ 574.734.796		X		
11		Octubre de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 54.093.339	$ 54.093.339	$ 560.553.526		X		
12		noviembre de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 39.912.069	$ 39.912.069	$ 546.372.256		X		
13		diciembre de 2020	$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 14.181.270		$ 25.730.799	$ 25.730.799	$ 532.190.986		X		
14		enero de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 10.235.693	$ 10.235.693	$ 516.695.880		X		
									$ 185.941.272						Registro presupuestal año 2021
15		febrero de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 180.681.859	$ 180.681.859	$ 501.200.774		X		
16		marzo de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 165.186.753	$ 165.186.753	$ 485.705.668		X		
17		abril de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 149.691.647	$ 149.691.647	$ 470.210.562		X		
18		mayo de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 134.196.541	$ 134.196.541	$ 454.715.456		X		
19		junio de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 118.701.435	$ 118.701.435	$ 439.220.350		X		
20		julio de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 103.206.329	$ 103.206.329	$ 423.725.244		X		
21		agosto de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 87.711.223	$ 87.711.223	$ 408.230.138		X		
22		septiembre de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 72.216.117	$ 72.216.117	$ 392.735.032		X		
23		octubre de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 56.721.011	$ 56.721.011	$ 377.239.926		X		
24		noviembre de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 41.225.905	$ 41.225.905	$ 361.744.820		X		
25		diciembre de 2021	$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 15.495.106		$ 25.730.799	$ 25.730.799	$ 346.249.714		X		
26		enero de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 9.305.940	$ 9.305.940	$ 329.824.855		X		
									$ 114.974.013						Registro presupuestal 2022
27		febrero de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 107.855.094	$ 107.855.094	$ 313.399.996		X		
28		marzo de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 91.430.235	$ 91.430.235	$ 296.975.137		X		
29		abril de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 75.005.376	$ 75.005.376	$ 280.550.278		X		
30		mayo de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 58.580.517	$ 58.580.517	$ 264.125.419		X		
31		junio de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 42.155.658	$ 42.155.658	$ 247.700.560		X		
									$ 52.615.778						Cto. Adicional 2315-1 de 2022
32		julio de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 78.346.577	$ 78.346.577	$ 231.275.701		X		
33		agosto de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 61.921.718	$ 61.921.718	$ 214.850.842		X		
34		septiembre de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 45.496.859	$ 45.496.859	$ 198.425.983		X		
35		octubre de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 29.072.000	$ 29.072.000	$ 182.001.124		X		
36		noviembre de 2022	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 12.647.141	$ 12.647.141	$ 165.576.265		X		
37		diciembre de 2022	$ 11.552.150		$ 11.552.150		$ 11.552.150		$ 1.094.991	$ 1.094.991	$ 154.024.115		X		
									$ 20.257.326						Cto. Adicional 2315-2 de 2022
									$ 32.849.718						Cto. Adicional 2315-4 de 2023
38		enero de 2023	$ 21.352.317		$ 21.352.317		$ 21.352.317		$ 32.849.718	$ 32.849.718	$ 132.671.798		X		
39		febrero de 2023	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859	$ 16.424.859	$ 116.246.939		X		
									$ 72.597.876						Cto. Adicional 2315-5 de 2023
40		marzo de 2023	$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 16.424.859		$ 72.597.876	$ 72.597.876	$ 99.822.080		X		
41		abril de 2023	$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 54.448.407	$ 54.448.407	$ 81.672.611		X		
42		mayo de 2023	$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 36.298.938	$ 36.298.938	$ 63.523.142		X		
43		junio de 2023	$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469	$ 18.149.469	$ 45.373.673		X		
									$ 18.149.469						Cto. Adicional 2315-6 de 2023
44		julio de 2023	$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469	$ 18.149.469	$ 27.224.204		X		
									$ 9.074.735						Cto. Adicional 2315-7 de 2023
45		agosto de 2023	$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 18.149.469		$ 9.074.735,0	$ 9.074.735,0	$ 9.074.735		X		
46		1 al 15 septiembre de 2023	$ 9.074.735,0		$ 9.074.735		$ 9.074.735		$ -	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 709.456.861**	$ -	**$ 709.456.861**		**$ 709.456.861**		$ -	$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 709.456.861**	$ -	**$ 709.456.861**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 709.456.861**	$ -	**$ 709.456.861**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA
NIT. 900.256.694-5
JAIRO ALBERTO CRUZ ALVEZ
Representante Legal
CC N° 15.877.033 de Leticia - Amazonas

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 12 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2696 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

MES INFORME MENSUAL: 8 DE AGOSTO A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	911923	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 58.129.870	
TOTAL						**$ 58.129.870**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 58.129.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.911923 De (3/8/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 58.129.870		**$ 58.129.870**				Registro presupuestal año 2023
1-FINAL		8 AGOSTO A 8 SEPTIEMBRE DE 2023	$ 57.142.857	$ 987.013	$ 58.129.870		$ 58.129.870		$ -	$ -	$ -		X		
TOTALES			**$ 57.142.857**	**$ 987.013**	**$ 58.129.870**		**$ 58.129.870**		**$ -**	**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 57.142.857**	**$ 987.013**	**$ 58.129.870**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 57.142.857**	**$ 987.013**	**$ 58.129.870**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA
NIT. 828.001.298-6
JOSE ORLINSON MONSALVE
Representante Legal
CC N° 17.702.965 De Puerto Rico -Caqueta

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3024 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

MES INFORME MENSUAL: 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1033023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 231.995.316	
TOTAL						**$ 231.995.316**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 231.995.316,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1033023 De (18/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 231.995.316		**$ 231.995.316**				CONTRATO PRINCIPAL
1		21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 19.004.680	$ 328.263	$ 19.332.943		$ 19.332.943		$ 212.662.373	$ 212.662.373	$ 212.662.373				
TOTALES			**$ 19.004.680**	**$ 328.263**	**$ 19.332.943**		**$ 19.332.943**		**$ -**	**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 19.004.680**	**$ 328.263**	**$ 19.332.943**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 19.004.680**	**$ 328.263**	**$ 19.332.943**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA
NIT. 828.001.298-6
JOSE ORLINSON MONSALVE
Representante Legal
CC N° 17.702.965 De Puerto Rico -Caqueta



Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3042 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

MES INFORME MENSUAL: 21 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1030223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 182.211.140	
TOTAL						**$ 182.211.140**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 182.211.140,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1030223 De (18/9/2023))	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 182.211.140		**$ 182.211.140**				CONTRATO PRINCIPAL
1		21 a 30 de septiembre de 2023	$ 14.926.442	$ 257.820	$ 15.184.262		$ 15.184.262		$ 167.026.878	$ 167.026.878	$ 167.026.878				
TOTALES			**$ 14.926.442**	**$ 257.820**	**$ 15.184.262**		**$ 15.184.262**		**$ 167.026.878**	**$ 167.026.878**	**$ 167.026.878**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 14.926.442**	**$ 257.820**	**$ 15.184.262**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 14.926.442**	**$ 257.820**	**$ 15.184.262**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Hermogenes Montenegro Vera
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
NIT. 828.000.747-7
HERMOGENES MONTENEGRO VERA
Representante Legal
CC N° 17.774.382 De San Vicente del Caguán -Caqueta

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 3 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3064 DE 2023 **CONTRATISTA:** PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

MES INFORME MENSUAL: 21 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1037323	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 71.031.792	
TOTAL						**$ 71.031.792**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 71.031.792,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1037323 De (19/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									$ 71.031.792		**$ 71.031.792**				CONTRATO PRINCIPAL
1		21 a 30 de septiembre de 2023	$ 5.919.316		$ 5.919.316		$ 5.919.316		$ 65.112.476	$ 65.112.476	$ 65.112.476				
TOTALES			**$ 5.919.316**	**$ -**	**$ 5.919.316**		**$ 5.919.316**		**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 5.919.316**	**$ -**	**$ 5.919.316**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 5.919.316**	**$ -**	**$ 5.919.316**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA
NIT. 900.256.694-5
JAIRO ALBERTO CRUZ ALVEZ
Representante Legal
CC N° 15.877.033 de Leticia - Amazonas

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 3 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3066 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

MES INFORME MENSUAL: 21 A 30 SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1032423	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 190.697.803,00	
TOTAL						**$ 190.697.803,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 190.697.803,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1032423 De (18/9/2023)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 190.697.803,00		**$ 190.697.803**				Registro presupuestal año 2019
1		21 a 30 septiembre de 2023	$ 15.621.655,00	$ 269.829,00	$ 15.891.484,00		$ 15.891.484,00		$ 174.806.319,00	$ 174.806.319,00	$ 174.806.319,00		X		
TOTALES			**$ 15.621.655,00**	**$ 269.829,00**	**$ 15.891.484,00**		**$ 15.891.484,00**		**$ 174.806.319,00**	**$ 174.806.319,00**	**$ 174.806.319,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 15.621.655,00**	**$ 269.829,00**	**$ 15.891.484,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 15.621.655,00**	**$ 269.829,00**	**$ 15.891.484,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma DUBER IJASI
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS
NIT. 828.001.249-5
DUBER IJAJI
Representante Legal
CC N° 17.774.117 De San Vicente del Caguán

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2313-2314-2315-1421 3024-3042-3066-3064 **CONTRATISTA:** CTA LOS COLONOS - CTA LOS LEJANOS - PCTA CENTRAL DE LETICIA - CTA LA SUREÑA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO D.T. CAQUETA GRUPO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	22	24	24	23	24	23	24	24	19	24	24	24	24	18	24	24	16	24	23	23	24	23	22	23	23	24	23	22	18	20		677
Lluvias moderadas	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	5	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	2	4	3		32
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1		11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN EL COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DEL TIEMPO SE ESTABLECIÓ CON APROXIMADAMENTE 677 HORAS CON TIEMPO SECO, 32 HORA CON LLUVIAS MODERADAS Y 11 HORAS DE LLUVIAS INTENSAS.

Firma Hermogenes Montenegro

COOP. TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS
NIT. 828.000.747-7
HERMOGENES MONTENEGRO VERA
Representante Legal
CC N° 17.774.382 De San Vicente del Caguán

FIRMA: Duber Ijaji

COOP. DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS
NIT. 828.001.249-5
DUBER IJAJI
Representante Legal
CC N° 17.774.117 De San Vicente del Caguán

FIRMA:

PRECOOP. TRAB ASOC CENTRAL VIAS LETICIA
NIT. 900.256.694-5
JAIRO ALBERTO CRUZ ALVEZ
Representante Legal
CC N° 15.877.033 de Leticia - Amazonas

Firma:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA
NIT. 828.001.298
JOSÉ ORLINSO MONSALVE
Representante Legal
CC N° 17.702.965 De Puerto Rico

FIRMA:

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2696 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SUREÑA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ. SECTORES 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN, PR0+0000 - PR52+0000. LOTE 7.

FECHA DE INICIO: 8 de agosto de 2023

PLAZO INICIAL: 8 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8 de septiembre de 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 58.129.870,00

VALOR ACUMULADO: $ 58.129.870,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.812.990,00	2	8	2023	12	3	2024
Calidad del servicio	30%	$ 17.438.970,00	2	8	2023	2	9	2028
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.625.980,00	2	8	2023	2	9	2026
Calidad de los bienes								
Respondabilidad Civil Extracontractual			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHJ-100004568

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	2	8	2023	12	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CHJ-100004568 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2313 de 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COLONOS

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, EN LOS SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUÁN - MINA BLANCA PR52+0000 - PR81+0092 Y 3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 - PR111+0000.

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 2019

PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.282.662.262,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.807.335.836,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 128.266.226,20	9	12	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 513.064.904,80	9	12	2019	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 256.532.452,40	9	12	2019	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Respondabilidad Civil Extracontractual			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA026166

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16 de diciembre de 2019

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 248.435.100,00	9	12	2019	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026175 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16 de diciembre de 2019

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 6 **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 180.733.584,00	30	8	2023	15	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 722.934.334,00	30	8	2023	15	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 361.467.167,00	30	8	2023	15	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA026166

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 6 **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 174.000.000,00	30	8	2023	15	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026175 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4 de septiembre de 2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2315 de 2019 **CONTRATISTA:** PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTRAL DE VIAS DE LETICIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, EN EL SECTOR 8501 LETICIA - TARAPACÁ PR4+0386 - PR25+0000

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 2019

PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 503.911.959,00

VALOR ACUMULADO: $ 709.456.861,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 50.391.195,90	9	12	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 201.564.783,60	9	12	2019	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 100.782.391,80	9	12	2019	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Respondabilidad Civil Extracontractual			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA026168

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13 de diciembre de 2019

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.400,00	9	12	2019	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026176 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de diciembre de 2019

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	2	10	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 7 **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 70.945.686,00	30	8	2023	15	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 283.782.744,00	30	8	2023	15	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 141.891.372,00	30	8	2023	15	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA026168

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 6 **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 116.000.000,00	30	8	2023	15	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026177 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4 de septiembre de 2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2	10	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2314 de 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, EN EL SECTOR 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III PR57+0500 - PR96+0000.

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 2019

PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.344.176.174,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.893.462.047,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2702 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 134.417.617,40	9	12	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 537.670.469,60	9	12	2019	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 268.835.234,80	9	12	2019	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Respondabilidad Civil Extracontractual			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA026167

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13 de diciembre de 2019

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 248.435.100,00	9	12	2019	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026176 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de diciembre de 2019

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 8 **PRÓRROGA No.:** 8 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 189.346.205,00	30	8	2023	15	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 757.384.819,00	30	8	2023	15	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 378.692.409,00	30	8	2023	15	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA26167

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 01 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 7 **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 200.000.000,00	30	8	2023	15	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA026176 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 01 de septiembre de 2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

La interventoría a cargo del consorcio SLG VIAL, con NIT. 901.734.940-7 (Integrado por SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO con C.C. No. 55.181.920, con un porcentaje de participación del 90%; y GIA INGENIERÍA S.A.S. identificada con NIT. No. 900.617.340-3, con un porcentaje de participación del 10%) encargado de la Administración Vial grupo 3, de la Territorial INVIAS Caquetá, que tiene por Objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3", el Representante Legal es el Ingeniero Luis Gabriel Ibarra Ángel. El contrato inició el 01 de septiembre de 2023 y va hasta 31 de diciembre de 2023.

Contractualmente tiene vinculado a 1 Ingeniero Residente, 1 Ingeniero Auxiliar, 1 Auxiliar Administrativo y 1 conductor; la oficina principal está en el municipio El Guamo, departamento del Tolima y se tiene oficina en San Vicente del Caguán, se cuenta con dos vehículos tipo camioneta y toda la logística contratada.

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL:

8.17.1.1. Participar activamente en la prevención de riesgos y manejo de las emergencias que se presenten en las vías

Vía 6504: Se hace reconocimiento de la vía desde el PR 0+0000 hasta el PR 81+0092, se detectan los sitios más críticos y los sitios con restricción a un carril por daños en la calzada o por trabajos en la vía por parte del contratista del pavimento de la vía Contrato 991 de 2021, ejecutado por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente. Se hace el reporte diario del estado de la vía.
Se monitorean asentamientos en el puente El Águila, se inspecciona socavación por detrás de la aleta del puente La Rastrera y el volcamiento de aleta en puente La Ceiba; se adelanta bacheo con material reciclado del pavimento.

Vía 3002: Se hace reconocimiento de la vía desde el PR 57+0500 hasta el PR 111+0000, se detectan los sitios más críticos y los sitios con restricción a un carril por daños en la calzada. No se adelantan trabajos en la vía por parte del contratista del pavimento de la vía Contrato 991 de 2021, ejecutado por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente. Se hace el reporte diario del estado de la vía.
Se realizaron recorridos diarios para coordinar el desalojo de derrumbes y monitorear los sitios críticos de inestabilidad por movimientos en masa, se programó a la cooperativa Los Lejanos para estar pendientes de retirar material de derrumbe en el PR 58+0500, la

cooperativa mantiene habilitados los pasos con restricción a un carril, para los cuales se solicitó maquinaria mediante oficio radicado a la Territorial.

Vía 8501: se habla con el representante legal de La Pre cooperativa Central vías de Leticia para tener información del estado de la vía. Se hace el reporte diario del estado de la vía.
Se hace revisión y el seguimiento a la alcantarilla de cajón del PR15+0420.

8.17.1.2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos

Vía 6504, En el tramo entre el PR 0+0000 hasta el PR 52+0000, se inició mantenimiento rutinario el día 21 de septiembre de 2023 y se avanza en cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario.
En el presente mes se realizaron trabajos por parte del contratista del pavimento Contrato 991 de 2021, en el PR 2+0560 hasta el PR 5+0000, se ha retirado parte del derrumbe en el PR 16+0400, en el PR 41+0700 hasta el PR 43+0300 se adelantan trabajos de pavimentación, en el PR 45+0480 construcción de alcantarilla.

En el PR4**+**0800 se adelanta construcción de box, ya se tiene instalados aceros en la mitad, no se evidencia avance de obra, al parecer se tuvo diferencias con el diseño.
El tramo presenta varios sitios críticos entre ellos PR4+0800 pontón colapsado, con paso a un carril, actualmente se construye una obra nueva el contrato 991 de 2021, PR 7+0995 perdida de banca, PR 12+0100 inestabilidad del terreno perdida cabezote alcantarilla, PR 16+0400 derrumbe paso a un carril, PR 28+0680 perdida de banca paso a un carril, PR 30+0900 hundimiento de calzada, PR 32+0000 hundimiento de calzada, PR 32+0750 hundimiento de calzada, PR 32+0800 hundimiento de calzada, PR33+0300 perdida de la banca por colapso de muro en gaviones paso a un carril, PR 33+0350 perdida un metro de la banca, PR 33+0500 hundimiento de la vía, PR 36+0850 hundimiento de la vía con paso a un carril, PR 38+0200 hundimiento en la vía. Actualmente el contrato 991 de 2021, labora en Mejoramiento con tres frentes de trabajo PR 2+0560 paso a un carril por construcción de alcantarilla y pavimentación, PR 4+0800 paso a un carril por construcción de alcantarilla de cajón, PR 40+0760 puente la Ceiba, PR 45+0500 paso a un carril por construcción de alcantarilla de cajón.

Se inicia con levantamiento de inventario de obras de drenaje, se identificaron los sitios críticos de la vía.

Vía 3002, se identificaron movimientos en masa que afectan toda la calzada de la vía, cunetas, alcantarillas, señales verticales, muros de contención. En los primeros 20 kilómetros del tramo es donde más afectación hay por movimientos en masa. con sitios críticos de paso restringido a un carril como en los siguientes puntos de referencia:

PR 58+0500, PR 59+0420, PR 60+0740, PR 61+0760, PR 62+0240, PR 62+0540, PR 63+0240, PR 63+0510, PR 64+0430, PR 64+0580, PR 67+0210, PR 67+0470, PR 68+0380, PR 68+0520, PR 68+0590, PR 68+0630, PR 69+0220, PR 69+0700, PR 70+0060, PR 70+0150, PR 70+0680, PR 71+0160, PR 71+0220, PR 71+0280, PR 71+0500, PR 71+0640, PR 71+0690, PR 71+0920, PR 72+0110, PR 72+0190, PR 72+0250, PR 72+0350, PR 73+0110, PR 73+0170, PR 73+0310, PR 73+0370, PR 73+0850, PR 73+0940, PR 74+0090, PR 74+0140, PR 74+0260, PR 74+0320, PR 74+0530, PR 74+0640, PR 74+0890, PR 74+0970, PR 75+0160, PR 75+0400, PR 75+0770, PR 75+0880, PR 76+0260, PR 85+0340, PR 87+0220, PR 89+0020, PR 93+0880, PR 94+0560, PR 95+0150.

El tramo en general presenta afectaciones por hundimientos y perdida de la calzada como en el PR 59+0670, PR 59+0870, PR 63+0660, PR 64+0430, PR 64+0580, PR 68+0630, PR 72+0110, PR 74+0090, PR 85+0340, PR 87+0220, PR 87+0980, PR 89+0020, PR 93+0880, PR 94+0560, PR 95+0150. En el PR64+0430 se presenta colapso de la estructura de salida y un tubo de 36", se requiere construcción de una contención para evitar pérdida de banca. Se requiere intervención para recuperar muros fallados en PR64+0600, 72+0150.

Vía 8501, se habló con el representante legal de la Pre Cooperativa Central de Vías de Leticia, comenta que se construyeron 6 losas de pavimento hace unos meses y en una de ellas quedó una fisura, el contratista demolió una loza del pavimento y hasta el momento está sin reparar, que el box del PR 15+0420 esta fallado. Este box debe reemplazarse por una obra de mayor capacidad hidráulica. En el PR 15+0980 hay que hacer un trincho con madera, ya se tiene la madera, pero se espera que baje el nivel del agua para poder trabajar.

8.17.1.3. Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual

En la R6504

En el presente mes se realizó bacheo con asfalto natural facilitado por un habitante de la región iniciando desde el PR 57+0000 hacia el PR 81+0092, de San Vicente del Caguán a Mina Blanca.

En este tramo el paso Nacional por San Vicente de Caguán es el que presenta afectaciones debido a que los tramos de una calzada y dos sentidos, la vía es muy estrecha, las cunetas y andenes se utilizan para parqueo y los peatones se ven obligados a transitar por la vía. Igualmente, en este paso, es en donde se concentra la accidentalidad y cuando se intervienen las vías urbanas se provoca paso en contravía ya que, es la única forma de circular. Debe considerarse la opción de una variante al paso urbano para que se puedan mejorar las especificaciones técnicas y disminuir la accidentalidad.

Se informa que hay una explotación de materiales de la fuente quebrada el Águila del PR9+0000, con permiso de corpoamazonía; esta explotación podría afectar aguas abajo al puente El Águila, se ha hecho monitoreo y se comprueba que ha habido asentamiento de 7 mm de la viga A de la luz 1 al centro.
En el PR4+0800, se tiene permiso provisional de ocupación de cauce para la construcción de la nueva obra.
En el PR 16+0400, se presenta derrumbe que ha sido retirado poco a poco por el Contratista del Pavimento Contrato 991 de 2021.
En el PR16+0700, se presenta proceso erosivo por inadecuado manejo de aguas en la vía de acceso a finca, que afecta un box de 4x4 que se encuentra colmatado por el sedimento arrastrado, anteriormente se ha presentado presupuesto para su atención.
En el PR51+0840, se presenta afectación de una alcantarilla, de la cuneta y del descole, con colmatación, por la instalación de tubería de 6" de aguas negras y de mangueras con agua potable, igualmente el descole se afecta por la instalación de columnetas en madera. Aunque se hizo bacheo con asfaltita reciclada, el paso sigue en mal estado.

En el paso urbano por San Vicente se debe hacer una evaluación del estado de las redes de servicios públicos que van por la vía nacional, debido a que en el PR52+0300 y 54+0220 se hacen bacheos y el hundimiento persiste.
Se envió informe en donde se solicita que el tramo ya asfaltado requiere demarcación y señalización, así como elementos de seguridad vial, desde el PR 0+0000 al PR 2+0500 y en el PR 41+0000 al PR 48+0000.

En la R3002, se presenta informe solicitando material para bacheo y de atención de sitios críticos con el contrato de Mejoramiento, se priorizan sitios como: PR 58+0500, PR 61+0800, retiro de derrumbe; PR 72+0120, recuperación de la banca con reposición del muro fallado; PR85+0400, ampliación de calzada a 2 carriles de 3,5 metros y verificar afectación del muro, PR87+0220, recuperación de la banca; PR89+000, recuperación de la banca y verificación de la afectación del muro; PR93+0860, recuperación de la banca; PR94+0600 recuperación de banca y prolongación de muro de contención; PR98+0600, recuperación de la banca, reconstrucción del box.

En el PR83+0400 se presentó socavación durante temporada invernal, se debe evaluar la construcción de muro.

Para la R8501, se requiere construcción de obra de mayor capacidad hidráulica en el PR 15+0420.

También debe prevenirse la afectación a cercas en el PR24+0300 que se encuentran muy cerca del talud explanado y que tienen riesgo de volcamiento.
Se requiere priorizar las obras necesarias de la R8501, con la construcción del box culvert del PR15+0420 y de cunetas entre el PR17 al PR19.

8.17.1.4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría

Contrato 1421 de 2023: Cooperativa de Trabajo Asociado La Sureña

Se programaron labores para el cumplimiento de todos los indicadores PR 0+0000 a PR 52+0000, de la vía 6504. Se dio terminación al contrato 1421 de 2023, el día 08 de septiembre de 2023 y se dio inicio al contrato 3024, el día 21 de septiembre de 2023.

Se señalizaron sitios críticos, se realizó la poda de árboles en apoyo al Contrato 991 de 2021, entre el PR 2+0500 al PR 3+0000. Se alcanza a cumplir con indicadores de los ítems de mantenimiento rutinario.

Las principales actividades realizadas:

- ✓ Bacheo
- ✓ Limpieza de cunetas
- ✓ Limpieza de encoles y descoles
- ✓ Limpieza de obras de drenaje
- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Poda y/o corte de árboles
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano
- ✓ Limpieza de señales
- ✓ Señalización de sitios críticos
- ✓ Vigilancia de la vía
- ✓ Atención de emergencias
- ✓ Apoyo a contrato 991 de 2021, poda de árboles
- ✓ Se inició con inventario vial

No se presentan observaciones a la última acta del contrato 1421 de 2023.
No se presentan novedades en salud o por accidentes laborales.

Contrato 2313 de 2019: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Colonos
se programaron labores para el cumplimiento de todos los indicadores PR 52+0000 a PR 81+0092, de la vía 6504 y en la vía 3002 desde el PR 96+0000 al PR 111+0000. Se dio terminación al contrato 2313 de 2019 el día 15 de septiembre de 2023 y se dio inicio al contrato 3042, el día 21 de septiembre de 2023.

Se señalizaron sitios críticos, se mantuvo habilitado el paso por el sitio crítico PR 98+0600 de la vía 3002, que presenta constante caída de detritos y en PR 105+0150 y en el sitio inestable del PR 71+0000 de la vía 6504 que presenta hundimiento, ambos sitios permanecieron debidamente señalizados, se hizo bacheo con asfalto natural (asfaltita) en PR 58+0000 al PR 74+0000, rocería, limpieza de cunetas y poda de árboles. Se alcanza a cumplir con indicadores de los ítems de mantenimiento rutinario.

Las principales actividades realizadas:

- ✓ Bacheo
- ✓ Limpieza de cunetas
- ✓ Limpieza de encoles y descoles
- ✓ Limpieza de obras de drenaje
- ✓ Mantenimiento de puentes
- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Poda y/o corte de árboles
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano
- ✓ Limpieza de señales
- ✓ Señalización de sitios críticos
- ✓ Vigilancia de la vía
- ✓ Mantenimiento de vivero y siembra de árboles
- ✓ Se trabajó en inventario de sitios críticos: derrumbes y hundimientos en la calzada

No se presentan observaciones a la última del contrato 2313 de 2019.
No se presentan novedades en salud o por accidentes laborales.
Cuentan con el curso de trabajo seguro en alturas.

Contrato 2314 de 2019: Cooperativa de Trabajo Asociados Los Lejanos

Se programaron labores para el cumplimiento de indicadores entre el PR 57+0500 al PR 96+0000, de la vía 3002. Se dio terminación al contrato 2314 de 2019 el día 15 de septiembre de 2023 y se dio inicio al contrato 3066, el día 21 de septiembre de 2023.

Se señalizaron sitios críticos, se mantiene habilitado el paso a un carril en los sitios críticos de inestabilidad por movimientos en masa ocurridos en los primeros 20 kilómetros del tramo; se atendieron emergencias mediante retiro de árboles caídos en PR75+0550.

Las principales actividades realizadas:

- ✓ Bacheo

- ✓ Limpieza de cunetas
- ✓ Limpieza de encoles y descoles
- ✓ Limpieza de obras de drenaje
- ✓ Mantenimiento de puentes
- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Poda y/o corte de árboles
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano
- ✓ Limpieza de señales
- ✓ Señalización de sitios críticos
- ✓ Vigilancia de la vía
- ✓ Siembra de árboles

No se presentan observaciones a la última acta del contrato 2314 de 2019.
No se presentan novedades en salud o por accidentes laborales.
Cuentan con el curso de trabajo seguro en alturas.

Contrato 2315 de 2019: Cooperativa de Trabajo Asociado Central de Vías de Leticia

Se programaron labores para el cumplimiento de indicadores entre el PR 4+0386 al PR 25+0000, de la vía 8501. Se dio terminación al contrato 2315 de 2019, el día 15 de septiembre de 2023 y se dio inicio al contrato 3066, el día 21 de septiembre de 2023.

Las principales actividades realizadas:

- ✓ Limpieza de cunetas
- ✓ Limpieza de encoles y descoles
- ✓ Limpieza de obras de drenaje
- ✓ Mantenimiento de pontón
- ✓ Rocería
- ✓ Limpieza de calzada
- ✓ Poda y/o corte de árboles
- ✓ Retiro de derrumbes menores a mano
- ✓ Limpieza de señales
- ✓ Señalización de sitios críticos
- ✓ Vigilancia de la vía
- ✓ Retiro de árbol caído sobre la vía
- ✓ Se consiguió madera para construcción de trincho
- ✓ Se inició con inventario vial

No se presentan observaciones a la última acta del contrato 2315 de 2019.

No se presentan novedades en salud o por accidentes laborales.

8.17.1.5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS

PROVINCIA SELVA AMAZÓNICA
Se atendió requerimiento de revisar y actualizar presupuesto de obra y las necesidades de la vía, elaboración de los respectivos Análisis de Precios Unitarios para el mantenimiento de la carretera Leticia – Tarapacá ruta 8501, PR 4+0386 al PR 20+0600.

PROVINCIA CAGUÁN
No se recibió requerimiento para las vías 6504 y 3002.

8.17.1.6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo

En los tramos a cargo, vía 6504 se han retirado los postes en los sitios intervenidos (PR 42+0000 al PR 47+0000) en la vía 3002, se encuentran todos los demás postes de referencia en buen estado, todos son de concreto reforzado, color fondo blanco y números color negro. En la vía 8501 se instalaron postes en lámina color verde, pero con información herrada el código aparece 0085 cuando debe ser 8501.

8.17.1.7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y presentación de informes y solicitudes de inspecciones especiales

Se realizó la inspección de los puentes y pontones, presentan buen estado y se realizó su mantenimiento rutinario, se lleva formato semanal solicitado por la SRN para atención de emergencias y se mantiene monitoreo de los puentes.

Vía 6504:

EL DESQUITE, presenta escombros de concreto reforzado al centro del cauce que provoca taponamiento y la inundación de casas vecinas, debe removerse con compresor y/o cemento expansivo, se localiza con GPS: Longitud 75°7’9” W y de Latitud 1°55’35” N, se hizo Inventario con la app del SIGP.

JOSEFA, presenta escombros de estructura anterior en el lecho, no tiene barandas, se hizo inventario con la app del SIGP.

EL AGUILA, puente provisional metálico se le reemplazaron 14 láminas de piso y reemplazo de pernos. Se localiza con GPS así: Longitud 75°4'33" W y Latitud 1°56'48" N, se revisaron los apoyos y la pila central, permanecen estables, se adelantó proceso de inventario para SIGP. Se realiza monitoreo del asentamiento y de las grietas en la viga A de la luz 1, que hasta la fecha presenta asentamiento de 7 mm al centro de la luz.

LA DONCELLA, sin novedad, se localiza con GPS de acuerdo a la instrucción del SIGP en el borde derecho del inicio, así: Longitud 75°1'42" W y Latitud 1°57'56" N, se observa desgaste de la capa de rodadura, son visibles aceros de fleje y de refuerzo. Se hizo inventario con la app del SIGP.

RASTRERA, presenta socavación en aleta de entrada, tiene hexápodos que ya tienen más de un año de instalados para mitigar afectación por socavación, se localiza con GPS así: Longitud 75°0'26" W y Latitud 2°0'29" N. Se hizo inventario con la app del SIGP.

RIECITO, puente de armadura metálica de paso a través, a cargo del Ejército Nacional, se le hizo inspección visual, en el año 2022, se le hizo mantenimiento de algunos elementos y reemplazo de tornillos. Se localizó con GPS así: Longitud 74°59'2" W y Latitud 2°0'24" N.

LA CEIBAS, se presenta socavación detrás de aleta y de estribo de inicio y junto a aleta izquierda de inicio, requiere con urgencia recalce de aleta y estribo porque la aleta izquierda de inicio presenta desplazamiento y también se requiere un estudio hidrológico para el diseño de la instalación de hexápodos u otra estructura para redireccionamiento del cauce y el dragado. Se hizo procedimiento de inventario e inspección del SIGP y localización con GPS así: Longitud 74°51'24" W y Latitud 2°3'46" N. Con el contrato 991 de 2021, se ha realizado lleno detrás de la aleta, pero debido a crecientes sigue afectando su estabilidad, un carril cerrado por precaución.

UREYA, sin novedad, se localiza con GPS así: Longitud 74°49'21" W y Latitud 2°5'30" N. Se hizo toma de datos para el SIGP.

ARENOSO, sin novedad, se localiza así: Long. 74°48'48" y Latitud 2°5'32" N.

SIBERIA, sin novedad, se hace inspección del estado de bolsacretos junto a estribo de entrada, se realizó inspección de afectaciones por corrosión, anteriormente se ha enviado informe solicitando visita de especialista en puentes, porque ya hay elementos fallados.

Vía 3002:

LA CAMPANA, sin novedad, se le ha realizado ejercicio de toma de datos para inventario, de acuerdo a la aplicación del SIGP y también el de Inspección.
PERLAS I, sin novedad, se le hizo limpieza a superficie de rodadura, juntas, desagües y barandas en concreto. Se le ha realizado toma de información para el Inventario SIGP.

LA RESACA, Presenta socavación detrás de aleta derecha del estribo 2 (salida), se le hizo limpieza a superestructura y se le ha realizado toma de datos para el Inventario del SIGP con la app correspondiente.

PERLAS II, sin novedad, se le hizo limpieza a superestructura y se le ha realizado toma de datos para SIGP Inventario.

PERLAS III, se realizó inspección del puente, se hizo sobre vuelo con dron para tomar registro fotográfico aéreo del estado del cauce del río aguas arriba, para informar a la Dirección Territorial, que presenta afectación de bolsacretos que protegen los estribos, el encauzamiento con hexápodos ha presentado cambio en el cauce del río y sobre pasó esta barrera, lo cual, pone en riesgo el talud de la vía. Se protege los estribos del puente con bolsacretos, protegiendo estribo inicial que presentan afectación mínima, también la aleta 1 presenta separación; se hace monitoreo, se le hizo limpieza, se tomaron datos para SIGP Inventario.

EL PATO, sin novedad, se le ha realizado inventario con la app del SIGP.

EL PESCADOR, sin novedad, se le ha realizado inventario con la app del SIGP.

LA DANTA, sin novedad, se le ha realizado inventario con la app del SIGP.

8.17.1.8. Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria

En el presente mes, no se realizó capacitación a Cooperativas.


8.17.1.9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país


En el presente mes, no se realizó reunión en coordinación con la Dirección Territorial.

8.17.1.10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS

Esta información se debe presentar en el informe trimestral jul - sept de 2023 que, por inspección realizada a cada tramo de vía, no presentan cambios demostrativos:


Vía 6504, Con 9% en mal estado, 61% en regular estado y 14 % en buen estado.

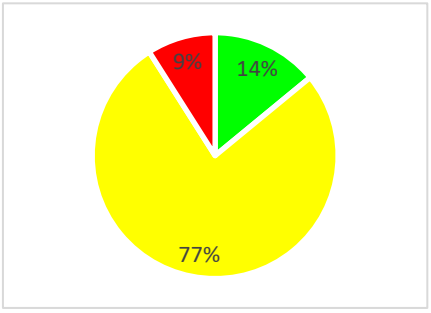


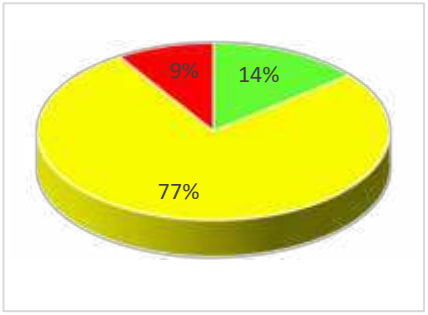

Se evidencia que desde hace meses no hay cambio en el mejoramiento del tramo. El avance de los trabajos de mantenimiento con el contrato 991 de 2021, no se ven reflejados en avance de pavimentación.


Vía 3002, Con 70% en mal estado, 30% en regular estado y buen estado el 0%.

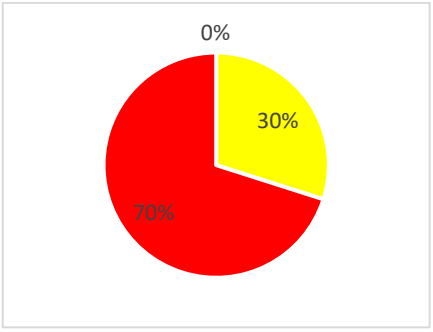


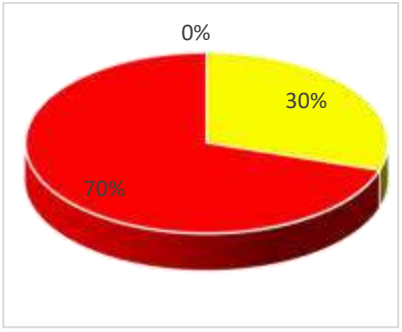

Se observa en comparación con el trimestre anterior que el tramo sigue casi en las mismas condiciones.

Vía **8501**, el tramo se encuentra pavimentado en su totalidad, por eso se puede ver que el 100% se encuentra en buen estado, con algunas lozas en regular estado, el tramo se ha intervenido con contratos de Mejoramiento.

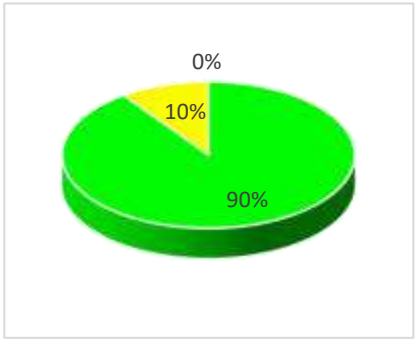

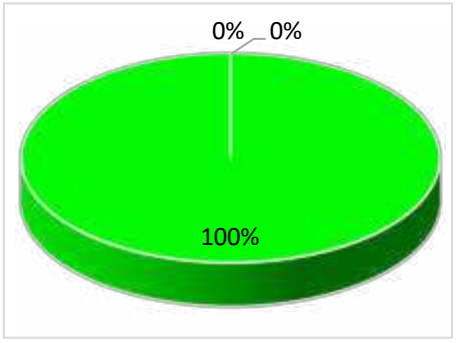

8.17.1.11. Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo

Vía 8501

1. Revisión de presupuesto y elaboración de los Análisis de Precios Unitarios de Mantenimiento de la Carretera Leticia – Tarapacá Ruta 85, Tramo 8501, PR 4+0386 al PR 25+0000.

Vía 6503 y Vía 6504.
2. Contrato VIITS Se encuentra instalado un poste con una cámara en la berma izquierda del PR 40+0940, de la vía 6504, sector Las Ceibas, en el presente mes no se presentaron novedades.

3. Contrato 991 de 2021, Mejoramiento corredor Neiva – Balsillas - San Vicente – Florencia, se realiza acompañamiento en labores de poda y/o corte de árboles entre el PR 0+0000 al PR 5+0000.

8.17.1.12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización

ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y SEÑALIZACION VERTICAL FALTANTE.

RUTA: 6504 / 3002 / 8501 — TRAMO: PUERTO RICO - MINA BLANCA PR0+000 A PR 81+0092 / SANTO DOMINGO - MINA BLANCA PR57+0500 A PR 111+0000 / LETICIA - TARAPACA PR4+0386 A PR 25+0000

			SEÑALES SP, SR Y SI				PASAVIAS				SEÑALES TIPO BANDERA				SEÑALES SI 05 Y SI 06				DELINEADORES DE CURVA				POSTES DE REFERENCIACIÓN				DEFENSAS METÁLICAS			
RUTA	TRAMO	Km.	B	R	M	F	B	R	M	F	B	R	M	F	B	R	M	F	B	R	M	F	B	R	M	F	B	R	M	F
			Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	ml	ml	ml	ml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
65	04	81,14	0	580	570	240	0	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0	14	0	4	44	312	0	82	0	0	410	0	0	1300
30	02	54,24	0	480	474	222	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	3	0	28	80	96	0	53	0	0	2107	11	32	490
85	01	16,235	40	190	100	20	0	1	0	1	1	2	0	2	3	2	0	4	0	1	90	16	0	18	0	2	0	0	0	320
TOTALES:			40	1250	1144	482	0	2	1	3	1	4	1	6	4	4	0	21	0	33	214	424	0	153	0	2	2517	11,4	32	2110

Las últimas señales instaladas son del año 2015 y presentan deficiencia en la reflectividad.

1. Vía 6504, hay 10 puentes, 8 necesitan señalización, en Riecito y El Águila se debe reducir la velocidad de paso para evitar el desgaste de las placas de piso y de los aproches, de acuerdo a concepto del técnico del ejército que realizó la visita de inspección al puente militar.
En el puente La Ceiba, PR40+0800, se encuentra instalada señalización provisional para el cierre del carril izquierdo, afectado por socavación detrás de la aleta, debido a crecientes por ola invernal.

2. Vía 3002, hay 8 puentes, todos necesitan señalización.

3. Vía 8501, hay 1 pontón, necesita señalización.

Para los tramos viales de la Administración Vial grupo 3, se programa el inicio de toma de datos para el inventario de señales verticales de la vía 3002, vía 6504 y vía 8501. Así mismo, los datos recogidos se digitarán en la plataforma HERMES V2.
En la anterior Administración se presentó cuadro de necesidades de señalización 2024-2027, solicitadas por Invías, en donde se incluyeron sistemas de contención vehicular, andenes peatonales y zonas escolares.

8.17.1.13. Recolección, digitación y reporte mensual de la información relacionada con la accidentalidad

1. Vía 6504: No se presentaron accidentes. Se presentó el informe de accidentalidad del mes de agosto.

2. Vía 3002: No se presentaron accidentes.

3. Vía 8501: No se presentaron accidentes.

8.17.1.14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato

Esta labor se realizará cuando INVIAS lo solicite, se tiene el inventario actualizado de las señales verticales y drenajes de todas las vías a cargo y se adelanta inventario vial completo, para presentar informe de Criterio Técnico.

8.17.1.15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes

Vía 6504:
Se espera que, en los reportes diarios del estado de las vías, realizados por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado La Sureña y Los Colonos, se informe de las novedades sobre el buen uso y defensa de las vías para adelantar la respectiva diligencia ante las autoridades locales.

En colaboración con un habitante de la región que facilitó 4 viajes de asfalto natural (asfaltita) a la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Colonos, se ha podido ir tapando huecos desde el PR 57+0000 hacia el PR 81+0092. Con el Contrato 991 de 2021, se realizó bacheo con asfaltita aportada por el contratista y la mano de obra de la Cooperativa Los Colonos en el paso urbano por San Vicente PR56+0200 y en la vía hacia el batallón PR63+0500, en el mes de julio y desde esa fecha no se suministrado material para tapar los huecos.

En el PR 9+0030 hay salida de acopio de materiales extraídos de río Aguililla, que cuenta con permiso de corpoamazonia.

En PR 4+0800, hay intervención de cauce, el cual cuenta con permiso de Corpoamazonía.

En el PR 40+0800 el Contrato 991 de 2021, tiene valla en donde se enuncia el permiso de uso de esta fuente hídrica, de parte de corpoamazonía.

Vía 3002:
Se espera que, en los reportes diarios del estado de las vías, realizados por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado Los Colonos y Los Lejanos, se informe de las novedades sobre el buen uso y defensa de las vías para adelantar la respectiva diligencia ante las autoridades locales.

Se reprogramó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Lejanos para que mantenga habilitados los pasos a un carril y así, garantizar el transito normal, hasta que llegue la maquinaria solicitada a la Dirección Territorial, esperando la asistencia por medio del Contrato 991 de 2021, que hasta la fecha no se tiene confirmación.

Vía 8501:
Se espera que, en los reportes diarios del estado de las vías, realizados por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Central de Vías de Leticia, se informe de las novedades sobre el buen uso y defensa de las vías para adelantar la respectiva diligencia ante las autoridades locales.

INTERACCION CON LAS COMUNIDADES:

Vía 6504
Se hizo la presentación del personal de la Administración Vial, Consorcio SLG VIAL, ante la Alcaldía municipal e Inspección de Policía municipal del municipio de Puerto Rico, de igual manera ante la Alcaldía municipal e Inspección de Policía municipal del Municipio de San Vicente del Caguán, de la misma manera ante la ESE Hospital San Rafael y Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Vicente del Caguán,

Vía 3002
Se hizo la presentación del personal de la Administración Vial, Consorcio SLG VIAL, ante la Alcaldía municipal e Inspección de Policía municipal del Municipio de San Vicente del Caguán, de la misma manera ante la ESE Hospital San Rafael y Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Vicente del Caguán,

Vía 8501
Se consiguió con personas de la comunidad la madera para construcción de trincho, se está esperando que baje el nivel del agua.

8.17.1.16. Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito
No se presentó esta actividad.

8.17.1.17. Llevar a efecto la toma de información y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS

La Administración Vial dispone del equipo GPS de alta precisión.

8.17.1.18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo

De acuerdo al informe trimestral de abril-junio de 2023 y al de criterio técnico, se puede determinar que:

Vía 6504: aunque se prevén las intervenciones hasta San Vicente del Caguán en toda su longitud con pavimento de asfalto en caliente con el proyecto de Vías para la Legalidad, a la salida de San Vicente hacia Mina Blanca, entre PR56 a PR64 la carpeta de asfaltita está muy deteriorada y necesita atención urgente con la instalación de un refuerzo. En este tramo de vía hay dos frentes de trabajo del contrato 991 del 2021, uno es entre el PR 2+0560 al PR 5+0000 y el otro frente en el PR 41+0000 al PR 45+0800.

Vía 3002: se requiere mantenimiento periódico en toda su longitud, hacia la parte alta de la cordillera entre los PR 57+0500 a PR 79+0000, en los primeros 20 kilómetros aproximadamente, es donde se presentan las mayores afectaciones en la estructura del pavimento en asfaltita, con tramos que ya tienen afectada la sub base, luego el tramo entre PR 79+0000 al PR 94+0000, con afectaciones de la capa de asfaltita a excepción de los puntos críticos por hundimiento de calzada y perdida de la banca y finalmente es crítico el estado del tramo entre PR100+0000 al PR105+0000, porque presenta rizado profundo en curvas, que afectan la carpeta y que presenta riesgo de volcamiento si no se reduce la velocidad a menos de 40 KM/H. El resto de la vía necesita una sobre carpeta en asfaltita, utilizando malla geotextil que impida el reflejo de las fisuras.
Se está adelantando recorrido para inventario de baches para solicitar el material y se nos pueda suministrar por medio del Contrato 991 de 2021.

Vía 8501: se requiere que entre el PR18+0200 al PR20+0100, donde se amplió la calzada a 5 metros, se construyan cunetas, canales y el box del PR15+0400, El resto de la vía presenta buen estado.

8.17.1.19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS

Se presenta información de la evolución con criterio técnico del estado de la red vial del primer semestre del año 2023.

Vía 6504: La evaluación realizada en el primer semestre del año 2023 muestra, que el avance en pavimentación no es evidente, aunque el contratista de mejoramiento de la vía haya estado haciendo presencia en el tramo:

Longitud Total vía		79,294									
RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	79,29	7,73	9,7%	1,09	1,4%	15,78	19,9%	54,70	69,0%	0,00	0,0%
No Pavimentado	0,00										

Longitud Total vía		1,847									
RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	0,00										
No Pavimentado	1,85	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,42	22,8%	1,43	77,2%	0,00	0,0%

Vía 3002: En esta vía se ve la afectación a gran escala por la pasada temporada de invierno, que ha dejado más de 46 derrumbes de gran volumen, ha dejado la vía en un trayecto de casi 20 kilómetros con paso restringido a un carril desde el PR 57+0500 hasta el PR 79+0000, se ha presentado el deterioro de la carpeta de asfaltita; lo que provocó el aumento de tramos en mal estado que antes figuraban como bueno y regular. Los sitios críticos por inestabilidad debido a movimientos en masa han aumentado otros se reactivaron y se monitorean de forma permanente.

Longitud Total vía		54,240									
RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	54,24	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9,10	16,8%	45,14	83,2%	0,00	0,0%
No Pavimentado	0,00										

Vía 8501 PAVIMENTADA

El tramo de vía se encuentra pavimentado en su totalidad desde el PR 4+0386 hasta el PR 25+0000. Presenta una variación leve, debido al desgaste de la demarcación con pintura; se presentó un sitio crítico con paso a un carril debido al hundimiento de la estructura del box culvert en el PR 15+0420, afectación por socavación. Se ha intervenido de forma provisional para habilitar los dos carriles, pero la estructura esta fallada y debe construirse una obra de drenaje de mayor capacidad hidráulica.

Longitud Total vía		20,305									
RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	20,31	4,71	23,2%	15,60	76,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
No Pavimentado	0,00										

Vía 8501 CICLO RUTA
El nuevo formato da la opción de ingresar vías de una calzada, de dos calzadas y otros como las ciclo rutas, que en la vía tiene concreto de la misma calidad que la calzada, separada solamente por bordillos y va al lado izquierdo y junto a ella la cuneta. Solamente en los pontones no hay separación y los ciclistas tienen que usar parte del carril izquierdo. Se presentado de forma separada a la vía vehicular y se ha venido evaluando de esta manera.

8.17.1.20. Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución No. 09337 del 30 de diciembre de 2016 o el que esté vigente
No hay contratos en ejecución aparte de Mantenimiento Rutinario y que nos corresponda hacer labor de interventoría.

En este mes se terminaron los contratos de Mantenimiento Rutinario 2313, 2314, 2315 de 2019, el día 15 de septiembre de 2023 y 1421 de 2023, el día 08 de septiembre de 2023.
En este mes se impartió orden de inicio a los contratos de Mantenimiento Rutinario 3024, 3042, 3066 y 3064, con fecha 21 de septiembre de 2023. Estos contratos tienen plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

8.17.1.21. Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS
Esta actividad no ha sido solicitada por INVIAS en el transcurso del mes.

8.17.1.22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta

Vía 6504: Se detecta afectación por proceso de socavación con las crecientes en los ríos que afectan el puente La Ceiba, se observa que el cauce se recarga sobre el estribo inicial (entrada o 1) y para corregirlo se debe instalar hexápodos aguas arriba, realizar dragado al centro y recalce de aletas y estribos. Puente La Rastrera, se observa socavación en aleta de entrada del flujo aguas arriba.
En el puente metálico en arco Siberia, se observaron afectaciones por corrosión sobre todo en los apoyos, esto debido a deficiencia en drenajes, por lo que el agua lluvia se

empoza y mantiene con humedad los 4 apoyos, hay una platina de la junta de viga riostra con viga izquierda y la diagonal, que esta fallada y requiere atención inmediata, se solicitó revisión por especialista.
En el puente El Águila se observa desprendimientos en viga A, y hundimiento que se verifica mediante control del nivel de las barandas.

Vía 3002:
En el puente Perlas III PR 94+0700, debido a creciente del río Perlas, se presenta socavación en la barrera de bolsacretos que protegen el estribo de salida del puente y también las crecientes han sobre pasado la barrera de hexápodos que protegen el talud derecho de la vía, se tiene el riesgo de posible pérdida de la banca.
El PR 58+0500 es un movimiento en masa de grandes dimensiones que tiene material desprendido desde 70 metros hacia el talud superior, se amerita un estudio detallado y obras de mitigación y control, por lo pronto se solicitó apoyo con maquinaria para mantener habilitado el paso.
En el PR 73+0200 R3002 se observan grietas y hundimiento detrás de muro de 3 metros de altura de 20 metros de longitud con junta al centro, se observa desplazamiento de 1 cm.

8.17.1.23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES

Durante el mes de septiembre no se presentaron cierres por emergencias, Se programó con la Cooperativa Los Lejanos de mantener vigilado y retirar el material de derrumbe cada vez que llueve en la zona para habilitar el paso vehicular con restricción a un carril.
El programa Hermes V2, presenta demora en cargar la página, no muestra datos que se hayan registrado.









8.17.1.24. Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles

Se suministrará cinta de peligro para mantener la señalización en los pasos restringidos a un carril por derrumbes de grandes dimensiones que requieren maquinaria y volquetas para su remoción y disposición final.
Se requiere pintura para repintar marcas viales de Zonas Escolares.
Se requiere pintura para abscisado de las vías.
Se requiere intervención en el PR64+0430, por colapso de estructura de salida de alcantarilla de 36".

8.17.1.25. Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS

En el presente mes no se observaron, ni se registraron atropellamientos de fauna.

8.17.1.26. Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS

Se presentó oficios a la Territorial y se está a la espera de confirmar para hacer el acompañamiento en el proyecto de Mejoramiento del corredor Neiva – San Vicente – Florencia, verificando los sitios que requieren atención para desalojo de derrumbes y construcción de muros fallados en la Vía 3002, debido a emergencia causada por temporada de invierno, se hace registro fotográfico de los sitios críticos.
Se hizo recorridos por la Vía 6504 para verificar los trabajos adelantados con el Contrato 991 de 2021.
Se hacen los Análisis de Precios Unitarios para el mantenimiento de la carretera Leticia – Tarapacá Ruta 85, tramo 8501, PR 4+0386 hasta el PR 20+0000.

8.17.1.28 Estado del tiempo (anexo FR10) y eventos naturales

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	22	24	24	23	24	23	24	24	19	24	24	24	24	18	24	24	16	24	23	23	24	23	22	23	23	24	23	22	18	20	677
Lluvias moderadas	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	5	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	2	4	3	32
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Vía 6504:
En el tramo Puerto Rico a San Vicente se presentó tiempo seco mayormente soleado, con periodos de lluvias moderadas esporádicamente.
En el tramo San Vicente hasta Mina Blanca predominó tiempo con periodos cortos de lluvias moderadas.

Vía 3002:
En la parte alta, sector Santo Domingo hasta La Campana (PR 57+0500 a PR 76+0000) el tiempo fue de alta nubosidad, mayormente tiempo seco y lluvias moderadas esporádicamente.
En el resto de la vía desde la Campana hasta Mina Blanca con pocas lluvias.

Vía 8501
En la región amazónica vía Leticia a Tarapacá, se presentó durante el mes de septiembre la mayoría de tiempo con soleado con lluvias moderadas.

Eventos naturales
En la Vía 6504, se presenta activación de movimiento en masa cuando se han presentado lluvia en el sector. Con el Contrato 991 de 2021 se ha atendido el movimiento en masa del PR 16+0400 a medida que sigue avanzando.

En la Vía 3002, se presenta activación de movimiento en masa, cuando se ha presentado lluvia en el sector. Se atiende con la Cooperativa Los Lejanos con frecuencia el PR 58+0500 y los demás puntos que requieren ser retirados con maquinaria y volquetas, se mantienen señalizados con cinta amarilla para prevención de accidentes.

En la vía 8501, el nivel del agua no baja y no se ha podido adelantar trabajos para construcción del trincho en el Box del PR 15+0980.

Eventos antrópicos
En el presente mes no se presentaron novedades.

8.17.1.29 Relaciones con la comunidad
Se atiende inquietud del señor ODUGER GARZÓN MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.690.378 expedida en Florencia. Quien, por medio de un Derecho de Petición, solicitó información sobre los trabajos a realizar en la malla vial entre el kilómetro 9 al kilómetro 19, del tramo de vía que va desde el municipio de Puerto Rico al municipio de San Vicente. El señor espera se tenga en cuenta la petición, se inspeccione al contratista para que entregue la malla vial al 100%.

8.17.1.30 Correspondencia

Se enviaron oficios de presentación del personal de la Administración Vial Grupo 3, a las autoridades municipales: Alcaldía municipal, Inspección de Policía del municipio de San Vicente y Alcaldía municipal, Inspección de Policía del municipio de Puerto Rico. De igual manera a las entidades como: ESE Hospital San Rafael, Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Vicente. Igualmente, a la firma contratista Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente (contrato 991 de 2021) y a la firma de Interventoría Consorcio Intervías Visión 2030 (contrato 985 de 2021), las dos firmas contratista con oficinas ubicadas en el municipio de Puerto Rico.
Se radicó actas de los contratos de Mantenimiento Rutinario 2313, 2314, 1421 y 2315, de los cuales somos interventores.
Se enviaron las solicitudes de reporte de accidentes a las Alcaldías de Puerto Rico y San Vicente en Caquetá y a Leticia en Amazonas.
Se envió reportes de accidentalidad del mes de agosto.
Se envió respuesta a requerimientos de la Dirección Territorial.
Se envió informe de los sitios críticos por movimientos en masa de la vía 3002.
Se envió informe de los sitios críticos por afectaciones y hundimientos en la calzada de la vía 3002.
Se actualizó y se envió directorio de emergencias solicitado por la Dirección Territorial.

5.3 Informes especialistas y profesionales

No se requirieron informes de especialistas y profesionales. Se realizó informe de afectaciones por movimientos en masa que limitan el tránsito vehicular a un carril entre el PR 57+0500 hasta el PR 77+0000 de la vía 3002. De igual manera se pasó informe sobre sitios críticos por hundimiento de la calzada y perdida de la banca en varios puntos de la vía 3002.

5.4 Informe del programa anual de caja PAC

Se dispone de recursos financieros suficientes para la ejecución total del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2023.

5.5 Informe matriz de riesgos

No se han presentado afectaciones al desarrollo del contrato.

5.6 Información de otros programas y aplicativos

Se informa que el aplicativo HERMES V2, se encuentra inactivo y no se ha podido ingresar información. Se cuenta con la APP de SURVEY123 bajo plataforma Arcgis. Se instala actualización de SUKUBUN. Se hace ejercicio en la app Inventario del SIGP, pero no deja ingresar.

6 REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.3 Equipos y vehículos contrato de interventoría

Se anexa formato que incluye los dos vehículos que permanecieron activos durante todo el mes.

6.4 Personal, control de aportes legales y seguridad social interventoría

Se incluye el formato que relaciona el personal y los aportes debidamente soportados.

6.5 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

Se anexa el formato del informe financiero que indica los valores acumulados y el saldo, del mes.

6.6 Seguimiento a garantías contrato de interventoría

Las garantías se entregaron al inicio del contrato y permanecen vigentes.

6.7 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

Como el contrato de obra no contempla ensayos de laboratorio, ni plan de calidad, la interventoría tampoco tiene contractualmente este plan de calidad.

6.8 Otros documentos de seguimiento mensual

Se envían los reportes de accidentalidad correspondientes al mes anterior, es decir del mes de agosto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-23

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2702 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO SLG VIAL

CONTRATO DE OBRA No. 2313 DE 2019-2314 DE 2019-2315 DE 2019-2696 DE 2023 3042 DE 2023 - 3066 DE 2023 - 3064 DE 2023 - 3024 DE 2023

CONTRATISTA: Cooperativa Los Colonos-Cooperativa los Lejanos- Precooperativa Central de Vías de Leticia- Cooperativa La Sureña

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta Platón KRR145	FORD RANGER XLS 2488 C.C.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Campero FQP001	FORD ECOSPORT 1999 C.C.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: DAB TIENE TECNOMECANICA A ENERO DE 2023 Y LA HCV A FEBRERO DE 2023.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202 - 04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 12 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO SLG VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, GRUPO 3 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ	18.103.329	ING. RESIDENTE	$ 6.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	CONSORCIO SLG VIAL	$ 6.800.000	$473.300	V	NUEVA E.P.S.	9457535523	$ 272.000	PORVENIR	9457535523	$ 1.156.000	$ 272.000			
2	DIEGO ANDRES CASTILLO LIZCANO	17.674.799	ING. AUXILIAR I	$ 4.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	CONSORCIO SLG VIAL	$ 4.400.000	$306.300	V	NUEVA E.P.S.	9457535523	$ 176.000	COLPENSIONES	9457535523	$ 704.000	$ 176.000			
3	ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	40.690.667	AUX. ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	CONSORCIO SLG VIAL	$ 1.500.000	$ 7.900	I	SANITAS	9457535523	$ 60.000	COLPENSIONES	9457535523	$ 240.000	$ 60.000			
4	YEFERSON GONZALEZ OCHOA	1.003.805.472	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	CONSORCIO SLG VIAL	$ 1.500.000	$ 65.300	IV	NUEVA E.P.S.	9457535523	$ 60.000	PORVENIR	9457535523	$ 240.000	$ 60.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 14.200.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HERNY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Ingeniero Residente Apoderado
Matricula profesional No.: 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3

Firma
LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matricula profesional No.:25202-04765 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **5 OCT 2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

MES INFORME MENSUAL: 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023 **PROYECTO:** PUERTO RICO - MINA BLANCA - BARSILLAS - LETICIA - TARAPACÁ

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	920723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	395.471.546	
					TOTAL	**$ 395.471.546**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 395.471.546**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								920723 - 08/08/2023	**$ 395.471.546**	**$ 395.471.546**		
1	1 al 30 Sep 2023	$ 52.998.412,00	$ 10.069.698,28	$ 63.068.110,28					$ 332.403.435,72	$ 332.403.435,72		
TOTALES		**$ 52.998.412,00**	**$ 10.069.698,28**	**$ 63.068.110,28**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2023	$ 52.998.412	$ 10.069.698,28	$ 63.068.110,28
VALOR TOTAL	**$ 52.998.412**	**$ 10.069.698,28**	**$ 63.068.110,28**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
Matrícula profesional No.: 25202100818 CND
Apoderado

Firma
LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202 - 04765 CUND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SLG VIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2023

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 395.471.546,00

VALOR ACUMULADO: $ 395.471.546,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39.547.154,60	2	8	2023	2	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 79.094.309,20	2	8	2023	2	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 118.641.463,80	2	8	2023	2	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101184288

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14 de agosto de 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%							
Calidad del servicio	30%							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 3
CONSORCIO SLG VIAL
M.P. 25202100818 CND
Administración del Mantenimiento Vial Grupo 3
Director de Interventoría

Firma

Nombre: **ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó inspección a las actividades de Mantenimiento Rutinario del contrato 1421, que terminó el día 08 de septiembre de 2023 y de los contratos 2313, 2314 y 2315, que terminaron el día 15 de septiembre de 2023. De igual manera se realizó inspección a las actividades de Mantenimiento Rutinario de los contratos 3024, 3042, 3066 y 3064, que se les impartió orden de inicio el día 21 de septiembre de 2023, y tienen plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2023.

Se realizó seguimiento e inspección a los sitios críticos por movimientos en masa, hundimientos de la calzada y perdida de banca de las vías 6504, 3002 y 8501. De sitios críticos de la vía 3002, se envió informe a la Dirección Territorial de aproximadamente 46 puntos de zonas de derrumbes con la cuantificación del volumen estimado a retirar, para atender estas actividades se requiere maquinaria, volquetas y zona de disposición final. También se envió informe a la Dirección Territorial de aproximadamente 15 puntos de afectaciones a la vía 3002, por hundimientos y perdida de la banca. Los sitios críticos se señalizaron con cinta amarilla para prevenir accidentalidad en el tramo vial.

Se atendió requerimientos de la Dirección Territorial, hacer un informe sobre estado del tramo desde el PR 9+0000 hasta el PR 19+0000 para dar respuesta a un derecho de petición presentado por el señor ODUGER GARZÓN MUÑOZ, revisar presupuesto y hacer Análisis de Precios Unitarios para mantenimiento de la vía Leticia – Tarapacá.

La construcción de la obra de drenaje en el PR4+0800, el trabajo es muy lento para reemplazar la obra colapsada. Desde el inicio de la Administración Vial día 01 de septiembre de 2023, no se ve avance en actividades de obra. Presenta restricción a un carril por su estado de construcción.



HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo 3
Territorial Caquetá
CONSORCIO SLG VIAL
