INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO. 10

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

VERSIÓN 1
ETAPA DE EJECUCION

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

CONTRATO 510-2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Bogotá D.C, AGOSTO 2024

REGISTRO DE REVISIONES

CONTRATO No.	510-2023	**FECHA**	JULIO 2024
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Informe mensual No.10 componente SST		

EDICIÓN N°	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
1	20/08/2024	Emitido para revisión

CONTROL INTERNO				
ELABORÓ	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	IVONNE GUERRA	03/08/2024	
REVISÓ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	MONICA JIMENA GUERRA	03/08/2024	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
1. CAPÍTULO I. 7
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
3.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 8
Ilustración 1. Localización general del proyecto 8
Localización especifica 8
3.1.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9
4.1 REVISION DOCUMENTAL 12
4.1.1 CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS APROBADOS 12
4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 13
4.3 COMITÉS Y REUNIONES 14
4.4 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 15
5. CAPÍTULO III ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 20
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE ACUERDO CON EL PAI-SG-SST 20
5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023 20
5.2.1 HORAS HOMBRE TRABAJADAS 23
5.2.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SG-SSI DE LA INTERVENTORIA 23
5.2.2 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023 23
5.2.3 EXÁMENES MÉDICOS 23
5.2.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 24
5.2.5 PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES 24
5.2.5.1 CERTIFICACIONES DE PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES 25
5.2.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 25
5.2.7 ACCIDENTALIDAD 25
5.2.8 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO YCOMITÉ DE CONVIVENCIA 26
5.2.9 PROGRAMA DE INSPECCIONES 26

5.2.10 AUSENTISMO LABORAL 26

5.2.11 REUBICACIÓN LABORAL 26

En el periodo del presente informe no se realizó reubicación laboral. 26

5.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 26

5.3.1 SANEAMIENTO BÁSICO 26

5.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 27

5.4.1 ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS 27

5.4.2 CAPACITACIONES 27

6. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

LISTA DE ANEXOS 31

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de interventoría, adquiridas a través del Contrato 510-2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", se remite al Instituto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, el informe Mensual de Interventoría de Salud y Seguridad en el Trabajo-SST No. 6, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de julio 2024

Documentando el control del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST del contrato de obra 510-2023 el cual incluye la revisión de las planillasde seguridad social, los exámenes médicos de ingreso, los soportes de inducciones,capacitaciones, inspecciones y el reporte del cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista de obra.

Es de resaltar que todas las actividades desarrolladas en este componente son armonizadas con las actividades ejecutadas por el área técnica, de forma tal que segarantice el cumplimiento permanente de los objetivos propuestos.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST del contratista CONSORCIO PARQUES 2023 y de la interventoría SOLUCIONES DE LA INGENIERIA SAS durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio 2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento por parte de la interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimento a lo establecido en el contrato, a las leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para el contrato.
- Supervisar el cumplimiento y la implementación por parte del contratista, de lasmedidas de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida para el contrato.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social del personal del contratista y la interventoría.
- Reportar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el SG-SST.

1. CAPÍTULO I.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades para ejecutar en el proyecto corresponden al mantenimiento y dotación de los parques vecinales de la localidad de bosa, En este sentido el área SST contribuirá a prevenir y mitigar los riesgos que se pudieran generar por la ejecución de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta que **LOCALIDAD DE BOSA**, elaboró los respectivos estudios previos al presente contrato, se realiza la ejecución de los parques asignados, previa autorización de la interventoría del contrato, de los parques entregados por la Alcaldía de bosa.

3.1.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Datos de contrato de obra interventoría Contrato 510-2023

CONTRATO No.	510-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA R/L. LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
INTERVENTOR	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S NIT. 900.389.180-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL C.C 79.688.270
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
	DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PLAZO FASE I - DIAGNOSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS	UN (01) MES
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN DE OBRAS	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	Ochocientos Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete pesos M/Cte., ($894.488.597,00)
FORMA DE PAGO	Se cancelará mediante pagos parciales que se realizarán en proporción porcentual al avance de ejecución de obra del contrato adjudicado mediante Licitación Pública
FIRMA ACTA DE INICIO	1 OCTUBRE DE 2023

3.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto se desarrolla en BOSA, la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, Colombia;

Esta localidad se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá.

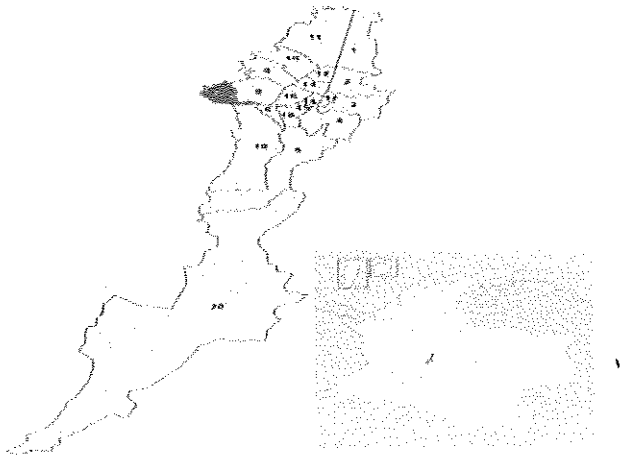


Ilustración 1. Localización general del proyecto

Localización especifica

Específicamente las intervenciones se desarrollarán en veintiocho (28) parques entre los cuales se encuentran parques vecinales y de bolsillo localizados en la localidad de Bosa

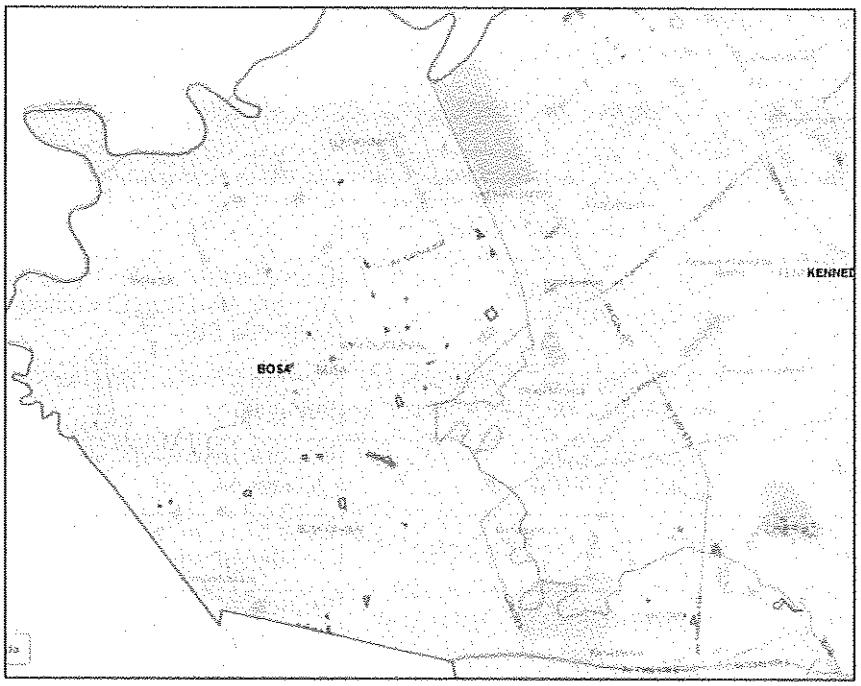


Ilustración 2. Localización especifica del proyecto

3.1.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se relaciona a continuación, en donde se encuentran ubicados los parques que se intervinieron, parques identificados por el código que asigna el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD). Se reportan los parques terminados con la fecha de inicio y fecha de entrega.

Cobertura del contrato

LISTADO DE PARQUES A INTERVENIR


Tabla 2. parques a intervenir localidad de bosa

No.	CODIGO DEL PARQUE	NOMBRE DEL PARQUES	DIRECCION
1	07-002	DESARROLLO BOSALINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	Entre Carrera 95 Y Transversal 98 Con Calle 61a Sur Y 62 Sur
2	07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIËN	Entre Carrera 100c (105b) Y Transversal 100d (carrera 106) Con El Costado Occidental De La Calle 68a Sur
3	07-026	DESARROLLO EL RINCËN DE BOSA, RECUERDO 4A,5,6,7	Carrera 87k Bis Con Calle 71 Sur Costado Nor-oriental
4	07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	Carrera 100d Con Calle 58c Sur costado Occidental
5	07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	Calle 57 C Sur Con Carrera 90 B Costado Sur Occidental
6	07-299	DESARROLLO LA PORTADA	Carrera 102b Con Calle 58a Sur Costado Nor-occidental
7	07-022	DESARROLLO PALESTINA	Entre Carrera 89 (19) Y 89 A (19a) Con Calles 70 A Sur (4c) Y 70b Sur (4b)
8	07-015	URBANIZACIÓN JIMINEZ DE QUEZADA	Entre Diagonal 63 A Sur, Transversal 87c Y Diagonal 64 Sur
9	07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Transversal 78c Con Calle 71a Sur Y Diagonal 71b Bis A Sur
10	07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Carrera 78 Con Calle 71a Sur Y Transversal 78a Bis A
11	07-104	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	CARRERA 77G - DIAGONAL 71B BIS SUR / TRANSVERSAL 77G BIS B
12	07-094	DESARROLLO DANUBIO	Entre Calle 69bis Sur Y Calle 69bisa Sur Con Carrera 101b Y Carrera 103
13	07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Entre Carrera 87l Y Carrera 87m Con Calle 63 Sur
14	07-333	DESARROLLO SANTA FE	Interior De La Manzana 76 Ubicada Entre Calle 56 H Sur Y Calle 56 G Sur Con Carrera 98 C Y Carrera 98 A
15	07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Entre Carrera 88f Y Carrera 88g Entre Calle 49c Bis Sur Y Calle 49d Bis Sur|
No.	CODIGO DEL	NOMBRE DEL PARQUES	DIRECCION

	PARQUE		
16	07-272	NUEVA ESCOCIA	Carrera 97f Con Calle 57b Sur Costado Nor-occidental
17	07-346	DESARROLLO VILLA SONIA 1	Diagonal 56b Bis A Sur Entre Carreras 85b Y 86
18	07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Entre Calle 69bis Sur Y Calle 69bisa Sur Con Carrera 101b Y Carrera 102
19	07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	Carrera 64 Con Calle 55 A Sur Costado Sur-oriental
20	07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	Avenida Ciudad De Villavicencio Con Calle 57b Sur Costado Nor-occidental
21	07-318	DESARROLLO ISLANDIA	Entre Calle 71a Sur Y Calle 72 Sur Con Carrera 83 Y Carrera 83a
22	07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	Entre Calle 56f Sur Y Calle 56d Sur Con Carrera 71f Y 71d
23	07-111	DESARROLLO SAN LUIS	Calle 57 B Sur Con Carrera 87 I Costado Sur Occidental
24	07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	Interior De Las Manzanas B Y C Ubicadas Entre Carreras 96 Y 96a Con Calle 58c Bis Sur Y 59a Sur
25	07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	Interior De La Manzana D (4) Ubicada Entre Calles 55 Bis Y 57 Sur Con Carrera 101 Bis
26	07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	KR 80Q 75 45 SUR
27	07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	AK 89B 49D 10 SUR
28	07-191	DESARROLLO SAN JOAQUÖN	KR 88G 72A 11 SUR

3.1.4 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ilustración 3 Organigrama empresarial Interventoría

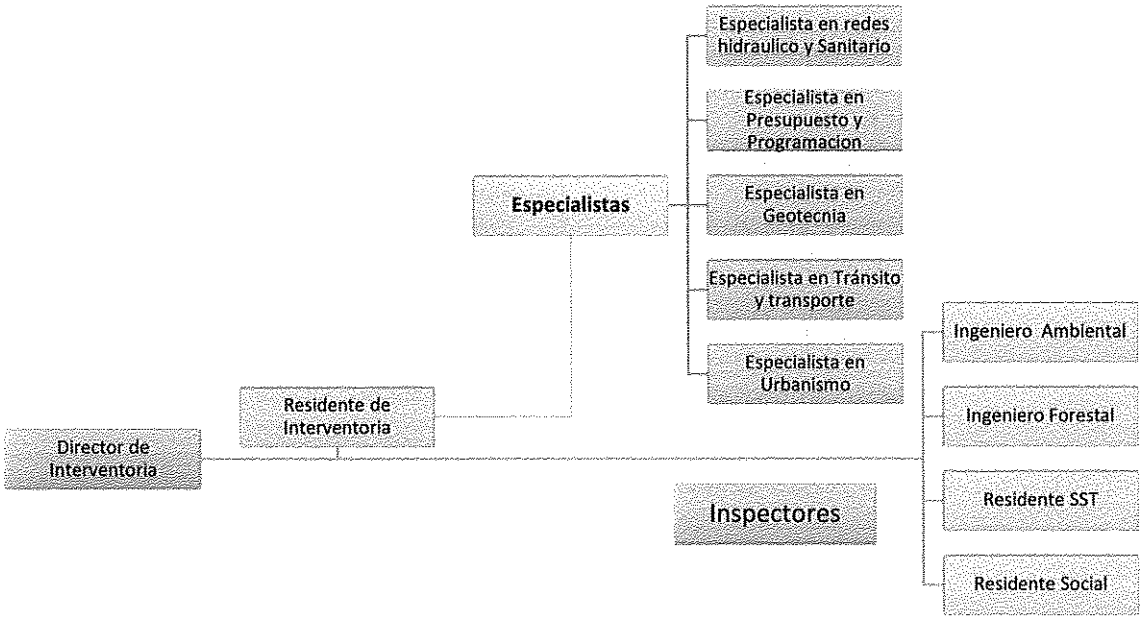

4.Capitulo II DESCRIPCION DE LA GESTION DE LA INTERVENTORIA

4.1 REVISION DOCUMENTAL

- La interventoría realizó la verificación y seguimiento a las actividades documentales realizadas por el contratista durante el periodo de 1 de julio al 31 de julio 2024.
- Revisión de Documentos del personal de interventoría ingresado al contrato 510-2023.
- Revisión de documentos de maquinaria y equipos del contrato.

4.1.1 CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS APROBADOS

A continuación, se relaciona los documentos que han sido aprobados por la interventoría al contratista:

DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE RADICADO U OFICIO
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST	01 de noviembre 2023	SPLI-BOS-23-044
INFORME SST No1	02 de octubre a 31 de octubre 2023	Visto bueno
INFORME SST No2	17 de noviembre 2023	SPLI-BOS-23-0103
INFORME SST No 3	5 de diciembre 2023	Visto bueno
INFORME SST No 4	5 de enero 2024	Visto bueno
INFORME SST No 5	5 de febrero 2024	Visto bueno
INFORME SST No 6 V4	11 de marzo 2024	Visto bueno
INFORME SST No 7 V4	22 de abril 2024	Visto bueno
INFORME SST No 8 V4	31 de mayo de 2024	Visto bueno

4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

- Al encontrarnos en la FASE 2 – EJECUCION se realizaron actividades de entrega de documentos de personal de obra y maquinaria, Visitas en campo de los campamentos de los parques que se encuentran en ejecución.
- Verificación de personal que se encuentra aprobado por interventoría, previa verificación de afiliaciones y/o pagos de seguridad social.
- Diligenciamiento de actas de comité
- Verificación de elementos SST y señalización preventiva, punto CREA y Campamentos.
- Verificación de uso de elementos de protección personal de obra
- Validación de personal relacionado en el informe.
- Acompañamiento en recorridos por los campamentos y parques activos.
- El área SST de interventoría realizó acompañamiento en las observaciones del ingreso de personal y asistió a los comités establecidos por la entidad, se realizó visita en campo en los diferentes parques que se encuentran intervenidos por el contratista, se verifico campamentos, punto de hidratación, punto de primeros auxilios y dotación.

4.3 COMITÉS Y REUNIONES

Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités:

FECHA	TEMA
11/10/2023	COMITÉ NO 2
18/10/2023	COMITÉ NO 3
25/10/2023	COMITÉ NO 4
01/11/2023	COMITÉ NO 5
08/11/2023	COMITÉ NO 6
15/11/2023	COMITÉ NO 7
22/11/2023	COMITÉ NO 8
29/11/2023	COMITÉ NO 9
06/12/2023	COMITÉ NO 10
13/12/2023	COMITÉ NO 11
20/12/2023	COMITÉ NO12
27/12/2023	COMITÉ NO13
03/01/2024	COMITÉ NO14
10/01/2024	COMITÉ NO15
17/01/2024	COMITÉ NO16
24/01/2024	COMITÉ NO17
31/01/2024	COMITÉ NO18
07/02/2024	COMITÉ NO19
14/02/2024	COMITÉ NO 20
21/02/2024	COMITÉ NO 21
28/02/2024	COMITÉ NO 22
06/03/2024	COMITÉ NO 23
13/03/2024	COMITÉ NO 24
20/03/2024	COMITÉ NO 25
27/03/2024	COMITÉ NO 26
03/04/2024	COMITÉ NO 27
10/04/2024	COMITÉ NO 28
17/04/2024	COMITÉ NO 29
24/04/2024	COMITÉ NO 30
01/05/2024	COMITÉ NO 33
08/05/2024	COMITÉ NO 34
15/05/2024	COMITÉ NO 35

22/05/2024	COMITÉ NO 36
29/05/2024	COMITÉ NO 37
04/06/2024	COMITÉ NO 38
12/06/2024	COMITÉ NO 39
19/06/2024	COMITÉ NO 40
26/06/2024	COMITÉ NO 41
04/07/2024	COMITÉ NO 42
10/07/2024	COMITÉ NO 43
19/07/2024	COMITÉ NO 44
24/07/2024	COMITÉ NO 45
31/07/2024	COMITÉ NO 46

Tabla 4

Relación de comités

- En el Anexo 1. Se remiten los soportes de los comités hasta la fecha teniendo en cuenta que no todos están firmados.

- 4.4 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES
- Revisión y verificación de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato de Interventoría conforme la normativa legal.
- Revisión, observación y aprobación de documentación de ingreso del contratista remitidas durante el periodo del presente informe.
- Asistencia a comités y reuniones del contrato de interventoría 510 - 2023
- Revisión, observación, aprobación y entrega comunicaciones al contratista y a la entidad contratante.

Tabla 5 Correspondencia enviada

FECHA	DIRIGIDO	CÓDIGO/N° DE OFICIO	ASUNTO	RESPUESTA
29/09/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-008	Observación SG-SST	pendiente
02/10/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-009	Entrega Hojas de Vida Personal mínimo de Interventoría	Correo electrónico 3/10/2023

09/10/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-014	Aprobación de las Hojas de Vida de Contratista de Obra	correo electrónico 05/10/2023
20/10/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-030	Observaciones al SG-SST	CPB-FDLB 508-34-2023
01/11/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-044	Plan SG-SST Aprobación	CPB-FDLB 508-34-2023
13/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-058	Documentos ingreso de personal	CPB-FDLB 508-63-2023
14/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-065	respuesta comunicado observaciones informes SST1	CPB-FDLB 508-54-2023
14/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-064	Requerimiento información maquinaria y equipos	CPB-FDLB 508-12-2023
15/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-077	Respuesta comunicado observaciones ingreso de personal	CPB-FDLB 508-75-2023
17/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-078	RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-75-2023 – OBSERVACIONES A DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL	CPB-FDLB 508-75-2023
17-11-2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-077	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST N° 1 V2. RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDL 508-74-2023	CPB-FDL508-74-2023
29/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0126 - SPLI-BOS-23-0145	DOCUMENTOS DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-97-2023
11/12/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0119	SOLICTUD PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	
2/01/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0181	OBSERVACIONES INFORME 3	CPB-FDLB 508-188-2023
03/01/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0193	APREMIO DOCUMENTACION VOLQUETAS	CPB-FDLB 508-193-2023

03/02/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0301	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-318-2023
17/02/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0302	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-508-2023
21/03/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0421	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-508-2023
25/03/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0432	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-508-2023
01/04/2026	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0448	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-489-2024
04/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551	OBSERVACIONES INFORME SST N 6	
03/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0460	DOCUMENTOS DE PERSONAL LYD	CPB-FDLB 508-502-2023
03/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0461	DOCUMENTOS DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-500-2023
03/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0462	DOCUMENTOS DE PERSONAL PAVIOBRAS	CPB-FDLB 508-499-2023
04/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0467	DOCUMENTOS DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-510-2023
04/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0470	DOCUEMNTOS DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-511-2023

09/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0479	OBSERVACIONES INFORME SEMANAL SST	CORREO EELCTRINICO
09/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0482	DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO	CPB-FDLB 508-526-2023V
10/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-487	OBSERVACIONES AL INFORME 6 V2 DEL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
10/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0460	DOCUEMNTOS DE PERSONAL LYD	CPB-FDLB 508-502-2023
10/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0488	LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES	
10/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0489	DOCUEMNTOS DE PERSONAL LYD	CPB-FDLB 508-517 2023
15/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0500	OBSERVACIONES INFORME SEMANAL SST	
16/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0501	DOCUEMNTOS DE PERSONAL LYD	CPB-FDLB 508-539 2023
16/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-502	OBSERVACIONES AL INFORME 6 V2 DEL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
19/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-519	OBSERVACIONES AL INFORME 6 V4 DEL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
23/04/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-520	APROBACION DE INFORME SST N 6V4	CPB-FDLB 563-2023

16/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-535	OBSERVACIONES IFORME 7 V1	
17/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-535	OBSERVACIONES IFORME 7 V2	
23/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-535	OBSERVACIONES IFORME 7 V3	
30/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-535	OBSERVACIONES IFORME 7 V4	
14/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-599	APREMIO 1	
30/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-612	OBSERVACIONES PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	
30/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-614	HALLAZGOS FRENTE DE OBRA	
31/05/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-615	APROBACION INFORME SST N 7V4	
07/06/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-634	OBSERVACIONES INFORME SST N 8V1	
18/06/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-657	OBSERVACIONES INFORME SST N 8V2	
20/06/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-669	OBSERVACIONES INFORME SST N 8V3	

20/06/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-658	DOCUMENTOS DE INGRESO DE PESONAL	
	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-670	PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	
	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0551-6	APROBACION INFORME SST N 8V4	
03/07/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0711	LISTAS DE CHEQUEO	
12/07/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0736	OBSERVACIONES INFORME 9	
22/07/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0756-520	OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE MAQUINARIA	
23/07/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0762-520	LLAMADO DE ATENCION	
23/07/2024	CONSORCIO PARQUES	SPLI-BOS-23-0763-520	OBSERVACIONES INFORME N 9	

5. CAPÍTULO III ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE ACUERDO CON EL PAI-SG-SST

A continuación, se relacionan la gestión desarrollada por la interventoría durante el periodo comprendido de julio 1 de 2024 al 31 de julio 2024

5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023

A continuación, se relaciona el personal mínimo requerido para el contrato de interventoría, (19) profesionales. Aprobados por la entidad.

PERSONAL PROFESIONAL

Tabla 7. Relación plantilla mínima del contrato de interventoría durante la duración del contrato

	CARGO	DEDICACION	NOMBRE	CC	ESTADO	
1	Director de Interventoría	25% - 40%	Mónica Jimena Guerra	52261971	aprobado	Activo
2	Residente de Interventoría	100%	Jenny Katherine Rodríguez	40049313	aprobado	Activo
3	Especialista en Geotecnia	20%	Robinson Villamil	79048393	aprobado	No aplica para el periodo
4	Especialista en presupuesto y programación	50% - 30%	Diego Osorio	94406535	aprobado	Activo
5	Especialista en Redes Hidráulico Sanitario	30%	Claudia Gómez	52261988	aprobado	No aplica para el periodo
6	Especialista en Tránsito y Trasporte	30%	Iván Barreto Esquivel	79688270	aprobado	No aplica para el periodo
7	Residente SST	25%	Ivonne Milena Guerra	40035976	aprobado	Activo
8	Residente Social	50% - 30%	María del Carmen Vergara	33449903	aprobado	Activo
9	Ingeniero Ambiental	50% - 20%	Brian Arango	1030654429	aprobado	Activo
10	Especialista Urbanismo	27%	Edgar Alirio Gómez	93408738	aprobado	Activo
11	Ingeniero Forestal	30% - 28%	Humberto Castillo	79305644	aprobado	No aplica para el periodo


PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

	CARGO	DEDICACION	NOMBRE	CC	ESTADO	
12	Inspector 1	100%	Oscar Chamorro	1088732695	Aprobado	Activo
13	Inspector 1	100%	Brayan Estiben Rodríguez	1234791652	Aprobado	Activo
14	Topógrafo Inspector	20%	Jennifer Carranza	1024525394	Aprobado	Activo
15	laboratorista Inspector	10%	Simón Pardo Guerra	1001218709	Aprobado	Activo
16	Cadenero 1	20%	Rafael arias	1085277386	Aprobado	Activo
17	Administrador	50% - 20%	Juan Carlos Duarte	1085278054	Aprobado	Activo
18	Conductor	10%	Johan Camilo Bernal	1033791125	Aprobado	Activo

PERSONAL DE APOYO ADICIONAL

	CARGO	DEDICACION	NOMBRE	CC	ESTADO	
19	Ing Auxiliar	30%	Ivette Tatiana Rodríguez		Aprobado	Activo

Para el presente periodo no se registró ingreso de trabajadores al contrato nuevo al contrato de interventoría 510-2023.



Gráfica 1 Relación de personal, cantidad de ingresos y retiros durante el periodo.

5.2.1 HORAS HOMBRE TRABAJADAS

LA INTERVENTORIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA, realizó el cálculo de horas hombre trabajadas acorde al personal vinculado al contrato 510 de 2023, teniendo en cuenta:

- Fecha de ingreso al contrato
- Dedicaciones del personal durante el periodo
- Jornada Laboral de 8 horas de lunes a viernes

Para el periodo del 1 de Julio 2024 al 31 de julio 2024, se reportó un total de 1135.2 HHT.

Anexo 3 Horas Hombre Trabajadas

5.2.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SG-SSI DE LA INTERVENTORIA

La interventoría realizó el respectivo pago de los aportes a la seguridad social de los (14) profesionales que se encuentran vinculados al contrato.

Anexo 4 Planillas de Seguridad

5.2.2 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023

Durante el periodo no se realizaron inducción debido a que no se presentó ingreso de personal

Anexo 5: se anexa

5.2.3 EXÁMENES MÉDICOS

Para el mes de mayo la interventoría revisó el personal antiguo que los exámenes se encontraran vigentes para la fecha del contrato 510-2023.

Anexo 6, personal al contrato 510 -2023

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA EXAMENES			CONCEPTO
			INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
1	GUERRA VERGARA MONICA	52.261.971	11/08/2023	NA	NA	Apto
2	YENNY KATERIEN RODRIGUEZ	1073515080	01/04/2024	NA	NA	Apto
3	IVONNE MILENA GUERRA	40.035.976	01/03/2024	NA	NA	Apto
4	DIEGO ALEXANDER OSORIO	94.406.535	14/01/2023	NA	NA	Apto
5	VERGARA MARIA DEL CARMEN	33.449.903	02/10/2023	NA	NA	Apto
6	BRYAN ARANGO	1030654429	01/04/2024	NA	NA	Apto
7	GOMEZ EDGAR ALIRIO	93.408.738	02/10/2023	NA	NA	Apto
8	CHAMORRO OSCAR	1.088.732.695	03/10/2023	NA	NA	Apto
9	RODRIGUEZ BRAYAN ESTEBAN	1234791652	13/07/2023	NA	NA	Apto
10	JOSE RAFAEL ARIAS NIETO	1.085.277.386	02/10/2023	NA	NA	Apto
11	JUAN CARLOS DUARTE	1.085.278.054	02/10/2023	NA	NA	Apto
12	BERNAL SANCHEZ JOHAN	1.033.791.125	30/01/2023	NA	NA	Apto
13	JENNIFER CARRANZA	1024525394	2/10/2023	NA	NA	Apto

5.2.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo del informe se realizó entrega de reposición al personal del contrato de interventoría 510-2023.

Anexo 7: Entrega de Dotación durante el periodo del informe.

5.2.5 PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

Todo el personal vinculado a Soluciones y los subcontratistas para la Ingeniería recibió pago de nómina completa para el mes de mayo.

5.2.5.1 CERTIFICACIONES DE PAGOS DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría hace entrega de las certificaciones de pagos de salarios, honorarios al SGSSI y parafiscales, **ver anexo** 8, entregados como soporte de cumplimiento de las siguientes empresas:

Tabla 8 Relación de empresas mediante la cual se vincula el personal de interventoría

EMPRESA	No. DE PERSONAS
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	4
YAMILL ALONSO MONTENEGRO	3
INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	1
CONSORCIO ALIANZA	2
CONSORCIO OBRAS 2022	1
CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA METRO	1
TOTAL	**13**

Anexo 8: certificaciones parafiscales

5.2.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

En el presente periodo no se han realizado modificaciones en la matriz de riesgos y peligros.

5.2.7 ACCIDENTALIDAD

En el periodo del presente informe no se registró accidentes laborales.

5.2.8 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO YCOMITÉ DE CONVIVENCIA

Dando cumplimiento al cronograma de actividades SST de la interventoría por la cantidad de trabajadores vinculados directamente con Soluciones para la ingeniería se establece un vigía de seguridad y salud en el Trabajo, dando Cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas aquellas normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. Debido a los Cambios de personal en este periodo se realizó la nueva asignación al Vigía de Seguridad, quedando el ING BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ.

ver Anexo 9, Acta de reunión vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.2.9 PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el presente periodo de diagnóstico y planeación no se realizan inspecciones.

5.2.10 AUSENTISMO LABORAL

No se presentó ausentismo laboral durante el periodo.

5.2.11 REUBICACIÓN LABORAL

En el periodo del presente informe no se realizó reubicación laboral.

5.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

5.3.1 SANEAMIENTO BÁSICO


Para el periodo del presente informe, el personal de interventoría que asiste a la oficina principal cuenta con dos baños y/o unidades sanitarias, las cuales están dotadas con lavamanos, gel antimaterial y toallas desechables.

Tabla 9 Ubicación de baños contrato 510-2023

Ítem	Observación
Baños	El personal de interventoría dispone en la oficina central de dos unidades sanitarias.
Lavamanos	El personal de interventoría que desarrolla actividades de oficina dispone de dos unidades de lavamanos que

Ítem	Observación
	se encuentran ubicados en cada uno de los baños. Estos están dotados con jabón líquido, alcohol glicerinado entre el 60% - 95% y toallas desechables

Ilustración 4 Ubicación zona de desinfección y baños

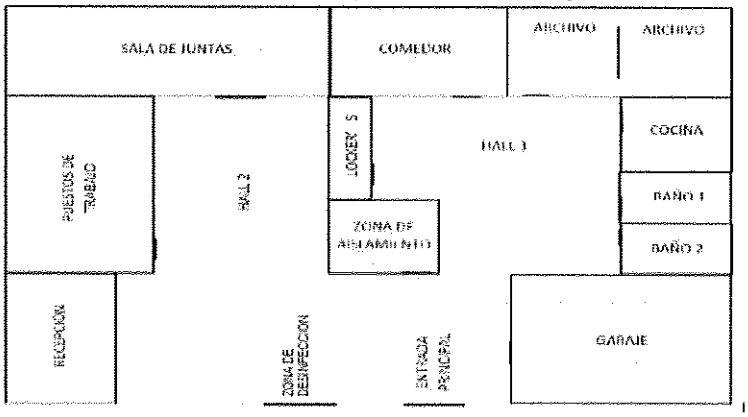

5.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.4.1 ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS

En el periodo del presente informe no se registró actos y condiciones inseguros.

5.4.2 CAPACITACIONES

Durante el periodo se realiza la capacitación de seguridad vial

INDICADORES SST

A continuación, se remite los indicadores del contrato de interventoría 510-2023 para el periodo del 1 de julio 2024 al 30 de julio 2024.

INDICADORES DE GESTIÓN	MAYO	OBSERVACIONES
Horas Hombre Trabajadas	1135.2	Se tiene en cuenta las horas laboradas durante el periodo
Total, de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0	Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo
Registro de tiempo de ausencia por causas médicas	0	No se presento
Numero de incapacidades	0	No se presentaron
Número de personas para assistir a permisos de consulta medica	0	Durante el período no se presentaron solicitudes de permisos parà asistir a consultas medicas

OBJETIVO	FÓRMULAS		JULIO		OBSERVACIONES
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en un mes / Número de trabajadores en el mes	X 100	= (0/13) *100 =0	0%	No han ocurrido accidentes
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD: Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes	X 100	= (0+0) /13*100 =0	0%	*No han ocurrido accidentes*
OBJETIVO	**FÓRMULAS**		JULIO		**OBSERVACIONES**
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES: Número de	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en	X100	= (0/0) *100 = 0	0%	No han ocurrido accidentes

accidentes de trabajo mortales en el año	el año Total, de accidentes de trabajo que se presentaron en el año				
PREVALENCIADE LA ENFERMEDAD LABORAL: Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" Promedio de trabajadores en el periodo "Z"	X 100	= (0/13)*100 = 0	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" Promedio de trabajadores en el periodo "Z"	X100	= (0/13) *100 = 0	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA: Ausentismo en la no asistencia al trabajo con incapacidad médica	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes Número de días de trabajo programados en el mes	X100	= (0/13)*100 =0	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral

6. CONCLUSIONES

- Durante el periodo del informe no se presentaron ingresos trabajadores al contrato de interventoría

- El consorcio Soluciones para la ingeniería se desarrolló las actividades contempladas en el cronograma de actividades SST

- Durante el periodo de este informe, del 1 de julio 2024 al 31 de julio 2024 no se presentaron accidentes y/o incidentes en el marco del contrato de obra de interventoría 510-2023.

- Durante el periodo de este informe se realizó visita a campamentos en los diferentes parques que se encuentran en ejecución.

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS CONTRATISTA

ANEXO 1. ACTAS DE COMITES

ANEXO 2. CONTRATOS PERSONAL INTERVENTORIA

ANEXO 3. HORAS HOMBRE TRABAJADAS

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAS SOCIAL

ANEXO 5. INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO NO APLICA PARA PERIODO

ANEXO 6. EXAMENES DE INGRESO NO APLICA PARA PERIODO

ANEXO 7. ENTREGA DE DOTACION NO APLICA PARA PERIODO

ANEXO 8. CERTIFICACIONES PARAFISCALES

ANEXO 9. PAZ Y SALVO NO APLICA PARA PERIODO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 19/07/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 44

HORA DE INICIO: 09:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 11: 00a m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobier

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.44, teniendo en cuenta que en el comité se encuentran profesionales nuevos por parte del contratista de obra y de la entidad se procede a realizar la presentación de todos los asientes al comité así:


- Iván Pardo: Representante legal del Consorcio Parques 2023
- Isabel Llanos Director de obra Consorcio Parques 2023
- Jeanneth Fajardo Residente de obra Consorcio Parques 2023
- Angy Pinilla apoyo en elaboración de cortes de obra contratista de obra
- Jimena Guerra Director de interventoría
- Brayan Rodríguez Inspector de interventoría
- Oscar parra inspector de interventoría
- Laura Muñoz Apoyo a la Supervisión del FDLB

La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así

SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACION
1	Entrega de acta de cierre parques libertador y la portada	CONTRATISTA DE OBRA	17 DE JULIO DE 2024	INCUMPLIDA	
2	Mesa de trabajo para revisión de balance de obra de 28 parques	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	12 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDA	
3	Entrega de programación NP 2	CONTRATISTA DE OBRA	16 DE JULIO DE 2024	INCUMPLIDA	
4	Entrega de subsanación plan de contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	13 DE JULIO DE 2024	INCUMPLIDA	Fue remitida el 17 de julio de 2024 bajo comunicado CPB-FDLB 508-833-2024
5	Entrega de implantación del juego 100607 y juego 106624 en el parque la Libertad	CONTRATISTA DE OBRA	12 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDA	

AVANCE FINANCIERO

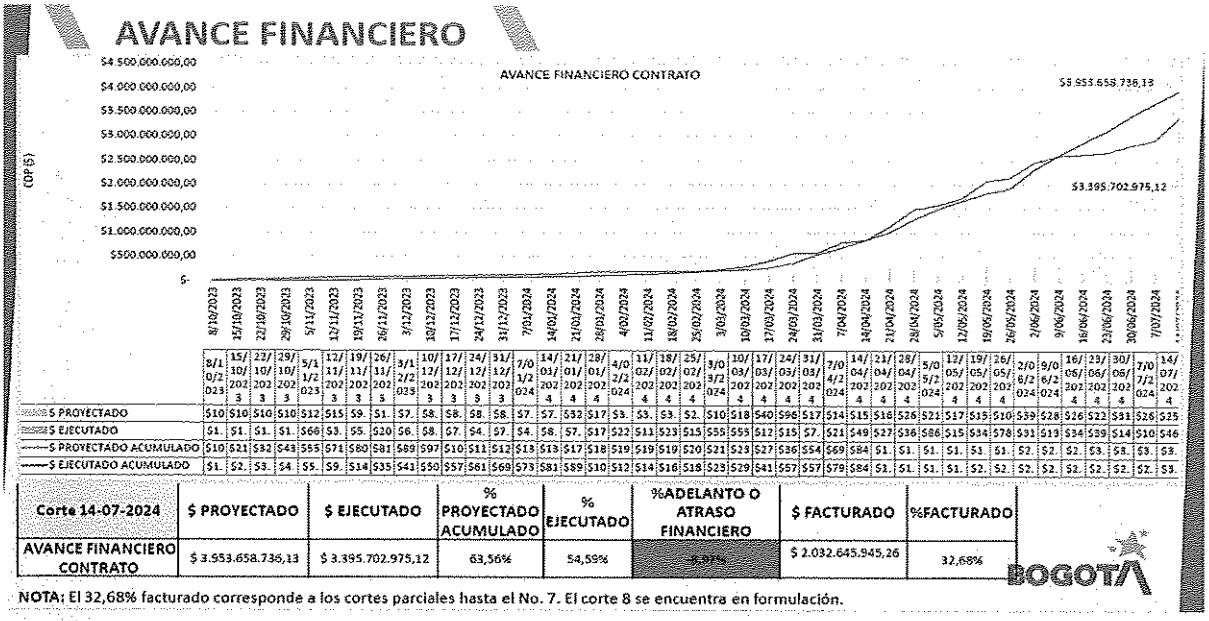


	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024
$ PROYECTADO	$10	$10	$10	$10	$12	$15	$9.	$1.	$7.	$8.	$8.	$8.	$8.	$7.	$7.	$32	$17	$3.	$3.	$3.	$2.	$10	$18	$40	$96	$17	$14	$15	$16	$26	$21	$17	$15	$10	$39	$28	$26	$22	$31	$26	$25
$ EJECUTADO	$1.	$1.	$1.	$1.	$66	$3.	$5.	$20	$6.	$8.	$7.	$4.	$7.	$4.	$8.	$7.	$17	$22	$11	$23	$15	$55	$55	$12	$15	$7.	$21	$49	$27	$36	$86	$15	$34	$78	$31	$19	$34	$39	$14	$10	$46
$ PROYECTADO ACUMULADO	$10	$21	$32	$43	$55	$71	$80	$81	$89	$97	$10	$11	$12	$13	$13	$17	$18	$19	$19	$19	$20	$21	$23	$27	$36	$54	$69	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.	$3.	$3.
$ EJECUTADO ACUMULADO	$1.	$2.	$3.	$4	$5.	$9.	$14	$35	$41	$50	$57	$61	$69	$73	$81	$89	$10	$12	$14	$16	$18	$23	$29	$41	$57	$57	$79	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$3.

Corte 14-07-2024	$ PROYECTADO	$ EJECUTADO	% PROYECTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	%ADELANTO O ATRASO FINANCIERO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 3.953.658.736,13	$ 3.395.702.975,12	63,56%	54,59%	-9,97%	$ 2.032.645.945,26	32,68%

NOTA: El 32,68% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 7. El corte 8 se encuentra en formulación.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

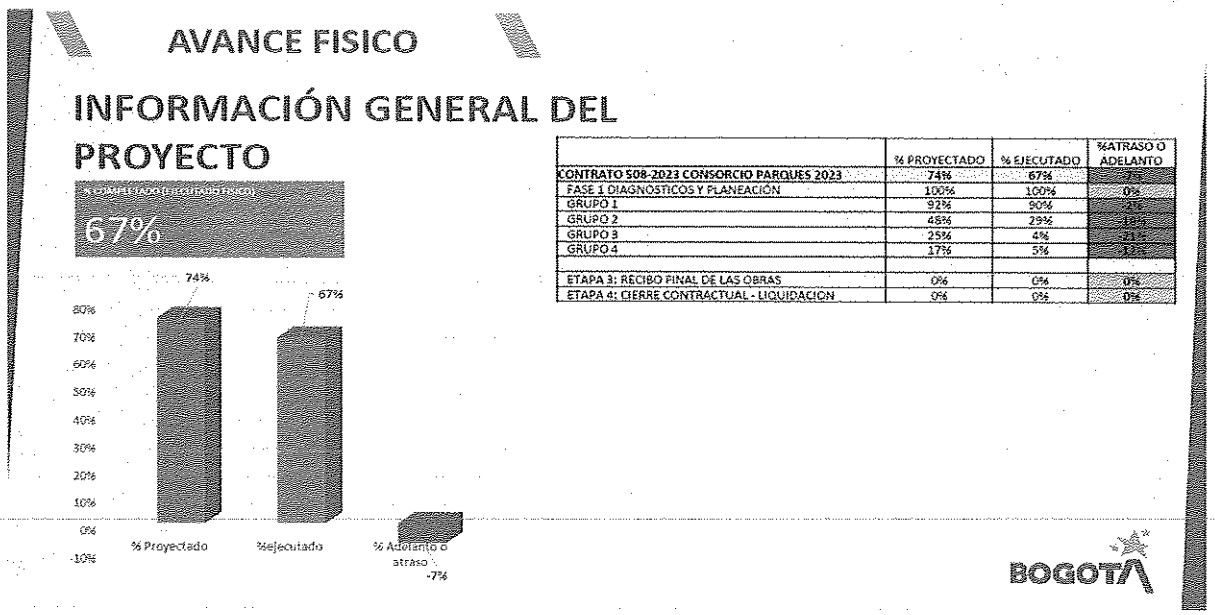

	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTO
CONTRATO S08-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	74%	67%	-7%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	100%	0%
GRUPO 1	92%	90%	-2%
GRUPO 2	48%	29%	-19%
GRUPO 3	25%	4%	-21%
GRUPO 4	17%	5%	-12%
ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4: CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION	0%	0%	0%

CONTROL FISICO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA DE 28 PARQUES

AVANCE FISICO

Estado general de los diferentes frentes

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	PUESTO EN SERVICIO	vie 3/11/23	vie 3/05/24	100,00%	100,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCIÓN	vie 3/11/23	vie 3/05/24	98,00%	100,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	PUESTO EN SERVICIO	jue 2/11/23	jue 20/06/24	99,00%	99,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCIÓN	jue 29/02/24	jue 8/08/24	74,00%	89,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	PUESTO EN SERVICIO	mar 30/01/24	vie 16/08/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCIÓN	lun 22/01/24	mar 25/06/24	56,00%	81,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	lun 11/03/24	jue 15/08/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	EN EJECUCIÓN	jue 2/11/23	vie 17/05/24	67,00%	43,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	EN EJECUCIÓN	jue 2/05/24	mié 21/08/24	99,00%	100,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	jue 2/11/23	jue 4/07/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 19/06/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 10/07/24	99,00%	64,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	EN EJECUCIÓN	lun 6/05/24	mar 13/08/24	35,00%	38,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	EN EJECUCIÓN	lun 20/05/24	mar 20/08/24	41,00%	75,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	EN EJECUCIÓN	lun 20/05/24	mar 20/08/24	33,00%	63,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	EN EJECUCIÓN	lun 27/05/24	vie 9/08/24	18,00%	46,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	EN EJECUCIÓN	mié 5/06/24	jue 22/08/24	21,00%	32,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	mié 5/06/24	mar 27/08/24	12,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	lun 22/07/24	vie 30/08/24	4,00%	26,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	mié 5/06/24	vie 30/08/24	3,00%	23,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	mié 5/06/24	vie 30/08/24	6,00%	24,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	jue 20/06/24	vie 30/08/24	5,00%	15,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	jue 20/06/24	lun 26/08/24	5,00%	40,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	mié 5/06/24	mar 20/08/24	2,00%	18,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	SIN INICIAR	jue 20/06/24	vie 30/08/24	4,00%	19,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	jue 20/06/24	vie 30/08/24	15,00%	13,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	8,00%	18,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	7,00%	0,00%

AVANCE FISICO


Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% Completado	Diferencia	Variación Comienzo
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	vie 3/11/23	vie 3/05/24	131 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	jue 2/11/23	jue 20/06/24	166 días	98%	100,00%	-2,00%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	jue 29/02/24	jue 8/08/24	115 días	99%	99,00%	0,00%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	mar 30/01/24	vie 16/08/24	144 días	74%	89,00%	-15,00%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	lun 22/01/24	mar 25/06/24	112 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	jue 15/08/24	114 días	56%	81,00%	-25,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	vie 17/05/24	142 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	jue 2/05/24	mié 21/08/24	80 días	67%	43,00%	24,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	jue 4/07/24	176 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	vie 2/02/24	mié 19/06/24	99 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	vie 2/02/24	mié 10/07/24	114 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	lun 6/05/24	mar 13/08/24	72 días	99%	64,00%	35,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	35%	38,00%	-3,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	41%	75,00%	-34,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	55 días	33%	63,00%	-30,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	57 días	18%	46,00%	-28,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	60 días	21%	32,00%	-11,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	lun 22/07/24	vie 30/08/24	30 días	12%	0,00%	12,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	4%	26,00%	-22,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	3%	23,00%	-20,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	6%	24,00%	-18,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	jue 20/06/24	lun 26/08/24	48 días	5%	15,00%	-10,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	55 días	5%	40,00%	-35,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	2%	18,00%	-16,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	4%	19,00%	-15,00%
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	15%	13,00%	2,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	8%	18,00%	-10,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	jue 1/08/24	mié 28/08/24	20 días	7%	0,00%	7,00%

AVANCE FISICO

Nombre	Inicio	Fin	Duración	Porcentaje	Proyectado	Diferencia Proyectado
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	vie 3/11/23	vie 3/05/24	131 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	jue 2/11/23	jue 20/06/24	166 días	98%	100,00%	-2,00%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	jue 29/02/24	jue 8/08/24	116 días	99%	99,00%	0,00%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	mar 30/01/24	vie 16/08/24	144 días	74%	89,00%	-15,00%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	lun 22/01/24	mar 25/06/24	112 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	jue 15/08/24	114 días	56%	81,00%	-25,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	vie 17/05/24	142 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	jue 2/05/24	mié 21/08/24	80 días	67%	43,00%	24,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	jue 4/07/24	176 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	vie 2/02/24	mié 19/06/24	99 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	vie 2/02/24	mié 10/07/24	114 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	lun 6/05/24	mar 13/08/24	72 días	99%	64,00%	35,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	35%	38,00%	-3,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	jun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	41%	75,00%	-34,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	55 días	33%	63,00%	-30,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	57 días	18%	46,00%	-28,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	60 días	21%	32,00%	-11,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	lun 22/07/24	vie 30/08/24	30 días	12%	0,00%	12,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	4%	26,00%	-22,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	3%	23,00%	-20,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	6%	24,00%	-18,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	jue 20/06/24	lun 26/08/24	48 días	5%	15,00%	-10,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	55 días	5%	40,00%	-35,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	2%	18,00%	-16,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	jue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	4%	19,00%	-15,00%
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	15%	13,00%	2,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	8%	18,00%	-10,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	jue 1/08/24	mié 28/08/24	20 días	7%	BOG	7,00%

AVANCE FISICO

Análisis avance físico en el tiempo

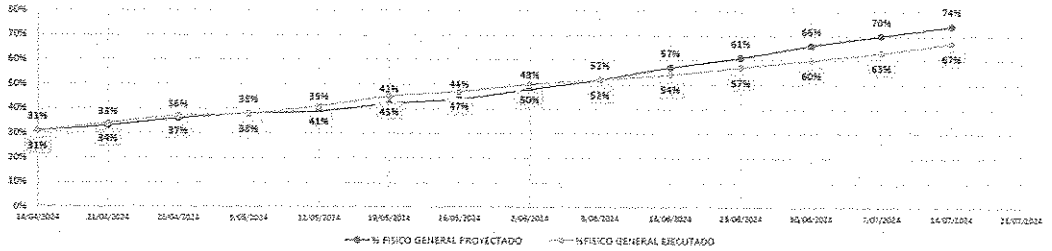

NOTA: A partir del grafico se tiene una ecuación de tendencia del porcentaje físico ejecutado aproximado equivalente a:

$$\%fisico\ ejecutado = 0{,}0267 * semana + 0{,}3091; \qquad R^2 = 0{,}9963$$

Donde, "semana" ∈ {14-04-2024 =0 ; 01-09-2024 =20). Por lo tanto, se tiene que de continuar en la línea de tendencia actual para la fecha de terminación del contrato se tendría un porcentaje físico ejecutado aproximado de 84,31%

$$\%fisico\ ejecutado(1/09/2024) = 0{,}0267 * (20) + 0{,}3091 = 84.31\%$$

Lo anterior, permite inferir que de no tomarse medidas para la fecha de terminación del contrato se corre el riesgo de presentar un presunto incumplimiento del plazo contractual del contrato.

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	%atraso o adelanto
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	jue 2/11/23	jue 20/06/24	98%	100%	-2%
Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMedio	mar 19/12/23	mar 23/01/24	95%	100%	-5%
AdoquínArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	vie 5/04/24	lun 20/05/24	94%	100%	-6%
Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	sáb 1/06/24	vie 14/06/24	50%	100%	-50%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	mar 30/01/24	mar 13/08/24	74%	89%	-15%
AUSTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	mar 23/04/24	mar 30/04/24	0%	100%	-100%
Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	mar 23/04/24	lun 29/04/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 24/05/24	jue 30/05/24	25%	100%	-75%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 31/05/24	vie 31/05/24	30%	100%	-70%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 31/05/24	mié 5/06/24	33%	100%	-67%
Pintura Modulo M-5 Columpio	vie 24/05/24	jue 30/05/24	30%	100%	-70%
Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	vie 31/05/24	jue 6/06/24	0%	100%	-100%
Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquin incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	lun 6/05/24	vie 14/06/24	80%	100%	-20%
MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	lun 24/06/24	vie 19/07/24	0%	75%	-75%
BANCA M - 31 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	91%	100%	-9%
BANCA M-40 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	jue 11/07/24	mié 17/07/24	0%	40%	-40%
MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	jue 11/07/24	vie 26/07/24	0%	17%	-17%
Recubrimiento skate master	jue 30/05/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 29/03/24	vie 26/04/24	95%	100%	-5%
CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	mié 19/06/24	vie 9/08/24	35%	47%	-12%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	lun 12/08/24	56%	81%	-25%
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 21/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	15%	100%	-85%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	lun 24/06/24	vie 19/07/24	0%	75%	-75%
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	mié 3/07/24	mar 16/07/24	0%	80%	-80%
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	mié 3/07/24	mar 16/07/24	0%	80%	-80%
MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	mié 3/07/24	mar 23/07/24	0%	53%	-53%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	jue 28/03/24	mié 24/07/24	80%	91%	-11%
Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	vie 17/05/24	mar 21/05/24	60%	100%	-40%
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	vie 21/06/24	jue 18/07/24	65%	80%	-15%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	jue 4/07/24	99%	100%	-1%
MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta)	vie 14/06/24	lun 24/06/24	90%	100%	-10%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	lun 19/08/24	35%	38%	-3%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 30/05/24	lun 3/06/24	60%	100%	-40%
Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMedio	mié 26/06/24	mar 2/07/24	0%	100%	-100%
Excavación manual+retiro suelo blando+Traslag(<50m	mié 3/07/24	lun 8/07/24	95%	100%	-5%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mar 9/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	67%	-67%
Geotextil geo5T300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	mar 9/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	67%	-67%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 20/05/24	mar 20/08/24	41%	75%	-34%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mié 19/06/24	jue 20/06/24	20%	100%	-80%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 16/07/24	0%	87%	-87%
Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	mar 2/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 5/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	67%	-67%
Recubrimiento skate master	mié 26/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	lun 10/06/24	vie 28/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 21/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	33%	63%	-30%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	vie 14/06/24	lun 17/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mar 18/06/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	jue 20/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	mar 2/07/24	mié 3/07/24	33%	100%	-67%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	jue 4/07/24	vie 5/07/24	33%	100%	-67%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	lun 8/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	jue 11/07/24	lun 15/07/24	15%	67%	-52%
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	jue 4/07/24	lun 8/07/24	33%	100%	-67%
Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	mié 10/07/24	jue 18/07/24	0%	43%	-43%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	18%	46%	-28%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mié 26/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	jue 4/07/24	vie 12/07/24	10%	100%	-90%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES,	mié 26/06/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte juego tipo M-3-STPM**	mié 26/06/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	21%	32%	-11%
Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	mar 25/06/24	lun 1/07/24	20%	100%	-80%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	lun 8/07/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mié 10/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	mié 10/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	4%	26%	-22%
INSTALACIÓN DE PMT	mar 11/06/24	jue 13/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 18/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	jue 4/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES,	lun 24/06/24	vie 5/07/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-059 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	jue 29/08/24		3%	23% -20%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 12/06/24	vie 14/06/24		0%	100% -100%
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	lun 17/06/24	mar 18/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mié 19/06/24	lun 24/06/24		0%	100% -100%
Desmonte Señal (IDG-S)	mar 25/06/24	mar 25/06/24		0%	100% -100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mié 26/06/24	jue 27/06/24		0%	100% -100%
Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMedio	vie 28/06/24	lun 8/07/24		0%	100% -100%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 9/07/24	mié 10/07/24		0%	100% -100%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	jue 11/07/24	mié 17/07/24		0%	40% -40%
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	vie 28/06/24	jue 11/07/24		0%	100% -100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Atraso o Adelanto
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 20/06/24	vie 30/08/24		6%	24% -18%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 26/06/24	vie 28/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	lun 1/07/24	jue 4/07/24		0%	100% -100%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	vie 5/07/24	mar 9/07/24		0%	100% -100%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	mié 10/07/24	vie 12/07/24		0%	100% -100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24		5%	40% -35%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 12/06/24	jue 13/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	vie 14/06/24	jue 20/06/24		0%	100% -100%
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	vie 21/06/24	lun 24/06/24		0%	100% -100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 25/06/24	mié 26/06/24		0%	100% -100%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	jue 27/06/24	mar 2/07/24		0%	100% -100%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mié 3/07/24	mié 3/07/24		0%	100% -100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	jue 4/07/24	lun 8/07/24		0%	100% -100%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	jue 4/07/24	lun 8/07/24		0%	100% -100%
Geotextil Tejido T-1700** Sum + Inst CDRC	jue 4/07/24	mar 9/07/24		0%	100% -100%
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	jue 27/06/24	vie 5/07/24		0%	100% -100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	mar 9/07/24	lun 15/07/24		0%	80% -80%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	jue 20/06/24	vie 23/08/24		5%	15% -10%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 26/06/24	jue 27/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 2/07/24	lun 8/07/24		0%	100% -100%
Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMedio	mar 9/07/24	mié 17/07/24		0%	57% -57%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 20/06/24	vie 30/08/24		2%	18% -16%
INSTALACIÓN DE PMT	lun 24/06/24	mié 26/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 27/06/24	vie 5/07/24		0%	100% -100%
DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	lun 8/07/24	mié 10/07/24		0%	100% -100%
Desmonte Señal (IDG-S)	jue 11/07/24	jue 11/07/24		0%	100% -100%
Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	vie 12/07/24	vie 12/07/24		0%	100% -100%
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	lun 8/07/24	vie 19/07/24		0%	50% -50%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	%atraso o adelanto
PARQUE 07-081 LAURELES	jue 20/06/24	vie 30/08/24		4%	19% -15%
INSTALACIÓN DE PMT	jue 20/06/24	jue 20/06/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 25/06/24	mié 26/06/24		0%	100% -100%
Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro	jue 27/06/24	mié 3/07/24		0%	100% -100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	jue 4/07/24	jue 4/07/24		0%	100% -100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	vie 5/07/24	lun 8/07/24		0%	100% -100%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	mar 9/07/24	mié 17/07/24		0%	57% -57%
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	jue 27/06/24	vie 5/07/24		0%	100% -100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% avance o atraso
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24		8%	18% -10%
INSTALACIÓN DE PMT	vie 5/07/24	mié 10/07/24		0%	100% -100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 11/07/24	vie 19/07/24		0%	29% -29%


AVANCE FISICO

Desarrollo Palestina 07-022

En la semana se ejecutaron las siguientes actividades:

- Limpieza general del parque

DURANTE

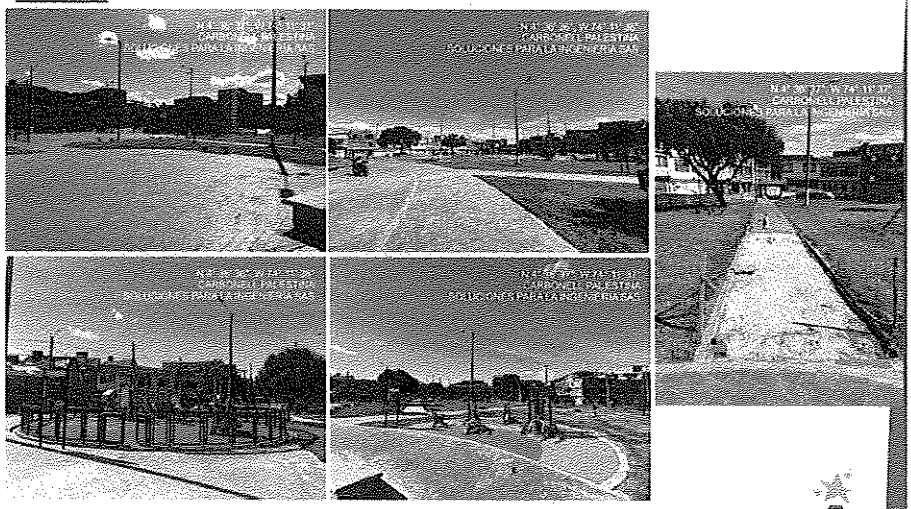


BOGOTÁ

AVANCE FISICO

Urbanización Jiménez de Quesada 07-015

DURANTE

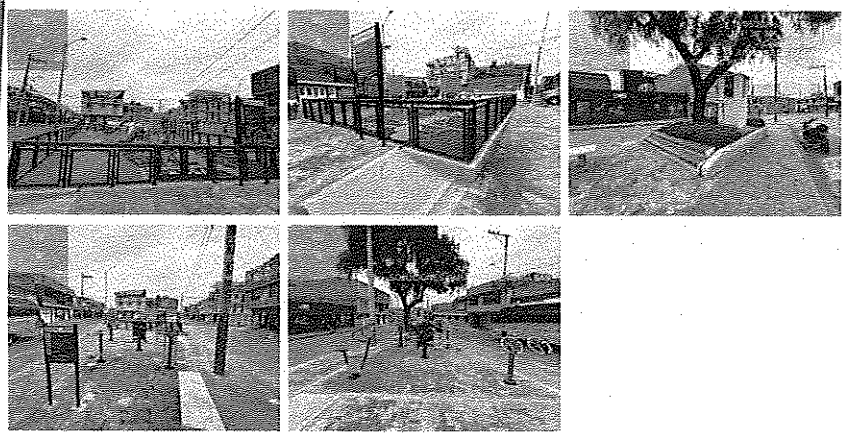


EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

Urbanización el Regalo 07-007

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

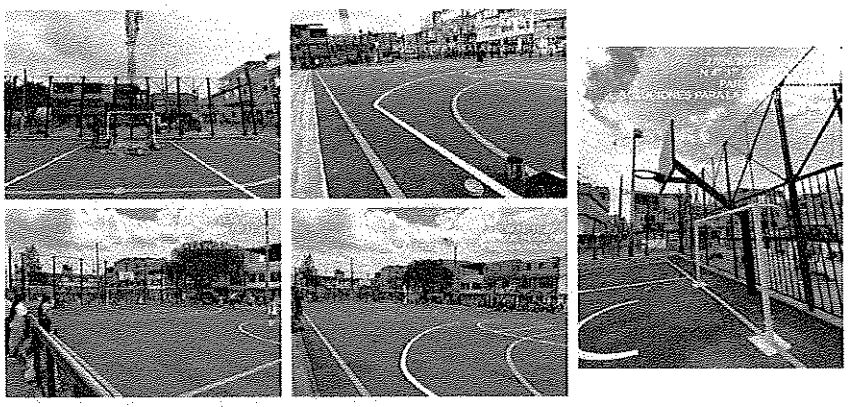

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

07-104 JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS

En la semana se ejecutaron las siguientes actividades

- Ya se ejecutó la totalidad de actividades, quedando pendiente el arreglo de biosafudable pectoral

DURANTE



BOGOTÁ

AVANCE FISICO

07-044 JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

DURANTE








BOGOTÁ


AVANCE FISICO

07-179 JOSE MARIA CARBONELL

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

DURANTE

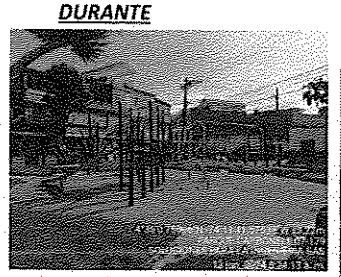

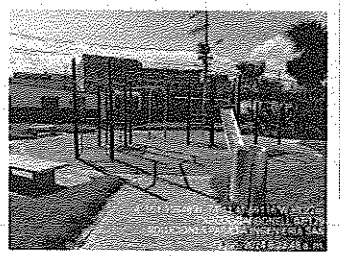



BOGOTÁ


AVANCE FISICO

07-002 DESARROLLO BOSALINDA

Actividades ejecutadas

- Instalación de cerramiento perimetral
- Fundida de placas en concreto
- Pintura de cerramiento contraimpacto
- Lijado de arcos de microfutbol
- Inicio lijado de juegos M-5
- Inicio lijado de baranda M-80 existente.

DURANTE

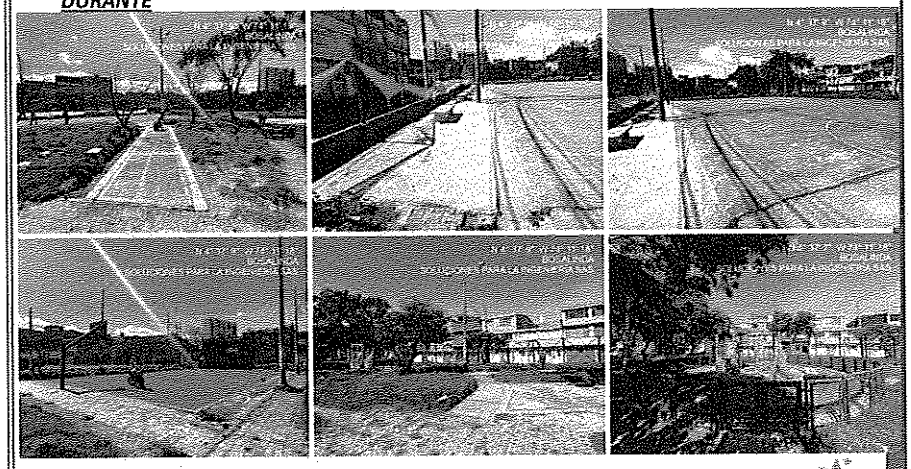


BOGOTÁ

AVANCE FISICO

07-026 DESARROLLO EL RINCÓN DE BOSA

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

DURANTE

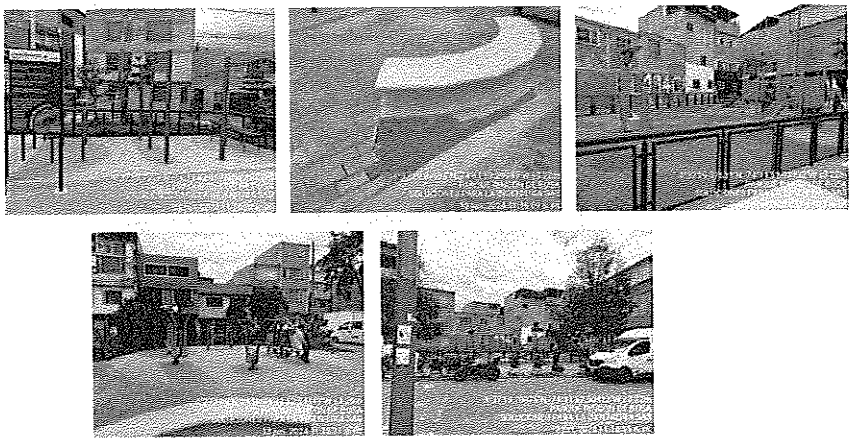


BOGOTÁ

AVANCE FISICO

07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

DURANTE

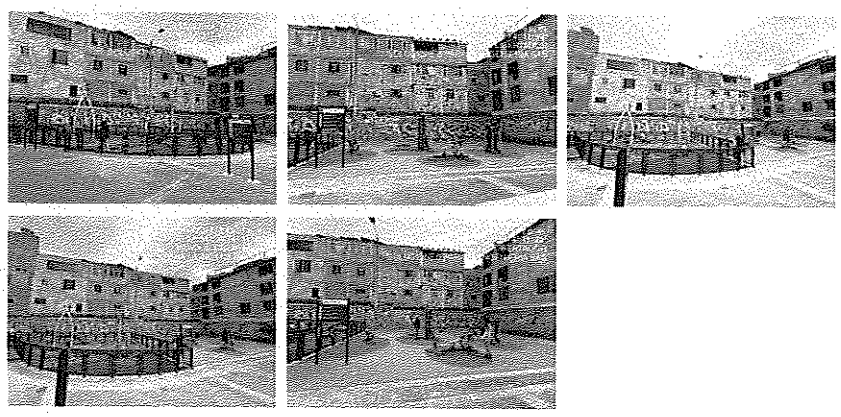


BOGOTÁ

AVANCE FISICO

07-299 DESARROLLO LA PORTADA

EL PARQUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD

DURANTE

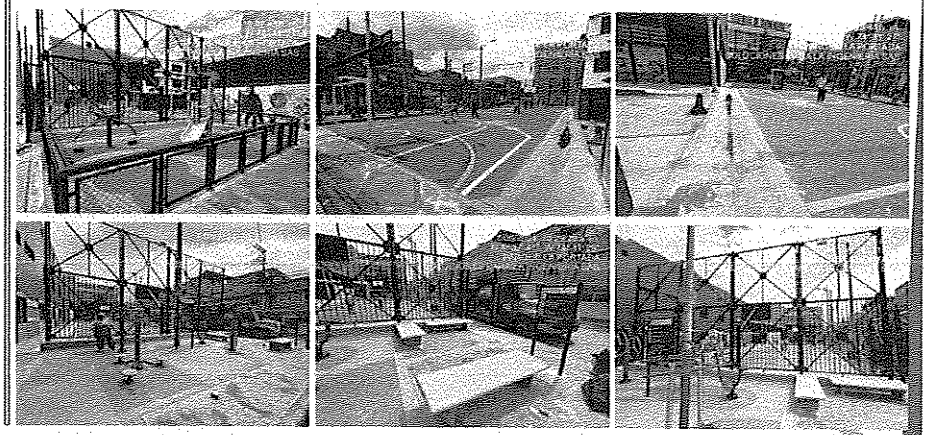


BOGOTÁ





Debido a que durante la actividad de vaciado de concreto en placa se presentaron fuertes lluvias, la interventoría solicitó al contratista de obra la toma de núcleo en placa, antes de la instalación de piso caucho.

El contratista de obra informa que el especialista recomendó la toma de esclerometría sobre la placa.

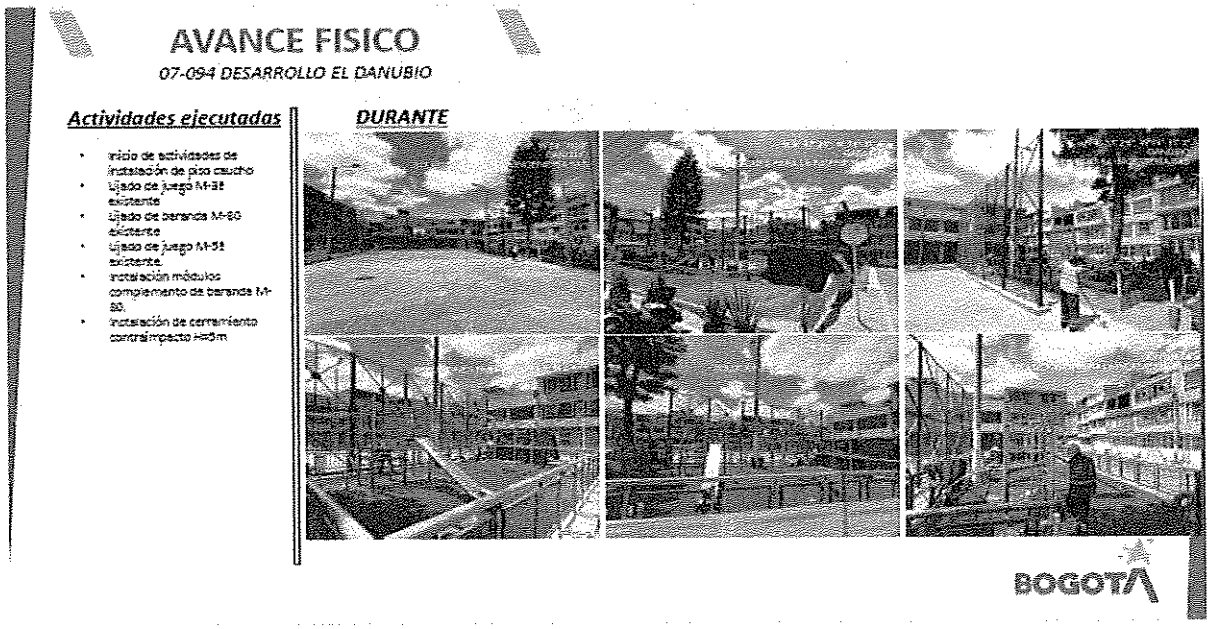

El contratista de obra informa que están trabajando con el fin de poder entregar este parque el 30 de julio, aclarando que el parque según programación no está para el mes de julio.

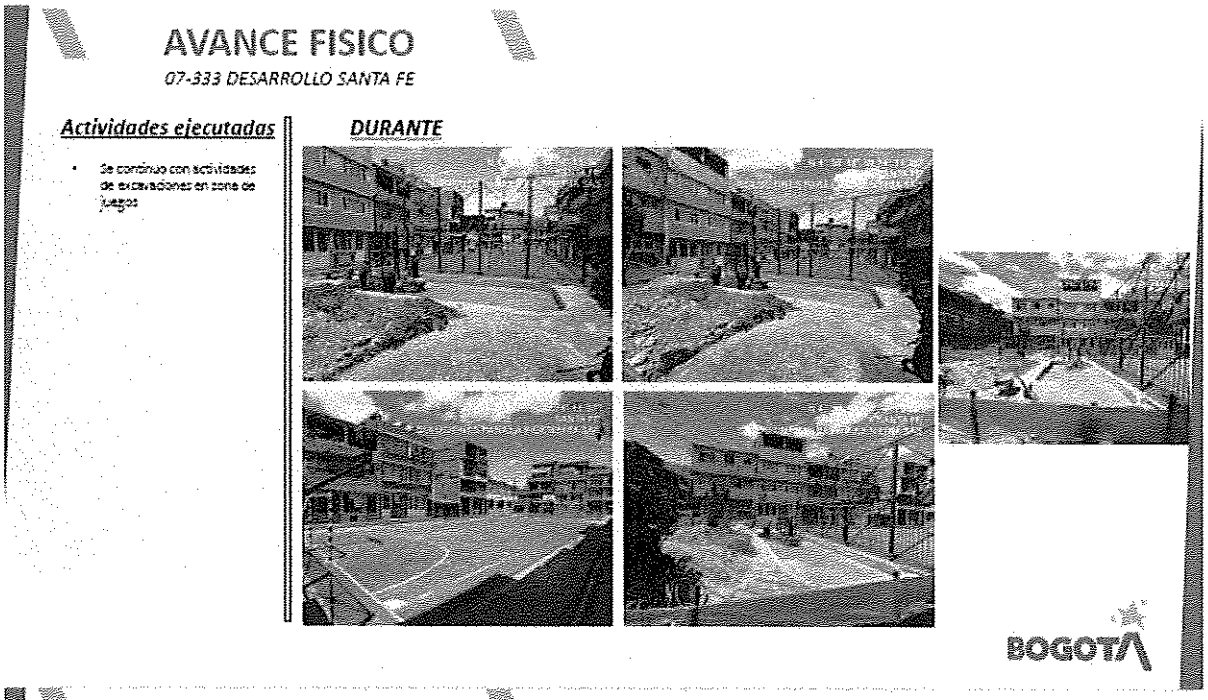

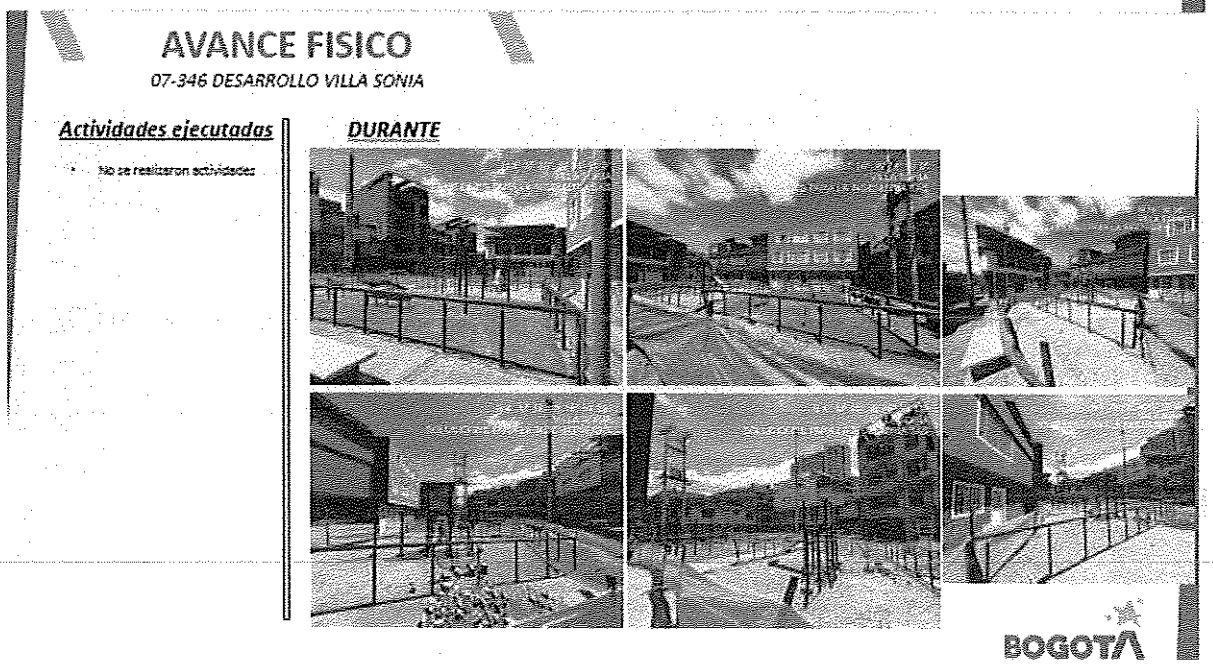

AVANCE FISICO

07-003 DESARROLLO BRASIL II SECTOR

Actividades ejecutadas

- Lijado de juego infantil M-3 existente
- Instalación de juego infantil carrusel
- Instalación de módulos complemento de baranda M-80 existente.
- Lijado de baranda M-80 existente
- Lijado de arcos de microfutbol
- Lijado de cerramiento contraimpacto en parte inferior

DURANTE




AVANCE FISICO

07-272 DESARROLLO NUEVA ESCOCIA


Actividades ejecutadas

- Instalación de juego infantil casita
- Desmonte de adoquín (gramoquín)
- Retiro de tierra negra de área de sendero en gramoquín
- Inicio demolición de placas de bicisludables

DURANTE

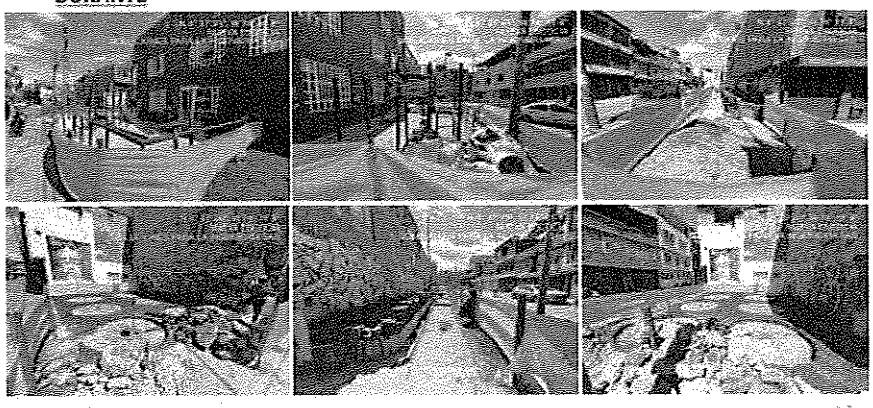

BOGOTÁ

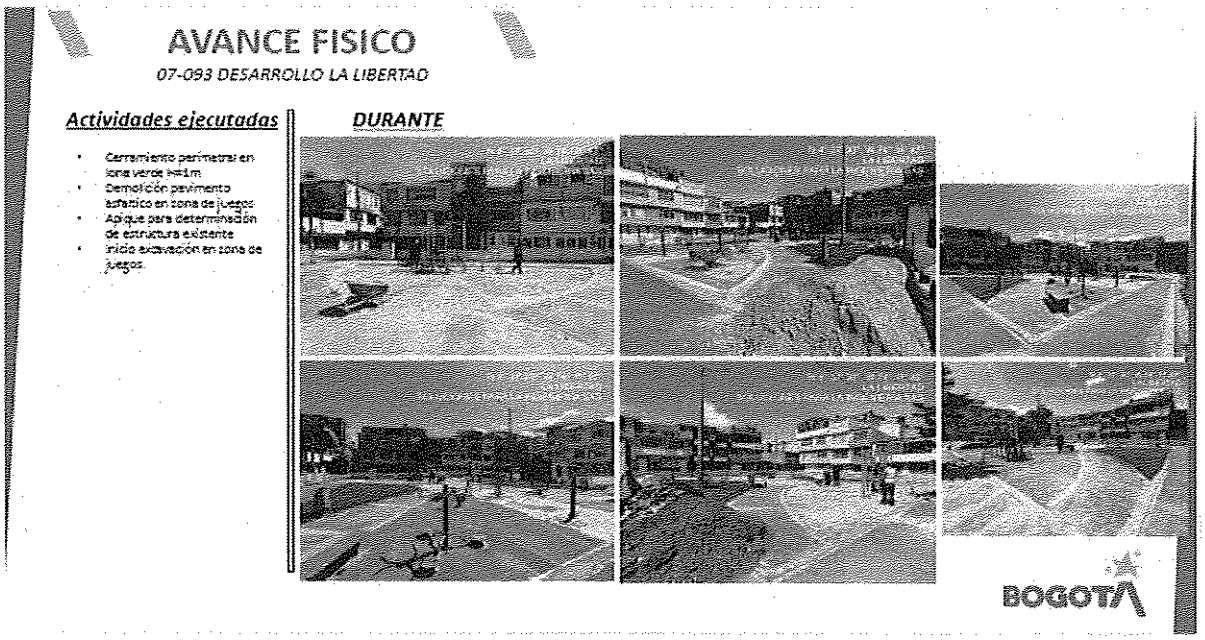

PARQUES PROXIMOS A ENTREGAR

El contratista de obra informa que los parques próximos ser entregados en el mes de julio a la comunidad son:

- Urbanización José María Carbonell 104
- Palestina
- El Libertador
- Bosalinda

COMPONENTE PMT

APROBADOS

COD PARQUE	NOMBRE PARQUE	FECHA		CON APROBACIÓN
		INICIO	FIN	
07-015	PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	29/05/2024	27/06/2024	12 DEL 21/03/2024
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	18/01/2024	11/07/2024	08 del 18/01/2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07-026	PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	18/01/2024	11/07/2024	08 del 18/01/2024
07-007	PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	18/01/2024	11/07/2024	08 del 18/01/2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07-082	DANUBIO AZUL	28/06/2024	25/08/2024	26 DEL 27-06-2024
07-022	DESARROLLO PALESTINA	28/06/2024	25/08/2024	26 DEL 27-06-2024
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	05/04/2024	25/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-259	DESARROLLO LA PORTADA	05/04/2024	25/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	05/04/2024	25/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	05/04/2024	25/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	10/05/2024	5/09/2024	19 DEL 09-05-2024
07-333	DESARROLLO SANTAFE	10/05/2024	5/09/2024	19 DEL 09-05-2024

La interventoría informa que el PMT del parque Bosalinda se encuentra vencido, motivo por el cual no se pueden adelantar ninguna actividad en dicho parque, hasta tanto no se cuente con la aprobación de prórroga de tiempo por parte de la SDM.

COMPONENTE PMT

COD PARQUE	NOMBRE PARQUE	FECHA		CON APROBACIÓN
		INICIO	FIN	
07-339	DESARROLLO EL CAUCE	17/05/2024	5/09/2024	20 DEL 16-05-2024
07-272	DESARROLLO NUEVA ESCOCIA	24/05/2024	12/09/2024	21 DEL 23-05-2024
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	31/05/2024	26/09/2024	25 DEL 30-05-2024
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	14/06/2024	10/10/2024	24 DEL 13-06-2024
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	18-07-2024	21-11-2024	29 DEL 18-07-2024
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	28-06-2024	26/12/2024	26 DEL 27-06-2024
07-087	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	28-06-2024	26/12/2024	26 DEL 27-06-2024
07-069	DESARROLLO OLARTE	05-07-2024	26-12-2024	27 DEL 04-07-2024
07-215	DESARROLLO OLARTE	05-07-2024	26-12-2024	27 DEL 04-07-2024
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	11-07-2024	26-12-2024	28 DEL 11-07-2024

PMTs PENDIENTES DE APROBACIÓN POR PARTE DE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	FECHA DE INICIO INSTALACIÓN PMT SEGÚN PROGRAMACION
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3	26-06-2024
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4	25-06-2024
07-265	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4	02-08-2024
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4	24-06-2024

INSTALACION DE PMTS

El contratista de obra informa que el lunes 22 de julio se iniciara la instalación de los PMT en los parques que se encuentran pendientes.

PARQUE PALESTINA

El contratista de obra informa que el día de hoy 19 de julio llega a obra el adoquín que falta para finalizar la actividad.

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

- Se da APROBACIÓN a informe mensual ambiental N 9 V 3 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0752 el 18 de julio de 2024
- Se reciben los reportes de actividades ambientales, evidenciando la gestión ambiental en cada uno de los frentes de trabajo, sin embargo, se recomienda seguir con el seguimiento ambiental en cada uno de los frentes de obra
- Para el mes de julio 2024 se debe realizar por parte de interventoría el cargue de información del segundo trimestre del año 2024 a la SDA, Se programa mesa de trabajo con el ingeniero Manuel de la supervisión el día 23 de julio de 2024 Para atender dicha actividad
- Se reitera la observación de mantenimiento al cerramiento perimetral de los frentes de trabajo que así lo requieran.
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros
- Continuar con el seguimiento al RCD y material granular que debe tener su respectivo acopio, señalización y protección con polietileno negro.


BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL – REGISTRO FOTOGRAFICO



Orden y Aseo – punto ecológico reportado por contratista en frente de trabajo La libertad

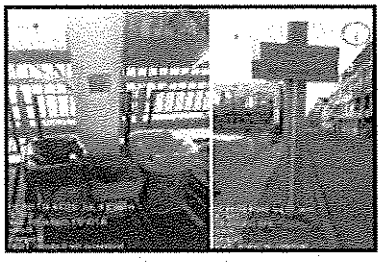

Programa de señalización y punto ecológico reportado por contratista en frente de trabajo el Danubio

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL – REGISTRO FOTOGRAFICO



Mantenimiento de cerramiento y malla de protección de sumideros frentes de trabajo villa Sonia



Punto ecológico y mantenimiento de cerramiento a individuos arbóreos frentes de trabajo nueva escocia



Punto ecológico y malla de protección de sumidero frente de trabajo santa fe

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 08 de JULIO 2024 14 de JULIO 2024			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	CAMPAMENTOS	0	
2	PUNTOS ECOLOGICOS REPARTADOS POR CONTRATISTA	13	
3	BAÑOS	0	• Descanso Palmeras 69-021 Calle 69 Sur # 93; 43 Bosa Palmitas • Descanso Bosa 84-001 • Urbanización José María Carbonell 1 Y 2 Etapa 69-104 se ubica por entrada Calle 69B # 97 B 10 – 69 • Urbanización El Rincón 67-007 Carrera 98 # 66 – 66 Sur • Descanso Danubio Azul 1 Y 2 87-014 Calle 69 Sur • Descanso Villa Nueva 1 y Descanso Bosa Pro 69-110 87-048 Calle 70 Sur # 87-43

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 08 de JULIO 2024 14 de JULIO 2024				
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	OBSERVACION
4	ACOPIOS		-	Contratista manifiesta que se reportaran puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinámica de las obras
5	SUMIDEROS PROTEGIDOS		29	Frente de obra / N° sumideros 07-501 DESARROLLO PALESTINA: 7 07-502 DESARROLLO BOSATAMA: 3 07-503 DESARROLLO EL REGALO: 4 07-504 DESARROLLO CARBONELL: 5 07-505 ARCON DE BOSA: 5 07-506 CONEXIONES: 2 07-507 DESARROLLO LENTA P2: 3 Se recomienda durante la semana del 01 de julio al 07 de julio de 2024 realizar mantenimiento a la malla de protección de los sumideros identificados.
6	INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS		93	Frente de obra / N° individuos arbóreos protegidos Contratista manifiesta que serán protegidos los individuos arbóreos conforme a la dinámica de la obra.
7	RCD	N SITU (m3)	-	Durante la ejecución del contrato, contratista reporta en su consolidado, un total en m3 entregado a planta de aprovechamiento de 649,61 m3, los cuales han sido entregados a gestores autorizados en Ambiental (EAI antes SECRETARIA de (SMA)
		APROVECHAMIENTO (m3)	607.0	
		DISPOSICION FINAL (m3)	-	
	RESIDUOS METALICOS (Chatarra)		0.03	Se reporta por parte del contratista entrega de residuos metálicos con gestor PREVENTIVA MARTHA

BOGOTÁ

El contratista de obra informa que se instalara cerramiento de polisombra mientras le autorizan la instalación de polimalla a 1mts de altura, según lo solicita la comunidad por la inseguridad de la zona.

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	50		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	34		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	16		DIRECCIÓN PUNTO CREA	
OTROS	0		Cra 80 A 81 - 16 sur	
			PUNTOS SATELITES	
TOTAL MUJERES	8	23,53%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	2,94%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	4	11,76%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	17	50,00%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (Porcentaje con base en Mano de obra no calificada	12	70,59%		

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA	
OTROS	0		Cra 80 A 81 - 16 sur	
			PUNTOS SATELITES	
TOTAL MUJERES	9	50%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	6%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	6%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A			

COMPONENTE SOCIAL

ACTAS DE VECINDAD

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	190X100/404 = 47 %
	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	46x100/404=11⅓
	NUMERO ACTAS CERRADAS	

PQRS

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	16X100/17=94%
	ATENCIONES RECIBIDAS	
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100	0X100/0 =0 %
	ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-034	DESARROLLO DANUBIO	Reunión Informativa de Inicio	30/01/2024	10
		Reunión Extraordinaria	19/03/2024	6

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

PROGRAMACIÓN REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-272	NUEVA ESCOCIA	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	

COMPONENTE SOCIAL
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PUESTA EN SERVICIO

PROGRAMACION REUNIONES DE PUESTA EN SERVICIO GRUPO 1			
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	PUESTA EN SERVICIO	ESTADO
07-015	URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	22/04/2024	ENTREGADO
07-179	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	26/04/2024	ENTREGADO
07-044	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	09/05/2024	ENTREGADO
07-026	DESARROLLO EL RINCON DE BOSA	04/06/2024	ENTREGADO
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	04/06/2024	ENTREGADO
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	18/06/2024	ENTREGADO
07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	26/06/2024	ENTREGADO
07-022	DESARROLLO PALESTINA	28/06/2024	EN EJECUCIÓN
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	02/07/2024	EN EJECUCIÓN
07-104	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	02/07/2024	EN EJECUCIÓN
07-002	DESARROLLO BOSA LINDA	08/07/2024	EN EJECUCIÓN

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

COMITÉS DE VEEDORES

PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL	
MES	**FECHA**
MARZO	21 DE MARZO DE 2024
ABRIL	18 DE ABRIL DE 2024
MAYO	23 DE MAYO DE 2024
JUNIO	20 DE JUNIO DE 2024
JULIO	18 DE JULIO DE 2024
AGOSTO	22 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE SST


Personal activo en la segunda semana de junio	Durante la segunda semana de julio ingresaron 2 trabajadores	Se retiraron del proyecto
46	2	0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO


Registro Fotográfico	Fecha	Actividad
	9/07/2024 Hora: 10:10	Asistencia a capacitación parque Polideportivo.
	10/07/2024 Hora: 4.40 pm	Entrega de EPP trabajadores




10/07/2024 Hora: 4.57 pm — Entrega de EPP trabajadores




11/07/2024 Hora: 11.35 am — Orden y aseo parque villa Sonia




11/07/2024 Hora: 11.23 am — Kit de derrame parque villa Sonia

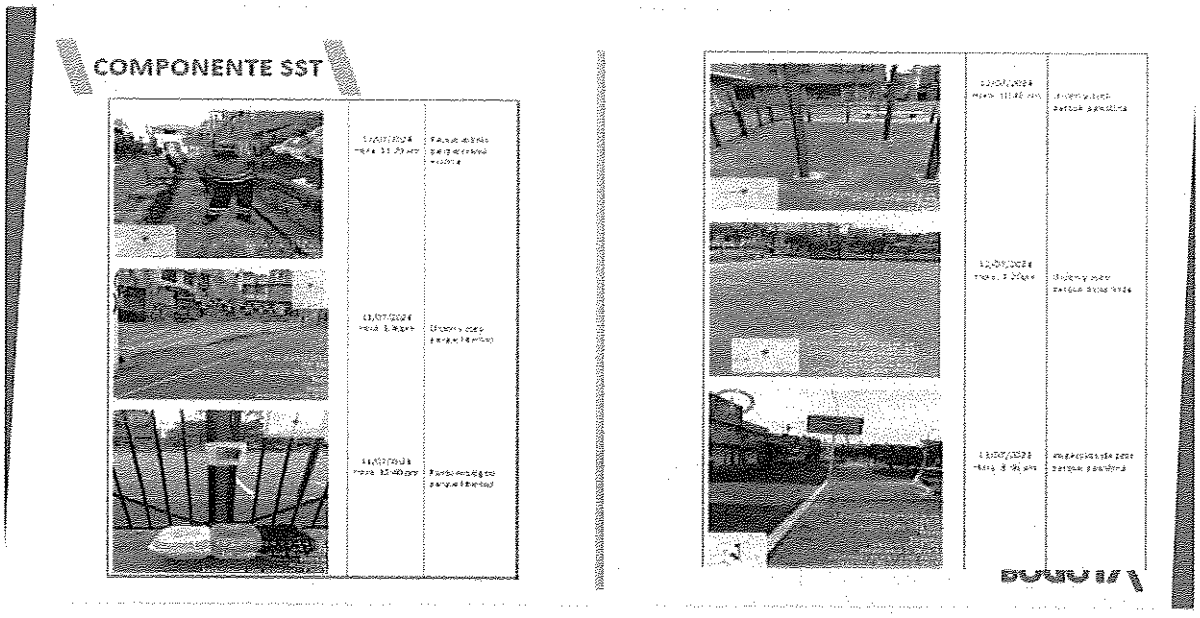
COMPONENTE SST

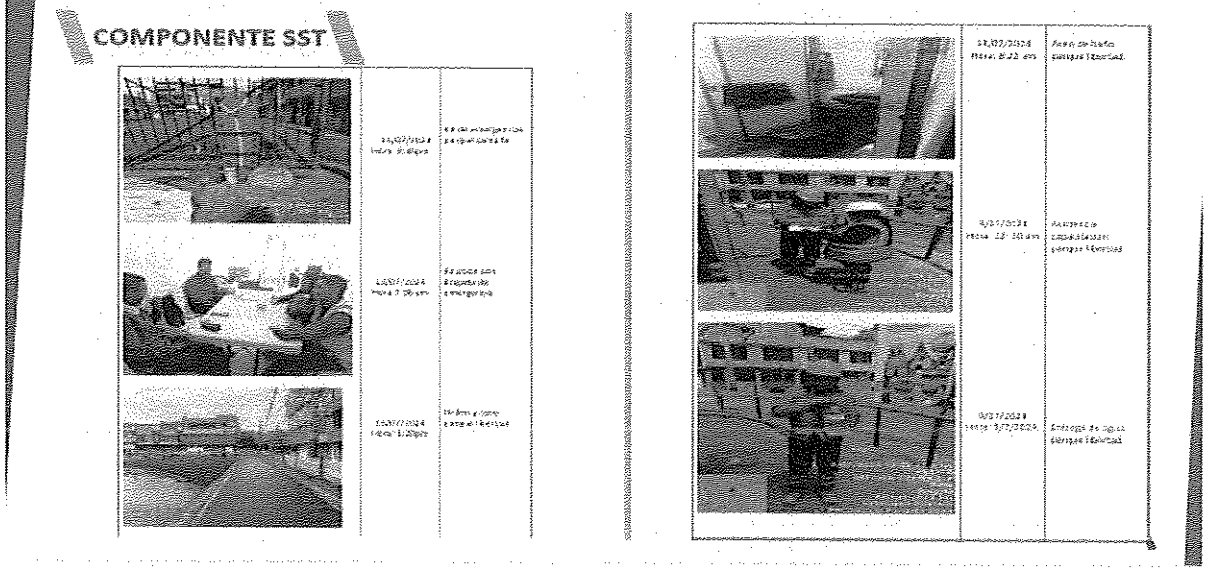
COMPONENTE SST

COMPONENTE SST



COMPONENTE SST

PERSONAL MINIMO DE CONTRATISTA DE OBRA

			PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	Isabel Cristina Llano Mosquera	DIRECTOR DE OBRA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Jeannette Fajardo	RESIDENTE DE OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Isabel Cristina Llano Mosquera	PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	Juan Ricardo Troncoso Rivera	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Maria Natalia Moreno Martinez	ESPECIALISTA EN URBANISMO	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Lisandro Núñez Galeano	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Héctor Muñoz Loaiza	TOPOGRAFO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8	José Reinaldo Torres	CADENERO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	Nubia Viviana Ordoñez	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	Danny Alexander Leiva Manzano	TRANSITO Y TRANPORTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	Laura Lizeth Malagon Zanabria	Auxiliar administrativa	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	John Jairo Llano Mosquera	Conductor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Patricia Nieva Ruiz	RESIDENTE SST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Jennifer Alejandra Llano Moreno	RESIDENTE SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Francisco Andrey Torres	ALMACENISTA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

COMPONENTE SST

PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA

			PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	MONICA JIMENA GUERRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	YENNY KATERINE SAENZ RODRIGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL	PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	VILLAMIL ROBINSON	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SOMEZ EDGAR ALIRIO	ESPECIALISTA EN URBANISMO	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
6	CLAUDIA GOMEZ	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARRANZA JENNIFER	TOPOGRAFO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	CADENERO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
9	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	BARRETO ESQUIVEL IVAN	TRANSITO Y TRANPORTE	0,30	0,30	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
11	BERNAL SANCHEZ JOHAN CAMILO	CONDUCTOR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
12	IVONNE ARLENA GUERRA VERGARA	RESIDENTE SST	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13	VERGARA MARIA DEL CARMEN	RESIDENTE SOCIAL	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	CASTILLO JOSE HUMBERTO	INGENIERO FORESTAL	0,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHAMORRO OSCAR	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	CERON JULIETH ALEJANDRA	ADMINISTRADOR	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	SIMON PARDO GUERRA	LABORISTA INSPECTOR	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10

BALANCE DE OBRA

La interventoría informa que se realizó mesa de trabajo con el contratista de obra durante los días 12,13 y 15 de julio de 2024, con el fin de revisar el balance del contrato que elaboró el Consorcio y donde se incluyen los NP 02.

De dicha revisión el contratista de obra remite a la interventoría el 16 de julio el balance de obra donde indica:

GRUPO 1: 11 PARQUES, con el alcance de las obras ejecutadas a la fecha y ajuste de obras que se encuentran en ejecución.

GRUPO 2: 7 PARQUES, se tuvo en cuanta los parques que están en ejecución, el alcance de cada arque de acuerdo a las condiciones encontradas en las zonas duras existentes, se incluyen los pisos en caucho previstos y los juegos autorizados para instalación.

GRUPO 3 : 5 PARQUES , se tuvo en cuenta los alcances ya previstos , se estiman los pisos de las zonas a intervenir en caucho, mantenimiento juegos y gimnasios existentes, mobiliario, incluido mantenimiento barandas.

Parque Olarte 07-069 por solicitud de la comunidad en reunión de información de inicio manifiestan que no se les instale pisos de caucho en la zona de juegos a intervenir para el presente balance se retiran las actividades de la zona de juegos y en visita del mes de febrero con entidad y con interventoría se estimó que se construyera sendero de conexión dependiendo del presupuesto, esta actividad se excluye del presente balance, quedando el alcance de las obras en este parque: Intervención cancha, cerramiento de 5,0 metros lateral, filtro francés y demás obras estimadas para el mantenimiento de la cancha y mantenimiento de senderos existentes y mobiliario urbano.

GRUPO 4: 4 PARQUES, se tuvo en cuenta los alcances ya previstos, se estiman los pisos de las zonas a intervenir en caucho, mantenimiento juegos y gimnasios existentes, mobiliario, incluido mantenimiento barandas.

Parque Laureles III Sector 07-081: se tuvo en cuenta el alcance ya aprobado para este parque en cuanto a mantenimiento zona de juegos (M-3), mantenimiento de gimnasios, mallas y demarcación cancha y estructuras deportivas y mantenimiento pista de patinaje.

El balance remitido por el contratista de obra indica que el valor a ejecutar es de $ 6.141.214.610,58, dando un valor de $79.309.258,42 a favor de la entidad.

La interventoría informa que, el contratista de obra el 18 de julio remitió uno nuevo balance donde indica que, en recorrido realizado por estos, evidenciaron actividades no incluidas en la mesa de trabajo realizada con la interventoría y que el valor a ejecutar corresponde a $6.246.401.651,92, con un valor de $25.877.782,92 por encima del valor contractual del contrato.

En general, la interventoría informa que en el balance se encuentran incluidos los piso caucho del grupo 3 y 4, se eliminaron los juegos nuevos para parques grupo 3 y grupo 4.

El contratista de obra informa que los especialista en geotécnica y pavimentos del Consorcio Parques 2023 realizaron la revisión de la zonas duras existentes en zonas de juegos de los parques Olarte 07-069, Islandia, Laureles III sector y Brasil 07-041, teniendo en cuenta el sistema constructivo ya utilizado en zonas infantiles que presentaron condiciones semejantes, en los cuales se realizó la instalación del piso de seguridad sobre las zonas duras existente y que evaluaron las condiciones actuales en donde encontraron zonas duras consolidadas y construidas sobre estructuras granulares las cuales no presentan ningún tipo de falla estructural, solo presentan deterioro normal debido al desgaste de la carpeta asfáltica, en ninguna de estas zonas duras se presentan agrietamientos en el asfalto que hayan sido producto de fallas en la estructura de pavimento.

Por lo anterior el Consorcio propone que se conserven las zonas duras de los parques Olarte 07-069, Islandia, Laureles III sector y Brasil 07-041, con el fin de optimizar recursos puesto que se aprovechan estas zonas que ya se encuentran consolidadas.

En este mismo sentido y de acuerdo a la evaluación realizada por el Consorcio propone que para los pisos de los gimnasios en los cuales se instalara mobiliario consistente en juegos biosaludables o gimnasios al aire libre, se conserven también las placas existentes y se realice un mantenimiento consistente en mejorar su acabado mediante pintura sport master como se ha realizado hasta la fecha y el cual se encuentra dentro de las obras aprobadas.

Teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista de obra, la entidad FDLB solicita la entrega del balance de obra.

El contratista de obra informa que el día de 19 de julio en la mañana realiza la entrega del balance formalmente ante la interventoría.

La interventoría entregará a la entidad la revisión del balance de obra el día 20 de julio de 2024, siempre y cuando el contratista de obra entregue el balance el día de 19 de julio de 2024 en horas de la mañana.

PROGRAMACION DE OBRA NP 02

El contratista de obra informa que el día 22 de julio entregará la programación de obra incluidos los NP 02 y el último balance de obra que entregan el 19 de julio.

La interventoría entregará concepto a la programación el día 24 de julio de 2024.

PLAN DE CONTINGENCIA

La interventoría informa que el plan de contingencia presentado por el contratista de obra el 17 de julio, no es aprobado por la interventoría, ya que, para poder cumplir con la entrega de los 28 parques para el 01 de septiembre, el contratista de obra debe trabajar en todos los parques faltantes por ejecución y entrega y tener el personal suficiente para la ejecución de todas las actividades de forma paralela. Advierte que sí el contratista de obra sigue trabajando como lo vienen realizando y aplican el plan de contingencia propuesto, no cumplieran con la entrega de todos los parques en la fecha estipulada contractualmente.

Teniendo en cuenta el plan de contingencia presentado por el contratista de obra mediante comunicado CPB-FDLB 508-833-202, este relaciona actividades atrasadas a la semana anterior y no está actualizado con las actividades que a la fecha están atrasadas, motivo por el cual el plan de contingencia presentado no es aplicable al contrato.

Se acuerda entre las partes, que el contratista de obra presentará el 19 de julio la programación de obra, donde incluya los NP 02 y el último balance de obra y que dicha programación mantendrá la fecha contractual de finalización del contrato, así mismo el contratista de obra se compromete a reforzar todos los frentes de obra pendientes por entregar, con el fin de cumplir con la fecha de finalización del contrato.

El Consorcio parques 2023 se compromete a que el porcentaje de atraso que a la fecha presenta el contrato de obra disminuirá y se nivelará para la entrega el día 01 de septiembre 2024.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

ADICION AL CONTRATO

El Apoyo a la Supervisión del FDLB informa que existe un listado de aproximadamente 24 parques a los cuales se deben realizar mantenimiento, por lo que la entidad realizará una adición al contrato de obra con el fin de realizar el mantenimiento de estos.

Por lo anterior, se solicita realizar la visita a los 24 parques con el fin de definir el alcance de los mismos.

REVISION DE AJUSTE A LOS PRECIOS

La interventoría informa que se programará mesa de trabajo con el fin de revisar el documento remitido por el contratista de obra para el ajuste a los precios del acta No 03.

COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Toma de esclerometría sobre placa parque Concepción.	CONTRATISTA DE OBRA	Antes de la instalación de piso caucho
2	Entrega de parques en el mes de Julio • Urbanización José María Carbonell 104 • Palestina • El Libertador • Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	Mes de julio de 2024
3	Instalación de PMTS	CONSTRATISTA DE OBRA	22 DE JULIO DE 2024
4	PARQUE PALESTINA llega a obra el adoquín que falta para finalizar la actividad.	CONSTRATISTA DE OBRA	19 DE JULIO DE 2024
5	Entrega de balance de obra incluido NP 02	CONSTRATISTA DE OBRA	19 DE JULIO DE 2024 ANTES DE MEDIO DIA
6	Revisión de balance de obra entregado por el contratista de obra	INTERVENTORIA	19 DE JULIO DE 2024
7	Entrega de la programación de obra incluidos los NP 02	CONTRATISTA DE OBRA	22 DE JULIO DE 2024
8	Entrega de concepto a la programación NP 02	INTERVENTORIA	24 DE JULIO DE 2024
9	Programación mesa de trabajo revisión de ajuste a los precios del acta No 03	INTERVENTORIA	

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 24/07/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 24/07/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 45

HORA DE INICIO: 09:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 10: 30a m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobier

bb1

DESARROLLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.45. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así:

ESCLEROMETRIA

El apoyo a la supervisión FDLB informa que el ensayo de esclerometría es un ensayo superficial y que el mismo no sirve para la verificación de la resistencia del concreto.

La interventoría aclara que quien solicitó la toma de esclerómetro fue el FDLB en el comité inmediatamente anterior.

IMPLEMENTACION DE PMT

El contratista de obra informa que implementara el PMT de Laureles el día viernes 26 de julio de 2024 y el PMT de La Florida el lunes 29 de julio de 2024.

PROGRAMACION NP 02

La interventora informas que el contratista de obra el día 23-07-2024 mediante comunicado CPB-FDLB 508-840-2024 remitió programación de obra donde incluye los NP 02, dicha programación se encuentra en revisión de la interventoría.

La interventoría informa que remitirá concepto de la programación presentada por el contratista de obra para el día 25 de julio de 2024.

El Apoyo a la supervisión FDLB informa que en la programación de obra que el contratista de obra presente y donde se incluyan los NP 02, debe mantener la línea base de la programación que se encuentra aprobada y sobre la cual se está realizando la evaluación actual.

AJUSTE A LOS PRECIOS DEL ACTA No 03

La interventoría informa que se programa reunión virtual para el jueves 25 de julio a las 11:00 am entre contratista de obra e interventora para la revisión de los soportes remitidos por el contratista de obra del acta No 03.


SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

La interventoría informa que el contrato de obra presenta atraso del -13.5%, aumentando el porcentaje de atraso con respecto a la semana anterior, la interventoría reitera en el presente comité, que mediante comunicado SPLI-BOS-23-0739 remitió informe detallado de posible incumplimiento por atraso en las obras en el contrato de obra SECOP II 508-2023 CTO-OBRA (89487).

El apoyo a la supervisión FDLB informa que dio traslado a las áreas respectivas del FDLB y se encuentran a disposición de las instrucciones que éstas emitan.

El Apoyo a la Supervisión FDLB reitera que, en el comité de seguimiento anterior, el contratista de obra adquirió el compromiso de disminuir el atraso que presenta el contrato, lo cual no fue cumplido, así mismo informa que no ve que el contratista de obra tome acciones para disminuir el atraso.

AVANCE FINANCIERO

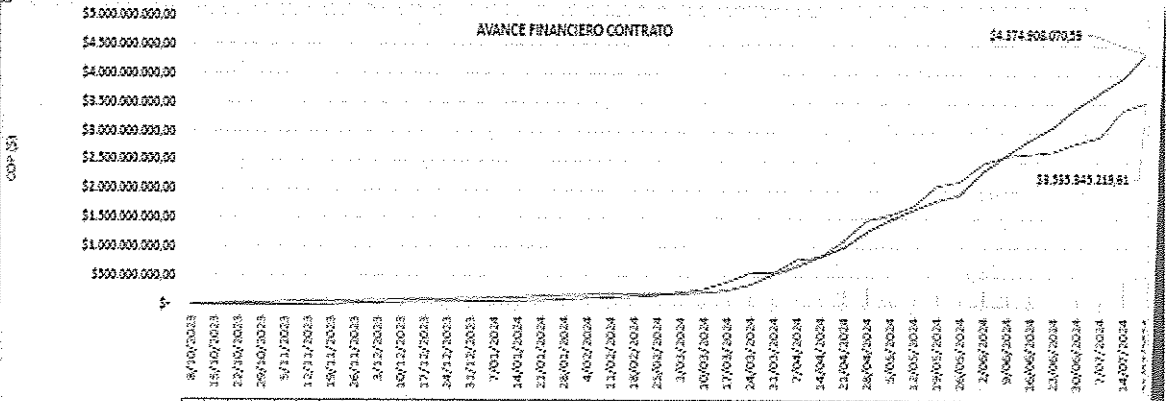

	8/1 0/2 023	15/ 10/ 202 3	22/ 10/ 202 3	29/ 10/ 202 3	5/1 1/2 023	12/ 11/ 202 3	19/ 11/ 202 3	26/ 11/ 202 3	3/1 2/2 023	10/ 12/ 202 3	17/ 12/ 202 3	24/ 12/ 202 3	31/ 12/ 202 3	7/0 1/2 024	14/ 01/ 202 4	21/ 01/ 202 4	28/ 01/ 202 4	4/0 2/2 024	11/ 02/ 202 4	18/ 02/ 202 4	25/ 02/ 202 4	3/0 3/2 024	10/ 03/ 202 4	17/ 03/ 202 4	24/ 03/ 202 4	31/ 03/ 202 4	7/0 4/2 024	14/ 04/ 202 4	21/ 04/ 202 4	28/ 04/ 202 4	5/0 5/2 024	12/ 05/ 202 4	19/ 05/ 202 4	26/ 05/ 202 4	2/0 6/2 024	9/0 6/2 024	16/ 06/ 202 4	23/ 06/ 202 4	30/ 06/ 202 4	7/0 7/2 024	14/ 07/ 202 4	21/ 07/ 202 4
$ PROYECTADO	$10	$10	$10	$10	$12	$15	$9.	$1.	$7.	$8.	$8.	$8.	$8.	$7.	$7.	$32	$17	$3.	$2.	$3.	$2.	$10	$18	$40	$96	$17	$14	$15	$16	$26	$21	$17	$15	$10	$39	$18	$26	$22	$31	$26	$15	$42
$ EJECUTADO	$1.	$1.	$1.	$1.	$66	$3.	$5.	$20	$6.	$8.	$7.	$4.	$7.	$4.	$8.	$7.	$17	$32	$11	$23	$15	$55	$55	$12	$15	$7.	$21	$48	$27	$36	$86	$15	$34	$78	$31	$13	$34	$39	$14	$10	$46	$13
$ PROYECTADO ACUMULADO	$10	$21	$32	$43	$55	$71	$80	$81	$89	$97	$10	$11	$12	$13	$13	$17	$18	$19	$19	$19	$20	$21	$23	$27	$36	$54	$69	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.	$3.	$3.	$4.
$ EJECUTADO ACUMULADO	$1.	$2.	$3.	$4.	$9.	$9.	$14	$33	$41	$50	$57	$61	$69	$73	$81	$89	$10	$12	$14	$16	$18	$23	$29	$41	$57	$57	$79	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.

Corte 21-07-2024	$ PROYECTADO SEMANA	$ EJECUTADO SEMANA	$ PROYECTADO ACUMULADO	$ EJECUTADO ACUMULADO	% PROYECTADO SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% PROYECTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	%ADELANTO O ATRASO FINANCIERO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 421.249.334,46	$ 139.642.244,49	$ 4.374.908.070,59	$ 3.333.345.219,61	9,77%	3,24%	70,33%	56,55%	-13,8%	$ 1.022.545.346,26	32,68%


NOTA: El 32,68% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 7. El corte 8 se encuentra en formulación.

AVANCE FISICO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO (EJECUTADO FISICO)

71%

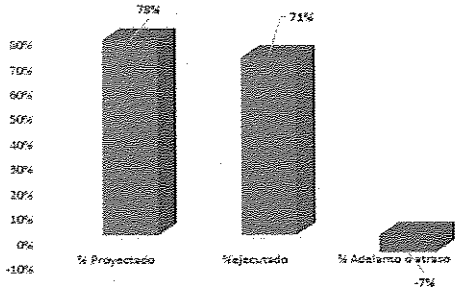

	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTO
CONTRATO 568-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	78%	71%	-7%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	100%	0%
GRUPO 1	94%	92%	-2%
GRUPO 2	58%	37%	-21%
GRUPO 3	36%	14%	-22%
GRUPO 4	24%	13%	-11%
ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4: CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION	0%	0%	0%

CUADRO DE CONTROL DE PROGRAMACION A CORTE 21-07-2024 POR PARQUE

AVANCE FISICO

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% Ejec. Real	% Ejec. Prog.	Variación Comienzo (días)
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	vie 3/11/23	vie 3/05/24	131 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	lue 2/11/23	lue 20/06/24	166 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	lue 29/02/24	lue 8/08/24	116 días	99%	99,00%	0,00%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	mar 30/01/24	vie 16/08/24	144 días	81%	93,00%	-12,00%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	lun 22/01/24	mar 25/06/24	112 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	lun 11/03/24	lue 15/08/24	114 días	65%	90,00%	-25,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	lue 2/11/23	vie 17/05/24	142 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	lue 2/05/24	mié 21/08/24	80 días	73%	50,00%	23,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	lue 2/11/23	lue 4/07/24	176 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-178 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	vie 2/02/24	mié 19/06/24	99 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	vie 2/02/24	mié 10/07/24	114 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	lun 6/05/24	mar 13/08/24	72 días	99%	75,00%	24,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	37%	46,00%	-9,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	44%	81,00%	-37,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	55 días	39%	73,00%	-34,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	lue 22/08/24	57 días	43%	52,00%	-9,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	60 días	26%	43,00%	-17,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	lun 22/07/24	vie 30/08/24	30 días	17%	0,00%	17,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	53 días	16%	34,00%	-18,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	9%	33,00%	-24,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	lue 20/05/24	vie 30/08/24	62 días	6%	39,00%	-33,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	lue 20/05/24	lun 26/08/24	48 días	7%	23,00%	-16,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	55 días	30%	56,00%	-26,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	lue 20/05/24	vie 30/08/24	62 días	12%	27,00%	-15,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	lue 20/05/24	vie 30/08/24	62 días	15%	23,00%	-8,00%
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	20%	24,00%	-4,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	8%	27,00%	-19,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	lue 1/08/24	mié 28/08/24	20 días	7%	0,00%	7,00%

AVANCE FISICO

Estado general de los diferentes frentes

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCION PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	PUESTO EN SERVICIO	vie 3/11/23	vie 3/05/24	100,00%	100,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCION	vie 3/11/23	vie 3/05/24	99,00%	100,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	PUESTO EN SERVICIO	lue 2/11/23	lue 20/08/24	99,00%	99,00%
07-002 BOSALINDA	SIN PMT	lue 29/02/24	lue 5/08/24	81,00%	93,00%
07-007 URBANIZACION EL REGALO	PUESTO EN SERVICIO	mar 30/01/24	vie 16/08/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCION	lun 22/01/24	mar 25/06/24	65,00%	90,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	lun 11/03/24	lue 15/08/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	EN EJECUCION	lue 2/11/23	vie 17/05/24	73,00%	80,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	EN EJECUCION	lue 2/05/24	mié 21/08/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	lue 2/11/23	lue 4/07/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 19/06/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 10/07/24	99,00%	75,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	EN EJECUCION	lun 6/05/24	mar 13/08/24	37,00%	45,00%
PARQUE 07-345 DESARROLLO VILLA SOFIA	EN EJECUCION	lun 20/05/24	mar 20/08/24	44,00%	61,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	EN EJECUCION	lun 20/05/24	mar 20/08/24	39,00%	73,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	EN EJECUCION	lun 27/05/24	vie 9/08/24	43,00%	52,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	EN EJECUCION	mié 5/06/24	lue 22/08/24	26,00%	45,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	mié 5/06/24	mar 27/08/24	17,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	lun 22/07/24	vie 30/08/24	16,00%	34,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	mié 5/06/24	vie 30/08/24	9,00%	33,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	mié 5/06/24	vie 30/08/24	6,00%	39,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	lue 20/05/24	vie 30/08/24	7,00%	23,00%
PARQUE 07-319 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	lue 20/05/24	lun 26/08/24	30,00%	55,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	mié 5/06/24	mar 20/08/24	12,00%	27,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	SIN INICIAR	lue 20/05/24	vie 30/08/24	15,00%	23,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	lue 20/05/24	vie 30/08/24	20,00%	24,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	3,00%	7,00%
PARQUE 07-265 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	7,00%	10,00%

En resumen a corte 21 de julio de 2024 se tiene:
07 parques PUESTO EN SERVICIO
09 parques EN EJECUCION
11 parque SIN INICIAR
01 parque con PMT vencidido motivo por el cual las actividades se encuntran suspendidas, hasta tanto se obtenga la aprobacion de la SDM.

El contratista de obra informa que en la presente semana se dio inicio a los parques:
Olarte 07-069: se dio inicio a las actividades el lunes 22 de julio de 2024.
Desarriollo el Cauce: se encuentra con PMT instalado. Al 23 de julio de 2024 no han dado inicio a las actividades de obra.
Villa Colombia: se dará inicio a las acividades en el parque, una vez se tenga aprobado el PMT.

PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA

La interventoria informa que el PMT del parque Bosalinda a la fecha se encuentra sin aprobacion de ampliacion de PMT.


El PMT se encuentra vencido desde el 12 de julio, por lo que han trnscurrdio 13 días sin que dicho parque cuente con PMT vigente.

La interventoria informa que sí para el jueves 25 de julio el parque no cuenta con ampliacion de PMT aprobada por la SDM, las actividades que ejecuten en el periodo de tiempo en el cual el PMT se encuentre vencido no serán recoonocidas por la intervenrtoria para el respectivo pago.

201

AVANCE FISICO

Análisis avance físico en el tiempo

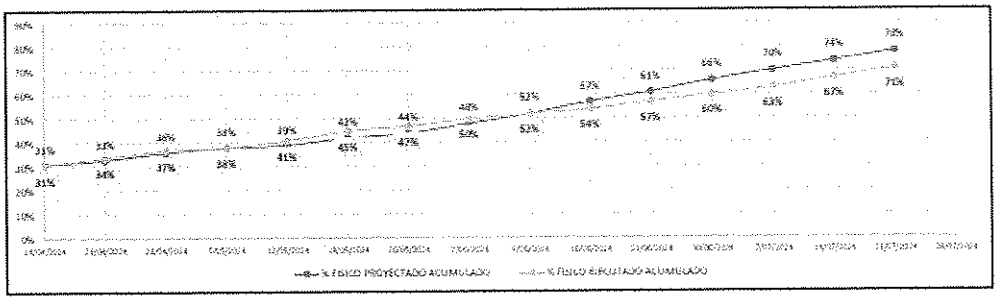

NOTA: A partir del grafico se tiene una ecuación de tendencia del porcentaje físico ejecutado aproximado equivalente a:

$$\%fisico\ ejecutado = 0{,}0274 * semana + 0{,}3063; \qquad R^2 = 0{,}9946$$

Donde, "semana" ∈ {14-04-2024 =0 ; 01-09-2024 =20}. Por lo tanto, se tiene que de continuar en la línea de tendencia actual para la fecha de terminación del contrato se tendría un porcentaje físico ejecutado aproximado de 85,44%

$$\%fisico\ ejecutado(1/09/2024) = 0{,}0274 * (20) + 0{,}3063 = \mathbf{85.44\%}$$

Lo anterior, permite inferir que de no tomarse medidas para la fecha de terminación del contrato se corre el riesgo de presentar un presunto incumplimiento del plazo contractual del contrato.

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	%atraso o adelanto
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	**jue 2/11/23**	**jue 20/06/24**	**99%**	**100%**	**-1%**
AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	vie 5/04/24	jue 20/05/24	94%	100%	-6%
Modulo linete - Gimnasio al aire libre(Suministro+Inst)	sáb 1/06/24	vie 14/06/24	50%	100%	-50%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	**mar 30/01/24**	**mar 13/08/24**	**81%**	**93%**	**-12%**
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	mar 23/04/24	mar 30/04/24	50%	100%	-50%
Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	mar 23/04/24	lun 29/04/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 24/05/24	jue 30/05/24	25%	100%	-75%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 31/05/24	vie 31/05/24	33%	100%	-67%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 31/05/24	mié 5/06/24	33%	100%	-67%
Pintura Modulo M-5 Columpio	vie 24/05/24	jue 30/05/24	30%	100%	-70%
Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	vie 31/05/24	jue 6/06/24	0%	100%	-100%
Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquin incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	lun 6/05/24	vie 14/06/24	80%	100%	-20%
MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	lun 24/06/24	vie 19/07/24	60%	100%	-40%
BANCA M - 31 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	91%	100%	-9%
BANCA M-40 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Recubrimiento skate master	jue 30/05/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8" (DESM+SUM+INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 29/03/24	vie 26/04/24	95%	100%	-5%
CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	mié 19/06/24	vie 9/08/24	45%	61%	-16%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	lun 12/08/24	65%	90%	-25%
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mar 28/05/24	lun 24/06/24	30%	100%	-70%
Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	30%	100%	-70%
Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	30%	100%	-70%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 21/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	30%	100%	-70%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	lun 24/06/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	mié 3/07/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sum+Inst)	mié 3/07/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	mié 3/07/24	mar 23/07/24	0%	87%	-87%
Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	vie 17/05/24	mar 21/05/24	60%	100%	-40%
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Estruc metalica cerram esfabonada cal12 h=2.5m**	vie 21/06/24	jue 18/07/24	70%	100%	-30%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	lun 19/08/24	37%	45%	-8%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 30/05/24	lun 3/06/24	60%	100%	-40%
Desmonte y reinstala AdoquinArcil p=5% sueloMedio	mié 26/06/24	mar 2/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	mar 16/07/24	mié 17/07/24	15%	100%	-85%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	mar 16/07/24	mar 23/07/24	0%	67%	-67%
Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	mar 9/07/24	jue 11/07/24	10%	100%	-90%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 20/05/24	mar 20/08/24	44%	81%	-37%
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	mar 2/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 5/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	mié 17/07/24	mar 30/07/24	0%	30%	-30%
Recubrimiento skate master	mié 26/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	lun 10/06/24	vie 28/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 21/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	39%	73%	-34%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	vie 14/06/24	lun 17/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcil p=5% sueloMedio	mar 18/06/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	15%	100%	-85%
Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 9/07/24	15%	100%	-85%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	jue 20/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 28/06/24	lun 1/07/24	15%	100%	-85%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	mar 2/07/24	mié 3/07/24	66%	100%	-34%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	jue 4/07/24	vie 5/07/24	45%	100%	-55%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	lun 8/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	jue 11/07/24	lun 15/07/24	20%	100%	-80%
Estruc metalica cerram esfabonada cal12 h=2.5m**	mié 10/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	43%	52%	-9%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mié 26/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	lun 15/07/24	mar 16/07/24	20%	100%	-80%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES,	mié 26/06/24	jue 4/07/24	33%	100%	-67%
DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	26%	43%	-17%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasleg(<50m	lun 8/07/24	mar 9/07/24	25%	100%	-75%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mié 10/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	lun 15/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	vie 19/07/24	jue 1/08/24	0%	10%	-10%
Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	mié 10/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%
Recubrimiento skate master	vie 19/07/24	lun 29/07/24	0%	14%	-14%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	lun 15/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	16%	34%	-18%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 18/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-5TPM**	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Sudbas IDRD	mar 16/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES,	lun 24/06/24	vie 5/07/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	jue 29/08/24	9%	33%	-24%
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	lun 17/06/24	mar 18/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mié 19/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal (IDG-5)	mar 25/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	vie 28/06/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 9/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo	jue 18/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	20%	-20%
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	20%	-20%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	jue 18/07/24	lun 22/07/24	0%	67%	-67%
AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	20%	-20%
CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-8 medio+Geotextil	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	20%	-20%
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	vie 28/06/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Atraso o Adelanto
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 20/06/24	vie 30/08/24	6%	39%	-33%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 26/06/24	vie 28/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	lun 1/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	vie 5/07/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=8cm	mié 10/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
PINTURA MODULO M-3A	lun 15/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 18/07/24	mar 23/07/24	0%	50%	-50%
Recubrimiento skate master	lun 15/07/24	lun 22/07/24	0%	83%	-83%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	jue 20/06/24	vie 23/08/24	7%	23%	-16%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 2/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquínArcill p=5% sueloMedio	mar 9/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	jue 18/07/24	mié 24/07/24	0%	40%	-40%
Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	20%	-20%
Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	jue 18/07/24	lun 22/07/24	0%	67%	-67%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	30%	56%	-25%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 12/06/24	jue 13/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 25/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mar 16/07/24	lun 5/08/24	0%	27%	-27%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mar 16/07/24	lun 22/07/24	0%	80%	-80%
Pintura estructura baloncesto	mar 16/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 19/07/24	mar 23/07/24	0%	33%	-33%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Recubrimiento skate master	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 20/06/24	vie 30/08/24	12%	27%	-15%
INSTALACIÓN DE PMT	jun 24/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 27/06/24	vie 5/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslago+Retiro)	lun 8/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal (IDG-5)	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal SC-60 2 caras - + Dado-STPM**	vie 12/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	lun 15/07/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	mié 17/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-091 LAURELES	jue 20/06/24	vie 30/08/24	15%	23%	-8%
INSTALACIÓN DE PMT	jue 20/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 25/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro	jue 27/06/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	jue 4/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	vie 5/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% ejecutado	% proyectado	Predecesoras
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	20%	24%	-4%
INSTALACIÓN DE PMT	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% avance o atraso
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24	8%	27%	-19%
INSTALACIÓN DE PMT	vie 5/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 11/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%

Teniendo en cuanta el atraso que se presenta ala fecha, el contratista de obra informa:

PARQUE PALESTINA
La actividad de adoquín y juego jinete se finaliza el día viernes 26 de julio de 2024.

El contratista de obra informa que se finalizarán actividades en dicho parque el día viernes 26 de julio de 2024.

El Apoyo a la Supervisión FDLB solicita se finalicen las actividades en el parque Palestina, ya que en el debate de la alcaldía solicitaron la pronta entrega del parque, debido al tiempo de ejecución que éste lleva, siendo el segundo parque en haberse dado iniciado su intervención.

PARQUE BOSALINDA
El contratista de obra informa que la actividad de imprimación asfáltica en cancha de microfútbol no se ejecuta, ya que no se ve la necesidad de realizarla según el estado actual de la cancha.

Así mismo, el contratista de obra informa que la cancha de microfútbol, fue revisada por el personal contratado para adelantar la actividad de nivelación, quienes recomienda nivelar la cancha con alistado en las zonas donde se presenta empozamientos.

El Apoyo a la Supervisión FDLB y la interventoría, en respuesta a la solicitud del contratista de obra para la cancha de microfútbol de instalar alistado en zonas donde se presenta empozamiento y dando respuesta al comunicado CPB-FDLB 508-837-2024, se autoriza la instalación de alistado en las zonas donde se presenta empozamiento en la cancha de microfútbol.

Por otra parte, el contratista de obra informa que las actividades de pintura quedan ejecutadas antes del 30 de julio.

Se acuerda entre Apoyo a la Supervisión FDLB, contratista de obra e interventoría que las actividades de demarcación cancha de baloncesto, se ejecutará antes del 30 de agosto, ya que va a esperar si la adición es aprobada por la entidad y de esta forma adelantar otras actividades que requiere la cancha de baloncesto antes de la demarcación.

Mantenimiento del espacio público, quedará ejecutado antes del 30 de julio.

El contratista de obra informa que el día sábado 27 de julio se realizará comité veedor y se dará respuesta al derecho de petición interpuesto por Liliana Andrea Escobar, posterior se emitirá repuesta oficial al derecho de petición.

PARQUE CONCEPCION
El contratista de obra informa que esta adelantando instalación de piso caucho.

El contratista de obra informa que se realizó la instalación del juego nuevo diferente a como se indicaba en la implantación aprobada por la interventoría.

El contratista de obra informa que las cantidades de piso caucho contempladas en la implantación de juego inicial corresponden a las mismas cantidades con el juego como se encuentra instalado actualmente.

La interventoría informa que, en la nueva ubicación del juego se evidencia que los rodaderos del juego existente con el juego nuevo, están enfrentados lo cual pude impedir el uso adecuado de los rodaderos.

La interventoría informa su preocupación respecto a la forma como el contratista de obra completará el espesor del piso caucho debido al cambio en la instalación del juego nuevo.

El contratista de obra informa que existe una póliza de calidad y estabilidad del contrato, en caso de ocurrir alguna posventa.

La interventoría solicita que el contratista de obra presente un proceso constructivo para completar el espesor y cumplir con las especificaciones de espesores en caucho, así mismo deja claro que la responsabilidad en calidad y estabilidad de la obra es única y exclusiva del contratista de obra.

Se realiza visita al sitio de la obra con el fin de revisar la implantación del juego y se acuerda entre el Apoyo a la Supervisión FDLB, contratista de obra e interventoría que el juego nuevo debe quedar conforme se encontraba aprobado por la interventoría, verificando por parte del contratista de obra las distancia entre los juegos y las barandas perimetrales y la ubicación de los roderos tanto del juego existente como del juego nuevo.

CERRAMIENTO

Se acuerda entre las partes que los cerramientos pendientes por implementar se realizarán en polimalla

INFORME MENSUAL MES DE JUNIO

La interventoría informa que a la fecha se encuentran pre aprobados los informes correspondientes al mes de junio del componente social y ambiental, así mismo se informa que el informe del mensual de junio del componente técnico, sst, seguimiento al plan de gerencia e informe de obligaciones presenta observaciones que el contratista de obra se encuentra subsanando.

La entidad reitera que los informes mensuales deben ser entregados los 05 primeros días del mes siguiente, de igual forma las cuentas deben ser radicadas durante los 10 días siguientes a finalizar el mes, con el fin de dar cumplimiento al PAC.

La entidad solicita que la entrega de los informes mensuales impresos se realice a doble cara.

PARQUE EL REGALO

La interventoría informa que, para el pago de la actividad de asfalto en la cancha del parque del regalo, se requiere que el contratista de obra emita respuesta a los dos comunicados con observaciones a los ensayos presentados por el contratista de obra.

El contratista de obra informa que el día de hoy 24 de julio remitirá la respuesta a las observaciones remitidas por la interventoría a los resultados de los ensayos realizados al material instalado en la cancha.

PMT

COMPONENTE PMT

APROBADOS

COD PARQUE	NOMBRE PARQUE	FECHA		COI APROBACIÓN
		INICIO	FIN	
07-015	PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	29/03/2024	27/06/2024	12 DEL 21/03/2024
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	19/01/2024	11/07/2024	03 del 18/01/2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07-026	PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	19/01/2024	11/07/2024	03 del 18/01/2024
07-007	PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	19/01/2024	11/07/2024	03 del 18/01/2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07-092	DANUBIO AZUL	28/06/2024	29/08/2024	26 DEL 27-06-2024
07-022	DESARROLLO PALESTINA	28/06/2024	29/08/2024	26 DEL 27-06-2024
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	05/04/2024	29/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	05/04/2024	29/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	05/04/2024	29/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	05/04/2024	29/08/2024	14 DEL 04/04/2024
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	10/05/2024	5/09/2024	19 DEL 09-05-2024
07-333	DESARROLLO SANTAFE	10/05/2024	5/09/2024	19 DEL 09-05-2024

COMPONENTE PMT

COD PARQUE	NOMBRE PARQUE	FECHA		COI APROBACIÓN
		INICIO	FIN	
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	17/05/2024	5/09/2024	20 DEL 16-05-2024
07-272	DESARROLLO NUEVA ESCOCIA	24/05/2024	12/09/2024	21 DEL 23-05-2024
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	21/06/2024	26/09/2024	25 DEL 20-06-2024
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	14/06/2024	10/10/2024	24 DEL 13-06-2024
07-081	[illegible]	19-07-2024	21-11-2024	29 DEL 18-07-2024
07-110	[illegible]	28-06-2024	26/12/2024	26 DEL 27-06-2024
07-037	URBANIZACION VILLA DEL RIO LOTE 2A	28-06-2024	26/12/2024	26 DEL 27-06-2024
07-069	DESARROLLO OLARTE	05-07-2024	26-12-2024	27 DEL 04-07-2024
07-215	DESARROLLO OLARTE	05-07-2024	26-12-2024	27 DEL 04-07-2024
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	12-07-2024	26-12-2024	28 DEL 11-07-2024

PMTs PENDIENTES DE APROBACIÓN POR PARTE DE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	FECHA DE INICIO INSTALACIÓN PMT SEGÚN PROGRAMACION
07-316	DESARROLLO ISLANDIA	3	26-06-2024
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4	26-06-2024
07-265	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4	02-08-2024
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4	24-08-2024

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

- Se da APROBACIÓN a informe mensual ambiental N 9 V 3 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0752 el 18 de julio de 2024
- **Con el fin de atender a las obligaciones contractuales en relación al cerramiento de los frentes de trabajo activos, la interventoría recomienda el cambio de polisombra por polimalla azul, la cual permite visualizar desde el exterior el interior del frente de trabajo, reduciendo el tema de vandalismo y contribuyendo al cumplimiento contractual. Esta medida correctiva se esta empezando a implementar en los proyectos de obra civil de la ciudad de Bogotá.**
- Se reciben los reportes de actividades ambientales, evidenciando la gestión ambiental en cada uno de los frentes de trabajo, sin embargo, se recomienda seguir con el seguimiento ambiental en cada uno de los frentes de obra
- Para el mes de julio 2024 se debe realizar por parte de interventoría el cargue de información del segundo trimestre del año 2024 a la SDA, Se realiza reprogramación a mesa de trabajo con el ingeniero Manuel de la supervisión el día 24 de julio de 2024 Para atender dicha actividad.
- Se reitera la observación de mantenimiento al cerramiento perimetral de los frentes de trabajo que así lo requieran.
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros
- Continuar con el seguimiento al RCD y material granular que debe tener su respectivo acopio, señalización y protección con polietileno negro.

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL – REGISTRO FOTOGRAFICO



Orden y Aseo – punto ecológico reportado por contratista en frente de trabajo La libertad




Programa de señalización y punto ecológico reportado por contratista en frente de trabajo el Danubio

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL – REGISTRO FOTOGRAFICO



Mantenimiento de cerramiento y malla de protección de sumideros frentes de trabajo villa Sonia



Punto ecológico y mantenimiento de cerramiento a individuos arbóreos frentes de trabajo nueva escocia



Punto ecológico y malla de protección de sumidero frente de trabajo santa fe

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 15 de JULIO 2024 21 de JULIO 2024			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	CAMPAMENTOS	6	
2	PUNTOS ECOLOGICOS REPORTADOS POR CONTRATISTA	12	
3	BAÑOS	6	• Desarrollo Palestina 87-022 Calle 69 sur # 81A-47 Barrio Palestina • Desarrollo Bavaria 87-001 • Urbanizacion José María Carbonell I Y II Etapas 87-104 (se ubica por vía Usaquén calle 183 con 7ª 600 – 45) • Urbanizacion El Virrey 87-067 Carrera 93 B No. 81 – 07 Sur • Desarrollo Distrito Azul I Y II 87-044 Calle 70 Sur • Desarrollo Villa Sonia 1 y Desarrollo Santa Fe 87-133 87-134 Calle 69 sur # 87-45

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 15 de JULIO 2024 21 de JULIO 2024				
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	OBSERVACION
4	ACOPIOS		-	Contratista manifiesta que se reportaran puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinámica de las obras
5	SUMIDEROS PROTEGIDOS		29	Frente de obra / N° sumideros 07-01 DESARROLLO PALESTINA: 4 07-02 DESARROLLO BOSA LIBERTAD: 3 07-03 DESARROLLO EL PERDIDO: 4 07-04 DESARROLLO CAPRICHITO: 2 07-05 RINCON DE BOSA: 6 07-06 CONCEPCION: 2 07-04 DESARROLLO SANTA FE: 2 Se recomienda durante la semana del 01 de julio al 07 de julio de 2024 realizar mantenimiento a la malla de protección de los sumideros identificados.
6	INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS		93	Parque / N° individuos arbóreos georreferenciados [redacted] Contratista manifiesta que serán protegidos los individuos arbóreos conforme a la dinámica de la obra.
7	RCD	IN SITU (m3)	-	Se reportara en la entrega del informe mensual ambiental #10
		APROVECHAMIENTO (m3)	-	
		DISPOSICION FINAL (m3)	-	
	RESIDUOS METALICOS (Chatarra)		-	Se reportara en la entrega del informe mensual ambiental #10

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	50	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	8	23,53%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	2,94%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	4	11,76%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	17	50,00%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (Porcentaje con base en Mano de obra no calificada:	12	70,59%

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION PUNTO CREA: Cra 80 k 61 - 15 sur
PUNTOS SATELITES:

8. GESTION SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	9	50%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN PUNTO CREA: Cra 80 k 61 - 15 sur
PUNTOS SATELITES:

COMPONENTE SOCIAL

ACTAS DE VECINDAD

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	190X100/404 = 47 %
	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	90x100/404=22%
	NUMERO ACTAS CERRADAS	

PQRS

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	16X100/18=88%
	ATENCIONES RECIBIDAS	
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100	0X100/0 =0 %
	ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-094	DESARROLLO DANUBIO	Reunión Informativa de Inicio	30/01/2024	10
		Reunión Extraordinaria	19/03/2024	6

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

PROGRAMACIÓN REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-272	NUEVA ESCOCIA	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PUESTA EN SERVICIO

PROGRAMACION REUNIONES DE PUESTA EN SERVICIO GRUPO 1		
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	PUESTA EN SERVICIO
07-015	URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	22/04/2024
07-179	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	26/04/2024
07-044	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	9/05/2024
07-026	DESARROLLO EL RINCON DE BOSA	4/06/2024
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	4/06/2024
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	18/06/2024
07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	28/06/2024
07-022	DESARROLLO PALESTINA	30/07/2024
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/07/2024
07-104	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	30/07/2024
07-002	DESARROLLO BOSA LINDA	30/07/2024

PROGRAMACION REUNIONES DE PUESTA EN SERVICIO GRUPO 2		
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	PUESTA EN SERVICIO
07-094	DESARROLLO DANUBIO	15/08/2024
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	27/08/2024
07-333	DESARROLLO SANTA FE	30/08/2024
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	22/08/2024
07-272	NUEVA ESCOCIA	28/08/2024
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	30/08/2024
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	30/08/2024

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

COMITÉS DE VEEDORES

PROGRAMACION COMITE VEEDOR MENSUAL	
MES	FECHA
MARZO	21 DE MARZO DE 2024
ABRIL	18 DE ABRIL DE 2024
MAYO	23 DE MAYO DE 2024
JUNIO	20 DE JUNIO DE 2024
JULIO	18 DE JULIO DE 2024
AGOSTO	22 DE AGOSTO DE 2024

BOGOTÁ




COMPONENTE SST

Personal activo mes mayo	Ingresos	Retiros
44	4	0


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO


Registro Fotográfico	Fecha	Actividad
	15/07/2024 Hora: 11:41 am	Entrega de agua parque parque nueva esperanza
	15/07/2024 Hora: 11:13 am	Entrega de agua parque santa fe
	16/07/2024 Hora: 11:18 am	Entrega de agua en parque bosa lindo
	17/07/2024 Hora: 2:54 pm	Entrega de agua parque libertad
	17/07/2024 Hora: 08:14 am	4 x 4 de emergencias parque libertad


COMPONENTE SST

	16/07/2024 Hora: 10:25 am	Entrega de agua parque Brasil
	16/07/2024 Hora: 1:48 pm	Pausas activas parque Bosa lindo
	16/07/2024 Hora: 4:58 pm	Pausas activas parque el libertador
	19/07/2024 Hora: 11:12 am	Pausas activas parque la nueva esperanza
	19/07/2024 Hora: 4:28 pm	Pausas activas parque bosa lindo
	19/07/2024 Hora: 08:16 am	4 x 4 de emergencias parque el libertador

COMPONENTE SST









BOGOTÁ

COMPONENTE SST

PERSONAL MINIMO DE CONTRATISTA DE OBRA

			PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	Isabel Cristina Llano Mosquera	DIRECTOR DE OBRA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	Jeannette Fajardo	RESIDENTE DE OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Isabel Cristina Llano Mosquera	PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	Juan Ricardo Troncoso Rivera	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	María Natalia Moreno Martínez	ESPECIALISTA EN URBANISMO	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Lizandro Núñez Galeano	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Héctor Muñoz Loaiza	TOPOGRAFO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8	José Reinaldo Torres	CADENERO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	Nubia Viviana Ordoñez	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	Danny Alexander Leiva Manzano	TRANSITO Y TRANPORTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	Laura Liseth Malagón Sanabria	Auxiliar administrativa	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	John Jairo Llano Mosquera	Conductor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Patricia Navia Ruiz	RESIDENTE SST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Jennifer Alejandra Llano Moreno	RESIDENTE SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Francisco Andrey Torres	ALMACENISTA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

BOGOTÁ

COMPONENTE SST

PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA

			PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	MONICA JIMENA GUERRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	YENNY KATERINE SAENZ RODRIGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL	PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	VILLAMIL ROBINSON	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GOMEZ EDGAR ALIRIO	ESPECIALISTA EN URBANISMO	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
6	CLAUDIA GOMEZ	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARRANZA JENNIFER	TOPOGRAFO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	CADENERO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
9	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	BARRETO ESQUIVEL IVAN	TRANSITO Y TRANPORTE	0,30	0,30	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
11	BERNAL SANCHEZ JOHAN CAMILO	CONDUCTOR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
12	IVONNE MILENA GUERRA VERGARA	RESIDENTE SST	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13	VERGARA MARIA DEL CARMEN	RESIDENTE SOCIAL	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	CASTILLO JOSE HUMBERTO	INGENIERO FORESTAL	0,30	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHAMORRO OSCAR	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	CERON JULIETH ALEJANDRA	ADMINISTRADOR	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	SIMON PARDO GUERRA	LABORISTA INSPECTOR	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Toma de esclerometría sobre placa parque Concepción.	CONTRATISTA DE OBRA	Antes de la instalación de piso caucho	CUMPLIDO	Se realiza esclerometría el 23-07-2024
2	Entrega de parques en el mes de Julio • Urbanización José María Carbonell 104 • Palestina • El Libertador • Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	Mes de julio de 2024		El contratista realiza entrega de cronograma de puesta en servicio de parques grupo 1 y grupo 2
3	Instalación de PMTS	CONSTRATISTA DE OBRA	22 DE JULIO DE 2024	INCUMPLIMIENTO	De los PMTs aprobados a la fecha por SDM, faltan por implementarse 07-081 Desarrollo

					Laureles y 07-110 Desarrollo La florida
4	PARQUE PALESTINA llega a obra el adoquín que falta para finalizar la actividad.	CONSTRATISTA DE OBRA	19 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDO	
5	Entrega de balance de obra incluido NP 02	CONSTRATISTA DE OBRA	19 DE JULIO DE 2024 ANTES DE MEDIO DIA	CUMPLIDO	El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-830-2024 remite el balance de obra incluido NP 02.
6	Revisión de balance de obra entregado por el contratista de obra	INTERVENTORIA	20 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDO	La interventoría remite comunicado SPLI-BOS-23-756 a contratista de obra con visto bueno del balance y remite a la entidad mediante comunicado SPLI-BOS-23-0758 el balance de obra avalado el día 22-07-2024
7	Entrega de la programación de obra incluidos los NP 02	CONTRATISTA DE OBRA	22 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDO	El contratista de obra remite programación mediante comunicado CPB-FDLB 508-839-2024
8	Entrega de concepto a la programación NP 02	INTERVENTORIA	24 DE JULIO DE 2024	CUMPLIDO	
9	Programación mesa de trabajo revisión de ajuste a los precios del acta No 03	INTERVENTORIA			

COMPROMISOS PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	IMPLEMENTACION DE PMT Implementación de PMT Parque Laureles el día viernes 26 de julio de 2024 y parque La Florida el lunes 29 de julio de 2024.	CONTRATISTA DE OBRA	26 de julio de 2024 29 de julio de 2024
2	Revisión de la programación presentada por el contratista de obra	INTERVENTORIA	25 de julio de 2024
3	Ajuste a los precios del acta No 03	CONTRATISTA DE	25 de julio de 2024 11:00

	reunión virtual para la revisión de los soportes remitidos por el contratista de obra del acta No 03.	OBRA INTERVENTORIA	am
4	PARQUE PALESTINA Finalización de la actividad de adoquín y juego jinete Finalización actividades	CONTRATISTA DE OBRA	26 de julio de 2024
5	PARQUE BOSALINDA Mantenimiento del espacio público.	CONTRATISTA DE OBRA	30 de julio de 2024
6	PARQUE BOSALINDA Comité veedor	CONTRATISTA DE OBRA	27 de julio de 2024
7	Respuesta al derecho de petición interpuesto por Liliana Andrea Escobar, posterior se emitirá repuesta oficial al derecho de petición del parque Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	
8	Demarcación de cancha de baloncesto	CONTRATISTA DE OBRA	ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO
9	PARQUE CONCEPCION Entrega de proceso constructivo para completar el espesor y cumplir con las especificaciones de espesores en caucho.	CONTRATISTA DE OBRA	
10	PARQUE EL REGALO Respuesta a las observaciones remitidas por la interventoría a los resultados de los ensayos realizados al material instalado en la cancha.	CONTRATISTA DE OBRA	24 de julio de 2024
11	Entrega de parques en el mes de Julio • Urbanización José María Carbonell 104 • Palestina • El Libertador • Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	Mes de julio de 2024

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 31/07/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 31/07/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 46 COMITÉ INTEGRAL

HORA DE INICIO: 09:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 10: 30a m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

210

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobier

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.46. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, así mismo los profesionales de cada componente (AMBIENTAL, SST y SOCIAL) realizan la exposición de las actividades adelantadas durante el mes, y se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría informa que se realizó reunión de inicio en el Parque Laureles donde la comunidad en general solicitó realizar intervención de la zona de patinaje, la comunidad informa que es prioritaria la intervención de esa zona debido a los continuos accidentes que se están presentando en dicha pista.

El contratista de obra indica que en la reunión de inicio se informó a la comunidad, que no se tiene presupuesto adicional para las actividades de la pista de patinaje, por lo que le sugirieron a la comunidad la presentación de una propuesta para no realizar la intervención de las actividades ya socializadas con la comunidad. La comunidad hizo llegar el comunicado al contratista de obra, pero en el documento no es claro en las actividades que la comunidad desea no se adelanten.

El contratista de obra informa que realizó actualización del balance del parque Laureles donde incluye la pista de patinaje y la cancha donde sólo se realizara mantenimiento de mallas ya que la cancha tiene póliza de estabilidad.

Programación de reuniones de inicio
La interventoría informa que recibió del contratista de obra una programación para reuniones de inicio de los Parque Islandia, Desarrollo San Luis, Desarrollo Villa Colombia, Brasil y Desarrollo San Joaquín. La interventoría recomienda al contratista de obra que antes de realizar las reuniones de inicio se revise la aprobación de los respectivos PMT.

El contratista de obra informa que los PMT de los parques mencionados por la interventoría a la fecha no se encuentran aprobados por la SDM.

Entrega de parques
La interventoría informa que se tiene programado la entrega de parques los días 30 y 31 de julio de 2024.
El contratista de obra solicita a la entidad se indique las posibles fechas para la entrega formal de los parques que ya se encuentran abiertos a la comunidad.

Comité de Veedor
La interventoría informa que se realizó comité de veedores en cada uno de los parques. En dos parques los veedores no asistieron al comité

El comité veedor se realizó en los parques de Concepción, la libertada, Bosa linda (con respuesta al derecho de petición).

Se anexa presentación de las actividades adelantadas en el componente.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventora informa que se recibieron documentos de SECAM como un nuevo proveedor, a lo cual desde el componente ambiental se emitió la respectiva aprobación.

La interventoría recomienda realizar compras con planta de aprovechamiento, con el fin de incrementar el porcentaje de aprovechamiento.

La interventoría informa que la semana anterior, se realizó mesa de trabajo entre interventoría, contratista de obra y el profesional ambiental del FDLB y se realizó revisión de cargue de la información que se debe subir en el trimestre que corresponde a abril, mayo y junio, de dicha mesa de trabajo surgieron observaciones, las cuales se informaron al contratista de obra y se realizó la respectiva corrección.

Así mismo, la interventoría informa que se realizó recorrido a las obras el día jueves 25 de julio, donde se realizaron observaciones, las cuales fueron atendidas por el contratista de obra en un gran porcentaje.

La interventoría recomienda al contratista de obra realizar constante seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales, se informa en comité que en las zonas en las cuales están realizando la instalación de piso caucho no se observa el kit de derrames.

La interventoría solicita la entrega de facturas y registro fotográfico por parque de la actividad en la cual se está usando el granulo caucho.

El contratista de obra informa que solicitaron las certificaciones y facturas al proveedor de granulo de caucho y se encuentra a espera de la entrega.

El contratista de obra informa que el día 31-07-2024 se realizará la entrega del informe ambiental del mes de julio

INFORMES MENSUAL (JUNIO)
La interventoría informa que a la fecha los informes mensuales de los componente ambiental y social se encuentran pre aprobados por la interventoría.

Los informes del componente SST y técnico presentan observaciones a la fecha.

CERRAMIENTOS DE OBRA
La interventoría informa que a entidad autorizo se realicen los cerramientos en los parques con polimalla azul a la altura establecida en el prepuesto.

COMPONENTE SST

La interventoría informa que para el mes de junio se tiene

Listas de calificación junio 91%
Ausentismo: 2 trabajadores por enfermedad general
Accidentes de trabajo: 0

Se cuentan con 48 personas en obra

Las capacitaciones realizadas son:
Sistema de alarma
Diligenciamiento de permisos
Riesgo físico
Detección de peligros

La interventoría informa que el contratista de obra está cumpliendo con la plantilla mínima exigida.

La interventoría recuerda al contratista de obra que en todo momento se debe dar usos a los EPP.

La interventoría informa que en las obras no se evidencian las medidas del riesgo químico, señalización del riesgo químico, contención de derrames, señalización de elemsntos químicos.

El contratista de obra informa que el día 31-07-2024 se realizará la entrega del informe sst del mes de julio.

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARQUE LA FLORIDA
El contratista de obra informa que realizará la instalación del cerramiento el 01 de agosto de 2024

PROGRAMACION INCLUIDOS NP 02
El contratista de obra solicita a la entidad se permita mover la línea base inicial del proyecto, con el fin de entregar la programación de los NP 02.

El Apoyo a la Supervisan del FDLB solicita que las programaciones de los parques que se encuentran finalizados se mantengan tanto en fecha de inicio como en fecha de finalización y según programación previamente aprobada.

La programación de los parques que se encuentran en ejecución, no se debe cambiar la fecha de inicio que se tiene establecida en la ultima programación aprobada por la interventoría.

Respecto a los parques que no han iniciado por temas de PMT, se debe presentar la programación con fecha máxima de entrega el 01 de septiembre.

La interventoría manifiesta que cerca del 40% del valor del contrato, el contratista de obra lo tiene proyectado ejecutar en el ultimo mes es decir mes agosto. De acuerdo al avance evidenciado muy posiblemente el contratista de obra no cumpla con la ejecución del 100% del contrato para el 01 de septiembre de 2024.

El contratista de obra entregará la programación el 01 de agosto de 2024.

La interventoría emitirá concepto de revisión de programación Np 02 el día 05-08-2024.


AJUSTE A LOS PRECIOS DEL ACTA No 03
La interventoría informa que el día de hoy 31-07-2024 se realizará reunión entre interventoría y contratista de obra para revisión de ajuste a los precisos del acta No 03 según formato de IDU.

ENTREGA PARQUE BOSALINDA
El contratista de obra informa que se entregará el día 10 agosto de 2024.

La actividad de Demarcación de cancha de baloncesto se ejecutará antes de la fecha de finalización del contrato de obra.

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

AVANCE FINANCIERO

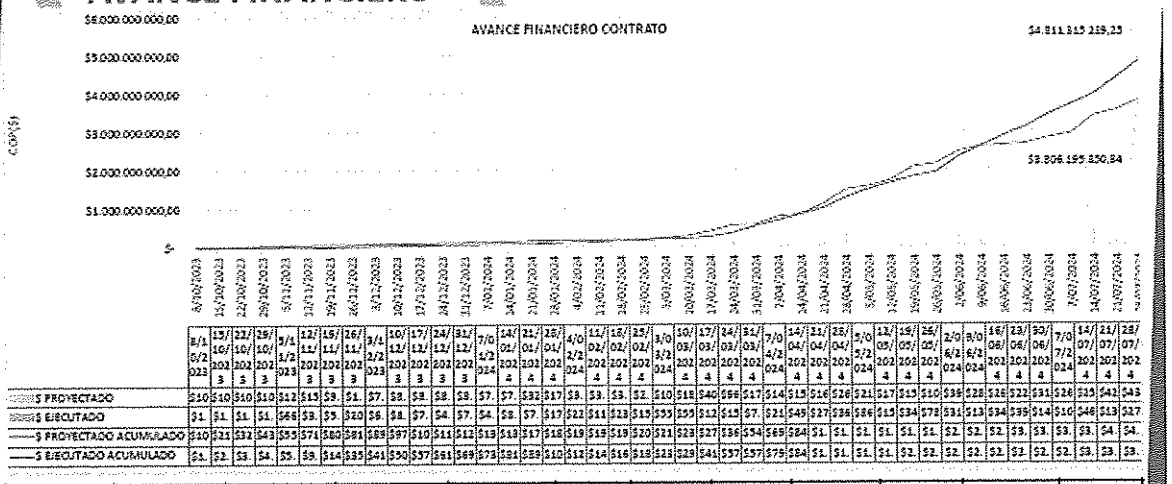

	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024
$ PROYECTADO	$10	$10	$10	$10	$12	$15	$9	$1	$7	$8	$8	$8	$8	$7	$7	$32	$17	$9	$9	$9	$2	$10	$18	$40	$96	$17	$14	$15	$16	$26	$21	$17	$19	$10	$38	$28	$28	$22	$31	$26	$15	$42	$43
$ EJECUTADO	$1	$1	$1	$1	$66	$9	$5	$10	$6	$8	$7	$4	$7	$4	$8	$7	$17	$22	$11	$23	$19	$55	$55	$55	$12	$15	$7	$21	$49	$27	$26	$86	$15	$34	$78	$31	$13	$34	$39	$14	$10	$46	$13	$27
$ PROYECTADO ACUMULADO	$10	$21	$32	$43	$55	$71	$80	$81	$89	$97	$10	$11	$12	$13	$13	$17	$18	$19	$19	$19	$20	$21	$23	$27	$36	$54	$69	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.	$3.	$3.	$4.	$4.	$4.
$ EJECUTADO ACUMULADO	$1.	$2.	$3.	$4.	$5.	$9.	$14	$25	$31	$39	$46	$50	$57	$61	$69	$76	$93	$10	$12	$14	$16	$18	$23	$29	$41	$57	$57	$79	$84	$1.	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.	$3.

Corte 21-07-2024	$ PROYECTADO SEMANA	$ EJECUTADO SEMANA	$ PROYECTADO ACUMULADO	$ EJECUTADO ACUMULADO	% PROYECTADO SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% PROYECTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	%ADELANTO O ATRASO FINANCIERO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 436.407.218,66	$ 270.850.631,33	$ 4.811.315.289,25	$ 3.806.195.850,84	7,02%	4,35%	77,35%	61,19%	-16,16%	$ 2.032.648.946,26	32,68%


NOTA: El 32,68% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 7. El corte 8 se encuentra en formulación.

AVANCE FISICO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO (EJECUTADO/PLAN)

75%

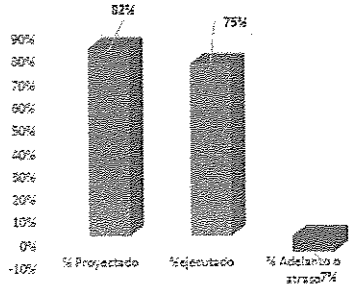

	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTO
CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	82%	75%	-7%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACION	100%	100%	0%
GRUPO 1	96%	95%	-1%
GRUPO 2	63%	45%	-18%
GRUPO 3	51%	22%	-29%
GRUPO 4	32%	16%	-16%
ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4: CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION	0%	0%	0%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	vie 3/11/23	vie 3/05/24	131 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	jue 2/11/23	jue 20/06/24	166 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	jue 29/02/24	jue 8/08/24	116 días	99%	99,00%	0,00%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	mar 30/01/24	vie 16/08/24	144 días	87%	95,00%	-8,00%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	lun 22/01/24	mar 25/06/24	112 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	jue 15/08/24	114 días	78%	92,00%	-14,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	vie 17/05/24	142 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	jue 2/05/24	mié 21/08/24	80 días	84%	63,00%	21,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	jue 4/07/24	176 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	vie 2/02/24	mié 19/06/24	99 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	vie 2/02/24	mié 10/07/24	114 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	lun 6/05/24	mar 13/08/24	72 días	99%	84,00%	15,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	48%	52,00%	-4,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 20/05/24	mar 20/08/24	67 días	48%	85,00%	-37,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	55 días	56%	73,00%	-17,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	57 días	50%	60,00%	-10,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	60 días	29%	58,00%	-29,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	lun 22/07/24	vie 30/08/24	30 días	26%	12,00%	14,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	17%	41,00%	-24,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	23%	54,00%	-31,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	lue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	14%	50,00%	-36,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	lue 20/06/24	lun 26/08/24	48 días	23%	42,00%	-19,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	55 días	30%	70,00%	-40,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	lue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	16%	31,00%	-15,00%
PARQUE 07-061 LAURELES	lue 20/06/24	vie 30/08/24	52 días	19%	34,00%	-15,00%
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	20%	35,00%	-15,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 5/07/24	vie 30/08/24	41 días	8%	35,00%	-27,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	lue 1/08/24	mié 28/08/24	20 días	7%	0,00%	7,00%

AVANCE FISICO

Estado general de los diferentes frentes

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCION FISICA A LA FECHA	EJECUCION PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	PUESTO EN SERVICIO	vie 3/11/23	vie 3/05/24	100,00%	100,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCION	jue 2/11/23	jue 20/06/24	99,00%	100,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	PUESTO EN SERVICIO	jue 29/02/24	jue 8/08/24	99,00%	99,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCION	mar 30/01/24	vie 16/08/24	87,00%	95,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	PUESTO EN SERVICIO	lun 22/01/24	mar 25/06/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCION	lun 11/03/24	jue 15/08/24	78,00%	92,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	jue 2/11/23	vie 17/05/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	EN EJECUCION	jue 2/05/24	mié 21/08/24	84,00%	63,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	FINAL ACTIVIDADES	jue 2/11/23	jue 4/07/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 19/06/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	PUESTO EN SERVICIO	vie 2/02/24	mié 10/07/24	100,00%	100,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	PUESTO EN SERVICIO	lun 6/05/24	mar 13/08/24	99,00%	84,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	EN EJECUCION	lun 20/05/24	mar 20/08/24	48,00%	52,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	EN EJECUCION	lun 20/05/24	mar 20/08/24	48,00%	85,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	EN EJECUCION	lun 27/05/24	vie 9/08/24	56,00%	73,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	EN EJECUCION	mié 5/06/24	jue 22/08/24	50,00%	60,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	EN EJECUCION	mié 5/06/24	mar 27/08/24	29,00%	58,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	EN EJECUCION	lun 22/07/24	vie 30/08/24	26,00%	12,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	mié 5/06/24	vie 30/08/24	17,00%	41,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	EN EJECUCION	mié 5/06/24	vie 30/08/24	23,00%	54,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	lue 20/06/24	vie 30/08/24	14,00%	50,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	EN EJECUCION	lue 20/06/24	lun 26/08/24	23,00%	42,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	mié 5/06/24	mar 20/08/24	30,00%	70,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	lue 20/06/24	vie 30/08/24	16,00%	31,00%
PARQUE 07-061 LAURELES	SIN INICIAR	lue 20/06/24	vie 30/08/24	19,00%	34,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	20,00%	35,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	vie 5/07/24	vie 30/08/24	8,00%	35,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	lue 1/08/24	mié 28/08/24	7,00%	0,00%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	%atraso o adelanto
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	**jue 2/11/23**	**jue 20/06/24**	**99%**	**100%**	**-1%**
AdoquinArcil e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	vie 5/04/24	lun 20/05/24		95%	100%	-5%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% adelanto o atraso
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	**mar 30/01/24**	**mar 13/08/24**	**87%**	**95%**	**-8%**
Pintura estructura baloncesto	vie 24/05/24	jue 30/05/24	25%	100%	-75%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 31/05/24	vie 31/05/24	33%	100%	-67%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 31/05/24	mié 5/06/24	66%	100%	-34%
Pintura Modulo M-5 Columpio	vie 24/05/24	jue 30/05/24	33%	100%	-67%
Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	vie 31/05/24	jue 6/06/24	0%	100%	-100%
Mantenimiemo preventivo espacio publico en adoquin incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	lun 6/05/24	vie 14/06/24	80%	100%	-20%
BANCA M - 31 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	91%	100%	-9%
BANCA M-40 (SUM + INST)	lun 24/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Recubrimiento skate master	jue 30/05/24	mié 19/06/24	30%	100%	-70%
CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 29/03/24	vie 26/04/24	95%	100%	-5%
CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	mié 19/06/24	vie 9/08/24	50%	74%	-24%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	**lun 20/05/24**	**lun 19/08/24**	**48%**	**52%**	**-4%**
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 30/05/24	lun 3/06/24	60%	100%	-40%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mié 26/06/24	mar 2/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	mar 16/07/24	mié 17/07/24	95%	100%	-5%
Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	mar 9/07/24	jue 11/07/24	80%	100%	-20%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mié 24/07/24	jue 25/07/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 26/07/24	mar 30/07/24	0%	33%	-33%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	**lun 11/03/24**	**lun 12/08/24**	**78%**	**92%**	**-14%**
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mar 28/05/24	lun 24/06/24	85%	100%	-15%
Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	85%	100%	-15%
Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mar 28/05/24	lun 24/06/24	85%	100%	-15%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 21/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	30%	100%	-70%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	lun 24/06/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	mié 3/07/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	mié 3/07/24	mar 23/07/24	50%	100%	-50%
Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	vie 17/05/24	mar 21/05/24	60%	100%	-40%
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Estruc metalica cerram esabonada cal12 h=2.5m**	vie 21/06/24	jue 18/07/24	80%	100%	-20%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	**lun 20/05/24**	**mar 20/08/24**	**45%**	**85%**	**-37%**
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 5/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 11/07/24	lun 15/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.65m)**	mié 17/07/24	mar 30/07/24	0%	50%	-50%
Recubrimiento skate master	mié 26/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES.	lun 10/06/24	vie 28/06/24	0%	100%	-100%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	vie 21/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% avance o atraso
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	**vie 5/07/24**	**vie 30/08/24**	**8%**	**35%**	**-27%**
INSTALACIÓN DE PMT	vie 5/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 11/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	lun 22/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	mié 24/07/24	vie 26/07/24	0%	100%	-100%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	56%	73%	-17%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	vie 14/06/24	lun 17/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mar 18/06/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 26/06/24	mar 9/07/24	90%	100%	-10%
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mié 26/06/24	mar 9/07/24	90%	100%	-10%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	jue 20/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	vie 28/06/24	lun 1/07/24	30%	100%	-70%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	jue 4/07/24	vie 5/07/24	66%	100%	-34%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	lun 8/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmaltei anticorrosivo	jue 11/07/24	lun 15/07/24	58%	100%	-42%
Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	mié 10/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	50%	60%	-10%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mié 26/06/24	lun 1/07/24	40%	100%	-60%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	lun 15/07/24	mar 16/07/24	40%	100%	-60%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES.	mié 26/06/24	jue 4/07/24	50%	100%	-50%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	mié 24/07/24	lun 29/07/24	0%	75%	-75%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	29%	58%	-29%
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasleg(<50m	lun 8/07/24	mar 9/07/24	92%	100%	-8%
Compactación fondo de excavación con equipos livia	mié 10/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	lun 15/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	lun 22/07/24	mié 24/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	vie 19/07/24	jue 1/08/24	0%	60%	-60%
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.60m)ZV-conAtr	jue 25/07/24	mar 30/07/24	0%	50%	-50%
Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	mié 10/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%
Recubrimiento skate master	vie 19/07/24	lun 29/07/24	0%	56%	-56%
Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	lun 15/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	vie 30/08/24	17%	41%	-24%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 18/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	lun 24/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	vie 28/06/24	lun 1/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 2/07/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	lun 22/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mié 24/07/24	mar 6/08/24	0%	30%	-30%
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	mié 24/07/24	mar 6/08/24	0%	30%	-30%
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	mié 24/07/24	vie 26/07/24	0%	100%	-100%
Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	mar 16/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES.	lun 24/06/24	vie 5/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	mié 5/06/24	jue 29/08/24	23%	54%	-31%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mié 19/06/24	lun 24/06/24	60%	100%	-40%
Desmonte Señal (IDG-S)	mar 25/06/24	mar 25/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mié 26/06/24	jue 27/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	vie 28/06/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	mar 9/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Filtro frances50*40 Excav+geoNT-1600+tubo	jue 18/07/24	vie 19/07/24	0%	100%	-100%
CAJA INSPECCION(.50x.60x.80) ESPEC-IDRD	lun 22/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+inst)	mié 24/07/24	jue 25/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	70%	-70%
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	70%	-70%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	mar 23/07/24	mié 24/07/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	jue 25/07/24	vie 26/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 25/07/24	lun 29/07/24	0%	67%	-67%
AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	70%	-70%
CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	jue 18/07/24	mié 31/07/24	10%	70%	-60%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Atraso o Adelanto
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 20/06/24	vie 30/08/24	14%	50%	-36%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 26/06/24	vie 28/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	lun 1/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
PINTURA MODULO M-3A	lun 15/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	jue 18/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+instal)	vie 26/07/24	mar 30/07/24	0%	33%	-33%
MODULO CAMINADOR AEREO (Suministro+Instal)	vie 26/07/24	mar 30/07/24	0%	33%	-33%
Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+inst	mié 24/07/24	jue 25/07/24	0%	100%	-100%
Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	vie 26/07/24	mié 31/07/24	0%	25%	-25%
Recubrimiento skate master	lun 15/07/24	jue 22/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	jue 20/06/24	vie 23/08/24	23%	42%	-19%
Desmonte y reinstala AdoquinArcill p<5% sueloMedio	mar 9/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	jue 25/07/24	mar 6/08/24	0%	22%	-22%
Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	jue 25/07/24	mié 14/08/24	0%	13%	-13%
Pintura esmalte tubería 2"	jue 25/07/24	lun 29/07/24	0%	67%	-67%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	jue 25/07/24	lun 29/07/24	0%	67%	-67%
AdoquinArcill e=0.06 p<5%4.2-3duro geot. T-1700	jue 25/07/24	mié 7/08/24	0%	20%	-20%
Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**	jue 18/07/24	mié 31/07/24	0%	70%	-70%
Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	jue 18/07/24	lun 22/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% Adelanto o atraso
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 20/06/24	vie 30/08/24	16%	31%	-15%
INSTALACIÓN DE PMT	lun 24/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	jue 27/06/24	vie 5/07/24	0%	100%	-100%
DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	lun 8/07/24	mié 10/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal (IDG-5)	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	vie 12/07/24	vie 12/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	lun 15/07/24	mar 16/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	mié 17/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	mié 5/06/24	mar 20/08/24	30%	70%	-40%
INSTALACIÓN DE PMT	mié 12/06/24	jue 13/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	mar 25/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	mar 16/07/24	lun 5/08/24	0%	60%	-60%
Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	mar 16/07/24	lun 22/07/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura baloncesto	mar 16/07/24	jue 18/07/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	vie 19/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
PINTURA MODULO M-3A	mié 24/07/24	mié 31/07/24	0%	50%	-50%
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	mié 24/07/24	mar 30/07/24	0%	60%	-60%
Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	vie 26/07/24	vie 2/08/24	0%	17%	-17%
Recubrimiento skate master	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-081 LAURELES	jue 20/06/24	vie 30/08/24	19%	34%	-15%
INSTALACIÓN DE PMT	jue 20/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	mar 25/06/24	mié 26/06/24	0%	100%	-100%
Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro	jue 27/06/24	mié 3/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	jue 4/07/24	jue 4/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	vie 5/07/24	lun 8/07/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% ejecutado	% proyectado	Predecesoras
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 5/07/24	vie 30/08/24	20%	35%	-15%
INSTALACIÓN DE PMT	mar 16/07/24	mié 17/07/24	0%	100%	-100%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	lun 22/07/24	mar 23/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal (IDG-5)	mié 24/07/24	jue 25/07/24	0%	100%	-100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	vie 26/07/24	lun 29/07/24	0%	50%	-50%

CORTE DE OBRA No 08 MES DE JUNIO

El contratista de obra el día 31-07-2024 realizó radicado en fisio del corte de obra No 08 ante la interventoría.

La interventoría informa que para el 02-08-2024 se emitirá concepto de la revisión del corte de obra No 08.

COMUNICADO CPB-FDLB 508-864-2024 CON ASUNTO SOLICITUD INSTALCION CICLO PARQUEADERO

El Apoyo a la supervisión solicita se realice la instalación del ciclo parqueadero en el parque Palestina, la cual consta de 14 ciclo parqueaderos.

COMUNICADO SPB-FDLB 508-854-2024 CON ASUNTO INTERVENCION CANCHA BOSA LINDA SEGÚN

El contratista de obra propone realizar en el parque Bosa linda el tratamiento de destronque y pulida en toda el área de la cancha de microfútbol, esta actividad tiene un costo aproximado de $25.577.963,82 incluido el AIU y el valor de los componentes. Se aclara que esta actividad no se encuentra incluida en el balance presentado por la interventoría ante la entidad.

El contratista de obra propone tomar los recursos que se requieren para el parque de Bosa linda, del parque Laureles III específicamente de las actividades contempladas zona de juegos, teniendo en cuenta que la comunidad manifestó que la prioridad era la intervención de la pista de patinaje.

El contratista de obra informa que el costo de ítems contemplados para intervención zona de juegos parque Laureles III es de $101.451.496,48 incluido AIU y valores componentes.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB aprueba realizar el destronque y pulida de la cancha de microfútbol del parque Bosa linda y compensar el valor con las actividades de la zona de juegos del parque Laureles III.

ACTUALIZACION DEL BALANCE

La interventoría solicita al contratista de obra la presentación en los comités de obra de la actualización del balance de obra teniendo en cuenta que se está a un mes de finalizar el contrato de obra.

CORTE DE OBRA No 09 JULIO

El contratista de obra informa que radicara ante la interventoría el corte de obra No 09 el día 05-08-2024.

COMPROMISOS PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	IMPLEMENTACION DE PMT Implementación de PMT Parque Laureles el día viernes 26 de julio de 2024 Parque La Florida el lunes 29 de julio de 2024.	CONTRATISTA DE OBRA	26 de julio de 2024 29 de julio de 2024	INCUMPLIDO	Laures se instaló el 30 de julio. La Florida a la fecha sin instalar
					Mediante comunicado SPLI-

2	Revisión de la programación presentada por el contratista de obra	INTERVENTORIA	25 de julio de 2024	INCUMPLIDO	BOS-23-0773 Se remitieron observaciones a la programación presentada por el contratista de obra.
3	Ajuste a los precios del acta No 03 reunión virtual para la revisión de los soportes remitidos por el contratista de obra del acta No 03.	CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA	25 de julio de 2024 11:00 am	CUMPLIDA	Se realizó reunión virtual entre contratista de obra e interventoría, la interventoría realizó la entrega del formato ACTA DE AJUSTE DE PRECIOS de la entidad IDU para ser diligenciado por el contratista de obra tenido en cuenta el ANEXO 1- ANEXO TECNICO, así mismo se socializa la fórmula para el ajuste de precios de ítem diferentes al asfalto, fórmula para juste de precio del acero y la fórmula para ajuste del asfalto. Todo según lo que se indica en el ANEXO 1 ANEXO TECNICO
4	PARQUE PALESTINA Finalización de la actividad de adoquín y juego jinete Finalización actividades	CONTRATISTA DE OBRA	26 de julio de 2024	CUMPLIDO	
5	PARQUE BOSALINDA Mantenimiento del espacio público.	CONTRATISTA DE OBRA	30 de julio de 2024		
6	PARQUE BOSALINDA Comité veedor	CONTRATISTA DE OBRA	27 de julio de 2024	CUMPLIDO	
7	Respuesta al derecho de petición interpuesto por Liliana Andrea Escobar, posterior se emitirá repuesta oficial al derecho de petición	CONTRATISTA DE OBRA			

	del parque Bosalinda				
8	Demarcación de cancha de baloncesto	CONTRATISTA DE OBRA	ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO		
9	PARQUE CONCEPCION Entrega de proceso constructivo para completar el espesor y cumplir con las especificaciones de espesores en caucho.	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO	El 25 de julio, el contratista de obra remitió el comunicado CPB-FDLB 508-844-2024 con asunto CONCEPTO TECNICO APLICACIÓN PISO SBR. El comunicado en mención se encuentra en revisión del especialista de la interventoría.
10	PARQUE EL REGALO Respuesta a las observaciones remitidas por la interventoría a los resultados de los ensayos realizados al material instalado en la cancha.	CONTRATISTA DE OBRA	24 de julio de 2024	INCUMPLIDO	El 30 de julio mediante comunicado CPB-FDLB 508-865-2024 el contratista remitió comunicado con asunto INFORMES LABOARTORIO Y APLICACIÓN ASFALTO CANCHA EL REGALO. El comunicado en mención se encuentra en revisión del especialista de la interventoría.
11	Entrega de parques en el mes de Julio • Urbanización José María Carbonell 104 • Palestina • El Libertador • Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	Mes de julio de 2024		

COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Entrega del informe ambiental del mes de julio	CONTRATISTA DE OBRA	31-07-2024
2	Entrega del informe sst del mes de julio.	CONTRATISTA DE OBRA	31-07-2024
3	Instalación de cerramiento parque LA FLORIDA	CONTRATISTA DE OBRA	01-08-2024
4	Entrega programación Np 02	CONTRATISTA DE OBRA	01-08-2024
5	Concepto de revisión de programación Np 02 el	INTERVENTORIA	05-08-2024
6	Reunión AJUSTE A LOS PRECIOS DEL ACTA No 03	CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA	31-07-2024
7	Entrega parque Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	10-08-2024
8	Revisión del corte de obra No 08.	INTERVENTORIA	02-08-2024
9	Actualización del balance de obra	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de seguimiento
10	Corte de obra No 09(JULIO) el día 05-08-2024	CONTRATISTA DE OBRA	05-08-2024

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 08/08/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 26/06/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 41 INTEGRAL

HORA DE INICIO: 09:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 11:40 m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Monica Jimena Guerra V		X								Interventoria		3176678652	
Laura C. Mejia Vargas			X						X	FIL Plan Implementación	lauramejia@gobiernobogota.gov.co		
ISABEL C. LIANO									X	CONTRATISTA	parqueiboss2023@gmail.com	3124811995	
Brayan Redmont Sanchez									X	Interventoria			
Jenny Rodriguez									X	Interventoria	Solucionesbarasas@gmail		

214

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.41. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, así mismo los profesionales de cada componente (AMBIENTAL, SST y SOCIAL) realizan la exposición de las actividades adelantadas durante el mes, y se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así.

COMPONENTE SOCIAL

PARQUE DESARROLLO EL CAUCE

La profesional social de la interventoría informa que la comunidad del parque El Cauce solicita el cambio del uso del parque. La interventoría le informó a la comunidad que esto debe ser solicitado por escrito. A la fecha dicha solicitud no ha sido allegada al punto CREA.

Debido a que la comunidad no allego la solicitud formal del cambio de uso del parque y que dicho parque según programación aprobada debe iniciar el 22-07-2024, se acuerda entre las partes que se ejecutarán actividades en el parque según lo que encuentra en el presupuesto, diagnóstico y últimos recorridos realizados.

PROGRAMACION DE ENTREGA DE PARQUES

- El regalo: se entregará el día viernes 28 de junio de 2024
- El Libertador se entregará el día viernes 28 de junio de 2024
- Palestina se entregará el día martes 2 de julio de 2024
- Carbonell 07-104 se entregará el día martes 2 de julio de 2024
- Concepción se entregará el día martes 2 de julio de 2024

El contratista de obra informa que el parque Concepción no se encuentra para puesta en servicio el día 02 de julio de 2024

ACTAS DE VENCIDAD

Se tiene programado para el viernes 28 de junio la realización de actas de cierre en el parque libertador y la portada

COMITÉ CON VEEDURIAS

La interventoría informa que viene presentando inconveniente con las reuniones de veeduría, ya que se han realizado dos citaciones y la comunidad no asisten.

Por lo anterior, la interventoría planteó al profesional social de la entidad realizar un plegable de cada parque informado el avance y realizar reunión con los líderes en cada punto de intervención.

El Apoyo a la Supervisión FDLB solicita se realice la revisión de los mecanismos de citación a las reuniones de veeduría, de tal forma que la comunidad asista.

Se debe validar el plan de acción para que la comunidad asista a las reuniones de veeduría.

INFORME MENSUAL DE JUNIO

El contratista de obra informa que será remitido a la interventoría el día viernes 28 de junio de 2024.

PARQUE BRASIL

El contratista de obra informa que se realizó la socialización de inicio del parque Brasil y se levantó la respectiva acta.

ATENCION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION EN ALCANCE DE LOS PARQUE

La interventoría solicita que todo cambio requerido por la comunidad se realice mediante un comunicado el cual debe estar firmado por la comunidad y radicado formalmente en las oficinas del punto CREA, con dicho comunicado se entrará a evaluar el cambio solicitado por la comunidad.

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	28		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 50 k 81 - 10 sur
OTROS	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	8	27%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0 00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3.5		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	4	14%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	13	45%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (Porcentaje con base en Mano de obra no calificada.	9	70%		

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS.	18		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS.	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 50 k 81 - 10 sur
OTROS	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	9	50%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0 00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD.	#EA			

BOGOTÁ

ACTAS DE VECINDAD

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	190X100/404 = 47 %
	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	46x100/404=11%
	NUMERO ACTAS CERRADAS	

PQRS

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	16X100/16=100%
	ATENCIONES RECIBIDAS	
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100	0X100/0 =0 %
	ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PUESTA EN SERVICIO

PROGRAMACION REUNIONES DE PUESTA EN SERVICIO GRUPO 1			
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	PUESTA EN SERVICIO	ESTADO
07-015	URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	22/04/2024	ENTREGADO
07-179	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	26/04/2024	ENTREGADO
07-044	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	09/05/2024	ENTREGADO
07-026	DESARROLLO EL RINCON DE BOSA	04/06/2024	ENTREGADO
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	04/06/2024	ENTREGADO
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	18/06/2024	ENTREGADO
07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	26/06/2024	EN EJECUCIÓN
07-022	DESARROLLO PALESTINA	28/06/2024	EN EJECUCIÓN
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	02/07/2024	EN EJECUCIÓN
07-104	URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL	02/07/2024	EN EJECUCIÓN
07-002	DESARROLLO BOSA LINDA	08/07/2024	EN EJECUCIÓN

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-094	DESARROLLO DANUBIO	Reunión Informativa de Inicio	30/01/2024	10
		Reunión Extraordinaria	19/03/2024	6

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE INICIO GRUPO 2

PROGRAMACION REUNIONES DE INICIO GRUPO 2				
CODIGO DEL PARQUE	PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	Reunión Informativa de Inicio	16/05/2024	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-272	NUEVA ESCOCIA	Reunión Informativa de Inicio	17/05/2024	
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA I	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Reunión Informativa de Inicio	30/05/2024	

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES

COMITÉS DE VEEDORES

PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL	
MES	FECHA
MARZO	21 DE MARZO DE 2024
ABRIL	18 DE ABRIL DE 2024
MAYO	23 DE MAYO DE 2024
JUNIO	20 DE JUNIO DE 2024
JULIO	18 DE JULIO DE 2024
AGOSTO	22 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE COLORES EN LOS RECIPIENTES DE RESIDUOS

La interventoría informa que el contratista de obra tiene instaladas las bolsas de colores, pero no cuenta con los respectivos recipientes, recalca que los puntos ecológicos en cada parque deben tener el recipiente de colores y su respectiva bolsa de color, como lo indica la resolución por lo que es de obligatorio cumplimiento.

La profesional ambiental del contratista de obra indica que para los inicios de los parques efectivamente se cuenta con bolsa de colores en los puntos ecológicos sin el respectivo recipiente, esto de forma provisional para dar inicio a las actividades en cada parque. Sin embargo, en lo sucesivo se colocan las canecas con las bolsas como lo solicitó el ingeniero Brayan, por ello el registro fotográfico que se envía en los reportes durante el mes y en informes.

La interventoría informa que el día 25 de junio, se realizó recorrido en los frentes de obra en ejecución evidenciando que los puntos ecológicos cuentan con las bolsas de colores pero no con el respectivo recipiente de color, por lo que se reitera la solicitud de implementación de punto ecológico completo, así mismo se solicita que para el inicio de actividades en los parques el contratista de obra debe tener implementado el punto ecológico con el recipiente y bolsa de color, de lo contrario no podrán dar inicio a las actividades.

APROBACION DE PROVEEDORES

La interventoría informa que se dio aprobación al proveedor ARCILLA CERÁMICA Y GRES SAS, sin embargo, se solicita al contratista de obra que previo al uso de materiales de cualquier proveedor se presenten los respectivos documentos.

ORGANIZACIÓN Y ASEO

El apoyo a la Supervisión FDLB, informa que la comunidad está manifestando la acumulación de escombros en los parques, por lo que se solicita realizar el retiro de escombros diario.

La interventoría reitera la solicitud de dejar puntos específicos de acopio toralmente señalizados y cubiertos en cada parque, ya que los mismos se encuentran dispersos por todo el parque.

PROTECCION DE SUMIDEROS

La interventoría informa que la malla de protección de sumideros no se encuentra instalada en todos los sumideros de los parques que están en intervención.

IMPLEMENTACION DE PLAN AMBIENTAL
La interventoría solicita al contratista de obre implementar el plan ambiental de manera constante y no solo cuando llegan los comunicados de la interventoría con las respectivas observaciones.

INDIVIDUOS ARBOREOS
La interventoría informa que la malla de protección de algunos individuos arbóreos se encuentra deteriorada, por lo que se solicita realizar su cambio y mantener la protección de los individuos arbóreos en buenas condiciones.

BAÑOS POR FRENTE DE OBRA
La interventoría solicita que todos los frentes que se encuentran en ejecución cuenten con los respectivos baños para el personal, por lo que se solicita al contratista de obra informar la ubicación de los baños para cada uno de los parques.


INFORME MENSUAL JUNIO
El contratista de obra informa que remitirá el informe mensual de junio el día 28 de junio

CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA AMBIENTAL
La interventoría informa que se realizó el cargue de los dos primeros trimestres y se inicia con el tercer trimestre el cual se cargará en el mes de junio.

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

- Se evidencia que contratista atiende las observaciones en relación en los puntos ecológicos y el código de colores, sin embargo, se esta dando uso en algunos frentes a solo la bolsa sin contar con el recipiente, recordamos que cada punto ecológico debe contar con su respectiva bolsa, recipiente, identificación y modo de uso.



- Se reitera la recomendación al contratista dar seguimiento a las zonas verdes que se encuentran en cada frente de trabajo, no se deben acopiar materiales y los residuos deben ser retirados de manera inmediata con el fin de conservar en buenas condiciones las zonas verdes existentes.

- Desde el componente ambiental se da aprobación al nuevo proveedor de materiales ARCILLA CERAMICA Y GRES SAS mediante comunicado SPU-SOS-23-0645 el día 12 de junio de 2024


COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL


- Se solicita realizar actualización del formato I. Se debe realizar el cambio de residente de interventoría con los siguientes datos (Brayan S. Arango Cruz – CC: 1030654429)
- Se evidencia en el frente BOSA SANTAFE, contratista sigue las observaciones en relación a la protección de materiales, se reitera la recomendación de mantener en cada frente de trabajo los RCD y materiales señalizados y cubiertos
- Se realiza seguimiento a las jornadas de orden aseo y limpieza en los frentes de obra activos, sin embargo, la interventoría desde su componente ambiental reitera el compromiso de mantener los parques libres de residuos ordinarios y libres de RCD. Los RCD se deben encontrar en su sitio de acopio designado para cada frente de trabajo
- Se realiza seguimiento al cerramiento de los individuos arbóreos presentes en los frentes de trabajo, se recomienda continuar con el mantenimiento a los cerramientos que así lo requieran. El día 10 de junio 2024 el contratista envía evidencia del mantenimiento de los individuos arbóreos
- Se asegura la protección de sumideros colindantes al frente de trabajo durante la segunda semana del mes de junio 2024. Algunos sumideros presentaban necesidad del mantenimiento a su malla de protección y fueron atendidos por el contratista.


COMPONENTE AMBIENTAL

Registro fotográfico – Gestión Ambiental




Protección de material y señalización





Zonas verdes libres de material y RCD





Mantenimiento Malla protección sumideros (Autor: Contratista)

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 17 de JUNIO 2024 A 23 de JUNIO 2024			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PERSONAL EXPUESTO AGENTE VARIO		Se realizara el seguimiento correspondiente [illegible]
2	CERRAMIENTOS	12	
3	PUNTOS ECOLÓGICOS	10	
4	BAÑOS	5	• Obra: Calle 69 Sur # 81J-45 Barrio Florencia • Obra: Calle 69 Sur No 81J-45 • Obra: Calle 69 Sur No 81J - 45 • Obra: Calle 69 Sur # 81J-45 Frente de trabajo 2: Ejecutado

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 17 de JUNIO 2024 A 23 de JUNIO 2024			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
5	ARCHIVOS		Contratista manifiesta que se replantean puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinámica de las obras
6	ACOPIO CERRAMIENTO		Inventario en la bodega
7	SUMIDEROS PROTEGIDOS	31	Se reporta información para la semana del 10 de mayo al 16 de junio 2024 realizar mantenimiento a la malla de protección de los sumideros identificados
8	NOMENCLATURA SUMIDEROS PROTEGIDOS	102	Contratista manifiesta que todos peligrosos de vehículos externos conforme a la dinámica de la obra.
9	PGIO	PESTICIDAS RESIDUOS ORDINARIOS (RO) RESIDUOS CON VALOR (RCV) RESIDUOS VERDES (RV)	SE REALIZARA EL CORRESPONDIENTE REPORTE DEL MES DE JUNIO 2024 EN EL INFORME AMBIENTAL #9 DEVIDO A QUE NO HAY LAS DIFERENTES CANTIDADES REPORTADAS POR EL CONTRATISTA

COMPONENTE SST

TRABAJO EN ALTURAS

El contratista de obra cuenta con un coordinador en alturas y una persona con curso en alturas la cual realiza las actividades de pintura en alturas.

PLAN DE RESCATE

El contratista de obra informa que remitió el plan de rescate.

INFORME MENSUAL DE JUNIO

El contratista de obra informa que el 28 de junio remitirá el informe mensual de junio.

COMPONENTE SST

SEMANA	INGRESO	ANTIGUOS	RETIRO
27 de mayo al 02 de Junio	0	47	0
4 al 9 de Junio	0	47	
11 al 16 de Junio	2	44	3
17 al 23 de Junio	2	43	0



- No se presentaron Accidentes de trabajo
- No se presento ausentismo reportado

- Personal Mínimo Exigido
- 13 personas

BOGOTÁ

COMPONENTE SST

PERSONAL MINIMO DE CONTRATISTA DE OBRA


			PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
2	Isabel Cristina Llano Mosquera	DIRECTOR DE OBRA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Jeannette Fajardo	RESIDENTE DE OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Isabel Cristina Llano Mosquera	PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5	Juan Ricardo Trancoso Rivera	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6	María Natalia Moreno Martínez	ESPECIALISTA EN GERENCIA	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8	Eduardo Nuñez Galeano	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Héctor Muñoz Lopez	TOPOGRAFO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	Jose Reinaldo Ferrer	CALDERO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	Nubia Viviana Ordoñez	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	Danny Alexander Lopez Manzano	TRANSITO Y TRANSPORTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	Laura Lizeth Maluigon Banguera	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Jairo Jorge Llano Mosquera	CONDUCTOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Patricia Maria Ruiz	RESIDENTE SST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Jennifer Alejandra Llano Mosquera	RESIDENTE SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Francisco Andrez Tovar	ALMACENISTA	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00


PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA

			PLANTA MENSUAL EXPERTA SEGÚN CONTRATO							
	NOMBRE	CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	MONICA JIMENA GUERRA	DIRECTOR DE OBRA	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	YENNY CATERINE SAENZ RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL	PROFESIONAL PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	VILLAMIL ROBINSON	GEOTECNISTA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GOMEZ EDGAR ARTURO	ESPECIALISTA EN URBANISMO	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
6	CLAUDIA GOMEZ	HIDRAULICO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARRANZA JENNIFER	TOPOGRAFO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	CADENERO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
9	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	RESIDENTE AMBIENTAL	0,50	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20	0,50	0,20
10	BARRETO ESQUIVEL IVAN	TRANSITO Y TRANSPORTE	0,50	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
11	BERNAL SANCHEZ JOHAN CAMILO	CONDUCTOR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
12	IVONNE MARIA GUERRA VERGARA	RESIDENTE SST	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13	VERGARA MARIA DEL CARMEN	RESIDENTE SOCIAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14	CASTILLO JOSE HUMBERTO	INGENIERO FORESTAL	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHAMORRO OSCAR	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	CERON JULIETH ALEJANDRA	ADMINISTRADOR	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	INSPECTOR 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	RAMON PARDO GUERRA	LABORATORISTA	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

BOGOTÁ

GESTION SST





Actividades SST en Obra
Entrega de EPP
Entrega Puntos de hidratación
Pausas activas.
Entrega del plan de protección contra caídas

Capacitaciones

TEMA	FECHA	PARTICIPANTES
Prevención de desastres naturales	15 /06/2024	4
Riesgo Mecánico	13/06/2024	14
Rescate trabajo en alturas	18/0672024	14
Que es acoso laboral	22/06/2024	4
Inspecciones de seguridad en obra	22/06/2024	4
Uso e inspección de EPP	27/06/2024	14

COMPONENTE SST

RELACION DE PERSONAL

FRENTE DE OBRA	PERSONAL
Carbonell 07-104	Sin personal
Palestina 07-032	1 SOAL 1 civil 2 ayudantes
Rosaleda 07-092	Sin personal obra civil Cuadrilla instalación paneles de cerramiento permanente
Hregafo 07-007	4 ayudantes 1 SOAL
Concepción 07-014	Sin personal
Santa Fe 07-313	1 ayudante
Danubio azul 07-092	Sin personal
Villa Soria 07-346	2 ayudantes 1 SOAL
Brasil II sector 07-003	2 ayudantes




BOGOTÁ

COMPONENTE SST





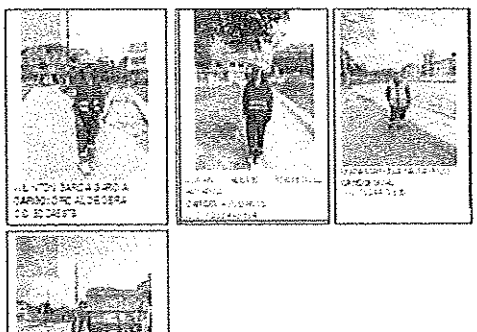



COMPONENTE TÉCNICO

ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PARQUE JOSÉ MARÍA CARBONELL 07- 179
El contratista de obra informa que se realizaron las subsanaciones de las observaciones.

Se realizará verificación de subsanación de observaciones el día 26 de junio de 2024, entre contratista de obra e interventoría.

ENTREGA DE INFORME MENSUAL SST
La interventoría solicita al contratista de obra que la profesional del componente SST del contratista de obra mejore la entrega de la información en los informes mensuales, ya que se ha identificado que el informe mensual versión 0 del componente presenta múltiples observaciones, motivo por el cual se debe realizar la revisión de varias versiones de los informes.

La interventoría advierte que sí, la calidad de los informes mensuales del componente sst no mejora, se procederá a solicitar cambio de la profesional.

ENTREGA DE BALANCE DE OBRA Y PROGRAMACIÓN PARA TRÁMITE DE NP 02

El contratista de obra informa que se encuentra trabajando el balance de obra con los NP 02, pero a la fecha no tiene autorización del representante legal del Consorcio de no incluir el tema de piso caucho en el balance de obra, tal como lo ha solicitado el Apoyo a la Supervisión del FDLB. lo anterior, debido a que el contratista de obra está a espera del comunicado oficial emitido por la entidad, donde indique la NO ejecución de la actividad de piso caucho.

El contratista de obra informa que entregará el balance de obra incluidos los NP 02 para el próximo comité de obra.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB, reitera la importancia de la entrega del balance de obra con el fin de verificar la meta física del contrato.

La interventoría informa que se cuenta con un balance donde se incluyen las cantidades de piso caucho de grupo 3 y grupo 4 y un balance donde se retiran las cantidades de piso caucho de grupo 3 y grupo 4, con corte a 26 de abril, el cual debe ser actualizado por el contratista de obra. Dicho balance fue socializado con la entidad el 26 de abril de 2024.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB indica que, en el comité de obra anterior, se había solicitado la presencia del representante legal del consorcio para el día de hoy 26 de junio de 2024, con el fin de tratar el tema de la no instalación de piso caucho y que dicho representante legal no se presentó.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB informa que a hoy no se cuenta con un balance de obra definitivo, si bien se tiene un estimado del mes de abril, no se tiene un balance definitivo lo cual puede abocar en variaciones económicas del proyecto las cuales son responsabilidad del contratista de obra.

CANECA
Se acuerda entre las partes (Alcaldía, contratista de obra e interventoría) no instalar canecas en los parques debido a las condiciones de seguridad y condiciones de manejo de residuos., por lo cual no se deben incluir en el presupuesto.

RADICACIÓN EN FÍSICO DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE EL LIBERTADOR.
El contratista de obra informa que entregara los documentos faltantes el 27 de junio de 2024.

332

CORTE DE OBRA No 07

La interventoría informa que a la fecha no se encuentra aprobado el corte de obra No 07 del mes de mayo, por presentar observaciones.

La interventoría informa que el 24 de junio a las 06:45 pm el contratista de obra mediante comunicado 756 remitió corrección de observaciones del corte de obra No 07, las cuales se encuentran en revisión de la interventoría y se remitirá el respectivo concepto el día 27 de junio de 2024.

El contratista de obra informa que es imposible entregar el corte de obra en la fecha establecida por la entidad ya que para el último día del mes aún se está realizando la medición de las cantidades en terreno.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB solicita la radicación del corte de obra No 07 del mes de mayo para el día 28 de junio de 2024.

La interventoría informa que no es posible que el corte de obra No 07 del mes de mayo quede radicado en la entidad el día viernes 26 de junio, lo anterior debido a que el corte de obra a la fecha no cuenta con la aprobación por parte de la interventoría.

ENTREGA DE PROYECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AJUSTES DE PRECIOS

El contratista de obra informa que dará respuesta a las observaciones remitidas por la interventoría mediante comunicado SPLI-BOS-23-068 el día 27 de junio de 2024.

REVISIÓN SUBSANACIÓN DE NP 02

La interventoría informa que el contratista de obra remitió subsanación de observaciones mediante comunicado CPB-FDLB 508-759-2024 el 26 de junio de 2024 y que las mismas fueron revisadas por la interventoría y presentan observaciones, las cuales se informarán de manera verbal al contratista de obra una vez se finalice el comité de obra, con el fin de que éste las atienda en el menor tiempo posible y continuar con el proceso ante la entidad.


PARQUE EL REGALO

La interventoría reitera que a la fecha el contratista de obra no ha emitido respuesta a las observaciones realizadas por el especialista en geotecnia de la interventoría, respecto a los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras de asfalto recolectadas en cada jornada de la actividad de asfalto. Por lo anterior, la interventoría informa que la actividad de suministro e instalación de asfalto no será recibida y paga hasta tanto los resultados de los ensayos y la subsanación de las observaciones se aprueben por el especialista en geotecnia y pavimentos de la interventoría.

CORTE DE OBRA No 08 MES DE MAYO

El Apoyo a la Supervisión del FDLB solicita la radicación del corte de obra No 08 correspondiente al mes de mayo para el 10 de julio de 2024.


CONTROL DE PROGRAMACION

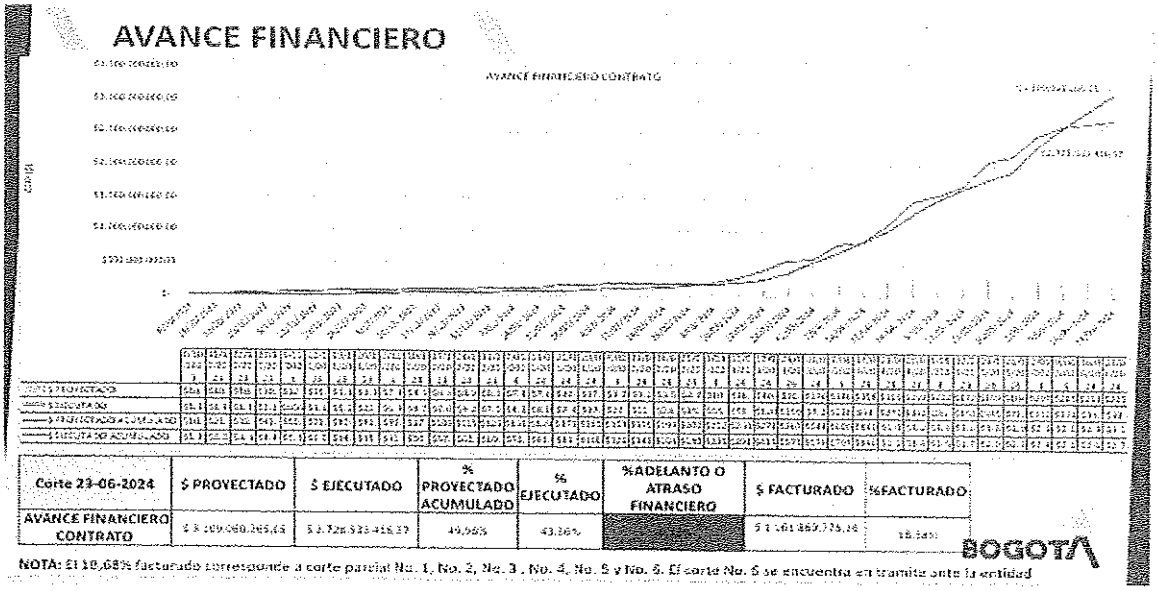

Corte 23-06-2024	$ PROYECTADO	$ EJECUTADO	% PROYECTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	%ADELANTO O ATRASO FINANCIERO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 8.109.060.265,63	$ 3.726.525.415,37	49,96%	43,36%		$ 1.661.869.775,16	18,36%


BOGOTÁ

NOTA: El 18,68% facturado corresponde a corte parcial No. 1, No. 2, No. 3 , No. 4, No. 5 y No. 6. El corte No. 6 se encuentra en tramite ante la entidad

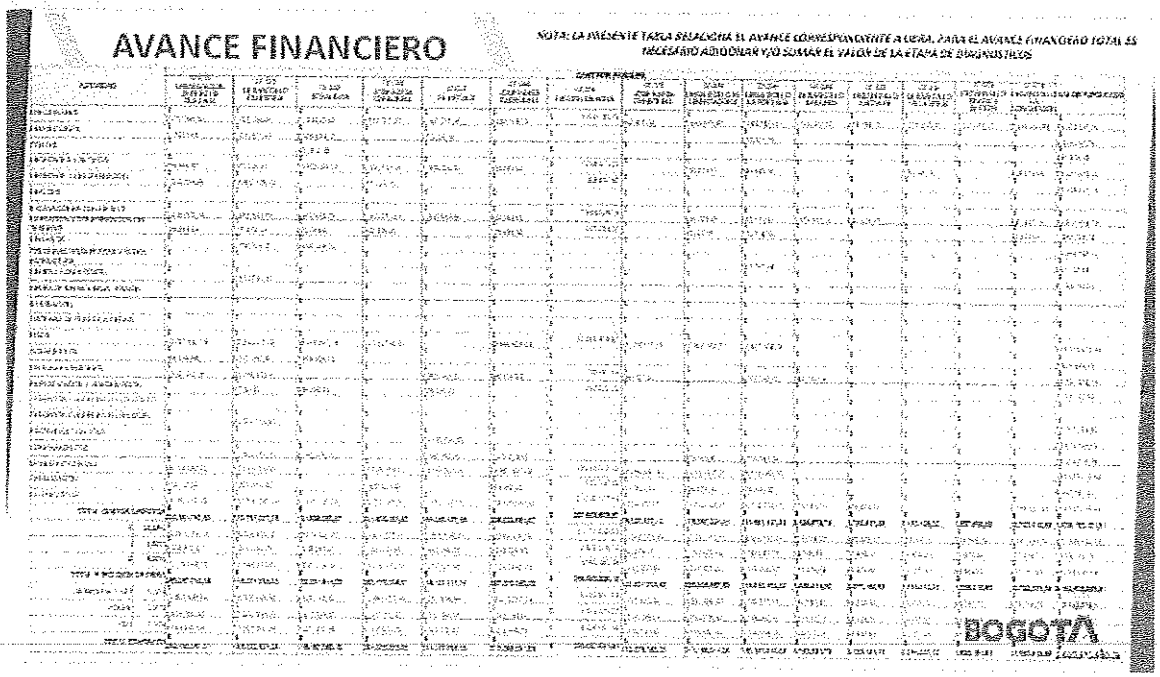


AVANCE FINANCIERO

Seguimiento PAC

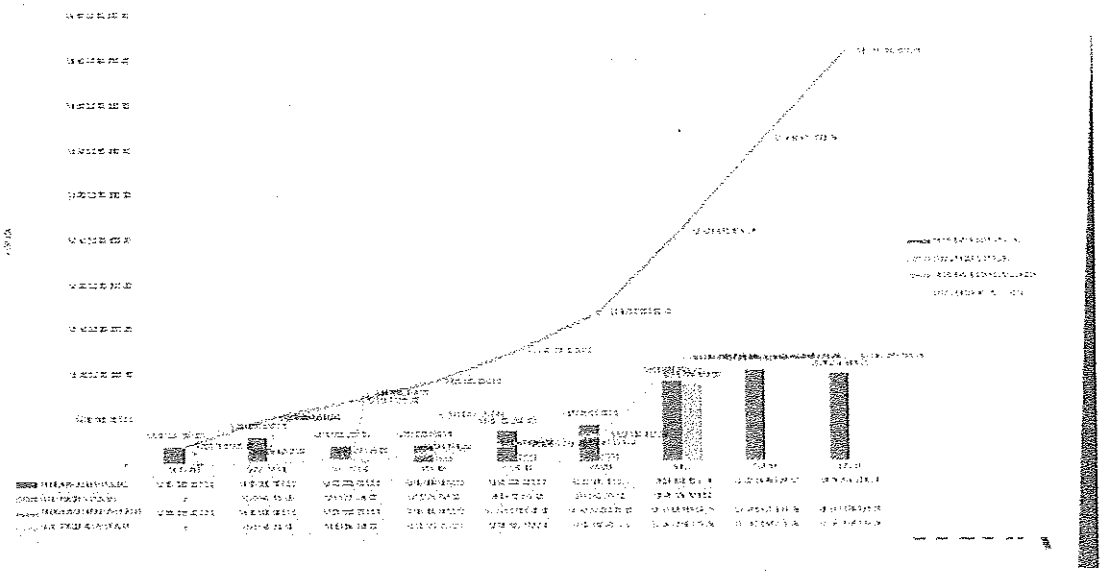


AVANCE FISICO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO




	% PROYECTADO	% EJECUTADO	% ATRASO O ADELANTO
CONTRATO 808-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	61%	57%	4%
FASE 1 DIAGNÓSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	100%	0%
GRUPO 1	83%	78%	5%
GRUPO 2	54%	50%	4%
GRUPO 3	5%	1%	4%
GRUPO 4	0%	0%	0%
ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 3: CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN	0%	0%	0%

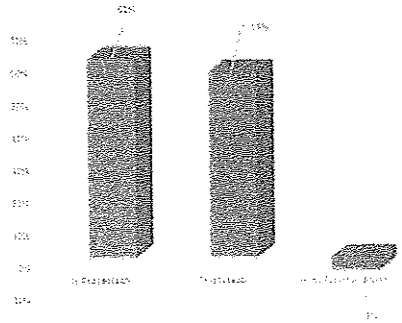

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

Análisis avance físico en el tiempo

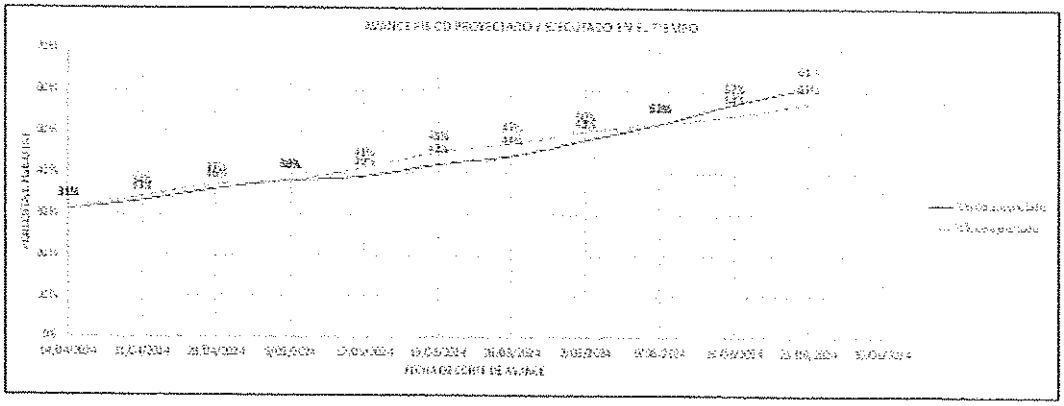

NOTA: El presente análisis es con base en la programación vigente desde el 12 de abril de 2024 y SE ADVIERTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, QUE DE MANTENERSE LA TENDENCIA EN EL AVANCE FISICO NOS ENCONTRAMOS PRÓXIMOS A INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA **CLAUSULA 14 - MULTAS**

AVANCE FISICO

PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	jue 2/11/23	vie 2/08/24	195 días	100%	100,00%	0,00%
PARQUE 07-023 DESARROLLO PALESTINA	jue 2/11/23	jue 29/08/24	206 días	83%	109,00%	-17,00%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	jue 2/11/23	vie 9/08/24	198 días	99%	86,00%	13,00%
PARQUE 07-031 BOSA LINDA	mar 30/01/24	vie 16/08/24	144 días	59%	75,00%	-16,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN EL SEGADO	lun 22/01/24	mar 27/08/24	157 días	66%	100,00%	-34,00%
PARQUE 07-011 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	lun 11/03/24	jue 29/08/24	134 días	55%	66,00%	-10,00%
PARQUE 07-054 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	vie 2/08/24	195 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL PARAISO	jue 2/05/24	mar 27/08/24	80 días	24%	30,00%	-6,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	jue 4/07/24	176 días	99%	92,00%	8,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	jue 2/11/23	vie 2/08/24	195 días	99%	100,00%	-1,00%
PARQUE 07-216 DESARROLLO EL TRIUNFADOR	jue 2/11/23	vie 16/08/24	198 días	100%	87,00%	13,00%
PARQUE 07-220 DESARROLLO LA PORTADA	jue 2/05/24	vie 16/08/24	72 días	0%	33,00%	-33,00%
PARQUE 07-321 DESARROLLO SANTA FE	lun 29/05/24	mar 29/08/24	67 días	15%	22,00%	-8,00%
PARQUE 07-325 DESARROLLO VILLA SONIA	lun 29/05/24	mar 27/08/24	67 días	11%	34,00%	-23,00%
PARQUE 007 BRASIL 3 SECTOR	lun 27/05/24	vie 9/08/24	55 días	21%	29,00%	-8,00%
PARQUE 07-091 DESARROLLO LA LIBERTAD	mié 5/06/24	jue 22/08/24	57 días	4%	12,00%	-8,00%
PARQUE 07-271 NUEVA ESCOCIA	mié 5/06/24	mar 27/08/24	60 días	3%	13,00%	-8,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	lun 27/05/24	vie 30/08/24	69 días	11%	3,00%	11,00%
PARQUE 07-087 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	mié 5/06/24	lun 26/08/24	68 días	2%	9,00%	-9,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN CLARTE	mié 5/06/24	vie 30/08/24	63 días	3%	8,00%	-5,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	jue 30/05/24	vie 30/08/24	62 días	3%	3,00%	-2,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN CLARTE	jue 29/05/24	lun 26/08/24	65 días	4%	2,00%	2,00%
PARQUE 07-214 DESARROLLO BLANQUIS	mié 5/06/24	mar 27/08/24	63 días	5%	12,00%	-7,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	jue 30/05/24	vie 30/08/24	63 días	3%	3,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	jue 30/05/24	vie 30/08/24	62 días	3%	8,00%	-5,00%
PARQUE 07-110 LA FLORIDA	vie 3/05/24	vie 30/08/24	63 días	12%	8,00%	15,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	vie 3/05/24	vie 30/08/24	81 días	8%	8,00%	0,00%
PARQUE 07-265 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	jue 1/08/24	mié 28/08/24	20 días	7%	0,00%	7,00%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-021 DESARROLLO PALESTINA	**jue 2/11/23**	**jue 20/06/24**	**83%**	**100%**	**-17%**
Demarche y arreglos Adoquinería en 6% vado Medio	mar 19/11/24	mar 11/06/24	80%	100%	-20%
Fumigación con Herbicida (aplicación)**	lun 20/05/24	jue 30/05/24	20%	100%	-80%
Mantenimiento preventivo existente (juntas en adoquín incluye cepillo de juntas, barrido, y retiro manual de cepa vegetal	lun 20/05/24	jue 30/05/24	0%	100%	-100%
Adoquinado en sitio 0.20*0.10 Rojo Terracota (Incluye Arena Gris)	vie 5/04/24	lun 20/05/24	85%	100%	-15%
CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Modulo Banco Comunal Aire Libre (suministro)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Modulo Sky - Gimnasio Aire Libre (Suministro)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Modulo Fuerte - Gimnasio Aire Libre (Suministro)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
MULTIFUNCIONAL (Suministro y Instalación)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Modulo Bicicleta Estatica y Carga Quantum (Suministro)	sab 1/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Señal informativa identificativa. Escenarios deportivos	lun 13/05/24	jue 23/05/24	0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-022 BOSA LINDA	**mar 30/01/24**	**mar 11/06/24**	**59%**	**76%**	**-16%**
Señalado de Juntas y pintura con Epoxico Amarillo	mar 2/04/24	mar 16/04/24	70%	100%	-30%
ALISTADO/APISONADO PISO MONTEREY 1 CAPA**	mar 23/04/24	mar 30/04/24	0%	133%	-100%
Instalación adoquín en sardinel (24cm)**	mar 23/04/24	lun 29/04/24	0%	120%	-100%
Pintura estructura soleamiento	vie 24/05/24	jue 6/06/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-63-2 MANOS	vie 31/05/24	vie 31/05/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura microlubricados Compresor	vie 31/05/24	mar 4/06/24	0%	133%	-100%
Pintura Modulo M-1 Columpio	mar 24/05/24	jue 30/05/24	0%	100%	-100%
Limpieza Estruct. Metalica y pintura estructura soleamiento	vie 31/05/24	lun 10/06/24	0%	53%	-53%
Demarcacion señales graficas tatami (1.5 m)**	vie 31/05/24	jue 6/06/24	0%	150%	-100%
Mantenimiento preventivo existente pintura en adoquín incluye cepillo de juntas, barrido, y retiro manual de cepa vegetal	lun 3/06/24	vie 14/06/24	80%	100%	-20%
Adoquinado en sitio 0.20*0.10 Rojo Terracota (Incluye Arena Gris)	lun 3/06/24	vie 21/06/24	67%	133%	-33%
Bordillo en sitio 0.20*0.10 m (SOLO MANO DE OBRA)	lun 3/06/24	vie 21/06/24	67%	133%	-33%
Mantenimiento Arbol master	jue 13/04/24	mar 11/06/24	0%	140%	-140%
Pasa contrapiso fc=210 kg/cm2 (15 cm) (15 m2)**	vie 24/05/24	vie 28/06/24	45%	133%	-153%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	**lun 22/01/24**	**lun 17/06/24**	**93%**	**100%**	**-7%**
Pintura estructura soleamiento	mar 30/04/24	jue 13/06/24	0%	100%	-100%
Limp. Estruct. Metalica y pintura estructura soleamiento	mar 30/04/24	jue 23/05/24	46%	100%	-54%
Restitución asfalto sencillo (capa rodadura e=6cm)	vie 24/05/24	jue 30/05/24	95%	100%	-5%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-018 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	**lun 22/05/24**	**lun 22/08/24**	**28%**	**58%**	**-30%**
Delineación y retiro adoquín	mar 21/05/24	lun 10/06/24	0%	100%	-100%
Conmutación fondo de vivienda con equipamiento	jue 16/05/24	lun 22/07/24	40%	100%	-60%
SOLADO CONCRETO 1:3:5 (e=8 cm) (SUM+INST)	jue 16/05/24	vie 28/06/24	6%	34%	-28%
Pas Contrapiso e=7cm (REFOR 1cm) (88.2cm	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	95%	-95%
Pas Contrapiso e=7cm (REFOR 1cm) (88.2cm sumin mal	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	95%	-95%
Pas Contrapiso e=6cm (REFOR 1cm) (88.2cm sumin mal	mar 28/05/24	lun 24/06/24	0%	95%	-95%
Demarcacion señales graficas tatami (1.5 m)**	vie 24/05/24	jue 30/05/24	0%	100%	-100%
Pintura estructura soleamiento	vie 31/05/24	vie 31/05/24	0%	100%	-100%
Pintura Baranda M-63-2 MANOS	vie 31/05/24	lun 24/06/24	0%	50%	-50%
Pintura estructura microlubricados Compresor	vie 31/05/24	lun 24/06/24	0%	50%	-50%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REFORZAMIENTO, PIEZAS FALTANTES	vie 28/06/24	mié 24/07/24	30%	73%	-43%
Pasa contrapiso fc=210 kg/cm2 (15 cm) (15 m2)**	vie 31/05/24	jue 27/06/24	0%	133%	-133%
Destape y limpieza caja (0.70x0.70)**	vie 17/05/24	mar 11/06/24	60%	100%	-40%
Pintura Modulo M-6 (reforzamiento y pintura general)	vie 21/06/24	lun 24/06/24	0%	50%	-50%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-004 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	**jue 2/11/23**	**vie 17/05/24**	**99%**	**100%**	**-1%**
Pintura Baranda M-63-2 MANOS	jue 2/05/24	mar 7/05/24	95%	100%	-5%

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-024 DESARROLLO EL DANUBIO	**jue 2/05/24**	**mié 22/05/24**	**14%**	**38%**	**-6%**
Cerramiento temporal 2.20 mts(Exc) **	vie 10/05/24	mié 22/05/24	50%	100%	-50%
Desmonte Estramillado en obra. fr=2 a 5 m+cargue y retiro	jue 23/05/24	vie 24/05/24	0%	100%	-100%
Excavación manual retiro tarde standar**+ proyección	lun 27/05/24	mié 12/06/24	0%	100%	-100%
Compactación fondo de excavación con equipo liviano	jue 23/05/24	jue 23/05/24	100%	100%	-100%
Sardinel de fisura y juntas con Emulsion Asfaltica	vie 24/05/24	jue 27/06/24	0%	70%	-70%
Placa contrapiso fm=3.0 E 210 kg/cm^2 (6.3cm@15)**	vie 24/05/24	jue 13/06/24	0%	7%	-7%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso
PARQUE 07-154 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	**jue 31/10/23**	**jue 4/07/24**	**86%**	**91%**	**-3%**
MODULO PISTINA PRENSA HORIZONTAL (SOM	vie 14/06/24	lun 24/06/24	0%	86%	-86%
PINTURA SPORT MASTER	jue 30/05/24	mié 12/06/24	0%	100%	-100%
Modulo Mesa sede de Espalda	vie 14/06/24	lun 24/06/24	0%	86%	-86%
PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	vie 14/06/24	jue 27/06/24	50%	60%	-10%
PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	vie 14/06/24	jue 27/06/24	50%	60%	-10%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	**vie 1/03/24**	**mar 18/06/24**	**99%**	**100%**	**-1%**
PINTURA MODULO M-3A	jue 18/04/24	mié 24/04/24	80%	100%	-20%
Pintura Modulo M-5 Columpio	jue 18/04/24	mié 24/04/24	90%	100%	-10%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA BE	**lun 20/05/24**	**lun 19/08/24**	**19%**	**23%**	**-3%**
Cerramiento temporal 2.20 mts(Exc) **	jue 30/05/24	lun 3/06/24	0%	100%	-40%
Desmonte Señal (DG-5)	jue 13/06/24	vie 14/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte EstramMalla en obra. fr=2 a 5 m+cargue y retiro	lun 27/05/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	**lun 20/05/24**	**mar 18/06/24**	**11%**	**34%**	**-23%**
Desmonte y demolicion cerca malla retiro escombro	jue 6/06/24	vie 7/06/24	66%	100%	-34%
Excavación manual retiro tarde standar**+ proyección	lun 10/06/24	mar 18/06/24	0%	100%	-100%
Compactación fondo de excavación con equipo liviano	vie 14/06/24	jue 20/06/24	0%	100%	-100%
Sardinel de fisura y juntas con Emulsion Asfaltica	vie 7/06/24	mar 25/06/24	0%	71%	-71%
Sendero peatonal 300 kg/cm^2 (12.5cm@1.5m+malla)**	lun 10/06/24	lun 24/06/24	0%	71%	-71%
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y APREGLO. DEPOSICION PIEZAS DESMONTABLES.	lun 10/06/24	vie 28/06/24	0%	57%	-57%
Bolardo para arboles en concreto reforzado	lun 10/06/24	mar 18/06/24	0%	100%	-100%
Muro contrapiso fm=3.0 E 210 kg/cm^2 (6.3cm@15)**	vie 7/06/24	mar 25/06/24	0%	71%	-71%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 001 BRASIL 1 SECTOR	**lun 27/05/24**	**vie 9/08/24**	**11%**	**19%**	**-8%**
Cerramiento temporal 2.20 mts(Exc) **	vie 7/06/24	jue 13/06/24	60%	100%	-40%
Desmonte EstramMalla en obra. fr=2 a 5 m+cargue y retiro	vie 14/06/24	lun 17/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte y retiro de Aaquipiso en gres metropolitano	mar 18/06/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
Sardinel de fisura y juntas con Emulsion Asfaltica	jue 20/06/24	mar 25/06/24	0%	0%	-0%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-003 DESARROLLO LA LIBERTAD	**mié 5/06/24**	**jue 27/06/24**	**4%**	**24%**	**-20%**
INSTALACIONES ESSE	mar 11/06/24	mié 12/06/24	0%	100%	-100%
Cerramiento temporal 2.20 mts(Exc) **	jue 13/06/24	mié 19/06/24	0%	100%	-100%
Desmonte Señal (DG-5)	jue 20/06/24	vie 21/06/24	0%	100%	-100%

BOGOTÁ

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA CON ATRASO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-372 NUEVA ESCOCIA	*mié 5/06/24*	*mar 11/06/24*		**5%**	**15%**	**-6%**
INSTALACIÓN DE PMT	mié 5/06/24	jue 13/06/24		0%	100%	-100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	mié 5/06/24	lun 17/06/24		0%	100%	-100%
Cerramiento Malla h=2.20 m (Ext) **	mar 18/06/24	vie 21/06/24		0%	20%	-20%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	*mié 5/06/24*	*vie 10/08/24*		**8%**	**9%**	**-6%**
INSTALACIÓN DE PMT	mié 5/06/24	jue 13/06/24		0%	100%	-100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	mié 5/06/24	lun 17/06/24		0%	100%	-100%
Cerramiento Malla h=2.20 m (Ext) **	mar 18/06/24	vie 21/06/24		0%	100%	-100%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	*mié 5/06/24*	*jue 15/08/24*		**3%**	**8%**	**-5%**
INSTALACIÓN DE PMT	mié 5/06/24	vie 14/06/24		0%	100%	-100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	lun 17/06/24	mar 18/06/24		0%	100%	-100%
Cerramiento Malla h=2.20 m (Ext) **	mié 19/06/24	lun 24/06/24		0%	20%	-20%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	*mié 5/06/24*	*mar 20/08/24*		**5%**	**12%**	**-7%**
INSTALACIÓN DE PMT	mié 5/06/24	jue 13/06/24		0%	100%	-100%
Cerramiento Malla h=2.20 m (Ext) **	vie 14/06/24	jue 20/06/24		0%	100%	-100%
Desmonte Juego tipo M-5 o SA-6TPM	vie 21/06/24	lun 24/06/24		0%	50%	-50%

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado	% proyectado	% atraso o adelanto
PARQUE 07-051 LAURELES	*jue 20/06/24*	*vie 30/08/24*		**2%**	**3%**	**-1%**
INSTALACIÓN DE PMT	jue 20/06/24	jue 20/06/24		0%	100%	-100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	vie 21/06/24	lun 24/06/24		0%	50%	-50%

PMT

COMPONENTE PMT

APROBADOS

PARCELE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA APROBACION
07-033	28/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-015	29/05/2024	27/06/2024	24/05/2024
07-026	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-032	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-070	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-007	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-038	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-058	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-098	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-126	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-098	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-038	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-126	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-058	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-070	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-032	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-038	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024
07-032	29/05/2024	28/06/2024	24/05/2024

BOGOTÁ

COMPONENTE PMT

PMTs PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACION	FECHA DE INICIO INSTALACIÓN PMT SEGÚN PROGRAMACION
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3	11-06-2024
07-009	URBANIZACIÓN CLARTE	3	12-06-2024
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	4	20-06-2024
07-215	URBANIZACIÓN CLARTE	4	25-06-2024
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4	26-06-2024
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4	18-07-2024
07-206	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4	02-06-2024
07-282	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4	20-06-2024
07-045	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4	24-06-2024
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4	05-07-2024

La interventoría informa que realizó llamado de atención al contratista de obra ya que a la fecha los PMT correspondientes al grupo 3 y 4 ya deberían haberse presentado para el correspondiente tramite.

La interventoría reitera que no se debe adelantar actividades en los parques que no cuenta con el respectivo PMT aprobado por la SDM y/o que están vencidos.

COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACION
1	Resultados extracción de núcleo para revisión de la resistencia del concreto parque portada	INTERVENTORIA	24 DE JUNIO DE 2024	CUMPLIDO	El resultado del ensayo sobre núcleo de concreto arrojo resistencia a la compresión de 22.1 Mpa, CUMPLIENDO con la resistencia requerida.
2	Resultados de concreto a los 56 días parque la portada	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO	El contratista de obra mediante comunicado CPB-FDLB 508-724-2024 remitió resultados de ensayos de concreto a los 56 días arrojando como resultados 22.5 Mpa.

3	Entrega de subsanación de observaciones Parque José María Carbonell 07- 179	CONTRATISTA DE OBRA	24 DE JUNIO DE 2024	INCUMPLIDO	A la fecha persisten observaciones
4	Revisión de informe SST No 08	INTERVENTORIA	24 DE JUNIO DE2024	CUMPLIDO	Aprobado mediante comunicado SPLI-BOS-23-0679 de fecha 24-06-2024
5	Respuesta observaciones informe técnico No 08	CONTRATISTA DE OBRA	19 DE JUNIO DE 2024	CUMPLIDO	Aprobado en versión 3 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0679 de fecha 24-06-2024
6	Entrega de balance de obra y programación para trámite de NP 02	CONTRATISTA DE OBRA	19 DE JUNIO DE 2024	INCUMPLIDO	
7	Radicación en fisico del manual de mantenimiento parque el libertador.	CONTRATISTA DE OBRA	20 DE JUNIO DE 2024	INCUMPLIDO	El contratista de obra mediante comunicado CPB-FDLB 508-751-2024 radico ante la interventoría el manual de mantenimiento del Libertador.
8	Entrega a la entidad parque el libertador	CONTRATISTA DE OBRA	03 DE JULIO 2024		
9	Radicación ante la entidad del corte de obra No 06 correspondiente al mes de abril tanto de obra como de interventoría.	INTERVENTORIA	19 DE JUNIO 2024	CUMPLIDO	La interventoría mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-667 y SPLI-BOS-23-659 radicó ante la entidad el corte de obra No 06 del contrato de obra y contrato de interventoría.
					El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-748-2024 de fecha 20-06-2024 y comunicado CPB-FDLB 508-753-2024 de fecha 21-

10	Entrega de proyección y justificación de los ajustes de precios	CONTRATISTA DE OBRA	19 DE JUNIO 2024	INCUMPLIDO	06-2024 remitió acta de ajuste a precios. La interventoría mediante comunicado SPLI-BOS-23-0684 de fecha 25-06-2024 remitió observaciones a los ajustes de precios presentados.
11	Revisión subsanación de NP 02	INTERVENTORIA			La interventoría mediante comunicado SPLI-BOS-23-0678 el 24 de junio remitió observaciones a la subsanación de NP 02 enviada por el contratista de obra mediante comunicado CPB-FDLB 508-712-2024

COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de parque El regalo	Contratista de obra	28 de junio de 2024
2	Entrega de parque El Libertador	Contratista de obra	28 de junio de 2024
3	Entrega de parque Palestina	Contratista de obra	2 de julio de 2024
4	Entrega de parque Carbonell 07-104	Contratista de obra	2 de julio de 2024
5	Entrega de parque Concepción	Contratista de obra	Por definir
6	Actas de cierre parque libertador y la portada	Contratista de obra	28 de junio de 2024
7	Informe mensual de junio sst, ambiental y social	Contratista de obra	28 de junio de 2024
8	Revisión de subsanación de observaciones parque José maría Carbonell 07- 179	Contratista de obra Interventoría	26 de junio de 2024
9	Entrega del balance de obra incluidos los NP 02	Contratista de obra	03 de julio de 2024
10	PARQUE EL LIBERTADOR. documentos faltantes manual de mantenimiento	Contratista de obra	27 de junio de 2024
11	Revisión de corte de obra No 07	Interventoría	27 de junio de 2024
12	Radicación corte de obra No 07	Interventoría	28 de junio de 2024
13	Subsanación de observaciones justificación de los ajustes de precios	Contratista de obra	27 de junio de 2024

14	Subsanación de observaciones NP 02	Contratista de obra	03 de julio de 2024
15	Corte de obra No 08 mes de mayo	Contratista de obra	10 de julio de 2024

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 04/07/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 04/07/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 42 RECORRIDO PARQUES EN EJECUCION

HORA DE INICIO: 09:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Monica Guerra		X								Interventoría		3176679302	
Jenny Rodriguez									X	Interventoría	Solucionesbasesia@gmail.com		
Brayan Rodriguez Sanchez									X	Interventoría	Soluciones basesia@gmail.com		
Laura C. Hernandez Borda			X						X	FDL Puente Aranda	lauracmoreno@gobiernobogota.gov.co		
Fernando Pinzón									X	Contratista	mujumera2000@hotmail.com		

224

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobier

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.42, se realiza recorrido a 04 parques que se encuentran en ejecución, a dicho recorrido asisten los profesionales de Apoyo a la Supervisión del FDLB, contratista de obra e interventoría.

Parque Concepción. En zona de juegos la interventoría realiza observación respecto a la validación de niveles antes del vaciado de concreto ya que se observa espesor de placa superior al definido.

Parque Bosa linda: la interventoría solicita señalizar las cajas de inspección que se encuentran sin tapa, teniendo en cuenta que las aguas de la cuneta existente se encuentran estancadas, se recomiendo que por medio de tubería se conecten las aguas de la cuneta a una caja de inspección existente.

Parque Palestina: Se acuerda entre las partes que el sendero que falta por instalar adoquín se realice con adoquín nuevo.

Parque Carbonell 104: en zona 18 el Apoyo a la supervisión del FDLB solicita realizar corrección de acabado en piso caucho instalado.

ENTREGA DE PARQUES

Parque El libertador, palestina y Carbonell 104 está pendiente definir la fecha de entrega de los parques por parte de la entidad.

La directora de obra del Consorcio parques 2023 no asiste al comité de seguimiento No 42.

INSTALACION DE PISO CAUCHO

El Apoyo a la Supervisión del FDLB solicita no realizar actividades en las zonas de juegos de los parques que corresponden al grupo 3 y 4.

PARQUE BRASIL

Parque Brasil: se acuerda entre las partes solo se instalar el juego m3 y reubicara en el parque el juego nuevo.

CORTE DE OBRA No 07

El contratista de obra indica que el día de hoy 04-07-2024 radicara ante la interventoría la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría.

El Apoyo a la Supervisión solicita que el corte No 07 se radique en la entidad el día 08 de julio de 2024.

ACTA DE CIERRE

La profesional social del contratista de obra informa que las actas de cierre de los parques libertador y la portada, se realizarán el lunes 08 de julio de 2024.

MANUAL DE MANTENIMIENTO EL LIBERTADOR:

El contratista de obra informa que el día de hoy 04-07-2024 radicará en físico ante la interventora los documentos faltantes del manual de mantenimiento del parque el Libertado.

ATRASOS EN OBRA

La interventoría informa que el contrato de obra presenta un atraso del -8.71% financiero según programación de obra aprobada y un atraso del -6% físico Por lo anterior, la interventoría procederá a remitir el informe de posible incumplimiento por parte del contratista de obra.

Así mismo, la interventoría informa que recibido del contratista de obra un plan de contingencia y que el mismo presenta observaciones las cuales fueron remitidas por la interventoría al contratista de obra el día 03-07-2024. Por lo anterior se solicita al contratista de obra que máximo el 05 de julio se remita respuesta a las observaciones realizadas al plan de contingencia.

COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Entrega de parque El regalo	Contratista de obra	28 de junio de 2024	CUMPLIDO	
2	Entrega de parque El Libertador	Contratista de obra	28 de junio de 2024	INCUMPLIDO	
3	Entrega de parque Palestina	Contratista de obra	2 de julio de 2024	INCUMPLIDO	
4	Entrega de parque Carbonell 07-104	Contratista de obra	2 de julio de 2024	INCUMPLIDO	
5	Entrega de parque Concepción	Contratista de obra	Por definir		
6	Actas de cierre parque libertador y la portada	Contratista de obra	28 de junio de 2024	INCUMPLIDO	
7	Informe mensual de junio sst, ambiental y social	Contratista de obra	28 de junio de 2024	CUMPLIO	Mediante comunicado CPB-FDLB 508-771-2024 el 28-06-2024 el contratista remitió versión 0 del informe sst Mediante comunicado CPB-FDLB 508-782-2024 el 28-06-2024 el contratista remitió versión 1 del informe ambiental Mediante comunicado CPB-FDLB 508-783-2024 el 30-06-2024 el contratista remitió versión 1 del informe

					social. Mediante comunicado CPB-FDLB 508-785-2024 el 30-06-2024 el contratista remitió versión 0 del informe social
8	Revisión de subsanación de observaciones parque José maría Carbonell 07- 179	Contratista de obra Interventoría	26 de junio de 2024	CUMPLIDO	
9	Entrega del balance de obra incluidos los NP 02	Contratista de obra	03 de julio de 2024	CUMPLIDO	Remitido por el contratista de obra el 28 de junio sin memorias de cantidades
10	PARQUE EL LIBERTADOR. documentos faltantes manual de mantenimiento	Contratista de obra	27 de junio de 2024	INCUMPLIDO	
11	Revisión de corte de obra No 07	Interventoría	27 de junio de 2024	CUMPLIDO	
12	Radicación corte de obra No 07	Interventoría	28 de junio de 2024	INCUMPLIDO	Mediante comunicado CPB-FDLB 508-775-2024 el 28-06-2024 el contratista de obra radico en físico el corte de obra No 07, el cual debió ser revisado por la interventoría encontrando observaciones en el documento radicado. Por lo anterior no se cumplió con el compromiso de radicar ante la entidad el corte de obra No 07
13	Subsanación de observaciones justificación de los ajustes de precios	Contratista de obra	27 de junio de 2024	CUMPLIDO	Mediante comunicado CPB-FDLB-508 763A - 2024 el 26 de junio el contratista remitió el documento.

					La interventoría remitió observaciones las cuales deben ser corregidas, teniendo en cuenta que el valor del acta de corte No 07 tiene modificación.
14	Subsanación de observaciones NP 02	Contratista de obra	03 de julio de 2024	CUMPLIDO	
15	Corte de obra No 08 mes de mayo	Contratista de obra	10 de julio de 2024	CUMPLIDO	

COMPROMISOS PRESENTE COMITÉ

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	ENTREGA DE PARQUES Parque El libertador, palestina y Carbonell 104 pendiente definir la fecha de entrega de los parques por parte de la entidad.	FDLB	
2	Entrega de subsanación de observaciones corte de obra No 07	CONTRATISTA DE OBRA	04 DE JULIO DE 2024 04:00 PM
3	Radicación ante la entidad del corte No 07	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	08 DE JULIO DE 2024
4	Acta de cierre parques libertador y la portada	CONTRATISTA DE OBRA	08 DE JULIO DE 2024
5	Documentos faltantes del manual de mantenimiento el libertador:	CONTRATISTA DE OBRA	04 DE JULIO DE 2024
6	Subsanación de observaciones plan de contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	05 DE JULIO DE 2024

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 10/07/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

FORMATO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-83		1

FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PERIODO INFORME	
30	8	2024	DE INFRAESTRUCTURA	DE CONSERVACION DE INFARESTRUCTURA	DESDE	
					HASTA	

	CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA	INTERVENTORIA
CONTRATO No	508-2023	510-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES 2023	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
OBJETO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

No.	EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR										ARL		EPS	AFP	FECHA EXAMENES			CONCEPTO
	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	SEXO F	SEXO M	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	NOMBRE EPS	NOMBRE AFP	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
	PESONAL NUEVO																		
	PESONAL ANTIGUO																		
1	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	Indefinido	GUERRA VERGARA MONICA JIMENA	52.261.971	48	X		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2/10/2023	NA	SURA	V	1/03/2019	FAMISANAR	COLPENSIONES	11/08/2023	NA	NA	Apto
2	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	YENNY XATERINE SAENZ RODRIGUEZ	40.949.310	42	X		RESIDENTE DE OBRA	1/11/2023	NA	POSITIVA	V	2/11/2023	SANITAS	PORVENIR	7/11/2023	NA	NA	Apto
3	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	Indefinido	DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL	94.406.535	44		X	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	2/10/2023	NA	SURA	V	24/09/2019	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	14/01/2023	NA	NA	Apto
4	CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA	Indefinido	VERGARA MARIA DEL CARMEN	20.449.903	68	X		RESIDENTE SOCIAL	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	COMPENSAR	NA	2/10/2023	NA	NA	Apto
5	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	Indefinido	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	1.030.654.429	28		X	RESIDENTE AMBIENTAL	16/4/2024	NA	SURA	V	26/03/2024	FAMISANAR	PORVENIR	20/03/2024	NA	NA	Apto
6	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	OPS	GOMEZ EDGAR ALIRIO	93.405.736	44		X	ESPECIALISTA URBANO	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	SANITAS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
7	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	Indefinido	IVONNE MILENA GUERRA VERGARA	40.035.076	50	X		RESIDENTE SST	26/02/2024	NA	SURA	V	2/02/2019	COMPENSAR	COLPENSIONES	7/02/2024	NA	NA	Apto
8	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	CHAMORRO OSCAR	1.089.732.685	34		X	INSPECTOR 1	2/10/2023	NA	POSITIVA	V	2/10/2023	SANITAS	COLPENSIONES	3/10/2023	NA	NA	Apto
9	CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA	Indefinido	CARRANZA JENNIFER	1.024.525.394	32	X		TOPOGRAFO INSPECTOR DIURNO Y NOCTURNO	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	COMPENSAR	PROTECCION	2/10/2023	NA	NA	Apto
10	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	JOSE RAFAEL ARIAS	1.065.277.366	34	X		CADENERO DIURNO Y NOCTURNO	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	SANITAS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
11	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	JUAN CARLOS DUARTE	1.065.278.054	33	X		ADMINISTRADOR	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
12	CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA	Indefinido	BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	1.234.791.604	24		X	INSPECTOR 1	30/1/2024	NA	SURA	V	14/8/2023	SANITAS	PORVENIR	19/8/2023	NA	NA	Apto
13	INFRAESTRUCTURA NACIONAL	Indefinido	BERNAL SANCHEZ JOHAN CAMILO	1.033.791.125	26		X	CONDUCTOR	1/03/2023	NA	SURA	V	25/09/2021	SANITAS	COLPENSIONES	30/01/2023	NA	NA	Apto
	RETIRO DE PERSONAL JUNIO																		
	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	VIVIANA ENRIQUEZ	1.065.277.366	34	X		CADENERO DIURNO Y NOCTURNO	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	SANITAS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	JULIETH CERON	1.065.278.054	33	X		ADMINISTRADOR	2/10/2023	NA	SURA	V	2/10/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
	RETIRO DE PERSONAL FEBRERO																		
1	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	1.065.277.366	34	X		CADENERO DIURNO Y NOCTURNO	2/10/2023	31/08/2024	SURA	V	2/10/2023	SANITAS	PORVENIR	2/10/2023	NA	NA	Apto
	RETIRO DE PERSONAL FEBRERO																		
3	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	MEJIA BARACALDO YURI ANDREINA	1.121.858.172	36	X		RESIDENTE SST	2/10/2023	15/03/2024	POSITIVA	I	16/10/2023	COMPENSAR	PROTECCION	9/02/2023	NA	NA	Apto
	INFRAESTRUCTURA NACIONAL	Indefinido	FORIGUA MARIA MONICA	52.484.116	44	X		INGENIERO AMBIENTAL	2/10/2023	NA	SURA	V		COMPENSAR	PROTECCION	27/07/4/2023	NA	NA	Apto

FORMATO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC 83		1

RETIRO DE PERSONAL ENERO

1	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	CHAVEZ LAURA MICHEL	1.193.509.303	23	X		INSPECTOR 1	2/10/2023	1/01/2024	SURA	V	2/10/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	2/10/2023	NA	NA	Apto
2	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	Indefinido	CUERVO ALARCON KAREN MAYERLY	1003965289	26	X		LABORISTA INSPECTOR	2/10/2023	1/01/2024	SURA	V	9/02/2018	FAMISANAR	PROTECCION	1/10/2023	NA	NA	Apto
	RETIRO NOVIEMBRE																		
1	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	Indefinido	FLOREZ ORTEGA RONNIE	79.663.169	40		X	RESIDENTE DE OBRA	2/10/2023	3/11/2023	SURA	V	9/08/2021	SANITAS	PROTECCION	14/11/2023	NA	NA	Apto
	INGRESO - RETIRO																		
19	TOTAL																		

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Firma: IvonneGuerra
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre: IVONNE MILENA GUERRA
Residente/ SST /Inspector

LIC. No: Resolucion 2841 de 28 de febero 2018
(Indicar el número de la licencia SST) fecha de expedición de la licencia SS

FORMATO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Interventoria	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
CONTRATO No	510-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

PERIODO INFORME	1/07/2024	A	30/07/2024

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS TRABAJADOS	HORAS TRABAJADAS	DEDICACION	AUSENCIAS ‡	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	YAMIL MONTENEGRO	Indefinido	MONICA LORENA GUEVARA VERGARA	52203971	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2/10/2023	N A	22	8	40%		8,8	70,4
2	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	YENNY KATERINE RODRIGUEZ	40049313	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7/11/2023	NA	22	8	100%		22	176
3	YAMIL MONTENEGRO	Indefinido	DIEGO ALEXANDER DELGADO	94476595	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	2/10/2023	NA	22	8	50%		11	88
4	YAMIL MONTENEGRO	Indefinido	IVONNE MILENA GUERRA	40035976	RESIDENTE SST	20/03/2024	NA	22	8	25%		5,5	44
5	CONSORCIO ALBIZA CUNDINAMARCA	Indefinido	MARIA DEL CARMEN HERRERA	53183521	RESIDENTE BOGOTA	02/10/2023	NA	22	8	50%		11	88
6	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	1033654429	INGENIERA AMBIENTAL	1/04/2023	NA	22	8	50%		11	88
7	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	OPS	EDGAR ALIRIO GOMEZ	83450736	ESPECIALISTA AMBIENTAL	02/10/2023	NA	22	8	30%		6,6	52,8
8	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	OSCAR DAVID CHAMORRO	1068730695	INSPECTOR 1	02/10/2023	NA	22	8	100%		22	176
9	CONSORCIO ALBIZA CUNDINAMARCA	Indefinido	BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ	1101684513	INSPECTOR 1	02/10/2023	NA	22	8	100%		22	176
10	CONSORCIO ALBIZA CUNDINAMARCA	Obra o Labor determinada	YENNIFER CARRANZA	1024525394	TOPOGRAFO INSPECTOR	02/10/2023	NA	22	8	20%		4,4	35,2
11	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	RAFAEL ARIAS	11/06/2024	CADENERO 1	11/07/2024	NA	22	8	20%		4,4	35,2
12	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	JUAN CARLOS DUARTE	11/06/2024	ADMINISTRADOR	11/07/2024	NA	22	8	50%		11	88
13	INFRAESTRUCTURA NACIONAL	Obra o Labor determinada	JOHAN COSTA O BONILLA	1013701125	TOPOGRAFO	2/10/2023	NA	22	8	10%		2,2	17,6
													1135,2

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS	1135,2

Firma: Ivonne Guerra
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre: Ivonne Guerra
Residente Especialista SST Interventoria

LIC No: 2941 (indicar el número de la licencia SST)

28/02/2016 (fecha de expedición de la licencia SST)

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

900579723-7

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**
He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son los Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales (SENA, ICBF), Cuando a ello hubiere lugar; así como los aporte a Caja de Compensación Familiar, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002,

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios y de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a un (1) trabajador:

Nombre	Cedula	Cargo
Bryan Steven Arango Cruz	1030654429	Residente Ambiental

El presente certificado se expide el 01 de agosto de 2024.

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal

INFRAESTRUCTURA NACIONAL

"INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO"

INFRAESTRUCTURA NACIONAL
NIT 900055521-7

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** La empresa ha cumplido y ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son los Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales como los propios del SENA, ICBF y aporte a Caja de Compensación Familiar, (cuando a ello hubiere lugar), así de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a (1) trabajador:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Johan Camilo Bernal	1033791125	Conductor

El presente certificado se expide a el 1 de agosto de 2024

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**
He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales como lo son (SENA, ICBF) cuando a ello hubiere lugar y aporte a Caja de Compensación Familiar,
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, donde se muestra los pagos efectuados oportunamente a dichas entidades para el periodo anteriormente mencionado.

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a tres (3) trabajadores:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
MONICA JIMENA GUERRA VERGARA	52.261.971	Director
DIEGO OSORIO	94.406.535	Especialista en presupuesto y programación
IVONNE MILENA GUERRA	40.035.976	Residente SST

El presente certificado se expide el 1 de agosto de 2024.

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales SENA, ICBF (cuando a ello Hubiere lugar), así como la Caja de Compensación Familiar, así de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002,

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a un (1) trabajadores:

NOMBRES Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO
Simón Pardo Guerra	1001218709	Conductor

Se expide en Bogotá a el 1 de agosto de 2024

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

|He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como los propios del (SENA, ICBF) si a ello hubiera lugar y aporte a Caja de Compensación Familiar, así como Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, donde se muestra los pagos efectuados oportunamente a dichas entidades para el periodo anteriormente mencionado.

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios y liquidaciones de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a cinco (5) trabajadores:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Jenny Katherine Sáenz Rodríguez	40.049.313	Residente de Obra
Edgar Alirio Gómez	93408738	Especialista Urbanismo
Oscar Chamorro	1088732695	Inspector 1
Juan Carlos Duarte	79127205	Administrador
Ivethe Tatiana Rodríguez	1073515080	Ingeniero Auxiliar

Dada en Bogotá, el 1 de agosto de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL
