

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE PALACIOS DE JUSTICIA**	**$ 498.843.701,00**			**109 días**	**19/06/24**	**20/11/24**
1	1	**INICIO OBRA**	**$ 0,00**		**323CC+15 días**	**0 días**	**19/06/24**	**19/06/24**
2	2	**INICIO CHALAN**	**$ 0,00**	**169CC+12 días**	**5CC;51CC+15 día**	**0 días**	**20/08/24**	**20/08/24**
3	3	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALÁN**	**$ 50.449.601,00**			**30 días**	**20/08/24**	**25/09/24**
4	3.1	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.423.263,00**			**7 días**	**20/08/24**	**28/08/24**
5	3.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 6.423.263,00	2CC	20CC+2 días;49;36CC;22C	7 días	20/08/24	28/08/24
6	3.2	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**20/08/24**	**20/08/24**
7	3.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	2CC		0 días	20/08/24	20/08/24
8	3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO B O C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COB	$ 0,00	2CC		0 días	20/08/24	20/08/24
9	3.3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 659.811,00**			**3 días**	**13/09/24**	**17/09/24**
10	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 659.811,00	18	43	3 días	13/09/24	17/09/24
11	3.4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.584.443,00**			**3 días**	**22/08/24**	**26/08/24**
12	3.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 871.243,00	20CC	15CC+2 días	3 días	22/08/24	26/08/24
13	3.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	20CC	15CC+2 días;47	3 días	22/08/24	26/08/24
14	3.5	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 671.750,00**			**5 días**	**24/08/24**	**30/08/24**
15	3.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFEC	$ 671.750,00	12CC+2 días;13CC+2	19	5 días	24/08/24	30/08/24
16	3.6	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 23.042.854,00**			**18 días**	**22/08/24**	**13/09/24**
17	3.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 2.470.911,00	20;31;48	18	6 días	29/08/24	5/09/24
18	3.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 9.492.900,00	17	10	6 días	5/09/24	13/09/24

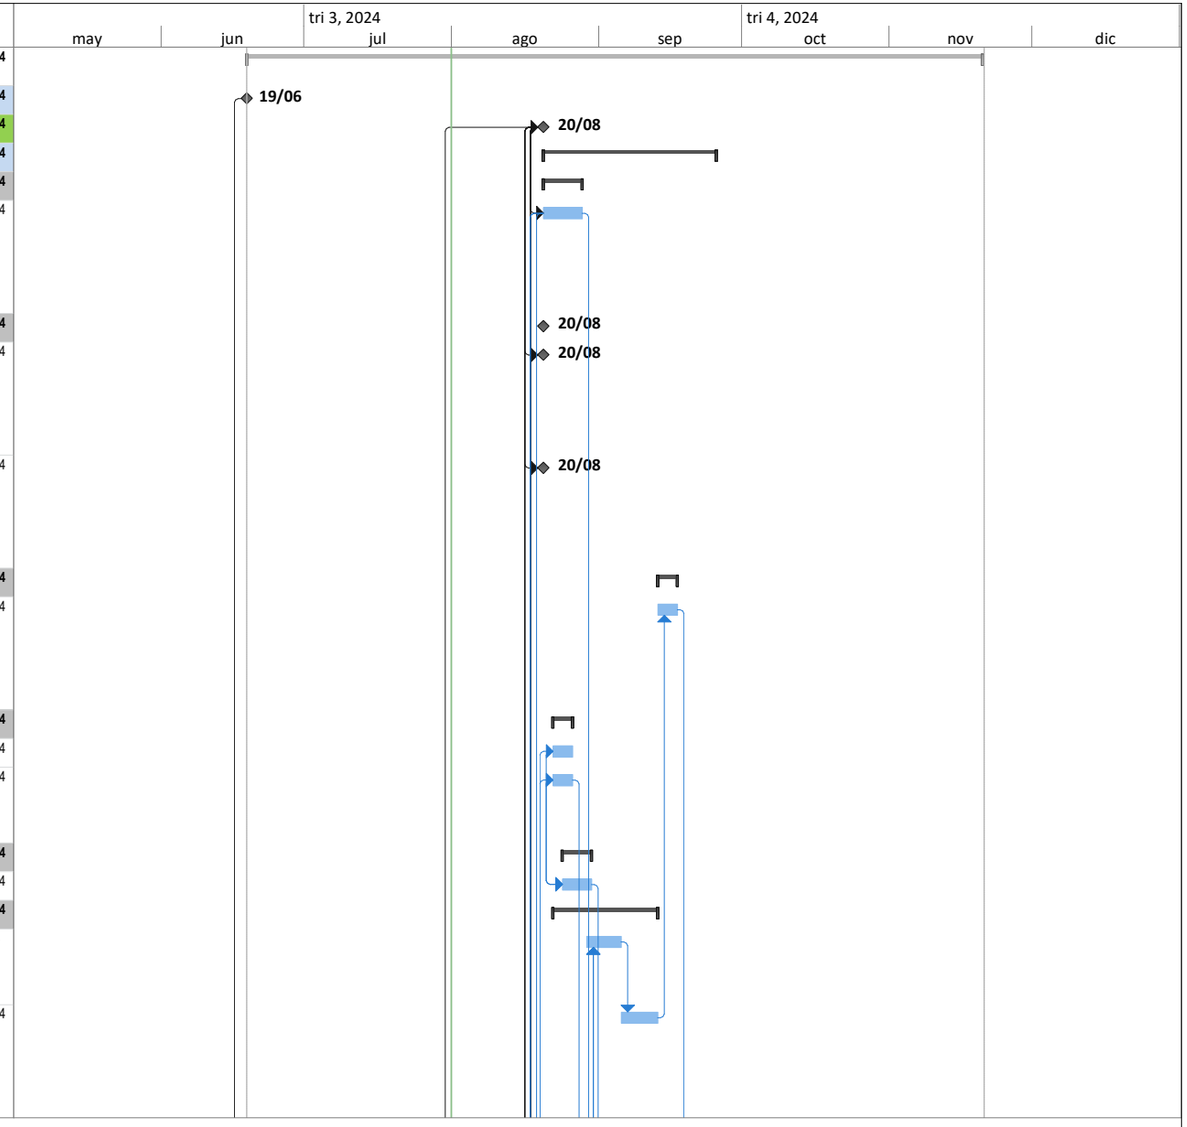

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only		


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
19	3.6.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 3.683.827,00	15	40;33	6 días	30/08/24	6/09/24
20	3.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 7.395.216,00	5CC+2 días	17;30CC;42CC;12	6 días	22/08/24	29/08/24
21	**3.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 61.360,00**			**3 días**	**20/08/24**	**23/08/24**
22	3.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 61.360,00	5CC	50	3 días	20/08/24	23/08/24
23	**3.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 286.194,00**			**11 días**	**20/08/24**	**2/09/24**
24	3.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 138.465,00	38	28CC	2 días	29/08/24	31/08/24
25	3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	2CC		0 días	20/08/24	20/08/24
26	3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	2CC		0 días	20/08/24	20/08/24
27	3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	2CC		0 días	20/08/24	20/08/24
28	3.8.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	24CC	50	3 días	29/08/24	2/09/24
29	**3.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 406.922,00**			**6 días**	**22/08/24**	**29/08/24**
30	3.9.1	SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 78.762,00	20CC	50	4 días	22/08/24	27/08/24
31	3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	$ 328.160,00	42CC+2 días	17	4 días	24/08/24	29/08/24
32	**3.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 1.508.732,00**			**6 días**	**6/09/24**	**14/09/24**
33	3.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 3.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 1.038.875,00	19	34	3 días	6/09/24	11/09/24
34	3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 469.857,00	33	50	3 días	11/09/24	14/09/24
35	**3.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.104.520,00**			**8 días**	**20/08/24**	**29/08/24**
36	3.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 431.879,00	5CC	37CC	5 días	20/08/24	26/08/24
37	3.11.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO	$ 431.879,00	36CC	38	5 días	20/08/24	26/08/24

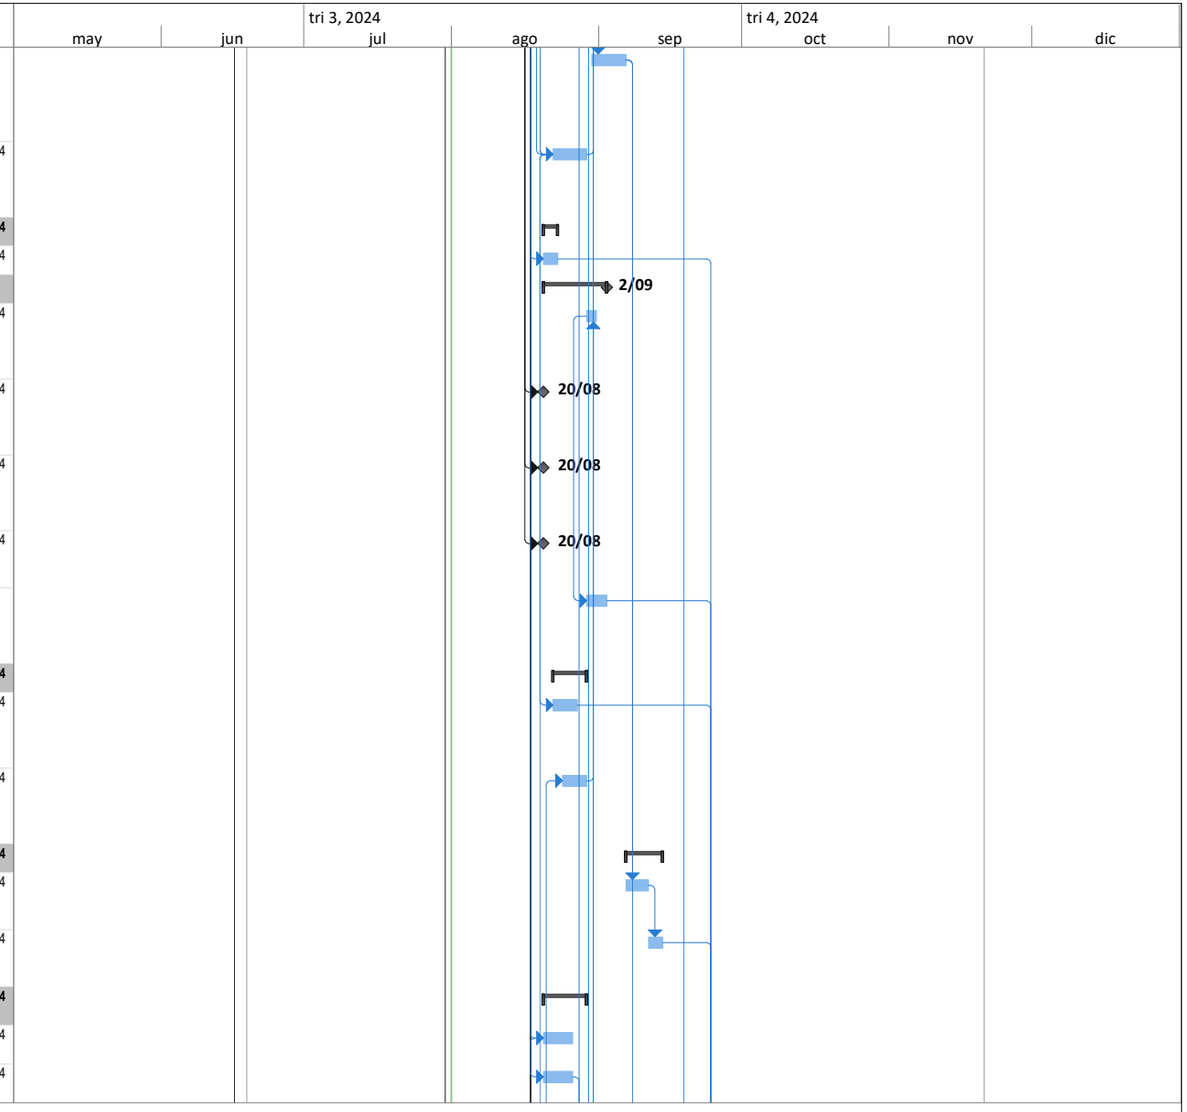

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
38	3.11.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 240.762,00	37	24	3 días	26/08/24	29/08/24
39	**3.12**	**SEGURIDAD**	**$ 403.721,00**			**2 días**	**6/09/24**	**10/09/24**
40	3.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 403.721,00	19	50	2 días	6/09/24	10/09/24
41	**3.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 10.360.938,00**			**28 días**	**22/08/24**	**25/09/24**
42	3.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK 18 RU (90x60X60)	$ 838.249,00	20CC	31CC+2 días	5 días	22/08/24	28/08/24
43	3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 9.125.255,00	10	44;45	3 días	17/09/24	20/09/24
44	3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA 29X85X2MT. 6 ENTRE-PAÑOS.	$ 328.468,00	43	50	3 días	20/09/24	24/09/24
45	3.13.4	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	$ 68.966,00	43	50	4 días	20/09/24	25/09/24
46	**3.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 1.935.093,00**			**13 días**	**20/08/24**	**4/09/24**
47	3.14.1	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 119.732,00	13	50	3 días	26/08/24	29/08/24
48	3.14.2	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 1.029.066,00	2CC	17	8 días	20/08/24	29/08/24
49	3.14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 786.295,00	5	50	6 días	28/08/24	4/09/24
50	**4**	**FIN CHALAN**	**$ 0,00**	**28;30;49;44;45;22;40**	**122**	**0 días**	**25/09/24**	**25/09/24**
51	**5**	**INICIO PALMITO**	**$ 0,00**	**2CC+15 días**	**73CC;276CC+5 di**	**0 días**	**6/09/24**	**6/09/24**
52	**6**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**	**$ 74.833.103,00**			**57 días**	**6/09/24**	**20/11/24**
53	**6.1**	**CUBIERTA**	**$ 6.574.892,00**			**14 días**	**6/09/24**	**24/09/24**
54	6.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 637.430,00	51CC	55CC	12 días	6/09/24	21/09/24
55	6.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.410.027,00	54CC	59CC;75CC;56CC	6 días	6/09/24	14/09/24
56	6.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.085.258,00	55CC	57	7 días	6/09/24	16/09/24
57	6.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 3.442.177,00	56	120	7 días	16/09/24	24/09/24
58	**6.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.353.514,00**			**7 días**	**6/09/24**	**16/09/24**

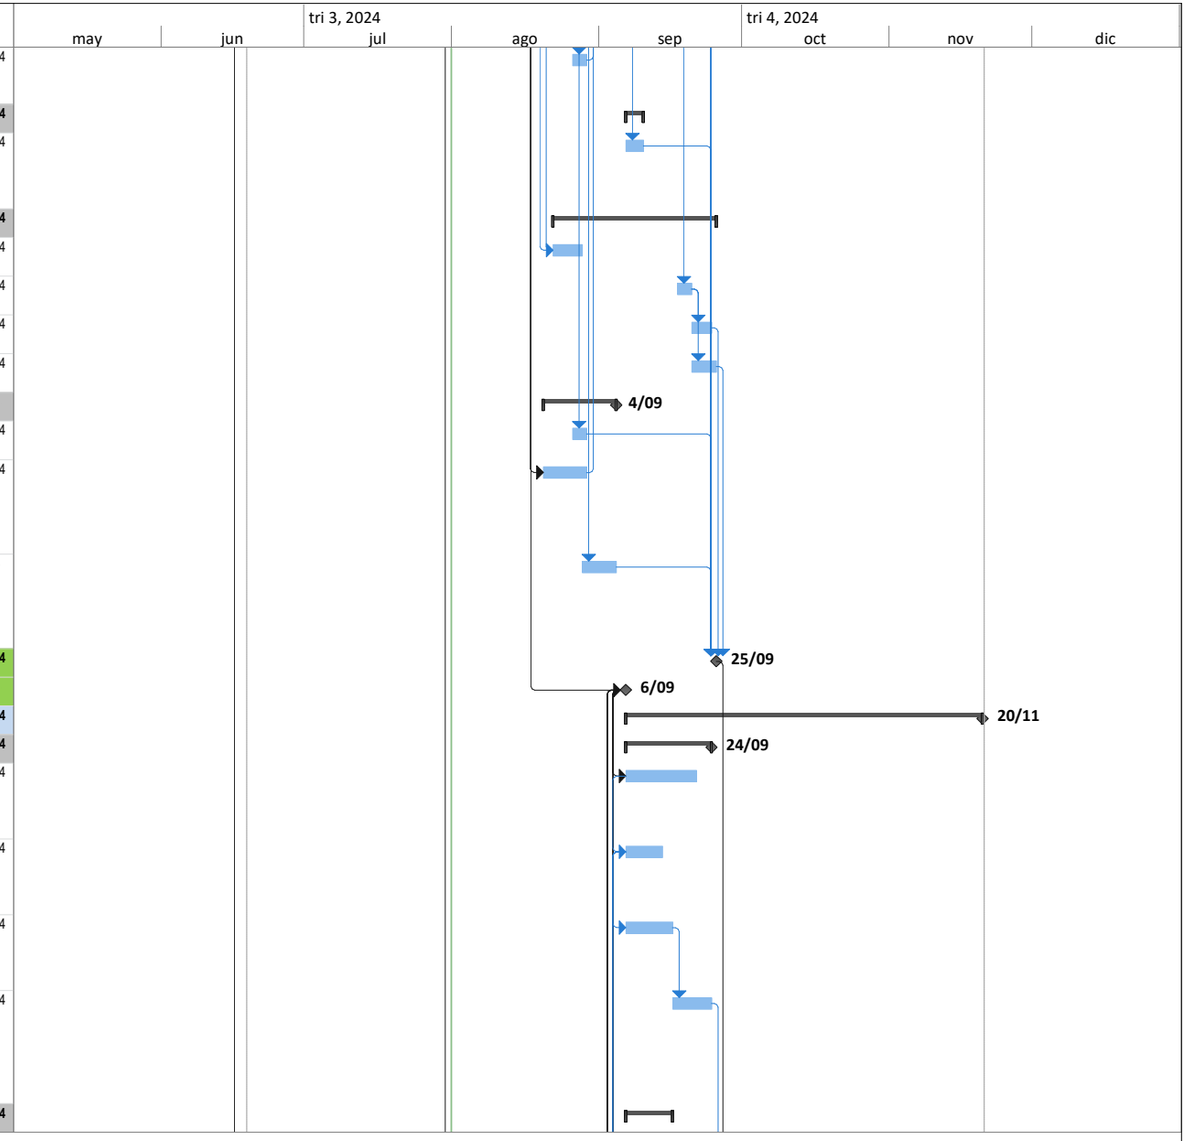

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
59	6.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 864.585,00	55CC	60CC	7 días	6/09/24	16/09/24
60	6.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 488.929,00	59CC	89CC	4 días	6/09/24	12/09/24
61	**6.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**			**2 días**	**4/10/24**	**7/10/24**
62	6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 384.890,00	71	87	2 días	4/10/24	7/10/24
63	**6.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 880.917,00**			**6 días**	**14/09/24**	**21/09/24**
64	6.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 461.246,00	73	65CC	3 días	14/09/24	18/09/24
65	6.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 220.309,00	64CC	66	3 días	14/09/24	18/09/24
66	6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO LAMINADO EN PUERTA	$ 199.362,00	65	87	3 días	18/09/24	21/09/24
67	**6.5**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 354.571,00**			**2 días**	**16/09/24**	**18/09/24**
68	6.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 354.571,00	119CC	72;83CC+2 días	2 días	16/09/24	18/09/24
69	**6.6**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 10.363.554,00**			**22 días**	**6/09/24**	**4/10/24**
70	6.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, RESANES, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 1.787.202,00	73	71	8 días	14/09/24	24/09/24
71	6.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 5.133.647,00	70	62	8 días	24/09/24	4/10/24
72	6.6.3	PINTURA ESMALTE EXTERIOR COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CON PREVIA CAPA ANTICORROSIVA PARA PASAMANOS Y PROTECTORES DE VENTANAS EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE RASPADA, RESANES, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRE	$ 293.954,00	68	87;92	8 días	18/09/24	27/09/24

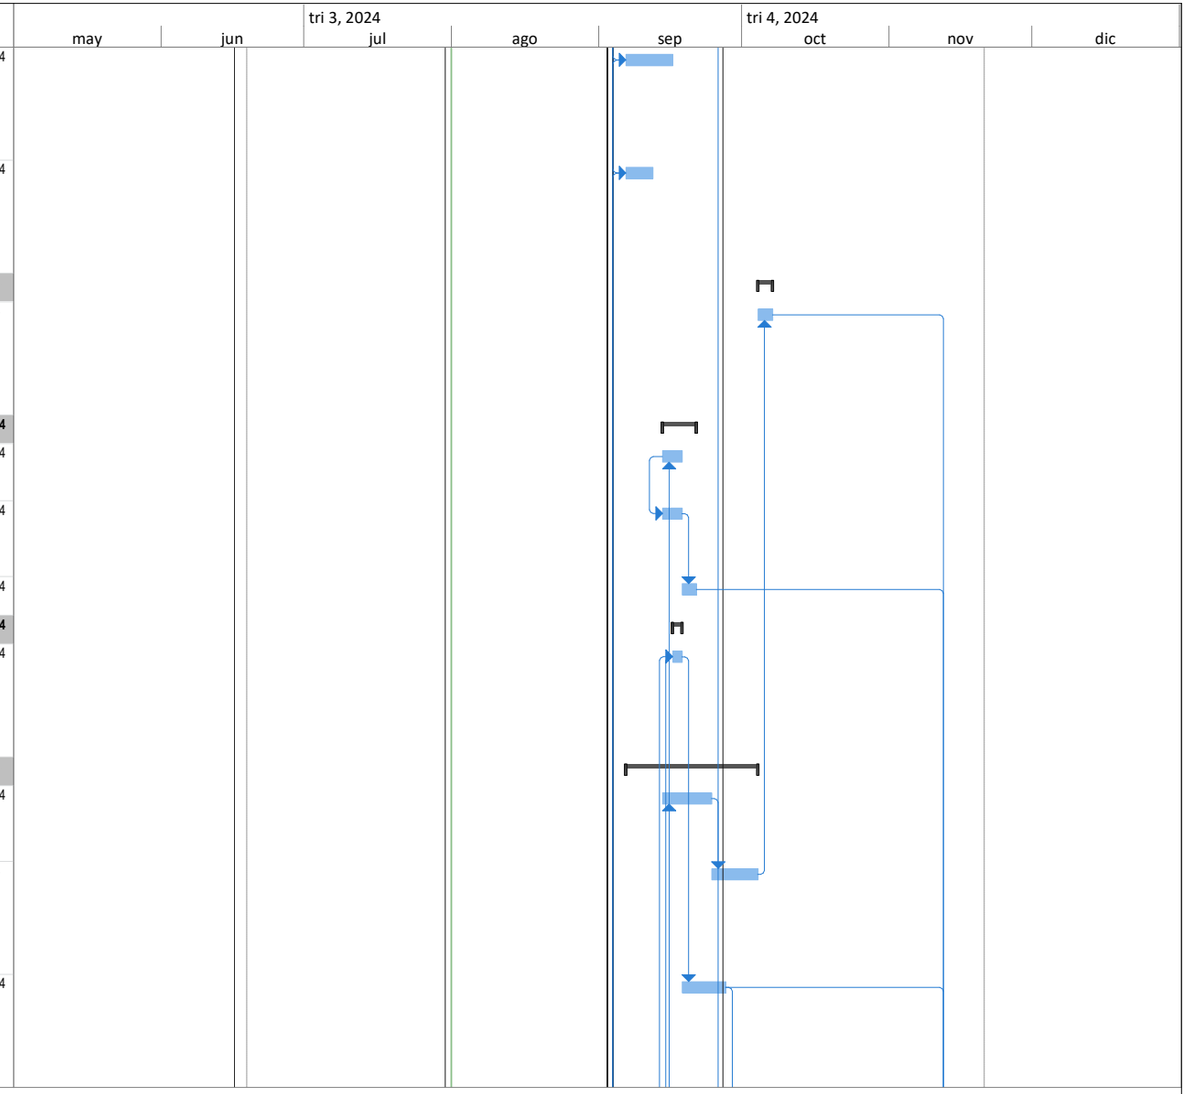

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
73	6.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.148.751,00	51CC	70;64;108CC;109	6 días	6/09/24	14/09/24
74	**6.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 1.047.551,00**			**4 días**	**6/09/24**	**12/09/24**
75	6.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 80.245,00	55CC	76CC	4 días	6/09/24	12/09/24
76	6.7.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	$ 967.306,00	75CC	87	4 días	6/09/24	12/09/24
77	**6.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 55.386,00**			**12 días**	**6/09/24**	**21/09/24**
78	6.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 55.386,00	90	87	4 días	17/09/24	21/09/24
79	6.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	51CC		0 días	6/09/24	6/09/24
80	6.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	51CC		0 días	6/09/24	6/09/24
81	6.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	51CC		0 días	6/09/24	6/09/24
82	**6.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 712.189,00**			**5 días**	**18/09/24**	**24/09/24**
83	6.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 30X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 333.200,00	68CC+2 días	84CC	3 días	18/09/24	21/09/24
84	6.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 51.952,00	83CC	85CC	5 días	18/09/24	24/09/24
85	6.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP 65 " INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	$ 327.037,00	84CC	87	5 días	18/09/24	24/09/24
86	**6.10**	**JARDINERIA VERTICAL EN FACHADA**	**$ 600.354,00**			**7 días**	**12/11/24**	**20/11/24**
87	6.10.1	PLANTAS ARTIFICALES PARA JARDIN VERTICAL	$ 600.354,00	120;85;105;72;66;62;121		7 días	12/11/24	20/11/24
88	**6.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.640,00**			**8 días**	**6/09/24**	**17/09/24**
89	6.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	$ 431.878,00	60CC	90	4 días	6/09/24	12/09/24
90	6.11.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 240.762,00	89	78	4 días	12/09/24	17/09/24
91	**6.12**	**SEGURIDAD**	**$ 3.897.417,00**			**5 días**	**27/09/24**	**4/10/24**
92	6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 3.897.417,00	72	87	5 días	27/09/24	4/10/24
93	**6.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 32.321.611,00**			**50 días**	**6/09/24**	**12/11/24**
94	6.13.1	PODA ARBOL VECINO	$ 0,00	51CC		0 días	6/09/24	6/09/24

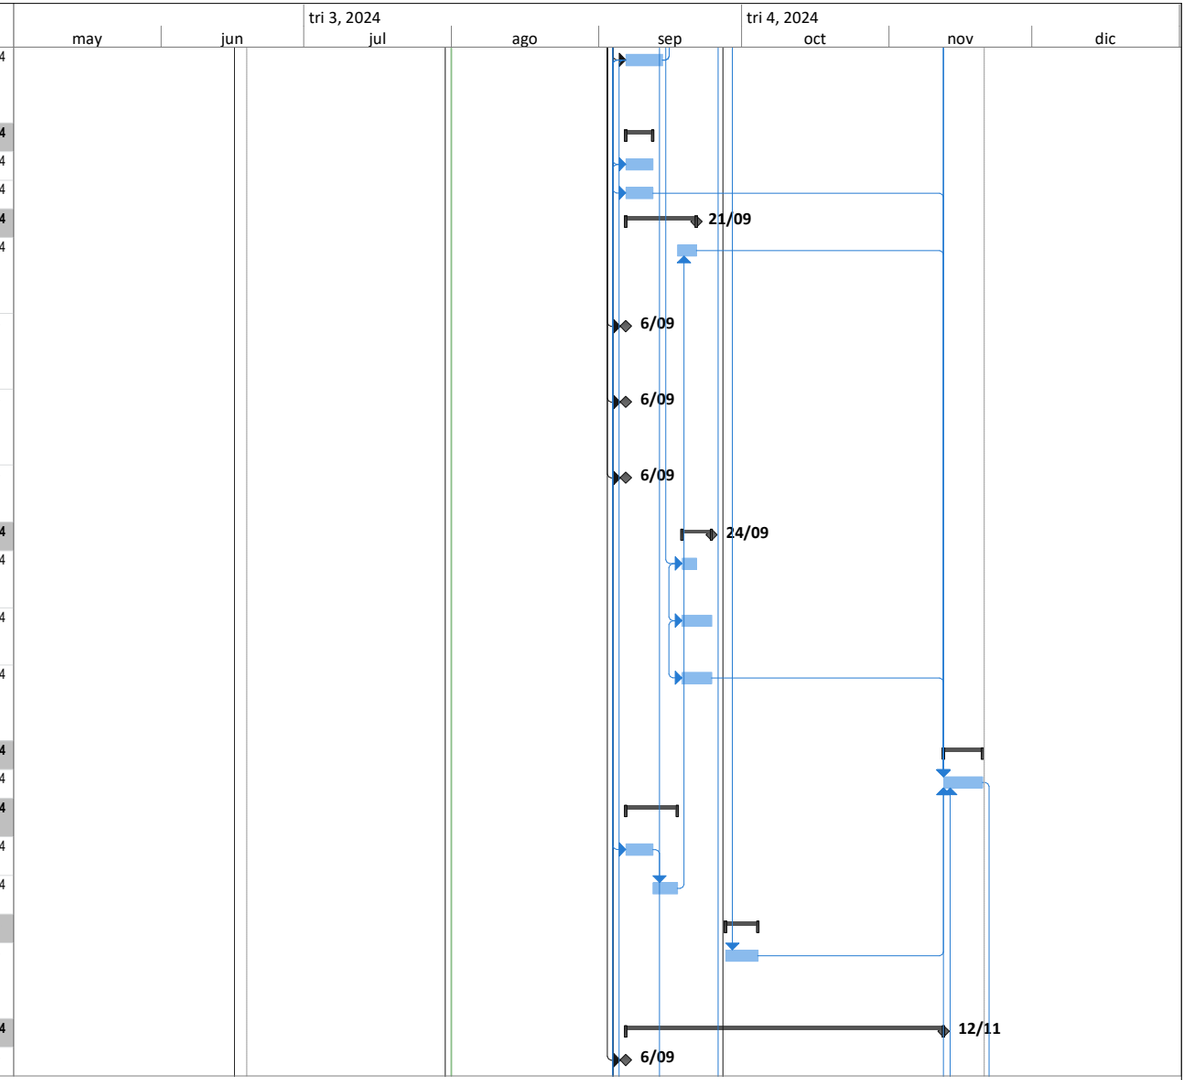

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
95	6.13.2	LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE CERRAMIENTO EN PATIO CON APLICACION DE DETERGENTE ANTIHONGOS (ALGUICIDAS) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 544.873,00	51CC	96CC+2 días	7 días	6/09/24	16/09/24
96	6.13.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 654.134,00	95CC+2 días	97	5 días	10/09/24	16/09/24
97	6.13.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 1.138.197,00	96	98	6 días	16/09/24	23/09/24
98	6.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MEJORADO CON CEMENTO	$ 151.991,00	97	100	3 días	23/09/24	26/09/24
99	6.13.6	SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	$ 9.546.623,00	100	101	9 días	2/10/24	12/10/24
100	6.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 17,5 MPa (2500 PSI) HECHO EN	$ 1.093.813,00	98	99	4 días	26/09/24	2/10/24
101	6.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA FONDO DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 6.665.665,00	99	102	5 días	12/10/24	21/10/24
102	6.13.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA MUROS DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 4.847.756,00	101	103;117CC	5 días	21/10/24	26/10/24
103	6.13.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA LOSA SUPERIOR DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 1.136.193,00	102	104	4 días	26/10/24	31/10/24
104	6.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 28MPa (4000 PSI) CON BORDES EN ÁNGULO DE 2"X2" Y REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE MEDIDAS 1,70mX1,70m, INCLUYES BISAGRAS DE SEGURIDAD Y GANCHOS DE APERTURA.	$ 804.522,00	103	105;114	4 días	31/10/24	6/11/24
105	6.13.12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO DOSIFICACIÓN 1:4	$ 5.737.844,00	104	87	3 días	7/11/24	12/11/24
106	**6.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 15.613.617,00**			**57 días**	**6/09/24**	**20/11/24**
107	6.14.1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .10 X .20.	$ 2.305.314,00	108	118CC	7 días	16/09/24	24/09/24
108	6.14.2	DEMOLICION DE VIGAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE .10 X .20.	$ 597.455,00	73CC	107;112	7 días	6/09/24	16/09/24
109	6.14.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	$ 1.198.513,00	73CC	110	7 días	6/09/24	16/09/24
110	6.14.4	CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	$ 349.449,00	109	111CC	6 días	16/09/24	23/09/24
111	6.14.5	CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	$ 779.844,00	110CC	121	5 días	16/09/24	21/09/24
112	6.14.6	TRASIEGO (MATERIAL SOBRANTE Y MATERIAL DE CONSTRUCCION)	$ 1.167.069,00	108	113	5 días	16/09/24	21/09/24
113	6.14.7	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	$ 1.639.743,00	112	121	5 días	21/09/24	27/09/24
114	6.14.8	CASETA PARA ELECTROBOMBA DE 0,6 X 0,6 X 0,6 DIMENCIONES INTERNAS (INCLUYE PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E = 8 CM Y PROTECTOR)	$ 563.557,00	104	115CC	8 días	7/11/24	18/11/24
115	6.14.9	SUMINISTRO E INSTALACIONDE ELECTROBOMBA DE 1/	$ 722.725,00	114CC	116	5 días	7/11/24	14/11/24
116	6.14.10	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 CM	$ 933.052,00	115	121	5 días	14/11/24	20/11/24
117	6.14.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$ 220.212,00	102CC	121	5 días	21/10/24	26/10/24

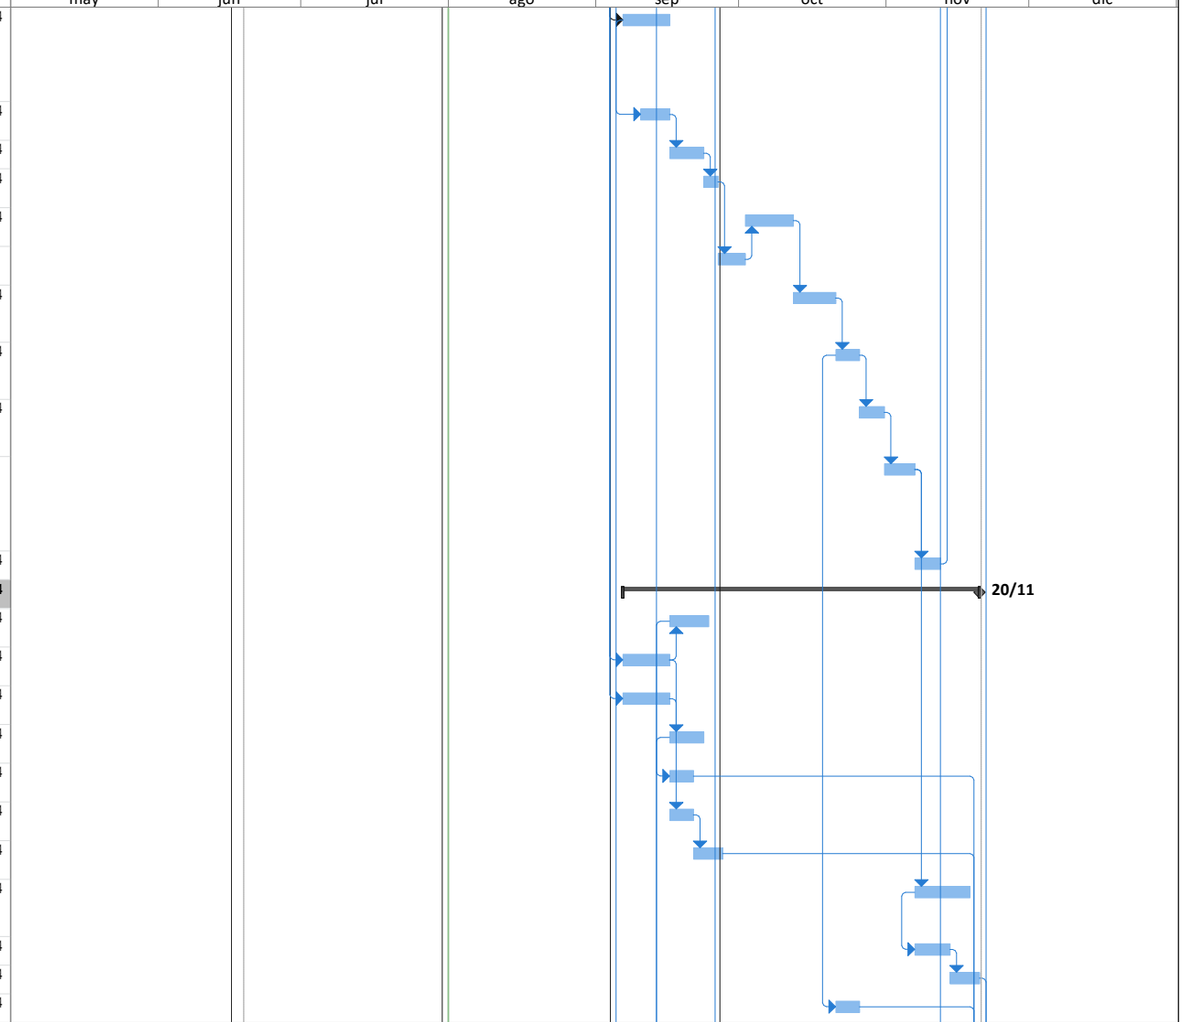

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only		


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
118	6.14.12	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 4.116.265,00	73CC;107CC	119CC	8 días	16/09/24	25/09/24
119	6.14.13	CIELO RASO PLANO EN PVC E=7MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	$ 234.124,00	118CC	68CC	8 días	16/09/24	25/09/24
120	6.14.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	57	87	8 días	24/09/24	4/10/24
121	**7**	**FIN PALMITO**	**$ 0,00**	**87;116;117;111;113**	**366**	**0 días**	**20/11/24**	**20/11/24**
122	**8**	**INICIO SAMPUES**	**$ 0,00**	**50**	**125CC;129CC;14**	**0 días**	**25/09/24**	**25/09/24**
123	**9**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUÉS**	**$ 37.518.164,00**			**19 días**	**25/09/24**	**21/10/24**
124	**9.1**	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.901.691,00**			**9 días**	**25/09/24**	**7/10/24**
125	9.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 401.500,00	122CC	126CC	8 días	25/09/24	5/10/24
126	9.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 6.500.191,00	125CC	143CC;167FC+2 días;128CC	9 días	25/09/24	7/10/24
127	**9.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.152.780,00**			**3 días**	**25/09/24**	**30/09/24**
128	9.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 1.152.780,00	126CC	141CC+2 días;166	3 días	25/09/24	30/09/24
129	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 1	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
130	**9.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**			**2 días**	**11/10/24**	**15/10/24**
131	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 384.890,00	139	168	2 días	11/10/24	15/10/24
132	**9.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.462.842,00**			**6 días**	**27/09/24**	**5/10/24**
133	9.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 461.246,00	141CC	134CC	3 días	27/09/24	2/10/24
134	9.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 74.426,00	133CC	135	3 días	27/09/24	2/10/24

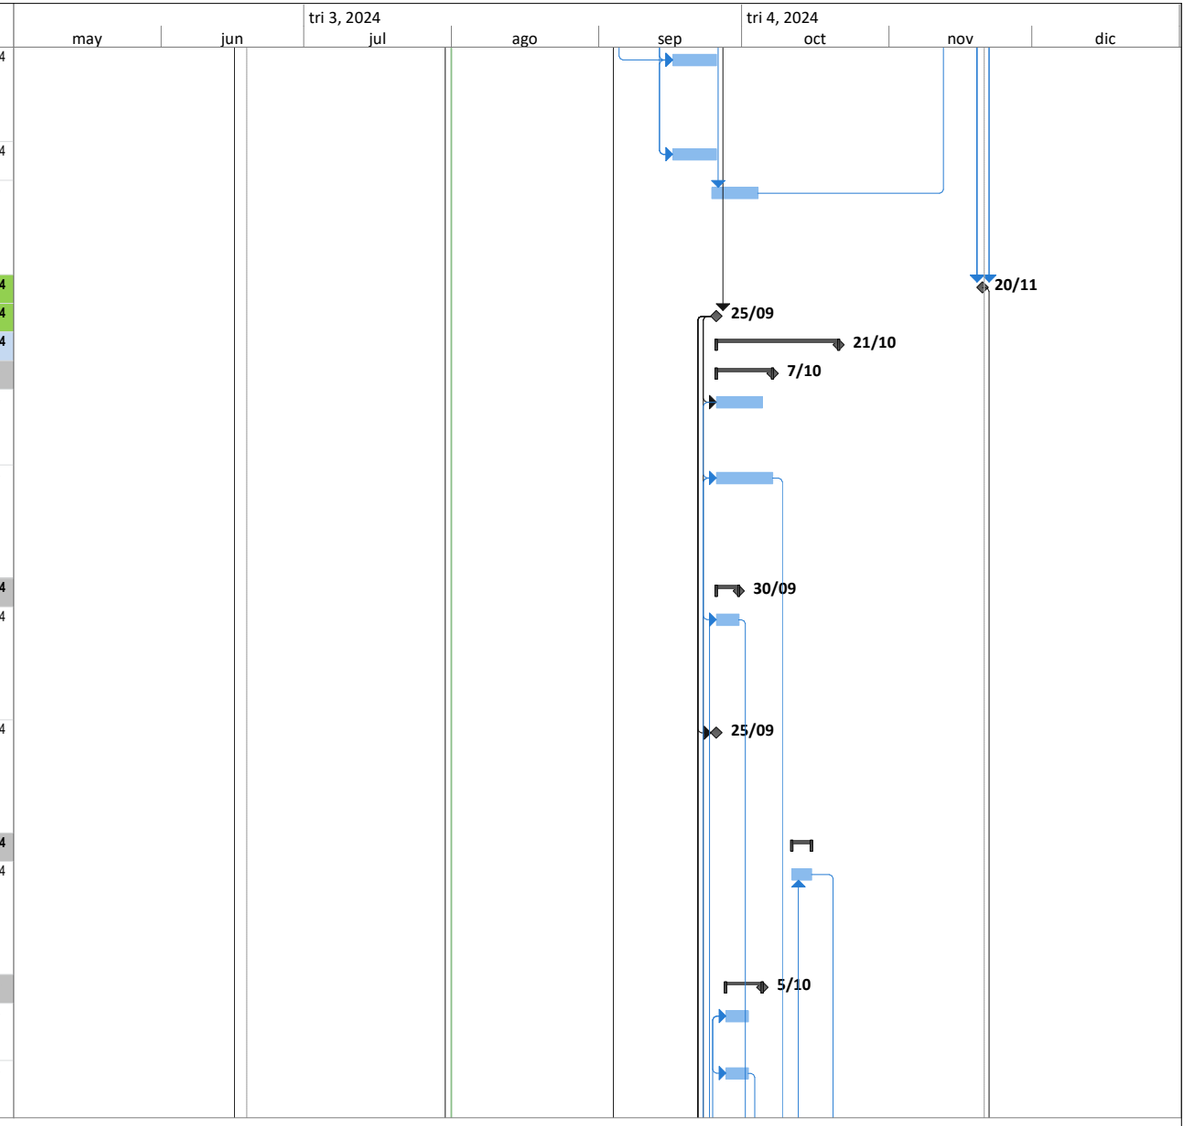

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline			
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress			
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual			
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only				


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
135	9.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	134	136CC	2 días	2/10/24	4/10/24
136	9.4.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD) DE PUERTA DE PATIO POSTERIOR INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 213.970,00	135CC	138	3 días	2/10/24	5/10/24
137	**9.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 16.677.810,00**			**17 días**	**27/09/24**	**21/10/24**
138	9.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 3.972.783,00	136	139CC	5 días	5/10/24	11/10/24
139	9.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 7.205.062,00	138CC	131;162;153CC	5 días	5/10/24	11/10/24
140	9.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.932.053,00	157	168	5 días	12/10/24	21/10/24
141	9.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.567.912,00	128CC+2 días	133CC	5 días	27/09/24	4/10/24
142	**9.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 95.415,00**			**4 días**	**25/09/24**	**1/10/24**
143	9.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 95.415,00	126CC	159CC+2 días	4 días	25/09/24	1/10/24
144	**9.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 1.254.210,00**			**19 días**	**25/09/24**	**21/10/24**
145	9.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
146	9.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
147	9.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
148	9.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
149	9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO BISELADO 2.0X1.5 SUPERPUESTO A PARED INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 411.849,00	165	168	3 días	16/10/24	21/10/24
150	9.7.6	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.	$ 103.718,00	159	151CC	3 días	7/10/24	10/10/24
151	9.7.7	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 738.643,00	150CC	165CC	3 días	7/10/24	10/10/24

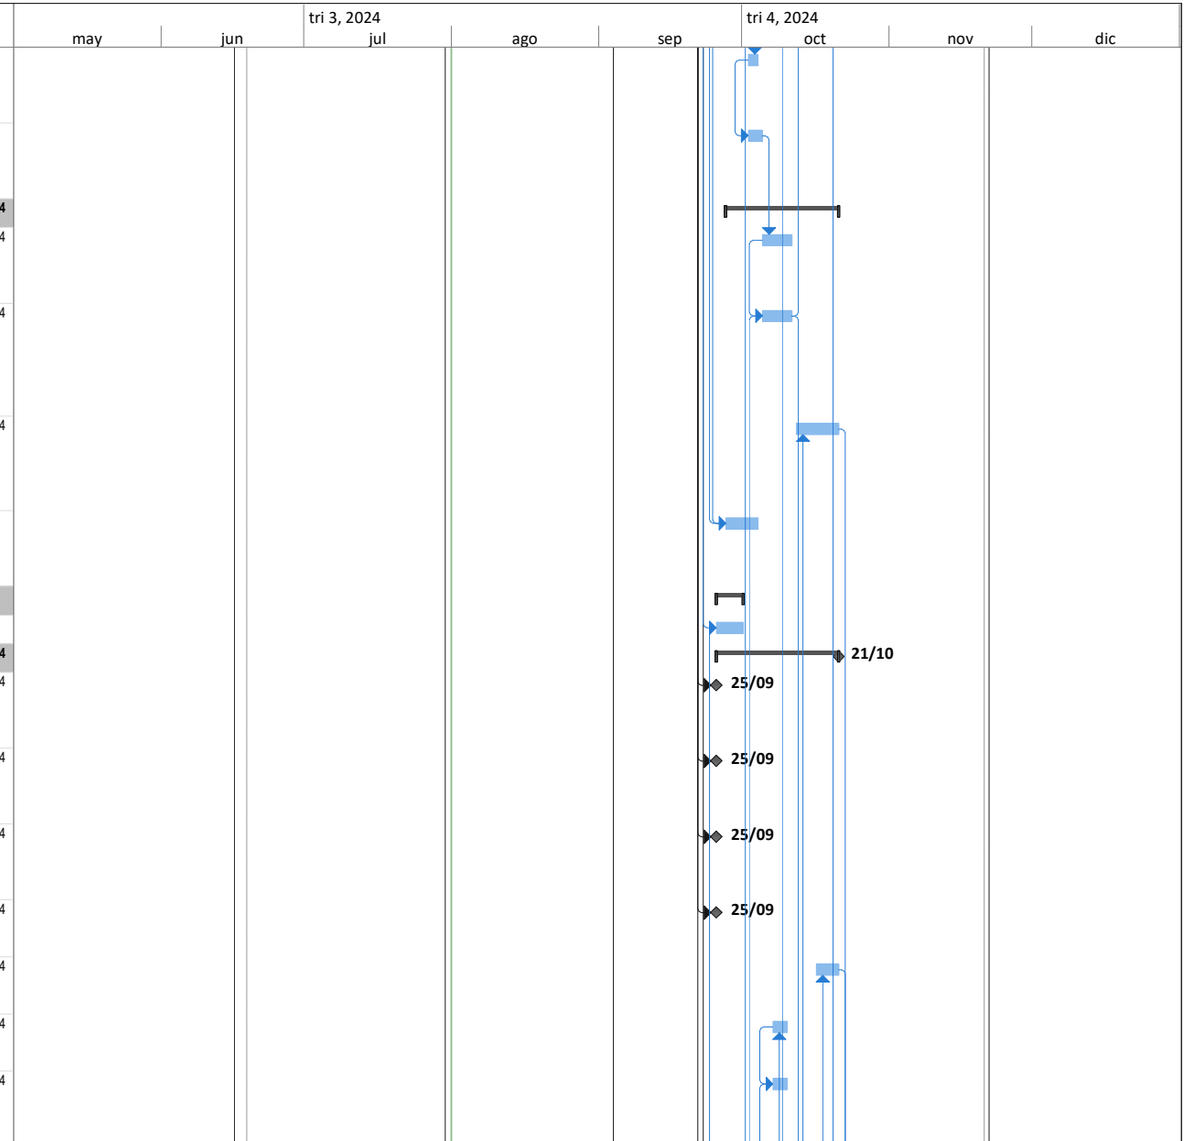

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
152	**9.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.762.209,00**			**6 días**	**5/10/24**	**12/10/24**
153	9.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 165.391,00	139CC	154CC	6 días	5/10/24	12/10/24
154	9.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 772.246,00	153CC	155CC	6 días	5/10/24	12/10/24
155	9.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 3" INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 92.277,00	154CC	156CC	6 días	5/10/24	12/10/24
156	9.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 463.656,00	155CC	157CC	6 días	5/10/24	12/10/24
157	9.8.5	MANTENIMIENTO DE SALIDAS ELECTRICA PARA LUMINARIAS LED 60X60	$ 268.639,00	156CC	140	6 días	5/10/24	12/10/24
158	**9.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 431.879,00**			**9 días**	**25/09/24**	**7/10/24**
159	9.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 431.879,00	143CC+2 días;164	150	4 días	2/10/24	7/10/24
160	9.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ 0,00	122CC		0 días	25/09/24	25/09/24
161	**9.10**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 161.789,00**			**2 días**	**11/10/24**	**15/10/24**
162	9.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 161.789,00	139	168	2 días	11/10/24	15/10/24
163	**9.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 5.232.649,00**			**17 días**	**25/09/24**	**17/10/24**
164	9.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 119.261,00	122CC	159	5 días	25/09/24	2/10/24
165	9.11.2	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.087.199,00	151CC	149	7 días	7/10/24	16/10/24
166	9.11.3	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 12.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAM	$ 1.239.894,00	128	168	5 días	30/09/24	5/10/24
167	9.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	126FC+2 días	168	6 días	9/10/24	17/10/24
168	**10**	**FIN SAMPUES**	**$ 0,00**	**167;166;149;131;162**	**366**	**0 días**	**21/10/24**	**21/10/24**
169	**11**	**INICIO SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**223CC+8 días**	**174CC;203CC;2C**	**0 días**	**2/08/24**	**2/08/24**
170	**12**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO ABAD**	**$ 40.030.034,00**			**75 días**	**2/08/24**	**7/11/24**
171	**12.1**	**CUBIERTA**	**$ 4.854.612,00**			**17 días**	**2/08/24**	**26/08/24**
172	12.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 4.408.273,00	174CC+2 días	173CC+5 días;221	14 días	5/08/24	24/08/24

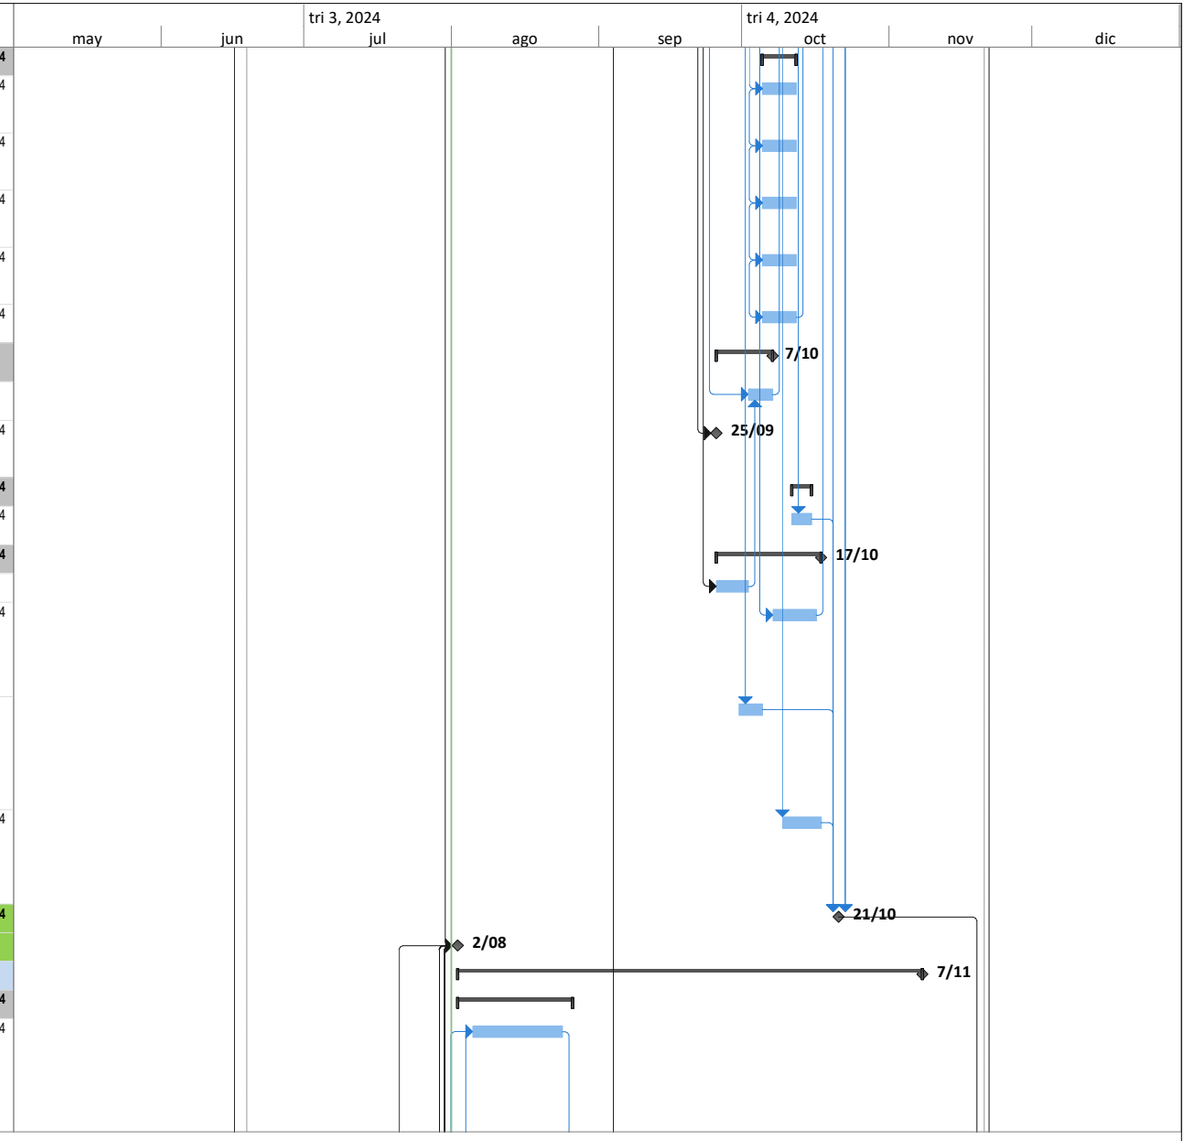

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
173	12.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 177.964,00	172CC+5 días	187	10 días	12/08/24	26/08/24
174	12.1.3	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	$ 268.375,00	169CC	172CC+2 días;189	10 días	2/08/24	15/08/24
175	**12.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**2/08/24**	**2/08/24**
176	12.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	169CC		0 días	2/08/24	2/08/24
177	12.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE. DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FA	$ 0,00	169CC		0 días	2/08/24	2/08/24
178	**12.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 494.858,00**			**6 días**	**15/10/24**	**23/10/24**
179	12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 494.858,00	185	222	6 días	15/10/24	23/10/24
180	**12.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.225.696,00**			**10 días**	**28/08/24**	**10/09/24**
181	12.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 512.496,00	220CC+2 días	182	5 días	28/08/24	3/09/24
182	12.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	181	184;215	5 días	3/09/24	10/09/24
183	**12.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 13.802.016,00**			**54 días**	**26/08/24**	**1/11/24**
184	12.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 2.475.236,00	182	185	14 días	10/09/24	26/09/24
185	12.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 6.455.062,00	184	186;179	14 días	26/09/24	15/10/24
186	12.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.364.067,00	185	208	14 días	15/10/24	1/11/24
187	12.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.507.651,00	173	220CC	12 días	26/08/24	10/09/24

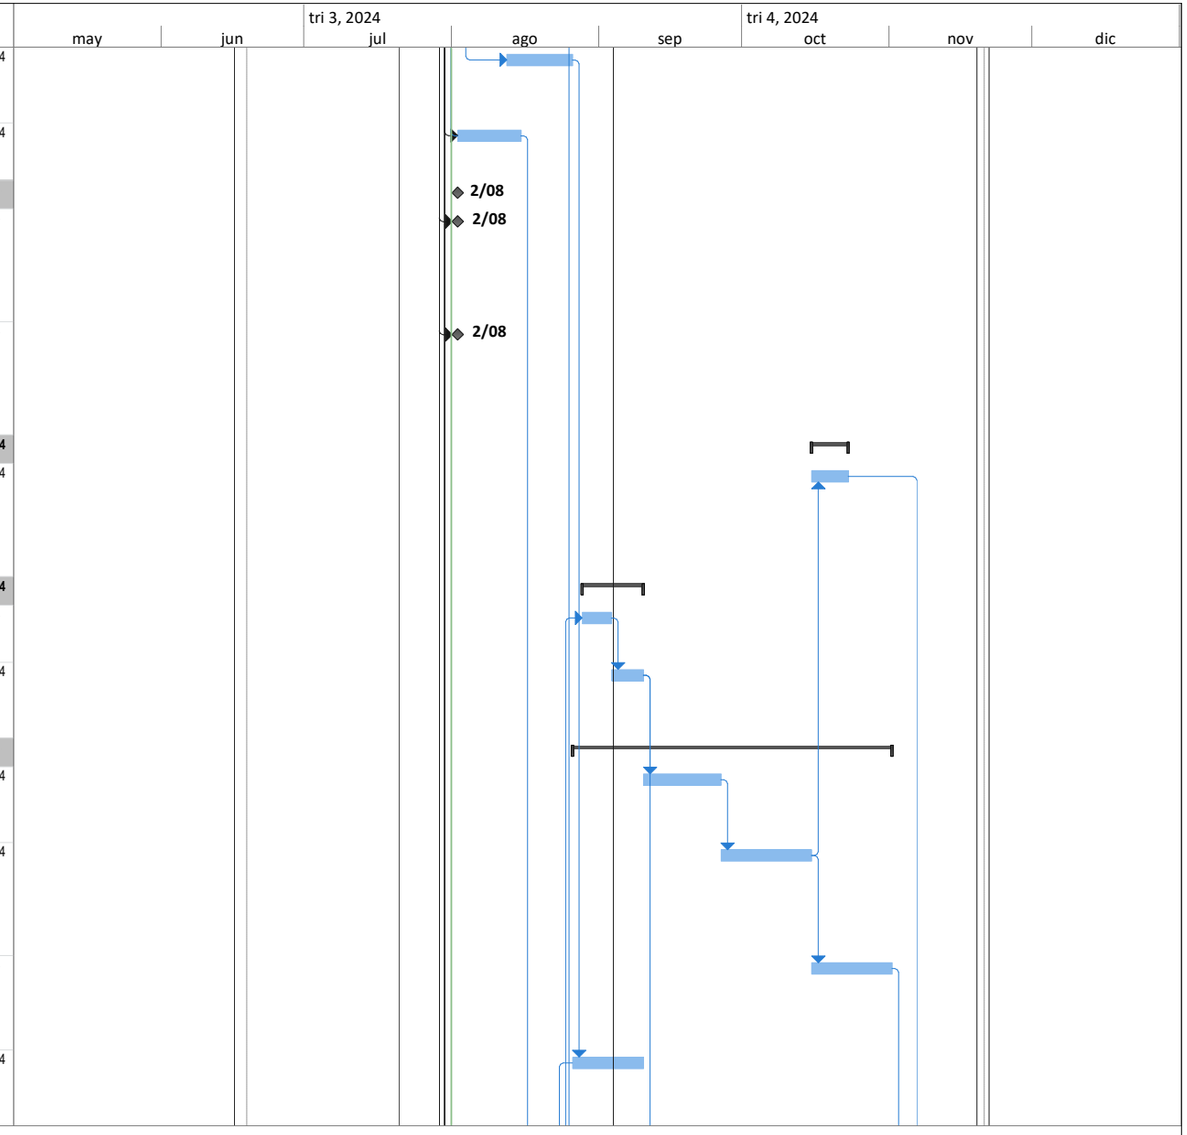

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
188	**12.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 128.873,00**			**7 días**	**15/08/24**	**26/08/24**
189	12.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 128.873,00	174	222	7 días	15/08/24	26/08/24
190	**12.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 541.961,00**			**14 días**	**2/08/24**	**22/08/24**
191	12.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 83.079,00	197CC	196CC	8 días	10/08/24	22/08/24
192	12.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	169CC		0 días	2/08/24	2/08/24
193	12.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	169CC		0 días	2/08/24	2/08/24
194	12.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	169CC		0 días	2/08/24	2/08/24
195	12.7.5	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA	$ 207.435,00	204	197CC	6 días	10/08/24	20/08/24
196	12.7.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	191CC	222	6 días	10/08/24	20/08/24
197	12.7.7	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA	$ 103.718,00	195CC	222;191CC	6 días	10/08/24	20/08/24
198	**12.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.484.435,00**			**3 días**	**26/08/24**	**29/08/24**
199	12.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 82.696,00	220CC	200CC	3 días	26/08/24	29/08/24
200	12.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 1.235.593,00	199CC	201CC	3 días	26/08/24	29/08/24
201	12.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 166.146,00	200CC	222	3 días	26/08/24	29/08/24
202	**12.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.641,00**			**6 días**	**2/08/24**	**10/08/24**
203	12.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 475 DE 2007)	$ 431.879,00	169CC	204CC+1 día	5 días	2/08/24	9/08/24
204	12.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 240.762,00	203CC+1 día	195	5 días	3/08/24	10/08/24
205	**12.10**	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA**	**$ 798.545,00**			**4 días**	**3/09/24**	**9/09/24**
206	12.10.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3 M.M (INCLUYE EXCAVACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUN	$ 798.545,00	220	222	4 días	3/09/24	9/09/24
207	**12.11**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 1.555.850,00**			**4 días**	**1/11/24**	**7/11/24**

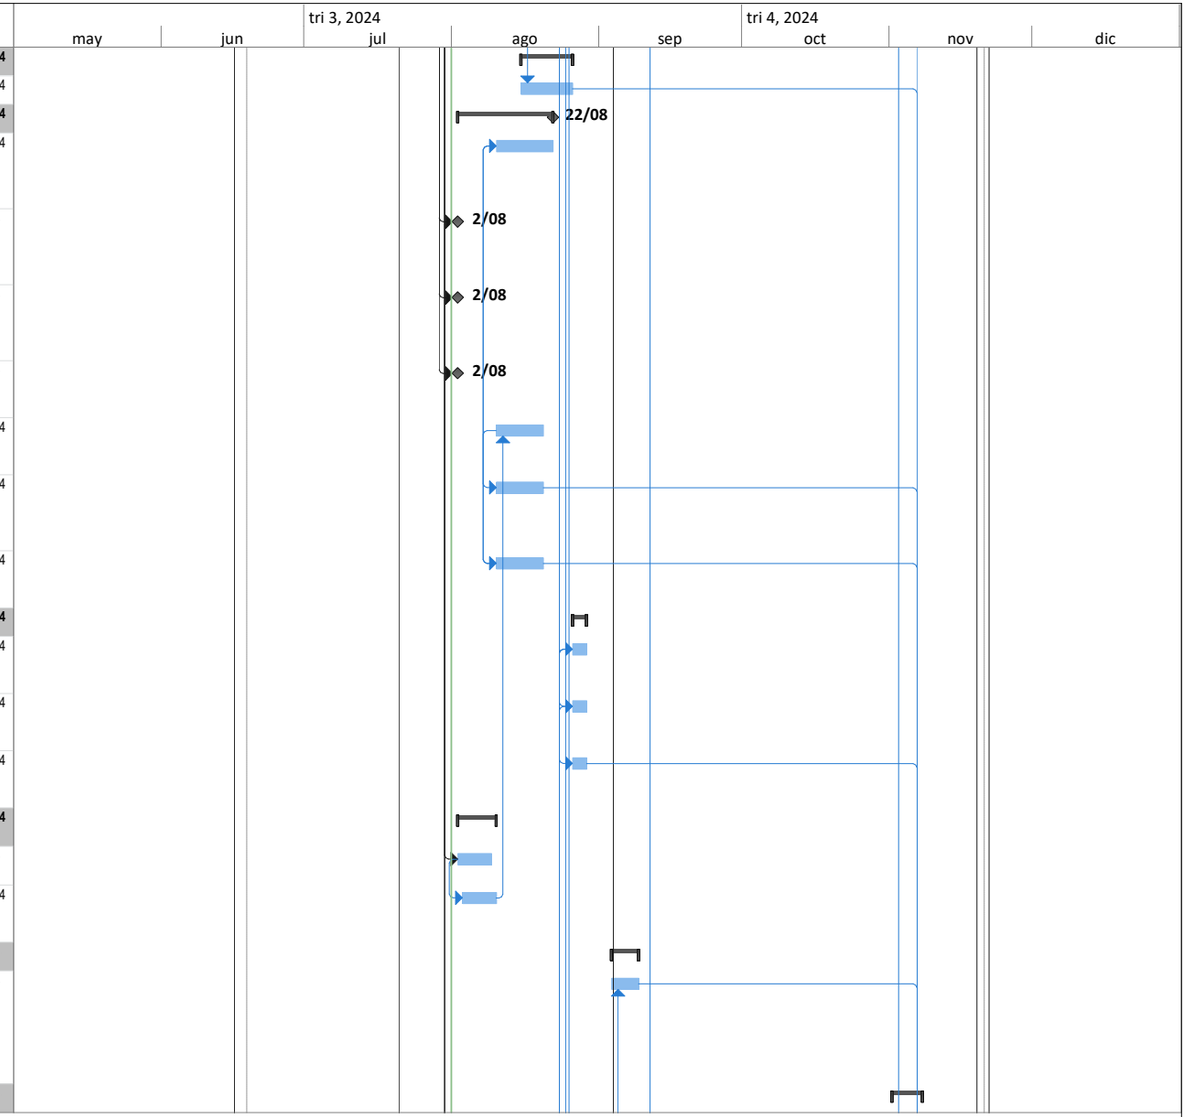

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
208	12.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 1.555.850,00	186	222	4 días	1/11/24	7/11/24
209	**12.12**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 500.506,00**			**10 días**	**2/08/24**	**15/08/24**
210	12.12.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 229.560,00	169CC	211	5 días	2/08/24	9/08/24
211	12.12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MEJORADO CON CEMENTO COMPACTADO	$ 270.946,00	210	222;216;219CC	5 días	9/08/24	15/08/24
212	**12.13**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 11.970.041,00**			**32 días**	**2/08/24**	**13/09/24**
213	12.13.1	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 194.510,00	221	222	4 días	31/08/24	5/09/24
214	12.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 457.373,00	169CC	222	5 días	2/08/24	9/08/24
215	12.13.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 776.314,00	182	222	3 días	10/09/24	13/09/24
216	12.13.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 2.252.718,00	211	217	6 días	15/08/24	24/08/24
217	12.13.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 1.076.014,00	216	218CC	6 días	24/08/24	31/08/24
218	12.13.6	ENCHAPE PARED 20 X 30 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 420.613,00	217CC	222	6 días	24/08/24	31/08/24
219	12.13.7	CUNETA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DESARROLLO 60 CM E=10 CM	$ 2.404.471,00	211CC	222	5 días	9/08/24	15/08/24
220	12.13.8	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.601.733,00	187CC	199CC;206;181CC	7 días	26/08/24	3/09/24
221	12.13.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	172	213	6 días	24/08/24	31/08/24
222	**13**	**FIN SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**208;206;201;197;179**	**366**	**0 días**	**7/11/24**	**7/11/24**
223	**14**	**INICIO CAIMITO**	**$ 0,00**	**323CC+2 días**	**228CC;242CC;26**	**0 días**	**23/07/24**	**23/07/24**
224	**15**	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**	**$ 59.172.673,00**			**21 días**	**23/07/24**	**21/08/24**
225	**15.1**	**CUBIERTA**	**$ 7.325.932,00**			**17 días**	**23/07/24**	**14/08/24**
226	15.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAL EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCC	$ 2.721.848,00	228	274CC+3 días	9 días	2/08/24	14/08/24
227	15.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 0,00	223CC		0 días	23/07/24	23/07/24
228	15.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.945.837,00	223CC	226;229	8 días	23/07/24	2/08/24
229	15.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.658.247,00	228	275	7 días	2/08/24	12/08/24

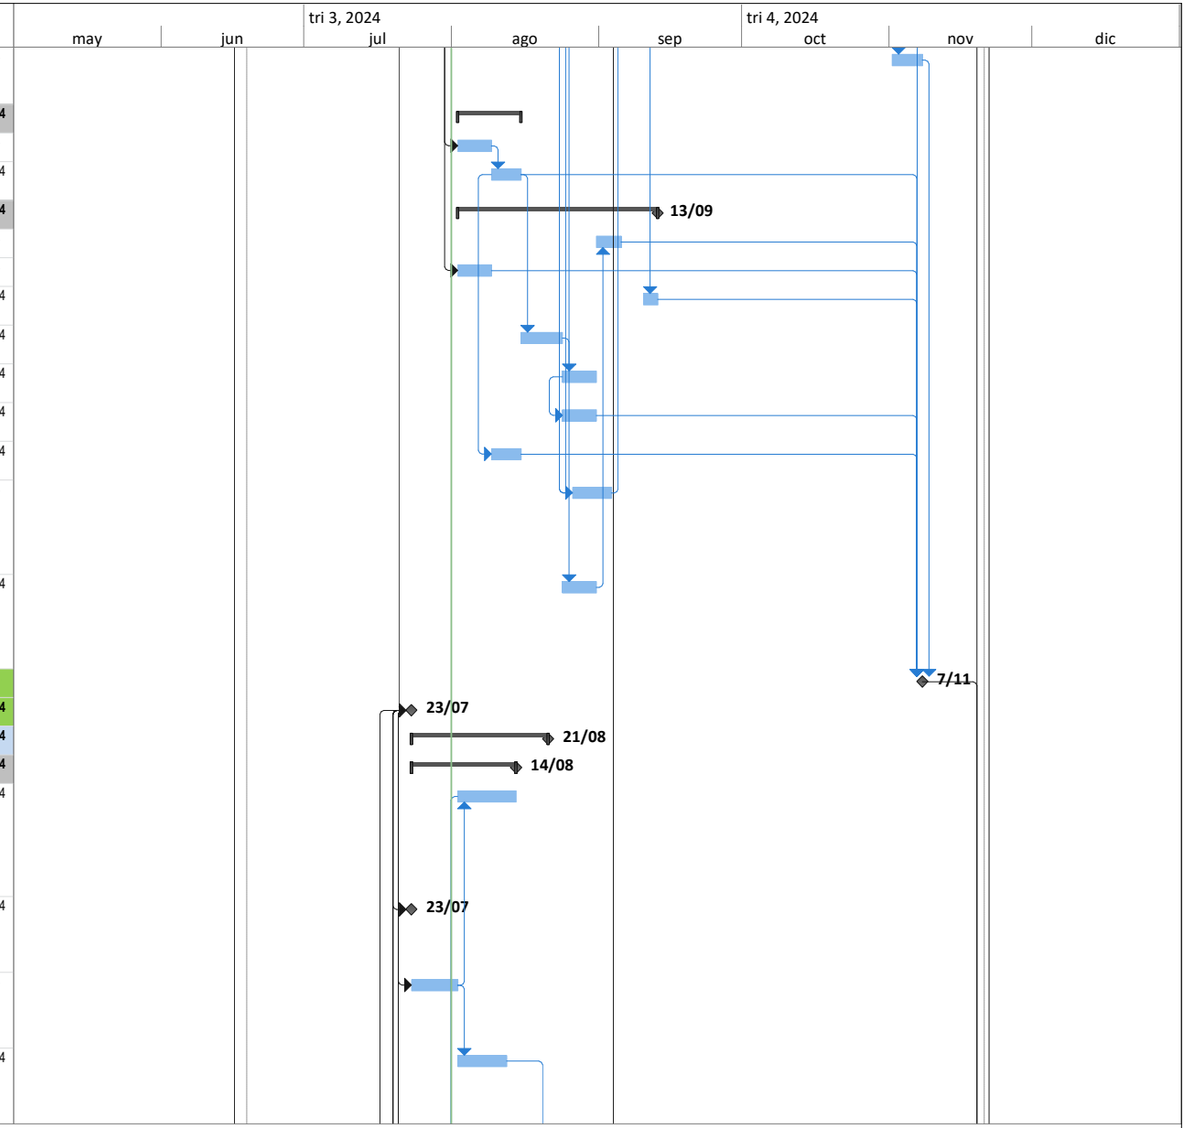

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progreso manual
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
230	**15.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**23/07/24**	**23/07/24**
231	15.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	223CC		0 días	23/07/24	23/07/24
232	**15.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 549.842,00**			**2 días**	**13/08/24**	**15/08/24**
233	15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 549.842,00	240	275	2 días	13/08/24	15/08/24
234	**15.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.528.915,00**			**3 días**	**1/08/24**	**5/08/24**
235	15.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 220.309,00	237CC	236CC	3 días	1/08/24	5/08/24
236	15.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTADE ACCESO A DEPENDENCIAS EN MADERA ENTAMBORADA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 595.406,00	235CC	239;244	3 días	1/08/24	5/08/24
237	15.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	273	235CC;269	3 días	1/08/24	5/08/24
238	**15.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 15.036.413,00**			**17 días**	**23/07/24**	**14/08/24**
239	15.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 4.003.343,00	236	240CC	5 días	5/08/24	12/08/24
240	15.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 6.314.703,00	239CC	233	6 días	5/08/24	13/08/24
241	15.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.897.965,00	257	275	4 días	9/08/24	14/08/24
242	15.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.820.402,00	223CC	273CC;271	8 días	23/07/24	2/08/24
243	**15.6**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 4.148.934,00**			**4 días**	**5/08/24**	**10/08/24**
244	15.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 4.148.934,00	236	275	4 días	5/08/24	10/08/24
245	**15.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 361.190,00**			**8 días**	**23/07/24**	**2/08/24**
246	15.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 109.743,00	260CC+2 días;264CC	247	2 días	25/07/24	29/07/24

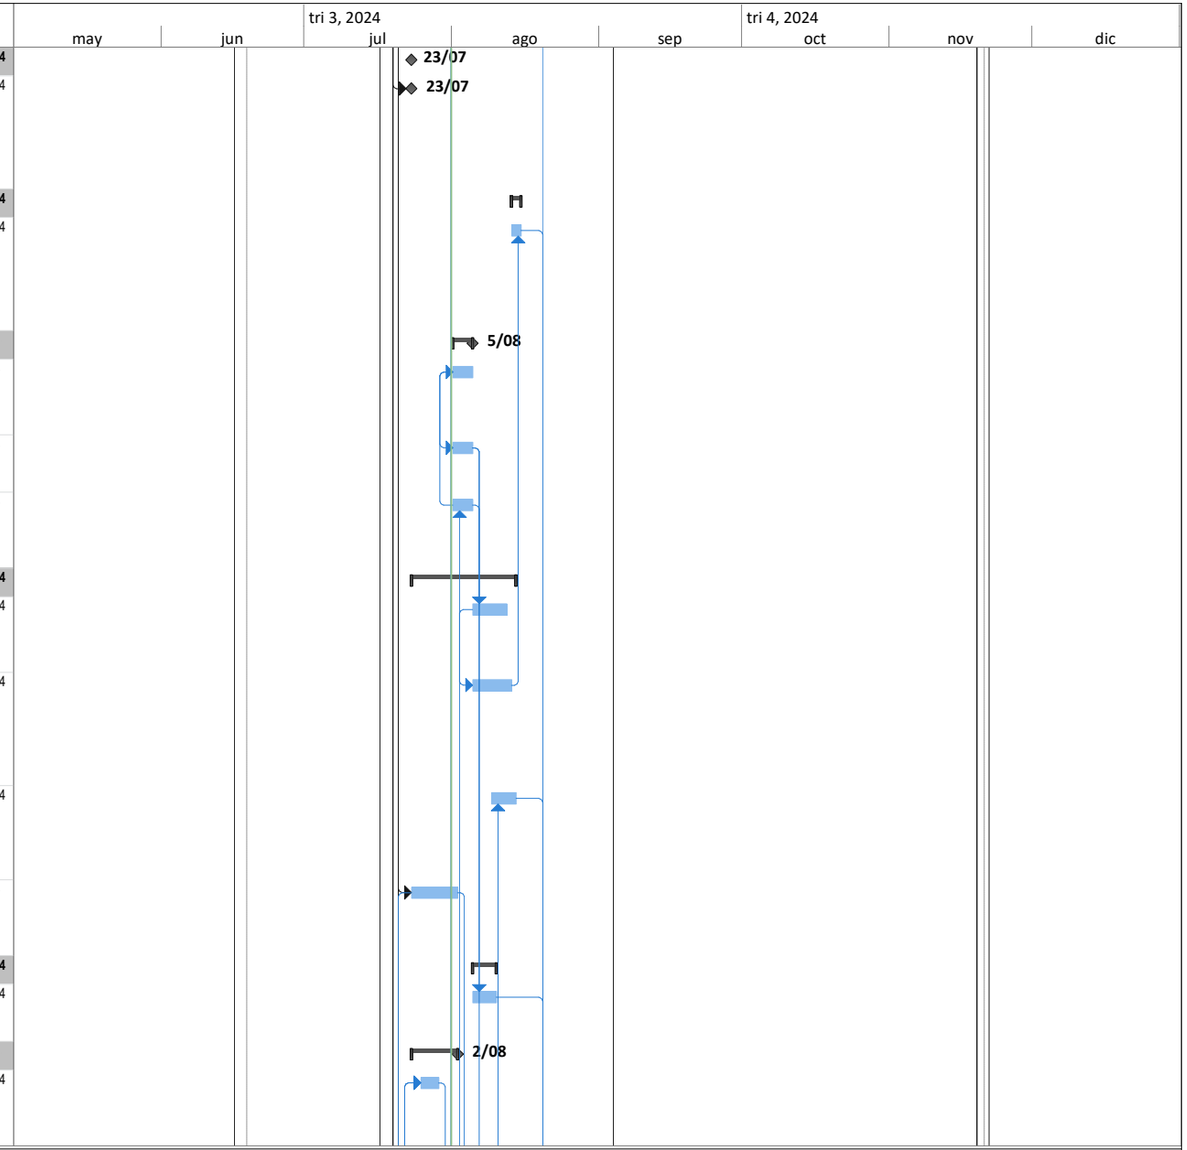

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
247	15.7.2	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	246	248	2 días	29/07/24	31/07/24
248	15.7.3	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA	$ 103.718,00	247	275	2 días	31/07/24	2/08/24
249	15.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	223CC		0 días	23/07/24	23/07/24
250	15.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	223CC		0 días	23/07/24	23/07/24
251	15.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	223CC		0 días	23/07/24	23/07/24
252	**15.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 5.680.196,00**			**13 días**	**23/07/24**	**9/08/24**
253	15.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 2.165.778,00	262CC+2 días	254CC	4 días	3/08/24	9/08/24
254	15.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE	$ 1.544.491,00	253CC	255CC	4 días	3/08/24	9/08/24
255	15.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 110.764,00	254CC	256CC	4 días	3/08/24	9/08/24
256	15.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 839.360,00	255CC	257CC	4 días	3/08/24	9/08/24
257	15.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 927.312,00	256CC	241	4 días	3/08/24	9/08/24
258	15.8.6	SUMISNISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 92.491,00	273CC	275	4 días	23/07/24	29/07/24
259	**15.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 309.875,00**			**5 días**	**23/07/24**	**30/07/24**
260	15.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	$ 309.875,00	223CC	246CC+2 días	5 días	23/07/24	30/07/24
261	**15.10**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 508.237,00**			**9 días**	**1/08/24**	**13/08/24**
262	15.10.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 508.237,00	273	253CC+2 días	9 días	1/08/24	13/08/24
263	**15.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 21.723.139,00**			**21 días**	**23/07/24**	**21/08/24**
264	15.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 178.892,00	223CC	246CC	5 días	23/07/24	30/07/24
265	15.11.2	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 250.084,00	274CC	266CC	5 días	6/08/24	13/08/24
266	15.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE 3" (AMAZONA) INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	$ 1.115.342,00	265CC	267CC	5 días	6/08/24	13/08/24

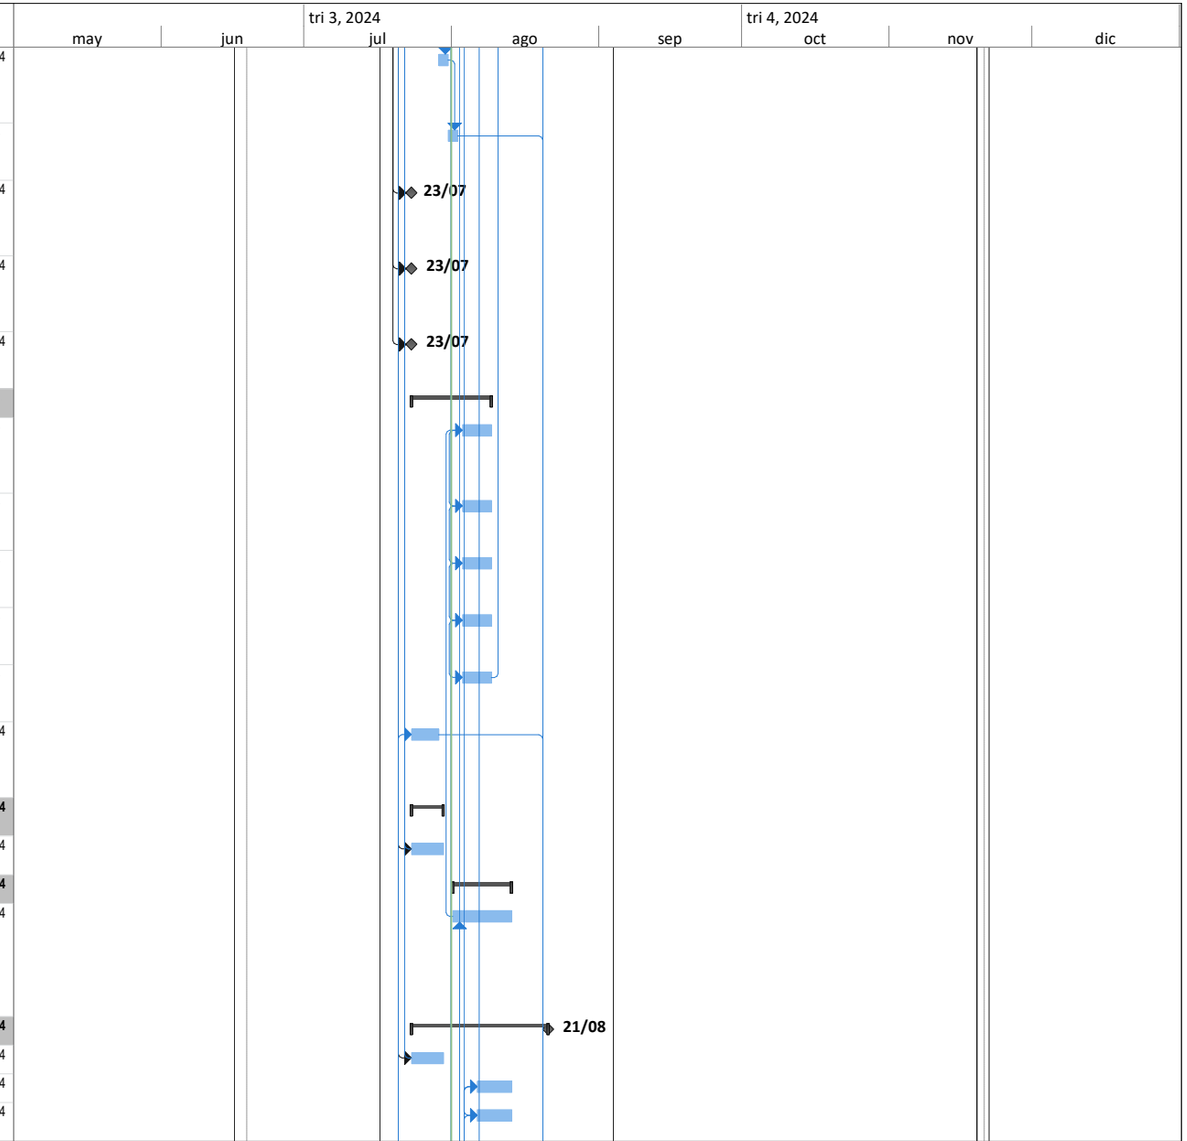

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
267	15.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" (AMAZONA) INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	$ 482.643,00	266CC	268	5 días	6/08/24	13/08/24
268	15.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 439.794,00	267	275	5 días	13/08/24	21/08/24
269	15.11.6	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 5.341.221,00	237	270CC	6 días	5/08/24	13/08/24
270	15.11.7	VENTANAS SERIE 744 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 807.626,00	269CC	275	4 días	5/08/24	10/08/24
271	15.11.8	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 7.238.345,00	242	272CC	5 días	2/08/24	9/08/24
272	15.11.9	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 1.995.698,00	271CC	275	5 días	2/08/24	9/08/24
273	15.11.10	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.087.199,00	242CC	237;262;258CC	7 días	23/07/24	1/08/24
274	15.11.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 786.295,00	226CC+3 días	275;265CC	5 días	6/08/24	13/08/24
275	**16**	**FIN CAIMITO**	**$ 0,00**	**241;244;248;258;274**	**366**	**0 días**	**21/08/24**	**21/08/24**
276	**17**	**INICIO SUCRE**	**$ 0,00**	**51CC+5 días**	**279CC;297CC+2**	**0 días**	**13/09/24**	**13/09/24**
277	**18**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE**	**$ 82.902.222,00**			**30 días**	**13/09/24**	**22/10/24**
278	**18.1**	**CUBIERTA**	**$ 18.928.668,00**			**18 días**	**13/09/24**	**5/10/24**
279	18.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 1.499.733,00	276CC	280CC;283CC	11 días	13/09/24	26/09/24
280	18.1.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	$ 3.757.254,00	279CC	281	9 días	13/09/24	24/09/24
281	18.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 13.671.681,00	280	314CC	9 días	24/09/24	5/10/24
282	**18.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.704.040,00**			**4 días**	**13/09/24**	**18/09/24**
283	18.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 1.704.040,00	279CC	320	4 días	13/09/24	18/09/24
284	18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 1	$ 0,00	276CC		0 días	13/09/24	13/09/24
285	**18.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 4.143.096,00**			**12 días**	**16/09/24**	**1/10/24**

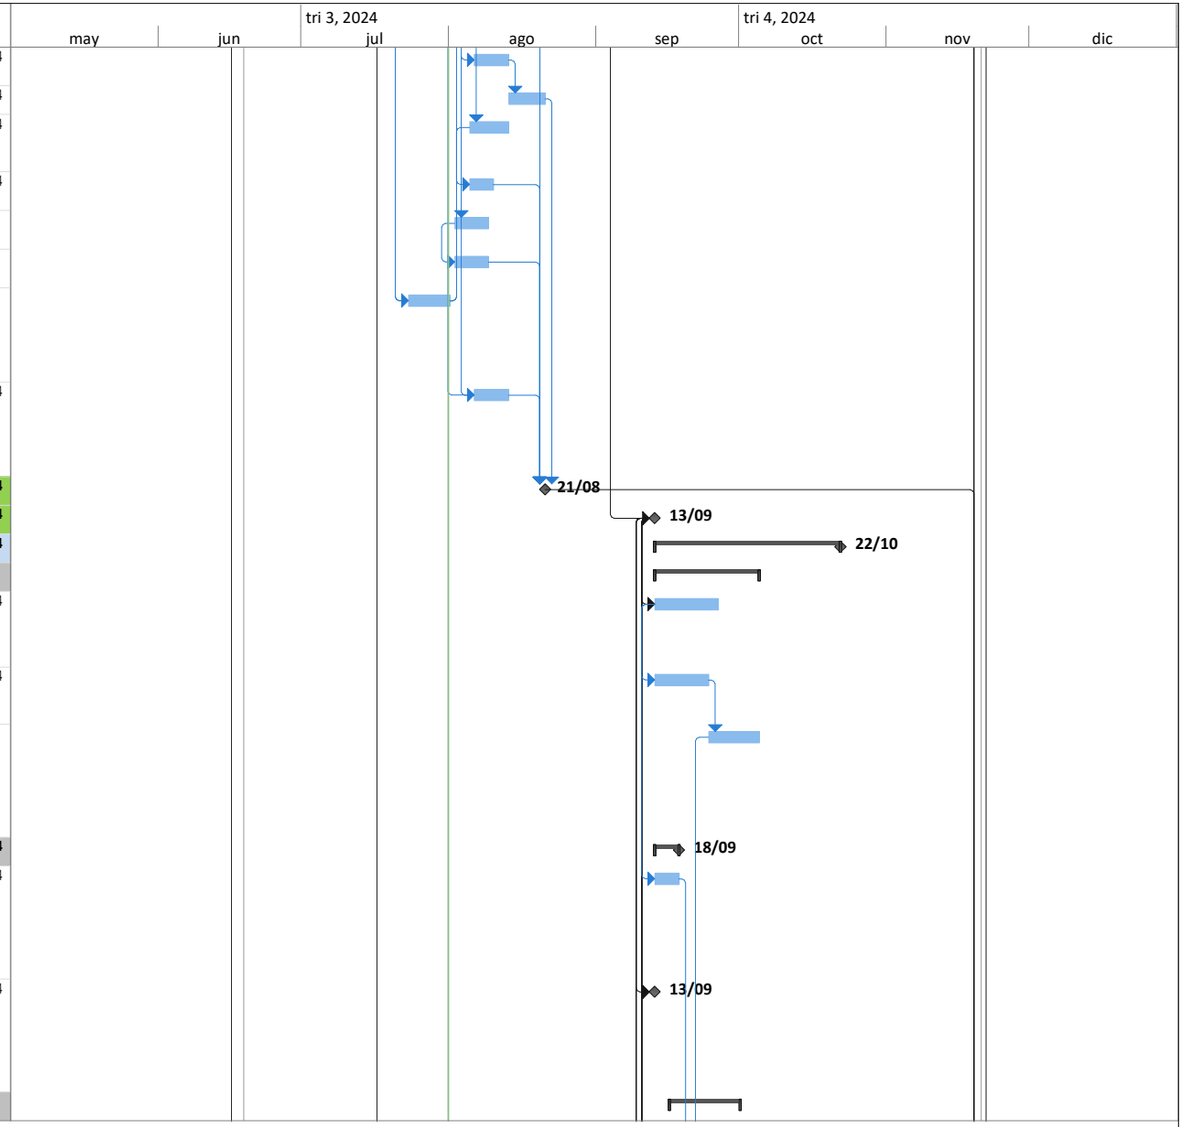

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
286	18.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS	$ 783.880,00	296CC	287	6 días	16/09/24	23/09/24
287	18.3.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 207.347,00	286	288CC	6 días	23/09/24	1/10/24
288	18.3.3	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	$ 438.669,00	287CC	289CC	6 días	23/09/24	1/10/24
289	18.3.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	288CC	293;291CC;313	6 días	23/09/24	1/10/24
290	**18.4**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 3.388.248,00**			**7 días**	**23/09/24**	**2/10/24**
291	18.4.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 3.388.248,00	289CC	295;306CC	7 días	23/09/24	2/10/24
292	**18.5**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 38.863.948,00**			**28 días**	**16/09/24**	**22/10/24**
293	18.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 2.993.640,00	289	294	8 días	1/10/24	10/10/24
294	18.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 16.411.834,00	293	322	8 días	10/10/24	22/10/24
295	18.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 4.547.093,00	291	322;319	8 días	2/10/24	11/10/24
296	18.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 8.523.258,00	321CC	286CC	8 días	16/09/24	25/09/24
297	18.5.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 6.388.123,00	276CC+2 días	321CC	8 días	16/09/24	25/09/24
298	**18.6**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 389.912,00**			**11 días**	**13/09/24**	**26/09/24**
299	18.6.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 138.465,00	311	303CC	3 días	23/09/24	26/09/24
300	18.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	276CC		0 días	13/09/24	13/09/24

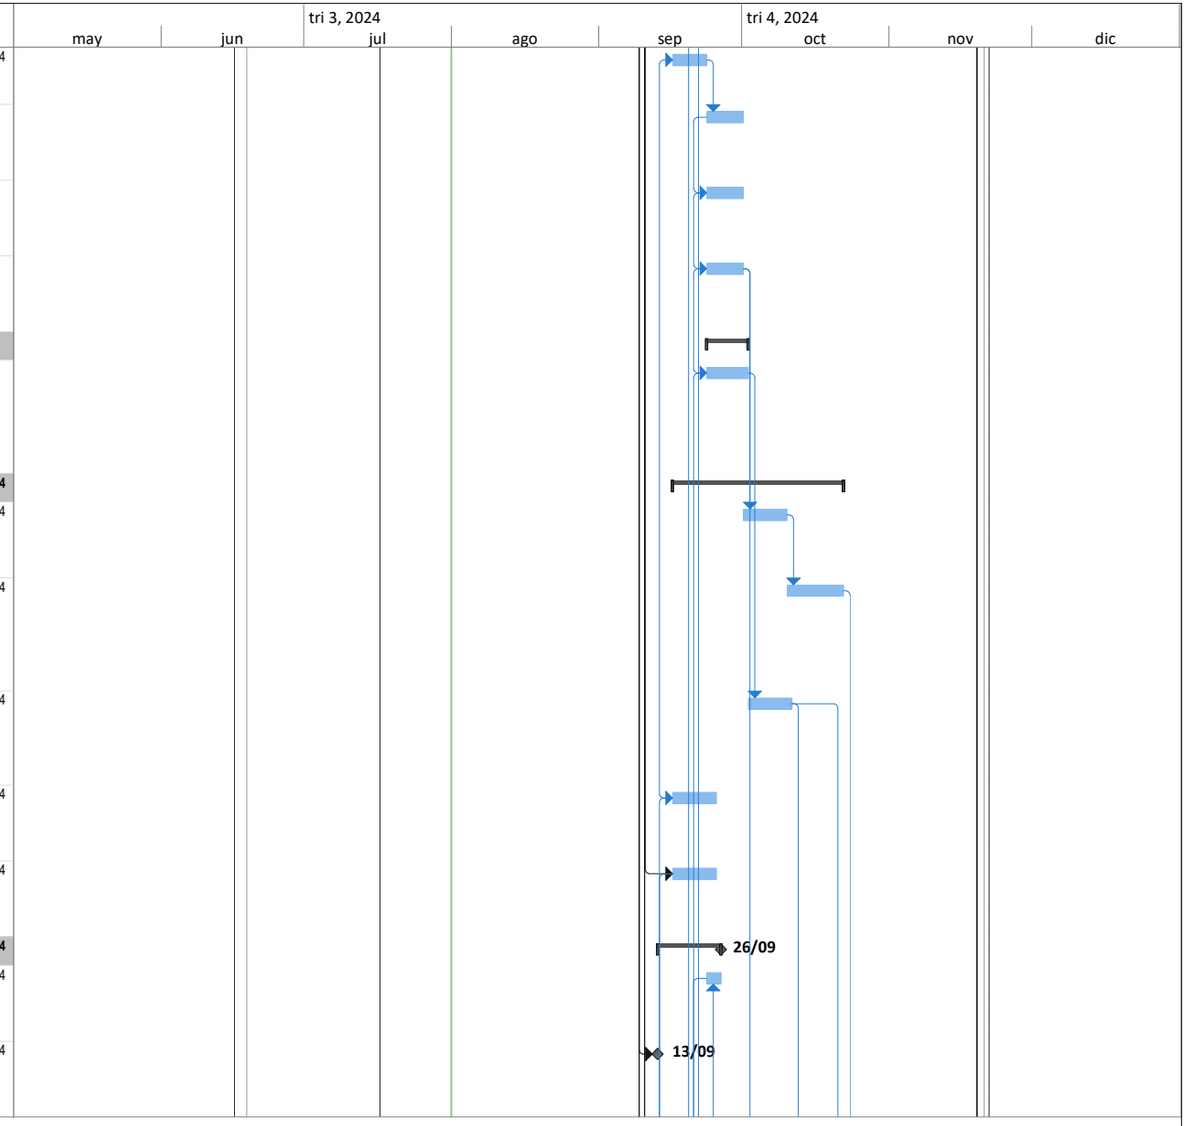

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
301	18.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	276CC		0 días	13/09/24	13/09/24
302	18.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	276CC		0 días	13/09/24	13/09/24
303	18.6.5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA	$ 103.718,00	299CC	304CC	3 días	23/09/24	26/09/24
304	18.6.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	303CC	322	3 días	23/09/24	26/09/24
305	**18.7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 3.426.460,00**			**10 días**	**23/09/24**	**5/10/24**
306	18.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 24W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 698.267,00	291CC	307	5 días	23/09/24	30/09/24
307	18.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 2.728.193,00	306	322	5 días	30/09/24	5/10/24
308	**18.8**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.029.459,00**			**8 días**	**13/09/24**	**23/09/24**
309	18.8.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	$ 426.373,00	276CC	310CC	4 días	13/09/24	18/09/24
310	18.8.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	$ 409.774,00	309CC	311	4 días	13/09/24	18/09/24
311	18.8.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 193.312,00	310	299	4 días	18/09/24	23/09/24
312	**18.9**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 1.896.404,00**			**8 días**	**24/09/24**	**4/10/24**
313	18.9.1	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	$ 97.597,00	289	315CC	3 días	1/10/24	4/10/24
314	18.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 1.403.064,00	281CC	322	7 días	24/09/24	3/10/24
315	18.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 395.743,00	313CC	322;318	3 días	1/10/24	4/10/24
316	**18.10**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 9.131.987,00**			**30 días**	**13/09/24**	**22/10/24**
317	18.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 424.071,00	276CC	322	8 días	13/09/24	23/09/24
318	18.10.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y RODAMIENTOS.	$ 1.272.384,00	315	322	7 días	4/10/24	12/10/24
319	18.10.3	EMBOQUILLADO ENCHAPE PARED Y PISO CERAMICO	$ 21.240,00	295	322	7 días	11/10/24	22/10/24
320	18.10.4	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 12.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAM	$ 1.239.894,00	283	322	5 días	18/09/24	24/09/24

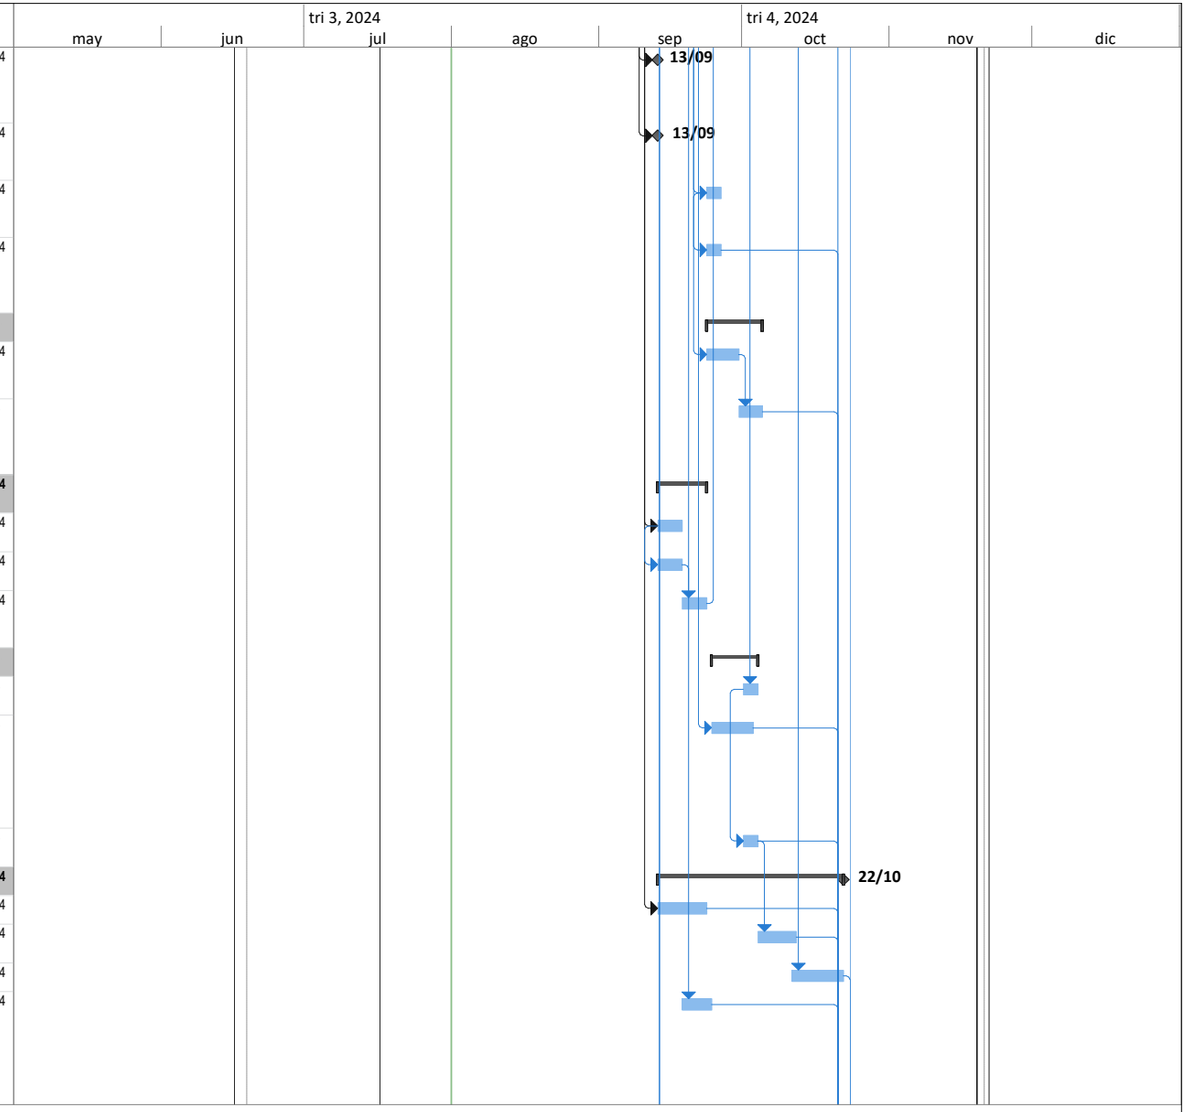

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
321	18.10.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 6.174.398,00	297CC	296CC	8 días	16/09/24	25/09/24
322	**19**	**FIN SUCRE**	**$ 0,00**	**320;314;315;307;304**	**366**	**0 días**	**22/10/24**	**22/10/24**
323	**20**	**INICIO SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**1CC+15 días**	**331CC;349CC;32(**	**0 días**	**19/07/24**	**19/07/24**
324	**21**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS**	**$ 153.937.904,00**			**40 días**	**19/07/24**	**11/09/24**
325	**21.1**	**CUBIERTA**	**$ 22.479.201,00**			**20 días**	**19/07/24**	**15/08/24**
326	21.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 22.479.201,00	323CC	364	20 días	19/07/24	15/08/24
327	**21.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**19/07/24**	**19/07/24**
328	21.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	323CC		0 días	19/07/24	19/07/24
329	21.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	323CC		0 días	19/07/24	19/07/24
330	**21.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 4.424.817,00**			**12 días**	**19/07/24**	**5/08/24**
331	21.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DE CERRADURA, INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 152.016,00	323CC	338;332	6 días	19/07/24	29/07/24
332	21.3.2	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	$ 1.559.601,00	331	333CC	6 días	29/07/24	5/08/24
333	21.3.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	332CC	352;359CC	5 días	29/07/24	3/08/24
334	**21.4**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 70.515.294,00**			**34 días**	**29/07/24**	**11/09/24**
335	21.4.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 13.756.405,00	363	365	9 días	3/08/24	15/08/24
336	21.4.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 22.643.764,00	339	354	9 días	2/08/24	14/08/24

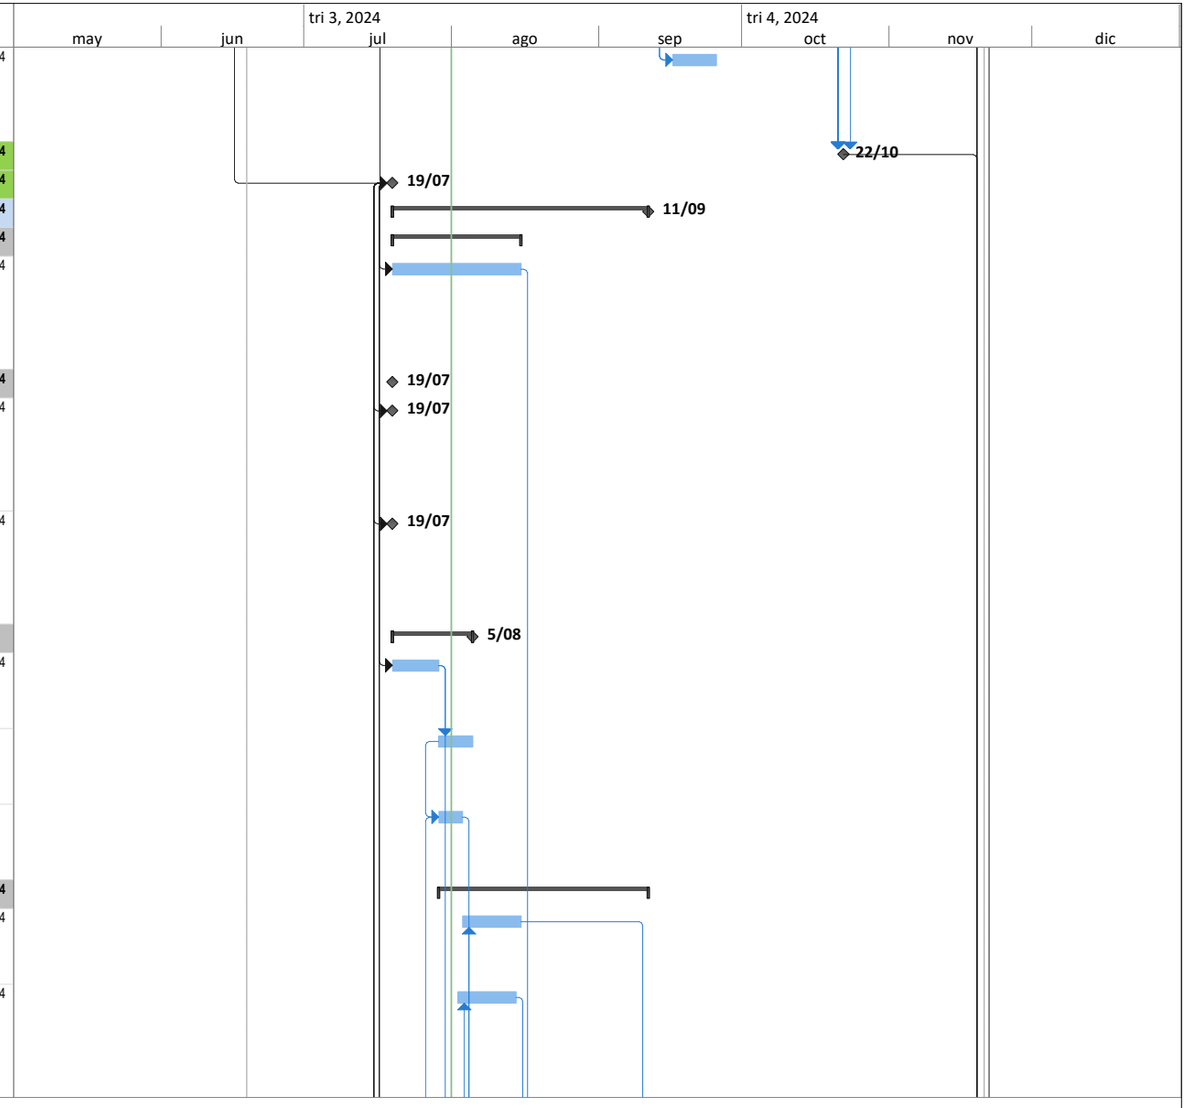

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
337	21.4.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 11.354.234,00	354	365	8 días	31/08/24	11/09/24
338	21.4.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.672.493,00	331	363CC	7 días	29/07/24	6/08/24
339	21.4.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 19.088.398,00	363CC	336	4 días	29/07/24	2/08/24
340	**21.5**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 701.587,00**			**19 días**	**19/07/24**	**14/08/24**
341	21.5.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 553.858,00	350;358	345CC	8 días	3/08/24	14/08/24
342	21.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	323CC		0 días	19/07/24	19/07/24
343	21.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	323CC		0 días	19/07/24	19/07/24
344	21.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	$ 0,00	323CC		0 días	19/07/24	19/07/24
345	21.5.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	341CC	365	6 días	3/08/24	12/08/24
346	**21.6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 4.633.474,00**			**8 días**	**31/08/24**	**11/09/24**
347	21.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 4.633.474,00	354	365	8 días	31/08/24	11/09/24
348	**21.7**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.104.517,00**			**11 días**	**19/07/24**	**3/08/24**
349	21.7.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 863.755,00	323CC	350CC+5 días	6 días	19/07/24	29/07/24
350	21.7.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 240.762,00	349CC+5 días	365;341	6 días	26/07/24	3/08/24
351	**21.8**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 7.574.408,00**			**6 días**	**3/08/24**	**12/08/24**
352	21.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 7.574.408,00	333	365	6 días	3/08/24	12/08/24
353	**21.9**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 1.694.124,00**			**13 días**	**14/08/24**	**31/08/24**
354	21.9.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 1.694.124,00	336	337;347;356	13 días	14/08/24	31/08/24

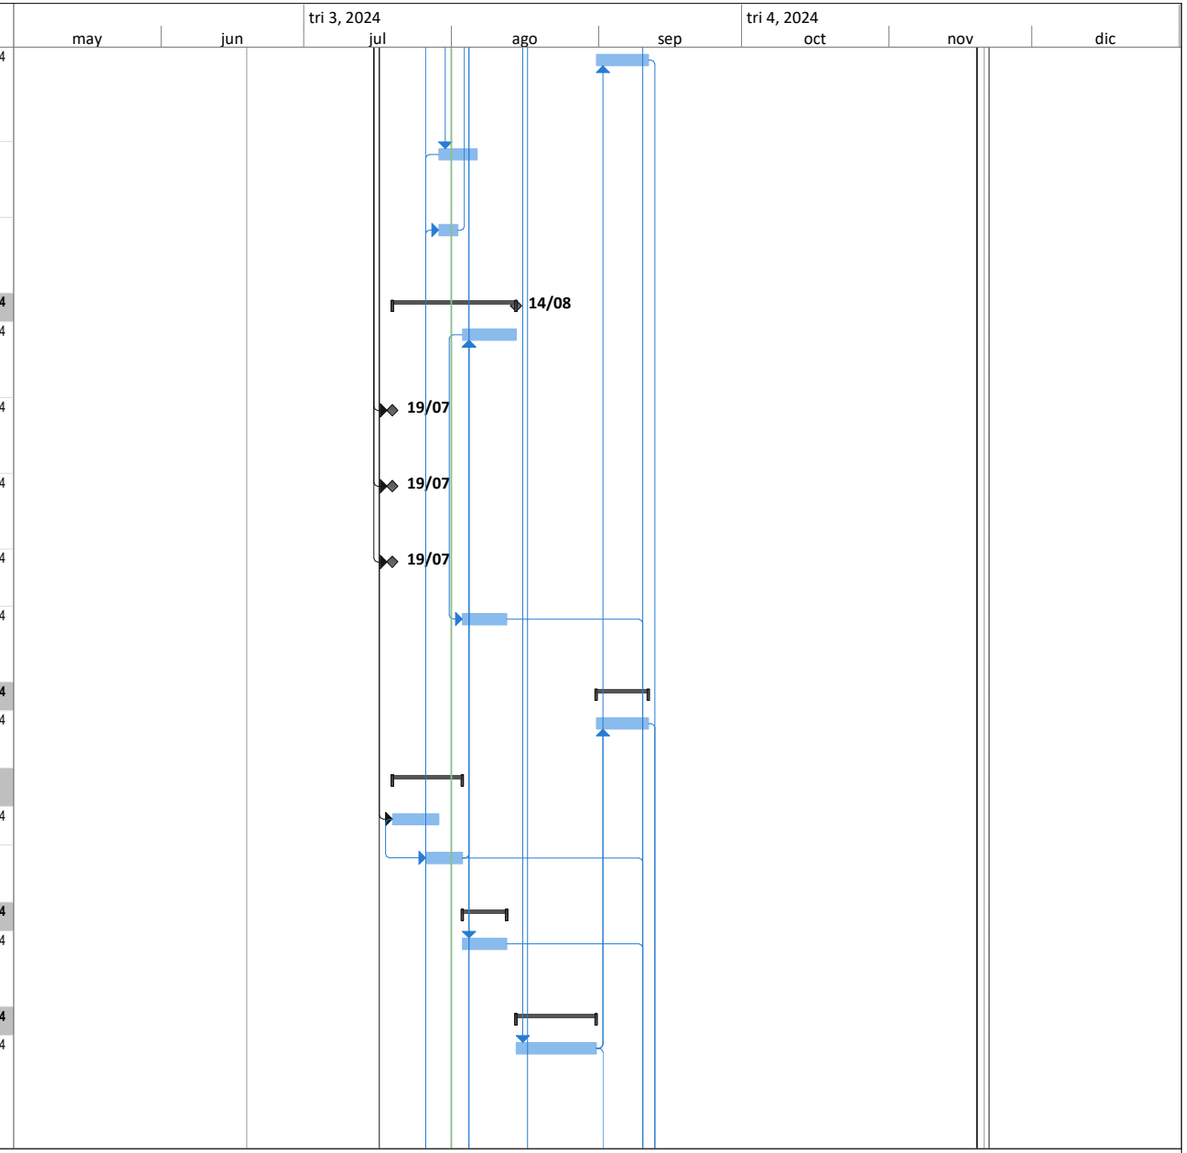

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
355	**21.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 4.228.715,00**			**3 días**	**31/08/24**	**4/09/24**
356	21.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 4.228.715,00	354	365	3 días	31/08/24	4/09/24
357	**21.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 36.581.767,00**			**38 días**	**19/07/24**	**9/09/24**
358	21.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 238.522,00	323CC	341	11 días	19/07/24	3/08/24
359	21.11.2	DESMONTE Y REINSTALACION DE PROTECTOR METALICO Y VENTANA EN ALUMINIO	$ 4.922.791,00	333CC	360	5 días	29/07/24	3/08/24
360	21.11.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 1.810.948,00	359	361	6 días	3/08/24	12/08/24
361	21.11.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 14.476.691,00	360	362	5 días	12/08/24	20/08/24
362	21.11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 5.405.016,00	361		5 días	20/08/24	26/08/24
363	21.11.6	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 8.810.454,00	338CC	339CC;335	5 días	29/07/24	3/08/24
364	21.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 917.345,00	326	365	18 días	15/08/24	9/09/24
365	**22**	**FIN SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**364;350;347;352;335**	**366**	**0 días**	**11/09/24**	**11/09/24**
366	**23**	**FIN DEL PROYECTO**	**$ 0,00**	**121;168;222;275;322**		**0 días**	**20/11/24**	**20/11/24**

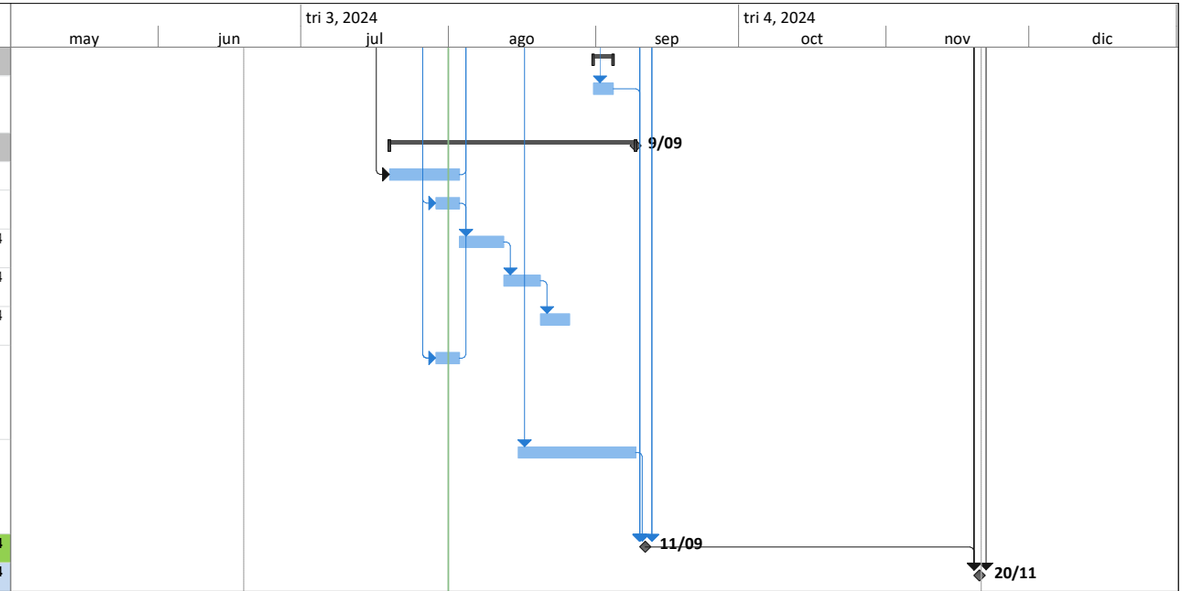

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 1/08/24

Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual
Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	
