CONTRATO DE OBRA No. 159 DEL 2023

INFORME DE OBRA No. 10

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FINAL [ ] **PARCIAL** [X] **No. _10_**

Periodo: del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	**159 de 2023**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA
VALOR INICIAL	$ 3.204.000.004,00
PLAZO	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
ANTICIPO 40%:	$ 1.281.600.002,00
CONTRATISTA	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
SUPERVISOR	ING. YESID ROJAS PEÑA
CONTRATANTE	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL SAS
OTRO SI 18 DE JUNIO DE 2024	ADICION VALOR: $ 113.338.444,00 ADICION PLAZO: DOS (2) MESES
FECHA FINAL TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tabla No. 1. Relación de Pólizas de contrato de Obra – Legalización.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	18-10-2023	18-08-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	18-10-2023	18-08-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 2. Relación de Pólizas de contrato de Obra – Acta de inicio.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 3. Relación de Pólizas de contrato de Obra Otro si No 01

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**995.201.534,40**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.326.935.379,20**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 663.467.689,60**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 995.201.534,40**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 520.000.000,00**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Este informe tiene como objetivo general dejar constancia del desarrollo de las acciones y actividades de obra que se han realizado durante el periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024, de acuerdo a la ejecución del contrato de obra No 159 de 2023.

Se detallan a continuación las actividades realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en progreso de la ejecución de las labores realizadas para la "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA".

Se describen los detalles de las actividades contractuales realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cada uno de los componentes técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo, sociales y ambientales correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024. Igualmente se relacionan los hechos y sucesos más relevantes de las actividades ejecutadas durante el periodo.

En este informe también se describe el estado y avance físico del contrato de obra y consecutivamente se relaciona la información financiera programada versus la inversión financiera ejecutada de acuerdo a la programación del cronograma de obra y con el avance físico real.

Se persiste verbalmente durante el periodo con el Secretario de Planeación Municipal y la Gerencia de Empresas Públicas de Altamira - Huila, Ing. Daniel Calderón y la ing. María Camila Yusti, respectivamente, la importancia primordial de los permisos de servidumbre pendientes por entregar, para el correcto desarrollo de las actividades previstas para el proyecto y el nivel de importancia de los mismos para la continua ejecución de las obras, las cuales nos proporcionaran o permiten alcanzar el objeto y el alcance del contrato de obra, por ende a continuación se relacionan los propietarios pendientes por firmar dichos permisos de servidumbre:

Flor María Cruz
Isleny Infante
Héctor Vargas
Daniela Vargas
Hernando Cuellar
Ermila Ome
Jaime Pérez

A la fecha se establece la trazabilidad de los permisos pendientes de servidumbre de la siguiente manera: Flor María Cruz está pendiente de la respuesta del acto administrativo interpuesto por la Alcaldía de Altamira – Huila con el objeto de generar la correspondiente resolución de imposición de servidumbre, Isleny Infante se instaló la tubería pero no ha firmado formalmente u oficialmente el permiso de servidumbre, Héctor y Daniela Vargas se inició el proceso de imposición de servidumbre se inicia con visita del perito al predio y entrega documentación o planos solicitados por el profesional, Hernando Cuellar y Ermila Ome están pendientes por radicar documentación para la formalización del permiso y Jaime Pérez, tienen pendiente respuesta de la socialización ejercida el mes pasado por medio de su representante o apoderado legal el señor José Luis Pérez.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS AL 23/09/2024	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	24/11/2023	**300 DÍAS**		24/09/2024
Socialización	27/02/2024			
Otro Si No 01	18/06/2024			23/11/2024

Avance físico de las Obras

En el periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024, en referencia al corte, se ha estado trabajando en las actividades contractuales, que se relacionan a continuación:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.06 Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo I, Arena lavada de rio o similar, para cama de tubería, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo II Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs: K8+515.00 a K8+700.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo III, material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K8+515.00 a K8+700.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material sobrante o no apto para relleno, proveniente de excavación manual y mecánica, desde la Abs K8+515.00 a K8+700.00, hasta sitio de acopio autorizado por la Alcaldía Municipal de Altamira – Huila.

NP 2.11 Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.
Se ejecuta excavación manual en roca con compresor, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.02 Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-6" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).
Se instala tunería PVC unión mecánica 6" RDE 21, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

3.13 Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 6".
Se suministra e instalan codos de radio de 22.5° PVC – RDE 21 – Unión hidráulica, para tubería 6", en las K8+546.07, K8+549.53 y K8+644.93.

CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

4.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo en su totalidad, las estructuras hidráulicas para válvulas ventosas y de purga o limpieza, ubicadas en las siguientes Abs: K0+010.00, K0+020.00, K0+218.95, K3+735.00, K3+784.52, K4+132.66, K4+340.00, K6+260.00, K6+750.00, K7+095.16, K7+240.00, K7+490.00, K7+840.78, K7+985.00 y K8+340.00.

4.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se excavo manualmente en material conglomerado, para las estructuras hidráulicas localizadas en las siguientes Abs: K0+616.45, K1+120.51, K1+367.39, K1+950.00, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+330.00 , K4+340.00, K4+400.00, K5+270.00, K5+365.00, K8+830.00, K8+920.00 y K9+320.00.

4.05 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo III, material seleccionado de la misma excavación, para estructuras hidráulicas ubicadas o localizadas en las Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00 , K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.06 Concreto 2000 PSI para solados. Elab. En obra (inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).
Se instala concreto 2000 PSI, para solado o limpieza de las estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.07 Suministro e Instalación Tapa válvula tipo chorote tráfico liviano.
Se suministran e instalan tapas tipo chorote tráfico liviano para las cajas de las estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.08 Construcción Caja Válvulas e Inspección 0.60 x 0.60 m.
Se construye cajas válvulas de inspección para estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

NP 4.14 Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula ventosa doble cámara para tubería 8", para aireación del sistema o red de aducción, localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+283.58 y K2+560.00.

NP 4.16 Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula compuerta elástica para tubería 8 ", para limpieza o purga del sistema o red de aducción, localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+250.00, K2+478.11 y K2+700.00.


CAPITULO 5 - ANCLAJES TUBERÍA

5.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.

Se localizo y replanteo en su totalidad las estructuras hidráulicas para anclajes de codos, ubicados en las siguientes Abs: K0+068.79, K0+170.00, K0+220.00, K3+695.00, K4+275.00, K4+399.25, K6+165.00, K8+180.00, K8+241.99, K8+243.46, K8+300.27, K8+546.07, K8+549.53, K8+644.93, K9+455.00, K9+457.15, K9+500.00, K9+502.03, K9+591.14 y K9+593.63.

En concordancia con lo estipulado contractualmente las obras se construyeron según las especificaciones técnicas avaladas por los estudios y diseños del proyecto siguiendo las normatividades vigentes para tal fin.

Imagen 1. Actividades programadas del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

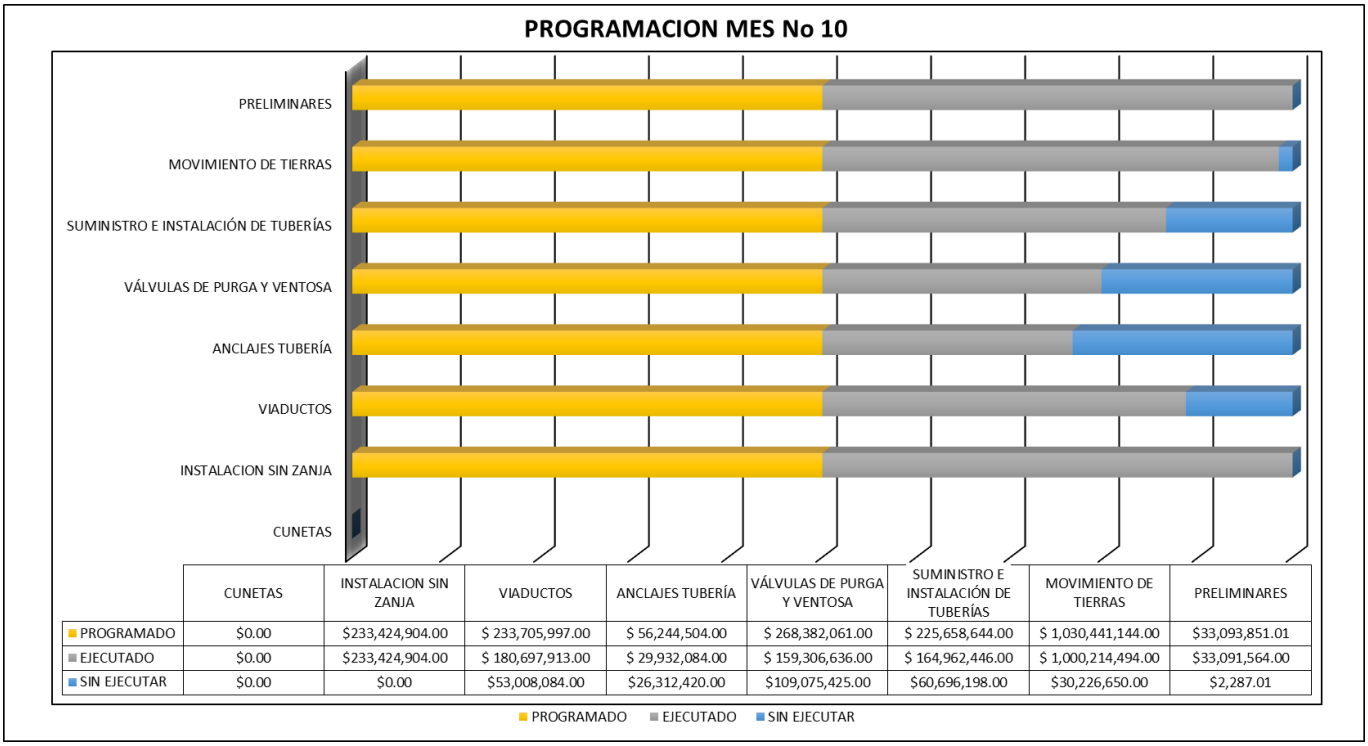

	CUNETAS	INSTALACION SIN ZANJA	VIADUCTOS	ANCLAJES TUBERÍA	VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS	PRELIMINARES
PROGRAMADO	$0.00	$233,424,904.00	$ 233,705,997.00	$ 56,244,504.00	$ 268,382,061.00	$ 225,658,644.00	$ 1,030,441,144.00	$33,093,851.01
EJECUTADO	$0.00	$233,424,904.00	$ 180,697,913.00	$ 29,932,084.00	$ 159,306,636.00	$ 164,962,446.00	$ 1,000,214,494.00	$33,091,564.00
SIN EJECUTAR	$0.00	$0.00	$53,008,084.00	$26,312,420.00	$109,075,425.00	$60,696,198.00	$30,226,650.00	$2,287.01

Según la programación de las actividades de obra y flujo de inversión, el porcentaje programado acumulado para el periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024, es de **81.76 %** y el ejecutado acumulado es de **70.60 %.**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	01	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE MODIFICACION	01	18 DE JUNIO DE 2024
ACTA PARCIAL	01	19 DE JUNIO DE 2024
ACTA PARCIAL	02	12 DE AGOSTO DE 2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... **$ 3.204.00.004,00**
VALOR DEL ANTICIPO.....**$ 1.281.600.001,60**
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....**40 %**

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Adición Otro Si No 01 .....**60 días**
Tiempo Total de Obra.....**360 días**

Tiempo Total Transcurrido .....**300 días**
Tiempo Total Restante..... **60 días**

Avance Porcentual según plazo inicial.....**83.33 %**
Porcentaje restante en tiempo .....**16.67 %**

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA

Inversión Contratada..... **$ 3.204.000.004,00**
Inversión Adicional Otro Si No 01 ..... **$ 113.338.444,00**
Inversión Total Contratada..... **$ 3.317.338.448,00**

Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 01) ..... **$ 33.766.176,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 02) ..... **$ 39.068.820,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 03) ..... **$ 24.989.959,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 04) ..... **$ 382.299.883,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 05) ..... **$ 213.419.942,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 06) ..... **$ 393.445.120,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 07) ..... **$ 239.033.081,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 08) ..... **$ 411.050.366,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 09) ..... **$ 445.786.026,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 10) ..... **$ 159.266.634,00**

Porcentaje Avance Físico Mensual Ejecutado .....**4.80 %**
Inversión Total Ejecutada.....,,,,,..... **$ 2.342.119.053,00**

Porcentaje Avance Físico Ejecutado Acumulado ..... **70.60 %**
Saldo por Ejecutar .....**$ 975.219.395,00**
Porcentaje por Ejecutar.....**29.40 %**

De acuerdo a la programación de obra para este periodo se tenía estimado un avance del **9.16 %,** pero el avance físico ejecutado para este periodo fue del **4.80 %,** lo cual indica un atraso del **4.36 %** para el periodo**.** El atraso se debe en gran medida al aumento de las precipitaciones en la zona, que no permitían ejecutar o desarrollar las actividades continuamente, ya que por seguridad del recurso humano, maquinaria y equipos estos deben parar en los diferentes frentes de obra, hasta presentarse un clima adecuado para ejecutar las obras, labores u actividades a realizar, así, mismo por los permisos de servidumbre pendientes por firmar, que impiden el acceso a

los predios por donde se estima instalar la tubería correspondiente a la aducción de la fase II, del proyecto, según el objetó y alcance del contrato de 159 de 2023.

A continuación, se indica el avance ejecutado mensualmente.

% Avance mensual	PERIODO 1 24 NOV AL 23 DIC	PERIODO 2 24 DIC AL 23 ENE	PERIODO 3 24 ENE AL 23 FEB	PERIODO 4 24 FEB AL 23 MAR	PERIODO 5 24 MAR AL 23 ABR	PERIODO 6 24 ABR AL 23 MAY	PERIODO 7 24 MAY AL 23 JUN	PERIODO 8 24 JUN AL 23 JUL	PERIODO 9 24 JUL AL 23 AGO	PERIODO 10 24 AGO AL 23 SEP	PERIODO 11 25 SEP AL 23 OCT	PERIODO 12 26 OCT AL 23 NOV	TOTAL
PROGRAMADO	1.07%	3.50%	6.21%	7.21%	5.93%	6.47%	18.62%	13.22%	10.37%	**9.16%**			**81.76%**
EJECUTADO	1.02%	1.18%	0.75%	11.52%	6.43%	11.86%	7.21%	12.39%	13.44%	**4.80%**			**70.60%**

CONTROL FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se puede observar el flujo de inversión financiero ajustado según acta modificatoria y seguimiento del avance programado financiero, con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en referencia.


Tabla 3. Control de inversión programada y ejecutada del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

INVERCIÓN FINANCIERA PROGRAMADO				INVERCIÓN FINANCIERA EJECUTADA		
AÑO	PERIODO	VR PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO	PERIODO	VR EJECUTADO MENSUAL	% PROGRAMADO
2023	24 NOV- 23 DIC	$ 35,336,945	1.07%	24 NOV- 23 DIC	$ 33,776,176	1.02%
	24 DIC- 23 ENE	$ 116,112,924	3.50%	24 DIC- 23 ENE	$ 39,068,820	1.18%
2024	24 ENE- 23 FEB	$ 206,160,922	6.21%	24 ENE- 23 FEB	$ 24,989,959	0.75%
	24 FEB- 23 MAR	$ 239,152,134	7.21%	24 FEB- 23 MAR	$ 382,299,883	11.52%
	24 MAR- 23 ABR	$ 196,765,797	5.93%	24 MAR- 23 ABR	$ 213,419,942	6.43%
	24 ABR - 23 MAY	$ 214,657,949	6.47%	24 ABR - 23 MAY	$ 393,445,120	11.86%
	24 MAY- 23 JUN	$ 617,581,388	18.62%	24 MAY- 23 JUN	$ 239,033,081	7.21%
	24 JUN- 23 JUL	$ 438,411,556	13.22%	24 JUN- 23 JUL	$ 411,050,366	12.39%
	24 JUL - 23 AGO	$ 344,010,456	10.37%	24 JUL - 23 AGO	$ 445,769,073	13.44%
	24 AGO - 23 SEP	$ 303,994,655	9.16%	24 AGO - 24 SEP	$ 159,266,634	4.80%
	25 SEP - 23 OCT	$ 294,852,807		25 SEP - 23 OCT		
	26 OCT - 23 NOV	$ 310,300,914		26 OCT - 23 NOV		
		$ 3,317,338,448	81.76%		**$ 2,342,119,053**	70.60%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

A continuación, se presentan las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024. En estas curvas se puede evidenciar que el valor financiero programado (línea verde) está levemente por encima del valor financiero ejecutado (línea azul). Estas curvas corroboran e indican que se presenta un leve atraso en las actividades que hacen parte del presupuesto financiero de obra.

Imagen 3. Curvas de Avance Financiero Programado vs. Valor Ejecutado Acumulado.

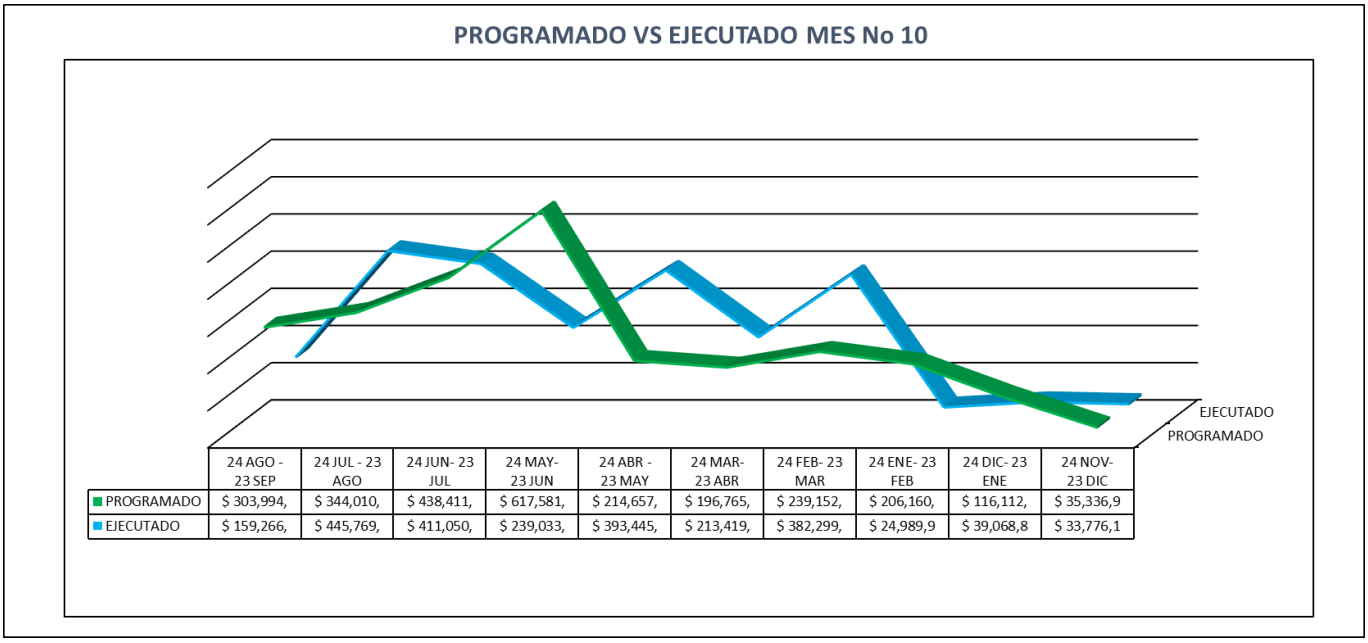

	24 AGO - 23 SEP	24 JUL - 23 AGO	24 JUN- 23 JUL	24 MAY- 23 JUN	24 ABR - 23 MAY	24 MAR- 23 ABR	24 FEB- 23 MAR	24 ENE- 23 FEB	24 DIC- 23 ENE	24 NOV- 23 DIC
PROGRAMADO	$ 303,994,	$ 344,010,	$ 438,411,	$ 617,581,	$ 214,657,	$ 196,765,	$ 239,152,	$ 206,160,	$ 116,112,	$ 35,336,9
EJECUTADO	$ 159,266,	$ 445,769,	$ 411,050,	$ 239,033,	$ 393,445,	$ 213,419,	$ 382,299,	$ 24,989,9	$ 39,068,8	$ 33,776,1

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Actas	Amortización	Valor
Anticipo (40%)				$ 1.281.600.002,00
ACTA PARCIAL 1	19/06/2024	$ 1.155.971.156,00	$ 462.388.462,00	$ 693.582.694,00
ACTA PARCIAL 2	12/08/2024	$ 904.582.941,00	$ 361.833.177,00	$ 542.749.764,00
ACTA PARCIAL 3				
TOTALES		**$ 2.060.554.097,00**	**$ 824.221.639,00**	**$ 1.236.332.458,00**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Facturado**	**Valor No Facturado**
$ 3.204.000.004,00	**$ 113.338.444.00**	**$ 3.317.338.448,00**	**$ 2.060.554.097,00**	**$ 1.256.784.351,00**

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

El equipo y personal que se presenta al contrato de obra 159 de 2023, es netamente operativo y administrativo, determinado como calificado y no calificado, con toda la idoneidad para el amplio desarrollo de las ejecuciones de obra y la administración del mismo.

En la siguiente tabla, se relaciona el personal mínimo requerido que ha estado vinculado al proyecto durante el periodo de ejecución No. 9, comprendido entre el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

Tabla 4. Relación de personal mínimo requerido dispuesto en obra.

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN
Representante legal	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR	-	Ingeniero Electricista
Asesor Estructural	WILLIAN PARRA OLAYA	30%	Ingeniero Civil y Esp. En Estructuras
Residente de Obra	LUIS IVAN LUNA GASCA	100%	Ingeniero Civil
Profesional Siso	VALENTINA POLANCO PARRA	100%	Administradora en gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Maestro de Obra	ALEXANDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Maestro de Obra
Oficial de Obra	JAIDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JHOAN ALEXIS RODRIGUEZ CUELLAR	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JEFERSON GOMEZ CAPIZ	100%	Bachiller

Ayudante de Obra	ALBERTO DE JESUS ACUÑA AGUILERA	0.03%	Bachiller
Ayudante de Obra	GERMAN EDUARDO CASTRO JIMENEZ	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JOSE ALONSO RAMIREZ PLAZAS	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JOSE ALIRO CAMELO	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JORGE LUIS GUEVARA RIVERO	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JOSE YAHIR RUIZ PERLAZA	0.03%	Bachiller
Ayudante de Obra	RUBEN DARIODUARTE ZAMBRANO	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	ROBINSON GOMEZ BERNAL	100%	Bachiller

En el ***anexo 1*** se adjunta la planilla de pago de seguridad social del mes de Agosto de 2024 del personal de mano de obra calificada y no calificada vinculada a la ejecución de las actividades de obra.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.06 Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo I, Arena lavada de rio o similar, para cama de tubería, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo II Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs: K8+515.00 a K8+700.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo III, material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K8+515.00 a K8+700.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material sobrante o no apto para relleno, proveniente de excavación manual y mecánica, desde la Abs K8+515.00 a K8+700.00, hasta sitio de acopio autorizado por la Alcaldía Municipal de Altamira – Huila.

NP 2.11 Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.
Se ejecuta excavación manual en roca con compresor, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.02 Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-6" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).
Se instala tunería PVC unión mecánica 6" RDE 21, entre las Abs K8+515.00 a K8+700.00.

3.13 Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 6".
Se suministra e instalan codos de radio de 22.5° PVC – RDE 21 – Unión hidráulica, para tubería 6", en las K8+546.07, K8+549.53 y K8+644.93.

CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

4.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo en su totalidad, las estructuras hidráulicas para válvulas ventosas y de purga o limpieza, ubicadas en las siguientes Abs: K0+010.00, K0+020.00, K0+218.95, K3+735.00, K3+784.52, K4+132.66, K4+340.00, K6+260.00, K6+750.00, K7+095.16, K7+240.00, K7+490.00, K7+840.78, K7+985.00 y K8+340.00.

4.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se excavo manualmente en material conglomerado, para las estructuras hidráulicas localizadas en las siguientes Abs: K0+616.45, K1+120.51, K1+367.39, K1+950.00, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+330.00, K4+340.00, K4+400.00, K5+270.00, K5+365.00, K8+830.00, K8+920.00 y K9+320.00.

4.05 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material tipo III, material seleccionado de la misma excavación, para estructuras hidráulicas ubicadas o localizadas en las Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.06 Concreto 2000 PSI para solados. Elab. En obra (inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).
Se instala concreto 2000 PSI, para solado o limpieza de las estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.07 Suministro e Instalación Tapa válvula tipo chorote tráfico liviano.
Se suministran e instalan tapas tipo chorote tráfico liviano para las cajas de las estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

4.08 Construcción Caja Válvulas e Inspección 0.60 x 0.60 m.
Se construye cajas válvulas de inspección para estructuras hidráulicas localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+250.00, K2+283.58, K2+478.11, K2+560.00, K2+700.00, K2+950.00, K3+090.00, K3+330.00, K4+700.00 y K4+840.00.

NP 4.14 Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula ventosa doble cámara para tubería 8", para aireación del sistema o red de aducción, localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+182.06, K2+283.58 y K2+560.00.

NP 4.16 Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula compuerta elástica para tubería 8 ", para limpieza o purga del sistema o red de aducción, localizadas o ubicadas en las siguientes Abs: K2+250.00, K2+478.11 y K2+700.00.

CAPITULO 5 - ANCLAJES TUBERÍA

5.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo en su totalidad las estructuras hidráulicas para anclajes de codos, ubicados en las siguientes Abs: K0+068.79, K0+170.00, K0+220.00, K3+695.00, K4+275.00, K4+399.25, K6+165.00, K8+180.00, K8+241.99, K8+243.46, K8+300.27, K8+546.07, K8+549.53, K8+644.93, K9+455.00, K9+457.15, K9+500.00, K9+502.03, K9+591.14 y K9+593.63.

En el ***anexo 2*** se puede evidenciar en el registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el periodo en cuestión.

3.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se reporta ningún daño ni perjuicio a terceros.

3.3 Modificaciones Realizadas en Obra

Durante el periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024, no se han presentado modificaciones realizadas en obra.

3.4. Comité de Obra - Actas de reunión

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité – Reunión (Describir)

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe se resumen las pruebas de laboratorio tomadas a las diferentes estructuras de concreto reforzado, relacionadas a continuación en el siguiente cuadro de muestras:

ABSCISA	ESTRUCTURA	OBSERVACION	FECHA MUESTRA
K3+440.00	VIADUCTO	19.0 m	29/01/2024
K5+820.00	VIADUCTO	12.0 m	8/02/2024
K6+000.00	VIADUCTO	22.5 m	20/02/2024

Las muestras relacionadas, fueron enviadas para el respectivo ensayo a la compresión de probetas de concreto hidráulico según las ASTM C31, C39A, C-143M, INV E 410-22 y NTC 673 o en su defecto por normatividad vigente para dichos ensayos, al laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, emitiendo los informes 202403-62 y 202405-04, anexados en los informe de obra de los periodos 7 y 5 respectivamente.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe, el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, mediante informes 202403-62 y 202405-04, emitieron los siguientes resultados de las muestras tomadas relacionadas a continuación:

ABSCISA	VIADUCTO (ML)	FECHA MUESTRA	VALOR PROYECTADO PSI	OBSERVACION
K3+440.00	19.00	29/01/2024	3516.07	ZAPATA
K5+820.00	12.00	8/02/2024	3017.95	ZAPATA
K6+000.00	22.50	20/02/2024	3496.73	ZAPATA

También mediante informe 202405-05, el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, genero el diseño de mezcla de 3000 PSI, anexado en el informe de obra No 6, para las estructuras o elementos en concreto reforzado, generado mediante análisis granulométrico de agregados, suministrados y certificados por MASSEQ – Proyectos e ingeniería S.A.S., anexado en el informe de obra No 5.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral del presente informe mensual de avance de obra No 7, correspondiente al periodo comprendido del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

- *Anexo 1. Planilla Seguridad Social Agosto 2024.pdf*
- *Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo No 10.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 10, 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.pdf*
- *Anexo 4. Certificados de calidad accesorios.pdf*

Presentado por:

NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
RL/ CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
Correo: conenergia-ltda@hotmail.com
Celular: 3187865568
Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Neiva - Huila

CONTROL DE REVISIÓN		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Luis Ivan Luna Gasca Residente de Obra **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Nelson Gutiérrez Cuéllar** Representante Legal **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Sergio Ernesto Gómez Zambrano** Director de interventoría **INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S**

Anexo 1. Planilla Seguridad Social Agosto 2024.pdf

Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo 10.pdf

Anexo 3. Bitácora Periodo No 10. 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.pdf

Anexo 4. Certificados de calidad accesorios.pdf

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral del presente informe mensual de avance de obra No 7, correspondiente al periodo comprendido del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.

- *Anexo 1. Planilla Seguridad Social Agosto 2024.pdf*
- *Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo No 10.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 10, 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024.pdf*
- *Anexo 4. Certificados de calidad accesorios.pdf*

Presentado por:

NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
RL/ CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
Correo: conenergia-ltda@hotmail.com
Celular: 3187865568
Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Neiva - Huila

CONTROL DE REVISIÓN		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Luis Ivan Luna Gasca Residente de Obra **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Nelson Gutiérrez Cuéllar** Representante Legal **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Sergio Ernesto Gómez Zambrano** Director de interventoría **INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S**

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Registro fotográfico 01. Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 02. Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.



Registro fotográfico 03. Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 04. Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.



Calle 6 No. 7 - 28
Teléfono (8) 8716478
Neiva - Huila.
conenergia_ltda@yahoo.com



Registro fotográfico 05. Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.





CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Registro fotográfico 06. Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-6" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).





Registro fotográfico 07. Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 6".





CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

Registro fotográfico 08. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).





Registro fotográfico 09. Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 10. Concreto 2000 PSI para solados. Elab. En obra (inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).





Registro fotográfico 11. Suministro e Instalación Tapa válvula tipo chorote tráfico liviano.

Registro fotográfico 12. Construcción Caja Válvulas e Inspección 0.60 x 0.60 m.





Registro fotográfico 13. Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.





Calle 6 No. 7 - 28
Teléfono (8) 8716478
Neiva - Huila.
conenergia_ltda@yahoo.com

Registro fotográfico 14. Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.





Registro Fotográfico 15. Sitio de acopio para disposición, descargue y adecuación de material de excavación, lote Vila Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila.





Calle 6 No. 7 - 28
Teléfono (8) 8716478
Neiva - Huila.
conenergia_ltda@yahoo.com

29-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Interventoria y Obra, Inspector Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, Ocho ayudantes SISO. Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demoledor, retroexcavadora, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Inicia excavación manual en roca entre los Abs K8+515 a K8+542, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
1:00 pm, continua instalación tuberia PVC 6" RDE21.
2:00 pm, continua el relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena cama tuberia, Recebo y material seleccionado misma exca. vación, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Soleado


25-08-24 Dia Festivo.

26-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, Ocho ayudantes. SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demoledor, retroexcavadora, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación manual en roca entre los Abs K8+542 a K8+569, segun especificaciones y niveles topograficos.
1:00 pm, continua instalación tuberia PVC 6" RDE21.
2:00 pm, continua relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena cama tuberia, Recebo y material seleccionado misma excavación, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
NOTA: Se suministro e instalo codo PVC 22,5° en la

Abs KB+596 y KB+549.
CLIMA: Llovio moderadamente fuerte.

27-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, oleoloder, retomartillo, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavacion manual en roca entre los Abs KB+569 a KB+596, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
1:00 pm, Continua instalacion tuberia 6" PVC RDE21.
2:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena cama tuberia, Recebo y Material seleccionado de la misma excavacion, compactado en capas cada 20cm hasta cota terreno, se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Soleado.

28-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta la dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, oleoloder, retomartillo, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavacion manual en material rocoso entre los Abs KB+596 a KB+623, segun especificaciones tecnicas

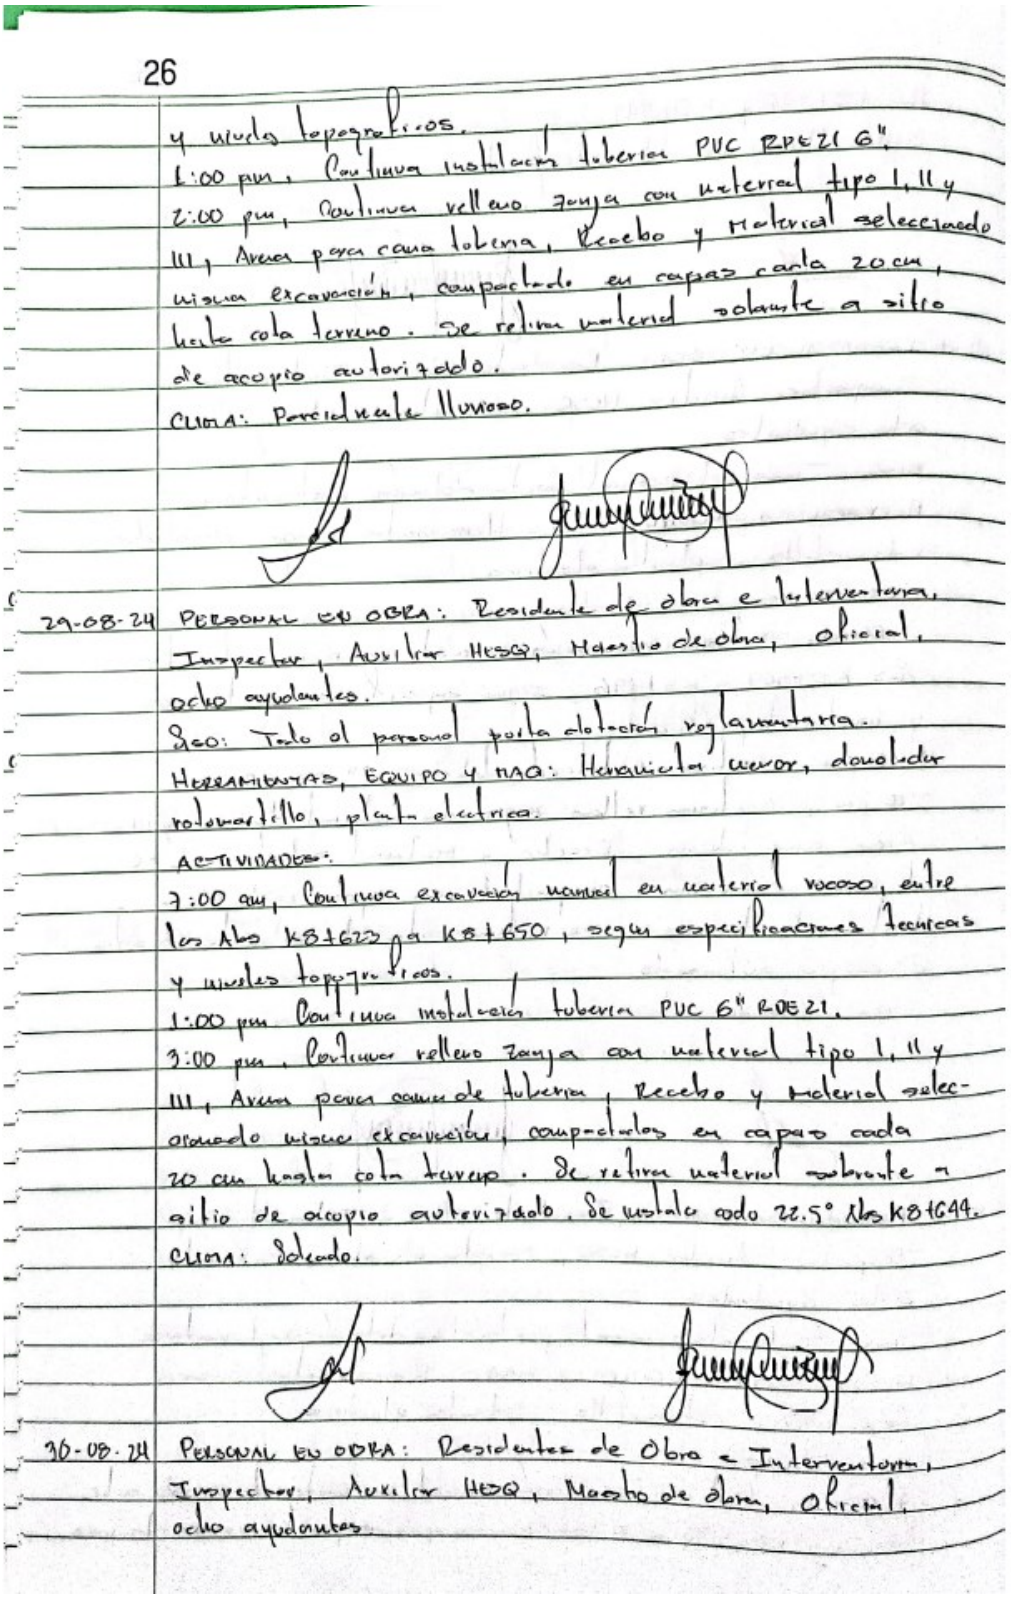

26

y niveles topográficos.
1:00 pm, Continua instalacion tuberia PVC RDE21 6".
2:00 pm, Continuan relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena para cama tuberia, Recebo y material seleccionado mismas excavación, compactado en capas cada 20 cm, hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Parcialmente lluvioso.

29-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residente de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Dotación: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, dosificador rotomartillo, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavacion manual en material rocoso, entre los Abs K8+623 a K8+650, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
1:00 pm Continua instalacion tuberia PVC 6" RDE21.
3:00 pm, Continuan relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena para cama de tuberia, Recebo y material seleccionado mismas excavación, compactados en capas cada 20 cm hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado. Se instala codo 22.5° Abs K8+644.
CLIMA: Soleado.

30-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.

Seguridad: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demoledor rotomartillo, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación manual en material rocoso, entre los Abs K8+650 a K8+677, segun especificaciones tecnicas. y niveles topograficos.
1:00 pm, Continua instalacion tuberia PVC 6" RDE21.
3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena cama tuberia, Recebo, Material seleccionado misma excavación, compactados en capas cada 20 cm hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
CUMA: Solicitado.

31-08-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Dia: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demoledor, rotomartillo, planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua la excavacion manual en roca o material rocoso entre los Abs K8+677 a K8+700, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
10:00 pm, Continua instalacion tuberia PVC 6" RDE21.
11:00 am, Continua relleno zanja con material tipo I, II y III, Arena cama tuberia, Recebo, Material seleccionado misma excavacion, compactados en capas cada 20 cm hasta cota terreno. Se retira material sobrante a sitio de acopio autorizado.
CUMA: Solicitado.

28

1-09-24 Dia Festivo.


2-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residente de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes, topografo.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demoledor rotomartillo, Planta electrica, estación topografica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continuan la localización y replanteo de las valvulas de purga y ventosas ubicadas en las siguientes Abs: K0+010, K0+020, K0+218, K3+735, K3+784, K4+132, K4+340, K6+260, K6+750, K7+095, K7+240, K7+490, K7+640, K7+985 y K8+340.
7:00 am, continuan excavación manual en material conglomerado, para cajas valvulas ubicadas en las Abs K0+616 y K1+120, segun especificaciones tecnicas.
CLIMA: Soleado.

3-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes, topografo.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQ: Herramienta menor, demoledor rotomartillo, planta electrica, estación topografica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua la localización y replanteo de las valvulas purgas o cajuelas ubicadas en las siguientes Abs: K0+068, K0+170, K0+220, K3+695, K4+275, K4+399, K6+165, K8+180, K8+241 y K8+243.
7:00 am, continuan la excavación manual en material conglomerado para cajas valvulas ubicadas en las

Abs K11267 y K1+950, segun especificaciones tecnicas.
CUMA: Soldado.

4.09.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes, topografo.
Dizo: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, demolador rotomartillo, planta electrica, estacion topografica, mezcladora
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua la localizacion y replanteo de estructuras para anclaje de sumideros, ubicados en las Abs K0+300, K0+546, K0+549, K8+649, K9+455, K9+457, K9+50, K9+502, K9+591 y K9+593.
7:00 am, Continuan excavacion en material conglomerado para valvula purga ubicada en la Abs K2+250, segun especificaciones.
10:00 am, se inicia fundicion soldado de limpieza, previa instalacion valvula compuerta.
11:00 am, se instala formaleta para fundicion caja, previa corte, figurado y amarre acero de refuerzo.
2:00 pm, Se funde con concreto 3000 PSI caja valvula con su respectiva tapa.
CUMA: Soldado.

5.09.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes,
Dizo: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, planta electrica, mezcladora ½ bulto.

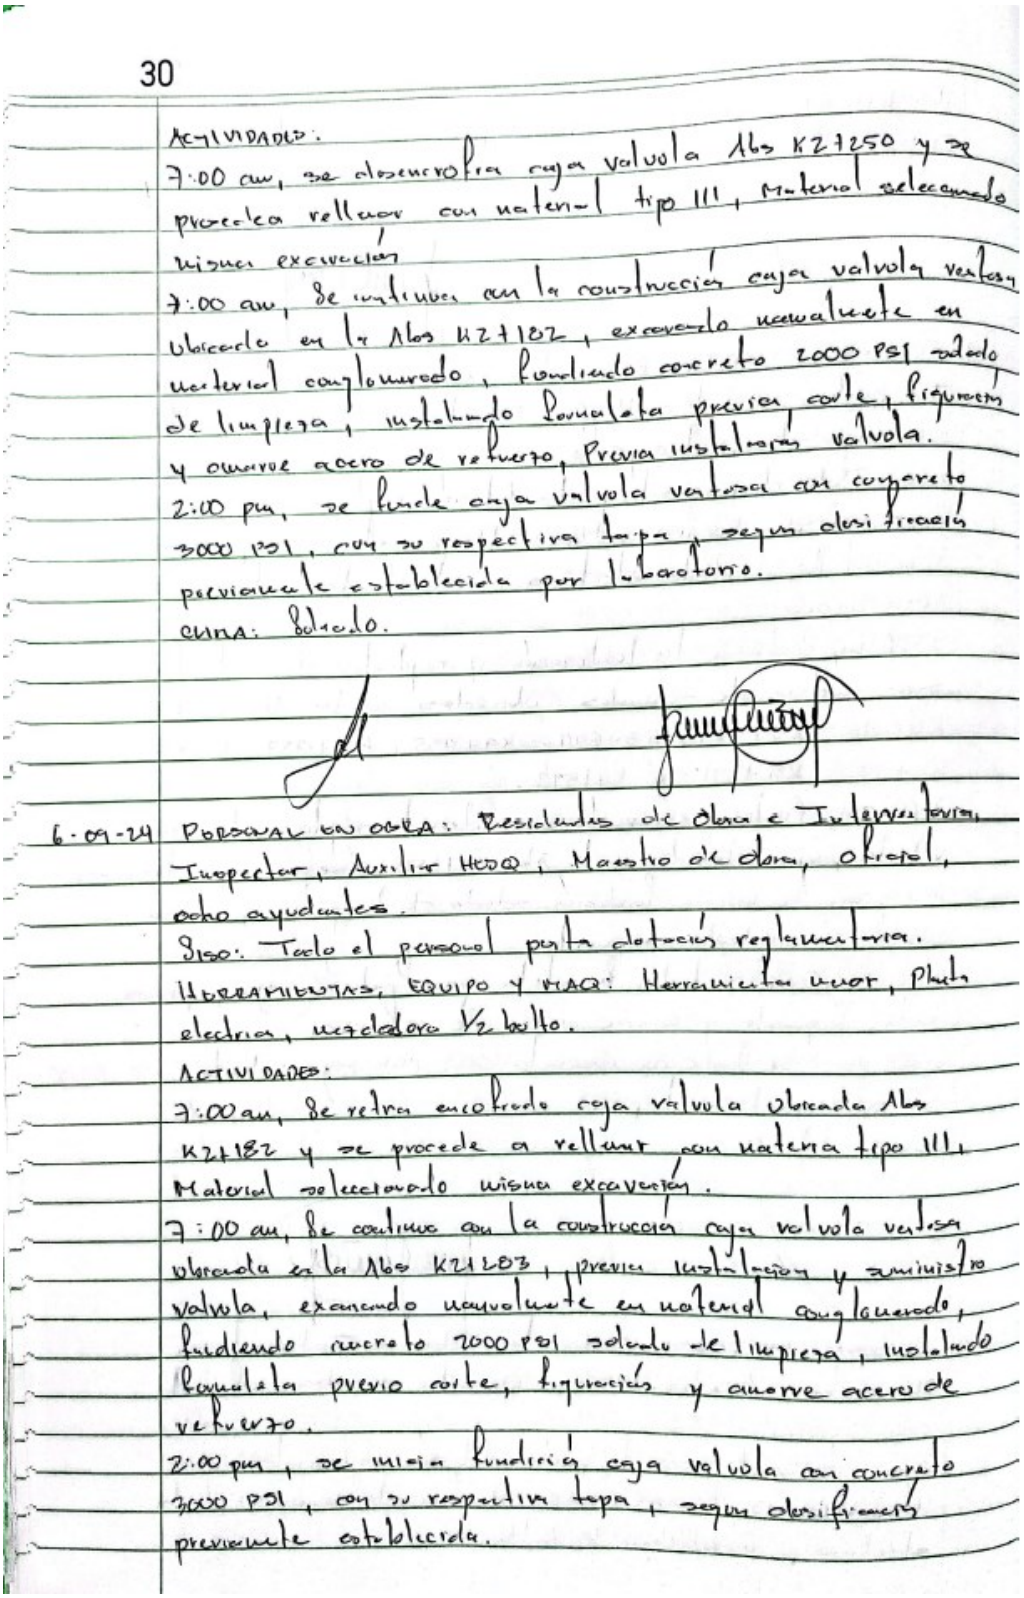

30

ACTIVIDADES:
7:00 am, se descubre la caja valvula Abs KZ1250 y se procede rellenar con material tipo III, Material seleccionado misma excavacion
7:00 am, Se continua con la construccion caja valvula ventosa ubicada en la Abs KZ1182, excavando manualmente en material conglomerado, fundiendo concreto 2000 PSI sobre solado de limpieza, instalando formaleta previo corte, figuracion y amarre acero de refuerzo, Previa instalacion valvula.
2:00 pm, se funde caja valvula ventosa con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun clasificacion previamente establecida por laboratorio.
FIRMA: Soldado.


6-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Dotacion: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, motosoldadora Vz bolito.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada Abs KZ1182 y se procede a rellenar con materia tipo III, Material seleccionado misma excavacion.
7:00 am, Se continua con la construccion caja valvula ventosa ubicada en la Abs KZ1203, previa instalacion y suministro valvula, excavando manualmente en material conglomerado, fundiendo concreto 2000 PSI sobre solado de limpieza, instalando formaleta previo corte, figuracion y amarre acero de refuerzo.
2:00 pm, se inicia fundicion caja valvula con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun clasificacion previamente establecida.

CLIMA: Soleado.

7-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Dotación: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Retroexcavadora V2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se retira encofrado caja valvula ubicada Abs KZ+283 y se procede a rellenar con material tipo III, Material seleccionado misma excavación.
8:00 am, Se continua con la construcción caja valvula ventosa ubicada en la Abs KZ+470, previa instalación y suministro valvula, excavado manualmente en material conglomerado, fundido concreto 2000PSI solado de limpieza, instalando formaleta previa, corte, figuración y amarre acero de refuerzo.
11:00 am, se inicia fundición caja valvula con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun dosificación.
CLIMA: Soleado.

8-09-24 Dia Festivo.

9-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Diso: Todo el personal porta dotación reglamentaria.

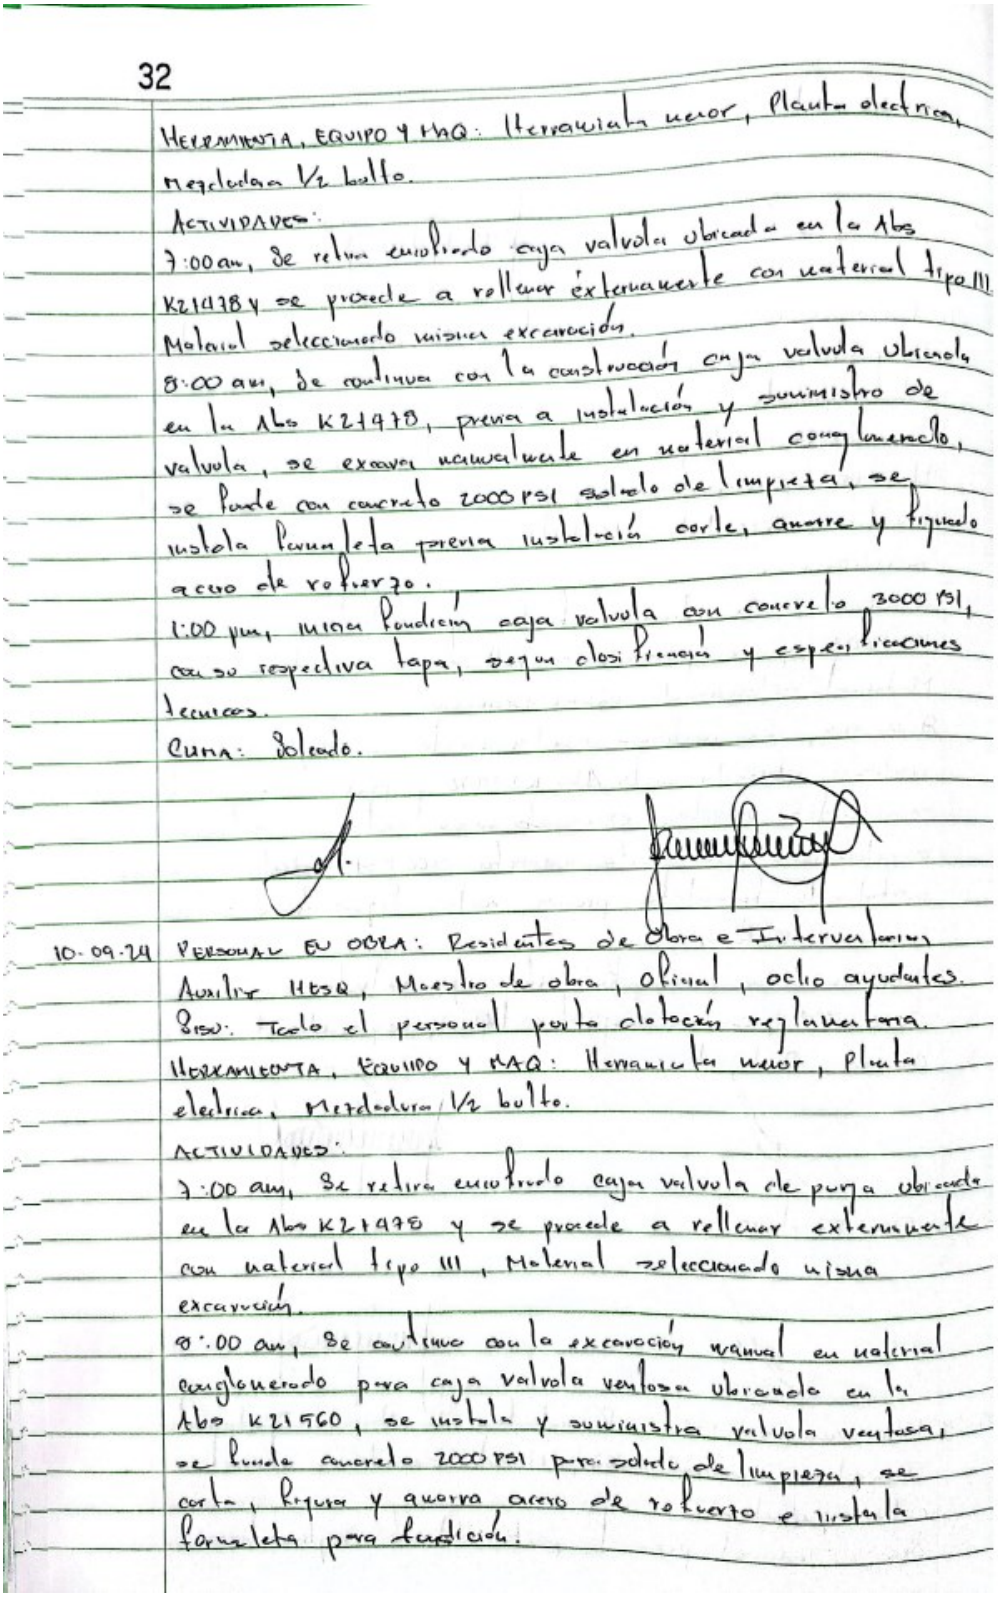

32

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Medidora 1/2 bulto.

ACTIVIDADES:

7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K21478 y se procede a rellenar externamente con material tipo III Material seleccionado misma excavación.

8:00 am, Se continua con la construcción caja valvula ubicada en la Abs K21478, previa a instalación y suministro de valvula, se excava manualmente en material conglomerado, se funde con concreto 2000 PSI solado de limpieza, se instala formaleta previa instalación corte, amarre y figurado acero de refuerzo.

1:00 pm, Misa fundición caja valvula con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun planos y especificaciones tecnicas.

CURA: Soleado.

10.09.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.

SISO: Todo el personal porta elotación reglamentaria.

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Medidora 1/2 bulto.

ACTIVIDADES:

7:00 am, Se retira encofrado caja valvula de purga ubicada en la Abs K21478 y se procede a rellenar externamente con material tipo III, Material seleccionado misma excavación.

8:00 am, Se continua con la excavación manual en material conglomerado para caja valvula ventosa ubicada en la Abs K21960, se instala y suministra valvula ventosa, se funde concreto 2000 PSI para solado de limpieza, se corta, figura y amarra acero de refuerzo e instala formaleta para fundición.

1:00 pm, se funde caja valvula con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun dosificacion y especificaciones tecnicas.
CURA: Soleado.

11-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Mezcladora 1/2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs KZ1560 y se procede a rellenar exteriormente con material tipo III, Material seleccionado mismo excavacion hasta cota terreno.
8:00 am, continua la excavacion manual en material conglomerado para caja valvula de purga o limpieza ubicada en la Abs KZ1700, se funde concreto 2000 PSI para solado de limpieza, se instala y suministra valvula, se corta, figura y amarra acero de refuerzo e instala formaleta para fundirán, segun especificaciones tecnicas.
1:00 pm, se inicia fundicion caja valvula con concreto 3000 PSI con su respectiva tapa, segun dosificacion.
CURA: Soleado.

12-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes
SISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta

34

electrica, Mezcladora 1/2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K2+700 y se procede a rellenar externamente con material tipo III, Material seleccionado misma excavación hasta cota terreno.
8:00 am, continua excavación manual en material conglomerado, para caja valvula ubicada en la Abs K2+950, se funde concreto 2000 PSI sobre solado de limpieza, Valvula previamente instalada y suministrada, se corta, figura y amarra acero de refuerzo e instala formaleta para fundición, segun especificaciones tecnicas.
1:00 pm, se inicia fundición caja valvula con concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun especificación
CLIMA: Lluvia parcial.


13-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes.
Riesgo: Todo el personal porta elementos reglamentarios.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, planta electrica, Mezcladora 1/2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K2+950 y se procede a rellenar externamente con material tipo III, Material seleccionado misma excavación hasta cota terreno.
8:00 am, Continua excavacion manual en material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K3+090, se funde concreto 2000 PSI sobre solado de limpieza, valvula previamente suministrado e instalado, se corta, figura y amarra acero de refuerzo y se instala formaleta para fundición, segun especificaciones tecnicas.

1:00 pm, se inicia fundición caja valvula en concreto 3000 PSI con su respectiva tapa, segun dosificación.
CLIMA: Soleado.

14-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, Ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TAE: Herramienta menor, Planta electrica, Martillo demoledor 1/2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K 3+090 y se rellena con material tipo III, Material de la misma excavación seleccionado, extendido, hasta cota terreno.
8:00 am, Continua excavación manual en material conglomerado para la caja valvula ubicada en la Abs K3+330, se funde concreto 2000PSI para solado de limpieza, valvula previamente suministrada e instalada, se corta, figura y amarra acero de refuerzo y se instala formaleta para fundición segun especificaciones Tecnicas.
11:00 am, se inicia fundición caja valvula en concreto 3000 PSI con su respectiva tapa, segun dosificación.
CLIMA: Lluvia Parcial.

15-09-24 Dia Festivo.

16-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria.

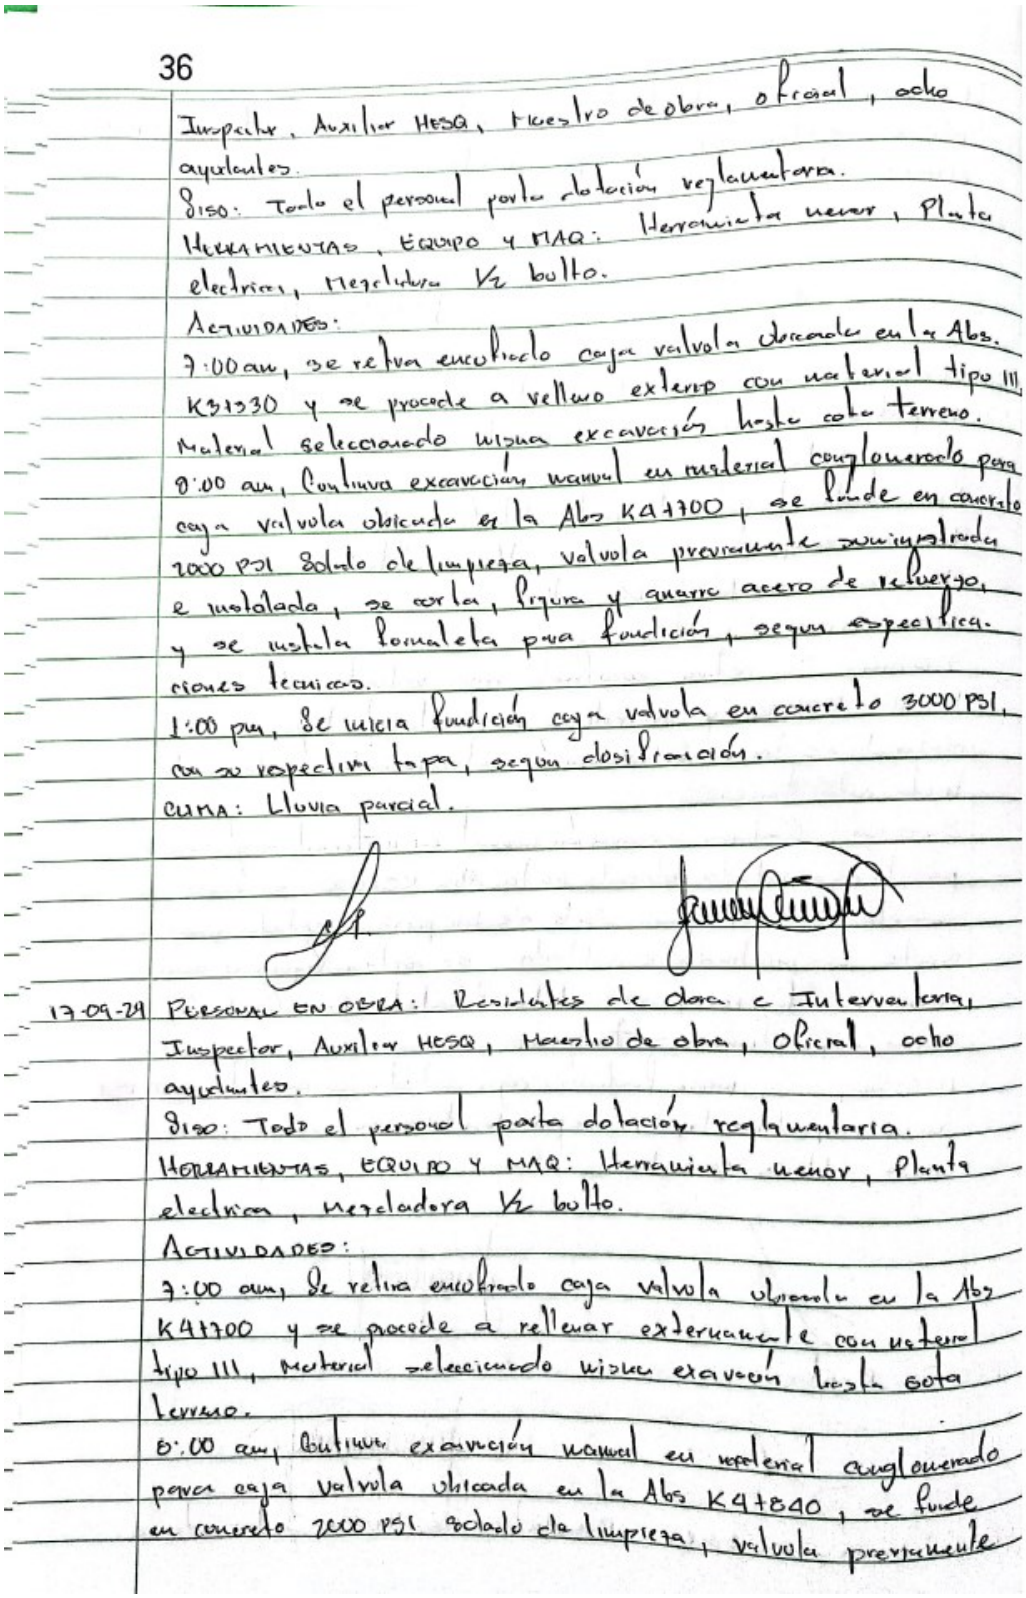

36

Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Mezcladora ½ bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs. K91330 y se procede a relleno externo con material tipo III, Material seleccionado misma excavación hasta cota terreno.
8:00 am, Continua excavación manual en material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K91700, se funde en concreto 2000 PSI solado de limpieza, valvula previamente suministrada e instalada, se corta, figura y amarre acero de refuerzo, y se instala formaleta para fundición, segun especificaciones tecnicas.
1:00 pm, se inicia fundición caja valvula en concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun dosificación.
CLIMA: Lluvia parcial.

17-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Mezcladora ½ bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K91700 y se procede a rellenar exteriormente con material tipo III, material seleccionado misma excavación hasta cota terreno.
8:00 am, Continua excavación manual en material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K91840, se funde en concreto 2000 PSI solado de limpieza, valvula previamente

suministrada e instalada, se corta, figura y guarra acero de refuerzo y se instala formaleta para fundición, segun especificaciones tecnicas.
1:00 pm, se inicia fundición caja valvula en concreto 3000 PSI, con su respectiva tapa, segun dosificación.
CLIMA: Soleado.

10-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica, Megladora 1/2 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se retira encofrado caja valvula ubicada en la Abs K4+300 y se procede a rellenar exteriormente con material tipo III, Material seleccionado misma excavación hasta cota terreno.
8:00 am, Continua excavación manual en material conglomerado para cajas valvulas ubicadas en la Abs K9+390 y K11+900, segun especificaciones tecnicas.
CLIMA: Lluvia parcial.

19-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor, Planta electrica.
ACTIVIDADES:

38

7:00 am, Continua excavación manual en material conglomerado para cajas valvulas ubicadas en las Abs K81240 y K81265, segun especificaciones tecnicas.
CLIMA: Soleado.


20-01-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Bizo: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQ: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K81830 segun especificaciones tecnicas.
NOTA: Se dispone para personal instalación y arreglo cercos afectados frentes de obra.
CLIMA: Lluvia parcial.

21-01-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, ocho ayudantes.
Bizo: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQ: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K81920, segun especificaciones tecnicas.
NOTA: Continua disposición de personal para instalación de puertas y arreglos cercos de propietarios afectados por obras o actividades.


CLIMA: Soleado.



22-07-24 Dia Festivo.



23-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, ocho ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQ: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual material conglomerado para caja valvula ubicada en la Abs K9+320, segun especificaciones tecnicas.
NOTA: Se continua disposicion de personal para instalacion de postes y arreglo cerros en alambre de propietarios afectados por obras o actividades.
CLIMA: Soleado.



24-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial,

SISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQ: Herramienta menor devolador retroexcavadora, Planta electrica.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavacion manual en material rocoso, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30819005
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$15.440.000		30819005

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1035436676	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	ARREDONDO RAMIREZ ALEXANDRA MARCELA	$1.760.000
CC-1075251914	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	CAMPOS MURCIA ADRIANA DEL PILAR	$1.300.000
CC-12126239	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	CERQUERA GUILOMBO JOSE WILLIAM	$1.300.000
CC-1081155462	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	CERVERA PEÑA JOHN FREDY	$1.300.000
CC-1003819875	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	CHARRY TAVERA KIMBERLY	$1.640.000
CC-1117535608	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	CLAROS FIERRO OSCAR ALIRIO	$1.640.000
CC-36069823	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	FIRIGUA RODRIGUEZ RUBIELA	$1.300.000
CC-19486513	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	GUTIERREZ CUELLAR NELSON	$1.300.000
CC-1075541804	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	OLAYA GUILOMBO EDUARD FERNANDO	$1.300.000
CC-1075266765	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	QUINTERO SANCHEZ HAROLD MAURICIO	$1.300.000
CC-1081415763	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RIVERA QUEVEDO STEFANNY	$1.300.000
TI-1138274458	19	No	No	No	41	1	1711001	Salario	VARGAS GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1035436676																													0		
CC - 1075251914																			X	2024-08-01	2024-08-30								0		
CC - 12126239																													0		
CC - 1081155462																													0		
CC - 1003819875																													0		
CC - 1117535608																													0		
CC - 36069823																													0		
CC - 19486513																													0		
CC - 1075541804																													0		
CC - 1075266765																													0		
CC - 1081415763																													0		
TI - 1138274458																													0		
TI - 1138274458																X	2024-08-12	2024-08-14											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1035436676	PORVENIR	30	$1.760.000	0.1600000	$281.600	$0	$0	$281.600	$0	$0	$0
CC - 1075251914	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12126239	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1081155462	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1003819875	COLFONDOS	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 1117535608	COLPENSIONES	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 36069823	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 19486513	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1075541804	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1075266765	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1081415763	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
TI - 1138274458	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TI - 1138274458	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1035436676	SANITAS	30	$1.760.000	0.0400000	$70.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.760.000	1	0.0052200	$9.200
CC - 1075251914	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0000000	$0
CC - 12126239	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600
CC - 1081155462	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600
CC - 1003819875	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.640.000	1	0.0052200	$8.600
CC - 1117535608	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.640.000	1	0.0052200	$8.600
CC - 36069823	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 19486513	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 1075541804	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075266765	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 1081415763	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
TI - 1138274458	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.170.000	0.1250000	$146.300	$0	0	$0	0	$0	27	$1.170.000	1	0.0052200	$6.200
TI - 1138274458	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$130.000	0.1250000	$16.300	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1035436676	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.760.000	0.0400000	$70.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075251914	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12126239	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081155462	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003819875	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117535608	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36069823	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19486513	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075541804	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075266765	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081415763	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1138274458	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1138274458	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	1	$262.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$262.400
COLPENSIONES	6	$1.302.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.302.400
PORVENIR	2	$489.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$489.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$605.800	$0	0	$0	0	$0	$605.800	0	$0	$0	$605.800	$0	0	$0	$0	$605.800	$0	$0	$605.800
SANITAS	3	$174.400	$0	0	$0	0	$0	$174.400	0	$0	$0	$174.400	$0	0	$0	$0	$174.400	$0	$0	$174.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	$229.600	0	$0	$0	$229.600	0	$0	$229.600	0	$0	$0	$229.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$565.600	0	$0	$565.600
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$780.200
PENSIONES	4	$2.470.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$229.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$565.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.045.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30633249
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM PARRA OLAYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12123891	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 6 52	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3153217351
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	obras
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30633249

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12123891	59	No	No	No	41	1	1711001	Salario	PARRA OLAYA WILLIAM	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12123891																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12123891	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$377.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30819097
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	32	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 23 ACU FASE II ALTAMIRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$4.000.000		30819097

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7714850	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	LUNA GASCA LUIS IVAN	$2.700.000
CC-1082129987	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	POLANCO PARRA VALENTINA	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7714850																													0		
CC - 1082129987																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7714850	COLPENSIONES	30	$2.700.000	0.1600000	$432.000	$0	$0	$432.000	$0	$0	$0
CC - 1082129987	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7714850	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.700.000	5	0.0696000	$188.000
CC - 1082129987	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7714850	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082129987	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
COLPENSIONES	1	$432.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$432.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$108.000	$0	0	$0	0	$0	$108.000	0	$0	$0	$108.000	$0	0	$0	$0	$108.000	$0	$0	$108.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$278.500	0	$0	$0	$278.500	0	$0	$278.500	0	$0	$0	$278.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$160.000	0	$0	$160.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$160.000
PENSIONES	2	$640.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$278.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$160.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.238.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30639907
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER RODRIGUEZ LOSADA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83057718	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 N 8A 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4799	CORREO ELECTRÓNICO	NECA_LUNA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8321097
FAX	8321097	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30639907

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83057718	03	No	No	No	41	319	0	Salario	RODRIGUEZ LOSADA ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83057718																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83057718	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83057718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83057718	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$370.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30826463
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	TALENTOHUMANO@CONENERGIA.CO	TELÉFONO	8716478
FAX	8716478	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	solo arl
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30826463

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83057718	59	4	No	No	41	26	5711001	Salario	RODRIGUEZ LOSADA ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83057718																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83057718	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83057718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83057718	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	0	$0	$90.500	0	$0	$0	$90.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$90.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$90.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30819223
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	39	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 ACU ALTAMIRA FASE II OPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
15		$14.430.003		30819223

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007616948	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	ACUÑA AGUILERA ALBERTO DE JESUS	$1.300.000
CC-6009055	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	CAMELO JOSE ALIRIO	$1.300.000
CC-83239835	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	CASTRO JIMENEZ GERMAN EDUARDO	$1.300.000
CC-39670633	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	CUELLAR LOSADA MARTHA CECILIA	$1.300.000
CC-1083889705	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	DUARTE ZAMBRANO RUBEN DARIO	$1.300.000
CC-1077857421	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	GOMEZ BERNAL ROBINSON	$1.300.000
CC-1110586146	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	GOMEZ CAPIZ JEFFERSON	$1.300.000
PT-6207020	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	GUEVARA RIVERO JORGE LUIS	$1.300.000
CC-83058468	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RAMIREZ PLAZAS JOSE ALONSO	$1.300.000
CC-1082124660	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ CUELLAR JHOAN ALEXIS	$1.300.000
CC-83058277	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ LOSADA JAIDER	$1.300.000
CC-1030692804	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RUIZ PERLAZA JOSE YAHIR	$1.300.000
CC-1003993933	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	SANCHEZ RAMOS MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-12207053	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	TRIVIÑO EFRAIN	$1.300.000
CC-1078246615	01	No	No	No	41	319	5422001	Fijo	VARGAS DURAN CRISTIAN	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1007616948																													8	2024-08-12	2024-08-19
CC - 1007616948			X	2024-08-24																									0		
CC - 6009055																													0		
CC - 83239835																													0		
CC - 39670633	X	2024-08-13	X	2024-08-13																									0		
CC - 1083889705	X	2024-08-13																											0		
CC - 1077857421	X	2024-08-02																											0		
CC - 1110586146																													0		
PT - 6207020																													0		
CC - 83058468																													0		
CC - 1082124660																													0		
CC - 83058277																													0		
CC - 1030692804			X	2024-08-24																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC – 1003993933			X	2024-08-13																									0		
CC – 12207053			X	2024-08-12																									0		
CC – 1078246615	X	2024-08-13	X	2024-08-14																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC – 1007616948	COLFONDOS	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC – 1007616948	COLFONDOS	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC – 6009055	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 83239835	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 39670633	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC – 1083889705	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC – 1077857421	PORVENIR	29	$1.256.667	0.1600000	$201.100	$0	$0	$201.100	$0	$0	$0
CC – 1110586146	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT – 6207020	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 83058468	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 1082124660	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 83058277	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC – 1030692804	COLFONDOS	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC – 1003993933	COLPENSIONES	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC – 12207053	PROTECCION	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC – 1078246615	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC – 1007616948	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	5	0.0000000	$0
CC – 1007616948	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	5	0.0696000	$48.300
CC – 6009055	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83239835	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 39670633	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	5	0.0696000	$3.100
CC - 1083889705	COMPENSAR-EPS	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	5	0.0696000	$54.300
CC - 1077857421	EPS-S AIC CAUCA	29	$1.256.667	0.0400000	$50.300	$0	0	$0	0	$0	29	$1.256.667	5	0.0696000	$87.500
CC - 1110586146	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
PT - 6207020	EPS-S AIC CAUCA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83058468	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1082124660	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83058277	EPS-S EMSSANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1030692804	SALUD TOTAL	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	5	0.0696000	$72.400
CC - 1003993933	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	5	0.0696000	$39.300
CC - 12207053	ESSC ASMET SALUD	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	5	0.0696000	$36.200
CC - 1078246615	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	5	0.0696000	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007616948	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$346.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007616948	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6009055	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83239835	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-39670633	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083889705	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077857421	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$1.256.667	0.0400000	$50.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110586146	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6207020	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058468	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082124660	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058277	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030692804	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003993933	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12207053	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246615	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	9	$1.386.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.386.800
COLFONDOS	3	$540.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$540.900
COLPENSIONES	1	$90.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$90.200
PROTECCION	2	$291.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$291.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$20.800	$0	0	$0	0	$0	$20.800	0	$0	$0	$20.800	$0	0	$0	$0	$20.800	$0	$0	$20.800
EPS-S EMSSANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$203.000	$0	0	$0	0	$0	$203.000	0	$0	$0	$203.000	$0	0	$0	$0	$203.000	$0	$0	$203.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$22.600	$0	0	$0	0	$0	$22.600	0	$0	$0	$22.600	$0	0	$0	$0	$22.600	$0	$0	$22.600
EPS-S AIC CAUCA	2	$102.300	$0	0	$0	0	$0	$102.300	0	$0	$0	$102.300	$0	0	$0	$0	$102.300	$0	$0	$102.300
SALUD TOTAL	2	$93.600	$0	0	$0	0	$0	$93.600	0	$0	$0	$93.600	$0	0	$0	$0	$93.600	$0	$0	$93.600
COMPENSAR-EPS	1	$31.200	$0	0	$0	0	$0	$31.200	0	$0	$0	$31.200	$0	0	$0	$0	$31.200	$0	$0	$31.200
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	15	$980.700	0	$0	$0	$980.700	0	$0	$980.700	0	$0	$0	$980.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$563.600	0	$0	$563.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$577.500
PENSIONES	4	$2.309.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$980.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$563.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.430.900

HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO., LTD.

CHEMICAL ANALYSIS AND MECHANCIAL TEST CERTIFICATE

EN 10204-3.1B

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Anex 1,Paragraph 4.3(Cert.No. 01202 CHN/Q-I7 0602)

Certificate No :XFCH3021081

Invoice No :XFCSS22-02A **Date of report:April.08.2022**

Goods Description: FLANGE **Mark of Manufacturer: XF**

Material : ASTM/ASME A105 **AD2000 -W0 W 9**

Dimension standard according to ANSI B16.5

Item No.	Quantity	Description/Artical	Heat No.	Specimen No
10	140	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 5"	6531	HBXF21070976
11	400	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 6"	6531	HBXF21070976
12	600	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 8"	6531	HBXF21070976
13	200	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 10"	6532	HBXF21070977
14	200	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 12"	6532	HBXF21070977
15	80	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 14"	6532	HBXF21070977
16	80	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 16"	6533	HBXF21070978
17	15	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 18"	6533	HBXF21070978
18	20	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 20"	6533	HBXF21070978
19	10	FLANGES SLIP-ON R.F. 150LBS 24" CLASE A RF	6533	HBXF21070978

Chemical Analysis: (%)

Heat No.	C%	Si%	Mn%	Cr%	P%	S%	Cu	Ni	Mo	V	C.E. %
Min		**0.100**	**0.60**								
Max	**≤0.35**	**≤0.35**	**1.05**	**≤0.3**	**≤0.035**	**≤0.04**	**≤0.4**	**≤0.4**	**≤0.12**	**≤0.08**	
6531	0.140	0.180	0.750	0.190	0.020	0.022	0.180	0.210	0.058	0.026	0.346
6532	0.15	0.18	0.68	0.17	0.018	0.020	0.21	0.20	0.056	0.026	0.3411
6533	0.16	0.16	0.70	0.20	0.021	0.023	0.18	0.21	0.055	0.023	0.3583

Specimen No.	A370-2007						Energy of impact test / Charpy size / 10mm×10mm×55mm / **Test Temp -20℃**			
	Test temp	Yield strength	Tensile Strength	Elongation	Reduction of area	Hardness	Joule(>27)			
		ReH N/mm²	Rm N/mm²	A %	Z %	HB				
	℃/RT	**250 MIN**	**485 MIN**	**22 MIN**	**30MIN**	**187MAX**	**1**	**2**	**3**	**∑/N**
HBXF21070976	20	268	554	31	39	162	28	30	30	29
HBXF21070977		260	558	30	40	163	29	30	27	29
HBXF21070978		264	560	29	38	160	28	29	30	29
Heat-Treatment:		solution annealed temperature 1050°C Holding Time 30 mins Cooling in water			Remarks:					

RT : room temperature

Visual inspection: Without Complaint

Dimensional check : Without Complaint

Surface crack inspection: Without Complaint

河北鑫丰高压法兰管件有限公司
HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO., LTD.
张根泉

We hereby certify that the materials described herein have been manufactured, inspected and tested in accordance with the customer's specification(s),and that they satisfy the requirements.

Manufacturer:HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE
AND PIPE FITTING CO., LTD.

Shandong Molong Petroleum Machinery Co.Ltd

Mill Test Certificate

ADD No.999,WenshengStreet,Shouguang,Shandong,P.R.China,Post Code:262700 www.molonggroup.com

NO.(编号)：QZJ/LTGBLCH211030-2021 **DATE ：DEC-08-2021**

CLENT				PO.NO/CONTRACT.NO		BLCH211030		CONTRACT REV.NO		BLCH211030		STANDARD		ASTM A106/ASTM A53/ ASME B 36,10								
PRODUCT	SEAMLESS LINE PIPE			GRADE*5		GR B		MAKING PROCESS		HOT ROLLING SEAMLESS		DELIVERY		Normalized		Type*4		QUANTITY		199.96 MT		
ITEM NO.	Size			Chemical Composition (%)														AUT-L4 (Body)	M.P.I. (End)	Hydrostatic test (13.3Mpa≥ 6S)	Visual&Dimensional inspection	Weight
				C 0.17-0.23	Si 0.17-0.37	Mn 0.35-0.65	P ≤0.035	S ≤0.035	Cr ≤0.25	Ni ≤0.30	Mo ≤0.15	Ti	V	Cu ≤0.25	Al	Nb	B ≤0.001	V+Nb+Ti ≤0.15					
1	60.3	3.91	6	0.19	0.24	0.40	0.015	0.007	0.078	0.049	0.011	0.0007	0.0002	0.037	0.02	0.0001	0.0002	0.0008	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
2	73	5.16	6	0.18	0.26	0.41	0.018	0.012	0.047	0.044	0.013	0.0007	0.0002	0.071	0.019	0.0001	0.0002	0.0006	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
3	88.9	5.49	6	0.19	0.25	0.37	0.015	0.007	0.060	0.031	0.013	0.0006	0.0001	0.079	0.022	0.0001	0.0002	0.0009	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
4	114.3	6.02	6	0.18	0.24	0.42	0.017	0.011	0.043	0.047	0.015	0.0005	0.0002	0.084	0.021	0.0001	0.0002	0.0011	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted

Descriptions of Delivery					Tensile Test					Impact Test							Hardness Test		
Item	Heat No.	Lot No.	Weight	Pcs	Specimen Type *1	Gauge Length(mm)	T.S Mpa	Y.S Mpa	E.L	Specimen Type*3	Temperature Kcv (℃)	Transverse			Longitudinal		Hardness Test (HV10)	Residual magnetism ≤30Gs	Thickness
							530-410	≥245	≥20.0			Unit Value	Average value	Shear Area	Unit Value	Shear Area			
1	103679	H19-10-85	50.00	1532	A3	50	513	350	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
2	P4732	H20A47892	50.02	966	A3	50	491	302	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
3	P5472	H20A97423	49.99	738	A3	50	505	304	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
4	P6642	H20A57834	49.95	518	A3	50	516	326	27	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
TOTAL			199.96	3754															

Other Inspecting Items其它检验项目											
Drift Test	Accepted	HIC	-	SSC	-	Nonmetallic inclusion	-	Grain Size	-	SOHIC	-

NOTES *1：Strip：A1-12.5，A2-25，A3-38.1;*2：Round Bar：B1-12.7,B2-8.9; *3：Impact Specimen：C1-10*10*55，C2-10*7.5*55，C3-10*5*55;*4：P-Product Analysis；*5:Steel Marking

WE HERE CERTIFY THAT THE PRODUCTS HEREIN DESCRIBED HAS BEEN MANUFACTURE、 SAMPLED TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT OF PROCURMENT SPECIFICATION FOR SEAMLESS LINE PIPE AND BUYER'S PURCHASE ORDER CONTRACT.

山东石油机械股份有限公司 质量证明书 专用章

Prepared By:魏 佳 **Approved：吕 紫 玉** **TPI：** **PAGE: 1 OF 1**

Shandong Molong Petroleum Machinery Co.Ltd

Mill Test Certificate

ADD No.999,WenshengStreet,Shouguang,Shandong,P.R.China,Post Code:262700 www.molonggroup.com

NO.(编号)：QZJ/LTGBLCH211030-2021 **DATE ：DEC-08-2021**

				PO.NO/CONTRACT.NO		BLCH211030		CONTRACT REV.NO		BLCH211030		STANDARD		ASTM A106/ASTM A53/ ASME B 36,10									
PRODUCT		SEAMLESS LINE PIPE		GRADE*5		GR B		MAKING PROCESS		HOT ROLLING SEAMLESS		DELIVERY		Normalized		Type*4		QUANTITY		199.96 MT			
ITEM NO.	Size			Chemical Composition (%)														AUT-L4 (Body)	M.P.I. (End)	Hydrostatic test (13.3Mpa≥ 6S)	Visual&Dimensional inspection	Weight	
				C 0.17-0.23	Si 0.17-0.37	Mn 0.35-0.65	P ≤0.035	S ≤0.035	Cr ≤0.25	Ni ≤0.30	Mo ≤0.15	Ti	V	Cu ≤0.25	Al	Nb	B ≤0.001	V+Nb+Ti ≤0.15					
1	60.3	3.91	6	0.19	0.24	0.40	0.015	0.007	0.078	0.049	0.011	0.0007	0.0002	0.037	0.02	0.0001	0.0002	0.0008	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
2	73	5.16	6	0.18	0.26	0.41	0.018	0.012	0.047	0.044	0.013	0.0007	0.0002	0.071	0.019	0.0001	0.0002	0.0006	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
3	88.9	5.49	6	0.19	0.25	0.37	0.015	0.007	0.060	0.031	0.013	0.0006	0.0001	0.079	0.022	0.0001	0.0002	0.0009	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
4	114.3	6.02	6	0.18	0.24	0.42	0.017	0.011	0.043	0.047	0.015	0.0005	0.0002	0.084	0.021	0.0001	0.0002	0.0011	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted	Accepted

Descriptions of Delivery					Tensile Test					Impact Test							Hardness Test		
Item	Heat No.	Lot No.	Weight	Pcs	Specimen Type *1	Gauge Length(mm)	T.S Mpa	Y.S Mpa	E.L	Specimen Type*3	Temperature Kcv (℃)	Transverse			Longitudinal		Hardness Test (HV10)	Residual magnetism ≤30Gs	Thickness
							530-410	≥245	≥20.0			Unit Value	Average value	Shear Area	Unit Value	Shear Area			
1	103679	H19-10-85	50.00	1532	A3	50	513	350	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
2	P4732	H20A47892	50.02	966	A3	50	491	302	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
3	P5472	H20A97423	49.99	738	A3	50	505	304	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
4	P6642	H20A57834	49.95	518	A3	50	516	326	27	-	-	-	-	-	-	-	-	Accepted	Accepted
TOTAL			199.96	3754															

Other Inspecting Items其它检验项目											
Drift Test	Accepted	HIC	-	SSC	-	Nonmetallic inclusion	-	Grain Size		SOHIC	-

NOTES *1：Strip：A1-12.5，A2-25，A3-38.1;*2：Round Bar：B1-12.7,B2-8.9; *3：Impact Specimen：C1-10*10*55，C2-10*7.5*55，C3-10*5*55;*4：P-Product Analysis；*5:Steel Marking

WE HERE CERTIFY THAT THE PRODUCTS HEREIN DESCRIBED HAS BEEN MANUFACTURE、 SAMPLED TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT OF PROCURMENT SPECIFICATION FOR SEAMLESS LINE PIPE AND BUYER'S PURCHASE ORDER CONTRACT.

山东石油机械股份有限公司 质量证明书 专用章

Prepared By:魏 佳 **Approved：吕 紫 玉** **TPI：** **PAGE: 1 OF 1**

APOLO

PROTOCOLO DE CALIDAD

CONTROL DEL PROCESO
INSPECCION DE PRUEBA DEL PRODUCTO

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S A S
CRA 42 # 29A 49 . ITAGUI - ANTIOQUIA
TEL 4482422 . FAX 2775598


CLIENTE: TODOVALVULAS SAS
DIRECCION: TRASV.4B SUR N 32B 39 **CUIDAD:** ENVIGADO
TELEFONO: 3005738543 **NIT:** 811045694
OV-031969
DESCRIPCION/ PRODUCTO: ACCESORIO EN HIERRO NODULAR
NORMA: AWWA C- 110 - C 153
TIPO DE EXTREMO: LISO/PVC
OPERACIÓN PARA ACOPLAR CON JUNTA RAPIDA

4	TEE 8X3 JR PVC H.D SERIE: 13037-13040
5	TEE 8X2 E.BDA CL-25 SERIE: 16880-16884
4	TEE 8X3 JR PVC H.D SERIE: 17687-17690

PRUEBA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	METODO
CUERPO	METALOGRAFICO	HIERRO NODULAR	PROC.CONTROLADO PROVEED.	ASTM A-536
CUERPO	PRUEB. HIDROS	ALEATORIA	400 PSI	AWWA C 153
PINTURA	N/A	EPOXICA ALTOS SOLIDOS	CUMPLIM RESOL 0501	AWWA C-550
APARIENCIA	**EXCELENTE**			

SUPERVISOR MAGDALENA JAIMES
FECHA DE EMISION VoBo 24-sep-24
CORDIALMENTE,



EDISON CARDONA
LOGISTICA Y DESPACHOS

NOTA: Si tiene alguna duda encuanto al producto favor comunicarce con la Gerencia Comercial.

MEDELLIN. TEL 4482422. FAX 2775598. CRA 42 # 29A 49 . ITAGUI-ANTIOQUIA.
*BOGOTA. TELS : 3607053/23/41/57- Fax (051) 277 82 43 PALO QUEMAO
*BARRANQUILLA. TEL; 349 1312- Fax 379 30 28
*E-mail : apolofluidos@epm.net.co

* Para tramitar una garantia, se requiere de comunicación escrita informando producto, No factura y objeto del reclamo, Ademas la parte del producto.
>>Este producto fue chequeado de acuerdo con el instructivo SGC 4709, el cual esta basado en la norma AWWA C-515 .

PROTOCOLO DE CALIDAD

CONTROL DEL PROCESO
INSPECCION DE PRUEBA DEL PRODUCTO

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S A S
CARR 42 # 29A 49 ITAGUI ANTIOQUIA
4482422. FAX 2775598

CLIENTE: TODOVALVULAS SAS
DIRECCION: TRASV.4B SUR N 32B 39 **CUIDAD:** ENVIGADO
TELEFONO: 3005738543 **NIT:** 811045694
OV-031969
DESCRIPCION: ACCESORIO EN ACERO SAE 1016
NORMA: AWWA C-219
TIPO DE EXTREMO: UNION DRESSER
OPERACIÓN: PARA ACOPLAR LISO


3	UNION CONSTRUCCION 8" JR SERIE: 13029-13031
1	UNION CONSTRUCCION 6" JR SERIE: 17686
3	UNION CONSTRUCCION 8" JR SERIE: 17683-17685

PRUEBA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO		METODO
BARRIL	PRUEB. HIDROS	250 PSI	1.4 Mpa :200psi	OK	AWWA C-219
BRIDAS	METAL/, COMP QUIMICA	ACERO SAE 1006	PROC.CONTROLADO PROVEED.		ASTM A - 536
EMPÁQUES	N/A	EPDM	OK		AWWA C-219
TORNILLERIA	N/A	ACERO GALVANIZADO	OK		AISI 304 ASTM A-307
PINTURA	N/A	EPOXICA NEGRA ALTOS SOLIDOS	APROX. 20 MICRAS		AWWA C - 550
APARIENCIA	**EXCELENTE**				

SUPERVISOR MAGDALENA JAIMES
FECHA DE EMISION VOBO 24/09/2024

CORDIALMENTE,



EDISON CARDONA
LOGISTICA Y DESPACHOS

NOTA: Si tiene alguna duda encuanto al producto favor comunicarce con la Gerencia Comercial.

MEDELLIN: 4482422. FAX 2775598. CRA 42 # 29A 49. ITAGUI-ANTIOQUIA.

*BOGOTA. TELS : 3607053/23/41/57- Fax (051) 277 82 43 PALO QUEMAO

*BARRANQUILLA. TEL; 349 1312- Fax 379 30 28

*E-mail : apolofluidos@epm.net.co

* Para tramitar una garantia, se requiere de comunicación escrita informando producto, No factura y objeto del reclamo, Ademas la parte del producto.

>>Este producto fue chequeado de acuerdo con el instructivo SGC 4715, el cual esta basado en la norma AWWA C-219.

APOLO

PROTOCOLO DE CALIDAD

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S A S
KRA 42 29A 49. ITAGUI. ANTIOQUIA
TEL 4482422. FAX 2775598.

CONTROL DEL PROCESO
INSPECCION DE PRUEBA DEL PRODUCTO

CLIENTE: TODOVALVULAS SAS
DIRECCION: TRASV.4B SUR N 32B 39 **CUIDAD:** ENVIGADO
TELEFONO: 3005738543 **NIT:** 811045694
OV-030425
DESCRIPCION/ PRODUCTO: VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCCION
NORMA: AWWA C-512
TIPO DE EXTREMO: BRIDADA

FECHA DE CHEQUEO	CANTIDAD	Número de serie para la trazabilidad
4-abr-2024	15	VLA VENTOSA 2" ANTIFRA T.A D.C BRIDA SERIE: 04642 - 04656

PRUEBA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO		METODO
			BAJA PRES.	ALTA PRES.	
VALVULA	PRUEB. HIDROS	250 PSI (PT)	50-150 PSI	150-500 PSI	AWWA C 512
CPO VALVULA	METALOG-QUIM.	HIERRO NODULAR	CERTIF. CALIDAD PROVEEDOR		ASTM A-536
TORNILLERIA	N/A	ACERO INOXIDABLE	OK		AISI 304 - ASTM A-307
PINTURA	N/A	EPOX. ALTOS SOLIDOS	OK		AWWA C550
O-RING, SELLOS	N/A	NITRILO-EPDM	OK		ASTM D-2000
APARIENCIA	EXCELENTE				

SUPERVISOR MAGDALENA JAIMES
FECHA DE EMISION VoBo 1/10/2024

CORDIALMENTE,

Magdalena Jaimes

MAGDALENA JAIMES
ING. CALIDAD APOLO

NOTA: Si tiene alguna duda encuanto al producto favor comunicarce con la Gerencia Comercial.

MEDELLIN: 4482422. FAX 2775598.CRA 42 # 29A 49. ITAGUI-ANTIOQUIA.
*BOGOTA. TELS : 3607053/23/41/57- Fax (051) 277 82 43 PALO QUEMAO
*BARRANQUILLA. TEL; 349 1312- Fax 379 30 28
*E-mail : apolofluidos@epm.net.co

* Para tramitar una garantia, se requiere de comunicación escrita informando producto, No factura y objeto del reclamo, Ademas la parte del producto.

>>Este producto fue chequeado de acuerdo con el instructivo SGC 4709, el cual esta basado en la norma AWWA C-512 .
