Popayán, septiembre 30 de 2024

Sres.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
Doctora **LUCELY GUTIERREZ TAO**
Supervisora del contrato
Cra 7 No. 1N – 28, Edificio Edgar Negret
Popayán, Cauca

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato 571-2023

REFERENCIA: **Contrato N° 0571-2023** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Estimada doc., LUCELY GUTIERREZ TAO

Yo, **EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Contratista del contrato 0571-2023, de la manera más atenta me permito solicitar la reanudación del contrato de la referencia lo antes posible, dado el valor estratégico y los beneficios mutuos que representa para ambas partes, dadas las siguientes condiciones:

A. Mediante comunicación de fecha 29 de diciembre de 2023, el **CONTRATISTA**, solicitó la suspensión del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el motivo que en resumen concluye lo siguiente:

   Cuando se inicia la actividad de la adecuación y mejoramiento de la cubierta de la sede Norte, se ha presentado unas lluvias torrenciales en la zona de trabajo, lo que impidió en principio el desmonte de las tejas, por tal motivo fue necesario suspender actividades para proteger la vida de los trabajadores.

   El clima presente durante la ejecución del contrato se ha presentado muy lluvioso, lo cual dificulta y disminuye el rendimiento del proyecto.

B. El contrato 571-2023 fue suspendido el 29 de diciembre de 2023, no se ha podido reiniciar debido a diferentes circunstancias que imposibilitaron su continuación, para esto es pertinente mencionar que el mismo se desarrolla en el Municipio de La Vega y en Santander de Quilichao y las razones diversas presentadas están asociadas a problemas de orden público durante el primer semestre del año 2024 y los taponamientos por paros


constantes en las vías, lo que hacía que se imposibilitara el transporte de materiales y el desplazamiento del personal.

C. Se informa que, durante el mes de septiembre de 2023, se desarrollaron actividades específicamente en la sede de la DT Macizo y se compraron los materiales no perecederos para la ejecución del contrato, alcanzando un avance del 70% en la ejecución (ver anexo 01- acta parcial N1).

D. Según datos del consejo Gremial del Cauca, lo que va corrido del año 2024, se han presentado 42 bloqueos en la vía panamericana, lo que significa unos 4.5 bloqueos por mes, lo que ha generado cuantiosas perdidas para los empresarios del país, en particular dificultado el transporte y venta de suministros de materiales para el desarrollo de la obra en el municipio de Santander de Quilichao. (https://www.elpais.com.co/economia/empresarios-de-gastronomia-y-hoteleros-de-popayan-revelan-las-afectaciones-por-los-continuos-bloqueos-en-la-via-panamericana-0734.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20Consejo%20Gremial,de%20esta%20zona%20del%20pa%C3%ADs). Anexo 2.

A razón de lo anterior y dadas las actuales condiciones técnicas y logísticas para el desarrollo del trabajo en las sedes de la CRC localizadas en los Municipios de Santander de Quilichao y La Vega, como contratista del contrato 571-2023 de la manera más atenta me permito solicitar la prórroga del contrato de la referencia, así mismo Teniendo en cuenta lo anterior, y tratándose de situaciones no previsibles por las partes, se estima que un tiempo de **22 días** adicional para dar conclusión a las actividades.

De lo anterior manifiesto que mi equipo está listo para continuar las labores según lo establecido en el contrato original, y estamos abiertos a cualquier ajuste o modificación que se requiera para garantizar el éxito de este proyecto conjunto.
Cordialmente,



EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ
CONTRATISTA
C. C. No.: 1.061.721.107 de Popayán
Correo electrónico: eduardoglopez13@gmail.com

ANEXO 01- acta parcial 1

ARQUITECTO EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: FARPFO - PGJ

Versión 1

CONTRATO No. 0571-2023	PLAZO 10 DIAS	INICIACION 20/12/2023	VENCIMIENTO 31/12/2023	V/R CONTRATO PRINCIPAL 114,734,375	VALOR ADICIONAL OTRO SI $ -	ACTA No. 001 PARCIAL
SUSPENSIÓN Nro. N.1 : 29/12/2023				VALOR TOTAL		
REINICIO Nro. N.1	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114,734,375		PARCIAL x

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA:EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c:1,061,721,107

SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO


FINAL

FECHA: 17/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION			CANTIDAD EJECUTADA					
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
	SEDE MAZICO LA VEGA CAUCA													
1	Rasqueteado de muros	M2	60,00	$ 4.036	$ 242.160		0,00	$ -	0	$ -	60,00	$ 242.160		$ 242.160
2	Demolición de pisos y enchapes	m2	125,00	$ 13.721	$ 1.715.125		0,00	$ -	0	$ -	125,00	$ 1.715.125		$ 1.715.125
3	Retiro de escombros, incluye cargue a mano	M3	14,00	$ 35.000	$ 490.000		0,00	$ -	0	$ -	14,00	$ 490.000		$ 490.000
4	Repello con mortero 1:3	m2	30,00	$ 28.375	$ 851.250		0,00	$ -	0	$ -	30,00	$ 851.250		$ 851.250
5	Enlucido para muros	m2	125,00	$ 7.276	$ 909.500		0,00	$ -	0	$ -	125,00	$ 909.500		$ 909.500
6	Pintura para muros en vinilo tipo 1	m2	315,00	$ 10.194	$ 3.211.047		0,00	$ -	0	$ -	315,00	$ 3.211.047		$ 3.211.047
7	Mortero para nivelación de pisos	m2	118,00	$ 24.733	$ 2.918.494		0,00	$ -	0	$ -	118,00	$ 2.918.494		$ 2.918.494
8	Suministro e instalación pisotpared porcelanico o cerámico	m2	141,00	$ 123.799	$ 17.455.659		0,00	$ -	0	$ -	141,00	$ 123.799		$ 17.455.659
9	Guardaescoba porcelanico o cerámico	ML	80,00	$ 38.500	$ 3.080.000		0,00	$ -	0	$ -	80,00	$ 3.080.000		$ 3.080.000
10	Suministro e instalación lavamanos	UND	2,00	$ 380.000	$ 760.000		0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 380.000		$ 760.000
11	Suministro e instlación sanitario	UND	2,00	$ 850.000	$ 1.700.000		0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 850.000		$ 1.700.000
12	Canal en tamiras	ML	24,00	$ 131.397	$ 3.153.528		0,00	$ -	0	$ -	24,00	$ 3.153.528		$ 3.153.528
13	Instalaciones hidrosanitarias	GBL	1,00	$ 4.102.000	$ 4.102.000		0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
14	Instalaciones electricas	GBL	1,00	$ 5.734.300	$ 5.734.300		0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
15	Suministro e instalación cocina. Material RH, mesón en acero, incluye grifería y estractor de olores y estufa de 4 puestos	GBL	1,00	$ 9.830.783	$ 9.830.783		0,00	-	0	$ -	1,00	$ 9.830.783		$ 9.830.783
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)			**$ 56.153.846**									**$ 46.317.546**
		ADMINISTRACION		20%	$ 11.230.769						0,12	$ 6.723.077		$ 6.723.077
		IMPREVISTOS		5%	$ 2.807.692						0,50	$ 2.807.692		$ 2.807.692
		UTILIDAD		5%	$ 2.807.692						0,50	$ 2.807.692		$ 2.807.692
		TOTAL COSTOS INDIRECTO			$ 16.846.154									
		VALOR TOTAL			**$ 73.000.000**						VALOR EJECUTADO			**$ 58.656.007**
	SEDE NORTE - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA													
16	Desmonte de cubierta existente en teja de barro	M2	227,00	$ 9.056	$ 2.055.712						0,00	$ -		$ -
17	Suministro e instalación manto asfaltico	M2	227,00	$ 57.535	$ 13.060.445						0,50	$ 6.530.223		$ 6.530.223
18	Instalación cubierta en teja de barro	M2	177,00	$ 16.904	$ 2.992.008						0,00	$ -		$ -
19	Suministro e instalación cubierta en teja de barro	M2	50,00	$ 79.904	$ 3.995.200						0,50	$ 1.997.600		$ 1.997.600
20	Pintura barnes para estructura en madera	m2	200,00	$ 50.000	$ 10.000.000		0,00	$ -	0	$ -	100,00	$ 7.000.000		$ 7.000.000
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)			**$ 32.103.365**							**$ 15.527.823**		$ 15.527.823
		ADMINISTRACION		20%	$ 6.420.673							$ 4.815.505		$ 4.815.505
		IMPREVISTOS		5%	$ 1.605.168							$ 1.284.135		$ 1.284.135
		UTILIDAD		5%	$ 1.605.168							$ 1.284.135		$ 1.284.135
		TOTAL COSTOS INDIRECTO (B)			**$ 9.631.010**									
		VALOR TOTAL (B)			**$ 41.734.375**						VALOR EJECUTADO			**$ 22.911.596**
		VALOR TOTAL OBRA (A+B)			**$ 114.734.375**						VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 81.567.604**

ESTADO DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ 57.367.188
VALOR ACTA No.: 1	$ 81.567.604
VALOR AMORTIZADO ACTA No.:	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ 57.367.188

	ESTADO DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	114.734.375
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 81.567.604

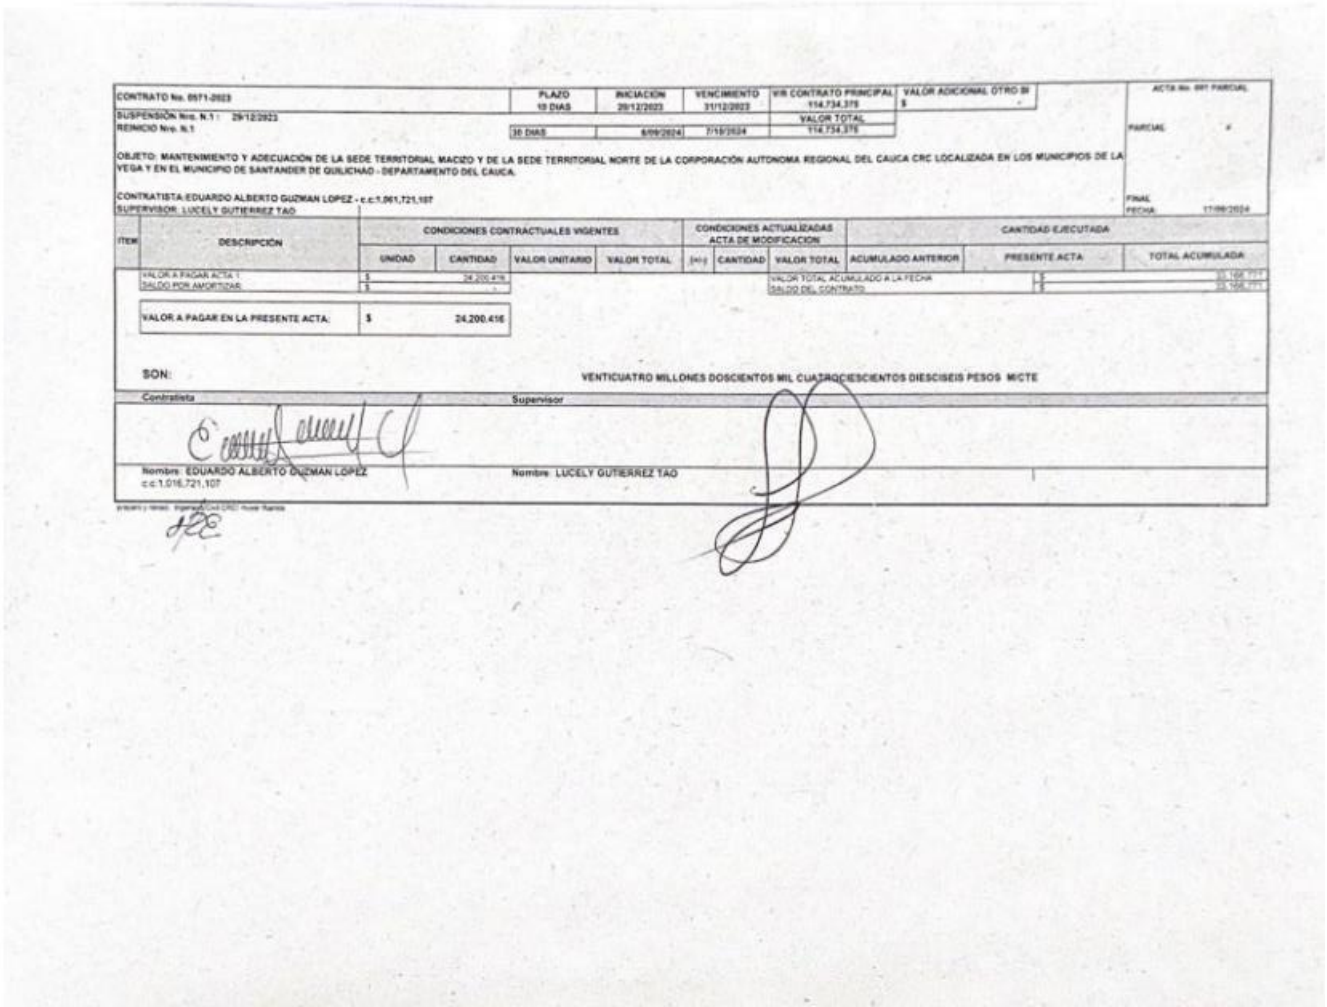

CONTRATO No. 0571-2023

PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	VR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI
10 DIAS	20/12/2023	31/12/2023	114.734.375	$ -
			VALOR TOTAL	
30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114.734.375	

ACTA No. 001 PARCIAL

SUSPENSIÓN Nro. N.1 : 29/12/2023
REINICIO Nro. N.1

PARCIAL x

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c.1,061,721,107
SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO

FINAL
FECHA: 17/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION			CANTIDAD EJECUTADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO
	VALOR A PAGAR ACTA 1	$	24,200,416					VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		$	$ [illegible]
	SALDO POR AMORTIZAR	$	-					SALDO DEL CONTRATO		$	$ [illegible]

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 24,200,416

SON: VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIESCIENTOS DIESCISEIS PESOS M/CTE

Contratista	Supervisor
Nombre: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ c.c.1.016.721.107	Nombre: LUCELY GUTIERREZ TAO

ANEXO 02- BLOQUE VIA PANAMERICANA

ANEXOS: PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO, BLOQUEO VIA PANAMERICANA



IMAGEN: BLOQUEO VIA PANAMERICANA, 06 FEBRERO 2024
FUENTE: PERIODICO PROCLAMA



IMAGEN: BLOQUEO VIA PANAMERICANA POR CAMIONEROS, 02 JULIO 2024

FUENTE: PERIODICO INFOBAE COLOMBIA

EL NUEVO SIGLO

NACIÓN

Más de 25 bloqueos en la vía Panamericana en lo que va de 2024: Campo

El corredor atraviesa al Cauca de sur a norte y conecta dos puntos estratégicos, la frontera con Ecuador en Nariño y el departamento del Valle del Cauca



Vía Panamericana atraviesa al Cauca de sur a norte y conecta dos puntos estratégicos, la frontera con Ecuador en Nariño y el departamento del Valle del Cauca. / Foto.- Invias

En tendencia

1. Incremento del costo de energía impacta precio de productos básicos
2. Zarpazo de la coalición de izquierda en segunda vuelta de legislativas de Francia
3. Un muerto y cuatro heridos deja caída de torre eléctrica en Santander
4. Tractomula se volcó al quedarse sin frenos en la vía Bogotá - Girardot
5. Cortes de luz en Barrios de Bogotá

IMAGEN: 25 BLOQUEOS VIA PANAMERICANA, 03 JULIO 2024
FUENTE: PERIODICO VIRTUAL EL NUEVO SIGLO

EL TIEMPO

OGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA SANTANDER BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

NOTICIA
OTRAS CIUDADES

Nuevo bloqueo de la vía Panamericana en Cauca: campesinos exigen no más desplazamiento y desmonte del paramilitarismo



Campesinos bloquean vía Panamericana exigiendo no más desplazamiento **FOTO:** Cortesía

Comunidades señalan que permanecerán activos hasta que el gobierno responda a la solicitud del Congreso de los Pueblos en Bogotá.

IMAGEN: 25 BLOQUEOS VIA PANAMERICANA, SECTOR ROSAS 02 JUNIO 2024
FUENTE: PERIODICO VIRTUAL EL TIEMPO



infobae

Colombia Últimas Noticias Violencia Economía Entretenimiento Newsletters

COLOMBIA >

Encontraron dos nuevos explosivos en la vía Panamericana, en Cauca: fueron detonados de manera controlada

El hallazgo surgió horas después de que se registrara un atentado en la misma vía, sobre las 4:50 a. m. del sábado 13 de abril

Los artefactos fueron encontrados en el sector de Mandiva, jurisdicción de Santander de Quilichao (Cauca) - crédito

PUBLICIDAD

infobae NEWSLETTERS

TECNO
Sindy Valbuena
El mundo tecnológico en tu mail

REGISTRATE GRATIS >

IMAGEN: EXPLOSIVOS VIA PANAMERICANA, 14 ABRIL 2024
FUENTE: PERIODICO INFOBAE COLOMBIA



EL TIEMPO

EXPLICATIVO
OTRAS CIUDADES

Atención: una granada de fragmentación cerca de la Fiscalía en Santander de Quilichao, Cauca genera susto entre la población

El hecho sucedió en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. **FOTO:** Archivo particular

IMAGEN: ATAQUE TERRORISTA, SANTANDER DE QUILICHAO, 14 JUNIO 2024
FUENTE: PERIODICO VIRTUAL EL TIEMPO



infobae

Colombia Últimas Noticias Violencia Economía Entretenimiento Newsletters

COLOMBIA >

Video: reportan enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército en Santander de Quilichao, hay un soldado muerto

Continúa la arremetida por parte del Estado Mayor Central en contra de la fuerza pública en el Cauca

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Enfrentamientos en Santander de Quilichao

Pobladores de Santander de Quilichao quedaron en medio de los enfrentamientos - crédito Redes sociales

Luego de la arremetida que se registró en contra de la estación de policía de Morales, Cauca, por parte del Estado Mayor Central de las disidencias, desde el Gobierno nacional se ordenó que la ofensiva en contra del grupo guerrillero sea continua, por lo que la seguridad de las poblaciones en esta región del país se encuentra en peligro.

PUBLICIDAD

infobae NEWSLETTERS

FRONTERAS AFUERA
Laureano Pérez Izquierdo
te cuenta que pasa
en el mundo

REGISTRATE GRATIS >

Lo Último | Colombia

IMAGEN: ENFRENTAMIENTOS SANTANDER DE QUILICHAO, 21 MAYO 2024
FUENTE: PERIODICO INFOBAE COLOMBIA
