VER ANEXO 11. CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES INTERVENTORIA

Mocoa-Putumayo, 29 agosto del 2024.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO:

Que **SERVICON CS S.A.S.** identificado con NIT. **900.949.050-7** ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y cuando ha habido lugar con los aportes a Caja de Compensación Familiar, durante los periodos comprendidos así: Desde el 04 de julio de 2023 al 03 de mayo de 2024 correspondiente al Contrato de Obra No. 786 de 2023, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)".**

%DEDICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PERIODO	PLANILLA	TIPO VINCULACION	MENSUAL (I.B.C.)
MES 01- JULIO							
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 3.420.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 07-08	9455798407 9472625328	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 07-08	9455798407 9472625328	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 07-07	9454295917	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 07-08	9472625328 9455798407	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 2.160.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 07-08	9455798407 9472625328	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 1.200.000

50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	OSCAR HOLDA	1006812950	CADENERO	PERIODO 07-08	9455798407	DEPENDIENTE	$ 1.160.000
			MES 02- AGOSTO				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 08-09	9472626559 9456252527	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 08-09	9472626559 9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 08-08	9454401888	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 08-09	9472626559 9456252527	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 08-09	9472626559 9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 1.200.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	OSCAR HOLDA	1006812950	CADENERO	PERIODO 08-09	9456252527	DEPENDIENTE	$ 1.160.000
			MES 03- SEPTIEMBRE				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 09-09	9457129106	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 3.200.000

30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 1.200.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	OSCAR HOLDA	1006812950	CADENERO	PERIODO 09-10	9457727126	DEPENDIENTE	$ 1.160.000
			MES 04 - OCTUBRE				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIDO 10-10	9458228418	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 1.200.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIDO 10-11	9458977863	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 05 - NOVIEMBRE				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIDO 11-11	9458432571	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 3.200.000

30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 1.200.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 11-12	9460281613	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 06 - DICCIEMBRE				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 12-12	9472309254 9460219030	INDEPENDIENTE	$ 1.400.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 12-01	9460281613	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 1.200.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 12-01	9461576505	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 07 - ENERO				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 01-01	9472319945	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000

100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIDO 01-02	9472633280	DEPENDIENTE	$ 1.440.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 1.300.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIDO 01-02	9462771907	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 08 - FEBRERO				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 02-02	9462946086	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 1.300.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 02-03	9464649133	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 09 - MARZO				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.100.000

40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 03-03	9463845558	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	WILLIAM BENAVIDES	1006995371	TOPOGRAFO	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.200.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 1.300.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 03-04	9465484222	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 10 - ABRIL				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 04-04	9465119163	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 04-05	9472647262 9467166673	DEPENDIENTE	$ 1.440.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACNISTA	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 1.300.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 04-05	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
			MES 11 - MAYO				
30%	WILLIAMS QUIROZ	97472356	DIRECTOR INTERVENTORIA	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.800.000
100%	CAMILO GUZMAN	14298136	RESIDENTE INTERVENTORIA	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.200.000

100%	ELIANA ZUÑIGA	66681750	PROFESIONAL HSEQ	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
40%	DANIEL PANTOJA	1061750485	ING. ESTRUCTURAL	PERIODO 05-05	9465119163	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000
100%	JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	12996429	ING. CIVIL ESP. GERENCIA PROYECTOS	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 3.200.000
30%	OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	98138713	PROFESIONAL REDES ELECTRICAS	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
45%	WILMER ORDOÑEZ	18187911	ING. CVIL ESP SOLDADURA	PERIODO 05-06	9472663411	DEPENDIENTE	$ 1.440.000
30%	FREIDER VARGAS	1083916566	ARQUITECTO	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.400.000
50%	KELLY JOHANA ESPAÑA	1061751834	PROFESIONAL SOCIAL	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JUALIANA ARTEAGA	1124865008	AUX INGENIERIA	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000
100%	JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	18127314	ALMACeNISTA	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 1.300.000
50%	ELIANA CEBALLOS	1123333549	AUX ADMON	PERIODO 05-06	9467166673	DEPENDIENTE	$ 2.100.000

Para constancia se emite en Mocoa (Putumayo), el trece (13) del mes de agosto de 2024.

GERMAN YOVANY CHAMORRO
CC.98.389.217
CONTADOR TP – No.112900-T

MES 01

4 JULIO - 03 AGOSTO

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	74556256	9454295917	I	2023/08/22	2023/07/31	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	132138715	9455798407	E	2023/08/14	2023/08/31	BANCOLOMBIA	17	$5,197,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (14 Afiliados)																							$20,792,000	$3,326,900			$20,792,000	$831,800			$20,792,000	$831,800			$20,792,000		$109,100		$0	$0		$5,099,600
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (14 Afiliados)																							$20,792,000	$3,326,900			$20,792,000	$831,800			$20,792,000	$831,800			$20,792,000		$109,100		$0	$0		$5,099,600
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (14 Afiliados)																							$20,792,000	$3,326,900			$20,792,000	$831,800			$20,792,000	$831,800			$20,792,000		$109,100		$0	$0		$5,099,600
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF63	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	0.522%	$5,500	27	$0	$0	SI	$256,200
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF63	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
7	CC	1006812950	HOLDA OSCAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
8	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
9	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
10	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
11	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF63	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	0.522%	$5,500	27	$0	$0	SI	$256,200
12	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,103,500
13	CC	1083916566	VARGAS FREIDER	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$41,800	CCF63	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	0.522%	$5,500	27	$0	$0	SI	$256,200
14	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
Total			**Afiliados(14)**																				$20,792,000	$3,326,900			$20,792,000	$831,800			$20,792,000	$831,800			$20,792,000		$109,100		$0	$0		$5,099,600

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	132138715	9455798407	E	2023/08/14	2023/08/31	BANCOLOMBIA	17	$5,197,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,326,900	$63,700	$0	$3,390,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$3,600	$0	$189,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,421,300	$46,300	$0	$2,467,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$13,800	$0	$733,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$109,100	$2,100	$0	$111,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$109,100	$2,100	$0	$111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$831,800	$15,900	$0	$847,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	14	$831,800	$15,900	$0	$847,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$831,800	$16,100	$0	$847,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,400	$900	$0	$47,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$900	$0	$47,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$649,200	$12,500	$0	$661,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$89,800	$1,800	$0	$91,600
TOTAL				14	$5,099,600	$97,800	$0	$5,197,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	887512945	9472625328	N	2023/08/14	2024/09/03	BANCOLOMBIA	386	$1,879,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (4 Afiliados)																								$3,426,000	$548,100			$3,426,000	$137,000			$3,426,000	$137,000			$3,426,000		$573,600		$0	$0		$1,395,700
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (4 Afiliados)																								$3,426,000	$548,100			$3,426,000	$137,000			$3,426,000	$137,000			$3,426,000		$573,600		$0	$0		$1,395,700
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																								$3,426,000	$548,100			$3,426,000	$137,000			$3,426,000	$137,000			$3,426,000		$573,600		$0	$0		$1,395,700
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA	X						A				o							230301	27	($1,044,000)	($167,100)	EPS037	27	($1,044,000)	($41,800)	CCF63	27	($1,044,000)	($41,800)	14-11	27	($1,044,000)	0.522%	($5,500)	27	$0	$0	SI	($256,200)
2	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA	X						C											230301	27	$1,890,000	$302,400	EPS037	27	$1,890,000	$75,600	CCF63	27	$1,890,000	$75,600	14-11	27	$1,890,000	6.960%	$131,600	27	$0	$0	SI	$585,200
3	CC	14298136	GUZMAN CAMILO							A				o							230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS037	30	($1,800,000)	($72,000)	CCF63	30	($1,800,000)	($72,000)	14-11	30	($1,800,000)	0.522%	($9,400)	30	$0	$0	SI	($441,400)
4	CC	14298136	GUZMAN CAMILO							C											230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
5	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER							A				o							230301	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS037	30	($1,160,000)	($46,400)	CCF63	30	($1,160,000)	($46,400)	14-11	30	($1,160,000)	0.522%	($6,100)	30	$0	$0	SI	($284,500)
6	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER							C											230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF63	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	6.960%	$100,300	30	$0	$0	SI	$445,900
7	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA							A				o							230301	30	($1,200,000)	($192,000)	EPS005	30	($1,200,000)	($48,000)	CCF63	30	($1,200,000)	($48,000)	14-11	30	($1,200,000)	0.522%	($6,300)	30	$0	$0	SI	($294,300)
8	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA							C											230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total Afiliados(4)																								$3,426,000	$548,100			$3,426,000	$137,000			$3,426,000	$137,000			$3,426,000		$573,600		$0	$0		$1,395,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	887512945	9472625328	N	2023/08/14	2024/09/03	BANCOLOMBIA	386	$1,879,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$548,100	$189,900	$0	$738,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$548,100	$189,900	$0	$738,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$573,600	$198,700	$0	$772,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$573,600	$198,700	$0	$772,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$137,000	$47,500	$0	$184,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$137,000	$47,500	$0	$184,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$137,000	$47,500	$0	$184,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$101,000	$35,000	$0	$136,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,000	$12,500	$0	$48,500
TOTAL				4	$1,395,700	$483,600	$0	$1,879,300

MES 02

4 AGOSTO - 03 SEPTIEMBRE

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	140489273	9454401888	I	2023/09/20	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	158406185	9456252527	E	2023/09/13	2023/09/13	BANCOLOMBIA	0	$5,437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (15 Afiliados)																							**$22,300,000**	**$3,568,000**			**$22,300,000**	**$892,000**			**$21,500,000**	**$860,000**			**$22,300,000**		**$117,000**		**$0**	**$0**		**$5,437,000**
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (15 Afiliados)																							**$22,300,000**	**$3,568,000**			**$22,300,000**	**$892,000**			$21,500,000	**$860,000**			$22,300,000		**$117,000**		**$0**	**$0**		$5,437,000
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (15 Afiliados)																							$22,300,000	$3,568,000			$22,300,000	$892,000			$21,500,000	**$860,000**			$22,300,000		**$117,000**		$0	$0		$5,437,000
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	1006995371	BENAYIDES WILLIAM																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	Si	$294,300
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
6	CC	1107038027	GORDILLO JOAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
7	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF63	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
8	CC	1006812950	HOLDA OSCAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
9	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
10	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
11	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
12	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
13	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,103,500
14	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
15	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	Si	$294,300
Total			**Afiliados(15)**																				$22,300,000	$3,568,000			$22,300,000	$892,000			$21,500,000	$860,000			$22,300,000		$117,000		$0	$0		$5,437,000

2023/09/13 02:18 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	158406185	9456252527	E	2023/09/13	2023/09/13	BANCOLOMBIA	0	$5,437,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,568,000	$0	$0	$3,568,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,662,400	$0	$0	$2,662,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$117,000	$0	$0	$117,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$117,000	$0	$0	$117,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$860,000	$0	$0	$860,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	15	$860,000	$0	$0	$860,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$892,000	$0	$0	$892,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$658,400	$0	$0	$658,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$94,400	$0	$0	$94,400
TOTAL				**15**	**$5,437,000**	**$0**	**$0**	**$5,437,000**

2023/09/13 02:18 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	887532431	9472626559	N	2023/09/13	2024/09/03	BANCOLOMBIA	356	$1,881,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct iri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$587,600		$0	$0		$1,432,400
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$587,600		$0	$0		$1,432,400
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$587,600		$0	$0		$1,432,400
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA	A ▫	230301	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS037	30	($1,160,000)	($46,400)	CCF63	30	($1,160,000)	($46,400)	14-11	30	($1,160,000)	0.522%	($6,100)	30	$0	$0	SI	($284,500)
2	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA	C	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
3	CC	14298136	GUZMAN CAMILO	A ▫	230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS037	30	($1,800,000)	($72,000)	CCF63	30	($1,800,000)	($72,000)	14-11	30	($1,800,000)	0.522%	($9,400)	30	$0	$0	SI	($441,400)
4	CC	14298136	GUZMAN CAMILO	C	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
5	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER	A ▫	230301	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS037	30	($1,160,000)	($46,400)	CCF63	30	($1,160,000)	($46,400)	14-11	30	($1,160,000)	0.522%	($6,100)	30	$0	$0	SI	($284,500)
6	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER	C	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF63	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	6.960%	$100,300	30	$0	$0	SI	$445,900
7	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA	A ▫	230301	30	($1,200,000)	($192,000)	EPS005	30	($1,200,000)	($48,000)	CCF63	30	($1,200,000)	($48,000)	14-11	30	($1,200,000)	0.522%	($6,300)	30	$0	$0	SI	($294,300)
8	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA	C	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total	Afiliados(4)						$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$587,600		$0	$0		$1,432,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	887532431	9472626559	N	2023/09/13	2024/09/03	BANCOLOMBIA	356	$1,881,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$563,200	$176,700	$0	$739,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$563,200	$176,700	$0	$739,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$587,600	$184,400	$0	$772,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$587,600	$184,400	$0	$772,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$44,200	$0	$185,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$140,800	$44,200	$0	$185,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$140,800	$44,200	$0	$185,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$104,800	$32,900	$0	$137,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,000	$11,300	$0	$47,300
TOTAL				4	$1,432,400	$449,500	$0	$1,881,900

2024/09/03 08:25 AM

MES 03

4 SEPTIEMBRE - 03 OCTUBRE

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	16086812	9457129106	I	2023/10/20	2023/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	227826226	9457727126	E	2023/10/12	2023/10/19	BANCOLOMBIA	7	$8,499,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVICON CS SAS (18 Afiliados)						$34,402,668	$5,504,600			$34,402,668	$1,376,400			$34,397,335	$1,376,200			$34,402,668	$180,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (18 Afiliados)						$34,402,668	$5,504,600			$34,402,668	$1,376,400			$34,397,335	$1,376,200			$34,402,668	$180,600		$0	$0
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (18 Afiliados)						$34,402,668	$5,504,600			$34,402,668	$1,376,400			$34,397,335	$1,376,200			$34,402,668	$180,600		$0	$0
1	CC	1124865008	ARTEAGA CRUZ JULIANA	Z30301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
2	CC	1006995371	BENAVIDES GUAPUCAL WILLIAM MILLER	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
3	CC	1123333549	CEBALLOS AREVALO ELIANA ANDREA	Z30301	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
4	CC	1061751834	ESPAÑA RUALES KELLY JOHANNA	Z30301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
5	CC	1123331657	GOMEZ BUCHELLY JHORMAN ESNEIDER	Z30301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	1107038027	GORDILLO PARRA JOAN SEBASTIAN	Z30301	1	$38,667	$6,200	EPSIC5	1	$38,667	$1,600	CCF63	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
7	CC	14298136	GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	Z30301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
8	CC	1006812950	HOLDA MARROQUIN OSCAR ANLLEDIS	Z30301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1089486495	MORA MATABAJOY JHON FREDY	Z30301	13	$502,667	$80,500	ESSC18	13	$502,667	$20,200	CCF63	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$2,700	13	$0	$0
10	CC	98138713	MUÑOZ NARVAEZ OLIVER CRISTIAN	Z30301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
11	CC	18187911	ORDOÑEZ URBANO WILMER IVAN	Z30301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
12	CC	1006948045	OTERO CHAPAL FREYDER EDUARDO	Z30301	13	$502,667	$80,500	ESSC18	13	$502,667	$20,200	CCF63	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$2,700	13	$0	$0
13	CC	1006663319	OTERO CHAPAL GABRIEL DARIO	Z30301	1	$38,667	$6,200	EPSIC3	1	$38,667	$1,600	CCF63	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
14	CC	18127314	PIEDRAHITA MAYA JOSE ALEXANDER	Z30301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
15	CC	97472356	QUIROZ BOTINA WUILLIAMS GILBERTO	Z30301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
16	CC	12996429	RUEDA ZARAMA JAVIER ANDRES	Z30201	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0
17	CC	1083916566	VARGAS PLAZAS FREIDER YAMID	Z30301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
18	CC	66681750	ZUÑIGA CUARTAS ELIANA ANDREA	Z30301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$34,402,668	$5,504,600			$34,402,668	$1,376,400			$34,397,335	$1,376,200			$34,402,668	$180,600		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	227826226	9457727126	E	2023/10/12	2023/10/19	BANCOLOMBIA	7	$8,499,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,504,600	$40,000	$0	$5,544,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$2,600	$0	$354,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,432,600	$32,100	$0	$4,464,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$5,300	$0	$725,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$180,600	$1,400	$0	$182,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$180,600	$1,400	$0	$182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,376,200	$10,000	$0	$1,386,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	18	$1,376,200	$10,000	$0	$1,386,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,376,400	$10,200	$0	$1,386,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$48,000	$400	$0	$48,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$124,400	$900	$0	$125,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$1,600	$100	$0	$1,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,022,400	$7,400	$0	$1,029,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,000	$1,400	$0	$181,400
TOTAL				18	$8,437,800	$61,600	$0	$8,499,400

MES 04

04 OCTUBRE - 03 NOVIEMBRE

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telé.	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	54356110	9458228418	I	2023/11/22	2023/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$0**	**$0**	**$406,400**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281667365	9458977863	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCOLOMBIA	1	$8,199,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (16 Afiliados)																								$33,397,334	$5,343,600			$33,397,334	$1,336,000			$33,397,334	$1,336,000					$175,200			$0	$0		$8,190,800
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (16 Afiliados)																								$33,397,334	$5,343,600			$33,397,334	$1,336,000			$33,397,334	$1,336,000					$175,200			$0	$0		$8,190,800
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (16 Afiliados)																								$33,397,334	$5,343,600			$33,397,334	$1,336,000			$33,397,334	$1,336,000					$175,200			$0	$0		$8,190,800
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
7	CC	1006812950	HOLDA OSCAR		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPSIC3	1	$38,667	$1,600	CCF63	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$9,700
8	CC	1089486495	MORA JHON		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	ESSC18	1	$38,667	$1,600	CCF63	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$9,700
9	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
10	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
11	CC	1006948045	OTERO FREYDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
12	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
13	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
14	CC	12596429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,103,500
15	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
16	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Total			**Afiliados(16)**																					$33,397,334	$5,343,600			$33,397,334	$1,336,000			$33,397,334	$1,336,000					$175,200			$0	$0		$8,190,800

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281667365	9458977863	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCOLOMBIA	1	$8,199,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,343,600	$5,500	$0	$5,349,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$400	$0	$352,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,271,600	$4,300	$0	$4,275,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$800	$0	$720,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$175,200	$200	$0	$175,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$175,200	$200	$0	$175,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,336,000	$1,400	$0	$1,337,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$1,336,000	$1,400	$0	$1,337,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,336,000	$1,600	$0	$1,337,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$132,000	$200	$0	$132,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,022,400	$1,100	$0	$1,023,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,000	$200	$0	$180,200
TOTAL				16	$8,190,800	$8,700	$0	$8,199,500

2023/11/20 09:17 AM

MES 05

04 NOVIEMBRE - 03 DICIEMBRE

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	304929601	9458432571	I	2023/12/21	2023/11/29	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele.	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332636573	9460281613	E	2023/12/14	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$8,171,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SERVICON CS SAS (14 Afiliados)					$33,320,000	$5,331,200			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$174,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (14 Afiliados)					$33,320,000	$5,331,200			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$174,600		$0	$0
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (14 Afiliados)					$33,320,000	$5,331,200			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$174,600		$0	$0
1	CC	1124865008	ARTEAGA CRUZ JULIANA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
2	CC	1006995371	BENAVIDES GUAPUCAL WILLIAM MILLER	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
3	CC	1123333549	CEBALLOS AREVALO ELIANA ANDREA	230301	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
4	CC	1061751834	ESPAÑA RUALES KELLY JOHANNA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
5	CC	1123331657	GOMEZ BUCHELLY JHORMAN ESNEIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	14298136	GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
7	CC	98138713	MUÑOZ NARVAEZ OLIVER CRISTIAN	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
8	CC	18187911	ORDOÑEZ URBANO WILMER IVAN	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
9	CC	1006948045	OTERO CHAPAL FREYDER EDUARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	18127314	PIEDRAHITA MAYA JOSE ALEXANDER	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
11	CC	97472356	QUIROZ BOTINA WUILLIAMS GILBERTO	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
12	CC	12996429	RUEDA ZARAMA JAVIER ANDRES	230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0
13	CC	1083916566	VARGAS PLAZAS FREIDER YAMID	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
14	CC	66681750	ZUÑIGA CUARTAS ELIANA ANDREA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**				$33,320,000	$5,331,200			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$1,332,800			$33,320,000	$174,600		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332636573	9460281613	E	2023/12/14	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$8,171,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$5,331,200	$0	$0	$5,331,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,259,200	$0	$0	$4,259,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$174,600	$0	$0	$174,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$174,600	$0	$0	$174,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,332,800	$0	$0	$1,332,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	14	$1,332,800	$0	$0	$1,332,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,332,800	$0	$0	$1,332,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$130,400	$0	$0	$130,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				14	$8,171,400	$0	$0	$8,171,400

MES 06

04 DICIEMBRE 2023 - 03 ENERO 2024

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	331406365	9460219030	I	2024/01/22	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$203,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$87,500		0	$0	$0	14-23	15	$700,000	$3,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$700,000	$112,000			$700,000	$87,500			$0	$0			$700,000	$3,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,000	$0	$0	$112,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$112,000	$0	$0	$112,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$0	$0	$3,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,700	$0	$0	$3,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,500	$0	$0	$87,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$87,500	$0	$0	$87,500
TOTAL				1	$203,200	$0	$0	$203,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	890674364	9472309254	N	2024/01/22	2024/09/04	BANCOLOMBIA	226	$160,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	20	($933,334)	($149,400)	EPS037	20	($933,334)	($116,700)		0	$0	$0	14-23	20	($933,334)	($4,900)	0	$0	$0
2	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$466,666	$74,600			$466,666	$58,300			$0	$0			$466,666	$2,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,600	$13,800	$0	$88,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,600	$13,800	$0	$88,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$500	$0	$3,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,500	$500	$0	$3,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,300	$10,800	$0	$69,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,300	$10,800	$0	$69,100
TOTAL				1	$135,400	$25,100	$0	$160,500

2024/09/04 11:45 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	392351602	9461576505	E	2024/01/15	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0	$7,138,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (14 Afiliados)																								$29,105,334	$4,656,900			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334		$152,600		$0	$0		$7,138,100
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (14 Afiliados)																								$29,105,334	$4,656,900			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334		$152,600		$0	$0		$7,138,100
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (14 Afiliados)																								$29,105,334	$4,656,900			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334		$152,600		$0	$0		$7,138,100
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																			25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ES5C18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																			23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
7	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
8	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER		X																	23030 1	1	$106,667	$17,100	EPS037	1	$106,667	$4,300	CCF63	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$106,667	0.522%	$600	1	$0	$0	SI	$26,300
9	CC	1006948045	OTERO FREYDER		X																	23030 1	1	$38,667	$6,200	ES5C18	1	$38,667	$1,600	CCF63	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$9,700
10	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																			23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF63	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
11	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																			23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
12	CC	12996429	RUEDA JAVIER																			23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,103,500
13	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																			23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
14	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Total			**Afiliados(14)**																					$29,105,334	$4,656,900			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334	$1,164,300			$29,105,334		$152,600		$0	$0		$7,138,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	392351602	9461576505	E	2024/01/15	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0	$7,138,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,656,900	$0	$0	$4,656,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,584,900	$0	$0	$3,584,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$152,600	$0	$0	$152,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,164,300	$0	$0	$1,164,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	14	$1,164,300	$0	$0	$1,164,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,164,300	$0	$0	$1,164,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$85,600	$0	$0	$85,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$898,700	$0	$0	$898,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				14	$7,138,100	$0	$0	$7,138,100

MES 07

04 ENERO - 03 FEBRERO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	820681890	9472319945	I	2024/02/20	2024/09/04	BANCOLOMBIA	197	$437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$32,900	$0	$240,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$32,900	$0	$240,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$1,100	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$1,100	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$25,700	$0	$188,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$25,700	$0	$188,200
TOTAL				1	$377,300	$59,700	$0	$437,000

2024/09/04 11:43 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	887664792	9472633280	E	2024/02/13	2024/09/03	BANCOLOMBIA	203	$411,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
1	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER	X																230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF63	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$353,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	887664792	9472633280	E	2024/02/13	2024/09/03	BANCOLOMBIA	203	$411,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$37,700	$0	$268,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,400	$37,700	$0	$268,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$1,300	$0	$8,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$1,300	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$9,500	$0	$67,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,600	$9,500	$0	$67,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$9,500	$0	$67,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,600	$9,500	$0	$67,100
TOTAL				**1**	**$353,200**	**$58,000**	**$0**	**$411,200**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	443721018	9462771907	E	2024/02/13	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	$7,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (12 Afiliados)																							$29,200,000	$4,672,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$152,900		$0	$0		$7,160,900
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (12 Afiliados)																							$29,200,000	$4,672,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$152,900		$0	$0		$7,160,900
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (12 Afiliados)																							$29,200,000	$4,672,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$152,900		$0	$0		$7,160,900
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
7	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
8	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
10	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,103,500
11	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
12	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Total			**Afiliados(12)**																				$29,200,000	$4,672,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$1,168,000			$29,200,000	$152,900		$0	$0		$7,160,900

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	443721018	9462771907	E	2024/02/13	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	$7,160,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,672,000	$0	$0	$4,672,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,600,000	$0	$0	$3,600,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$152,900	$0	$0	$152,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$152,900	$0	$0	$152,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$84,000	$0	$0	$84,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$904,000	$0	$0	$904,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				12	$7,160,900	$0	$0	$7,160,900

2024/02/07 09:13 PM

MES 08

04 FEBRERO - 03 MARZO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	454272080	9462946086	I	2024/03/20	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/02/14 10:00 AM

en línea

Planilla resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	529251364	9464649133	E	2024/03/13	2024/03/22	BANCOLOMBIA	9	$9,759,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (16 Afiliados)																							$36,300,000	$5,808,000			$36,300,000	$1,452,000			$35,908,526	$1,436,400			$988,400		$0	$0		$9,684,800
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (11 Afiliados)																							$23,900,000	$3,824,000			$23,900,000	$956,000			$23,508,526	$940,400			$125,200		$0	$0		$5,845,600
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (11 Afiliados)																							$23,900,000	$3,824,000			$23,900,000	$956,000			$23,508,526	$940,400			$125,200		$0	$0		$5,845,600
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$303,200
7	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
8	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER	X																	23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
9	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
10	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
11	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$863,200		$0	$0		$3,839,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$863,200		$0	$0		$3,839,200
12	CC	1123334302	DIAZ MAYRA	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
14	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
16	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total			**Afiliados(16)**																				$36,300,000	$5,808,000			$36,300,000	$1,452,000			$35,908,526	$1,436,400			$988,400		$0	$0		$9,684,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	529251364	9464649133	E	2024/03/13	2024/03/22	BANCOLOMBIA	9	$9,759,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,808,000	$44,900	$0	$5,852,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$768,000	$6,000	$0	$774,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,320,000	$33,300	$0	$4,353,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$5,600	$0	$725,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$988,400	$7,700	$0	$996,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$988,400	$7,700	$0	$996,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,436,400	$11,100	$0	$1,447,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$1,436,400	$11,100	$0	$1,447,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,452,000	$11,300	$0	$1,463,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$136,000	$1,100	$0	$137,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,084,000	$8,400	$0	$1,092,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,000	$1,800	$0	$233,800
TOTAL				16	$9,684,800	$75,000	$0	$9,759,800

2024/05/28 04:18 PM

MES 09

04 MARZO- 03 ABRIL

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele[illegible]	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	37515285	9463845558	I	2024/04/18	2024/03/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	563290087	9465484222	E	2024/04/11	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$9,700,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (16 Afiliados)																							$36,300,000	$5,808,000			$36,300,000	$1,452,000			$36,300,000	$1,452,000			$36,300,000		$988,400		$0	$0		$9,700,400
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (11 Afiliados)																							$23,900,000	$3,824,000			$23,900,000	$956,000			$23,900,000	$956,000			$23,900,000		$125,200		$0	$0		$5,861,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (11 Afiliados)																							$23,900,000	$3,824,000			$23,900,000	$956,000			$23,900,000	$956,000			$23,900,000		$125,200		$0	$0		$5,861,200
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAVIDES WILLIAM																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
8	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
9	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
10	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
11	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000		$863,200		$0	$0		$3,839,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000		$863,200		$0	$0		$3,839,200
12	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
14	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
16	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total			**Afiliados(16)**																				$36,300,000	$5,808,000			$36,300,000	$1,452,000			$36,300,000	$1,452,000			$36,300,000		$988,400		$0	$0		$9,700,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	563290087	9465484222	E	2024/04/11	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$9,700,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,808,000	$0	$0	$5,808,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$768,000	$0	$0	$768,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,320,000	$0	$0	$4,320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$988,400	$0	$0	$988,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$988,400	$0	$0	$988,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,452,000	$0	$0	$1,452,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$1,452,000	$0	$0	$1,452,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,452,000	$0	$0	$1,452,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$136,000	$0	$0	$136,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,084,000	$0	$0	$1,084,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				16	$9,700,400	$0	$0	$9,700,400

MES 10

04 ABRIL- 03 MAYO

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	581706365	9465119163	I	2024/05/22	2024/04/17	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	$162,500			$0	$0			**$1,300,000**	$6,800		$0	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	888314897	9472647262	E	2024/05/15	2024/09/03	BANCOLOMBIA	111	$378,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
1	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF63	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$353,200
Total Afiliados(1)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	888314897	9472647262	E	2024/05/15	2024/09/03	BANCOLOMBIA	111	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$14,600	$0	$245,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,400	$14,600	$0	$245,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$1,500	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$1,500	$0	$9,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$4,400	$0	$62,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,600	$4,400	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$4,400	$0	$62,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,600	$4,400	$0	$62,000
TOTAL				1	$353,200	$24,900	$0	$378,100

2024/09/03 01:46 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	643264640	9467166673	E	2024/05/15	2024/05/16	BANCOLOMBIA	1	$8,119,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (16 Afiliados)																							$29,823,335	$4,771,900			$29,823,335	$1,193,100			$29,823,335	$1,193,100			$29,823,335		$954,600		$0	$0		$8,112,700
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (11 Afiliados)																							$17,423,335	$2,787,900			$17,423,335	$697,100			$17,423,335	$697,100			$17,423,335		$91,400		$0	$0		$4,273,500
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (11 Afiliados)																							$17,423,335	$2,787,900			$17,423,335	$697,100			$17,423,335	$697,100			$17,423,335		$91,400		$0	$0		$4,273,500
1	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1006995371	BENAYIDES WILLIAM		X																25-14	1	$73,334	$11,800	EPS037	1	$73,334	$3,000	CCF63	1	$73,334	$3,000	14-11	1	$73,334	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$18,200
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	1123331657	GOMEZ JHORMAN		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF63	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$10,900
6	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
8	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER		X																23030 1	1	$106,667	$17,100	EPS037	1	$106,667	$4,300	CCF63	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$106,667	0.522%	$600	1	$0	$0	SI	$26,300
9	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
10	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
11	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000		$863,200		$0	$0		$3,839,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																							$12,400,000	$1,984,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000	$496,000			$12,400,000		$863,200		$0	$0		$3,839,200
12	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
14	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
16	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total			**Afiliados(16)**																				$29,823,335	$4,771,900			$29,823,335	$1,193,100			$29,823,335	$1,193,100			$29,823,335		$954,600		$0	$0		$8,112,700

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	643264640	9467166673	E	2024/05/15	2024/05/16	BANCOLOMBIA	1	$8,119,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,771,900	$4,000	$0	$4,775,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$427,800	$400	$0	$428,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,624,100	$3,000	$0	$3,627,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$600	$0	$720,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$954,600	$800	$0	$955,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$954,600	$800	$0	$955,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,193,100	$1,000	$0	$1,194,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$1,193,100	$1,000	$0	$1,194,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,193,100	$1,100	$0	$1,194,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$136,000	$200	$0	$136,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$825,100	$700	$0	$825,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,000	$200	$0	$232,200
TOTAL				16	$8,112,700	$6,900	$0	$8,119,600

2024/05/28 04:24 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	888352249	9472663411	E	2024/06/17	2024/09/03	BANCOLOMBIA	78	$374,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200
1	CC	18187911	ORDOÑEZ WILMER																	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF63	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$353,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000		$7,600		$0	$0		$353,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	888352249	9472663411	E	2024/06/17	2024/09/03	BANCOLOMBIA	78	$374,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$13,600	$0	$244,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,400	$13,600	$0	$244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$500	$0	$8,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$500	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$3,400	$0	$61,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,600	$3,400	$0	$61,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$3,400	$0	$61,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,600	$3,400	$0	$61,000
TOTAL				1	$353,200	$20,900	$0	$374,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061750485		PANTOJA OCAÑA DANIEL CAMILO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PROGRESO	MOCOA-PUTUMAYO	4204721	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	683599798	9468265022	N	2024/06/24	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$12,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	($1,400,000)	($224,000)	EPS037	30	($1,400,000)	($175,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,400,000)	($7,400)	0	$0	$0
2	CC	1061750485	PANTOJA DANIEL	230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$180,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,442,000	$7,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$42,000**	**$6,800**			**$42,000**	**$5,300**			**$0**	**$0**			**$42,000**	**$200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$0	$0	$200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$200	$0	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$5,300	$0	$0	$5,300
TOTAL				1	$12,300	$0	$0	$12,300

2024/06/05 07:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	715618306	9468685905	E	2024/06/17	2024/06/19	BANCOLOMBIA	2	$8,112,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (13 Afiliados)																							$28,800,000	$4,608,000			$28,800,000	$1,152,000			$28,800,000	$1,152,000			$28,800,000		$1,187,300		$0	$0		$8,099,300
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (6 Afiliados)																							$12,700,000	$2,032,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000		$66,500		$0	$0		$3,114,500
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																							$12,700,000	$2,032,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000		$66,500		$0	$0		$3,114,500
1	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	ESSC18	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
2	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
3	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	98138713	MUÑOZ OLIVER																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
5	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,900
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (7 Afiliados)																							$16,100,000	$2,576,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000		$1,120,800		$0	$0		$4,984,800
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (7 Afiliados)																							$16,100,000	$2,576,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000		$1,120,800		$0	$0		$4,984,800
7	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
10	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
12	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
13	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total			**Afiliados(13)**																				$28,800,000	$4,608,000			$28,800,000	$1,152,000			$28,800,000	$1,152,000			$28,800,000		$1,187,300		$0	$0		$8,099,300

2024/08/27 02:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	715618306	9468685905	E	2024/06/17	2024/06/19	BANCOLOMBIA	2	$8,112,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,608,000	$7,400	$0	$4,615,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$700	$0	$416,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,472,000	$5,500	$0	$3,477,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$1,200	$0	$721,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,187,300	$1,900	$0	$1,189,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,187,300	$1,900	$0	$1,189,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,152,000	$1,900	$0	$1,153,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	13	$1,152,000	$1,900	$0	$1,153,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,152,000	$2,000	$0	$1,154,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$136,000	$300	$0	$136,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$784,000	$1,300	$0	$785,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,000	$400	$0	$232,400
TOTAL				13	$8,099,300	$13,200	$0	$8,112,500

2024/08/27 02:55 PM

VER ANEXO 12. CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORIA

NIT: 900.949.050-7

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 01

4 JULIO - 03 AGOSTO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.I.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES	1
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO	MOCOA
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023		

DIA / PROFESIONAL	CARGO	JULIO																									AGOSTO				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	X	X	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	0	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	X	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma

CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 02

4 AGOSTO - 03 SEPTIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	2

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	AGOSTO																													SEPTIEMBRE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 03

4 SEPTIEMBRE - 03 OCTUBRE

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	3

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	SEPTIEMBRE																											OCTUBRE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	X
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	0	X	0	X	X	X	0	0	X	0	X	X	0	0	0	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0	X	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____
Nombre _____
Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 04

04 OCTUBRE - 03 NOVIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	4

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	OCTUBRE																												NOVIEMBRE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	X	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	X	0	X	0	X	X	0	0	X
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	0	X	X	0	0	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	0	0	X
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	X	X	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	X	X	0	0	X	0	X	X	0	0	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____
Nombre _____
Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 05

04 NOVIEMBRE - 03 DICIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	5

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	NOVIEMBRE																											DICIEMBRE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	X	0	0	X	0	X	X	0	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	X	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

Nombre _____

Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 06

04 DICIEMBRE 2023 - 03 ENERO 2024

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	6

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	DICIEMBRE																										ENERO		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	0	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	0	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	0	X	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	X	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	X	0	0	0	X	0	X	X	0	0	X	0	X	X	0	0	0	X	0
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	0	X	X
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	0	0	X	X
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	X	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____
Nombre _____
Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 07

04 ENERO - 03 FEBRERO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	7

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	ENERO																													FEBRERO		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	X	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	X	0	0	X
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	X	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

Nombre _____

Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 08

04 FEBRERO - 03 MARZO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	8

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	FEBRERO																										MARZO		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0
JAVIER ANDRES RUEDA ZAMARA	ING. CIVIL ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	0	X	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0
KELLY JOHANA ESPAÑA RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	0	X	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0
WILLIAM BENAVIDES	TOPOGRAFO	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
JUALIANA ARTEAGA	AUXILIAR DE INGENIERIA	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
JOSE ALEXANDER PIEDRAHITA	ALMACENISTA	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
ELIANA CEBALLOS	AUX. ADMINISTRATIVA	0	X	X	0	X	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

Nombre _____

Residente de Interventoria

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 09

04 MARZO- 03 ABRIL

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS			MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023			9

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	MARZO																												ABRIL		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0		0	X	0
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	X	0	X
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

Nombre _____

Residente de Interventoria

NIT: 900.949.050-7

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE PERSONAL MES 10

04 ABRIL- 03 MAYO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS		MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023		10

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

DIA / PROFESIONAL	CARGO	ABRIL																										MAYO		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
WILLIAMS QUIROZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X
CAMILO GUZMAN	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	0	X	X
ELIANA ANDREA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	X	0	X	X
DANIEL PANTOJA	ING. ESTRUCTURAL	0	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0	X	X	0	0	X	0	X	0
OLIVER MUÑOZ NARVAEZ	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS	X	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
WILMER ORDOÑEZ	ING. ESP. SOLDADURA	0	X	X	0	X	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0
FREIDER VARGAS	ARQUITECTO	X	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X

X ASISTIO
0 NO ASISTIO
RETIRADO

Firma _____

Nombre _____

Residente de Interventoria

VER ANEXO 13. COMITES TECNICOS.

ACTA COMITÉ N° 01

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

CONVENIO ☐ CONTRATO ☒X		MUNICIPIO	MOCOA
No. 763	FECHA	24/04/2023	
OBJETO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	CONSORCIO ALIANZA MOCOA Rep. Legal. Álvaro Luis Villanueva Riascos		
INTERVENTOR	SERVICON CS S.A.S Rep. Legal. Eliana Andrea Ceballos Arevalo		
	Interventor mediante contrato No. 786 de fecha: 14/04/2023		

FECHA DE COMITÉ	11/07/2023	HORA: 10:00 AM
CONVOCADO POR	Secretaria de infraestructura Departamental	
TEMA PRINCIPAL	Seguimiento a la ejecución de obra Revisión aspectos técnicos, administrativos y juridicos	

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Álvaro Luis Villanueva Riascos	CONSORCIO ALIANZA MOCOA
Eliana Andrea Ceballos Arevalo	SERVICON CS S.A.S
Max Fredy Ruiz Navarro	Supervisor
Nombre	

Desarrollo

10:24 am del 11/07/2023 Inicia el Comite Técnico N° 1 con el saludo del ingeniero Jorge Cortez (Apoyo SIG) resumió el proceso de inicio del contrato.

1. Aspectos Administrativos - Pólizas: Realizó la recomendación de dar cumplimiento debido que los recursos son de Regalias y estan vigilados por otros entes de nivel nacional. Reitero la solicitud de poliza con acta inicio y los soportes de pago de estampillas; documentos que deben reposar en el expediente original

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

Contratista de obra ing. Luis R Rincon, adquiere compromiso de presentar y subsanar hoy la presentación de los documentos (Polizas y soportes de pago estampillas)

2. Aspectos Tecnicos.

Se realizó la presentación del equipo.

- Luis Roberto Ricon - Contratista - Conexion Virtual
- Miguel Joven - Direccion proyecto - Contratista - Conexión Virtual
- Mauricio Vera - Apoyo Interventoria - Conexion Virtual.
- Andres Muñoz - Residente obra
- Brigit Rojas - inspectora
- Sheril Rojas - SST - Obra
- Frayder Vargas - Residente Interventoria - Apoyo Interventoria
- Juliana Arteaga - Apoyo a la interventoria
- Carolina Zuñiga - Apoyo a la interventoria

3. Avances

Jorge Cortez Resume evidencias que se encontraron en visita tecnica realizada; convoco a los contratistas a que en estos comites se traten esos temas para dar cumplimiento al cronograma de obra; solicitó reporte del avance a la interventoria y recomendó presentar oportunamente los informes los cuales se reportan a plataforma Geoprey.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

Interviene el ingeniero Freyder Vargas; quien menciona aspectos técnicos así

- Pedestal C1 y D5 presentan diferencias de alturas
- Pedestal A2 opción de construir 2 cajas para desviar tubería
- Ciclopeo de 1 metro x 1.80 en todos los pedestales
- Pedestal A6 sin novedades
- Pedestal B6 tema de derrumbes se está estabilizando
- Pedestal C1 estaría para ciclopeo
- Pedestal D5 tiene un replanteo estructural; situación de la cual ya tiene conocimiento la Interventoría
- Pedestal E4 - se hizo demolición listo para continuar
- Adelantados Pedestales A y B son de poca altura: el consorcio trabaja y de los 8 pedestales 4 no tienen problema.

Jorge Cortez manifestó que desde la Secretaría de Infraestructura entrega copia de la circular que requiere el cumplimiento en la presencia del personal

Solicito además el cumplimiento de los pagos de seguridad social, afiliaciones. Recomendó estricto cumplimiento

Carolina Zuñiga manifestó en el informe semanal ya está soportes de afiliación de EPS y ARL, Pendiente fondo de pensiones y caja compensa. solo del personal de obra faltando el equipo mínimo

Jorge Cortez refiere que desde el 4/07/2023 los contratistas deben tener todo el personal debidamente afiliado (personal

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

minimo y del personal en obra)

Miguel Joven - Director de obra manifesto que el personal esta afiliado, adquirió el compromiso de entregar afiliaciones a la interventoría el dia 12/07/23

El ingeniero Jorge Cortez; expuso que segun lo tratado se ve que saldrá mayores cantidades por lo que recomendó ir analizando en planos con el fin de ir avanzando para incluir en una sola. Realizó recomendaciones de cumplimiento a los elementos de protección.

Por parte de la interventoria recomendo el cumplimiento de los elementos de protección personal; tambien manifestó que las hojas de vida del personal minimo ya estan aprobadas.

Pendiente que el contratista informe a la interventoría las observaciones técnicas encontradas.

Siendo las 11:10 am termina Comité técnico N= 1

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 01

CONCLUSION PRINCIPAL/COMPROMISOS

1. El 11/07/23 el contratista obra entregará soporte pago estampillas y pólizas actualizadas con acta Inicio
2. Para el 12/07/23 el contratista entregará soportes de afiliación a seguridad social. y también Interventoría

(nombre)
Secretario de Infraestructura Dptal. — firma

(nombre) Jorge Andres Cortez Vera
Profesional Universitario — firma

(nombre) ANDRES MUÑOZ LOJAS
Contratista de obra RESIDENTE OBRA — firma

(nombre) FREIDER VARGAS PLAZAS
Interventoría ARQUITECTO. — firma

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSION:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD	QUIEN ORGANIZA

LUGAR	FECHA	HORA
	11/07/2023.	

TEMA A TRATAR:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	ANDRES MUÑOZ LOJAS	1014206198	CONTRATISTA	andress.munoz r@gmail.com	3507072895	
	Juliana Alegria C.	1.124.865.008	Interventoría	lac[illegible]@hotmail.com	3104649[illegible]	
	Carolina Zuñiga	1.075[illegible]86	Interventoría	[illegible]@gmail.com	3209[illegible]80	
	Cheryl Pardo	1124814169	Contratista	sharl2488@hotmail.com	3223117594	
	Freider Vargas Platas	1.083.916.566	Interventoria	Freyanidez@gmail.com	3[illegible]2992042	
	Dina Brigith Rojas	1.088.241.733	Contratista	brigrsg@outlook.es	3103953665	
	Jorge A. Cortez Vera	1.053 825. 160	SID Gobernación	ingjorgecortezv@gmail.com	3124[illegible]	

ACTA COMITÉ N° 02

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT- IVC -003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/09//2015

TIPO DE LA REUNIÓN: Comite tecnico No 2.	**Acta No.:** Comite tecnico No 2
DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE:	**Fecha:** 15-09-2023
OBJETO: Seguimiento a la ejecucion del Contrato de obra No 783 de 2023.	**Hora Inicio:** 10:00 am
LUGAR: Secretaria de Intraestructura Departamental	**Hora de Terminación:**

ORDEN DEL DÍA	
1	Bienvenida y toma de asistencia
2.	Intervenciones de las partes.
3.	Compromisos y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a los asistentes y convocados al presente comite de obra No 2.

- Juan Pablo Borbano
- Manuel Toro
- Andres Moñoz
- Freiden Vargas
- Carolina Zuñiga

No se contó con la Presencia de los representantes legales ni de obra ni de interventoria

Se da inicio al comite tratando los siguientes Puntos, asi:

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 300.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-SIG-009
	ACTA REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 07/06/2017

1.) Informe No 1

- Pagos de planillas ss. seguridad social tanto al contratista de obra como de interventoria deben cumplir con los pagos de ley segun la Propuesta Economica y salarios establecidos. se deben Ajustar

2.) Por Parte de la supervision se solicita que se haga una revision completa y general del proyecto para evitar posibles inconsistencias futuras.

3.) Referente al acero se estipula que las cantidades contractuales segun el contrato alcanzan con las modificaciones de profundizacion realizadas segun el concepto del geotecnista.

4.) se deben presentar los apu de los item no previstos/ imprevistos de las actividades de obra

5.) Por Parte de la supervision se solicita un plan de contingencia debido a que en el mes No 2 se presenta un atraso en la programacion del 1,35%, Programado fue 6.03% y el ejecutado fue del 4,68%

6.) Interventoria: manifiesta tener inconvenientes con el personal minimo presentado, a la fecha no se cuenta con los documentos del profesional electrico. De igual forma se tiene incumplimiento con el profesional siso, debido a que no cumple con el Porcentaje de dedicacion del 100%.
se debe mejorar el informe del SST.

7.) Supervision solicita entregar los informes mensuales antes del 12 de cada mes para poder remitir el reporte al Gesproy.

8.) Se solicita se remita la conformacion de la Veeduria ante la Personeria

se da por terminado el comite y se procede a realizar una visita tecnica al lugar de ejecución

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-SIG-009
	ACTA REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 07/06//2017

OBSERVACIONES
Se solicita mejorar los rendimientos de obra para cumplir con el cronograma y programacion de obra

COMPROMISOS			
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**
1	Entrega del plan de contingencia a la Interventoria	contratista de obra	20/09/2023
2	Revision y aprobacion plan de contingencia	Interventoría	1 día
3	entrega de Hoja de vida del profesional electrico a la interventoría	Contratista obra	18/09/2023

En constancia firman:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jorge A Cortez V	Prof Universitaria SLD	
ANDRES MUÑOZ BOJAS	RESIDENTE OBRA	
Manuel Toro	INSPECTOR OBRA	Manuel Toro
Carolina Forero	Apoyo interventoria	
FREDDER VARGAS	APOYO INTERVENTORIA	
Juan Pablo Bedoya	Apoyo Interventoria	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSION:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD		QUIEN ORGANIZA	
Comite tecnico No2		Secretaria de Infraestructura	
LUGAR		FECHA	HORA
Secretaria de Infraestructura Departamental		15-09-2023	10:00 am
TEMA A TRATAR: Seguimiento a la ejecucion del contrato de obra No 783 de 2023			

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Pablo Burbano	1.127.783.517	Interventoria	jpbo.burbano1319@gmail.com	3125[illegible]865	
2.	Manuel Toro	1017210421	OBRA	manueltoro89906@Gmail.com	3046229428	Manuel Toro
3.	ANDRES MUÑOZ ROJAS	1042106198	OBRA	obra.mocoa763@gmail.com	3507[illegible]289	
4.	FREIDER VARGAS PLAZAS	1.083.916.566	INTERVENTORIA	interventorias.eyrconcsas@gmail	3139847312.	
5.	CARLINA ZUÑIGA	1.075.261.186	Interventoria	interventoriasyrconcsas@gmail.com.	3209137480	

ACTA COMITÉ N° 03

	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-SIG-009
PUTUMAYO GOBERNACIÓN	PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión	VERSIÓN	03
	FORMATO	Acta de Reunión o Comité	FECHA	17/08/2023

TIPO DE REUNIÓN:	Interna: [redacted]	Externa: [redacted]	Acta No. 03	Fecha: 09/10/2023
DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE:	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		LUGAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" CTO 763-2023 "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" (INTERVENTORIA) CTO 786-2023			Hora inicio: 10:00 AM	Hora fin: 11:00 AM

ORDEN DEL DÍA	
1	Saludo y presentación por parte del secretario de infraestructura departamental.
2	Intervención de las partes.
3	Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. **Saludo y presentación de los asistentes**

La Secretaria de Infraestructura Departamental, representada por el Arq. Max Fredy Ruiz y quien ejerce la supervisión del contrato de obra No 763-2023 e interventoría No. 786-2023, brinda un saludo a todos los presentes y les agradece por asistir. Buenos días, siendo las 10:00 AM se da inicio al comité técnico No. 3 con la presentación de los siguientes asistentes:

- ARQ. MAX FREDY RUIZ -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA-
- ING. JORGE ANDRES CORTEZ VERA-PROFESIONAL APOYO SID
- ARQ. CARLOS EDUARDO CLEVES - PROFESIONAL APOYO SID
- JULIANA ARTEAGA-AUXILIAR DE INGENIERIA DE INTERVENTORIA SERVICON CS SAS
- FREIDER VARGAS PLAZAS-ARQUITECTO DE INTERVENTORIA SERVICON CS SAS

- MIGUEL EDUARDO JOVEN -DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ALIANZA MOCOA
- ANDRES MUÑOZ ROJAS -RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO ALIANZA MOCOA
- MANUEL TORO - INSPECTOR APOYO CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO ALIANZA MOCOA

2. Intervención de las partes

Se da inicio al tercer comité técnico, desarrollado en las instalaciones de la secretaria de infraestructura departamental, interviene el arq. Freider Vargas, quien señala que, en cuanto a las actividades realizadas, se han completado los pedestales A2, A6, B2, B6, C1, E4, F3 y D5, concluyendo así las tareas relacionadas con los pedestales y expresando que se puede dar inicio a las actividades de nivelación y posteriormente instalación de placa base y columnas que conforman la estructura metálica. Adicionalmente menciona que el desarrollo de la obra se han identificado actividades no contempladas en el contrato, como los baños y el manejo de aguas lluvias, que deben ser abordados.

Interviene la Ing. Juliana Arteaga apoyo de servicon cs sas, quien da a conocer el avance del proyecto, expresa que a la fecha se tiene un ejecutado del 20%, mientras que el programado es del 23,98%, con corte al mes tres, las actividades de instalación de estructura metálica tenían fecha de inicio la semana pasada, sin embargo, por el retraso en el envió de documentación actualizada por parte del contratista, no ha sido posible iniciar estas actividades. En obra se recibió parte de la estructura metálica, pero aun no han enviado todo como se había acordado.

El Ing. Jorge Cortez enfatiza la necesidad de haber corregido o advertido previamente ciertas situaciones. Destaca la importancia del oficio enviado por el Ing. Ruíz durante la visita de campo hace dos semanas. Además, solicita un cronograma detallado, ya que no se tenía conocimiento de que solo se había recibido una carga de material y que otra estaba pendiente. Aunque se mencionó que todos los materiales llegarían en un solo envío, aún no han sido entregados, lo que es crucial para el inicio de los trabajos.

Interviene el Ing. Miguel Joven, quien resalta tres puntos clave. Primero, reconoce que, aunque se han propuesto fechas para la ejecución, siempre existen riesgos y se ha gestionado la situación dentro de un margen de error aceptable. Segundo, solicita a la mesa técnica que considere el avance en planta al evaluar el progreso y propone establecer un acuerdo sobre cómo se controlará este aspecto, ya que en planta se ha venido trabajando en la estructura metálica, y esta llega a a obra lista para ser instalada. En tercer lugar, a partir de hoy se inicia la etapa de instalación de la estructura; sin embargo, se han enfrentado desafíos relacionados con ajustes documentales. Por lo tanto, se están coordinando el uso de dos grúas: una para el movimiento interno y otra para el izaje de los módulos. Dado el limitado espacio disponible, se ha planificado realizar el izaje en el área de la cancha.

Es necesario finalizar los detalles relacionados con la adecuación entre el tamaño de la grúa y el módulo, asegurando que sean compatibles en capacidad. Una vez perfeccionados estos aspectos, se espera que el proceso de instalación avance rápidamente, ya que se cuenta con un equipo especializado. Además, se atenderán los requerimientos documentales durante la semana.

También, se está analizando la optimización de los tiempos; por ello, se ha solicitado al contratista de obra una explicación detallada del método constructivo. Además, es importante coordinar las actividades realizadas en taller y obra. Es indispensable, que el documento indique claramente cuándo se cargará en taller y cuándo llegará a Mocoa, para asegurar el cumplimiento de los plazos. Asimismo, este programa tiene como objetivo proporcionar visibilidad sobre el envío de materiales, evitando confusiones como la llegada parcial de la estructura metálica. También es crucial que se especifique el estado actual de la fabricación y los tiempos previstos para la entrega.

Cambiando el tema a tratar, en temas de seguridad social, el abogado de la Secretaría de Infraestructura interviene, para aclarar que tienen autonomía en la elección de la forma de vinculación y en la determinación de los honorarios del personal mínimo requerido para la obra. No obstante, señala que en la propuesta del contrato no se contemplaron los valores para este personal. Por lo tanto, ha surgido una discrepancia, ya que, aunque estos valores no se incluyeron en la propuesta, estaban previstos en el AIU dentro del procedimiento contractual. En consecuencia, estos presupuestos sirvieron de base para establecer el porcentaje de administración del 25%, que incluye los costos de la contraprestación del personal mínimo.

En este contexto, consideramos necesario verificar el cumplimiento de ciertos aspectos. Específicamente, debemos revisar si el pago de las cotizaciones del personal se ajusta al presupuesto previamente establecido por la administración para ofertar este contrato. De no cumplirse este requisito, se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa justificada, ya que el presupuesto estableció ciertos valores y cualquier excedente se consideraría inapropiado. Por lo tanto, si el pago realizado es inferior al presupuesto, esto podría resultar en un enriquecimiento indebido para una de las partes y un empobrecimiento para la otra.

Además, es fundamental verificar que el pago al sistema de seguridad social se realice conforme a los valores establecidos. En consecuencia, discrepamos con la postura asumida por el contratista y solicitamos que se cumpla con los valores predefinidos para el proyecto.

El Ing. Miguel Joven informa que transmitirá la solicitud al representante legal, enfatizando que su rol no es defender el reporte, sino tramitar la solicitud de la administración para resolver la discrepancia. El abogado aclara que, al recibir un acta parcial, se procederá con la verificación correspondiente; si se detectan inconsistencias, no se tramitarán las actas resultantes.

Se identificó una observación adicional respecto al profesional SISO, ya que se estuvo sin este especialista durante casi quince días. En relación con la dedicación del 100% al equipo mínimo, es crucial cumplir con esta exigencia. Además, el director de interventoría tiene una dedicación del 30%, y con la próxima fase de soldadura, es fundamental contar con un ingeniero especializado en soldadura dentro del equipo mínimo. Este profesional debería estar presente, especialmente ahora que se iniciará la instalación de los elementos metálicos.

Estas recomendaciones están orientadas a garantizar el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma. Aprovechando la presencia del director, solicitamos que el especialista en estructuras y el de interventoría se mantengan en el equipo mínimo y que se realice una revisión completa del proyecto,

considerando las modificaciones y posibles adiciones necesarias. Esta solicitud fue realizada el mes pasado y, hasta la fecha, no se ha efectuado la revisión completa ni se han justificado adecuadamente. Es necesario hacer una modificación integral del proyecto, dado que es financiado con regalías y no se deben realizar modificaciones mensuales.

El Ing. Miguel Joven indica que el proyecto está bien definido en su estado actual, habiéndose superado ya las fases más complejas, especialmente en lo relacionado con la cimentación. Es importante aclarar que no se demolió ningún pedestal; se trató de un ajuste en la cimentación ciclópea. Estructuralmente, todos estamos alineados con el enfoque de trabajo y hemos identificado los ajustes necesarios en los aspectos hidráulicos, cerramiento y baños.

Ahora, es esencial coordinar con el equipo de interventoría para afinar las cantidades y formalizar las soluciones para la parte hidráulica, que ya fueron recibidas y revisadas por la dirección de interventoría. Estos ajustes se encuentran en una etapa preliminar y requieren ser documentados formalmente para su trámite ante el departamento correspondiente, con el objetivo de obtener la aprobación necesaria.

En cuanto a los camerinos y la gradería, es necesario abordar los ajustes pendientes, que incluyen la integración de jardineras y la revisión de las plantas arquitectónicas. También se debe solucionar el problema de accesibilidad relacionado con los pedestales, que actualmente obstruyen el acceso y afectan las medidas de la cancha. Es crucial resolver estos problemas para evitar inconvenientes en el campo.

El Arq. Carlos Eduardo Cleves presenta sus observaciones sobre los planos proporcionados por el Ing. Jorge Cortez. Señala que los planos presentan numerosas deficiencias en la planimetría: Carecen de cortes, fachadas, despieces, tipos de materiales, cotas, ejes y manchetas. Además, los planos no están fechados ni firmados por el profesional competente, lo cual es fundamental. También, recomienda considerar la incorporación de un profesional delineante para manejar la exportación de archivos y asegurar la coherencia arquitectónica en el proceso.

El Secretario de Infraestructura, Max Fredy Ruiz, señala que debemos centrarnos en equilibrar el contrato, especialmente en lo relacionado con el cerramiento y el muro. Además, se deben abordar las soluciones para el sistema hidráulico y el acceso a los baños, asegurando que la cantidad de muro se contemple adecuadamente. Aunque, la modificación judicial pendiente implica que debemos considerar la equivalencia de recursos, ya que algunos fondos pueden ser redirigidos a otras áreas que también requieren financiamiento. Finalmente, se plantea realizar un replanteo único del proyecto. La razón de esta estrategia es evitar múltiples modificaciones que podrían afectar la calificación del proyecto.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

CONCLUSIONES:

1. El contratista de obra, CONSORCIO ALIANZA MOCOA, se compromete a iniciar de manera inmediata el ensamblaje y elevación de la estructura metálica de la cubierta. Adicionalmente, se

compromete a remitir el método constructivo correspondiente al proyecto, garantizando así el cumplimiento del cronograma establecido.

2. De parte de la secretaria de infraestructura solicitan el cronograma actualizado de acuerdo a las actividades que se van a realizar en trascurso del mes.

3. El contratista debe verificar que el pago al sistema de seguridad social se realice conforme a los valores establecidos. En consecuencia, se solicita que se cumpla con los valores predefinidos para el proyecto.

4. CONSORCIO ALIANZA MOCOA deberá cumplir con la dedicación del 100% del personal mínimo requerido, incluyendo a la profesional SISO. Por su parte, la interventoría SERVICON CS SAS deberá asegurar que el director de interventoría dedique un 30% de su tiempo, y que el resto del equipo mínimo cumpla con sus respectivas responsabilidades.

5. CONSORCIO ALIANZA MOCOA se compromete a efectuar los ajustes necesarios en la planimetría hidráulica, el muro de cerramiento, la accesibilidad de los baños, la tarima, y las medidas de la cancha, garantizando que estos elementos cumplan con los estándares establecidos.

COMPROMISOS:

1. Iniciar la instalación de las columnas metálicas y remitir el método constructivo correspondiente a la interventoría.
2. Enviar a la interventoria el cronograma detallado donde relacione las actividades a ejecutar

3. Ajustar la propuesta de adjudicación, considerando los valores contractuales correspondientes.

4. Cumplir con la dedicación del personal mínimo tanto por parte del contratista de obra, CONSORCIO ALIANZA MOCOA, como de la interventoría, SERVICON CS SAS.

5. Enviar a la interventoría SERVICON CS SAS los planos ajustados que contemplen la planimetría hidráulica, el muro de cerramiento, la accesibilidad de los baños, la tarima y las medidas de la cancha, incluyendo tanto las cantidades mayores como menores.

FIRMAS ASISTENTES			
Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Firma
MAX FREDY RUIZ	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	

FIRMAS ASISTENTES			
Nombres y apellidos	**Entidad**	**Cargo**	**Firma**
JORGE ANDRES CORTEZ VERA	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	PROFESIONAL APOYO SID	
CARLOS EDUARDO CLEVES	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	PROFESIONAL APOYO SID	
JULIANA ARTEGA	SERVICON CS SAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	
FREIDER VARGAS PLAZAS	SERVICON CS SAS	ARQUITECTO	
MIGUEL EDUARDO JOVEN	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	DIRESCTOR DE OBRA	Miguel J.
ANDRES MUÑOZ ROJAS	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	RESIDENTE DE OBRA	
MANUEL TORO	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	INSPECTOR APOYO	

	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó PT:	Arq. Carlos Eduardo Cleves B	Secretaria de Infraestructura	Profesional Apoyo Técnico SID	
Proyectó PJ:	Doc. Ximena Ceron	Secretaria de Infraestructura	Profesional Apoyo jurídico SID	

ACTA COMITÉ N° 04

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

CONVENIO □ CONTRATO □X		MUNICIPIO	MOCOA
No. 763	FECHA	24/04/2023	
OBJETO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	CONSORCIO ALIANZA MOCOA Rep. Legal. Álvaro Luis Villanueva Riascos		
INTERVENTOR	SERVICON CS S.A.S Rep. Legal. Eliana Andrea Ceballos Arevalo		
	Interventor mediante contrato No. 786 de fecha: 14/04/2023		

FECHA DE COMITÉ	31/10/2023	HORA: 04:00 pm
CONVOCADO POR	Secretaria de infraestructura Departamental	
TEMA PRINCIPAL	Mesa de trabajo - Seguimiento a la ejecución	

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Álvaro Luis Villanueva Riascos	CONSORCIO ALIANZA MOCOA
Eliana Andrea Ceballos Arevalo	SERVICON CS S.A.S
Max Fredy Ruiz Navarro	Supervisor

Desarrollo

Siendo las 4:05 pm del 31/10/2023, se da inicio a la mesa de trabajo y de seguimiento a la ejecución del contrato de obra No 763. de 2023, de manera virtual a traves de la Plataforma Google Meet.

- Se da la brenvenida a los convocados y se procede a que se presenten cada uno con el cargo que ejercen en el Proyecto:

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

- Jorge Andres Cortez : Profesional Apoyo SID
- David Tez : Abogado Apoyo SID.
- Andres Muñoz : Residente de obra
- Freider Vargas : Residente de Interventoria.
- Luis Roberto Rincon: Ing. Mecanico -obra

Por Parte de la Supervision se pone en conocimiento de los temas principales a tratar

1. Diseño del Cerramiento Perimetral
2. Diseño Hidraulico (caja de inspección ubicada en el sanitario Femenino y ubicacion de descole de las aguas desde la cobierta a coretas de concha)
3. Diseños de Sanitario de Hombres (reubicación Presentar Propuesta de solucion)
4. Diseño arquitectonico (zona de las jardineras en las gradenias, acceso a baterias sanitarias)

- Se aclara desde la SID que referente a la ejecución de obra se evidencia que en la instalacion de las columnas se estan haciendo ajustes mediante cortes a la mitad de las columnas ya instaladas. debido a que no cumplen la pendiente de diseño.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

- Se solicita al contratista implementar mas personal para subsonar los inconvenientes presentados en obra puesto que ya deblan iniciarse las trabajos para tapar la cobierta.
- Se solicita implementar on plan de contingecia para recuperar el tiempo y lograr complir con el cronograma.
- Se requiere incorporar mas personal para las actividades de soldadura e instalacion de las columnas y al armado de las vigas de cubierta.
- Se solicita al contratista responder las solicitudes por parte de la interventoria referente al plan de trabajo para la instalacion de la cobierta.
- Se requiere al contratista que vincule todo el personal propuesto para avanzar en los temas que seron motivo para realizar la Modificacion al Proyecto sin descuidar la ejecucion de obra.

Por parte de la interventoria se hacen las siguientes apreciaciones:

CONCLUSION PRINCIPAL/COMPROMISOS

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

- Manifiestan que hasta la semana 17 se lleva un porcentaje de 27% de ejecucion Vs a un 43% de programado.
- Se encuentran realizando actividades de soldadura de las Columnas de 6" y 8" en los Pedestales A2 Y A6, Ya se encuentran terminados los Pedestales B2 Y B6 en soldadora y corte Para Ajuste de Pendiente, Para continuar con el izaje de los cajones
- Referente a los cajones se deben realizar una Correccion de Pintura y anticorrosivo.
- En el cierre Perimetral se lleva instalando acero hasta la ubicacion de la vaya.
- Que se estan revisando las temas de la modificacion Pero se deben tener todos los Items aprobados Para Poder Continuar y definir el balance de Cantidades

Por Parte del Contratista manifiesta que ya se tiene definido el Equipo Para Poder atenizar el modificatorio Y solicita que se realice entregas Parciales Para que se Vayan revisando una vez se tenga.

CONCLUSION PRINCIPAL/COMPROMISOS

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

- Contratista manifiesta que implementará un plan de contingecia el cual presentará una vez lo disponga que se realizará un analisis para mejorar la estrategia de instalación
- Que disponen de un equipo para realizar la modificación

Por ultimo la supervision aclara que todo ajuste por ser recursos del sistema general de regalias lo rige el acuerdo 07 de 2022 y ley 2056 de 2020.

Por lo tanto se debe tener

- Diseños
- Planos
- Concepto viabilidad de la interventoría
- Certificacion tecnica, administrativa y Financiera
- APUS nuevos
- Memoria de cantidades de obra
- Cotizaciones
- Especificaciones tecnicas Items nuevos
- Balance del Proyecto.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

COMPROMISOS

		Fecha
1.)	Plan de Contingencia	07/11/2023
2.)	Seguimiento semanal	Cada Semana.
3.)	Balance Proyecto	10/11/2023
4.)	Diseño Cerramiento (80 Portes)	07/11/2023
5.)	Propuesta reubicacion Baños Hombres	10/11/2023
6.)	Diseño Hidraulico	07/11/2023


Por ultimo el abogado de SID manifiesta que los compromisos suscritos son de estricto cumplimiento toda vez que se evidencia un atraso en la ejecución por lo tanto es indispensable Ponerse al dió en el cronograma suscrito para Poder llegar a un feliz termino, ya que como se evidencia serían causas imputables al contratista por lo que la entidad no estaria de acuerdo en ampliar el plato contractual en caso de requirirse

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017


ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 4

Se anexa Pantallazo invitacion a Reunion Google Meet

Jorge Andres Cortez Vera
Prof. Universitario SID


firma

J. David Tez Montenegro
Prof. Esp. Apoyo Jco SID



firma

ANDRES MUÑOZ LOJAS
RESIDENTE OBRA


firma

FREIDER VARGAS
APOYO INTERVENTORIA


firma



MESA DE TRABAJO CUBIERTA SAN AGUSTIN CTP 763-2023

Creado por: Jorge Andres Cortez · Tu respuesta: ✔Sí, asistiré.

Hora

4pm - 5pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mar 31 oct 2023

Invitados

- ✔ ing.mauriciovera@gmail.com
- ✔ Jorge Andres Cortez
- alianzamocoa2023@gmail.com
- interventoriaserviconcssas@gmail.com
- jacortezvera@gmail.com
- serviconcssas@gmail.com
- tezjuridico@gmail.com

Mis notas

ACTA COMITÉ N° 05

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 05

CONVENIO ☐ CONTRATO ☐X		MUNICIPIO	MOCOA
No. 763	FECHA	24/04/2023	
OBJETO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	CONSORCIO ALIANZA MOCOA Rep. Legal. Álvaro Luis Villanueva Riascos		
INTERVENTOR	SERVICON CS S.A.S Rep. Legal. Eliana Andrea Ceballos Arevalo		
	Interventor mediante contrato No. 786 de fecha: 14/04/2023		

FECHA DE COMITÉ	07/12/2023	HORA: 02:00 pm
CONVOCADO POR	Secretaria de infraestructura Departamental	
TEMA PRINCIPAL	Seguimiento a la ejecución del contrato	

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Álvaro Luis Villanueva Riascos	CONSORCIO ALIANZA MOCOA
Eliana Andrea Ceballos Arevalo	SERVICON CS S.A.S
Max Fredy Ruiz Navarro	Supervisor

Desarrollo: el 7 de diciembre del 2023 siendo las 3:20 pm se da inicio al comité técnico No.5 con el saludo del ing. Jorge Cortez (apoyo SID) y la respectiva presentación de cada uno de los asistentes:
AURA ISABEL CORDOBA (profesional SST)
ANDRES MUÑOZ ROJAS (residente de obra)
FREIDER VARGAS PLAZAS (interventoría)
JULIANA ARTEAGA (apoyo a la interventoría)
FRANCY CANCHALA (apoyo profesional SID)
MANUEL TORO (consorcio alianza Mocoa)
MAX FREDDY RUIZ (secretario infraestructura)
ANDRES DAVID GOMEZ (profesional SID)
MAURICIO VERA (interventoría)
MIGUEL EDUARDO JOVEN (director de obra)
LUIS RINCON (consorcio alianza Mocoa)

La Ingeniera Francy lleva a cabo observaciones durante la visita a la obra y da lectura al informe correspondiente. El Ingeniero Andrés Gómez, en calidad de apoyo SID, toma la palabra para informar que la visita se realizó de manera visual, sin profundizar en detalles. No obstante, se

destacan observaciones sobre los cortes en los pedestales, los cuales fueron soldados nuevamente debido a deficiencias en la soldadura original. Se enfatiza la necesidad de revisar estos cortes en detalle, ya que representan puntos críticos de falla que, de no estar correctamente soldados, pueden comprometer la integridad estructural.

El Ingeniero Gómez también señala la preocupación por la posición de una platina, indicando que su ubicación actual fuera del eje y de la columna la hace susceptible a doblarse con el tiempo, generando daños. Se destaca la importancia de corregir las soldaduras defectuosas, pero se advierte sobre la necesidad de hacerlo adecuadamente para evitar problemas adicionales.

Posteriormente, el Ingeniero Cortez toma la palabra para informar que la visita realizada fue únicamente visual. Se menciona la contratación de una firma interventora a través de un proceso de concurso de méritos, destacando la experiencia y competencia de los profesionales seleccionados. Se cede el turno a la Interventoría para que proporcione aclaraciones, observaciones y posibles soluciones ante las deficiencias identificadas en la obra. Se menciona un plan de contingencia programado para abordar problemas específicos, como los relacionados con los cizajes.

El Ingeniero Javier Vera, en representación de la Interventoría, expone que recibió los resultados de las pruebas de soldadura el día anterior. Se indica la necesidad de detener la obra para realizar reparaciones que garanticen la estabilidad de la estructura frente a las cargas previstas. Se menciona la realización de pruebas adicionales para evaluar la calidad de las reparaciones y se destaca la importancia de tomar medidas para evitar la presencia de líneas de falla. Se plantea abordar el tema con el contratista de obra sobre el manejo de la situación.

El Ingeniero Andrés Gómez, en su intervención posterior, explica las dificultades para corregir soldaduras defectuosas debido a las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso. Se señala la falta de soldadores calificados y se hace hincapié en el daño ocasionado al acero por temperaturas elevadas, evidenciado en orificios en las soldaduras. Se destaca la importancia de contar con profesionales capacitados para garantizar la calidad de las reparaciones.

Se plantea la preocupación de que el acero presente en la estructura esté dañado y no sea funcional. Se discuten diversas opciones invasivas para abordar el problema, como encamisar, soldar arriba y abajo, o incluso cortar el elemento. Se destaca la necesidad de monitorear cada soldadura y análisis con ensayos de laboratorio.

La Ingeniera Francy Cánchala (apoyo SID) expresa su inquietud acerca de la compatibilidad geométrica, señalando que el elemento modelo superior está significativamente fuera del elemento base. Se cuestiona el uso de topografía detallada y se sugiere revisar las medidas estructurales para evitar incertidumbres.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 05

El contratista de obra responde a las preguntas y se plantea la preocupación sobre la pendiente incorrecta en un elemento vertical. El Ingeniero Andrés Gómez destaca la importancia de calcular correctamente las pendientes para garantizar la precisión en la construcción.

La Ingeniera Francy señala un problema relacionado con la dimensión del elemento, destacando que el modelo de la colmena es más grande que el que están armando, lo cual puede afectar la integridad de la estructura.

El contratista explica dos situaciones y asegura que se atienden todas las observaciones. Se enfatiza la importancia de corregir las percepciones erróneas y abordar los hallazgos preocupantes.

El Ingeniero Jorge Cortez toma la palabra para expresar su preocupación sobre la ubicación de paneles sobre la viga, que es crucial para la distribución de cargas y resistencia sísmica. Se destaca la necesidad de tener apoyos completos para garantizar la estabilidad de la estructura.

El Ingeniero Mecánico Luis Rincón del consorcio Alianza Mocoa toma la palabra durante la videoconferencia y expresa su comprensión hacia las preocupaciones manifestadas. Destaca la importancia de respaldar todas las acciones con un modelo matemático estructural sólido. Asegura que, como contratistas y profesionales, cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarios para garantizar la integridad de la estructura, respaldada no solo en detalles sino también en un modelo matemático.

El Ingeniero Rincón aborda el tema de las casas, indicando que el método constructivo utilizado es válido para identificar diferencias en obras. Menciona la posibilidad de realizar reparaciones, cortes de longitud o alargamientos de elementos, respaldándolos numéricamente. Subraya la importancia del cálculo estructural como factor determinante para evaluar la idoneidad de la obra.

Ante esto, el Ingeniero Jorge Cortez interviene y menciona la existencia de planos y un diseño inicial, preguntando si se planea realizar un replanteo en el diseño estructural. El Ingeniero Luis Rincón aclara que todos los planos, desde los estructurales hasta los de construcción, deben estar respaldados por el diseño final y que cualquier cambio estructural debe reflejarse en los planos finales. Subraya que no se trata de un replanteo puntual en el diseño, sino de garantizar que los cambios estén respaldados en los planos finales.

Finalmente, el Ingeniero Jorge Cortez solicita la corroboración del ingeniero de estructuras del consorcio y también consulta al director de obra, el ingeniero Miguel Eduardo, quien es

especialista en estructuras, para obtener su concepto referente al informe presentado por la hipótesis planteada del Ingeniero Luis Rincón.

El Ingeniero Max Ruiz, en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, expresa su confusión respecto al soporte y ubicación de la colmena en la obra, cuestionando la necesidad de su posición actual y la carga que esta representa. Andrés Gómez responde indicando que se deben evaluar las simplificaciones estructurales en todos los aspectos y señala que la carga de la viga no está en el centro, sino en otro lugar.

Posteriormente, el Ingeniero Max Ruiz plantea la pregunta sobre los controles de calidad implementados en la ejecución del proyecto. Mauricio Vera, en representación de la interventoría, responde detallando los controles realizados, desde topografía hasta ensayos especiales para abordar dificultades con pedestales. Destaca la colaboración entre obra e interventoría y menciona los ensayos de concreto como parte del control constructivo.

Max Ruiz reflexiona sobre la posibilidad de inconvenientes en obras, pero cuestiona la realización de ensayos para verificar la calidad de la soldadura en el momento oportuno, especialmente dada la altura de la estructura. Mauricio Vera explica que los elementos llegaron prefabricados y que las verificaciones se realizaron posteriormente debido a problemas de altura.

Jorge Cortez interviene para explicar cómo se unieron las columnas y los elementos prefabricados. Max Ruiz destaca la importancia de contar con un especialista que verifique en el momento la calidad de la soldadura para evitar retrasos en la obra.

Andrés Gómez añade información sobre la cantidad de soldaduras y la necesidad de evaluar su calidad, destacando que hay numerosas obras deficientes realizadas por el soldador.

Finalmente, Luis Roberto toma la palabra para explicar que la normativa NSR diez exige la inspección aleatoria del 5% de las uniones soldadas críticas, como las placas base y el empalme de columnas.

Entonces, se plantea que ya se tiene un plan para llevar a cabo la inspección necesaria. Se destaca que se realizaron inspecciones de columnas y cajones en taller, y se ha enviado el informe correspondiente junto con el certificado de calidad de los cajones. Se menciona la importancia de que también haya un control por parte de la obra, y se reconoce que se han identificado deficiencias que se están trabajando y corrigiendo en el campo.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 05

Se aborda la preocupación sobre algunas fotografías en el informe que muestran soldaduras quemadas, explicando que esto es normal debido al proceso de fusión al soldar sobre elementos con pintura. Sin embargo, se plantea la inquietud sobre la temperatura de algunas soldaduras, indicando que los ensayos realizados muestran daños en el acero que van más allá de la quema de la pintura.

El Ingeniero Andrés (SID) interviene para expresar discrepancias y señalar que no concuerda con las justificaciones presentadas. Se argumenta que los ensayos del territorio indican problemas en las soldaduras que no se deben simplemente a la quema de pintura. Se destaca que se observan deficiencias en los cordones de soldadura, como despegados, bultos y burbujas. Se enfatiza que el proceso constructivo de las soldaduras no sigue los lineamientos adecuados.

Se menciona la preocupación por la ubicación de la estructura, q cargas pesadas, como tracto mulas, generando vibraciones constantes y desgaste sobre las soldaduras. Se resalta la importancia de evaluar no solo el 5%, sino todos los puntos críticos, especialmente en las conexiones donde se cortaron pedestales. Se subraya la necesidad de evaluar y corregir las soldaduras en dichos puntos críticos, ya que la ruta crítica se centra en la calidad de las soldaduras.
El contratista de obra señala al ingeniero Andrés que se refería a imágenes distintas en relación con el informe que presentó anteriormente. Explica que las imágenes mostraban socavaciones de soldadura y se refiere al informe anterior, donde se evidencian cordones de soldadura de 5 centímetros cada 20 y 30, indicando que se mencionaba que esas soldaduras estaban mal hechas. Se destaca que se trata de técnicas específicas de soldadura, donde se reconoce la presencia de socavaciones y la necesidad de correcciones correspondientes.

Andrés Gómez (SID) interviene para expresar que la supervisión debería citar al ingeniero mecánico y al equipo mínimo de obra para que realicen verificaciones periódicas en campo. Jorge Cortez concuerda y menciona que en el presupuesto de la Interventoría hay un ingeniero especialista en soldadura. Se plantea la necesidad de analizar y revisar el cumplimiento de la dedicación del especialista en soldadura por parte de la Interventoría.

Se hace hincapié en la falta de control y seguimiento tanto por parte de la Interventoría como en la ejecución de la obra por parte del contratista. Se solicita al contratista que corrobore con otro ensayo el informe de la Interventoría y se pide que se realice el acompañamiento durante la ejecución de estos ensayos. La supervisión solicita una revisión de la totalidad de las soldaduras en sitio antes del listaje.

Se manifiesta la preocupación por la falta de compromiso y la necesidad de realizar reparaciones que podrían retrasar la obra. La supervisión hace un llamado a la Interventoría para que realice

un seguimiento estricto en temas de calidad. Se dejan compromisos, entre ellos, que una vez analizados los informes, se realizarán las reparaciones y se solicita un compromiso claro del contratista sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo estas reparaciones. Además, se insta a que los pares de la Interventoría y del contratista estén presentes en las pruebas próximas para garantizar un mismo concepto y evitar inconvenientes.
El Secretario de Infraestructura, Max Ruiz, destaca la importancia de que los pares estén presentes en la obra y hace hincapié en la necesidad de ser más estrictos en este aspecto. Luego, menciona que se deben definir el informe, las observaciones y el cronograma de examinaciones. Se plantea la cuestión de cómo garantizar el cambio necesario para cumplir con el plazo de entrega y si será necesario extenderlo. Ruiz señala que es consciente de que en las obras pueden surgir imprevistos, pero se requiere una definición para avanzar, ya que en el proceso de empalme se va a cuestionar, que la obra tiene como fecha límite marzo.

Jorge Cortez interviene para sugerir replantear el plan de contingencia, considerando las observaciones para subsanar lo encontrado. Se enfoca en la importancia de cumplir con los compromisos establecidos en comités anteriores y solicita una definición clara sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo las reparaciones.

Miguel Eduardo Joven interviene para proponer dimensionar los requerimientos y establecer un plan de atención a las observaciones. Se destaca la importancia de que los especialistas en soldadura de ambas partes trabajen juntos para definir el alcance de los tiempos.

Jorge Cortez insta a definir la fecha de reunión de los pares para presentar el informe lo antes posible. Miguel Joven propone que el especialista en soldadura confirme la fecha y se realice un diagnóstico y un plan de atención a las observaciones.

Andrés Muñoz Rojas del consorcio Alianza Mocoa contextualiza las acciones realizadas hasta el momento, mencionando la visita del inspector de soldadura y la corrección de soldaduras de elementos que venían de fábrica. Explica que se están ejecutando correcciones y se realizarán reuniones con los directores para abordar nuevas observaciones. También comunica la disponibilidad del inspector y la aprobación para la visita del día siguiente.

Ing. Max Ruiz destaca el compromiso y solicita que tanto la interventoría como el contratista definan los arreglos y ensayos, presentando un cronograma. El contratista responde que la prueba en campo se llevará a cabo el lunes.

Max Ruiz, Secretario de Infraestructura, comunica que el lunes se espera recibir el informe con las subsanaciones y el plazo previsto para realizarlas. Destaca la necesidad de comprender la urgencia debido al proceso de empalme en marcha con el gobierno entrante, con el objetivo de concluir la obra en marzo. Se plantea la posibilidad para ampliar los plazos si es necesario.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 05

Jorge Cortez interviene para proponer una revisión detallada del personal especializado, especialmente del ingeniero especialista en soldadura, cuyo desempeño impacta en el cumplimiento de la obra. Establece un compromiso para la entrega del informe de correcciones el próximo lunes, destacando la importancia de evidenciar el cumplimiento para evitar inconvenientes.

Ing. Luis Rincón se compromete a revisar la ubicación y comportamiento según el modelo matemático, brindando tranquilidad a los participantes. Se establece un compromiso adicional para el 15 de informar sobre el análisis de lo ejecutado.

La Ing. Francy interviene para resaltar la importancia de un proceso constructivo minucioso y la necesidad de trabajar con la topografía para garantizar la precisión en la instalación. Advierte sobre la falta de fusión y penetración en las soldaduras, haciendo hincapié en la importancia de controlar las temperaturas. Llama a tener cuidado con el proceso constructivo y sugiere un seguimiento detallado con topografía de detalle para evitar problemas futuros.

El ing. Jorge explica si se llega a iniciar un proceso de incumplimiento no quiere decir que les van a dar el incumplimiento totalmente. El proceso de incumplimiento es un análisis de las partes, cada uno tendrá sus descargos, luego se determinará ya por la oficina de contratación, ya sea una multa, sanción, caducidad, liquidación, eso es un proceso legal. O sea, no quiere decir que ya directamente ya se va parar la obra. La idea es que la obra siga.

CONCLUSION PRINCIPAL/COMPROMISOS

hay dos compromisos, el primero es que el día lunes se van a reunir para el tema de las reparaciones de las soldaduras y el segundo, que es el día viernes, 15, deben entregar el análisis a esta estructura que se encuentra ahí, y el tema del análisis estructural.

En segundo punto, tenía el cumplimiento de los compromisos del comité anterior, los cuales era la entrega del balance, la entrega de los diseños y la entrega del diseño, rediseño hidráulico y rediseño del cerramiento. Interventoría esta semana envió un oficio diciéndole que, si bien hizo una entrega inicial el contratista, no se han entregado las subsanaciones y correcciones a ello. Entonces, para que replanteemos este compromiso, que es que no se ha cumplido desde exactamente el 10 de noviembre, hoy 7 de diciembre, ya prácticamente va a ser un mes, que el contratista tiene conocimiento de estos rediseños que se deben hacer urgentemente. Para nosotros, como entidad, es importante que este año se dé esa modificación debido a que tenemos unas cantidades que son de considerar.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 05

Jorge Cortez plantea definir una fecha de presentación para el estricto cumplimiento y seguimiento ya que se esta en proceso de empalme y por ende se debe informar sobre la supervisión que se lleva a cabo.

Secretario de Infraestructura Dptal.




firma

Jorge Andres Cortez Vera
Profesional Universitario



firma

ANDRES MUÑOZ LOJAS
RESIDENTE OBRA
Contratista de obra



firma

FREIDER VARGAS
APOYO INTERVENTORIA
Interventoría



firma

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSION:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD	QUIEN ORGANIZA
Comité técnico No.5 Contrato de obra No. 763 de 24/04/2023 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Secretaría De Infraestructura Departamental

LUGAR	FECHA	HORA

TEMA A TRATAR:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jorge Cortes	1057621160	SID	ingjorgecortesv@gmail	3121476925	
2	Mauricio Vera	1104557700	Interventoria	Saviers@gmail.com.	3112778004	
3	Aura Isabel Cordoba	1006662627	C. Alianza Mocoa	isaau23@hotmal.com	3193309927	ISABEIC
4	Juliana Arteaga	1.124.865.008	Interventoria	Jac0897@hotmail.com	3107649893	
5.	Andrés David Gómez M.	1020771814	SID	andresgomez1104@gmail.com	3213401489	
6	ANDRES MUÑOZ ROJAS	1014206198	C-ALIANZA MOCOA	andres.munoz@gmail.com	3509071895	
7	Manuel Toro	1017770921	C-ALIANZA MOCOA	manueltoro1406@Gmail.com	3046224428	
8	FREIDER VARGAS PLAZAS	1083916566	INTERVENTORIA	freyamiral07@gmail.com	313-8473512	
9	Max F. Ruiz N	18.127.528	Secretaria Infr	maxruiz@putumayo.gov.co	311-2241556	
10	Franay Canchala M.	1124315656	SID	Canchala.franay@gmail.com	3238498078	
11.	Max F. Ruiz Navarro	18.127.528	SID	max.ruiz@putumayo.gov.co	3112241556	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SIG-017
	LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA	VERSION:02
		FECHA:28/02/2018

ACTIVIDAD (objeto y temática)		QUIEN ORGANIZA	
		QUIEN DIRIGE	
		HORA	
LUGAR	FECHA	Inicio	Final

No.	NOMBRE	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
1	Manuel Toro	Inspector de Obra	
2	ANDRES MUÑOZ LOJAS	RESIDENTE OBRA	
3	FREIDER VARGAS PLAZAS	APOYO INTERVENTORIA	
4	Juliana Arteaga C.	Apoyo interventoria	

ACTA COMITÉ N° 06

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 6

CONVENIO □ **CONTRATO** X		**MUNICIPIO**	**Mocoa Putumayo**
No. 763	**FECHA**	24/04/2023	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	CONSORCIO ALIANZA MOCOA Rep. Legal. Álvaro Luis Villanueva Riascos		
INTERVENTOR	SERVICON CS S.A.S Rep. Legal. Eliana Andrea Ceballos Arévalo		
	Interventor mediante contrato No. 786 de fecha: 14/04/2023		

FECHA DE COMITÉ	08/01/2024	**HORA:** 2:00 pm
CONVOCADO POR	Secretaria de infraestructura Departamental	
TEMA PRINCIPAL	**-PORCENTAJE DE SOLDADURA DE 3%** **-BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES A CERO**	

CONVOCADOS	**DEPENDENCIA/ENTIDAD**
Álvaro Luis Villanueva Riascos	CONSORCIO ALIANZA MOCOA
Eliana Andrea Ceballos Arévalo	SERVICON CS S.A.S
Max Fredy Ruiz Navarro	Supervisor

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité No 6 el día 08 de enero del presente año, siendo las 2:00 pm con la presentación de los asistentes:

JORGE ANDRES CORTEZ VERA (SECRETARIO INFRAESTRUCTURA)
JULIANA ARTEAGA (INTERVENTORIA)
ANDRES MUÑOZ ROJAS (RESIDENTE DE OBRA)
FREIDER VARGAS PLAZAS (INTERVENTORÍA)
MIGUEL EDUARDO JOVEN (DIRECTOR DE OBRA)
LUIS RINCON (CONSORCIO ALIANZA MOCOA)
MANUEL TORO (CONSORCIO ALIANZA MOCOA)

El Ing. Jorge Andrés Cortez Vera informa quien será el encargado a partir de hoy del apoyo a la supervisión de la Cubierta de San Agustín. el día de ayer se citó a este comité para evaluar unos temas que quedaron pendientes, compromisos en el Comité realizado el día 7 diciembre del 2023, donde se evaluaron unas conclusiones y unos

compromisos; uno de ellos era que el día lunes 11 de diciembre se iban a reunir para el tema de las reparaciones de soldaduras y el segundo, el día viernes 15 de diciembre, se debía entregar el análisis de la estructural.

De parte del Consorcio de Alianza, hace presencia el ingeniero Andrés Residente de obra, por parte de interventoría está la ingeniera Juliana Arteaga, Freider Vargas, Manuel Toro. La idea de este comité es saber cómo van a subsanar el tema del análisis de precios, la revisión de los compromisos, si ya solventaron, si ya subsanaron el tema de la soldadura, el informe del análisis estructural, la revisión del avance y la prórroga.

Respecto a la revisión de la soldadura, como se había discutido previamente, se ha venido resolviendo en obra. Además, interventoría enviará un informe; asimismo, ya se cuenta con el primer informe donde se da viabilidad a la soldadura inspeccionada a los primeros elementos de cajones revisados y columnas. Falta el segundo informe, que debería ser entregado a más tardar el lunes o martes 15 de enero. La revisión se realizó el sábado, y de parte de obra, estuvieron realizando la inspección de la soldadura ayer.

En resumen, el tema de la soldadura estaría subsanado. El especialista en el tema de soldaduras vendría a revisar para hacer el segundo informe y lo estarían entregando el día 15 o 16 del presente mes, la revisión y aprobación serían por parte de la interventoría; de igual manera, desde Infraestructura Departamental, se llevará a cabo la revisión.

Aparte de los ensayos que se van a realizar a las soldaduras en específico, a manera de recomendación, se menciona que se realice una inspección a los elementos adyacentes que están en la soldadura; sin embargo, también se realizará una revisión a toda la estructura. Se informa que la interventoría había emitido un oficio donde se requería al contratista realizar no solo a la soldadura sino a toda la estructura, las pruebas son de suma importancia; en este sentido, el día sábado se hará la respectiva visita con el segundo informe que va a presentar obra e interventoría. El tema de las soldaduras que sería entregado el 15-16 de este mes del presente año.

Otro tema es el informe del análisis estructural, si bien por parte de obra, hicieron un informe el cual no es claro, no es efectivo, para la revisión de los presentes ingenieros estructurales de la Secretaría de Infraestructura. De parte de ellos se hizo un oficio a la interventoría pidiéndole el informe completo del análisis estructural, este informe debe estar completo y que sea avalado por obra e interventoría, profesionales idóneos, residente y firma y aprobación del representante legal.
También se habla de la prórroga y la revisión del balance. ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cuáles son las estimaciones de parte del equipo?

Se presenta el ingeniero JORGE ANDRES CORTEZ VERA como el nuevo Secretario de Infraestructura Departamental, con los ingenieros presentes y con la interventoría. Les ha propuesto que se llevarán a cabo una primera modificación, un balance de mayores y menores cantidades, e inclusión de ítems no previstos. Sin embargo, en esta ocasión, lo cerrarán en ceros, Los motivos de negligencias por parte del contratista y la interventoría son evidentes, La idea en estos momentos es realizar el balance a cero; esa es la oportunidad que tienen tanto el contratista como la interventoría al menos, con lo ejecutado en obra, puedan hacer un cobro efectivo, Hacer este balance de cero no significa que se vaya a desfinanciar el proyecto, por el contrario, es tener la claridad de que ese

proyecto requiere de un adicional de recursos. Pero lo que pasa es que, a la fecha, hoy 11 de enero, no tienen ni siquiera la orden del gasto definida, no tienen el balance financiero del cierre del año que les permita reconocer cuántos recursos les quedan, primero, de recursos propios y segundo lugar, el contrato es financiado con recursos de regalías, en regalías no se abren en plataforma sino hasta inicios de marzo o a finales de febrero. Entonces, ¿qué conlleva? Si bien requiere un adicional, lo que mejor le puede pasar a este proyecto es que en estos momentos se haga un balance en cero.

El ing. Cortez comenta que la entidad no tiene el espacio adicional. Segundo, referente a lo que le comentaba el ingeniero Andrés en el comité anterior del tema de la soldadura, el 3% es un tema de discusión, porque si bien ellos tuvieron todo el tiempo para hacer un análisis cuando se presentó inicialmente la propuesta, con el apuro, lo hicieron y se presentaron diciendo que así era su propuesta y que eso era lo que iban a ejecutar.

Jorge Cortez explica que no hay ningún problema que los contratistas reclamen bajo una controversia contractual después de la terminación del contrato; están en todo su derecho, la ley lo permite.
Así mismo, se continua con el tema de la soldadura, en primer lugar, lo puso en conocimiento la interventoría y para la Secretaria de Infraestructura es muy difícil ir en contra de ella, sin embargo, se da la opción de llegar a una liquidación bilateral en común acuerdo y ellos tienen todo el derecho de salida y hacer la reclamación a la entidad y que ya sea una tercera instancia quien defina si se permite o no este pago.

El Secretario de Infraestructura manifiesta que hubo todo el tiempo para hacer un análisis cuando se presentó inicialmente la propuesta. Con el apuro, lo hicieron y se presentaron diciendo que así era su propuesta y que eso era lo que con lo que iban a ejecutar.

El Secretario de Infraestructura comenta que hay total disponibilidad con el arquitecto Carlos Cleves, él es quien estará pendiente del proyecto y lo que mas se desea es que esta obra saga adelante.
El Ing. Cortez expresa que mientras esté vigente el contrato se puede surtir el proceso y cuando se termine el contrato también el contratista tiene derecho a hacer una reclamación administrativa. a través de controversia contractual se deja una salvedad en el acta de liquidación y luego se puede hacer una reclamación a la entidad. Aquí hay total disposición, ya que este gobierno tiene total disposición de que no haya ningún elefante blanco, así que todas las obras se acaben.

Lo importante en este momento es que empiecen a izar esa cubierta. Les da un parte de tranquilidad tenerla en el piso, pero la idea es que esté izada y cumpliendo con la normatividad.
El tema de la garantía de la estructura es algo que también debe cumplirse y es algo que les debe garantizar tanto la interventoría como el contratista de obra. Estarán muy pendientes para que se cumpla la normatividad. Se ha hablado de unos pies de amigos, pues obviamente, como este es un error constructivo, la entidad no va a financiarlo.

Jorge Cortez deja claridad que eso tendrá que ser asumido por el contratista o, la otra opción que han dado, es que determinen si hay otra salida que no sea incluir más actividades o modificar, bajar o volver a izarla.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 6

Esta es una obra que ha sido 100% financiada por ellos. No ha habido un anticipo de ellos y el tema de la continuidad de la obra no está sujeta a un pronto pago de actas, sino a que se cumplan con compromisos financieros y físicos, como se ha mostrado hasta el momento, que la obra continúa a pesar de que no han cobrado la primera acta y ha continuado sin inconveniente.

Se debe buscar un balance en cero en esta primera etapa y queda pendiente el tema de la soldadura para qué cumpla con la justificación. No obstante, pues entienden que es una posición de interventoría, y que desde una óptica jurídica y técnica diga si es viable o no; en consecuencia, si ven que los argumentos jurídicos y técnicos son suficientes, decidirán el monto del 3%, el cual, para ellos, desde su óptica jurídica y técnica, es una norma nacional, es una ley que está inclusive por encima del contrato y lo que hace parte de mayores y menores cantidades.

Les indica que trabajen ahora en el primer balance para legalizar muchas situaciones que se han dado, y la segunda modificación se realizará más adelante. También se piensa hacer la modificación con la inclusión de actividades, y de una vez les será más fácil añadir la prórroga. Así arrancarían con toda para poder realizar muchas actividades pendientes. Mensualmente les corresponde cargar el ejemplo y hasta el momento no se ha subsanado ese tema.

Una cosa es la prórroga del tiempo y otra es el modificatorio, ya que como contratistas no quieren estar cerca al plazo de vencimiento y que el modificatorio no sea más cuando aún hay un oficio de incumplimiento de su parte. No quieren exponerse a iniciar una audiencia injusta por los inconvenientes que han tenido y los imprevistos que han llevado más tiempo.

Por parte de Secretaria de Infraestructura Departamental se Invita a trabajar fuertemente la próxima semana para sacar el balance y les incluirá la prórroga ahí mismo. Se les indica que demuestren el compromiso administrativo y saquen ese balance en los próximos 15 días y se pide que demuestren el compromiso para que la obra se termine y se entregue a la comunidad. También se les recuerda la fecha límite del 30 de enero para la prórroga.

El ing. Luis Roberto, solicita un oficio que documente el desistimiento del incumplimiento por parte de ellos o la interventoría para tenerlo como parte de tranquilidad.

Así mismo Jorge Cortez Indica que se hará devolución a la Interventoría para que corrija el informe y que la devolución del informe se realizará con observaciones.

También se habla sobre la inclusión de la prórroga en el balance y alienta a seguir trabajando para alcanzar un nuevo año con una programación y ejecución renovadas.

Adicionalmente se menciona que, cuando estén el balance cero, levantarán las observaciones del incumplimiento y tratarán el tema del desistimiento.

El Secretario de Infraestructura explica que, con la prórroga, la programación cambia automáticamente.
Se les hace la solicitud de que la documentación futura sea original y firmada por el director, el residente y los estructurales.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 6

Por parte de la Secretaria de Infraestructura se presenta recomendaciones como parte de la supervisión se propone revisar el índice de estabilidad, analizar efectos de segundo orden, hacer un análisis local detallado de elementos, y recomienda análisis de elementos finitos para conexiones también se solicita participación del equipo mínimo en comités y decisiones.

El ingeniero Cortez menciona un tema pendiente en la obra por parte de la supervisión. La supervisión, como representante de Infraestructura Departamental, expone inquietudes y recomendaciones que deben ser subsanadas. El tema de la soldadura no está completamente corregido, y se espera la revisión del profesional de soldaduras el sábado para entregar un segundo informe a la interventoría.

Por parte de interventoría la Ing. Juliana Arteaga, menciona que el sábado se realizará una revisión, y el profesional de soldaduras dará respuestas y aval inmediato si es posible. Aunque consideran que la soldadura está subsanada, reconocen la necesidad de una revisión de la interventoría para confirmar el soporte.

Por parte de los contratistas de obra se Asegura que la soldadura está subsanada, ya que los elementos fueron liberados después de la última revisión. Reconoce la importancia de la revisión de la interventoría para respaldar el trabajo.

La secretaria de infraestructura solicita a la interventoría presentar un informe, y el especialista en soldadura verificará y dará aval. Se destaca la importancia de obtener el aval de la interventoría antes de realizar afirmaciones sobre la corrección.

Se informa que enviarán la documentación a más tardar mañana, y se menciona la realización de más pruebas de soldadura durante la segunda fase del montaje. Aseguran que las pruebas anteriores fueron para liberar la estructura de las plataformas dos y tres.
Se destaca el interés de la organización contratista en atender las observaciones. Se sugiere que la ingeniera transmita la información adicional a través de la interventoría para abordar las observaciones.
Aseguran que los Pies de amigos están resueltos y que están dispuestos a proporcionar precisiones en coordinación con el diseñador.
Se reitera que la interventoría es la encargada de avaluar y dar el aval a los requerimientos y correcciones presentadas por el contratista. Aseguran que están dispuestos a atender observaciones y correcciones que surjan durante la coordinación con la interventoría y el especialista en soldadura.
Por parte de la secretaria de infraestructura se confirma que están dispuestos a atender todas las observaciones que se presenten una vez que sean informados, siempre y cuando la documentación esté completa.
Siendo las 3:10 pm finaliza el comité, agradeciendo a todos los asistentes.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 6

El primer compromiso, es el informe del profesional idóneo de soldaduras que quedaría para el día sábado con la visita de obra, interventoría e infraestructura departamental. El lunes tendrían el informe o el aval de interventoría de esta soldadura. Además, los ensayos de soldadura también estarían programados para el día lunes y martes.
El segundo compromiso es el tema del balance de mayores y menores cantidades, para tenerlo listo el 22 del presente mes, evitando atrasos en este proyecto.
Tercer compromiso implica que parte de obra, interventoría y el equipo mínimo presente atiendan las correcciones, subsanación de la estructura y las recomendaciones que la secretaría de Infraestructura, y esto debería ser coordinado con la Interventoría.
En relación a la estructura, se menciona que deberán solventar esto lo antes posible, ya que de ello depende la estructura. También se espera la entrega del concepto de la interventoría sobre las observaciones realizadas por la Secretaria de Infraestructura Departamental.
Otro compromiso está relacionado con el tema de la prórroga, que se haría en conjunto con el análisis de precios unitarios y de mayores y menores cantidades. El tiempo estimado de la prórroga dependerá de los soportes y de lo justificado en oficios anteriores.

Se sugiere que el contratista presente a la Interventoría el tiempo estimado que consideren para la prórroga, adjuntando justificaciones y soportes. Se plantea la posibilidad de hacer un comité para revisar los diseños en proceso y definir la necesidad de un presupuesto para efectos de urbanismo y la función pública. El Ing. Cortez destaca la pertinencia de la prórroga y el modificatorio.

5832 – NTC LEY-2056 REGALIAS

(nombre)
Profesional Universitario/Profesional de Apoyo — firma

(nombre) Jorge Andres Cortez Vera
Secretario de Infraestructura Dptal. /

ANDRES MOTOY LOJAS
RESIDENTE OBRA

Contratista/Beneficiario Apoyo — firma

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. _____

FREDDER VARGAS APOYO INTERVENTORIA	
Interventor/Por la interventoría de apoyo	firma

ACTA COMITÉ N° 07

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 7

CONVENIO ☐ **CONTRATO** ☒		**MUNICIPIO**	Mocoa Putumayo.
No. 763	**FECHA**		
OBJETO	Construccion cubierta y mejoramiento polideportivo del barrio san agustin, municipio de mocoa, putumayo.		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	Consorcio Alianza Mocoa.		
INTERVENTOR	Servicon CS S.A.S		
	Interventor mediante contrato No. 786 **de fecha:**		
FECHA DE COMITÉ	6/02/2024.	**HORA:**	
CONVOCADO POR	Secretaria Infraestructura Departamental		
TEMA PRINCIPAL	Seguimiento a la ejecucion del contrato.		

CONVOCADOS	**DEPENDENCIA/ENTIDAD**
1- Contratista de Obra	Consorcio Alianza Mocoa
2- Contratista de Interventoría	Servicon CS SAS
3- Secretaria de Infraestructura Departamental	Gobernación del Putumayo
4- Profesionales de Apoyo de Interventoría	Servicon CS SAS
5- Profesionales de Apoyo de Obra	Consorcio Alianza Mocoa


Buenos días, se da inicio al comité técnico No.7 con la presentación de los siguientes asistentes:
- ING. LUIS ROBERTO-CONSORCIO ALIANZA MOCOA
- ARQ. JUAN CAMILO RAMÍREZ- ARQUITECTO DE OBRA
- DIANA CAROLINA ZUÑIGA- APOYO A INTERVENTORÍA
- ING. ANDRÉS MUÑOZ- RESIDENTE DE OBRA
- ARQ. CARLOS EDUARDO CLEVES- PROFESIONAL SID
- ARQ. FREIDER VARGAS- APOYO INTERVENTORÍA


Se disponen a estar prestos para atender el comité técnico No.7 que fue solicitado por parte del contratista de Obra No **763-2023** con oficio Obra 062 enviado por correo electrónico el día 2 de febrero del presente año. El contratista de obra empieza explicando la propuesta arquitectónica, tanto urbanística como la parte del escenario, baños, cerramiento, y demás.

El arquitecto Ramírez les da el saludo a todos e inicia revisando el tema del urbanismo con relación a la pérgola. Posteriormente, proceden a revisar el informe por parte de Interventoría. Se dispone a compartir pantalla para mostrar la presentación de la pérgola.


En la reunión virtual del día 25 de enero del 2024 con el Arquitecto Carlos Cleves se le recomendó hacer otra propuesta arquitectónica con respecto a la pérgola o cubierta adicional para cubrir el área restante para la protección de aguas lluvias. Donde la primera propuesta se basa en cuatro

apoyos donde tiene unos pedestales y unos brazos en diagonales en tubería circular para poder soportar la cubierta propuesta.

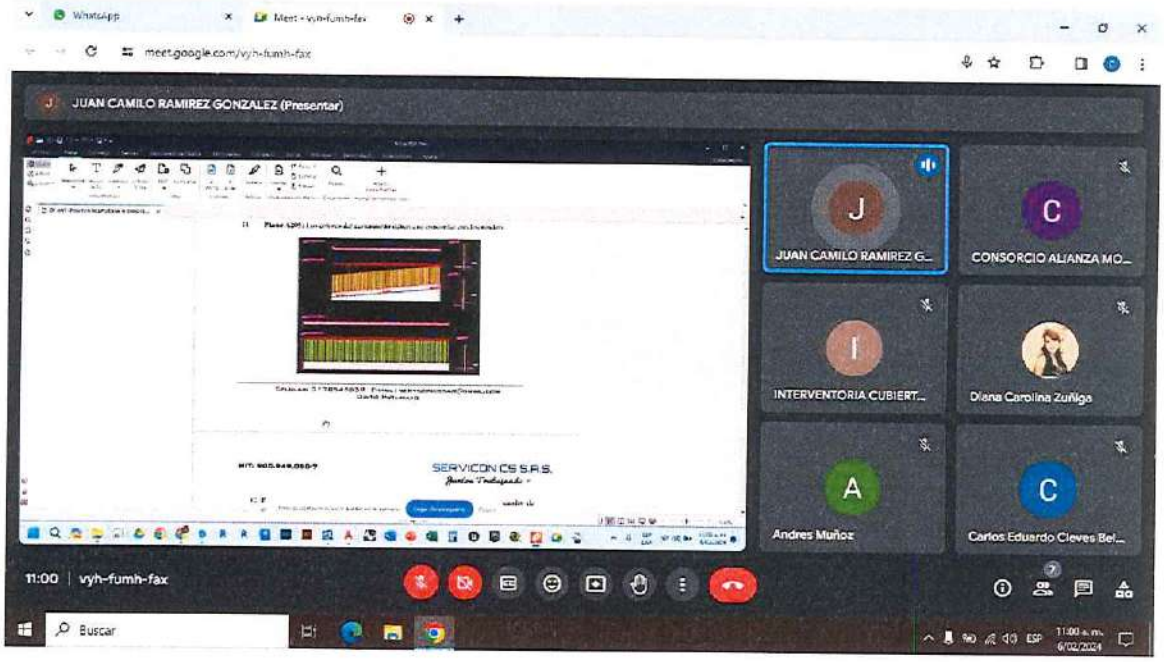

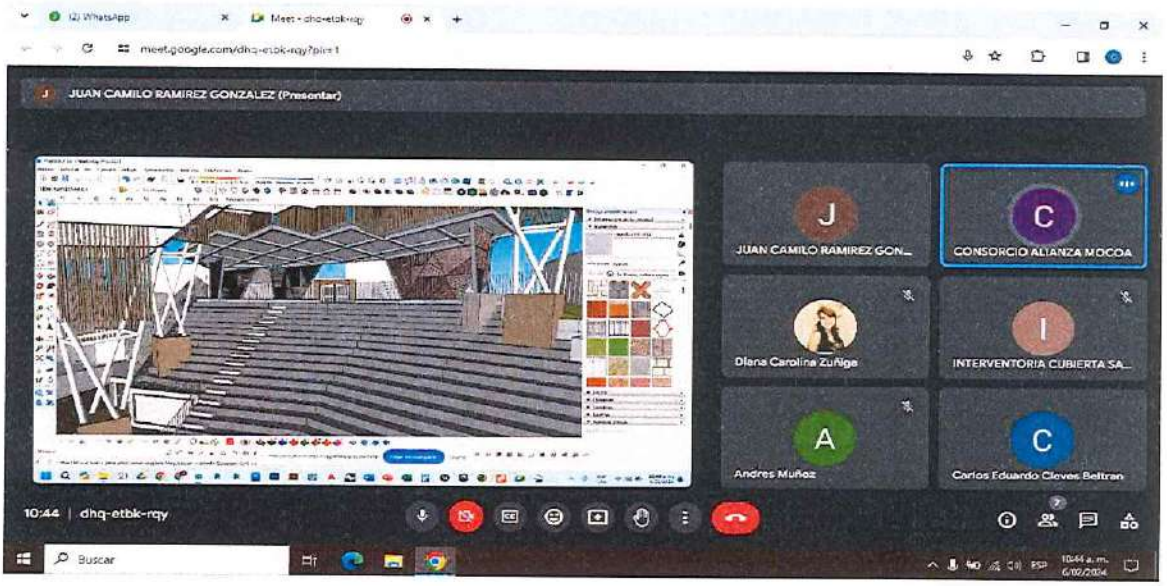

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 7

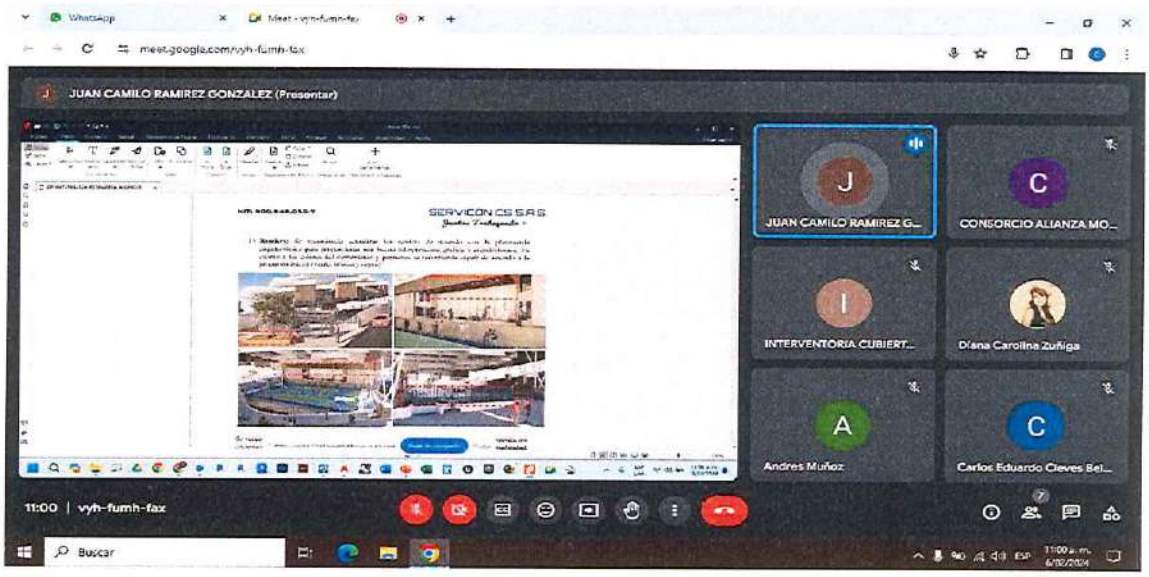

Continúa explicando con un video pre-render para poder visualizar cómo quedaría la primera opción de la pérgola para la parte superior de las graderías. Esta primera propuesta es simétrica a la cubierta existente de las plataformas 1,2,3 donde se realiza los mismos módulos en rectángulos o cuadrados y los mismos apoyos con pedestales y con columnas circulas en diagonal donde es totalmente independiente de la estructura existente. se proyecta un render desde la vista aérea. Posteriormente, tenemos una opción 2, esta cubre más la superficie, de la parte expuesta a la intemperie.

Detalla sobre la segunda opción: "Esta funciona con unas columnas y unos paneles estructurales la cubierta es mucho más amplia. Ahí como pueden observar es una estructura que sería aproximadamente un perfil cuadrado o en IPE de 30 centímetros de alto, están las cerchas cada 3 metros. Tiene un acabado de cielo raso en estructura liviana y está apoyado en unas estructuras metálicas que dan la resistencia para sostener la cubierta. Realmente está cubierta ayuda a que no entre las lluvias a la gradería y tendría una viga canal superficial para poder orientar las aguas lluvias de esa cubierta".

El Arq. Ramírez pregunta si tienen alguna duda con respecto a las 2 presentaciones.

El Arq. Carlos Cleves interviene y le realiza una pregunta, le pide que devuelva el render en el video que mostró el último, ¿Esta cubierta tiene una esquina, va hasta el borde del cerramiento para poder cubrir toda la gradería?

El arquitecto Ramírez responde: "No señor. Aquí queda al aire libre y lo que se hace es que se va a poner una jardinera para poder recibir el agua que cae de la cubierta en varias partes".

Arq. Cleves continúa con otra pregunta: como empata con la cubierta de arriba, ¿por qué ahí quedan espacios sin cubrir de las graderías?

El arquitecto Juan Camilo Ramírez explica: "Sí, Lo que pasa es que no se puede pegar porque se debe respetar aquí un retiro, entonces realmente ya queda así, un espacio; tocaría hacer una jardinera como para proyectar y que esa zona si llega a llover tenga como otra jardinera y que sea como el concepto de lo que se está manejando con las jardineras en donde es posible que caiga agua; todas estas jardineras están correlacionadas a la proyección de la cubierta para precisamente evitar que las graderías se mojen".

Arq. Cleves plantea otra cuestión: "Bueno, ahí donde se muestra en los renders existen unos pedestales donde reduce el espacio de las graderías y en su momento en las visitas técnicas en campo el presidente de la junta del barrio San Agustín el señor Miguel manifestó que; "es bueno darles continuidad a las graderías para aprovechar más espacio y más capacidad de personas en el proyecto".

El Arq. Ramírez expone que, usando toda el área de la cancha múltiple como para espectadores, también aproximadamente entran entre 900 personas. Entonces realmente hay que decirle al presidente, al señor Miguel, que realmente va a tener una capacidad para 1.500, 1.600 personas. Es una cantidad razonable si llega a haber un evento importante en la ciudad o unos Intercolegiados o temas culturales, folclóricos. Entonces, se puede conversar con él y mostrarle que puede tener una capacidad perfectamente entre mil quinientas y mil setecientas personas.

Arq. Cleves expone: el tema de la cantidad de personas me parece razonable y está totalmente de acuerdo hacerle ver los renders a la comunidad o al presidente de la junta al Señor Miguel y explicarle detalladamente cómo es que se va a manejar este tema de las aguas lluvias porque es bien complejo. Adicionalmente exponer el espacio de la cubierta que hace falta, la recomendación es bordar o bordearlo al lado de esas columnas. Porque hacerle una jardinera o un espacio verde les reduce bastante las escaleras. Se le pregunta al Arq. Ramírez ¿qué posibilidad hay de que logre subsanar o rediseñar el espacio que queda en la cubierta.

Arq. Ramírez propone: "La idea es para no proponerle la jardinera., sino para dejar esos escalones ahí. Sencillamente darle continuidad a la cubierta que se está proponiendo."

Arq. Ramírez continúa: "Como no hay claridad con el tema de la cubierta se va a realizar las observaciones y apreciaciones que expusieron anteriormente los profesionales, donde claramente los videos se le van a hacer llegar con los renders para que haya esa tranquilidad de las correcciones. Entonces ya se entraría en un proceso de diseño estructural para

predimensionarlo y por parte de obra y el diseñador estructural definirían la estructura si soporta las longitudes de la pérgola con los apoyos que se diseñó ya es suficiente para poder darle esa amplitud y ese espacio útil al proyecto.

Arq. Ramírez, detalla la posibilidad de utilizar elementos altamente resistentes a la intemperie o perfiles metálicos livianos de calibre delgado en la fachada, con el objetivo de proporcionar sombra para los usuarios. Según las sugerencias del Arq. Cleves, se plantea la opción de simplificar los detalles de los apoyos y seguir la simetría estética de la cubierta inicial, añadiendo persianas más pequeñas alrededor para dirigir el agua hacia las jardineras y evitar la entrada de agua a la gradería durante lluvias fuertes.

La interventoría, representada por el Arq. Freider Vargas, señala que la inclusión de persianas en la estructura de la cubierta aumentaría su peso y complejidad, afectando la estética y la facilidad constructiva. Se sugiere optar por una estructura más ligera y estéticamente acorde, con el fin de cumplir los estándares de diseño y mitigar el ingreso de agua y sol de manera efectiva.

En respuesta, Arq. Ramírez indica que la estructura propuesta es fácil de fabricar y montar, basada en perfiles de alta resistencia que cumplen con los requisitos de carga y resistencia necesarios. Se enfatiza en la importancia de mantener la armonía estética con la estructura existente y en la necesidad de una solución arquitectónicamente coherente, fácil de construir y funcional para mitigar los efectos del clima.

Así las cosas, el Arq. Freider Vargas reitera la importancia de buscar un lenguaje arquitectónico coherente y no saturado, que se alinee con la estructura existente y cumpla con los requisitos técnicos y estéticos establecidos.

Arq. Cleves sugiere la implementación de persianas verticales para mantener la coherencia estilística con la cubierta, pero propone que estas estén un poco más separadas. Por su parte, Arq. Ramírez propone una solución para reducir la intensidad visual sugerida por Arq. Cleves.

Luego, el Arq. Cleves, junto con el Ingeniero Luis, Roberto y Arq. Ramírez, concuerdan con las observaciones de la interventoría respecto a la saturación de detalles en el diseño. Recomiendan coordinar con el equipo estructural para simplificar la estructura y buscar elementos más livianos y estéticamente coherentes.

La Ingeniera Especialista en Estructuras Sara Manuela Gómez (apoyo SID) apoya la sugerencia de utilizar elementos tipo cerchas en lugar de tantos elementos metálicos unidos en diferentes direcciones, con el objetivo de resistir cargas sísmicas y mantener la estética.

Arq. Ramírez aclara que la función estructural recae únicamente en los marcos de los soportes, mientras que los elementos adicionales son consideraciones arquitectónicas.

Por otro lado, Arq. Cleves propone la creación de una mesa técnica donde se unifiquen y presenten las propuestas de diseño a la Junta de la comunidad, incluyendo al presidente Miguel y se le pide al Ing Andrés Muñoz quien es residente de obra que tome contacto con el Sr. Miguel para poder reunirse y explicarle todo el tema del diseño de la cubierta.

Desde la Secretaría de Infraestructura, se sugiere la realización de una mesa técnica entre obra, interventoría y la participación del presidente para llegar a un acuerdo sobre el diseño antes de presentarlo a la Secretaría.

Arq. Cleves informó que culminado la propuesta presentada de la cubierta adicional estamos listos para abordar el otro tema del diseño de los aspectos de urbanismo, escenario, rampas y la propuesta del baño. Luego, cedió la palabra al arquitecto Juan para que presentara las propuestas realizadas.

El Arq. Ramírez detalló que se resolvieron varios aspectos del plano general, como la adición de curvas de nivel, las correcciones, la organización de puertas y ventanas, la actualización del plano de áreas y de las ventanas mal señaladas, así como la inclusión de especificaciones de acabado en los muros. Además, mostró el diseño de las luminarias, el cielo raso, las rampas y los cerramientos. También explicó la disposición del baño, señalando que, aunque el espacio es adecuado, la altura de la palanca de apoyo y el lavamanos cumple con la normativa para personas con discapacidad.

Arq. Cleves expresó algunas preocupaciones sobre la dirección de las rampas y los colores de los cerramientos de las persianas, solicitando la opinión del arquitecto de interventoría, Freider Vargas. Este último recomendó que la dirección de las rampas fuera contraria al flujo del agua para garantizar su funcionalidad. Sin embargo, el Arq. Ramirez argumentó que las líneas en cierto sentido estaban diseñadas para dirigir el agua hacia los bordes dilatados de las rampas. Tras discutir, acordaron corregir la dirección de las rampas según la recomendación de Arq. Vargas.

Se observa una conversación entre Arq. Cleves y Arq. Ramirez, donde se plantea la necesidad de realizar un levantamiento actualizado de la cubierta, señalando la importancia de tener medidas precisas para evitar discrepancias entre los planos y la construcción real. Arq. Ramirez responde que se realizó un replanteo del proyecto en topografía y sugiere hacer un nuevo replanteo una vez que la estructura esté completamente levantada. Arq. Cleves concuerda con la sugerencia y menciona que, aunque el proyecto está avanzado, es necesario enviar toda la información a la Secretaría de Infraestructura y obtener la aprobación de la interventoría.

Arq. Ramirez se compromete a enviar los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos una vez que el proyecto esté totalmente aprobado.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 7

Arq. Freider Vargas de la interventoría solicita que se actualice la información de los renders para que coincida con la planimetría propuesta.

Arq. Ramirez propone dejar libre un espacio para acceso y maniobra en caso de emergencia, siguiendo la recomendación de Arq. Vargas en cuanto a la gestión de riesgos.

Adicionalmente, el Arquitecto Cleves sugirió enviar los respectivos planos con la aprobación de la interventoría y la revisión por parte del equipo de obra. Solicitó que se enviara una copia a su correo electrónico y al de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Por su parte, el arquitecto Ramirez mencionó que enviaría la información en horas de la tarde para que la interventoría pudiera revisarla. El ingeniero Luis Roberto consultó a Freider Vargas de interventoría sobre la disponibilidad de espacio a las 15:00 horas para revisar el tema de la cubierta de la pérgola.

La mayoría de las observaciones hechas por la interventoría han sido subsanadas. Se procedería a enviar un oficio con las propuestas y la elaboración de los planos correspondientes.

El Arq. Cleves realizó una última recomendación, mencionando el tema de la modificación del balance en cero y la importancia de enviar la información completa y con la debida certificación de la interventoría a la Secretaría de Infraestructura. También informó que había enviado los respectivos documentos por medio de WhatsApp para poner al tanto al equipo. Se mencionaron cinco documentos, incluyendo aspectos financieros, jurídicos y técnicos, con énfasis en la viabilidad del balance en cero y sus respectivas certificaciones.

Por último, el Arq. Cleves se comprometió a proporcionar más información sobre este tema y aclaró que estaban dispuestos a colaborar en caso de cualquier duda o inquietud respecto a los documentos enviados; asimismo, ratifico que por parte de la Secretaria de Infraestructura se está presto para que el proyecto salga adelante.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

1- Por parte del contratista de obra y el Arquitecto Juan Ramírez se compromete hacer las diferentes correcciones a la propuesta de cubierta adicional en las graderías que le sugirió la interventoría (Arq. Freider Vargas) y las recomendaciones que se le realizo por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

2- El Arq. Juan Ramírez se compromete hacer los diferentes cambios en los planos arquitectónicos en la propuesta urbanística teniendo en cuenta la socialización con la comunidad y el contratista de Interventoría.

3- El contratista de obra e interventoría se comprometen el día 06 de febrero del 2024 en horas de la tarde hacer una reunión con la comunidad teniendo en cuenta al presidente de la junta del barrio

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 7

San Agustín para sustentarle la propuesta de las graderías, cubierta y lo urbanismo para tener en cuenta las opiniones de la comunidad y así mismo culminar el tema de diseño.

4- Los contratistas de Obra e Interventoría se comprometen a enviar a la Secretaria de Infraestructura Departamental toda la documentación de planos Arquitectónicos, renders, videos y avances de los demás diseños como: estructurales, eléctricos, hidráulicos, Sanitarios con las correcciones anteriores mencionadas, donde enviaran el día 13 de febrero del 2024 para su respetiva revisión por parte de la entidad y así mismo seguir con los procesos administrativos para el adicional de estos diseños presentados.

5- Por parte de la Secretaria de Infraestructura esta atenta a recibir la información de acuerdo a los compromisos pactados para así hacer la respectiva revisión final para culminar los diseños arquitectónicos y posteriormente seguir con los aspectos administrativos para finiquitar esta propuesta arquitectónica.

Jorge Andres Cortes Vera
Secretario de Infraestructura Dptal. /

firma

ANDRES MUÑOZ
Contratista/Beneficiario Apoyo

firma

ANDRES.

FREIDER VARGAS
Interventor/Por la interventoria de apoyo

firma

Proyecto PT:	Arq. Carlos Eduardo Cleves	Secretaria de Infraestructura	Profesional de Apoyo SID	cleves
Reviso PJ:	Doc. Ximena Cerón	Secretaria de Infraestructura	Profesional de Apoyo SID	
Reviso:	Residente de Obra	Consorcio Alianza Mocoa	Contratista de Obra	
Reviso:	Arq. Freider Vargas	Servicon CS SAS	Contratista de Interventoria Profesional de Apoyo	
Reviso:	Ing. Carolina Zuñiga	Servicon CS SAS	Contratista de Interventoria Profesional de Apoyo	Carolina Z.
Reviso:	Arq. Juan Camilo Ramirez	Consorcio Alianza Mocoa	Contratista de Obra Profesional de Apoyo	Juan C.

ACTA COMITÉ N° 08

	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-SIG-009
PUTUMAYO GOBERNACIÓN	PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión	VERSIÓN	03
	FORMATO	Acta de Reunión o Comité	FECHA	17/08/2023

TIPO DE REUNIÓN:	Interna:		Externa:	X	Acta No. 8	Fecha: 26/02/2024
DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE:	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO				LUGAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."					Hora inicio: 10:00 AM	Hora fin: 11:00 AM

ORDEN DEL DÍA	
1	Saludo y presentación.
2	Análisis para la prórroga No 1 de los Contrato de obra 763-2023 e Interventoría 786-2023
3	Intervención de las partes.
4	Conclusiones y compromisos.

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO:

1. **SALUDO Y PRESENTACIÓN:**

La Secretaría de Infraestructura Departamental, da apertura al comité técnico No 08 del Contrato: Obra No. **763 del 24 de abril de 2023**, agradece la presencia y participación de todos los asistentes a la reunión programada, posteriormente da a conocer que el objetivo del comité es establecer el Acta de Prorroga No 1 de la ejecución del contrato de obra, para culminar el 100% de la ejecución del proyecto.

La Secretaria de Infraestructura Departamental tomando en cuenta que la firma contratista CONSORCIO ALIANZA MOCOA realiza solicitud de Prórroga No 1 y que esta ha sido revisada y avalada por la firma interventora SERVICON CS S.A.S, es necesario tramitar la prórroga lo más pronto posible con el fin de que se garantice el tiempo necesario en el cronograma de obra que permita llegar a las metas planteadas en el proyecto.

2. **SOLICITUD DE PRORROGA No 1 POR EL CONTRATISTA DE OBRA**

ING. ÁLVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS., representante legal del CONSORCIO ALIANZA MOCOA, en calidad de contratista de obra, enuncia que las continuas lluvias 2023 han generado serios retrasos en las labores contractuales en los diferentes frentes de obra, y que esto aunque se ha informado y se ha presentado en los informes, bitácora y formatos de control de clima, no se habían contemplado en el cronograma puesto que se trató de compensar estas pérdidas de tiempo con trabajo intensivo, sin embargo al finalizar la obra se evidencia un periodo faltante equivalente a cuatro (4) meses calendario que es lo que se solicita para la terminación del proyecto.

Continúa exponiendo las consideraciones que justifican la Prorroga No 1 del contrato de Obra:

Mediante oficio Obra-074. del 21 de febrero de 2024, remitido a la interventoria, se expusieron las razones debido a problemas técnicos y ambientales, como lluvias continuas, ajustes en la implantación del proyecto, inestabilidad del suelo y profundización de pedestales, que han generado mayores tiempos y costos de ejecución

a. Las lluvias continuas que hasta el periodo 5 reportado es de 62 días acumulados, dificultado las actividades de excavación, cimentación, armado, soldado y pintado de la estructura, lo que ha generado mayores costos y tiempos de ejecución.
b. Correcciones a la implantación del proyecto donde se identificó el pedestal C1 se localizaba en el baño de hombres, la condición inicial se encontraba 60 cm por encima del nivel del piso del baño, se ajustó para que el elemento quedara apoyado. Este ajuste repercutió en mayores cantidades de obra y mayores tiempos de ejecución a las inicialmente contempladas.
c. La inestabilidad del suelo en los pedestales el cual obligo al contratista a una solución técnica diferente a la planteada por la consultoría del proyecto para la estabilización y contención de las paredes laterales de la excavación, teniendo mayores cantidades de obra y mayores tiempos de ejecución.
d. Que la visita del señor presidente de la junta en compañía del ingeniero Leandro y funcionarios de la alcaldia concluye en la suspensión de actividades de los pedestales D5, E4 Y F3 hasta tanto no se argumente desde la parte estructural el nivel de cimentación actual de los estos pedestales. La interventoria emite oficio con el concepto del estructural alineado con el concepto por parte de la alcaldía, a solicitud de la alcaldía quien es el ente que viabilizo la licencia de construcción, se debe proceder a le demolición de los ciclópeos y posterior profundización de los pedestales D5, E4 y F3. Lo anterior requería una suspensión de 24 días en el frente de trabajo de los pedestales D5, E4 y F3, sumándole 45 días más en el reproceso del ajuste al diseño de los pedestales, la solicitud del hierro para el aumento de la altura del mismo debido los niveles adicionales de desplante requeridos por la Alcaldía.
e. La demolición y continuación de la excavación, la estabilización con concreto reforzado en malla electrosoldada en las paredes laterales de la excavación ya que se evidencio en campo que el entibado no era suficiente por la inestabilidad del terreno. Para un total de 69 días adicionales a o inicialmente programado, así como también mayores cantidades de obra.
f. Se resalta que, de los 8 pedestales a construir, 5 tuvieron problemas técnicos con un percentil del 62%, la profundización de los pedestales D5, E4 y F3, la estabilización de la excavación con una metodología diferente a la contractual.

Intervención Interventoría del Contrato: ELIANA ANDREA CEBALLOS, en calidad de contratista de interventoría R/L. SERVICON CS S.A.S. La firma interventora reitera el aval a la solicitud de cuatro (04) meses puesto que esto compensa el tiempo perdido en rendimiento por Invierno y también por los argumentos técnicos, por ende, es necesario compensar este tiempo en el cronograma de obra y así garantizar que se termine las actividades contractuales de forma satisfactoria. manifiesta:

1. *Que, una vez revisada y estudiada la solicitud de parte del contratista de obra y complementada según observaciones hechas por la interventoría, en cuanto a la justificación de la Prorroga No 1 de obra se emitió por parte de la interventoria VIABILIDAD TÉCNICA favorable.*
2. *Se autorice la Adición en tiempo al contrato de interventoría No.786 de 2023 con lo cual se le da piso financiero a el contrato de interventoría por el tiempo adicional requerido para la terminación del contrato de Obra a Satisfacción.*
3. *Si la adición presupuestal no es viable se solicita se replantee el personal mínimo de trabajo así:*

- ✓ *Director de Interventoría*
- ✓ *Residente de interventoría*
- ✓ *Ingeniero estructural*
- ✓ *Ingeniero civil especialista en soldadura*
- ✓ *Arquitecto*
- ✓ *Profesional HSEQ*
- ✓ *Profesional de redes eléctricas*

Lo anterior tomando en cuenta que él % de avance de obra a la fecha es del 64.16%, y que el 35.84% quedan pendientes actividades de la estructura metálica como: instalación y soldadura de cajones, persianas, templetes y perfiles; actividades de urbanismo, redes eléctricas, instalación de la red pluvial, cubierta en PVC, entre otros similares o de menor complejidad y que por tanto ya no se requiere de la presencia en obra de:

- ✓ **INGENIERO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS:** En las actividades pendientes, el proyecto no requiere una gestión específica a nivel de ingeniería especialista en proyectos, dado que el proyecto puede dar continuidad eficientemente con el equipo anteriormente mencionado
- ✓ **PROFESIONAL SOCIAL:** al tiempo actual, no se requiere a la profesional social ya que el proyecto al momento no involucra aspectos sociales significativos que requieran una intervención especializada, las intervenciones con la comunidad son limitadas y se ha logrado dar un buen manejo con el presidente de la junta para el éxito del proyecto.
- ✓ **TOPÓGRAFO:** Las actividades de localización y replanteo han finalizado, por lo cual no se requiere a la comisión topográfica.
- ✓ **AUXILIAR DE INGENIERÍA:** Las tareas restantes del auxiliar de ingeniería pueden ser manejadas por otros miembros del equipo o por el ingeniero residente de interventoría, logrando llevar de manera exitosa el proyecto.
- ✓ **AUXILIAR ADMINISTRATIVO:** La carga administrativa asociada al proyecto puede ser manejada por otros miembros del equipo.
- ✓ **ALMACENISTA:** La gestión del inventario y los materiales puede ser realizada por el equipo existente sin la necesidad de un personal dedicado en el sitio del proyecto.

Intervención de la supervisión: Secretaría de Infraestructura Departamental:

El secretario de Infraestructura Departamental manifiesta que una vez revisada la documentación radicada por parte del contratista de obra y viabilizada por la interventoría, en la cual esta última suscribió la VIABILIDAD PARA PRORROGA No 1 DEL CONTRATO DE OBRA No 763 DEL 24/04/2023, donde aprueba la Prorroga No. 01, se compromete a realizar los trámites necesarios ante la Oficina de Contratación Departamental para suscripción del acto administrativo pertinente.

Teniendo en cuenta la solicitud radicada por parte de la Interventoría mediante oficio OF-INT-786-142 del 22 de febrero de 2024 en la Secretaria de Infraestructura Departamental con Registro Interno No 0214 que se replantee el personal mínimo de trabajo de interventoría teniendo en cuenta que los profesionales tales como: INGENIERO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, PROFESIONAL SOCIAL, TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE INGENIERÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALMACENISTA , ya culminaron el proceso de ejecución de dichos profesionales adicionalmente

se tiene cuenta que él % de avance de obra a la fecha es del 64.16%, y que el 35.84% actividades de la estructura metálica como: instalación y soldadura de cajones, persianas, templetes y perfiles; actividades de urbanismo, redes eléctricas, instalación de la red pluvial, cubierta en PVC, entre otros similares o de menor complejidad y ejecución total de la obra del 100%.

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista de Interventoria, se determina que el personal ofertado por la Interventoria para el 35.84% de ejecución restante se considere y quede de la siguiente manera

- ✓ Director de interventoría
- ✓ Residente de interventoría
- ✓ Ingeniero estructural
- ✓ Ingeniero civil especialista en soldadura
- ✓ Arquitecto
- ✓ Profesional HSEQ
- ✓ Profesional de redes eléctricas

Por consiguiente se autoriza únicamente lo expresado por la interventoría precisando para cambio del equipo mínimo de la interventoría excluyendo al personal que ya no se requiere en obra por las justificaciones técnicas antes mencionadas debido a que las actividades que corresponden al 35.84 % de ejecución no requiere todo el personal inicialmente propuesto; del mismo modo se deja claridad que la entidad no cuenta con los recursos necesarios para autorizar un adicional para el contrato de interventoría según lo expresado en el numeral 2 donde se solicita por el valor de 266.581.404,05,00 (Doscientos sesenta y seis millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos con cinco centavos M/CTE), en consecuencia los gastos generados por la presente prorroga por el término de cuatro (04) meses serán asumidos por el contratista interventor, dadas las condiciones y sustentos fácticos y jurídicos de la presente prorroga, de manera expresa EL CONTRATISTA de interventoría con la suscripción reconoce que la misma no demanda recursos que alteren el equilibrio económico del contrato y en consecuencia declara que no realizará reclamaciones posteriores por ese motivo ni por las demás prorrogas y acuerdos ya celebrados con la entidad aceptando la modificación

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción de las partes y así proceder a su ejecución. - Los gastos que ocasione el perfeccionamiento de la presente prórroga serán asumidos por el CONTRATISTA en su totalidad y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Ahora bien, es necesario analizar el presente asunto a la luz del mandato normativo contenido en El parágrafo del Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, según el cual:

"Artículo 85. Continuidad de la interventoría. *Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.*

Parágrafo. *Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta los etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato".*

Por lo anterior, El secretario de Infraestructura Departamental manifiesta que, una vez analizado el asunto, se aprueba la Prorroga No. 01 al contrato de obra No 763 del 2023 y al contrato de interventoría No. 786 de 2023, y se compromete a realizar los trámites necesarios ante la Oficina de Contratación Departamental para suscripción del acto administrativo pertinente, tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

CONCLUSIONES:

1. Se da viabilidad para la suscripción de la **Prorroga No. 01 al Contrato de Obra No. 763 del 24 de abril de 2023.** De igual manera, y considerando la necesidad de continuar con el control y vigilancia del contrato de obra, se da viabilidad para la suscripción de la **Prorroga No. 01 al contrato de interventoría 786 del 14 de abril de 2023.**

2. Contratista de Obra e Interventoría presenta y avala respectivamente, y Supervisión aprueba la justificación por la cual se solicita la realización de los trámites pertinentes ante la Gobernación del Putumayo para la suscripción del correspondiente acto contractual ante la oficina de Contratación Departamental.

COMPROMISOS:

1. Apoyar en el trámite para la suscripción de la Prorroga No. 01 al Contrato de Obra No. 763 de 24 de abril de 2023, De igual manera, la Prorroga No. 01 al contrato de interventoría 786 del 14 de abril de 2023.

2. El Contratista de obra, se compromete a informar a interventoría sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del aludido contrato y de todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del proyecto.

FIRMAS ASISTENTES

Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Firma
JORGE ANDRES CORTEZ VERA	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
ALVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	
ELIANA ANDREA CEBALLOS	SERVICON CS S.A.S	INTERVENTORÍA	

Proyecto PT:	Arq. Carlos Eduardo Cleves B.	Secretaria de Infraestructura	Profesional de Apoyo SID	
Revisó PJ:	Doc. Ximena Cerón	Secretaria de Infraestructura	Profesional de Apoyo SID	

ACTA COMITÉ N° 09

PUTUMAYO GOBERNACIÓN	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-SIG-009
	PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión	VERSIÓN	03
	FORMATO	Acta de Reunión o Comité	FECHA	17/08/2023

TIPO DE REUNIÓN:	Interna: [ ]	Externa: [x]	Acta No. 09	Fecha: 20/03/2024
DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE:	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		LUGAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			Hora inicio: 10:00 AM	Hora fin: 11:00 AM

ORDEN DEL DÍA	
1	Saludo y presentación.
2	Análisis para Modificatorio No 1 de los Contrato de obra 763-2023
3	Intervención de las partes.
4	Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. El Secretario de Infraestructura Departamental da apertura al comité técnico del contrato de obra No. 763 del 24 de abril del 2023, agradece la asistencia y participación de todos los asistentes a la reunión, posteriormente da a conocer el objetivo del comité, que es evaluar y hacer una revisión del estado del proyecto, la solicitud de modificación de mayores y menores cantidades de obra más la inclusión de ítems no previstos, modificaciones necesarias para culminar el 100% de la ejecución del proyecto.

2. La Secretaría de Infraestructura Departamental manifiesta que una vez revisada la documentación soporte para el ajuste al proyecto, por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental, y subsanadas las observaciones de la misma por parte de los contratistas de obra e interventoría, el ajuste ejecutor al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", Código BPIN 2022006860459, va ser presentado a la Secretaría de Planeación Departamental quien es la oficina encargada de realizar los Ajustes a los proyectos financiados con recursos del sistema general de Regalías, según lo dispuesto en la Ley 2056 de 2021, conforme a lo preceptuado en el Artículo 4.4.2.2.1. Ajustes que deben ser considerados por la entidad pública

designada como ejecutora del proyecto de inversión, del Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR.

3. EL ingeniero **ÁLVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS**, representante legal del consorcio ALIANZA MOCOA, en calidad de contratista de obra, inicia exponiendo las consideraciones que justifican la inclusión de los ítems no previstos, balance de mayores y menores cantidades de obra de ítems contractuales de obra:

Mediante el oficio OBRA 079 de asunto "Solicitud de Modificación de Contrato por Ajustes en Mayores y Menores Cantidades de Obra y creación de ítems no previstos." se expusieron las razones de orden técnico que conlleven a la necesidad de incluir nuevos ítems no previstos, realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra de los ítems contractuales para su ejecución, donde se expuso:

A lo largo del desarrollo de las actividades contractuales, nos hemos encontrado con situaciones que han requerido adaptaciones en la implementación del proyecto. A continuación, detallamos brevemente cada situación y su impacto:

- **Lluvias Continuas:** Se registraron 62 días acumulados de lluvia, lo que dificultó actividades como la excavación y cimentación, generando un incremento en los costos y tiempos de ejecución. ***Ver anexo 7 – Reporte de lluvias***
- **Pedestal C1:** Se identificó que el pedestal C1 se ubicaba en el baño de hombres, lo que requirió un ajuste para asegurar su correcta ubicación y soporte, impactando en las cantidades de obra y tiempos de ejecución.
- **Inestabilidad del Suelo: La** inestabilidad en los pedestales obligó a adoptar soluciones técnicas distintas a las inicialmente planteadas, incrementando las cantidades de obra y extendiendo los tiempos de ejecución.
- **Profundización de Pedestales D5, E4 y F3:** Se realizó la profundización de los pedestales D5, E4 y F3 a solicitud de la Alcaldía. Esto implicó la demolición de los ciclópeos y la ejecución de trabajos adicionales. En el anexo 8 del oficio de la veeduría, se evidencia la solicitud de revisión de un posible problema técnico en la estructura, emitida por el ingeniero Leandro Ortega Gómez a la unidad de planeación, gestión y evaluación de la alcaldía de Mocoa, con copia al contratista de obra y a la interventoría. Como resultado de este oficio, se llevó a cabo una visita del personal de la unidad de planeación, gestión y evaluación de la alcaldía de Mocoa el día 24 de Julio del año 2023, donde se socializo la situación dando a conocer la visita y evaluación del especialista en suelos que se realizó el día 12 de julio, quien realizo los estudios pertinentes para evaluar la capacidad de soporte del terreno y tras su análisis, otorgó el aval para la construcción de los pedestales en las condiciones actuales y niveles de excavación establecidos, según lo mencionado por el profesional el día de la visita, el terreno cuenta con la resistencia para soportar la carga esperada y cumple con los requisitos para garantizar la estabilidad de la estructura *(ver **Anexo 9 - Concepto Geotécnico**).*
  Sin embargo, la Alcaldía de Mocoa realizó una revisión en la que se recibió una respuesta del director técnico de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal, Alexander Roberto Melo y de interventoría a cargo del ingeniero estructural Benjamín Romero. El objetivo de esta evaluación fue analizar la estabilidad de los pedestales DE, E4 y F3. Como conclusión, se determinó que deben tomarse acciones correctivas y

garantizar que se cumpla con la profundidad de desplante de 2 metros para asegurar la estabilidad no solo de los pedestales, sino de toda la estructura. (ver anexo 10 – Concepto estructurales).

- ***Mejoramiento Teja termoacústica:** En el desarrollo de las actividades se solicita por medio del oficio **OBRA 0-36** el cambio de especificación de teja para la cubierta, en el se menciona lo siguiente:*

(...) Por medio de la presente se hace propuesta para cambiar la especificación de la teja para la cubierta, cambiando de UPVC a tipo sándwich, como se muestra en la siguiente tabla:*

Descripción	Teja Contractual	Propuesta
Tipo	UPVC	Sandwich en acero o aluminio con Vynil foil
Espesor	2.5 mm	18 mm
Largo	11.80	12
Ancho	1.08	1.08
Color	Blanco	Gris
Peso (kg/m2)	5.15	4.10
Valor por m2	$87.762	$93.668

Como se puede observar en la tabla proporcionada, se aprecia un aumento significativo en el espesor de la teja propuesta. Este aumento no solo contribuye a una mayor robustez estructural, sino que también resulta en una disminución del peso total, lo que conlleva beneficios tanto en términos de manipulación como de carga sobre la estructura existente.

Adicionalmente, se destaca una mejora significativa en las condiciones acústicas ofrecidas por la nueva especificación técnica de la teja. Este aspecto es crucial, ya que contribuirá a crear un ambiente más confortable y agradable en el espacio donde se implemente.

Es importante resaltar que la teja propuesta exhibe una capacidad de sobrecarga notablemente superior, alcanzando los 79 kg/m2. Esta capacidad, por ende, es más que suficiente para soportar el peso de una persona, garantizando la seguridad y durabilidad a lo largo del tiempo. En este sentido, la durabilidad mejorada de la teja propuesta constituye una ventaja significativa, ya que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y, por lo tanto, disminuye los costos a largo plazo.

A pesar de que la inversión inicial puede ser ligeramente superior, es crucial considerar que esta diferencia se ve compensada por las garantías sustancialmente mejoradas que ofrece la nueva especificación técnica. Estas garantías proporcionan tranquilidad y respaldo a largo plazo, minimizando los riesgos asociados con posibles problemas o deterioro prematuro.

En este contexto, solicitamos respetuosamente a la interventoría que considere detenidamente nuestra propuesta para la modificación de la especificación técnica de la teja.

Es importante destacar que esta propuesta busca no solo optimizar las condiciones del material, sino también mantener inalterado el valor del metro cuadrado instalado, conforme a los términos del contrato vigente. Esta consideración adicional subraya nuestro compromiso de proporcionar mejoras sustanciales sin incurrir en costos adicionales para la entidad contratante. (...")

En el mencionado oficio se encuentran todos los soportes técnicos y documentos que justifican los ajustes solicitados.

Adicional al balance de mayores y menores cantidades, se requiere la inclusión de ítems no previstos necesarios para completar de manera satisfactoria las obras adicionales requeridas, estos ítems son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNIT
NP1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	M3	$ 344,371.50
NP2	DETONACIÓN DE ROCA (USO DE EXPLOSIVOS)	UND	$ 272,061.90
NP3	ESTABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO DE EXCAVACIÓN HACIENDO USO DE CONCRETO REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA INTERNO 1.85X1.85 E=10 CM	M2	$ 272,982.80
NP4	MORTERO DE NIVELACIÓN DE BAJA RETRACCIÓN PARA APOYOS COLUMNA	UND	$ 2,745,666.00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA PANEL TIPO SANDWICH ESPESOR=18MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 28	M2	$ 170,000.00
NP6	CERRAMIENTO CON TUBERÍA GAL. 3" DISEÑO TIPO I (incluye excavación)	ML	$ 2,065,340.22
NP7	CERRAMIENTO CON TUBERÍA GAL. 3" DISEÑO TIPO II (incluye excavación)	ML	$ 2,148,132.37
NP8	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 20"	ML	$ 437,646.44
NP9	ARENA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA	M3	$ 128,428.81
NP10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 EN CONCRETO SIMPLE	UND	$ 851,461.35
NP11	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CANCHAS MICROFUTBOL Y BASQUETBALL	UND	$ 192,307.50

Lo que en resumen se tiene, que la modificación No 1 planteada no requiere de adicional de recursos económicos para su ejecución, como se presenta en el siguiente cuadro:

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 6.421.465.902,00
VALOR MODIFICATORIO No. 01:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO (INICIAL + MODIFICATORIO No. 01):	$ 6.421.465.902,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO:	$ 0,00

En este sentido, se solicita la inclusión de ítems no previstos y balance de mayores y menores (+/-) cantidades de obra, sin que sea necesaria la adición en valor al contrato de obra.

4. ELIANA ANDREA CEBALLOS, representante legal de SERVICON CS SAS, en calidad de contratista de interventoría manifiesta:

Que, los soportes técnicos aportados por el contratista de obra y las condiciones reales de obra, la interventoría manifiesta que es procedente y viable técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental para el Contrato de Obra No. 763 del 2023 la Modificación No. 01 de balance de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de Ítems No Previstos.

Que, en base a la justificación dada por el contratista de obra, se emite un informe de interventoría donde se da la justificación técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental de modificación de mayores y menores cantidades de obra de ítems contractuales, inclusión de ítems no previstos para el contrato de obra no. 763 del 2023: "construcción de cubierta y mejoramiento de polideportivo del barrio san Agustín, municipio de Mocoa, departamento de putumayo".

Adicionalmente, presenta en el comité la VIABILIDAD PARA MODIFICACIÓN DE OBRA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.

5. El Secretario de Infraestructura Departamental manifiesta que una vez revisada la documentación radicada por parte del contratista de obra y viabilizada por la interventoría, en el cual esta esta última suscribió la VIABILIDAD PARA MODIFICACIÓN DE OBRA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA, donde apruéba el modificatorio No. 01 de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos No 1, se compromete a realizar los trámites necesarios ante la Oficina de Contratación Departamental para suscripción del acto administrativo pertinente, tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

CONCLUSIONES:

1. Se da viabilidad para la suscripción del modificatorio No. 01 de balance de mayores y menores cantidades de obra, inclusión de ítems no previstos No. 01 al Contrato de Obra No. 763 del 2023.

2. Contratista de Obra e Interventoría presenta y avala respectivamente, y Supervisión aprueba la justificación por la cual se solicita la realización de los trámites pertinentes ante la Gobernación del Putumayo para la suscripción del correspondiente acto contractual ante la oficina de Contratación Departamental.

COMPROMISOS:

1. Apoyar en el trámite para la suscripción del modificatorio No. 01 para balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos No. 01 al Contrato de Obra No. 763 del 2023

2. El Contratista de obra, se compromete a informar a interventoría sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del aludido contrato y de todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del proyecto.

FIRMAS ASISTENTES

Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Firma
JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
ÁLVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	
ELIANA ANDREA CEBALLOS	SERVICON CS S.A.S	INTERVENTORÍA	

	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó PT:	Arq. Carlos Eduardo Cleves B	Secretaría de Infraestructura	Profesional Apoyo Técnico SID	
Proyectó PJ:	Doc. Ximena Ceron	Secretaría de Infraestructura	Profesional Apoyo Jurídico SID	

VER ANEXO 14. CONTROL DIARIO DEL TIEMPO.

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 01

4 JULIO - 03 AGOSTO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	1
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		JULIO																											AGOSTO		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA																															
	TARDE			x				x	x	x	x				x	x	x			x	x	x	x	x	x			x			x	x
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA			x		x			x	x	x		x	x		x	x			x	x	x	x	x				x	x	x		x
	TARDE	x			x	x						x	x	x					x							x	x		x	x		
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA		x				x	x				x			x			x							x	x				x		
	TARDE		x		x		x											x	x									x				

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NIT: 900.949.050-7

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 02

4 AGOSTO - 03 SEPTIEMBRE

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	2
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		AGOSTO																												SEPTIEMBRE		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA	x		x				x			x			x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x		x	x
	TARDE		x		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA		x		x		x		x	x		x	x					x	x	x						x					
	TARDE	x		x		x		x			x															x					
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA					x																										
	TARDE																															

Firma _____

CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 03

4 SEPTIEMBRE - 03 OCTUBRE

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES	3
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO	MOCOA
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023		

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

	MES	SEPTIEMBRE																										OCTUBRE		
	DIA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
SECO	MAÑANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X
	TARDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA															X							X		X						
	TARDE														X	X	X														
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA											X																			
	TARDE																				X										

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 04

04 OCTUBRE - 03 NOVIEMBRE

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	4
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		OCTUBRE																												NOVIEMBRE		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	TARDE	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X			X	X			X	X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA							X							X																	
	TARDE				X						X					X									X	X			X	X		
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA					X						X					X							X				X				
	TARDE						X													X												X

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 05

04 NOVIEMBRE - 03 DICIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	5
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		NOVIEMMBRE																										DICIEMBRE		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
SECO	MAÑANA	X		X	X			X			X			X	X	X	X		X	X		X		X				X	X	X	X
	TARDE		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA					X	X		X	X		X											X				X	X			
	TARDE	X		X				X												X		X		X				X		X	
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA		X										X					X			X				X						
	TARDE																														

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 06

04 DICIEMBRE 2023 - 03 ENERO 2024

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	6
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		DICIEMBRE																												ENERO		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA		X		X	X	X			X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X				X
	TARDE	X	X	X			X	X	X			X	X	X						X		X			X	X		X	X	X	X	X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA	X		X				X	X				X	X											X					X	X	
	TARDE				X	X				X	X				X	X	X				X		X	X			X		X			
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA											X								X						X						
	TARDE																	X	X													

Firma _____

CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 07

04 ENERO - 03 FEBRERO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	7
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		ENERO																													FEBRERO		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	TARDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA								X		X				X	X													X	X		X
	TARDE												X				X		X													
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA													X				X													X	
	TARDE																	X								X						

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 08

04 FEBRERO - 03 MARZO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	8
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		FRBRERO																										MARZO		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3
SECO	MAÑANA			X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X
	TARDE	X	X								X	X				X	X	X	X	X		X	X			X	X	X		X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA		X								X	X				X						X							X	
	TARDE			X	X	X	X			X			X		X									X	X					
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA	X																								X		X		
	TARDE							X	X					X							X									

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 09

04 MARZO- 03 ABRIL

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	**MES**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	9
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	**MUNICIPIO**
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

		MES	MARZO																												ABRIL		
		DIA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SECO	MAÑANA		X			X	X	X	X		X		X	X	X	X			X			X	X	X		X			X			X	
	TARDE		X	X	X				X	X	X	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA			X						X		X					X	X		X	X						X	X		X			X
	TARDE					X	X	X						X	X	X							X	X								X	
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA				X																				X						X		
	TARDE												X																					

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DEL TIEMPO MES 10

04 ABRIL- 03 MAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE CLIMA DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	10
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES		ABRIL																											MAYO		
DIA		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
SECO	MAÑANA			X			X	X	X	X	X				X	X		X	X			X	X	X		X		X	X	X	
	TARDE	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X			X			X	X	X			X		X			X	X
LLUVIAS MODERADAS	MAÑANA	X	X			X						X	X	X			X			X							X				X
	TARDE			X						X					X			X					X	X				X	X		
LLUVIAS INTENSAS	MAÑANA				X																X				X						
	TARDE															X			X							X					

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VER ANEXO 15. CONTROL DIARIO DE EQUIPOS DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 01

4 JULIO - 03 AGOSTO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	1
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	JULIO																											AGOSTO		
DIA / EQUIPO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 02

4 AGOSTO - 03 SEPTIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	**MES**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	2	
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	**MUNICIPIO**	
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA	

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	AGOSTO																												SEPTIEMBRE		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Equipos de oficina	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 03

4 SEPTIEMBRE - 03 OCTUBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	3
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	SEPTIEMBRE																										OCTUBRE		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
Papeleria	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 04

04 OCTUBRE - 03 NOVIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	4
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	OCTUBRE																											NOVIEMBRE		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 05

04 NOVIEMBRE - 03 DICIEMBRE

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	5
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	NOVIEMBRE																										DICIEMBRE		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
Papeleria	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Equipos de oficina	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 06

04 DICIEMBRE 2023 - 03 ENERO 2024

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	6
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	DICIEMBRE																											ENERO		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 07

04 ENERO - 03 FEBRERO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	**MES**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	7
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	**MUNICIPIO**
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	ENERO																											FEBRERO		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NIT: 900.949.050-7

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 08

04 FEBRERO - 03 MARZO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	8
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	FEBRERO																										MARZO		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3
Papeleria	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Equipos de oficina	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

general de la misma, por los q estos análisis, conclusiones y las recomendaciones derivadas de este informe no constituyen una herramienta infalible en la toma de decisiones y conservar un grado de incertidumbre asociada a la cantidad de juntas que contienen las secciones de la estructura de las cubiertas y que no se inspeccionaron.

3. GENERALIDADES

3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ASME SECCION V ARTICULO 2 Y 6 " examinación por líquidos penetrantes"
- ASME SECCION VII APENDICE MANDATORIO: 8. "métodos para la examinación de líquidos penetrantes".
- ASTM-E 165 "Practicas recomendadas para la inspección con líquidos penetrantes"
- AWS D1.1 Sociedad de Soldadura de Estados Unidos.
- ASTM-E 1417 "Practicas estándar para la inspección con líquidos penetrantes".
- ASTM-E 433 "Fotografías estándar de referencia para la inspección con líquidos penetrantes"
- NTC-1642 "Higiene y seguridad. Andamios requisitos generales de seguridad".
- NTC-2234 "Higiene y seguridad. Andamios colgantes, clasificación, dimensiones y usos".
- ANSI A10-8 "Norma nacional americana de requisitos de seguridad para andamios".

3.2. DESCRIPCION DEL ENSAYO

El método de ensayo no destructivo por líquidos penetrantes consiste en la aplicación de estos sobre la superficie de la pieza, el penetrante penetra en las discontinuidades. Posteriormente, una vez eliminado el exceso de penetrante de la superficie de la pieza, el líquido contenido en las discontinuidades se hace aparecer por medio de un polvo absorbente (revelador).
Las definiciones pueden consultarse en la ASTM E 1316 "terminología para examinaciones no destructivas" SECCION F "examinación líquidos penetrantes".

3.3. PERSONAL

El personal deberá estar calificado y certificado como **NIVEL II** en Líquidos Penetrantes (PT) de acuerdo a las practicas recomendadas por la norma ASNT, SNT-TC-1A, de acuerdo al ASME Sección V.

3.4. TIPO DE LIQUIDOS

El kit de líquidos utilizados están basados bajos el código ASTM E–165, tabla 1, tipo II Penetrante Visible Coloreado, Método C removible con un solvente.

El kit consta de las siguientes referencias:

Penetrante: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKL-WP2)**
Revelador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKD-S2)**
Limpiador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKC-S)**

4. RESULTADOS.

Se hace inspección a las soldaduras de una pieza por cada parte de La estructura como lo dice la norma, en el procedimiento no se evidencia efectologia de ningún tipo, arrojando el resultado de que la estructura se encuentre en óptimas condiciones para ejercer su función.

4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.

- **Socialización de la actividad**: inicialmente se realizó la socialización de la actividad al personal involucrado, divulgado el alcance y los criterios de aceptación del código usado para evaluar las soldaduras de la estructura metálica.



FOTO 1 DIVULGACION DEL ALCANSE DE LA ACTIVIDAD.

- Cubierta metálica **POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN** (MOCOA – PTYO) se realizó la inspección de la cubierta metálica a las siguientes intersecciones de la estructura:

- Plataforma 1.
- Plataforma 2
- Plataforma 3.
- Plataforma 4.













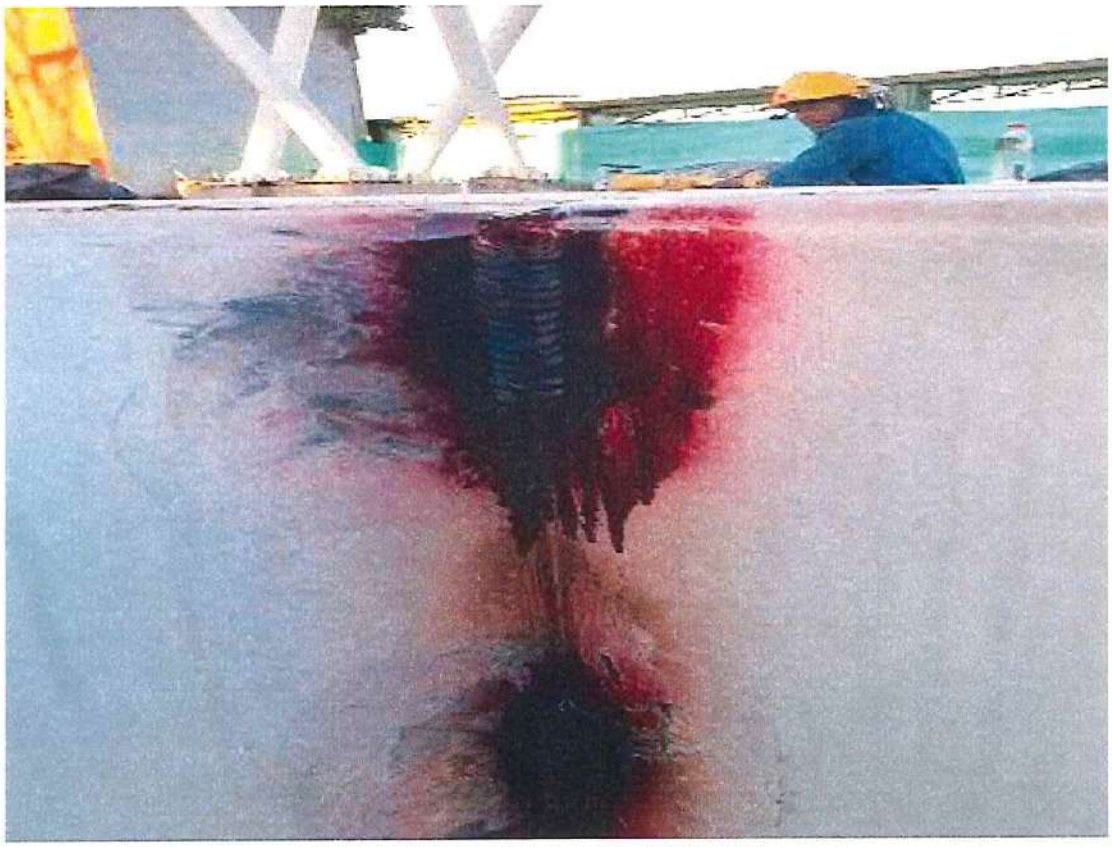


FOTO POLIDEPORTIVO DE PLATAFORMA.

5. Conclusiones.

De acuerdo a la evaluación realizada al spot correspondientes al muestreo de la estructura metálica de la cubierta del polideportivo San Agustín (Mocoa ptyo) según los resultados obtenidos se concluye que la estructura cuenta con las condiciones óptimas para el montaje de las plataformas inspeccionadas.

Este informe contiene la inspección mediante la referencia los textos citados de la norma, estos resultados constituyen y garantizan la integridad del mismo, la actualización de estos resultados esta sujetos a los cambios o actualizaciones en cada código de referencias mencionado.

Fernando silva Salazar.

INPECTOR NIVELL II VT PT

N° DE CERTIFICADO:

PT-FSS-21-2208.

VT-FSS-22-2554.

MT-FSS-23-2840.

UTWT-FSS-22-2554.

SOLDADOR 1A.



INFORME FINAL.

SERVICON CS SAS.

CONTRATO N° 786

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. GENERALIDADES 3
3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
3.2. DESCRIPCCION DEL ENSAYO 4
3.3. PERSONAL 4
3.4. TIPO DE LIQUIDOS 4
4. RESULTADOS 5
4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
5. CONCLUSIONES.

1. OBJETIVO

Detectar defectos abiertos a la superficie en soldaduras de filetes en las uniones soldadas en las secciones del prefabricado para la cubierta metálica del POLIDEPORTIVO **BARRIO SAN AGUSTIN**, (Mocoa - ptyo) para determinar la aptitud y disponibilidad para el servicio.

2. ALCANCE

El presente informe contiene los resultados, análisis y conclusiones de la cubierta del **POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN**, (Mocoa - ptyo) la construcción perteneciente a **LA INTERVENTORÍA SERVICON CS SAS** Basándose en los procedimientos **QCIEN-PR-018** (inspección por líquidos penetrantes), Bajo las normas **ASME SECCION V-E-165/95 – AWS D1.1.**

los análisis se hicieron a partir de datos obtenidos en los lugares donde se realizó la inspección, datos que corresponden a un muestreo o spot estadístico tomando sobre los puntos de las juntas de la estructura, con el fin de predecir el estado general de la misma, por los q estos análisis, conclusiones y las recomendaciones derivadas de este informe no constituyen una herramienta infalible en la toma de decisiones y conservar un grado de incertidumbre asociada a la cantidad de juntas que contienen las secciones de la estructura de las cubiertas y que no se inspeccionaron.

3. GENERALIDADES

3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ASME SECCION V ARTICULO 2 Y 6 “examinación por líquidos penetrantes”
- ASME SECCION VII APENDICE MANDATORIO: 8. “métodos para la examinación de líquidos penetrantes”.
- ASTM-E 165 “Practicas recomendadas para la inspección con líquidos penetrantes”
- AWS D1.1 Sociedad de Soldadura de Estados Unidos.

- ASTM-E 1417 "Practicas estándar para la inspección con líquidos penetrantes".
- ASTM-E 433 "Fotografías estándar de referencia para la inspección con líquidos penetrantes"
- NTC-1642 "Higiene y seguridad. Andamios requisitos generales de seguridad".
- NTC-2234 "Higiene y seguridad. Andamios colgantes, clasificación, dimensiones y usos".
- ANSI A10-8 "Norma nacional americana de requisitos de seguridad para andamios".

3.2. DESCRIPCION DEL ENSAYO

El método de ensayo no destructivo por líquidos penetrantes consiste en la aplicación de estos sobre la superficie de la pieza, el penetrante penetra en las discontinuidades. Posteriormente, una vez eliminado el exceso de penetrante de la superficie de la pieza, el líquido contenido en las discontinuidades se hace aparecer por medio de un polvo absorbente (revelador).
Las definiciones pueden consultarse en la ASTM E 1316 "terminología para examinaciones no destructivas" SECCION F "examinación líquidos penetrantes".

3.3. PERSONAL

El personal deberá estar calificado y certificado como **NIVEL II** en Líquidos Penetrantes (PT) de acuerdo a las practicas recomendadas por la norma ASNT, SNT-TC-1A, de acuerdo al ASME Sección V.

3.4. TIPO DE LIQUIDOS

Los kits de líquidos utilizados están basados bajos el código ASTM E–165, tabla 1, tipo II Penetrante Visible Coloreado, Método C removible con un solvente.

El kit consta de las siguientes referencias:

Penetrante: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKL-WP2)**
Revelador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKD-S2)**
Limpiador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKC-S)**

4. RESULTADOS.

Se hace inspección a las soldaduras de una pieza por cada parte de La estructura como lo dice la norma, en el procedimiento no se evidencia efectologia de ningún tipo, arrojando el resultado de que la estructura se encuentre en óptimas condiciones para ejercer su función.

4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.


- **Socialización de la actividad**: inicialmente se realizó la socialización de la actividad al personal involucrado, divulgado el alcance y los criterios de aceptación del código usado para evaluar las soldaduras de la estructura metálica.




FOTO 1 DIVULGACION DEL ALCANSE DE LA ACTIVIDAD.


- Cubierta metálica **POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN** (MOCOA – PTYO) se realizó la inspección de la cubierta metálica a las siguientes intersecciones de las estructuras con métodos por inspección visual y líquidos penetrantes.


- **Plataforma 1: se realiza la inspección visual.**

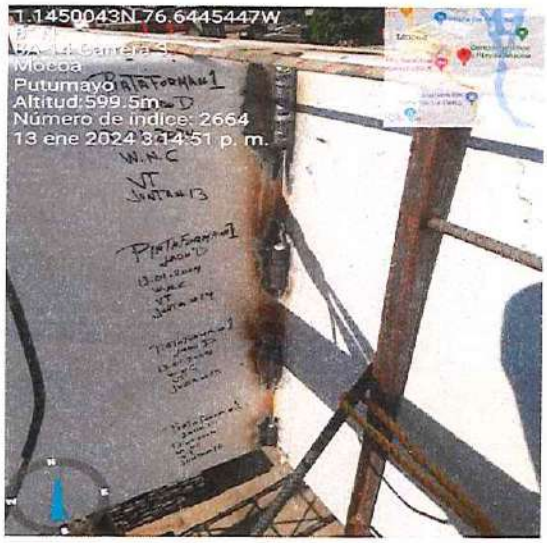

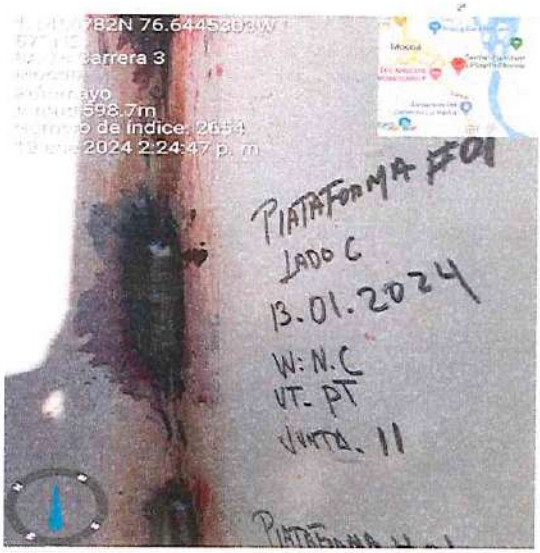


- **Plataforma 1 con líquidos penetrantes.**

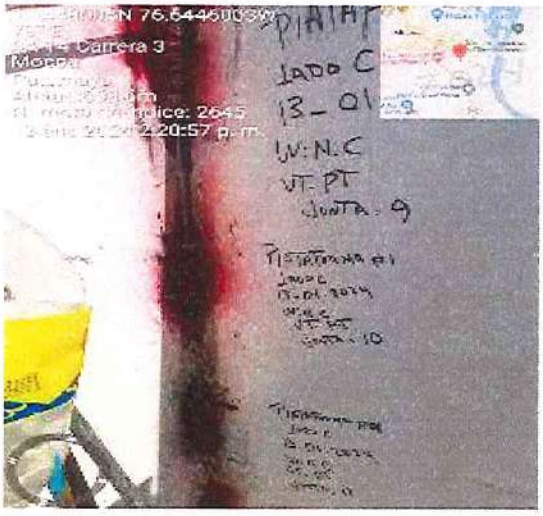


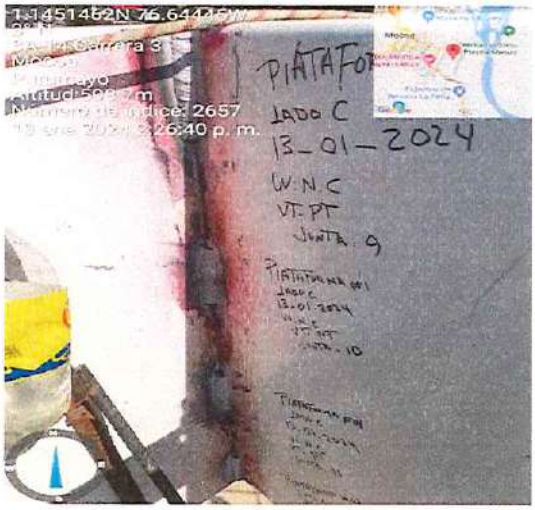


- **Plataforma 3 por inspección visual.**



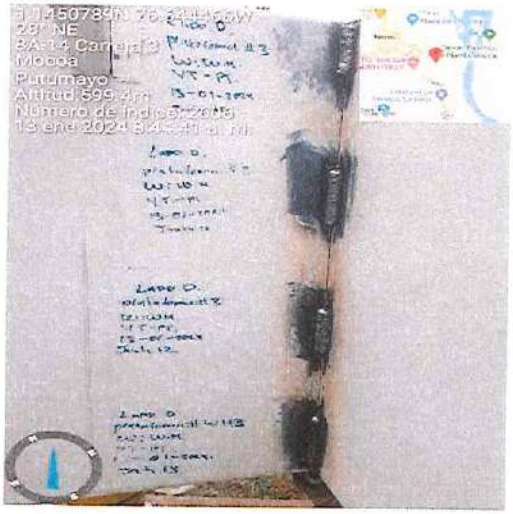


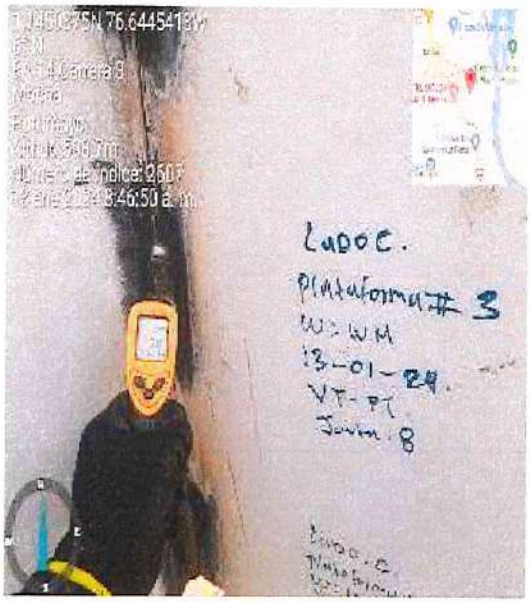


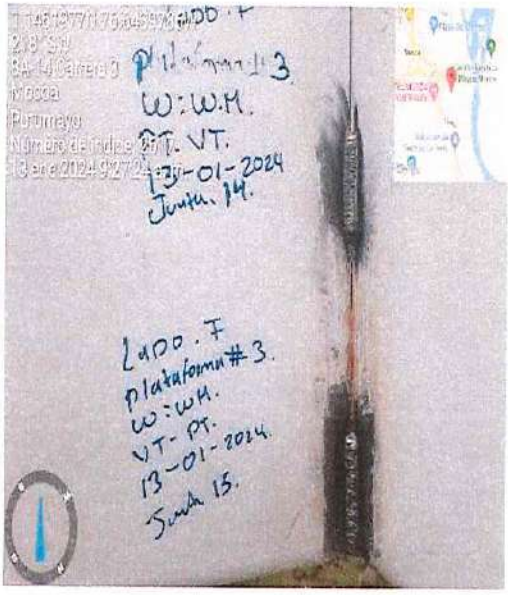

- **Plataforma 3 por líquidos penetrantes:**




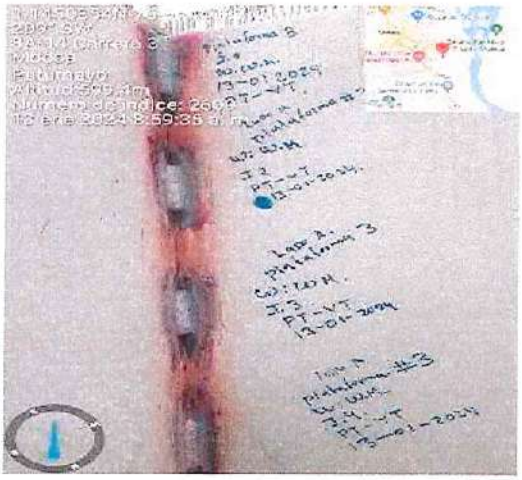


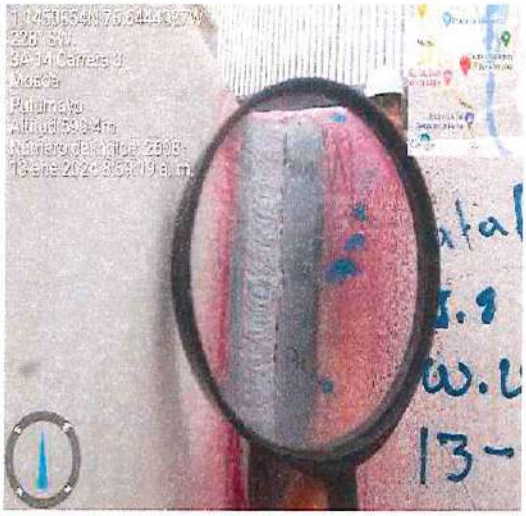




- **Plataforma 3 de lado B de la parte interna.**

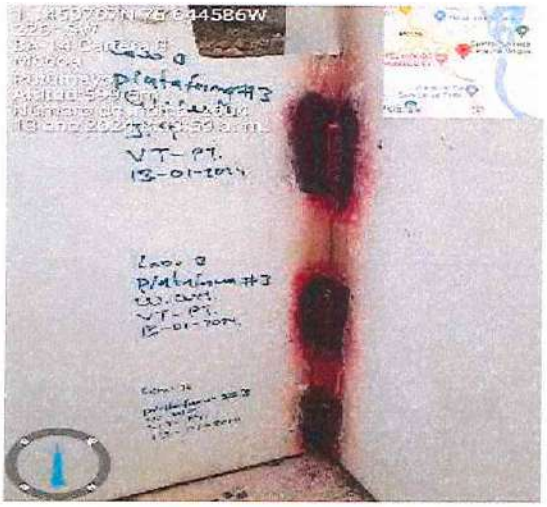

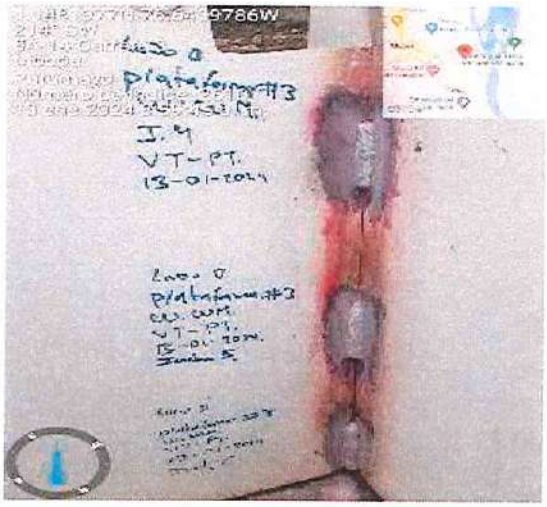







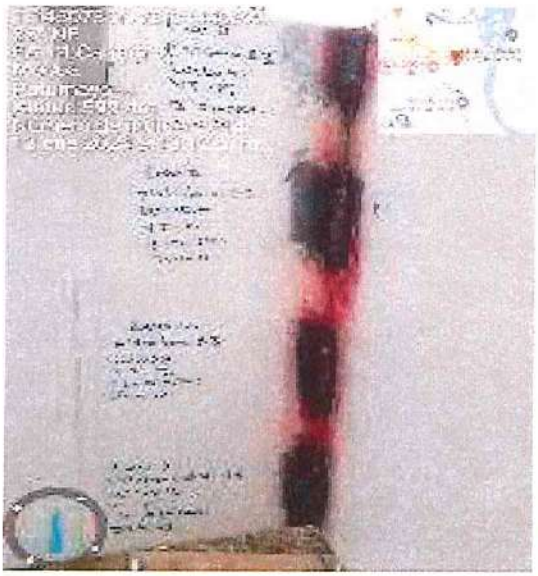



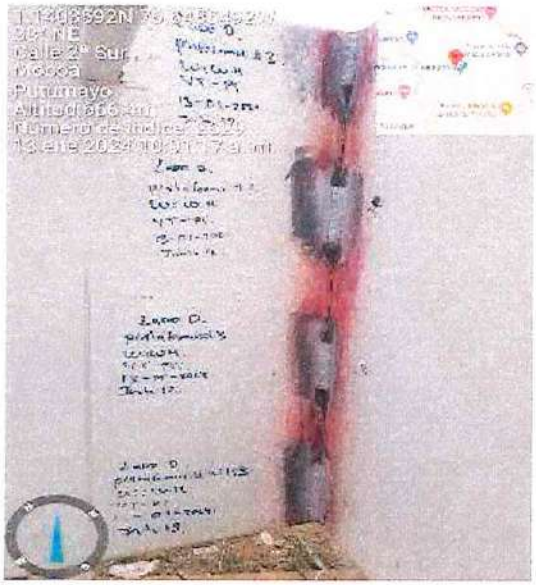

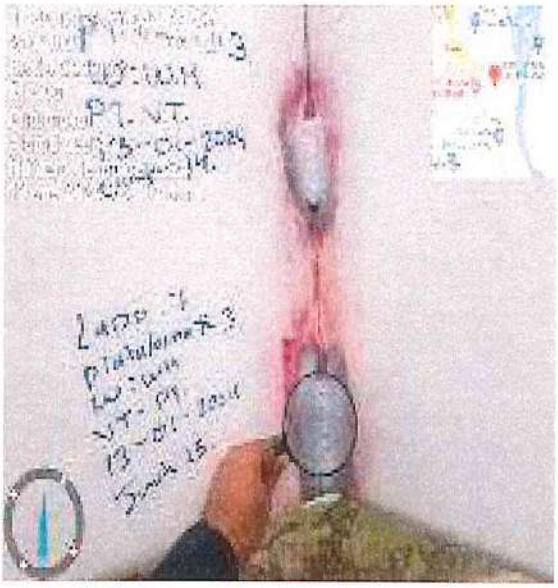

- **Plataforma 3 por inspección visual lado externo.**









- **Plataforma 3 por líquidos penetrantes lado externo.**













- **Plataforma 3 por inspección visual sobre cabeza.**










- Plataforma 3 de sobre cabeza por líquidos penetrantes.



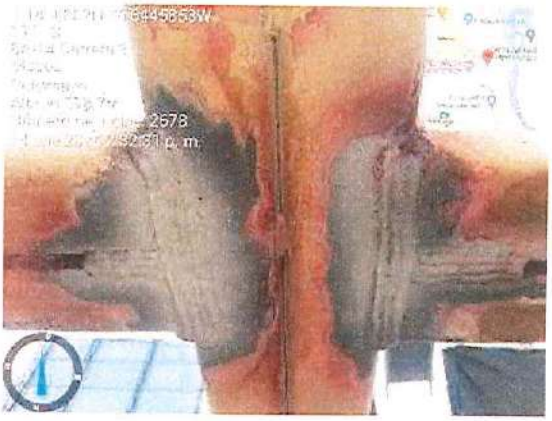









5. Conclusiones.

De acuerdo a la evaluación realizada al spot correspondientes al muestreo de la estructura metálica de la cubierta del polideportivo San Agustín (Mocoa ptyo) según los resultados obtenidos se concluye que la estructura cuenta con las condiciones óptimas para el montaje de las plataformas inspeccionadas.

Este informe contiene la inspección mediante la referencia los textos citados de la norma, estos resultados constituyen y garantizan la integridad del mismo, la actualización de estos resultados están sujetos a los cambios o actualizaciones en cada código de referencias mencionado.

Fernando silva Salazar.

INPECTOR NIVELL II VT PT

N° DE CERTIFICADO:

PT-FSS-21-2208.

VT-FSS-22-2554.

MT-FSS-23-2840.

UTWT-FSS-22-2554.

SOLDADOR 1A.

ingenieria y ensayos sas	**INSPECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES**	INFORME FINAL DE PLATAFORMA# 1 TORRES ACI 6 TORRE A2 PEDESTAL B2
MOCOA PUTUMAYO	06/02/2024	Página 1 de 1.



INFORME.

SERVICON CS SAS.

CONTRATO N° 786

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. GENERALIDADES 3
3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
3.2. DESCRIPCCION DEL ENSAYO 4
3.3. PERSONAL 4
3.4. TIPO DE LIQUIDOS 4
4. RESULTADOS 5
4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
5. CONCLUSIONES.

1. OBJETIVO

Detectar defectos abiertos a la superficie en soldaduras de filetes en las uniones soldadas en las secciones del prefabricado para la cubierta metálica del POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN, (Mocoa - ptyo) para determinar la aptitud y disponibilidad para el servicio.

2. ALCANCE

El presente informe contiene los resultados, análisis y conclusiones de la cubierta del **CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN,** (Mocoa - ptyo) la construcción perteneciente LA INTERVENTORIA SERVICON CS SAS Basándose en los procedimientos **QCIEN-PR-018** (inspección por líquidos penetrantes), Bajo las normas **ASME SECCION V-E-165/95 – AWS D1.1.**

los análisis se hicieron a partir de datos obtenidos en los lugares donde se realizó la inspección, datos que corresponden a un muestreo o spot estadístico tomando sobre los puntos de las juntas de la estructura, con el fin de predecir el estado general de la misma, por los q estos análisis, conclusiones y las recomendaciones derivadas de este informe no constituyen una herramienta infalible en la toma de decisiones y conservar un grado de incertidumbre asociada a la cantidad de juntas que contienen las secciones de la estructura de las cubiertas y que no se inspeccionaron.

3. GENERALIDADES

3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ASME SECCION V ARTICULO 2 Y 6 "examinación por líquidos penetrantes"
- ASME SECCION VII APENDICE MANDATORIO: 8. "métodos para la examinación de líquidos penetrantes".
- ASTM-E 165 "Practicas recomendadas para la inspección con líquidos penetrantes"
- AWS D1.1 Sociedad de Soldadura de Estados Unidos.

- ASTM-E 1417 "Practicas estándar para la inspección con líquidos penetrantes".
- ASTM-E 433 "Fotografías estándar de referencia para la inspección con líquidos penetrantes"
- NTC-1642 "Higiene y seguridad. Andamios requisitos generales de seguridad".
- NTC-2234 "Higiene y seguridad. Andamios colgantes, clasificación, dimensiones y usos".
- ANSI A10-8 "Norma nacional americana de requisitos de seguridad para andamios".

3.2. DESCRIPCION DEL ENSAYO

El método de ensayo no destructivo por líquidos penetrantes consiste en la aplicación de estos sobre la superficie de la pieza, el penetrante penetra en las discontinuidades. Posteriormente, una vez eliminado el exceso de penetrante de la superficie de la pieza, el líquido contenido en las discontinuidades se hace aparecer por medio de un polvo absorbente (revelador).
Las definiciones pueden consultarse en la ASTM E 1316 "terminología para examinaciones no destructivas" SECCION F "examinación líquidos penetrantes".

3.3. PERSONAL

El personal deberá estar calificado y certificado como **NIVEL II** en Líquidos Penetrantes (PT) de acuerdo a las practicas recomendadas por la norma ASNT, SNT-TC-1A, de acuerdo al ASME Sección V.

3.4. TIPO DE LIQUIDOS

Los kits de líquidos utilizados están basados bajos el código ASTM E–165, tabla 1, tipo II Penetrante Visible Coloreado, Método C removible con un solvente.

El kit consta de las siguientes referencias:

Penetrante: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKL-WP2)**
Revelador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKD-S2)**
Limpiador: Marca MAGNAFLUX (SPOTCHECK **SKC-S)**

4. RESULTADOS.

Se hace inspección a las soldaduras de una pieza por cada parte de La estructura como lo dice la norma, en el procedimiento no se evidencia efectologia de ningún tipo, arrojando el resultado de que la estructura se encuentre en óptimas condiciones para ejercer su función.

4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.


- **Socialización de la actividad**: inicialmente se realizó la socialización de la actividad al personal involucrado, divulgado el alcance y los criterios de aceptación del código usado para evaluar las soldaduras de la estructura metálica.




FOTO 1 ALCANSE DE LA ACTIVIDAD.

- Cubierta metálica **POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN** (MOCOA – PTYO) se realizó la inspección de la cubierta metálica a las siguientes intersecciones de las estructuras con métodos por inspección visual y líquidos penetrantes.

FOTOS DE PEDESTAL #1.

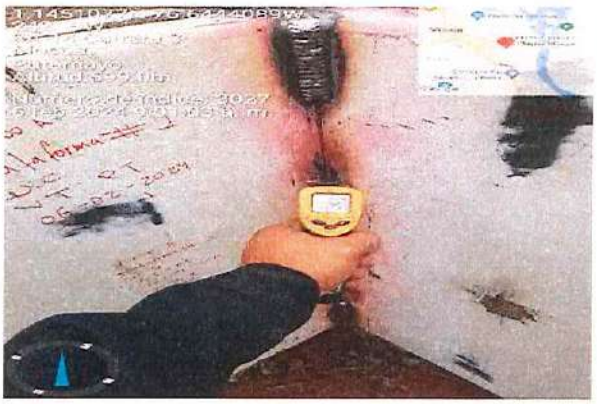

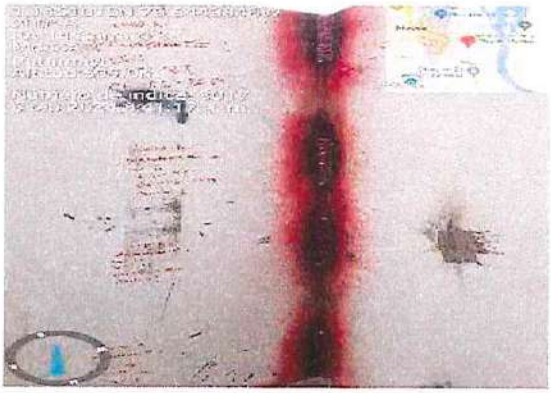









- TORRE ACI 6. INSPECCION VISUAL II













- TORRE ACI 6 LIQUIDOS PENETRANTES.













- TORRE A2. INSPECCION VISUAL.





- LIQUIDOS PENETRANTES.









- PEDESTAL B2.





Recomiend reparar.









Se recomienda reparar socavados.

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 09

04 MARZO- 03 ABRIL

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	9
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	MARZO																												ABRIL		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Papeleria	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X
Equipos de oficina	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS MES 10

04 ABRIL- 03 MAYO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S.

Juntos Trabajando

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SERVICON CS SAS	MES
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No: 786 DE 2023	10
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO
CONTRATO DE OBRA	No: 763 DE 2023	MOCOA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)"

MES	ABRIL																											MAYO		
EQUIPO / DÍA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
Papeleria	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A
Equipos de oficina	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = I

Firma _____

CAMILO GUZMAN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VER ANEXO 16. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL:4296887-3118060140
correo:wahcor1@gmail.com

CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CLIENTE CONSORCIO SERVICON CS SAS — FECHA AGO/SEP/OCT–2023 — HOJA 1

PROYECTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO — RESISTENCIA f'c=3000 PSI ó 21,0 Mpa — ENTIDAD GOBERNACION DEL PUTUMAYO

FECHA DE FUNDICIÓN	CILINDRO No	DIAS DE CURADO	FECHA ROTURA	CARGA KN	RESISTENCIA CILINDRO PSI	RESISTENCIA CILINDRO Mpa	RESISTENCIA fi Mpa	a (Mpa) fi ≥ (f'c – k1) fi ≥18,4 Mpa	b (Mpa) fm ≥ f'c fm ≥ 21,0 Mpa	% RESISTENCIA	OBRA	ESTRUCTURA	DOSIFICACIÓN	MATERIALES	OBSERVACIÓN
19 de agosto de 2023	1	7	26 de agosto de 2023	120,9	2177	14,9	21,8	CUMPLE	22,7	73	PEDESTAL	A6			
	2	14	2 de septiembre de 2023	133,0	2395	16,4				80					
	3	28	16 de septiembre de 2023	176,1	3171	21,8				106					
19 de agosto de 2023	4	7	26 de agosto de 2023	159,4	2870	19,7	27,6	CUMPLE		96	PEDESTAL	A2			
	5	14	2 de septiembre de 2023	178,0	3205	22,0				107					
	6	28	16 de septiembre de 2023	223,5	4025	27,6				134					
28 de agosto de 2023	7	7	7 de septiembre de 2023	125,0	2251	15,4	21,9	CUMPLE		75	PEDESTAL	B2			
	8	14	14 de septiembre de 2023	140,2	2525	17,3				84					
	9	28	28 de septiembre de 2023	177,2	3191	21,9				106					
6 de septiembre de 2023	10	7	13 de septiembre de 2023	127,4	2294	15,7	22,4	CUMPLE		76	PEDESTAL	B2 y A2			
	11	14	20 de septiembre de 2023	144,5	2602	17,9				87					
	12	28	4 de octubre de 2023	181,0	3259	22,4				109					
7 de septiembre de 2023	13	7	14 de septiembre de 2023	123,3	2220	15,2	21,5	CUMPLE		74	PEDESTAL	A6			
	14	14	21 de septiembre de 2023	136,1	2451	16,8				82					
	15	28	5 de octubre de 2023	174,2	3137	21,5				105					
21 de septiembre de 2023	16	7	28 de septiembre de 2023	130,2	2345	16,1	22,8	CUMPLE		78	PEDESTAL	B6 y C1			
	17	14	5 de octubre de 2023	147,0	2647	18,2				88					
	18	28	19 de octubre de 2023	184,6	3324	22,8				111					
25 de septiembre de 2023	19	7	2 de octubre de 2023	127,0	2287	15,7	22,3	CUMPLE		76	PEDESTAL	D5			
	20	14	9 de octubre de 2023	142,0	2557	17,5				85					
	21	28	23 de octubre de 2023	180,6	3252	22,3				108					
27 de septiembre de 2023	22	7	4 de octubre de 2023	121,1	2181	15,0	21,4	CUMPLE		73	PEDESTAL	E4			
	23	14	11 de octubre de 2023	137,1	2469	16,9				82					
	24	28	25 de octubre de 2023	173,4	3122	21,4				104					

DOSIFICACION SEGÚN DISEÑO

Artículo 630-13

a) fi ≥ (f'c – k1)

b) fm ≥ f'c

fm : Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de tres (3) ensayos

fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa.

f'c : Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días

k1 : Constante de evaluación.

para concretos con f'c menor o igual a 20,6 Mpa= 2,6 Mpa

Para concretos f'c≥ 20,6 Mpa= 3,5 Mpa

NOTA: LOS CILINDROS SON TOMADOS Y TRANSPORTADOS POR EL CLIENTE

GEOTEC.

WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
C.P No 19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL:4296887-3118060140
correo:wahcor1@gmail.com

CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CLIENTE CONSORCIO SERVICON CS SAS — FECHA AGO/SEP/OCT–2023 — HOJA 2

PROYECTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO — RESISTENCIA f'c=3000 PSI ó 21,0 Mpa — ENTIDAD GOBERNACION DEL PUTUMAYO

FECHA DE FUNDICIÓN	CILINDRO No	DIAS DE CURADO	FECHA ROTURA	CARGA KN	RESISTENCIA CILINDRO PSI	RESISTENCIA CILINDRO Mpa	RESISTENCIA fi Mpa	a (Mpa) fi ≥ (f'c – k1) fi ≥18,4 Mpa	b (Mpa) fm ≥ f'c fm ≥ 21,0 Mpa	% RESISTENCIA	OBRA	ESTRUCTURA	DOSIFICACIÓN	MATERIALES	OBSERVACIÓN
04 de octubre de 2023	25	7	11 de octubre de 2023	120,9	2177	14,9	21,0	CUMPLE		73	PEDESTAL	F3			
	26	14	18 de octubre de 2023	135,8	2445	16,8				82					
	27	28	01 de noviembre de 2023	170,2	3065	21,0				102					

DOSIFICACION SEGÚN DISEÑO

Artículo 630-13

a) fi ≥ (f'c – k1)
b) fm ≥ f'c
fm : Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) dias de tres (3) ensayos
fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa.
f'c : Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días

k1 : Constante de evaluación.
para concretos con f'c menor o igual a 20,6 Mpa= 2,6 Mpa
Para concretos f'c≥ 20,6 Mpa= 3,5 Mpa

NOTA: LOS CILINDROS SON TOMADOS Y TRANSPORTADOS POR EL CLIENTE

GEOTEC.

WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
C.P No 19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

VER ANEXO 17. RESULTADOS DE ENSAYOS DE SOLDADURA

INFORMES FINALES DE INSPECCIÓN DE SOLDADURA

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO



INFORME FINAL

SERVICON CS SAS.

CONTRATO N° 786.

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. GENERALIDADES 3
3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
3.2. DESCRIPCCION DEL ENSAYO 4
3.3. PERSONAL 4
3.4. TIPO DE LIQUIDOS 4
4. RESULTADOS 4
4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
5. CONCLUSIONES.

1. OBJETIVO

Detectar defectos abiertos a la superficie en soldaduras de filetes en las uniones soldadas en las secciones del prefabricado para la cubierta metálica del POLIDEPORTIVO **BARRIO SAN AGUSTIN,** (Mocoa - ptyo) para determinar la aptitud y disponibilidad para el servicio.

2. ALCANCE

El presente informe contiene los resultados, análisis y conclusiones de la cubierta del **POLIDEPORTIVO BARRIO SAN AGUSTIN,** (Mocoa - ptyo) la construcción perteneciente a **LA INTERVENTORÍA SERVICON CS SAS** Basándose en los procedimientos **QCIEN-PR-018** (inspección por líquidos penetrantes), Bajo las normas **ASME SECCION V-E-165/95 – AWS D1.1.**

los análisis se hicieron a partir de datos obtenidos en los lugares donde se realizó la inspección, datos que corresponden a un muestreo o spot estadístico tomando sobre los puntos de las juntas de la estructura, con el fin de predecir el estado

5. Conclusiones.

De acuerdo a la evaluación realizada al spot correspondientes al muestreo de la estructura metálica de la cubierta del polideportivo Barrio san Agustín (Mocoa ptyo) según los resultados obtenidos se concluye que la estructura cuenta con las condiciones óptimas para el montaje de las plataformas # 1, inspeccionadas.

OBSERVACION:

- El pedestal B2 se evidencia socavado de los criterios de aceptación se recomienda reparar.
- Se evidencia el tamaño de soldadura fuera de los criterios de aceptación se recomienda que la pierna de la soldadura (tamaño sea igual al espesor o más delgado a la pieza a unir).

Este informe contiene la inspección mediante la referencia los textos citados de la norma, estos resultados constituyen y garantizan la integridad del mismo, las actualizaciones de estos resultados están sujetos a los cambios o actualizaciones en cada código de referencias mencionado.

Fernando silva Salazar.

INPECTOR NIVELL II VT PT

N° DE CERTIFICADO:

PT-FSS-21-2208.

VT-FSS-22-2554.

MT-FSS-23-2840.

UTWT-FSS-22-2554.

SOLDADOR 1A.

REPORTES DE INSPECCIÓN DE SOLDADURA

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

FORMATO

REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES

Aprobacion:01/11/23
QCIEN-F-030
Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

E	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001-PT-SERV-23
AMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

S DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	VIGAS DE PERFILERIA				ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3	
MATERIAL / REFERENCIAS:	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8 mm	DIAMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	4 VIGAS DE RIGIDEZ

MACIÓN DE LA INSPECCIÓN

DIMIENTO N:	QCIEN-PR-018	REVISIÓN:	1	NORMA O CODIGO DE REFERENCIA:	AWS D1.1		
O DE LIMPIEZA :	MANUAL	TIPO DE PENETRANTE	II (VISIBLES)	METODO DE APILICACION:	SPRAY		
O DE REMOCION:	LAVABLES CON AGUA (METODO A)	TIEMPO DE PENETRACION:	10 MINUTOS	TIEMPO DE REVELADO	10 MINUTOS		

4. EQUIPOS, DESCRIPCIÓN DE LAS LIQUIDOS PENETRANTES

R DE TEMPERATURA:	SKF CMSS 3000 SI	SERIAL:		FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)	3789	TIPO DE LUZ NEGRA:	NA
TRO:	TRACEABLE 3251	SERIAL:	181568893	FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	MARCA LAMPARA UV UTILIZADA:			NA
EL PENETRANTE:	MAGNAFLUX SKL WP2	LOTE:	231000180			SERIAL:			NA
VELADOR:	MAGNAFLUX SKD-S2	LOTE:	2301002544			INTENSIDAD DE LUZ NEGRA (µW/cm2):			NA
PIADOR:	MAGNAFLUX SKC-S	LOTE:	221101C			RADIOMETRO:	NA	SN	NA

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ AREA INSPECCIONADA			INDICACION 1			INDICACION 2				
ZONA INSP. / DISTANCIA AL REGISTRO (m)	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO	EVALUACIO	OBSERVACIONES
VIGAS DE PERFILERIA 1	JV1	N.R	-	-	-	-	-	-	REPARAR	Se evidencia discontinuidades como porosidad, garganta insuficiente, socavados y cordon irregular, las cuales no se ecnuentran entre los criterios de aceptacion. Se recomienda realizar reparacion - las actividades de soldadura deben contar con procedimiento de soldadura calificado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGAS DE PERFILERIA 2	JV1	N.R	-	-	-	-	-	-	REPARAR	Se evidencia discontinuidades como porosidad, garganta insuficiente, socavados y cordon irregular, las cuales no se ecnuentran entre los criterios de aceptacion. Se recomienda realizar reparacion - las actividades de soldadura deben contar con procedimiento de soldadura calificado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGAS DE PERFILERIA 3	JV1	N.R	-	-	-	-	-	-	REPARAR	Se evidencia discontinuidades como porosidad, garganta insuficiente, socavados y cordon irregular, las cuales no se ecnuentran entre los criterios de aceptacion. Se recomienda realizar reparacion - las actividades de soldadura deben contar con procedimiento de soldadura calificado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. ESQUEMA DE INSPECCIÓN

SERVACIONES: Se realizó la inspección de VIGAS DE PERFILERIA

INSPECTOR		REVISADO POR		APROBO
IRE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRE: Eliana Ceballos	NOMBRE: Wilmer Ordoñez	NOMBRE: Eliana Ceballos
FICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-[illegible]945	CARGO: R.L.	CARGO: ESP. Soldadura	CARGO: R.L.
A:	DUVAN PALMA.	FIRMA	FIRMA	FIRMA
	2 de diciembre de 2023	FECHA:	FECHA:	FECHA:

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03
Clen	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001-PT-SERV-23
ENTO	SUR	SISTEMA	LIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUS			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
NTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	VIGAS DE PERFILERIA			ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3		
ATERIAL EFERENCIAS:	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8, mm	DIAMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	4 VIGAS DE RIGIGEZ

5. RESULTADO DE LA INSPECCION

COMPONENTE/ AREA INSPECCIONADA			INDICACION 1			INDICACION 2			EVALUACIO	OBSERVACIONES
ZONA INSP. / DISTANCIA AL	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO		
VIGA4	JV1	N.R	-	-	-	-	-	-	REPARAR	Se evidencia discontinuidades como porosidad, garganta insuficiente, socavados y cordon irregular, las cuales no se ecnuentran entre los criterios de aceptacion. Se recomienda realizar reparacion - las actividades de soldadura deben contar con procedimiento de soldadura calificado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERVACIONES: Se realizó la inspección de VIGAS DE PERFILERIA

INSPECTOR	REVISADO POR	APROBO
E: DUVAN PALMA GALLARDO ICADO NIVEL II N°: PT-DPG-27295 DUVAN PALMA. 2 de diciembre de 2023	NOMBRI Elvira Ceballos CARGO R.L. FIRMA FECHA:	NOMBRE: Wilmer Cadena CARGO ESP soldadura. FIRMA FECHA:	NOMBRI Elvira Ceballos CARGO R.L. FIRMA FECHA

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001-PT-SERV-23
AMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



POROSIDAD Y SOCAVAMIENTO

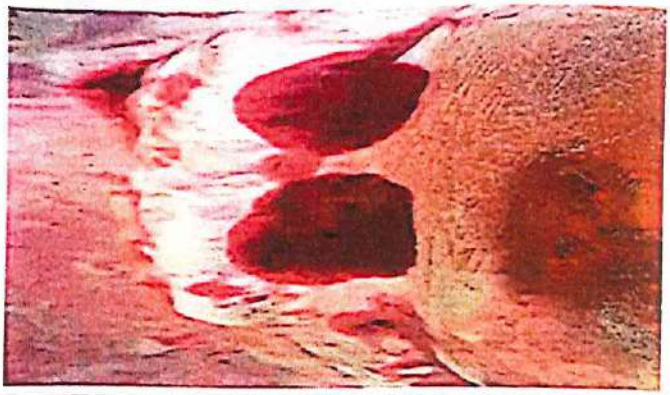



Foto 02 PRESENCIA DE POROSIDAD



DESTROZAMIENTO MATERIAL BASE



Foto 04 APLICACIÓN DE PENETRANTE

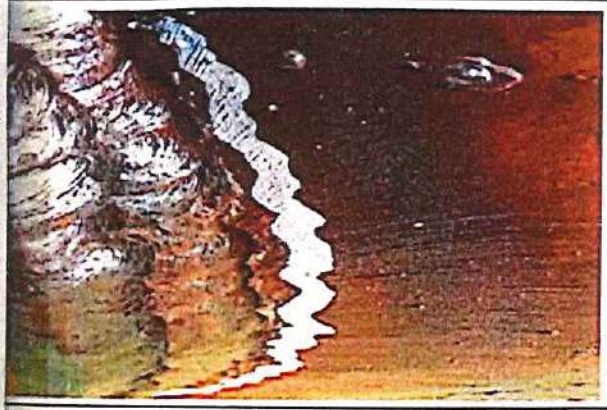

PRESENCIA DE SOCAVADO



Foto 06 PRESENCIA DE SOCAVADO

RE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRI Eliana Ceballos	NOMBRE: Wilmer Ordoñez	NOMBRI Eliana Ceballos
FICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-22-2945	CARGO RL.	CARGO Ep. Estructuras	CARGO RL.
	DUVAN PALMA.	FIRMA	FIRMA Wilmer Ordoñez	FIRMA
	2 de diciembre de 2023	FECHA:	FECHA:	FECHA

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001-PT-SERV-23
MENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
MENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCAVADO



Foto 08 POROSIDAD Y SOCAVADO



SOCAVADO Y POROSIDAD

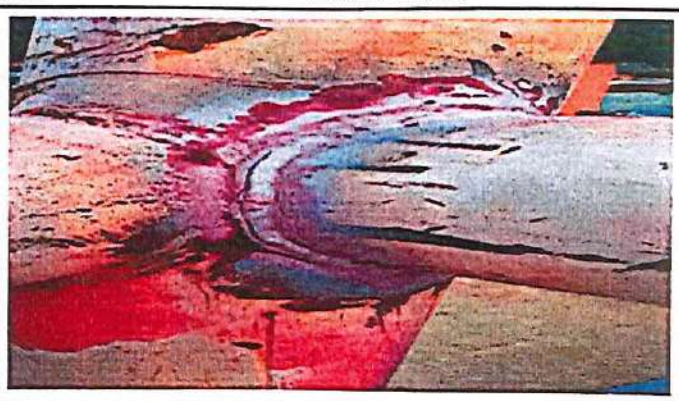


Foto 10 CORDON IRREGULAR

Aplicación de Revelador

Foto 12 Aplicación de Revelador

CADO NIVEL II N° :	DUVAN PALMA GALLARDO PT-DPG-22-2515 DUVAN PALMA. 2 de diciembre de 2023	NOMBRE: Eliana Cobaleda CARGO RL. FIRMA FECHA:	NOMBRE: Wilmer Orduz CARGO ESP. SST FIRMA FECHA:	NOMBRE: Eliana Cobaleda CARGO RL. FIRMA FECHA

	FORMATO	
Clen	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001A-PT-SERV-23
IENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LINEA	NA		
ENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	UNIONES SOLDADAS PLATAFORMA N°1			ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3		
ATERIAL EFERENCIAS:	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8 mm	DIÁMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	PLATAFORMA N° 1

ACIÓN DE LA INSPECCIÓN.

MIENTO N:	QCIEN-PR-018	REVISIÓN:	1	NORMA O CÓDIGO DE REFERENCIA:	AWS D1.1
DE LIMPIEZA :	MANUAL	TIPO DE PENETRANTE	II (VISIBLES)	METODO DE APILICACIÓN:	SPRAY
DE REMOCIÓN:	LAVABLES CON AGUA (METODO A)	TIEMPO DE PENETRACION	10 MINUTOS	TIEMPO DE REVELADO	10 MINUTOS

4. EQUIPOS, DESCRIPCIÓN DE LAS LIQUIDOS PENETRANTES

E TEMPERATURA:	SKF CMSS 3000 SI	SERIAL:		FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)	3789	TIPO DE LUZ NEGRA:	NA
O	TRACEABLE 3251	SERIAL:	181588893	FECHA DE CALIBRACION	5/06/2023	MARCA LAMPARA UV UTILIZADA:			NA
PENETRANTE:	MAGNAFLUX SKL WP2	LOTE:	231000180	SERIAL:					NA
REVELADOR:	MAGNAFLUX SKD S2	LOTE:	2301002544	INTENSIDAD DE LUZ NEGRA (µW/cm2):					NA
LIMPIADOR:	MAGNAFLUX SKC S	LOTE:	221101C	RADIÓMETRO:	NA	SN			NA

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ ÁREA INSPECCIONADA			INDICACIÓN 1			INDICACIÓN 2				
ZONA INSP. / DISTANCIA AL REGISTRO (m)	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO	EVALUACIO	OBSERVACIONES
PLATAFORMA N°1	SPOT 1	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	
	SPOT 2	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	Se evidencia discontinuidades como porosidad, garganta insuficiente, socavados y cordon irregular, las cuales no se encuetra entre los criterios de aceptacion. Se recomienda realizar reparacion - las actividades de soldadura deben contar con procedimiento de soldadura calificado
	SPOT 3	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	
	SPOT 4	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	
	SPOT 5	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	
	SPOT 6	-	-	-	-	-	-	-	REPARAR	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. ESQUEMA DE INSPECCIÓN

ERVACIONES :	Se realizó la inspección de UNIONES SOLDADAS PLATAFORMA N°1


INSPECTOR	REVISADO POR	APROBO
E: DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRE: Eliana Ceballos	NOMBRE: Eliana Ceballos
CADO NIVEL II N° : PT-DPG/23-2945	CARGO R.L	CARGO: R.L
DUVAN PALMA.	FIRMA	FIRMA:
2 de diciembre de 2023	FECHA:	FECHA:
	NOMBRE: Wilmer Ordoñez	
	CARGO ESP. Soldadura.	
	FIRMA	
	FECHA:	

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	2/12/2023	Reporte N°	R-001A-PT-SERV-23
ENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
ENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

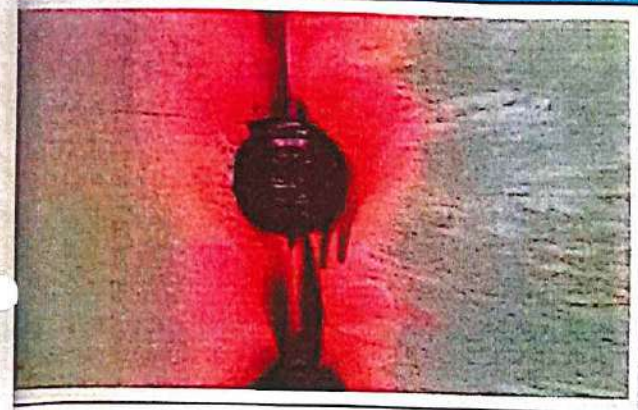

APLICAICON DE PENETRANTE


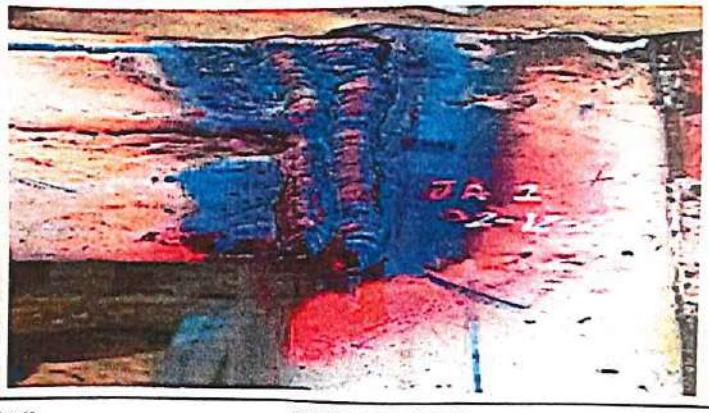


Foto 02 APLICAICON DE PENETRANTE

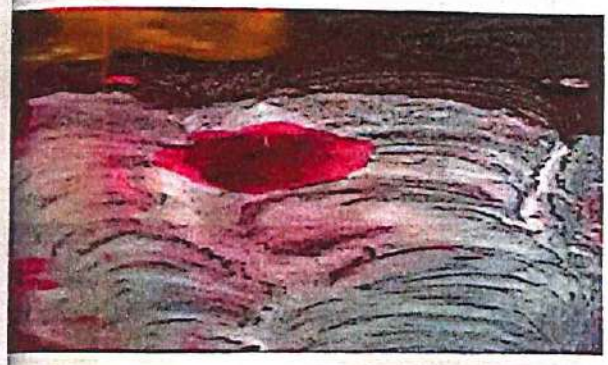

PRESENCIA DE POROS


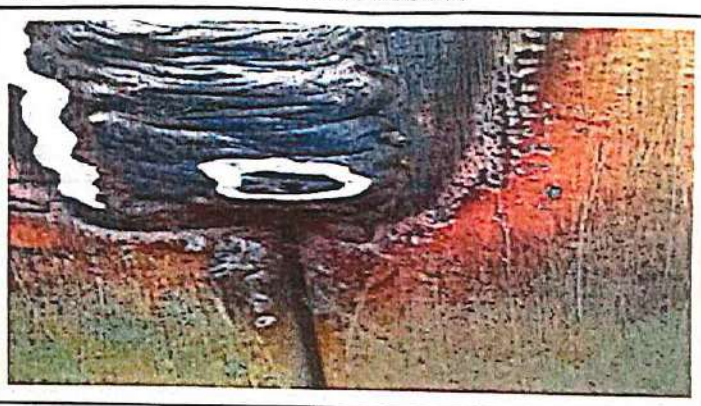


Foto 04 PRESENCIA DE PORO

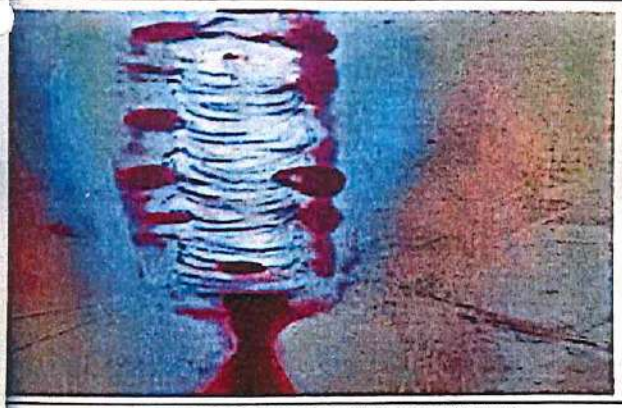

PRESENCIA DE SOCAVADO Y POROSIDAD, CORDON IRREGULAR

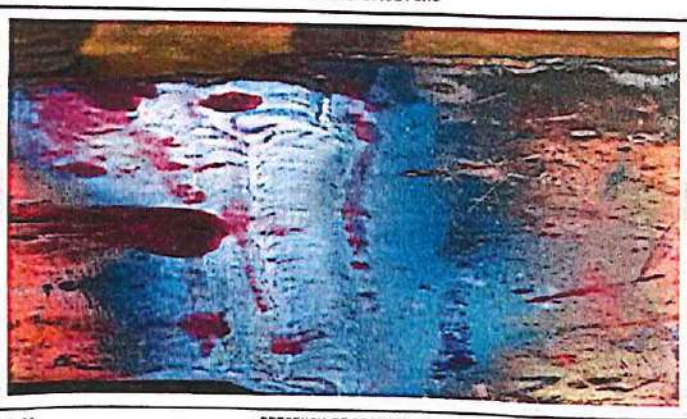


Foto 06 PRESENCIA DE SOCAVADO Y PROSIDAD

RE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRE: Eliana Ceballos	NOMBRE: Wilma Ordoñez	NOMBRE	Eliana Ceballos
FICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-23-2915	CARGO	CARGO ESP Soldadora	CARGO	
:	DUVAN PALMA. 2 de diciembre de 2023	FIRMA	FIRMA	FIRMA	
		FECHA:	FECHA:	FECHA	

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/12/2023	Reporte N°	R-002-PT-SERV-23
AMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	PLATAFORMAS DE CUBIERTA				ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3	
MATERIAL / REFERENCIAS	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8 mm	DIAMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	4 PLATAFORMAS



MACIÓN DE LA INSPECCIÓN

DIMIENTO N	QCIEN-PR-018	REVISIÓN:	1	NORMA O CÓDIGO DE REFERENCIA:	AWS D1.1		
O DE LIMPIEZA	MANUAL	TIPO DE PENETRANTE	II (VISIBLES)	METODO DE APILICACION:		SPRAY	
O DE REMOCIÓN:	LAVABLES CON AGUA (METODO A)	TIEMPO DE PENETRACION:	10 MINUTOS	TIEMPO DE REVELADO		10 MINUTOS	

4. EQUIPOS, DESCRIPCIÓN DE LAS LIQUIDOS PENETRANTES

DE TEMPERATURA	SKF CMSS 3000 SI	SERIAL:		FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)	3789	TIPO DE LUZ NEGRA	NA
TO:	TRACEABLE 3251	SERIAL:	161588893	FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023				
L PENETRANTE:	MAGNAFLUX SKL WP2	LOTE:	23100180	MARCA LAMPARA UV UTILIZADA:					NA
L REVELADOR:	MAGNAFLUX SKD-S2	LOTE:	2301002544	SERIAL:					NA
LIMPIADOR:	MAGNAFLUX SKC-S	LOTE:	24101C	INTENSIDAD DE LUZ NEGRA (µW/cm2):					NA
				RADIOMETRO:	NA	SN			NA

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ ÁREA INSPECCIONADA			INDICACION 1			INDICACION 2				
ZONA INSP. / DISTANCIA AL REGISTRO (m)	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO	EVALUACIO	OBSERVACIONES
PLATAFORMA 1	SPOT 1	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion. Se evidencia una grieta la cual fue reparada y inspeccionada con resultados satisfactorios
	SPOT 2	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 3	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 4	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 5	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 6	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
PLATAFORMA 2	SPOT 1	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion. cado
	SPOT 2	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 3	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 4	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 5	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 6	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
PLATAFORMA 3	SPOT 1	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion. a calificado
	SPOT 2	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 3	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 4	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 5	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 6	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	

6. ESQUEMA DE INSPECCIÓN

SERVACIONES: Se realizó la inspección de PLATAFORMAS DE CUBIERTA

INSPECTOR		REVISADO POR		APROBO
BRE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRE: Eliana Caballos	NOMBRE: Wilmer Pidonat	NOMBRE: Eliana Caballos
IFICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-23-2845	CARGO: R.L	CARGO: Soldadora	CARGO: R.L
A:	DUVAN PALMA.	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
A:	13 de diciembre de 2023	FECHA:	FECHA:	FECHA:

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23 QCIEN: F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/12/2023	Reporte N°	R-002-PT-SERV-23
TAMENTO	SUR	SISTEMA	LIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUS			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

2. DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	PLATAFORMAS DE CUBIERTA				ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3	
MATERIAL / REFERENCIAS	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	6, mm	DIAMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	4 PLATAFORMAS DE RIGIDEZ

3. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ AREA INSPECCIONADA			INDICACION 1			INDICACION 2			EVALUACIO	OBSERVACIONES
ZONA INSP. / DISTANCIA AL	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO		
PLATAFORMA 4	SPOT 1	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion o
	SPOT 2	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 3	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 4	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 5	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	SPOT 6	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: Se realizó la inspección de PLATAFORMAS DE CUBIERTA


INSPECTOR		REVISADO POR		APROBO
RE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRI: Elana Caballos	NOMBRE: Wilmer Ordoñez	NOMBRI: Elana Caballos
FICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-2242945	CARGO: RL	CARGO: Esp. Soldadura	CARGO: R.L
A	DUVAN PALMA.	FIRMA	FIRMA	FIRMA
A:	13 de diciembre de 2023	FECHA:	FECHA:	FECHA

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version.03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/12/2023	Reporte N°	R-002-PT-SERV-23
TAMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
TAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

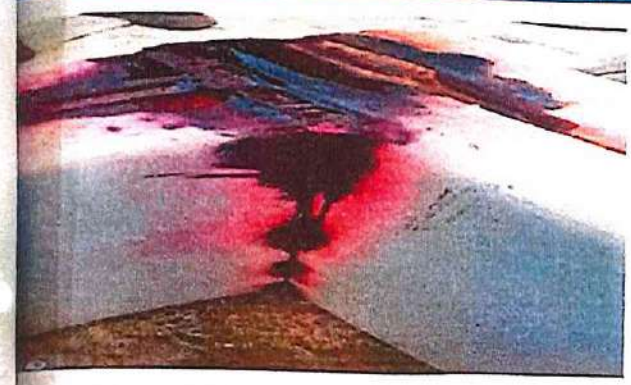

APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #1

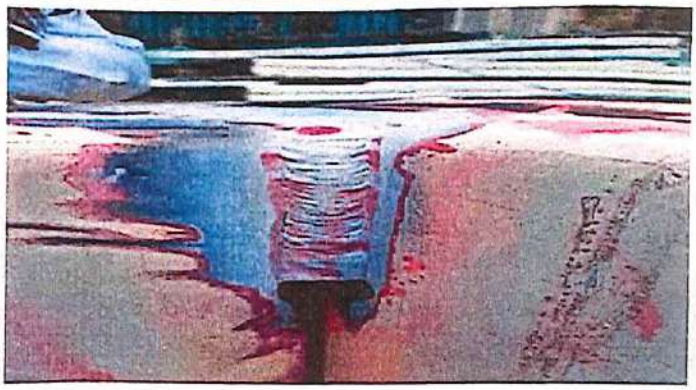


Foto 02 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #1



APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #1

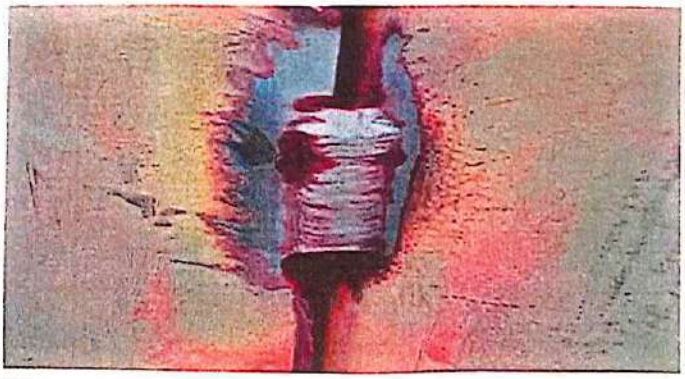


Foto 04 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #1



SOLDADURAS CONFORMES PLATAFORMA #2

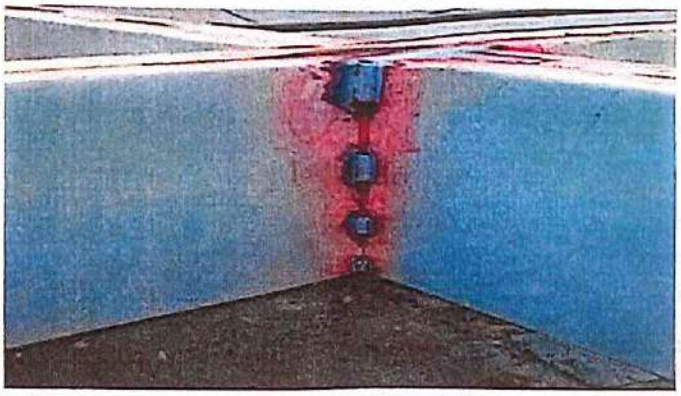


Foto 06 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #2

IRE:	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRI	Eliana Urbano	NOMBRE:	Wilmer Ordoñez
IFICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-2[illegible]5	CARGO	R.L	CARGO	Ep. soldadora.
A:	13 de diciembre de 2023	FIRMA	DUVAN PALMA.	FIRMA	
		FECHA		FECHA	

NOMBI	Eliana Urbano
CARGO	R.L
FIRMA	
FECHA	

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/12/2023	Reporte N°	R-002-PT-SERV-23
TAMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



APLICACION DE REVELADOR PLATAFORMA #2


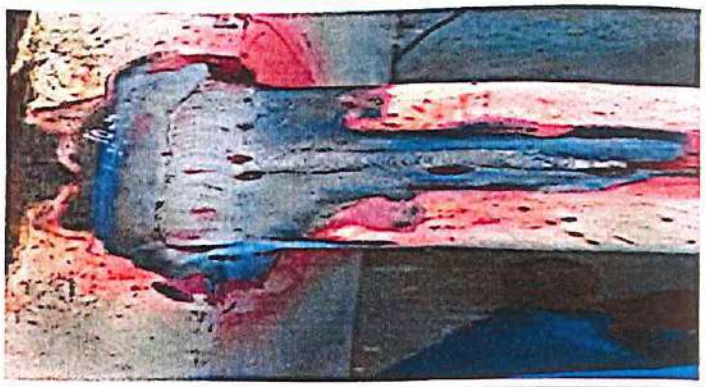


Foto 08 APLICACION DE REVELADOR PLATAFORMA #2

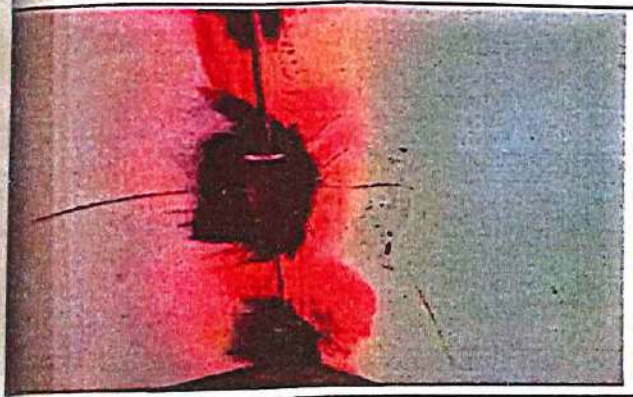

APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #3


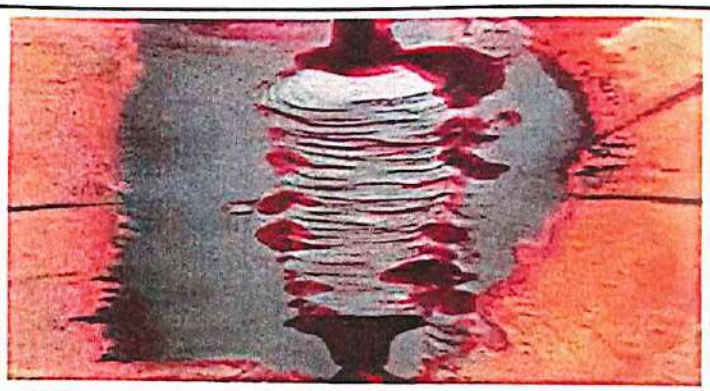


Foto 10 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #3

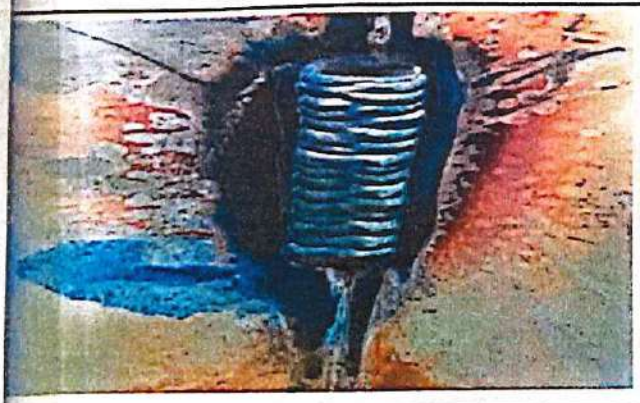

SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA #3



Foto 12 APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #4

FICADO NIVEL II N° :	DUVAN PALMA GALLARDO PT-DPG-27-2915	NOMBRI CARGO FIRMA FECHA	NOMBRE: CARGO Esp Soldadura FIRMA FECHA:	NOMBI Eliana Cebalos. CARGC R. Tejas FIRMA FECHA	
A:	13 de diciembre de 2023				

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

E	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/12/2023	Reporte N°	R-002-PT-SERV-23
TAMENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
AMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #4



Foto 08 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #4

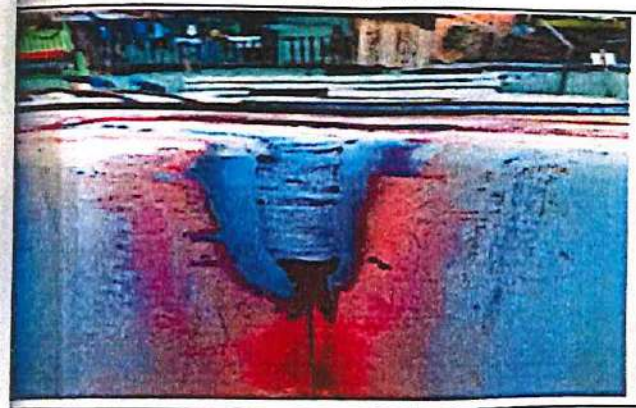

APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #4



Foto 10 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #4



SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA #4

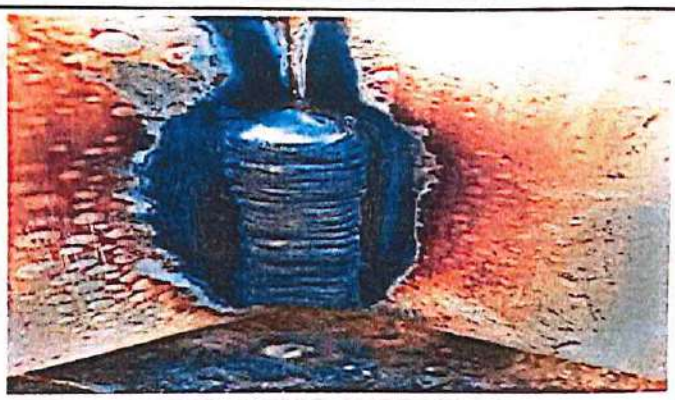


Foto 12 SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA #4

	DUVAN PALMA GALLARDO	NOMBRI	Eliana Caballos	NOMBRE:		NOMBRI	Eliana Caballos
FICADO NIVEL II N° :	PT-DPG-2[illegible]5	CARGO	R.L.	CARGO	Esp. Soldadura	CARGO	R.L.
	DUVAN PALMA.	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
A:	13 de diciembre de 2023	FECHA:		FECHA:		FECHA	

FORMATO

REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES

Aprobacion:01/11/23
QCIEN-F-030
Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/01/2024	Reporte N°	R-003-PT-SERV-23
ENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
ENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	PLATAFORMAS DE CUBIERTA			ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3		
ATERIAL	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8. mm	DIAMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	2 PLATAFORMAS
EFERENCIAS							


CIÓN DE LA INSPECCIÓN

MIENTO N	QCIEN-PR-018	REVISIÓN:	1	NORMA Ó CÓDIGO DE REFERENCIA:	AWS D1.1
DE LIMPIEZA	MANUAL				
DE REMOCIÓN	LAVABLES CON AGUA (METODO A)	TIPO DE PENETRANTE	II (VISIBLES)	METODO DE APILICACION:	SPRAY
		TIEMPO DE PENETRACION	10 MINUTOS	TIEMPO DE REVELADO	10 MINUTOS

4. EQUIPOS, DESCRIPCIÓN DE LAS LIQUIDOS PENETRANTES

TEMPERATURA	SKF CMSS 3000 SI	SERIAL:	FECHA DE CALIBRACION:	5/08/2023	INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)	3789	TIPO DE LUZ NEGRA NA
O	TRACEABLE 3251	SERIAL: 181588693	FECHA DE CALIBRACION	5/08/2023	MARCA LAMPARA UV UTILIZADA:		NA
PENETRANTE	MAGNAFLUX SKL WP2	LOTE:	231000180		SERIAL:		NA
REVELADOR	MAGNAFLUX SKD-S2	LOTE:	2301002544		INTENSIDAD DE LUZ NEGRA (µW/cm2):		NA
LIMPIADOR	MAGNAFLUX SKC-S	LOTE:	ZN01C		RADIOMETRO NA	SN	NA

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ AREA INSPECCIONADA			INDICACION 1			INDICACION 2				
ZONA INSP / DISTANCIA AL REGISTRO (m)	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO	EVALUACIO	OBSERVACIONES
PLATAFORMA 1	LADO A	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion.
	LADO B	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO C	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO D	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLATAFORMA 3	LADO A	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion. cado
	LADO B	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO C	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO D	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO E	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
	LADO F	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. ESQUEMA DE INSPECCIÓN

VACIONES : Se realizó la inspección de PLATAFORMAS DE CUBIERTA

INSPECTOR	REVISADO POR	APROBO
FERNANDO SILVA	NOMBRE: Eliana Cabal(c)	NOMBRE: Wilma Cadena
ADO NIVEL II N° :	CARGO R.L.	CARGO ESP. Soldadura
13 de enero de 2024	FIRMA	FIRMA
	FECHA:	FECHA:
		NOMBRE: Eliana Cabal
		CARGO: R.L.
		FIRMA:
		FECHA:

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/01/2024	Reporte N°	R-003-PT-SERV-23
	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO




APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #3

Foto 02



LADO B PLATAFORMA #3

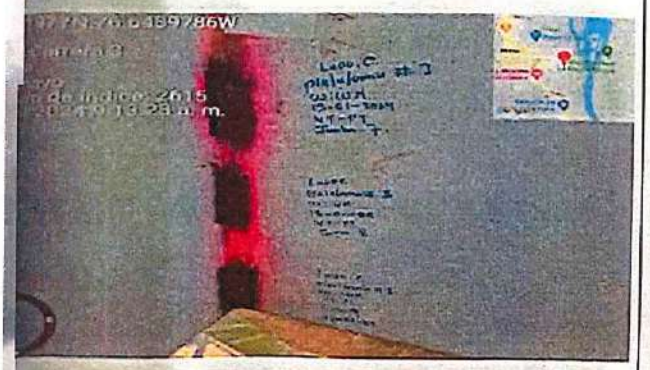

APLICACIÓN DE PENETRANTE LADO C PLATAFORMA #3

Foto 04




APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #3



APLICACIÓN DE PENETRANTE LADO A PLATAFORMA #3

Foto 06

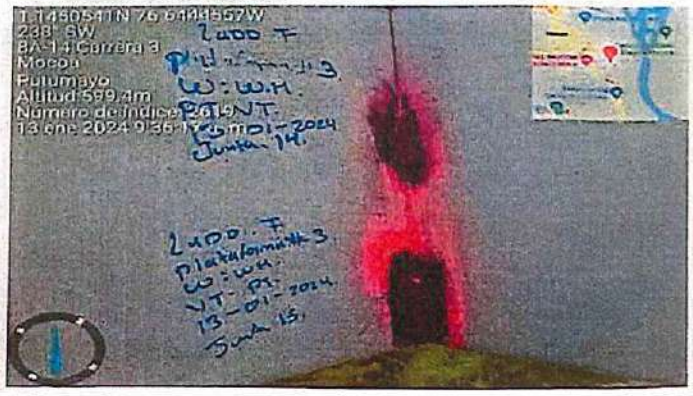

APLICACIÓN DE PENETRANTE LADO F PLATAFORMA #3

ADO NIVEL II N° :	FERNANDO SILVA	NOMBRE:	Elvira Caballos	NOMBRE:	Wilmer Ordoñez
	13 de enero de 2024	CARGO	R.L.	CARGO	Esp. Soldadura
		FIRMA		FIRMA	
		FECHA:		FECHA:	


NOMBRE:	Elvira Caballos				
CARGO	R.L.				
FIRMA					
FECHA					

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/01/2024	Reporte N°	R-003-PT-SERV-23
NTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
NTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA


7. REGISTRO FOTOGRAFICO

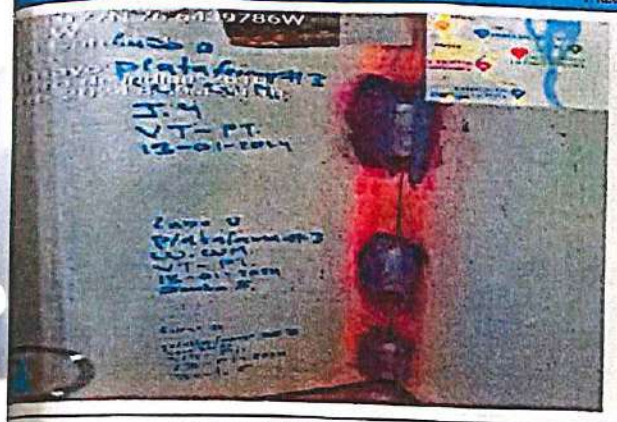

SOLDADURAS CONFORME LADO B PLATAFORMA #3



Foto 08 SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA #3

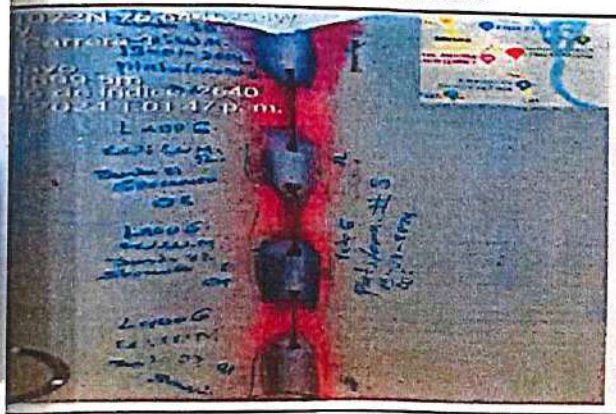

SOLDADURAS CONFORME LADO G PLATAFORMA #3


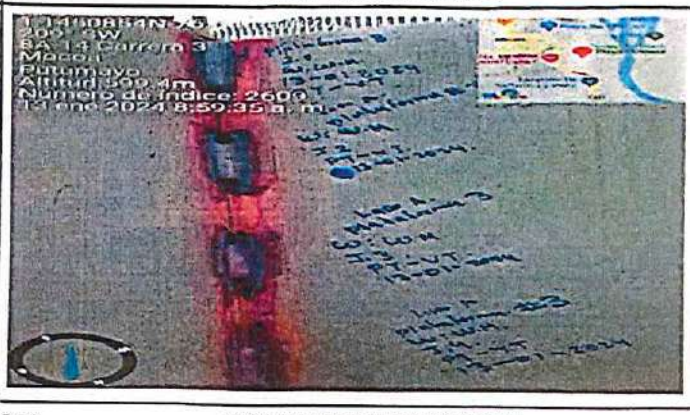


Foto 10 SOLDADURAS CONFORME LADO A PLATAFORMA #3

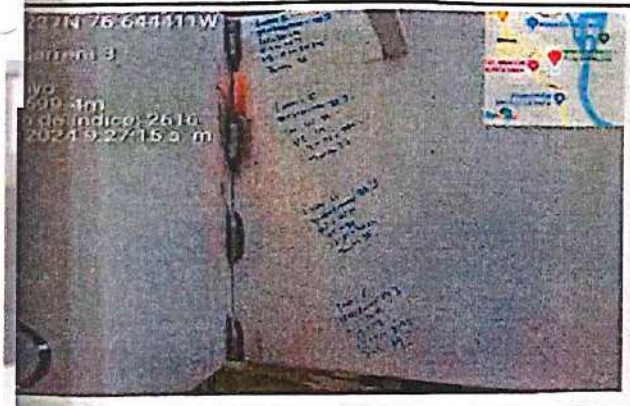

SOLDADURAS CONFORME LADO E PLATAFORMA #3



Foto 12 SOLDADURAS CONFORME LADO D PLATAFORMA #3

DO NIVEL II N° :	FERNANDO SILVA 13 de enero de 2024	NOMBRE: Eliana Caballos CARGO: RL. FIRMA: FECHA:	NOMBRE: Wilmer Ordoñez CARGO: ESP. Soldadura FIRMA: FECHA:	NOMBRE: Eliana Caballos CARGO: RL. FIRMA: FECHA:	

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	13/01/2024	Reporte N°	R-003-PT-SERV-23
ENTO	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
ONTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



APLICACIÓN DE PENETRANTE LADO C PLATAFORMA #1



Foto 08 APLICACIÓN DE REVELADOR LADO C PLATAFORMA #1



APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA



Foto 10 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA



SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA



Foto 12 SOLDADURAS CONFORME PLATAFORMA

DO NIVEL II N° :	FERNANDO SILVA 13 de enero de 2024	NOMBRE: Eliana Caballos CARGO R.L FIRMA FECHA:	NOMBRE: Wilmer Ordoñez CARGO Soldador FIRMA FECHA:

	FORMATO	
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	6/02/2024	Reporte N°	R-004-PT-SERV-23
DEPARTAMENTO O&M	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

2. DATOS DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	TORRES - PLATAFOMA -PEDESTAL DE CUBIERTA					ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3
MATERIAL	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8, mm	DIÁMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	1 PLATAFORMAS - 2 TORRES PEDESTAL
PLANO / REFERENCIAS:							

3. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO N:	QCIEN-PR-018	REVISIÓN:	1	NORMA O CODIGO DE REFERENCIA:	AWS D1.1
METODO DE LIMPIEZA :	MANUAL	TIPO DE PENETRANTE	II (VISIBLES)	METODO DE APILICACION:	SPRAY
METODO DE REMOCION:	LAVABLES CON AGUA (METODO A)	TIEMPO DE PENETRACION:	10 MINUTOS	TIEMPO DE REVELADO	10 MINUTOS


4. EQUIPOS, DESCRIPCIÓN DE LAS LIQUIDOS PENETRANTES

MEDIDOR DE TEMPERATURA:	SKF CMSS 3000 SI	SERIAL:		FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)	3789	TIPO DE LUZ NEGRA	NA
LUXOMETRO:	TRACEABLE 3251	SERIAL:	181588893	FECHA DE CALIBRACION:	5/06/2023	MARCA LAMPARA UV UTILIZADA:		NA	
MARCA DEL PENETRANTE:	MAGNAFLUX SKL WP2	LOTE:	231000180			SERIAL:		NA	
MARCA DEL REVELADOR:	MAGNAFLUX SKD-S2	LOTE:	2301002544			INTENSIDAD DE LUZ NEGRA (µW/cm2):		NA	
MARCA DEL LIMPIADOR:	MAGNAFLUX SKC-S	LOTE:	22H01C			RADIOMETRO:	NA	SN	NA

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

ITEM	ZONA INSP. / DISTANCIA AL REGISTRO (m)	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INDICACIÓN 1			INDICACIÓN 2			EVALUACIÓ	OBSERVACIONES
				INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO		
1	PLATAFORMA 1 	LADO A	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion.
		LADO B	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		LADO C	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		LADO D	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		LADO E	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LADO F	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	TORRE ACI 6 	J1	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	Se realiza la inspeccion de la plataforma, se evidencia indicaciones entre los criterios de aceptacion. cado
		J2	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		J3	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		J4	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		J5	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
		J6	N.R	-	-	-	-	-	-	CONFORME	
3	- 	J1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		J2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		J3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		J4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		J5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		J6	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. ESQUEMA DE INSPECCIÓN



OBSERVACIONES : Se evidencia tamaños de soldadura fuera de los criterios de aceptacion, se recomienda solicitar al diseñador de la estructura los esfuerzos reales o los tamaños de soldaduras adecuados, según estos calculos, se recomienda que la pierna de soldadura (tamaño) sea igual al espesor mas delgado de las piezas a Unir.

INSPECTOR	REVISADO POR		APROBO
NOMBRE: FERNANDO SILVA	NOMBRE: ELIANA ANDREA CEBALLOS	NOMBRE:WILMER ORDOÑEZ	NOMBRE: ELIANA ANDREA CEBALLOS
CERTIFICADO NIVEL II N° :	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	CARGO: ING CIVIL ESP. SOLDADURA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA:
FECHA: 6 de febrero de 2024	FECHA: 6 de febrero de 2024	FECHA:6 de febrero de 2024	FECHA: 6 de febrero de 2024

	FORMATO	
QCien Ingeniería y soluciones SAS	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	6/02/2024	Reporte N°	R-004-PT-SERV-23
DEPARTAMENTO O&M	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

2. DATOS DEL EQUIPO INSPECCIONADO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:	TORRES - PLATAFOMA -PEDESTAL DE CUBIERTA					ACABADO SUPERFICIAL:	SSPC-SP3
MATERIAL	ASTM A 36 - ASTM A 572	ESPESOR	8, mm	DIÁMETRO	NA	CANTIDAD INSPECCIONADA	4 PLATAFORMAS DE RIGIDEZ
PLANO / REFERENCIAS:							

5. RESULTADO DE LA INSPECCION.

COMPONENTE/ ÁREA INSPECCIONADA				INDICACIÓN 1			INDICACIÓN 2			EVALUACIO	OBSERVACIONES
ITEM	ZONA INSP. / DISTANCIA AL	IDENTIFICACION	ESTAMPE	INICIO	LONG	TIPO	INICIO	LONG	TIPO		
4	PEDESTAL B2	SPOT 1	N.R	-	-	-	-	-	-	REPARAR	SE EVIDENCIA SOVAVADO, FUERA DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACION, SE RECOMIENDA REPARAR
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES : Se realizó la inspección de TORRES - PLATAFOMA -PEDESTAL DE CUBIERTA

INSPECTOR	REVISADO POR		APROBO
NOMBRE: FERNANDO SILVA	NOMBRE: ELIANA ANDRE CEBALLOS	NOMBRE: WILMER ORDOÑEZ	NOMBRE ELIANA ANDREA CEBALLOS
CERTIFICADO NIVEL II N° :	CARGO REPRESENTANTE LEGAL	CARGO ING CIVIL. ESP. SOLDADURA	CARGO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA: 6 de febrero de 2024	FECHA:6 de febrero de 2024	FECHA:6 de febrero de 2024	FECHA:6 de febrero de 2024

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
QCien Ingeniería y Soluciones SAS	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	6/02/2024	Reporte N°	R-004-PT-SERV-23
DEPARTAMENTO O&M	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO


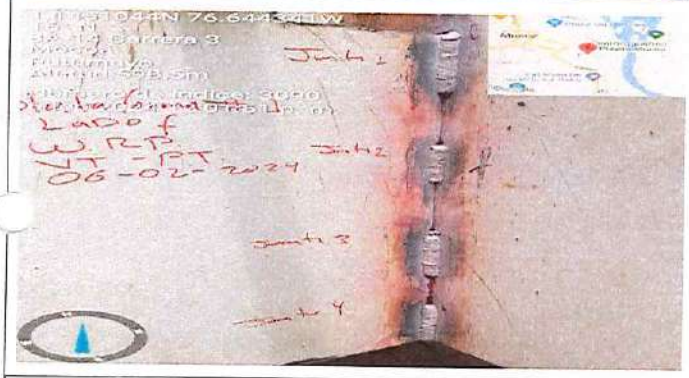


Foto 01 PLATAFORMA #1



Foto 02 APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #

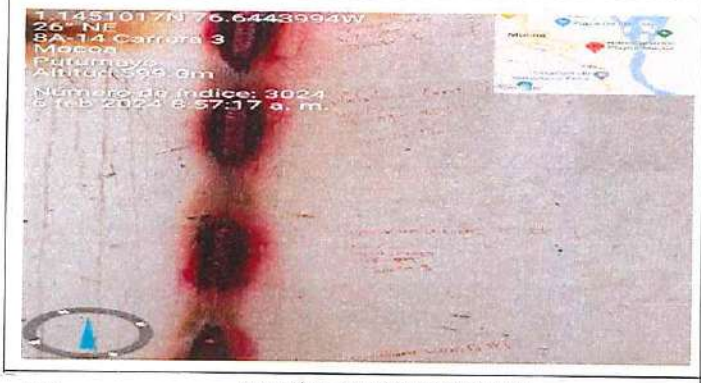

to 03 APLICACIÓN DE PENETRANTE PLATAFORMA #1

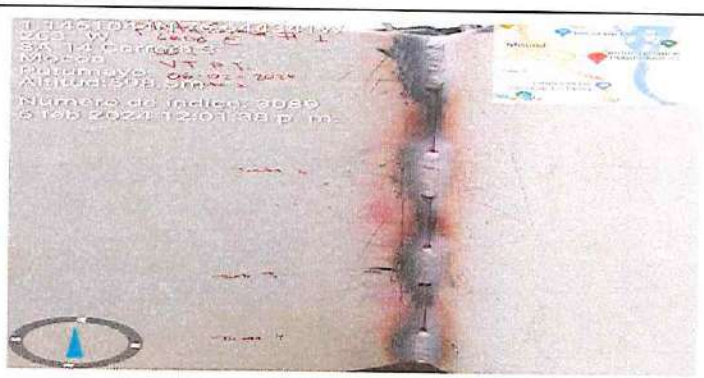


Foto 04 APLICACIÓN DE REVELADOR PLATAFORMA #3



Foto 05 SOLDADURAS CONFORMES PLATAFORMA #1



Foto 06 APLICACIÓN DE PENETRANTE LADO F PLATAFORMA #1

NOMBRE: FERNANDO SILVA CERTIFICADO NIVEL II N° : FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE:ELIANA ANDREA CEBALLOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA:6 de febrero de 2024	NOMBRE: WILMER ORDOÑEZ CARGO: ING CIVIL. ESP. SOLDADURA FIRMA FECHA:6 de febrero de 2024	NOMBRE: ELIANA ANDREA CEBALLOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA:6 de febrero de 2024

	FORMATO	Aprobacion:01/11/23QCIEN-F-030 Version:03
	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	

1. DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	6/02/2024	Reporte N°	R-004-PT-SERV-23
DEPARTAMENTO O&M	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 07 SOLDADURAS CONFORME TORRE ACI #6



Foto 08 SOLDADURAS CONFORME TORRE ACI #6



Foto 09 SOLDADURAS CONFORME TORRE ACI #6



Foto 10 APLICACIÓN DE PENETRANTE TORRE ACI #6



Foto 11 APLICACIÓN DE PENETRANTE TORRE ACI #6

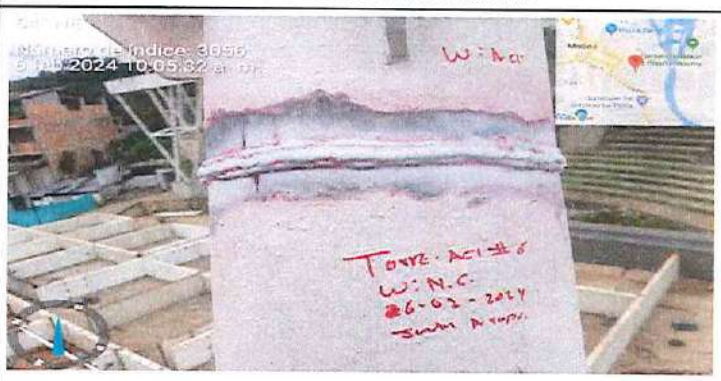


Foto 12 SOLDADURAS CONFORME TORRE ACI #6

NOMBRE: FERNANDO SILVA CERTIFICADO NIVEL II N° : FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE: ELIANA ANDREA CEBALLOS CARGO REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE:WILMER ORDOÑEZ CARGO: ING. CIVIL ESP. SOLDADURA FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE ELIANA ANDRES CEBALLOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024

	FORMATO	
QCIEN ingeniería y ensayos sas	REPORTE DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES	Aprobacion:01/11/23 QCIEN-F-030 Version:03

1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	SERVICON CS SAS	CONTRATO N°	786	OT	NA	Fecha actividad	6/02/2024	Reporte N°	R-004-PT-SERV-23
DEPARTAMENTO O&M	SUR	SISTEMA	POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN			SUBSISTEMA O LÍNEA	NA		
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA			PK DEL SISTEMA	NA	DISTANCIA REGISTRO	NA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 13 APLICACIÓN DE PENETRANTE TORRE #2



Foto 14 APLICACIÓN DE REVELADOR TORRE #2



Foto15 APLICACIÓN DE REVELADOR TORRE #2



Foto 16 SOLDADURA CONFORMES TORRE #2



Foto 17 APLICACION PENETRANTE PEDESTAL B2

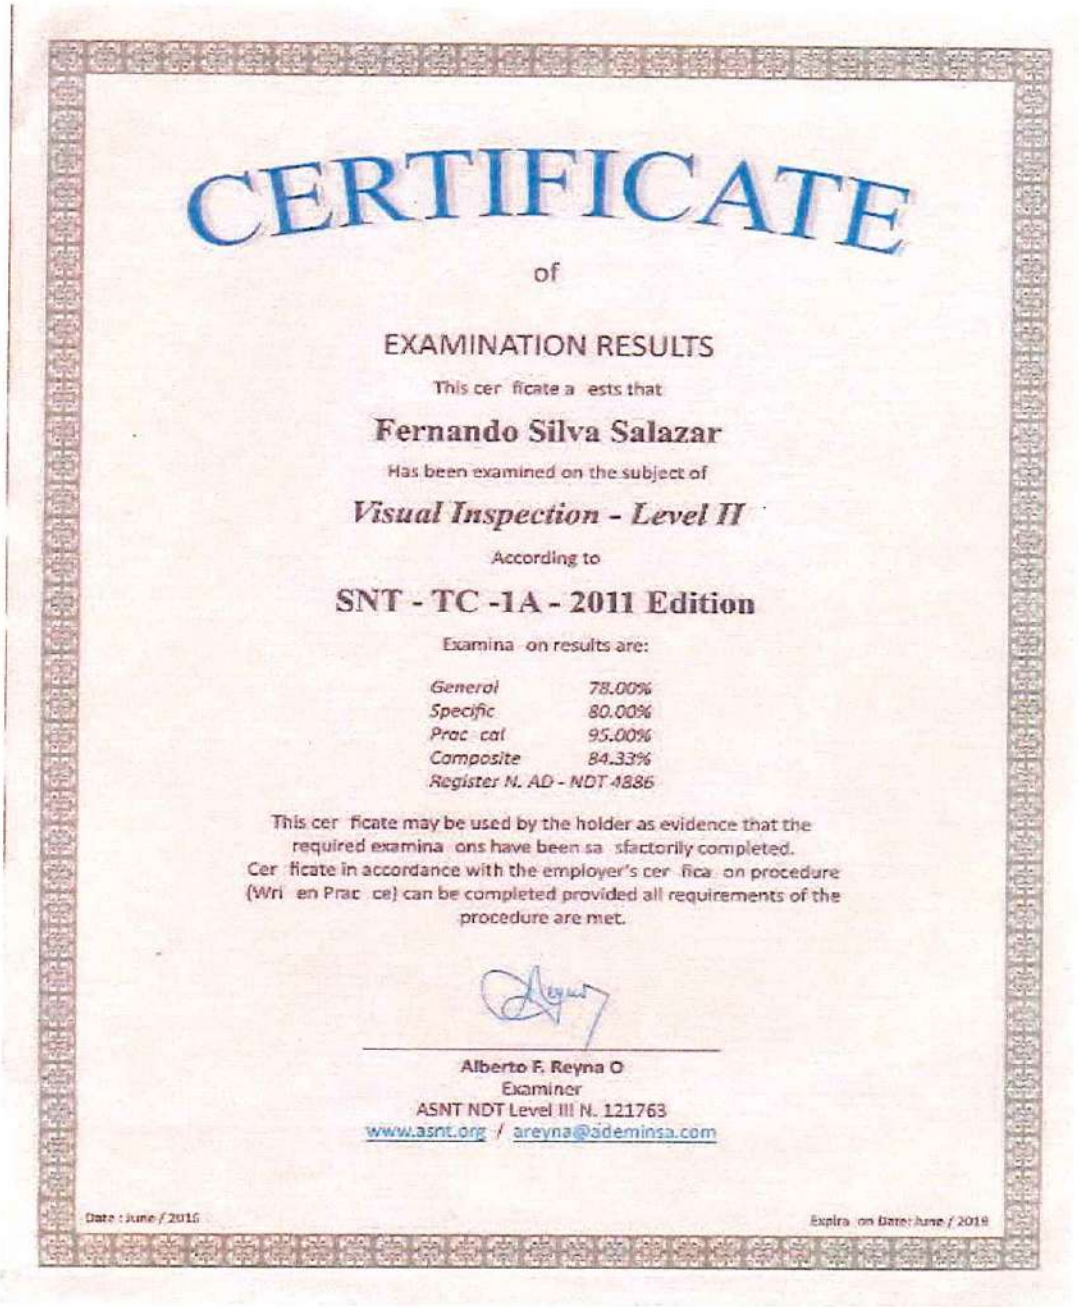


Foto 18 APLICACION REVELADOR PEDESTAL B2

FERNANDO SILVA CERTIFICADO NIVEL II N° : FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE:ELIANA ANDREA CEBALLOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE: WILMER ORDOÑEZ CARGO: ING CIVIL. ESP. SOLDADURA FIRMA FECHA: 6 de febrero de 2024	NOMBRE: ELIANA ANDREA CEBALLOS CARGO:REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA:6 de febrero de 2024

DOCUMENTOS DEL INSPECTOR DE SOLDADURA

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO



CERTIFICATE

of

EXAMINATION RESULTS

This cer ficate a ests that

Fernando Silva Salazar

Has been examined on the subject of

Visual Inspection - Level II

According to

SNT - TC -1A - 2011 Edition

Examina on results are:

General	*78.00%*
Specific	*80.00%*
Prac cal	*95.00%*
Composite	*84.33%*
Register N. AD - NDT 4886	

This cer ficate may be used by the holder as evidence that the required examina ons have been sa sfactorily completed. Cer ficate in accordance with the employer's cer fica on procedure (Wri en Prac ce) can be completed provided all requirements of the procedure are met.

Alberto F. Reyna O
Examiner
ASNT NDT Level III N. 121763
www.asnt.org / areyna@ademinsa.com

Date : June / 2018

Expira on Date: June / 2018

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS

CERTIFICACION PERSONAL E.N.D.

N° CERTIFICADO: VT-FSS-19-1388

FERNANDO SILVA SALAZAR

C.C. 1.075.218.255

BACHILLER CON CONOCIMIENTOS EN SOLDADURA

MÉTODO: INSPECCIÓN VISUAL	ALCANCE: DIRECTA Y REMOTA	NIVEL: II

EXPERIENCIA TOTAL EN EL METODO CALIFICADO:	1000	
EXPERIENCIA TOTAL EN ENSAYOS NO DETRUCTIVOS	5000	
ENTRENAMIENTO COMPLETO SEGÚN:	SNT-TC-1A:2016 / INSP-PR-002	
ENTRENAMIENTO TOTAL EN EL MÉTODO:	16 Horas	
RESULTADO PARCIAL EXAMEN GENERAL DEL METODO:	34/40	85%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN ESPECIFIDO DEL METODO:	16/20	80%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN PRACTICO DEL METODO:	8.5/10	85%
RESULTADO PROMEDIO EXAMEN FINAL DE CALIFICACION:		83.33%
RESULTADO DE AGUDEZA VISUAL Y CONTRASTE DE COLORES:		APROBADO

FECHA DE LA CERTIFICACION: **12-07-2019**

GILBERTO QUINTERO MANTILLA ASNT NDT LEVEL III 212174

FECHA DE CADUCIDAD CERTIFICACION: **31-07-2022**

EMITIDO POR NIVEL III ASNT: GILBERTO QUINTERO M.
Issued by ASNT NDT LEVEL III CN: 212174

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS

FIRMADO POR G. COMERCIAL: CINDY PAOLA GARCIA DIAZ

Consultar validez de certificado en www.INSPECOLSERVICES.COM/Consultas

Agencia Externa de Calificación

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS certifica que la calificación se realizo de acuerdo a la práctica escrita de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS para calificación y certificación de personal No. INSP-PR-002, confeccionada de acuerdo a: SNT TC 1A Ed. 2.016. Esta calificación puede ser usada por el portador como evidencia que los exámenes han sido satisfactorios, la presente calificación puede ser homologada por empleadores, completando los requerimientos de su práctica escrita

No. CERTIFICADO:
VT-FSS-22-2554

ISC

Este certificado constata que:

FERNANDO SILVA SALAZAR
IDENTIFICACIÓN: 1.075.218.255

>CQR COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

CERTIFICADO No. SC-20200015218

Asistió al curso con Intensidad de 24 horas y cumplió con los requisitos de calificación y certificación de acuerdo a la práctica de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS SNT-TC-1A:2020 / CA-P-01 confeccionada de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-1A Ed. 2.020 de la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos (ASNT) en el método de:

INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II

EXPERIENCIA TOTAL EN EL METODO CALIFICADO	3.000 Horas	
EXPERIENCIA TOTAL EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	Más de 8.000 Horas	
RESULTADO PARCIAL EXAMEN GENERAL DEL METODO	34/40	85%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN ESPECÍFICO DEL MÉTODO	16/20	80%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN PRÁCTICO DEL METODO	8.5/10	85%
RESULTADO PROMEDIO EXAMEN FINAL DE CALIFICACIÓN		**83.33%**

EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL Y CONTRASTE DE COLOR: APROBADO

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19-07-2022 **FECHA DE CADUCIDAD CERTIFICACIÓN: 31-07-2027**

ASNT

EMITIDO POR NIVEL III ASNT:
Issued by ASNT NDT LEVEL III ON

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
ASNT NDT LEVEL III 212174

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
212174

ISC

FIRMADO POR GERENTE:

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS certifica que la calificación se realizó de acuerdo a la práctica escrita de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS para calificación y certificación de personal No. CA-P-01, confeccionada de acuerdo a: SNT TC 1A Ed. 2.020. Esta calificación puede ser usada por el portador como evidencia que los exámenes han sido satisfactorios, la presente calificación puede ser homologada por empleadores, cumpliendo los requerimientos de su práctica escrita. El aspirante demuestra evidencias de trabajo NDT.

Consultar validez de certificado en www.INSPECOLSERVICES.COM/Consultas

Agencia Externa de Calificación

Version 1 CA-F-04 31/03/2020



CERTIFICADO DE RESULTADOS

Este Certificado Corresponde Que:

FERNANDO

SILVA SALAZAR

C.C. 1.075.218.255

Cumplió con los requisitos para la calificación de personal de ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, basado en la práctica recomendada SNT-TC-1A Ed 2016 emitida por ASNT en el método de:

LÍQUIDOS PENETRANTES

NIVEL II

Resultados en sus exámenes:

Examen general: 80% Examen Específico: 90% Examen Práctico: 95%

Promedio ponderado: 91,66%

Horas de Experiencia: 2880 Horas

Examen de Agudeza Visual: Aprobado, Control a 1 año

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
ASNT NDT Level III 212174

CINDY PAOLA GARCIA DIAZ
GERENTE COMERCIAL

ING. GILBERTO QUINTERO MANTILLA
ASN NDT Level III CN: 212174

Certificación de calificación No PT-IPSS-18-743

Fecha de Emisión 24/05/2018, Fecha de Expiración 31/05/2021

Consultar validez de certificado en www.INSPECOLSERVICES.COM/Consultas

Agencia Externa de Calificación

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS Certifica que el entrenamiento y calificación en relación anuncio...
...de SNT-TC-1A (edición 2016)

N° CERTIFICADO:
PT-FSS-21-2208

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

FERNANDO SILVA SALAZAR
1.075.218.255

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS

MÉTODO: LÍQUIDOS PENETRANTES	ALCANCE: VISIBLES	NIVEL: II	
EXPERIENCIA TOTAL EN EL MÉTODO CALIFICADO:	600 HORAS		
EXPERIENCIA TOTAL EN ENSAYOS NO DETRUCTIVOS	Mayor a 3000 HORAS		
ENTRENAMIENTO COMPLETO SEGÚN:	SNT-TC-1A:2020 / CA-P-01		
ENTRENAMIENTO TOTAL EN EL MÉTODO:	24 Horas		
RESULTADO PARCIAL EXAMEN GENERAL DEL MÉTODO:		32/40	80%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN ESPECIFICO DEL MÉTODO:		16/20	80%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN PRACTICO DEL MÉTODO:		8.5/10	85%
RESULTADO PROMEDIO EXAMEN FINAL DE CALIFICACIÓN:			81,66 %
RESULTADO DE AGUDEZA VISUAL Y CONTRASTE DE COLORES:		APROBADO (Seguir las recomendaciones del optómetra)	

FECHA DE LA CERTIFICACION: **04-06-2021** FECHA DE CADUCIDAD CERTIFICACION: **30-06-2026**

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
ASNT NDT LEVEL III 212174

EMITIDO POR NIVEL III ASNT: GILBERTO QUINTERO M.
Issued by ASNT NDT LEVEL III CN: 212174

FIRMADO POR LA GERENTE: CINDY PAOLA GARCIA DIAZ

Consultar validez de certificado en www.INSPECOLSERVICES.COM/Consultas
Agencia Externa de Calificación

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS certifica que la calificación se realizó de acuerdo a la práctica escrita de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS para calificación y certificación de personal No. CA-P-01, confeccionada de acuerdo a SNT-TC-1A del 2020. Esta calificación cuenta con soporte en el portafolio como evidencia que los exámenes han sido satisfactorios, la presente certificación puede ser revocada por incumplimiento, suspensión de certificados de evidencia escrita. El aspirante demuestra evidencias de trabajo NDT

Versión 1

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FERNANDO SILVA SALAZAR

Con Cedula de Ciudadania No. 1.075.218.255

Cursó y aprobó la acción de Formación

SIMBOLOGIA E INTERPRETACION GRAFICA DE PLANOS DE SOLDADURA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Orito, a los veintiun (21) dias del mes de septiembre de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
MILTON HERNANDO PEREZ ORDOÑEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

MILTON HERNANDO PEREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
REGIONAL PUTUMAYO

30226148 - 21/09/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo el numero 9518001033709CC1075218255C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FERNANDO SILVA SALAZAR

Con Cedula de Ciudadanía No. 1.075.218.255

Cursó y aprobó la acción de Formación

CODIGOS Y NORMAS DE SOLDADURA

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cartagena, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014)

Firmado Digitalmente por
BIBIANA CECILIA PINTO TOVAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

BIBIANA CECILIA PINTO TOVAR
SUBDIRECTOR
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO
REGIONAL BOLÍVAR

19405188 - 05/05/2014
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 910400714718CC1075218255C

VER ANEXO 18. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 01

4 JULIO - 03 AGOSTO

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	8	2023

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 01

CONTRATO OBRA No: 765 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-05	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	5-jul-23	SOLICITUD ENTREGABLES AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2	OF-INT-726-06	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	5-jul-23	CONSIDERACIONES PARA LA DETONACION DE ROCAS EN OBRA
3	OF-INT-726-07	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	7-jul-23	SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA
4	OF-INT-726-09	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	7-jul-23	SOLICITUD DE ESPECIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, INCLUYENDO OBRA E INTERVENTORIA
5	-	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	8-jul-23	RECORDATORIO PRIMERA ENTREGA DEL INFORME SEMANAL
6	OF-INT-726-11	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	10-jul-23	SOLICITUD ENTREGABLES AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR SEGUNDA VEZ
7	OF-INT-726-13	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA	13-jul-23	SOLICITUD ENTREGABLES COMPONENTE SST POR TERCERA VEZ
8	OF-INT-726-14	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	18-jul-23	SOLICITUD DE PLANOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
9	OF-INT-726-16	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	21-jul-23	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PMT
10	OF-INT-726-17 . 18, 22, 23, 24	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	24-jul-23	OFICIOS REMITIDOS N. 17-18-22-23-24
11	OF-INT-726-19 -21	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	25-jul-23	REPORTE VISITA EN OBRA Y ENTREGA INFORME AVANCE DE OBRA
12	OF-INT-726-19 -21	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	25-jul-23	REPORTE VISITA EN OBRA Y ENTREGA INFORME AVANCE DE OBRA RADICADOS
13	OF-INT-726-26	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26-jul-23	SOLICITUD INFORME DE PROFESIONALES
14	OF-INT-726-27	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28-jul-23	SOLICITUD POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON ACTA DE INICIO DE OBRA
15	OF-INT-726-31	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2-ago-23	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS DE MANERA "URGENTE".

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	CON.AM.020.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	6-jul-23	Respuesta a oficio OF-INT-786-07 – SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA
2	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10-jul-23	INFORME SEMANAL SST
3	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-jul-23	IMPLANTACIÓN PROYECTO Y NOVEDADES ENCONTRADAS EN OBRA
4	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12-jul-23	IMPLANTACIÓN PROYECTO Y NOVEDADES ENCONTRADAS EN OBRA
5	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14-jul-23	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 3000 PSI
6	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14-jul-23	AFILIACIÓN PERSONAL DE OBRA
7	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14-jul-23	RESPUESTA OFICIO 726-13
8	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15-jul-23	Re: Solicitud - Planos firmados de los estudios y diseños
9	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17-jul-23	INFORME SEMANAL SST 2
10	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	24-jul-23	INFORME SEMANAL SST 3
11	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	25-jul-23	SG - SST
12	-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	25-jul-23	CONFORMACION DE VEEDURIA PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN MOCOA
13	OBRA 003	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28-jul-23	respuesta oficio OF-INT-726-27 – Solicitud Pólizas Actualizadas
14	OBRA 004	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28-jul-23	Respuesta oficio OF-INT-726-22 – Solicitud Entrega de Actas de Vecindad
15	OBRA 006	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	29-jul-23	respuesta oficio OF-INT-786-26 – Solicitud de Informe de Profesionales
16	OBRA 007	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	29-jul-23	respuesta oficio OF-INT-786-18 – Solicitud de Avance y Cronograma de llegada de estructura de cubierta y apoyo a obra.
17	-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	31-jul-23	22. GP-SID-EXT-0960 DEVOLUCION DE POLIZAS Contrato de obra No. 769 de 24/04/202
18	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	1-ago-23	INFORME SEMANAL SST 4
19	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3-ago-23	INFORME SEMANAL SST 5

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 02

4 AGOSTO - 03 SEPTIEMBRE

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSION	1		
	FECHA	3	9	2023

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 02
CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-786-33	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	5-ago-23	Solicitud de respuesta a oficios de manera URGENTE
2	OF-INT-786-34	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	5-ago-23	Solicitud de respuesta a oficios de manera URGENTE
3	OF-INT-786-35	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5-ago-23	Solicitud de respuesta a oficios de manera URGENTE
4	OF-INT-786-36	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8-ago-23	CORRECIONES INFORME MENSUAL DE OBRA N 1.
5	OF-INT-786-39	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10-ago-23	SOLICITUD DE ENVIO INFORME MENSUAL MES 01 DE CARACTER URGENTE
6	OF-INT-786-37	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-ago-23	OFICIOS REMITIDOS
7	OF-INT-786-38	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-ago-23	OFICIOS REMITIDOS
8	OF-INT-786-40	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	11-ago-23	RESPUESTA A OFICIO OBRA-006, RESPUESTA DE ESPECIALISTAS
9	OF-INT-786-41	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-ago-23	RECOMENDACIONES DE PROTECCION DE ACERO EN OBRA
10	OF-INT-786-42	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-ago-23	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN OBRA
11	OF-INT-786-43	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	12-ago-23	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA 01 - CONTRATO DE OBRA 763 DE 2023
12	OF-INT-786-44	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15-ago-23	CORRECCIONES INFORME MENSUAL 01
13	OF-INT-786-45	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15-ago-23	SOLICITUD FUNDICIÓN DE PEDESTALES
14	OF-INT-786-46	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17-ago-23	SOLICITUD DE AUTORIZACIONES PARA PROCEDIMIENTO DE DETONACIÓN DE ROCAS
15		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	18-ago-23	Correcciones informe mensual 1- cubierta san Agustin
16	OF-INT-786-47	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22-ago-23	SOLICITUD DE PROPUESTA PARA ENTIBACIÓN DE PEDESTAL B6.
17	OF-INT-786-48	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28-ago-23	INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA
18	OF-INT-786-49	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	31-ago-23	RECORDATORIO ENVIO DE INFORME MENSUAL No. 2

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	GP-SID-EXT-1149	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	4-ago-23	REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CTO DE OBRA 763-2023
2	CON.AM.021.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	4-ago-23	CON.AM.021.2023 (RESPUESTA GP-SID-EXT-1149)
3		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	4-ago-23	INFORME MENSUAL JULIO
4	CON.AM.022.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8-ago-23	CON.AM.021.2023 (RESPUESTA GP-SID-EXT-1149)
5	Obra - 009	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-ago-23	respuesta oficio OF-INT-786-39 y OF-INT-786-39 – SOLICITUD DE ENVIO INFORME MENSUAL MES 01
6	Obra-013	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18-ago-23	Procedimiento Constructivo de Pedestales
7		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22-ago-23	Certificados ARL ingreso Cuadrilla #2
8		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22-ago-23	Informe Semanal SST
9		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23-ago-23	Soporte radica Secretaria de transito PMT
10	CON.AM.023.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23-ago-23	CON-AM-023-2023 (Solicitud de legalización subcontratista)
11		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23-ago-23	Certificado ARL ingreso Ayudante de obra Pendiente
12	Obra-014	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	25-ago-23	Entregables Formatos SG_SST - Obra-014
13		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	30-ago-23	Informe semanal area SST del 21 al 27 de Agosto

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 03

4 SEPTIEMBRE - 03 OCTUBRE

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	10	2023

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 03
CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-786-50	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN ING. LEANDRO ORTEGA	5-sep-23	AVISO ESTADO ACTUAL DE PEDESTALES E4, D5 Y F3.
2	OF-INT-786-51	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	5-sep-23	SOLICITUD DE ENVÍO INFORME MENSUAL 02.
3	OF-INT-786-52	CONSORCIO ALIAZNA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	6-sep-23	NOTIFICACIÓN N° 2 DE INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.
4	OF-INT-786-53	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8-sep-23	AJUSTE IBC EQUIPO MINIMO
5	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8-sep-23	VERIFICACIÓN DE IBC EN LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
6	OF-INT-786-54	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-sep-23	"URGENTE" SOLICITUD REALIZAR MEJORAMIENTO EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE OBRA.
7	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14-sep-23	Rwd: Entregables Formatos SG_SST - Obra-014
8	OF-INT-786-56	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	14-sep-23	URGENTE SOLICITUD PRESENCIA PROFESIONAL SST DE MANERA INMEDIATA.
9	OF-INT-786-58	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14-sep-23	SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE AVANCE Y LLEGADA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA A OBRA.
10	OF-INT-786-60	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	16-sep-23	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
11	OF-INT-786-61	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	16-sep-23	CARACTER URGENTE - SOLICITUD DEL SG-SST Y PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST EN OBRA.
12	OF-INT-786-62	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	18-sep-23	Requerimiento para el cumplimiento con las obligaciones contractuales.
13	OF-INT-786-63	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18-sep-23	REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU).
14	OF-INT-786-59	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18-sep-23	ENVIÓ CONFORMACIÓN VEEDURÍA
15	OF-INT-786-64	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	20-sep-23	INSPECCION GENERAL AL LA GESTION DOCUMENTAL DEL COMPONENTE SST.
16	OF-INT-786-65	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	22-sep-23	RESPUESTA OFICIO 017- PRESENTACIÓN DEL SG SST
17	OF-INT-786-66	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	22-sep-23	INMEDIATO REPARACIÓN DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.
18	OF-INT-786-67	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	22-sep-23	RESPUESTA A OFICIO OBRA- 019
19	OF-INT-786-68	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	25-sep-23	RECORDATORIO DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL N°3.

20	OF-INT-786-69	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	25-sep-23	SOLICITUD N°2. REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU).
21	OF-INT-786-70	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	26-sep-23	SOPORTE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA SAN AGUSTÍN
	OF-INT-786-71	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	28-sep-23	SOLICITUD PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA.
	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2-oct-23	Fwd: Desistimiento de Revisión de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
	OF-INT-786-72	CONSORCIO ALIANZA MOCOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	2-oct-23	APROBACION EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5-sep-23	Entrega Informe semanal área sst
2	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5-sep-23	Informe Mensual Agosto SST
3	Obra-015	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7-sep-23	Respuesta Oficio OF-INT-786-49 y OF-INT-786-51 SOLICITUD DE ENVIO INFORME MENSUAL MES 02
4	-	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7-sep-23	Mensual Agosto área SST
5	Obra-016	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7-sep-23	Planos de Taller de Pedestales, Columnas, Plataforma Cubierta
6		CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11-sep-23	Informe Mensual No.2 Corregido
7	GP-SID- EXT- 1178	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	14-sep-23	Citación a comité técnico No.2 Contrato de obra No. 763 de 24/04/2023
8	Obra-017	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19-sep-23	Entrega sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Version.0
9	Obra-018	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19-sep-23	Respuesta oficios OF-INT-726 - 56, 61, 62
10	Obra-019	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20-sep-23	Respuesta Oficio OF-INT-786-60 Solicitud Plan de Contingencia
11	Obra-021	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23-sep-23	Solicitud Comité Técnico de Obra
12	Obra-022	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	25-sep-23	Respuesta Oficio OF-INT-786-65, Entrega sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Version.1
13	CON.AM.024.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26-sep-23	Respuesta OF-INT-786-53
14	CON.AM.025.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26-sep-23	Respuesta OF-INT-786-67
15	CON.AM.026.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26-sep-23	Respuesta - OF-INT-726-62
16	CON.AM.027.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28-sep-23	Respuesta – Entrega HV Ingeniero Electrico
17	CON.AM.027.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	29-sep-23	CON.AM.027.2023
18	Obra-023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2-oct-23	Desistimiento de Revisión de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
19	Obra-024	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3-oct-23	Respuesta Oficio OF-INT-786-69 Requerimiento de Análisis de Precios Unitarios

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 04

04 OCTUBRE - 03 NOVIEMBRE

SERVICON CS S.A.S. Juntos Trabajando	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	11	2023

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 04
CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-73	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/10/2023	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE MANERA URGENTE
2	OF-INT-726-74	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	9/10/2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS
3	OF-INT-726-75	GOBERNACIÓN	10/10/2023	ACLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDAD
4	OF-INT-726-76	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/10/2023	INFORME MENSUAL N° 3
5	OF-INT-726-77	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	24/10/2023	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
6	OF-INT-726-78	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/10/2023	SOLICITUD ENVIO DE APU MURO DE CERRAMIENTO
7	OF-INT-726-79	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/10/2023	SOLICITUD DE MEJORA DE PLAN DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA.
8	OF-INT-726-80	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	1/11/2023	SOLICITUD PLAN DE CHOQUE Y RECORDATORIO COMPROMISOS

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	Obra-024	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/10/2023	Respuesta Oficio OF-INT-786-69 Requerimiento de Analisis de Precios Unitarios
2	GP SID 1245	GOBERNACIÓN	4/10/2023	GP SID 1245 - Solicitud de informe de cronograma detallado de estructura metálica
3	Obra-025	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7/10/2023	Respuesta Oficio OF-INT-786-73 SOLICITUD DE INFORME MENSUAL 03 - URGENTE
4	Obra-026	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	9/10/2023	Documentos de Afiliacion a Seguridad Social Cuadrilla Estructura Metalica
5	Obra-027	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/10/2023	Respuesta Oficio OF-INT-786-75 y OF-INT-786-74
6	Obra-028	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/10/2023	Respuesta Oficio GP-SID-EXT-1245 – Solicitud de informe de cronograma detallado de estructura metálica
7	Obra-029	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/10/2023	Procedimiento de Trabajo Seguro de Izaje
8	Obra-030	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/10/2023	Procedimiento de Trabajo En Caliente
9	GE-FO-16	GOBERNACIÓN	23/10/2023	Notificacion de factibilidad
10	_	GOBERNACIÓN	27/10/2023	Citacion reunion virtual revision y estado actual del proyecto
11	Obra-031	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	30/10/2023	Planos de Taller de Correas y Templetes
12	_	GOBERNACIÓN	31/10/2023	Mesa de trabajo cubierta San Agustin
13	_	GOBERNACIÓN	1/11/2023	ACTA DEL COMITE N.04

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 05

04 NOVIEMBRE - 03 DICIEMBRE

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	12	2023

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 05
CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-81	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7/11/2023	NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO
2	OF-INT-726-82	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7/11/2023	INCUMPLIMIENTO PRESENTACION DE INFORME MENSUAL 03
3	OF-INT-726-83	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7/11/2023	ENTREGA INMEDIATA DEL SG-SST
4	OF-INT-726-84	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8/11/2023	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITE DE OBRA N°4.
5	OF-INT-726-85	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/11/2023	TERCERA SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4. URGENTE.
6	OF-INT-726-86	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14/11/2023	CORRECCIONES DISEÑO HIDRÁULICO AGUAS LLUVIAS - DISEÑO ESTRUCTURAL CERRAMIENTO
7	OF-INT-726-87	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14/11/2023	SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
8	OF-INT-726-88	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/11/2023	CORRECCIONES INFORME MENSUAL N°4.
9	OF-INT-726-89	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17/11/2023	RESPUESTA OFICIO OBRA - 034 PLAN DE CONTINGENCIA ESTRUCTURA METÁLICA.
10	OF-INT-726-90	GOBERNACION	18/11/2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL N°4.
11	OF-INT-726-91	GOBERNACION	19/11/2023	RESPUESTA OFICIO GP-SID-EXT- 1410 COMUNICACIÓN - PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
12	OF-INT-726-92	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23/11/2023	ACEPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL PLAN DE CONTINGENCIA
13	OF-INT-726-93	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23/11/2023	RESPUESTA OFICIO OBRA-036 SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIFICACION DE TEJA PARA LA CUBIERTA
14	OF-INT-726-94	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23/11/2023	SEGUIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA
15	OF-INT-726-95	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	29/11/2023	RECORDATORIO ENTREGA DE INFORME MENSUAL N°5

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	GP SID EXT 1390	GOBERNACION	9/11/2023	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
2	Obra-032	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/11/2023	DISEÑO HIDRAULICO DE AGUAS LLUVIAS - DISEÑO DE CERRAMIENTO ESTRUCTURAL
3	Obra-033	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14/11/2023	INFORME MENSUAL MES 04
4	GP SID EXT 1410	GOBERNACION	16/11/2023	COMUNICACION - PRESUNTO INCUMPLIMIENTO — Art. 86 de la ley 1474 de 2011
5	Obra-035	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/11/2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL MES 04 CON CORRECCIONES
6	Obra-034	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17/11/2023	PLAN DE CONTIGENCIA ESTRUCTURA METALICA
7	Obra-036	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17/11/2023	SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIFICACION DE TEJA PARA LA CUBIERTA
8	Obra-037	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/11/2023	RESPUESTA OFICIO OF-INT-786-88 - PLAN DE CONTINGENCIA ESTRUCTURA METALICA
9	Obra-038	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28/11/2023	OFICIO RESPUESTA SST OF-INT-786-83
10	GPSID EXT 1480	GOBERNACION	1/12/2023	SOLICITUD DE INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SOLDADURA Y ACERO SEGÚN NORMATIVA

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 06

04 DICIEMBRE 2023 - 03 ENERO 2024

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	1	2024

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 06

CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-96	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/12/2023	URGENTE RESULTADOS INSATISATORIOS EN ENSAYOS DE TINTAS PENETRANTES SOLICITUD DE REPARACIONES
2	OF-INT-726-97	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/12/2023	INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO N° 763-2023
3	OF-INT-726-98	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/12/2023	INFORME CALIDAD DE MATERIALES
4	OF-INT-726-99	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/12/2023	SOLICITUD RESULTADOS DE ENSAYO DE SOLDADURA
5	OF-INT-726-100	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	6/12/2023	SOLICITUD POR TERCERA VEZ DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
6	OF-INT-726-101	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	6/12/2023	SOLCITUD INFORME DE CALIDAD Y CONTROL
7	OF-INT-726-102	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/12/2023	RECORDATORIO COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ N°5
8	OF-INT-726-103	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/12/2023	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ INFORME DE CALIDAD Y CONTROL
9	OF-INT-726-104	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/12/2023	SOLICITUD ANEXOS DEL BALANCE
10	OF-INT-726-105	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/12/2023	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ INFORME MENSUAL N° 5
11	OF-INT-726-106	GOBERNACION	15/12/2023	REMISIÓN PARA REVISION DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS.
12	OF-INT-726-107	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/12/2023	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITE N°5
13	OF-INT-726-108	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/12/2023	OF-INT-786-108 SOLICITUD POR TERCERA VEZ INFORME DE CALIDAD Y CONTROL
14	OF-INT-726-109	GOBERNACION	26/12/2023	INFORME ESTRUCTURAL
15	OF-INT-726-110	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28/12/2023	RESPUESTA OFICIO OBRA 039 – CERTIFICADOS DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA
16	OF-INT-726-111	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28/12/2023	RESPUESTA OFICIO OBRA-045 (INFORME DE CALIDAD)
17	OF-INT-726-112	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/01/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA-044 INFORME ESTRUCTURAL
18	OF-INT-726-113	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/01/2024	OF-INT-786-113 RESPUESTA OFICIO OBRA-046 SOLICITUD COMITÉ TECNICO

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	GP SID EXT 1488	GOBERNACIÓN	5/12/2023	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
2	GP SID EXT 1489	GOBERNACIÓN	5/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA
3	GP SID EXT 1490	GOBERNACIÓN	5/12/2023	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SOLDADURA Y ACERO SEGÚN NORMATIVIDAD
4	GP SID EXT 1410	GOBERNACIÓN	8/12/2023	COMUNICACIÓN - PRESUNTO INCUMPLIMIENTO — Art. 86 de la ley 1474 de 2011
5	–	GOBERNACIÓN	11/12/2023	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL CTO 763-2023 DE FECHA 05-12-2023
6	Obra-039	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/12/2023	ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIDAD ESTRUCTURA
7	Obra-040	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/12/2023	BALANCE DE OBRA
8	Obra-041	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/12/2023	PLANOS DE TALLER RIGIDIZADORES, DETALLES PERSIANAS, CORREAS, PASADORES
9	GPSID EXT 1576	GOBERNACION	20/12/2023	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SEGÚN COMITÉ TÉCNICO N. 5
10	GPSID EXT 1588	GOBERNACION	20/12/2023	RESPUESTA A OFICIO OF-INT-786-106
11	Obra-043	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/12/2023	RESPUESTA A OFICIO OF-INT-786-97 INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO N. 763-2023
12	Obra-044	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/12/2023	RESPUESTA A OFICIO OF-INT-786-107 COMPROMISOS COMITÉ 5-INFORME ESTRUCTURAL
13	Obra-045	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/12/2023	RESPUESTA A OFICIO OF-INT-786-107 Y 108
14	Obra-046	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23/12/2023	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO DE OBRA
15	Obra-047	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	23/12/2023	PLANOS DE TALLER CANAL AGUAS LLUVIAS
16	Obra-048	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/01/2024	SOLICITUD DE INFORMACION OFICIOS N. -OBRA-043, 044, 045

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 07

04 ENERO - 03 FEBRERO

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CODIGO		
	VERSION	1	
	FECHA	3	2	2024

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 07

CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-114	GOBERNACION	9/01/2024	SOLICITUD COMITÉ TECNICO
2	OF-INT-726-115	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/01/2024	CONCEPTO ESTRUCTURTAL
3	OF-INT-726-116	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/01/2024	REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
4	OF-INT-726-117	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/01/2024	SOLICITUD DOCUMENTAL DEL COMPONENTE SST
5	OF-INT-726-118	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/01/2024	INFORME ESTRUCTURAL - ANALISIS MONTAJE ESTRUCTURA POR EXCENTRICIDAD EN EL APOYO ENTRE COLUMNA CAJON.
6	OF-INT-726-119	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/01/2024	CONSIDERACIONES POSTERIORES A VISITA DE OBRA
7	OF-INT-726-120	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/01/2024	REPORTE INSPECCION DE SOLDADURA
8	OF-INT-726-121	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19/01/2024	RESPUESTA A OFICIO 0-45 y 0-51 ENSAYOS DE TINTAS PENETRANTES
9	OF-INT-726-122	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/01/2024	SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ DE PLANOS DETALLE DE UNIONES Y CRONOGRAMA
10	OF-INT-726-123	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/01/2024	SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS URBANISMO Y TARIMA
11	OF-INT-726-124	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	30/01/2024	SOLICITUD DE INICIO INMEDIATO DE LA INSTALACIÓN DE PIES DE AMIGOS Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE
12	OF-INT-726-125	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	1/02/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA 059
13	OF-INT-726-126	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/02/2024	RESPUESTA A OFICIO DE OBRA-061 CORRECCION DE PLANOS ARQUITECTONICOS URBANISMO, TARIMA Y RENDERS
14	OF-INT-726-127	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/02/2024	SEGUNDA SOLITUD DE DOCUMENTACION DE PROFESIONAL DE SOLDADURA
15	OF-INT-726-128	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/02/2024	SOLICITUD DE CORRECCIONES EN OBRA Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PENDIENTE
16	OF-INT-726-129	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/02/2024	RESPUESTA DE OFICIO OBRA-060 BALANCE DE OBRA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	-	GOBERNACIÓN	4/01/2024	RESPUESTA A OFICIO OF-INT-786-109
2	Obra-049	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/01/2024	SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO
3	Obra-050	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/01/2024	ALCANCE OFICIO OBRA 044-INFORME ESTRUCTURAL
4	Obra-051	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/01/2024	SEGUNDO INFORME ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES
5	Obra-052	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/01/2024	INICIO DE ACTIVIDADES DE IZAJE PLATAFORMA
6	GP-SID-EXT 0024	GOBERNACION	18/01/2024	ACLARATORIO OFICIO OF-INT-786-115 E INFORME DE VISITA TECNICA DEL PROYECTO
7	Obra-054	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/01/2024	BALANCE DE OBRA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
8	Obra-055	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	18/01/2024	PLANOS ARQUITECTONICOS URBANISMO Y TARIMA
9	Obra-057	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	24/01/2024	BALANCE DE OBRA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA V.2
10	Obra-058	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/01/2024	SOLICITUD TRAMITE PRORROGA AL CONTRATO Y ESTADO ACTUAL INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
11	Obra-059	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/01/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-786-116 CON ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
12	GP-SID-EXT 0104	GOBERNACION	30/01/2024	GP SID EXT 0104 RESPUESTA OFICIO OF-INT-786-120
13	Obra-060	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	31/01/2024	BALANCE DE OBRA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
14	Obra-061	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	31/01/2024	RESPUESTA OFICIO OF-INT-786-123 CORRECCION DE PLANOS ARQUITECTONICOS
15	Obra-062	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/02/2024	SOLICITUD MESA TECNICA ARQUITECTONICO URBANISMO Y TARIMA

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 08

04 FEBRERO - 03 MARZO

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSION	1		
	FECHA	3	3	2024

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 08

CONTRATO OBRA No: 263 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-130	GOBERNACION	9/02/2024	INSPECCIÓN DE TINTAS PENETRANTES - REPORTE DE EVALUACION POR EL CONTRATISTA.
2	OF-INT-726-131	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	13/02/2024	INSPECCION SOLDADURA PARAFORMA 1 Y PEDESTALES A
3	OF-INT-726-132	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	13/02/2024	SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME SEMANAL Y ATENCION A REQUERIMIENTO.
4	OF-INT-726-133	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14/02/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA-066. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL 3% DE LA SOLDADURA Y ESPESOR DE LA LÁMINA DEL CAJÓN EN EL CONTRATO.
5	OF-INT-726-134	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/02/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA – 068 CONCEPTO ESTRUCUTRAL PIE DE AMIGO
6	OF-INT-726-135	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/02/2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO COMITE TECNICO #7
7	OF-INT-726-136	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	15/02/2024	SOLICITUD DOCUMENTOS PROFESIONALES
8	OF-INT-726-137	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19/02/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA – 070 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL 3% DE LA SOLDADURA Y ESPESOR DE LA LÁMINA DEL CAJÓN EN EL CONTRATO.
9	OF-INT-726-138	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19/02/2024	SOLICITUD ENVIÓ DE INFORME INSPECCIÓN DE SOLDADURA.
10	OF-INT-726-139	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	REPORTE INSPECCION TINTAS PENETRANTES N° 3
11	OF-INT-726-140	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	INFORMACION ESPESOR DE LAMINA DE CAJONES
12	OF-INT-726-141	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	21/02/2024	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 AREA SST.
13	OF-INT-726-142	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/02/2024	RESPUESTA INTERVENTORIA DE ADICION EN TIEMPO OBRA
14	OF-INT-726-143	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/02/2024	SOLICITUD DEL AREA SST.

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	GP SID EXT 0129	GOBERNACION	5/02/2024	DEVOLUCION AL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CTO 263-2023
2	GP SID EXT 0125	GOBERNACION	5/02/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA 002 MESA TECNICA ARQUITECNICA
3	Obra-063	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8/02/2024	RESPUESTA OFICIO OF-INT-726-121 Y 122 DOCUMENTACION ENSAYOS DE TINTAS PENETRANTES
4	Obra-064	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	9/02/2024	RESPUESTA OFICIO OF-INT-726 118, 122, 124 CONCEPTO ESTRUCTURAL PIE DE AMIGO
5	Obra-065	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	9/02/2024	OBRA-065 ACTA DE SODALIZACION PERGOLA Y ZONA VERDE
6	Obra-066	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/02/2024	SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL 3% DE LA SOLDADURA Y ESPESOR
7	Obra-067	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	10/02/2024	INFORME SST N.5 Y N.6
8	GP SID EXT 0184	GOBERNACION	13/02/2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO
9	Obra-069	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/02/2024	ENTREGA DE INFORMACIÓN AREA SST, SOLICITA EN VISITA DE INSPECCION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024
10	Obra-070	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/02/2024	RESPUESTA OFICIO OF-INT-726-133 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL 3% DE LA SOLDADURA Y ESPESOR DE LAMINA DEL CAJON EN EL CONTRATO
11	Obra-072	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	INFORME DE INSPECCIÓN DE TINTAS PENETRANTES
12	Obra-073	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-726-132, SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SEMANAL Y REQUERIMIENTO
13	CON.AM.004.2023	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO
14	Obra-073	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	20/02/2024	HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO
15	Obra-074	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	21/02/2024	SOLICITUD PRORROGA
16	Obra-075	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/02/2024	DISEÑO TARIMA, BAÑOS Y URBANISMO
17	Obra-076	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	28/02/2024	AUTORIZACION FIRMA DIGITAL ACTA COMITE N.8 PRORROGA CONTRATO DE OBRA 263-2023
18	Obra-077	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/03/2024	POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA N.1
19	Obra-078	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/03/2024	INFORME SEMANAL SST 34

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 09

04 MARZO- 03 ABRIL

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	4	2024

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 09

CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-144	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/03/2024	SOLICITUDES POSTERIORES A VISITA DE OBRA
2	OF-INT-726-145	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/03/2024	INFORME TOPOGRAFICO N. 1
3	OF-INT-726-146	SID	6/03/2024	ENTREGA DE POLIZAS PRORROGA N.1
4	OF-INT-726-147	CONTRATACION	6/03/2024	ENTREGA DE POLIZAS PRORROGA N.1
5	OF-INT-726-148	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	6/03/2024	REQUERIMIENTO AREA SST "CARÁCTER URGENTE".
6	OF-INT-726-149	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	6/03/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA 075 DISEÑO TARIMA, BAÑOS Y URBANISMO
7	OF-INT-726-150	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8/03/2024	SOLICITUD PLANOS TALLER DE SOLDADURA
8	OF-INT-726-151	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	12/03/2024	RECOMENDACION SOBRE ACTIVIDADES EN EL SITIO DE OBRA
9	OF-INT-726-152	SID	13/03/2024	RESPUESTA INTERVENTORIA PARA MODIFICACION N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 763 de 2023
10	OF-INT-726-153	SID	13/03/2024	SOLCITUD CONVOCACION DE COMITÉ TECNICO
11	OF-INT-726-154	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/03/2024	OBSERVACIONES DEL AREA SST E INFORME MENSUAL 08 AREA SST.
12	OF-INT-726-155	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	21/03/2024	CORRECCIÓN DE PLANOS TARIMA, BAÑOS Y URBANISMO
13	OF-INT-726-156	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/04/2024	REMISION DEL INFORME SEMANAL Y OTRAS CONSIDERACIONES.
14	OF-INT-726-157	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	3/04/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA 089 SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL TOPÓGRAFO

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	Obra-079	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	7/03/2024	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO POR AJUSTES EN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS
2	GP SID EXT 0107	GOBERNACION	9/03/2024	CORRECTO SEGUIMIENTO TECNICO CTO-763 DE 2023
3	Obra-082	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	11/03/2024	INFORME MENSUAL SST N.8
4	Obra-083	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	14/03/2024	MODIFICATORIO Y JUSTIFICACION, TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 763-2023
5	Obra-084	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/03/2024	RESPUESTA OF-INT-786-149 PLANOS URABANISMO Y TARIMA
6	Obra-085	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19/03/2024	INFORME SEMNAL SST 36 Y 37
7	Obra-086	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-786-125 - RESPUESTA OFICIO OBRA 059 DEL 26 DE ENERO 2024
8	Obra-087	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	22/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-786-117 SOLICITUD DOCUMENTO DEL COMPONENTE SST
9	Obra-088	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	25/03/2024	INFORME SEMANAL SST 38
10	Obra-089	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/03/2024	SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL-TOPOGRAFO
11	Obra-090	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	26/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-786-141 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07-AREA SST Y OF-INT-786-154 OBSERVACIONES DEL AREA SST E INFORME MENSUAL 08 AREA SST

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL CORRESPONDENCIA MES 10

04 ABRIL- 03 MAYO

SERVICON CS S.A.S. *Juntos Trabajando*	CÓDIGO			
	VERSIÓN	1		
	FECHA	3	5	2024

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	INTERVENTOR SERVICON CS SAS	MES 10
CONTRATO OBRA No: 763 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MOCOA	MUNICIPIO MOCOA

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

ENVIADA

N°	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO
1	OF-INT-726-158	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/04/2024	RESPUESTA OFICIO OBRA 090.
2	OF-INT-726-159	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	13/04/2024	SOLICITUD DE RESPUESTA INMEDIATA A OFICIOS ENVIADOS.
3	OF-INT-726-160	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	13/04/2024	MESA TECNICA REVISIÓN DE PLANOS DE TARIMA Y BAÑOS.
4	OF-INT-726-161	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	17/04/2024	OBSERVACIONES Y REQUIRIMIENTOS POSTERIORES A VISITA EN LA OBRA
5	OF-INT-726-162	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	19/04/2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
6	OF-INT-726-163	GOBERNACION Y CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/05/2024	SEGUNDA MESA TECNICA - REVISIÓN DE PLANOS DE TARIMA Y BAÑOS.

RECIBIDA

N°	CONSECUTIVO	REMITIDO POR:	FECHA	ASUNTO
1	Obra-091	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	5/04/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-786-156 REMISION DEL INFORME SEMANAL Y OTRAS CONSIDERACIONES
2	Obra-092	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8/04/2024	RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-786-158 RESPUESTA A OFICIO DE OBRA 090
3	Obra-093	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	8/04/2024	REMISION INFORME SEMANAL 40 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2024
4	Obra-094	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	9/04/2024	REMISION INFORME MENSUAL SST MARZO 2024 DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2024
5	Obra-097	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	16/04/2024	REMISION INFORME SEMANAL 41 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2024
6	GP SID EXT 0504	GOBERNACION	18/04/2024	RECOMENDACIONES Y CORRECTO SEGUIMIENTO TECNICO DE OBRA
7	Obra-098	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	24/04/2024	REMISION INFORME SEMANAL 42 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024
8	Obra-099	CONSORCIO ALIANZA MOCOA	2/05/2024	REMISION INFORME SEMANAL 43 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024

ING. CAMILO GUZMAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
