TABLA DE CONTENIDO

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. BSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO. 6
7. FIRMAS SUPERVISORES. 7
8. IMÁGENES DE REFERENCIA. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO


Número de Contrato:	No. 23001020 H2 DE 2023 LOTE 1
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL UT RADCOL 2023
Periodo informe:	MES DE AGOSTO 2024
Nombre de Supervisor:	IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS MARIO ROSAS GALLO ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZ JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
Nombre del Interventor:	CONSORCIO AERONAUTICA TORRES
Área perteneciente:	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

“ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTOSISTEMAS DE VIGILANCIA PSR /MSSR - MODO S Y ADSB ENHANCED INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA-LOTE 2: “LETICIA, MITU, CALI, LA VIGA”

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

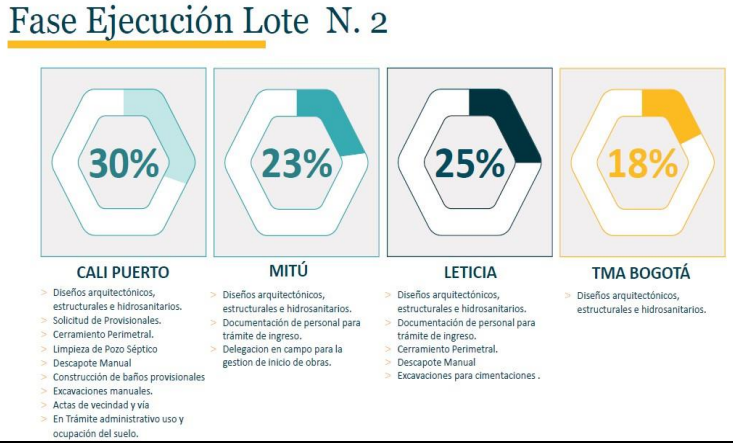PERÍODO: 01 al 31 de agosto de 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Fase de Planeación		ARCHIVOS DEL CONTRATO
2. Fase de Ejecución		ARCHIVOS DEL CONTRATO

3. Fase de Adquisiciones	Estado Adquisiciones	ARCHIVOS DEL CONTRATO

N.	COMPONENTE	PROVEEDOR	ESTADO
1.	OBRAS CIVILES	DEXTERA	En ejecución.
2.	TORRES	CMA	En ejecución.
3.	UPS	SONEPAR	En ejecución.
4.	GENERADORES	INGESOFT	En ejecución.
5.	AIRES ACONDICIONADOS	AIREFLEX	En ejecución.
6.	DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS	DEXTERA	En ejecución.
7.	CONTROL DE ACCESOS	DEXTERA	En ejecución.
8.	MONTAJE RADOMO	HARBIN	En ejecución.
9.	VSAT+FIREWALLS	SMARTEL	En ejecución.
10.	CCTV	DEXTERA	En ejecución.
11.	SCADA Y TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSIÓN.	COINAT	En ejecución.
12.	CELDAS+ACOMETIDAS	DEXTERA	En ejecución.
13.	FILTROS DE ARMÓNICOS	COINAT	En ejecución.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

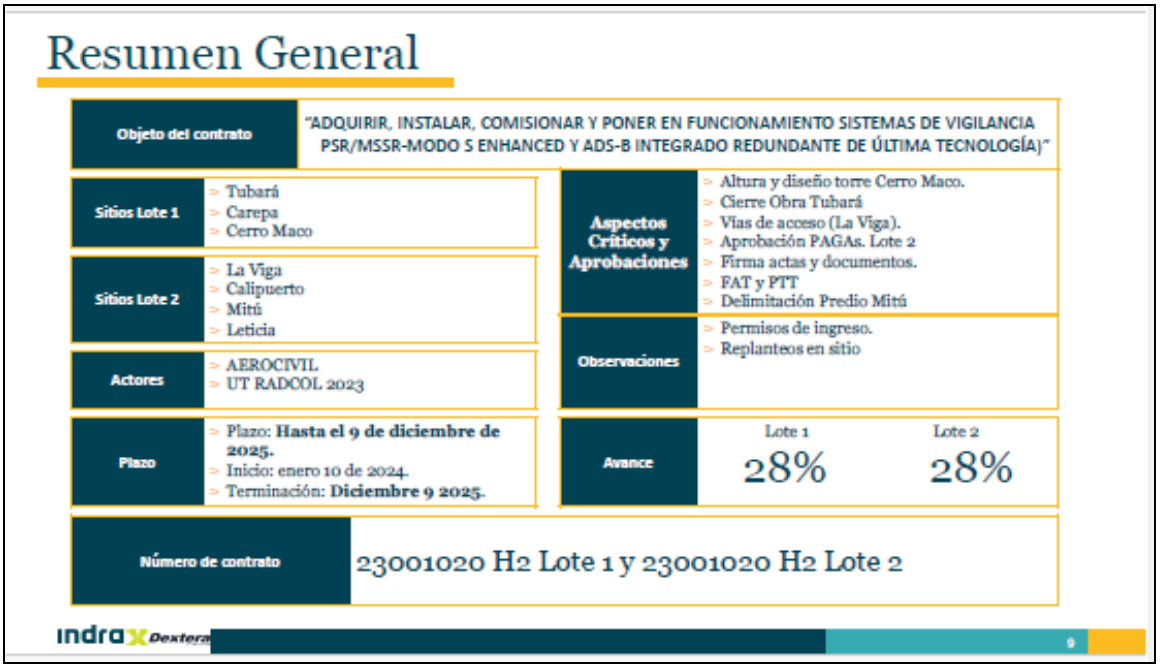


Ilustración 1Resumen general del proyecto

3.2.1. La UT RADCOL presenta cronograma de socialización del proyecto en los cuatro sitios correspondiente al Lote 2

3.2.2. La UT RADCOL programación PTT grupo 1 para ocho (8) personas Lote 2

3.2.3. Aerocivil realiza trámites y autorización de ingreso de personal de la UT RADCOL en los diferentes sitios, con el fin de dar inicio de obras civiles.

3.2.4. La UT RADCOL entrega alcance de pruebas FAT segundo y tercer sistema Lote 2 LETICIA y MITU

3.2.5. Aerocivil realiza entrega de listado de personal que asistirá a las PTT grupo 1 Lote 2 (8) personas y grupo 2 Lote 1 (6) personas; FAT del segundo y tercer sistema a la UT RADCOL.

3.2.6. Se entrega por parte de la supervisoria, informe de pruebas FAT de los sitios CAREPA y CALIPUERTO, realizadas desde el 25 de julio al 08 de agosto 2024.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el presente periodo no se hace entrega de ningún producto y/o bien.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.



Ilustración 2 Cronograma de socialización del proyecto Lote 1 Y Lote 2

PTT LOTE 2			
GRUPO 1 (OCHO PERSONAS)	MSSR	9/09/2024	20/09/2024
	PSR3D	23/09/2024	4/10/2024

Ilustración 3 Fechas PTT grupo 1 Lote 2

SITIO	FAT PRIMARIO	
LETICIA	16/09/2024	20/09/2024
MITÚ	23/09/2024	27/09/2024

Ilustración 4 Fechas FAT segundo y tercer sistema

La UT RADCOL manifiesta inconvenientes de acceso a la estación La Viga, por cuenta del mal estado de la vía.



Ilustración 5 Estado de la vía de acceso sitio la VIGA

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo.		

5.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	
8	X	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZDOS.

A la fecha no se han realizado pagos al contratista. Pendiente aprobación Pre-Factura Lote 2.

6.2. AVANCES EN EL PROCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 28%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

7. FIRMAS SUPERVISORES.



IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



MARIO ROSAS GALLO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023.

8. IMÁGENES DE REFERENCIA.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

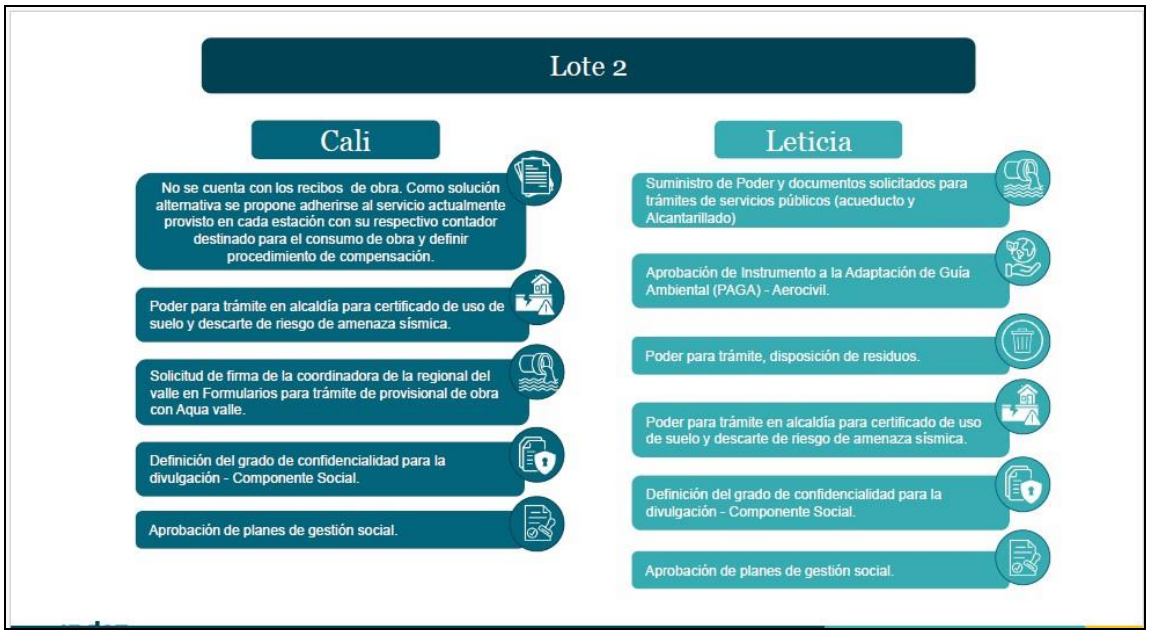


Ilustración 6 Pendientes Lote 2



Ilustración 7 Pendientes Lote 2

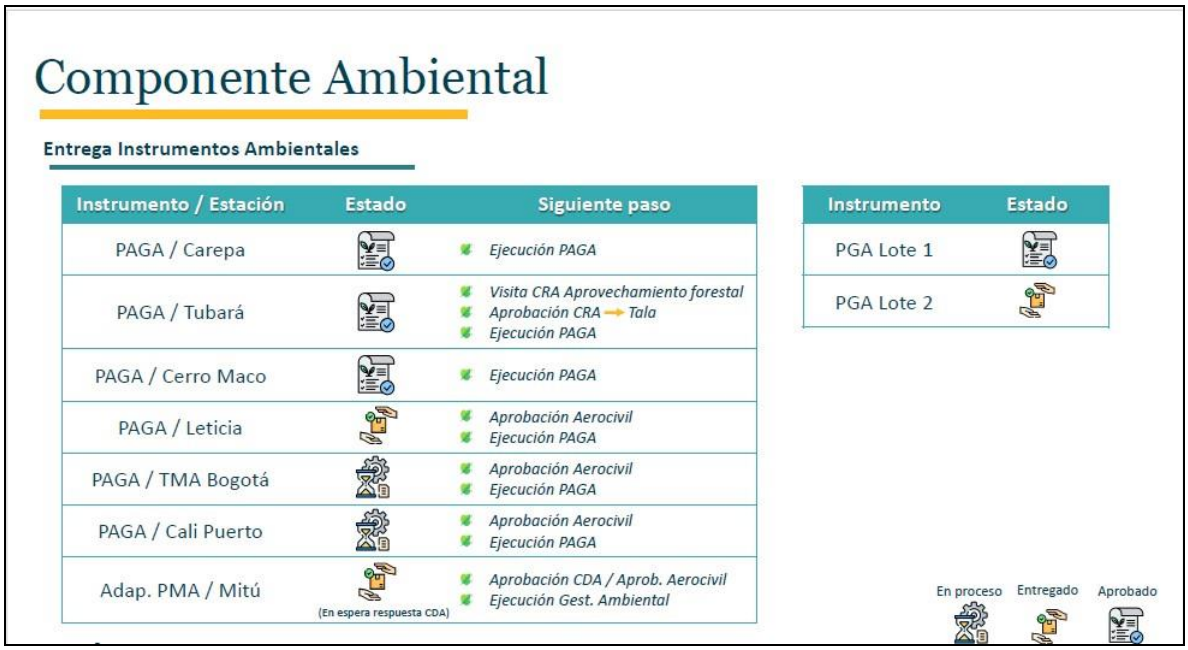


Ilustración 8 Componente ambiental del proceso No 23001020-H2

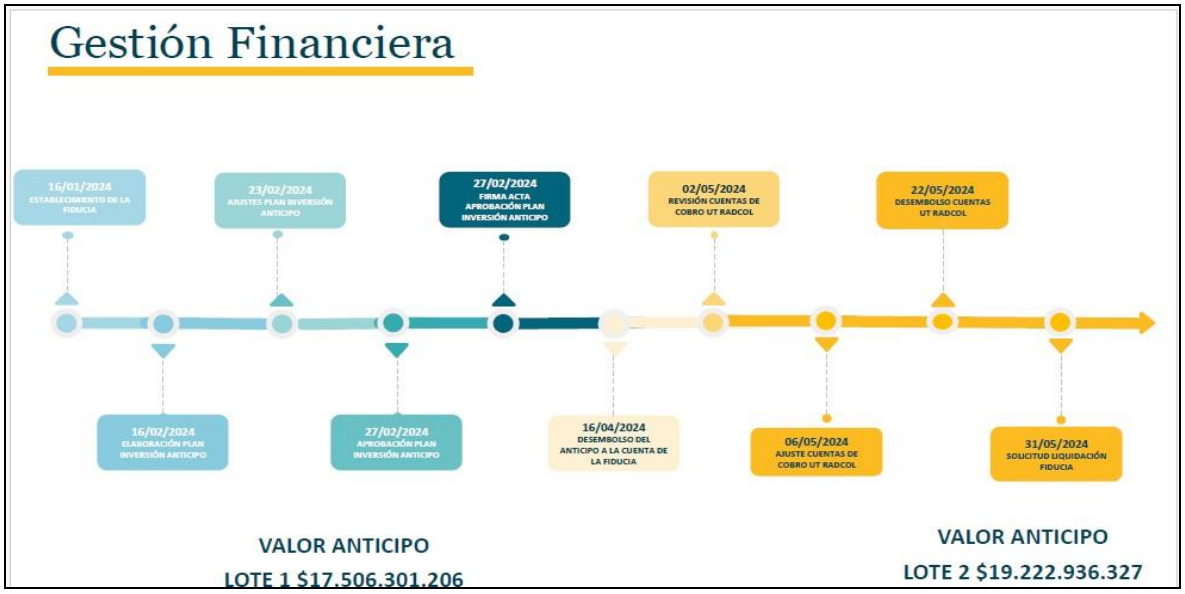


Ilustración 9 Gestión financiera del proceso 23001020-H2

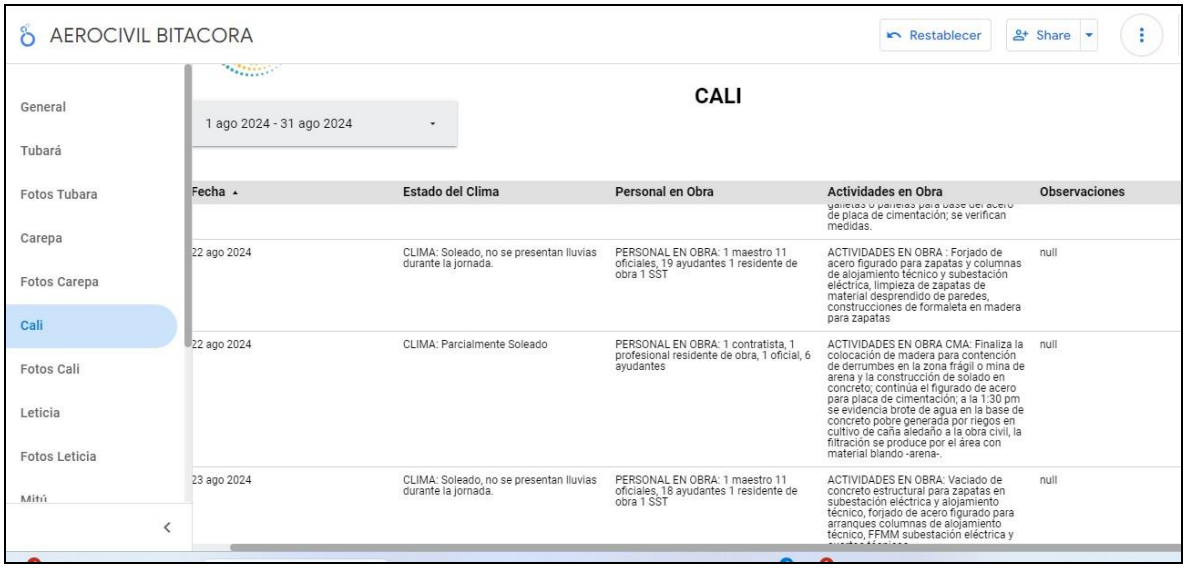


Ilustración 106 Registro Bitácora CALIPUERTO



Ilustración 7 Avance de obra civil CALIPUERTO



Ilustración 8 Avance de obra CAREPA



Ilustración 9 Avance de obra Leticia
