INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 20 de noviembre de 2023 Al: 26 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 118,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: CALLE 48 N° 49 -31SEVILLA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) — SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	RETRASO
Obra programada (%)	8,58%	89,52%	Obra Física Ejecutada (%)	1,41%	55,010%	34,51%
Valor básico de la Obra	$ 21.203.549,28	$ 221.228.640,05	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 3.484.499,36	$ 135.944.900,46	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 247.127.614,00
Valor Actualizado:	$ 247.127.614,00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes 15 de diciembre 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 44.129.958,25
Valor Actualizado:	44.129.958,25
Plazo Inicial:	cinco (5) meses
Plazo Actualizado:	cinco (5) meses
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves 28 de diciembre 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA NUMERO 10 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ITEM 1,47 REGATA SOBRE MURO+RESANE
ITEM 1,55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
ITEM 1,57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA
ITEM 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL
ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM
ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM
ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO
ITEM 16,07 PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO
ITEM 16,11 PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS
ITEM 17,12 SALIDA SANITARIA INODORO 4"
ITEM 17,14 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"
NP-ITEM 7,02 ESTUCO INTERIOR
NP - ITEM 15,09 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA
NP, 03 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22

NOTA: POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA SE INFORMA, QUE EL CONTRATISTA DE OBRA AL DÍA DE HOY 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA OBRA PRESENTA UN RETRASO DEL 34,51%, PARA LO CUAL SE LE SOLICITA IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA LO MÁS PRONTO POSIBLE DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

IMAGENES AVANCE





NP.702 ESTUCO INTERIOR



ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)




ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)



ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)



NP.702 ESTUCO INTERIOR

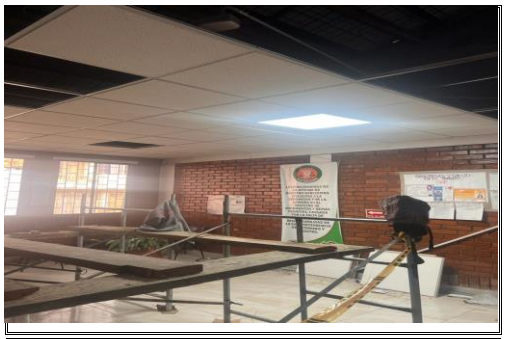

ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM



NP.702 ESTUCO INTERIOR

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN MUCHAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM
ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL
ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No.: A08322006-92536604

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.10	DESCRIPCION	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UNI	M2	UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	AREA 1									-
	SALA DE ESPERA	4,00								4,00
	OFFI REGISTRADOR	3,00								3,00
	WC REGISTRADOR	1,00								1,00
	AREA DE CAJAS	3,00								3,00
	HALL Y PATIO INTERNO	2,00								2,00
	HALL AL PATIO	2,00								2,00
	OFICINA N° 1	2,00								2,00
	OFICINA N° 2	2,00								2,00
	COCINA	1,00								1,00
	BAÑO CABALLERO	1,00								1,00
	BAÑODAMAS	1,00								1,00
	SISTEMA	1,00								1,00
	ARCHIVO 1	6,00								6,00
	ARCHIVO 2	8,00								8,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									37,00

CROQUIS

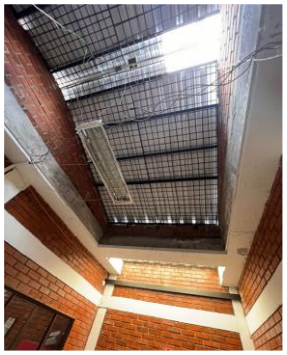



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,11	DESCRIPCION	DESMONTE DE CUBIERTA	UNI M2	UBICACIÓN ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,70	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		2,00	3,20	4,75						30,40
ZONA DE ARCHIVO 4		1,00	6,90	9,00						62,10
ZONA DE ARCHIVO 5		1,00	9,70	9,00						87,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									270,70

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,33	DESCRIPCION	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UNI M2	UBICACIÓN ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINA REGISTRADOR		1,00								1,00
ATENCION AL USUARIO		2,00								2,00
SECRETARIA		1,00								1,00
										-
OFICINA OPERATIVA		1,00								1,00
OFICINA ADMINISTRATIVA		1,00								1,00
OFICINA 2		1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									7,00

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES		ITEM	1,34	DESCRIPCION	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	MURO DIVISORIO	1,00	3,15		2,21					6,96
	MODULOS	1,00	2,20		1,40					3,08
SECRETARIA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
										-
OFICINA OPERATIVA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
OFICINA ADMINISTRATIVA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
OFICINA 2	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									22,36

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	*ITEM 1,36 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PATIO POSTERIOR	VIGA CANAL	2,00	12,000							24,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									24,00	

Observaciones

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
08 22006-92536604
CONTRATISTA

DIDIER MONTERROZA
A1XXX
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ORIP										-	
	ZONA DE CAJA	1,00	7,20	3,20						23,04	
	PATIO INTERNO Y ATENCION	1,00	8,84	3,10						27,40	
	AREA DE PATIO INTERNO	1,00	4,82	3,20						15,42	
		1,00	1,54	2,00						3,08	
	PASILLO	1,00	9,56	1,00						9,56	
	CUARTO DE RACK	1,00	3,10	3,20						9,92	
	OFICINA N° 1	1,00	3,00	3,40						10,20	
	OFICINA N° 2	1,00	3,10	3,40						10,54	
	ARCHIVO	1,00	6,10	3,20						19,52	
	CAFETERIA	1,00	3,80	2,00						7,60	
	WC - DAMAS	1,00	1,40	1,60						2,24	
	WC - CABALLERO	1,00	1,48	2,30						3,40	
		1,00	0,78	0,64						0,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									142,43	

Observaciones

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
A08322006-92536604
CONTRATISTA

DIDIER MONTERROZA
A1XXX
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,43	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	#	1,45						13,05
			#							-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									13,05

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,43	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ORIP										-
	ZONA DE CAJA	1,00	7,20	3,20						23,04
	PATIO INTERNO Y ATENCION	1,00	8,84	3,10						27,40
	AREA DE PATIO INTERNO	1,00	4,82	3,20						15,42
		1,00	1,54	2,00						3,08
	PASILLO	1,00	9,56	1,00						9,56
	CUARTO DE RACK	1,00	3,10	3,20						9,92
	OFICINA N° 1	1,00	3,00	3,40						10,20
	OFICINA N° 2	1,00	3,10	3,40						*10,54*
	ARCHIVO 2	1,00	6,10	3,20						*19,52*
	CAFETERIA	1,00	3,80	2,00						*7,60*
	WC - DAMAS	1,00	1,40	1,60						*2,24*
	WC - CABALLERO	1,00	1,48	2,30						*3,40*
		1,00	0,78	0,64						*0,50*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*142,43*

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,46	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	1,960							1,96
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									1,96

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,47	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	**BAÑO CABALLERO**									-
	DUCHA	1,00	2,20							2,20
	ORINAL	1,00	2,00							2,00
	LAVAMANO	1,00	0,80							0,80
	SANITARIO	1,00	0,30							0,30
	BAÑO DAMA									-
	LAVAMANO	1,00	0,80							0,80
	A.A.A	1,00	2,00							2,00
	SANITARIO	1,00	0,30							0,30
	COCINA									-
	LAVAPLATO	1,00	0,70							0,70
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									9,10

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,47	DESCRIPCION	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UNI	U
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	**BAÑO CABALLERO**									-
	ORINAL	1,00								1,00
	LAVAMANO	1,00								1,00
	SANITARIO	1,00								1,00
	BAÑO DAMA									-
	LAVAMANO	1,00								1,00
	SANITARIO	1,00								1,00
	OFICINA DIRECTOR									-
	LAVAMANO	1,00								1,00
	SANITARIO	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									7,00

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,54	DESCRIPCION	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	MURO DIVISORIO	1,00	3,15		2,21					6,96
	MODULOS	1,00	2,20		1,40					3,08
SECRETARIA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
										-
OFICINA OPERATIVA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
OFICINA ADMINISTRATIVA	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
OFICINA 2	MODULO	1,00	2,20		1,40					3,08
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	22,36

CROQUIS

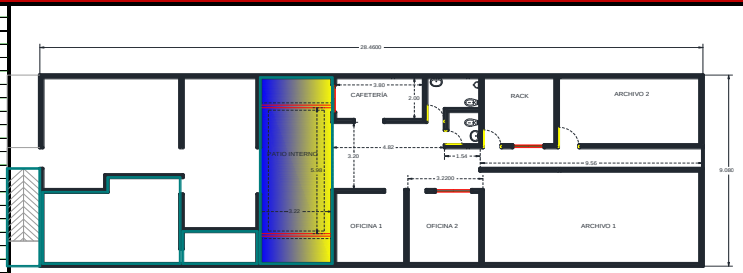

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,37	DESCRIPCION	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	SALA DE ESPERA	4,00								4,00
	OFFI REGISTRADOR	3,00								3,00
	WC REGISTRADOR	2,00								2,00
	AREA DE CAJAS	3,00								3,00
	HALL Y PATIO INTERNO	5,00								5,00
	HALL AL PATIO	2,00								2,00
	OFFI OPERATIVA	2,00								2,00
	OFFI ADMOL	2,00								2,00
	COCINA	2,00								2,00
	BAÑO CABALLERO	1,00								1,00
	BAÑODAMAS	1,00								1,00
	SISTEMA	1,00								1,00
	ARCHIVO 1	6,00								6,00
	ARCHIVO 2	10,00								10,00
										-
										-
				SE INSTALAN NUEVAS						-31,00
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									13,00

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,57	DESCRIPCION	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	UNI	U
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ORIP - SEVILLA	PISO 1	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									*1,00*	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,67	DESCRIPCION	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	*PISO 1*	*30,00*								*30,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*30,00*

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	4,02	DESCRIPCION	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
OFICINAS Y PASILLOS											
ATENCION AL USUARIO	AREA 1	1,00	5,32	2,68						14,26	
		1,00	4,62	3,34						15,43	
OFICINA DEL REGISTRADOR		1,00	4,10	3,10						12,71	
		1,00	3,40	2,80						9,52	
WC - REGISTRADOR		1,00	3,20	1,53						4,90	
AREA DE CAJAS		1,00	7,20	3,20						23,04	
PATIO INTERNO		1,00	6,45	3,10						20,00	
HALL DE CIRCULACION		1,00	4,82	3,20						15,42	
		1,00	2,00	1,54						3,08	
		1,00	9,56	1,00						9,56	
OFICINA N° 1		1,00	3,40	3,00						10,20	
OFICINA N° 2		1,00	3,40	3,10						10,54	
CAFETERIA		1,00	3,80	2,00						7,60	
WC - CABALLEROS		1,00	2,30	1,48						3,40	
		1,00	0,78	0,64						0,50	
WC - DAMAS		1,00	1,60	1,40						2,24	
CUARTO DE RACK		1,00	3,20	3,10						9,92	
ARCHIVO N° 1		1,00	9,32	4,40						41,01	
ARCHIVO N° 2		1,00	6,10	3,20						19,52	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									232,84	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	5	CONCRETOS Y MORTEROS	ITEM	5,02	DESCRIPCION	PAÑETE MUROS 1:3	UNI	M2
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS ADMINITRATIVAS										-
OFICINA DEL REGISTRADOR		1,00	20,00		2,70					54,00
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	WC - PUERTA	-1,00	0,70		2,05					-1,44
	VENTANA	-3,00	1,37		1,10					-4,52
CAFETERIA		1,00	11,60		2,70					31,32
	PUERTAS	-1,00	1,30		2,05					-2,67
	VENTANA	-1,00	1,30		1,10					-1,43
										-
WC - CABALLEROS		1,00	8,84		2,70					23,87
	PUERTA	-1,00	0,78		2,05					-1,60
										-
WC - DAMAS		1,00	6,00		2,70					16,20
	PUERTA	-1,00	0,70		2,05					-1,44
										-
HALL DE CIRCULACION		1,00	21,65		2,70					58,46
	PUERTA	-1,00	0,80		2,05					-1,64
		-1,00	0,90		2,05					-1,85
		-1,00	1,00		2,05					-2,05
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					-1,51
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									162,08

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	5	CONCRETOS Y MORTEROS	ITEM	5,02	DESCRIPCION	PAÑETE MUROS 1:3	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS ADMINITRATIVAS										-
OFICINA N° 1		1,00	12,80		2,70					34,56
	PUERTAS	-1,00	0,90		2,05					-1,85
	VENTANA	-1,00	1,60		1,10					-1,76
OFICINA N° 2		1,00	13,00		2,70					35,10
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					-1,51
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									162,08
	TOTAL									224,98

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	6	CUBIERTAS	ITEM	6,16	DESCRIPCION	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA 1	CUBIERTA	8,00	9,08							72,64
ZONA 2	CUBIERTA	4,00	9,08							36,32
ZONA 3	CUBIERTA	5,00	3,17							15,86
ZONA 4	CUBIERTA	5,00	3,20							16,00
ZONA 5	CUBIERTA	8,00	9,08							72,64
ZONA 6	CUBIERTA	11,00	9,08							99,88
										-
REFUERZOS DE REJA DE SEGURIDAD	ORIP	7,00	4,30							30,10
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									343,44

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	6	CUBIERTAS	ITEM	6,20	DESCRIPCION	CANAL EN LÁMINA CAL 22	UNI M	UBICACIÓN ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	PISO 1	*1,00*	*4,000*							*4,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*4,00*

CROQUIS

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	6	CUBIERTAS	ITEM	6,22	DESCRIPCION	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	UNI	M2
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,70	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		2,00	3,20	3,25						20,80
ZONA DE ARCHIVO 4		1,00	6,90	9,00						62,10
ZONA DE ARCHIVO 5		1,00	9,70	9,00						87,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									261,10

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023

CAPITULO	7	ENCHAPE MUROS	ITEM	7,05	DESCRIPCION	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
CAFETERIA		1,00	5,40		2,70					14,58
WC - CABALLEROS		1,00	8,84		2,70					23,87
	PUERTA	-1,00	0,78		2,05					-1,60
										-
WC - DAMAS		1,00	6,00		2,70					16,20
	PUERTA	-1,00	0,70		2,05					-1,44
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS		ITEM	10,04	DESCRIPCION	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	9,000		5,00					45,00
VENTANA N°1		-1,00	3,50		1,40					-4,90
VENTANA N°2		*-1,00*	*2,25*		*1,40*					*-3,15*
FACHADA PRINCIPAL		*1,00*	*9,00*		*2,00*					*18,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,10	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNI	M2
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
OFICINAS ADMINITRATIVAS										-
OFICINA DEL REGISTRADOR		1,00	20,00		2,70					54,00
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	WC - PUERTA	-1,00	0,70		2,05					-1,44
	VENTANA	-3,00	1,37		1,10					-4,52
CAFETERIA		1,00	6,20		2,70					16,74
	PUERTAS	-1,00	1,30		2,05					-2,67
	VENTANA	-1,00	1,30		1,10					-1,43
HALL DE CIRCULACION		1,00	21,65		2,70					58,46
	PUERTA	-1,00	0,80		2,05					-1,64
		-1,00	0,90		2,05					-1,85
		-1,00	1,00		2,05					-2,05
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					-1,51
OTROS		1,00	30,00							30,00
OFICINA N° 1		1,00	12,80		2,70					34,56
	PUERTAS	-1,00	0,90		2,05					-1,85
	VENTANA	-1,00	1,60		1,10					-1,76
										-
OFICINA N° 2		1,00	13,00		2,70					35,10
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					*-1,51*
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									203,37

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	14	PISOS		ITEM	14,06	DESCRIPCION	PISO CERÁMICO DURO PISO	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	ZONA DE CAJA	1,00	7,20	3,20						23,04
	PATIO INTERNO Y ATENCION	1,00	8,84	3,10						27,40
	AREA DE PATIO INTERNO	1,00	4,82	3,20						15,42
		1,00	1,54	2,00						*3,08*
	PASILLO	1,00	9,56	1,00						*9,56*
	CUARTO DE RACK	1,00	3,10	3,20						*9,92*
	OFICINA N° 1	1,00	3,00	3,40						*10,20*
	OFICINA N° 2	1,00	3,10	3,40						*10,54*
	ARCHIVO	1,00	6,10	3,20						*19,52*
	CAFETERIA	1,00	3,80	2,00						*7,60*
	WC - DAMAS	1,00	1,40	1,60						*2,24*
	WC - CABALLERO	1,00	1,48	2,30						*3,40*
		1,00	0,78	0,64						*0,50*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									142,43

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	14	PISOS		ITEM	16,07	DESCRIPCION	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR										-
	PATIO DE SERVICIO	1,00	10,23	9,20						94,07
		-1,00	1,00	1,00						-1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									93,07

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	14	PISOS		ITEM	14,12	DESCRIPCION	POYO COCINA 55X10CM	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CAFETERIA	PISO 1	1,00	1,96							1,96	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									1,96	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S						NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC						NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	14	PISOS		ITEM	14,13	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISO 2CM		UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	ZONA DE CAJA	1,00	7,20	3,20						23,04
	PATIO INTERNO Y ATENCION	1,00	8,84	3,10						27,40
	AREA DE PATIO INTERNO	1,00	4,82	3,20						15,42
		1,00	1,54	2,00						*3,08*
	PASILLO	1,00	9,56	1,00						*9,56*
	CUARTO DE RACK	1,00	3,10	3,20						*9,92*
	OFICINA N° 1	1,00	3,00	3,40						*10,20*
	OFICINA N° 2	1,00	3,10	3,40						*10,54*
	ARCHIVO	1,00	6,10	3,20						*19,52*
	CAFETERIA	1,00	3,80	2,00						*7,60*
	WC - DAMAS	1,00	1,40	1,60						*2,24*
	WC - CABALLERO	1,00	1,48	2,30						*3,40*
		1,00	0,78	0,64						*0,50*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									142,43

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	14	PISOS	ITEM	14,16	DESCRIPCION	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
FACHADA POSTERIOR	ZONA DE CAJA	1,00	16,34							*16,34*	
	PATIO INTERNO Y ATENCION	1,00	18,58							*18,58*	
	AREA DE PATIO INTERNO	1,00	7,88							*7,88*	
	PASILLO	1,00	18,92							*18,92*	
	CUARTO DE RACK	1,00	11,80							*11,80*	
	OFICINA N° 1	1,00	12,07							*12,07*	
	OFICINA N° 2	1,00	12,38							*12,38*	
	ARCHIVO 2	1,00	17,70							*17,70*	
	CAFETERIA	1,00	4,90							*4,90*	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									120,57	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	7	ENCHAPE MUROS	ITEM	7,01	DESCRIPCION	ESTUCO EXTERIOR	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	1,00	9,000		5,00					45,00
VENTANA N°1		-1,00	3,50		1,40					*-4,90*
VENTANA N°2		*-1,00*	*2,25*		*1,40*					*-3,15*
FACHADA PRINCIPAL		*1,00*	*9,00*		*2,00*					*18,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	13	PINTURAS	ITEM	13,10	DESCRIPCION	ESTUCO INTERIOR	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS ADMINITRATIVAS										-
OFICINA DEL REGISTRADOR		1,00	20,00		2,70					54,00
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	WC - PUERTA	-1,00	0,70		2,05					-1,44
	VENTANA	-3,00	1,37		1,10					-4,52
CAFETERIA		1,00	6,20		2,70					16,74
	PUERTAS	-1,00	1,30		2,05					-2,67
	VENTANA	-1,00	1,30		1,10					-1,43
HALL DE CIRCULACION		1,00	21,65		2,70					58,46
	PUERTA	-1,00	0,80		2,05					-1,64
		-1,00	0,90		2,05					-1,85
		-1,00	1,00		2,05					-2,05
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					-1,51
OFICINA N° 1		1,00	12,80		2,70					34,56
	PUERTAS	-1,00	0,90		2,05					-1,85
	VENTANA	-1,00	1,60		1,10					-1,76
										-
OFICINA N° 2		1,00	13,00		2,70					35,10
	PUERTAS	-1,00	0,80		2,05					-1,64
	VENTANA	-1,00	1,37		1,10					-1,51
										-
OTROS		1,00	30,00							30,00
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									203,37

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	16	RED HIDRÁULICA	ITEM	16,07	DESCRIPCION	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
										-	
WC - CABALLERO	PISO 1	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									1,00	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	16	RED HIDRÁULICA	ITEM	16,11	DESCRIPCION	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	PISO 1	1,00								1,00
WC - CABALLERO	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									2,00

CROQUIS

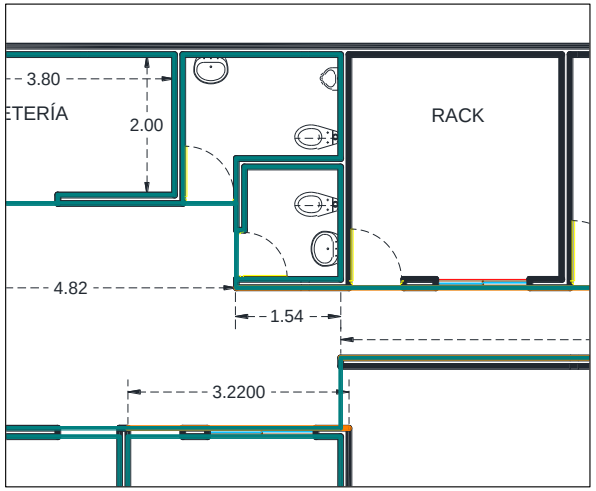

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	16	RED HIDRÁULICA	ITEM	16,24	DESCRIPCION	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
COCINA	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									1,00

CROQUIS

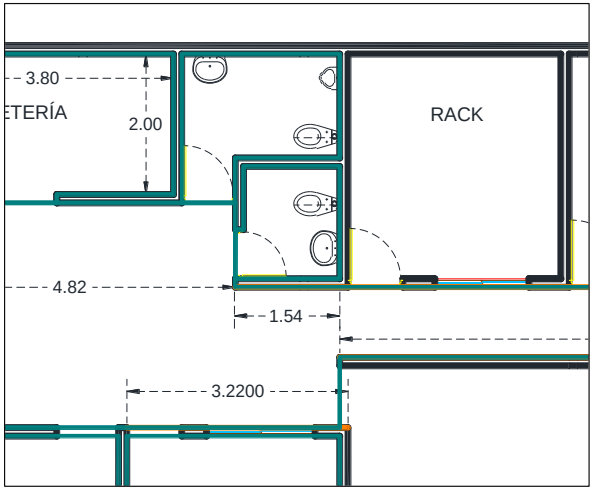

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	16	RED HIDRÁULICA	ITEM	16,32	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
WC - REGISTRADOR	PISO 1	1,00								1,00
WC - DAMAS	PISO 1	1,00								1,00
WC - CABALLERO		1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									3,00

CROQUIS

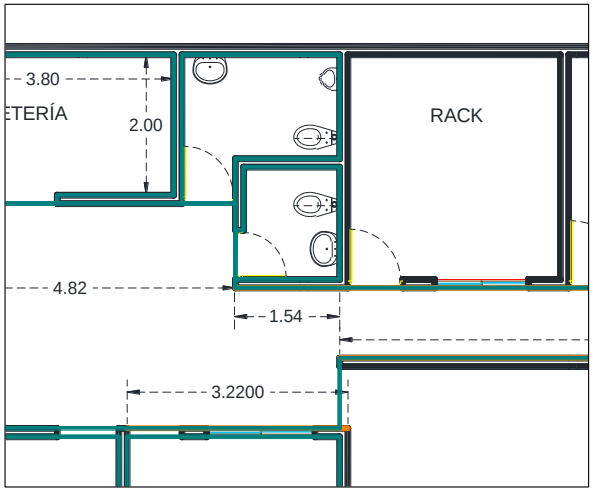

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	16	RED HIDRÁULICA	ITEM	16,33	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
WC - REGISTRADOR	PISO 1	1,00								1,00
WC - DAMAS	PISO 1	1,00								1,00
WC - CABALLERO		1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									3,00

CROQUIS

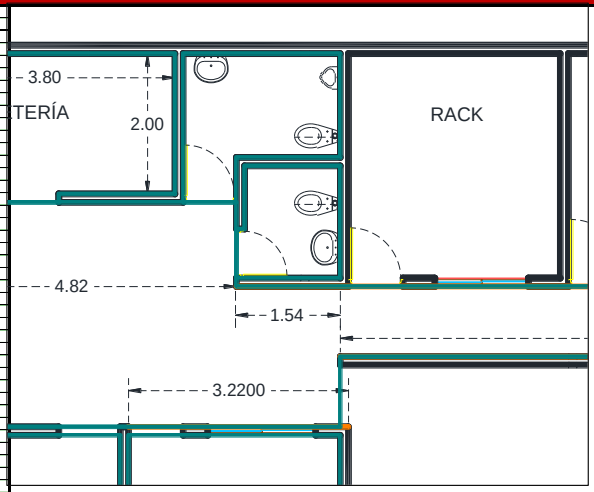

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	17	RED SANITARIA	ITEM	17,29	DESCRIPCION	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO CABALLEROS	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*1,00*

CROQUIS

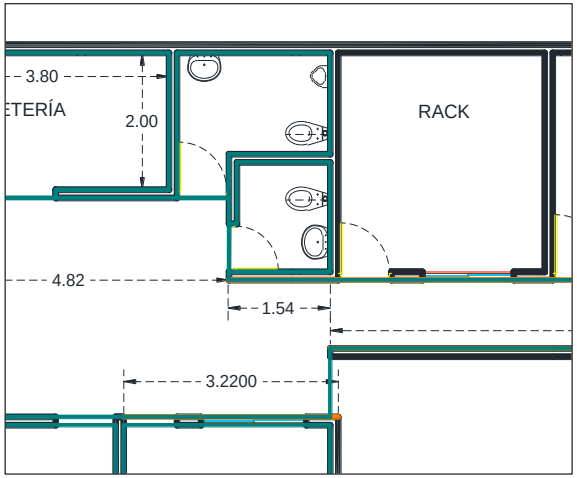

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	18	URBANISMO	ITEM	18,03	DESCRIPCION	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ANDEN	PISO 1	1,00	9,00	1,45						13,05
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									13,05

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	ITEM	19,01	DESCRIPCION	ASEO GENERAL DE OBRA	UNI	U	UBICACIÓN: ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINA DE REGISTRO DE INTRUMENTOS PUBLICOS	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*1,00*

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	19	ASEO-SEÑALIZACIÓN		ITEM	19,02	DESCRIPCION	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UNI	U	UBICACIÓN ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									1,00

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	ITEM	19,04	DESCRIPCION	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA POSTERIOR	PISO 1	8,00								8,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									8,00

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA


ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	ITEM	19,05	DESCRIPCION	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UNI	U	UBICACIÓN: ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ORIP - SEVILLA	ACCESO PRIN	1,00								1,00
	OFFI REGISTRADOR	1,00								1,00
	JURIDICA	2,00								2,00
	ARCHIVOS	2,00								2,00
	SISTEMA	1,00								1,00
	WC-DAMAS	1,00								1,00
	WC-CABALLERO	1,00								1,00
	COCINA	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*10,00*

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)										
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	19	ASEO-SEÑALIZACIÓN		ITEM	19,07	DESCRIPCION	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO		UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ORIP - SEVILLA	PISO 1	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									*1,00*	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTOS	ITEM	NP-03	DESCRIPCION	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	UNI	M
UBICACIÓN	CUBIERTA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CUBIERTA	PISO 1	2,00	24,00							48,00
		2,00	9,00							18,00
		2,00	3,00							6,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									72,00

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	1,04	DESCRIPCION	DESMONTE DE CIELORRASO	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
OFICINAS Y PASILLOS										-	
ATENCION AL USUARIO	AREA 1	1,00	5,32	2,68						14,26	
		1,00	4,62	3,34						15,43	
OFICINA DEL REGISTRADOR		1,00	4,10	3,10						12,71	
		1,00	3,40	2,80						9,52	
WC - REGISTRADOR		1,00	3,20	1,53						4,90	
AREA DE CAJAS		1,00	7,20	3,20						*23,04*	
PATIO INTERNO		1,00	5,74	2,40						*13,78*	
HALL DE CIRCULACION		1,00	4,82	3,20						*15,42*	
		1,00	2,00	1,54						*3,08*	
		1,00	9,56	1,00						*9,56*	
OFICINA N° 1		1,00	3,40	3,00						*10,20*	
OFICINA N° 2		1,00	3,40	3,10						*10,54*	
CAFETERIA		1,00	3,80	2,00						*7,60*	
WC - CABALLEROS		1,00	2,30	1,48						*3,40*	
		1,00	0,78	0,64						*0,50*	
WC - DAMAS		1,00	1,60	1,40						*2,24*	
CUARTO DE RACK		1,00	3,20	3,10						*9,92*	
ARCHIVO N° 1		*1,00*	*9,32*	*4,40*						*41,01*	
ARCHIVO N° 2		*1,00*	*6,10*	*3,20*						*19,52*	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									226,63	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	1,07	DESCRIPCION	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ORIP - SEVILLA	WC -- OFFI REGISTRADOR	2,00								2,00	
	WC - DAMAS	2,00								2,00	
	WC - CABALLEROS	2,00								2,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									6,00	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTO	ITEM	1,15	DESCRIPCION	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	UNI M2	UBICACIÓN ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,70	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									259,50

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR
