SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 12** **Fecha: 24- 12 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 14 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24 Oficina de registro instrumentos publicos Orip Pereira SUPERVISOR: ALFONSO RENE SANCHEZ

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,12%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 531.472,68	$ 442.893.902,00

	SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra Física Ejecutada (%)	7,05%	79,62%	20,38%
Valor básico de la Obra	$ 31.224.020,09	$ 352.632.124,77	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 442.893.902,00
Valor Actualizado:	$ 442.893.902,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES Y MEDIO 4,5
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	martes, 19 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 14 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALLINC S.A.S. BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 79.075.700.380
Valor Actualizado:	$ 79.075.700.380
Plazo Inicial:	CINCO MESES 5
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	martes, 19 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA


AVANCE

El proceso de mantenimiento de la semana 14 se ha evidenciado un avance significativo en:

1. Enchape tanque de reserva.
2. Instalación de guarda escobas terraza del registrador.
3. Emboquillado de baños atención al cliente.

IMAGENES AVANCE



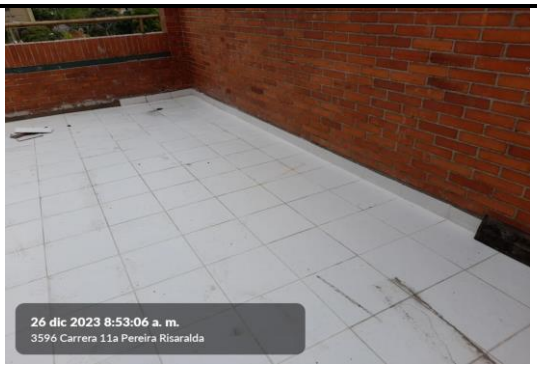


Comentario: Enchape tanque de reserva.

Comentario: Instalación de guarda escobas terraza del registrador.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 12** **Fecha: 24- 12 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

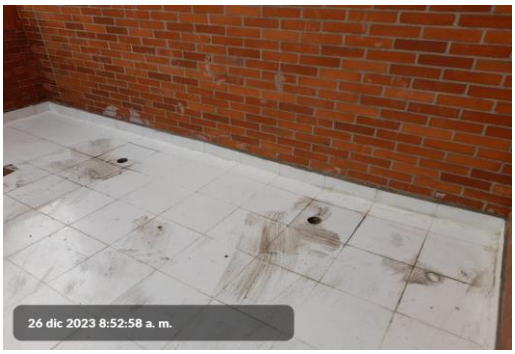


Comentario: Instalación de guarda escobas terraza del registrador.




Comentario: Emboquillado de baños atención al cliente.



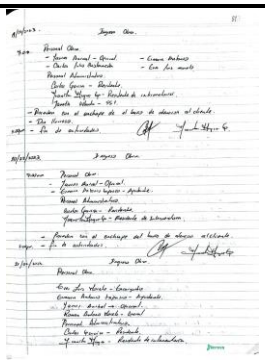

BITÁCORA

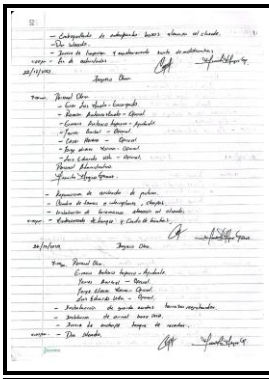

BITÁCORA

OBSERVACIONES

Se requiere un avance de finalización de la terraza con su respectivo guarda escobas, se requiere la finalización.
Se evidencio humedades en la pintura en cielo raso del pasillo de jurídica y filtraciones de humedad en las oficinas de jurídica 3 humedades por causa del deterioro de los muros perimetrales de la cubierta por su porosidad y paredes que todavía siguen pendientes por pintar.
Se manifiesta que procedan con la actividad de nos encontramos con las actividades atrasadas.

Actividades atrasadas de acuerdo a la programación

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

DESMONTE DE PUERTA METÁLICA

MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM
MUEBLE BAJO MESÓN COCINA

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE
MANTENIMIENTO DE CIELOR RASO EN FIBRA

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : Juanita Duque Gómez
Matrícula No.: A17842018-1053835028

RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva
Matrícula No.: A08322006-92536604

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *16.19 LAVAMANOS DE COLGAR* **UNIDAD** *UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS ATENCION AL USUARIO	*PISO 2*	2,00								2,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	2,00

CROQUIS

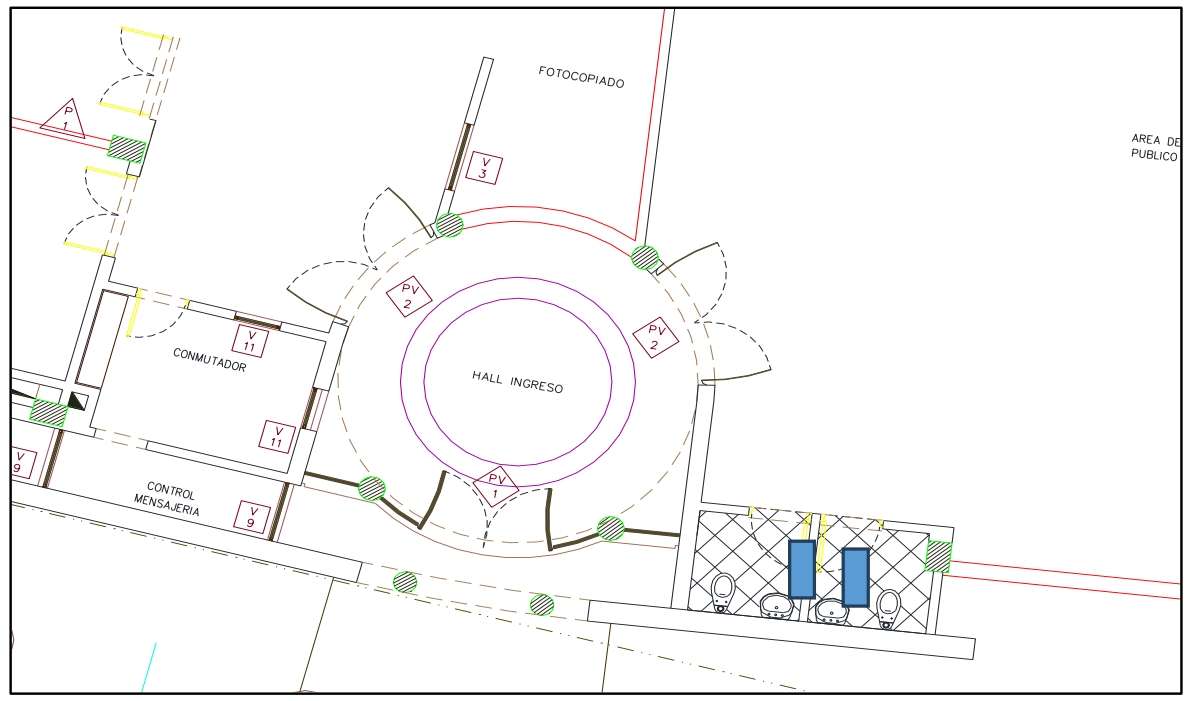

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08322006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | FECHA | DIA 5 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE 1

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *16.23 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE* **UNIDAD** *UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 1										-
TANQUE DE AGUA DE RESERVA EN MUROS		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS

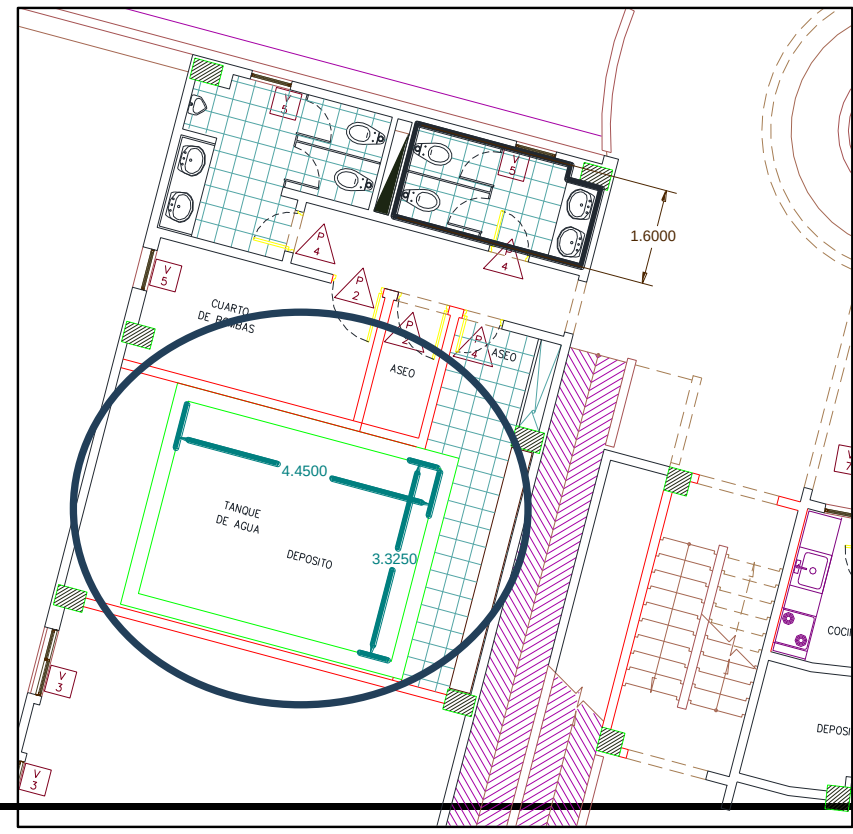

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	*16.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS*	UNIDAD	*UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS										-
BAÑO HOMBRES	*PISO 2*	*2,00*								*2,00*
BAÑOS MUJERES	*PISO 2*	*2,00*								*2,00*
BAÑO HOMBRES	*PISO 1*	*2,00*								*2,00*
BAÑOS MUJERES	*PISO 1*	*2,00*								*2,00*
BAÑO REGISTRADOR	*PISO 2*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*9,00*

CROQUIS

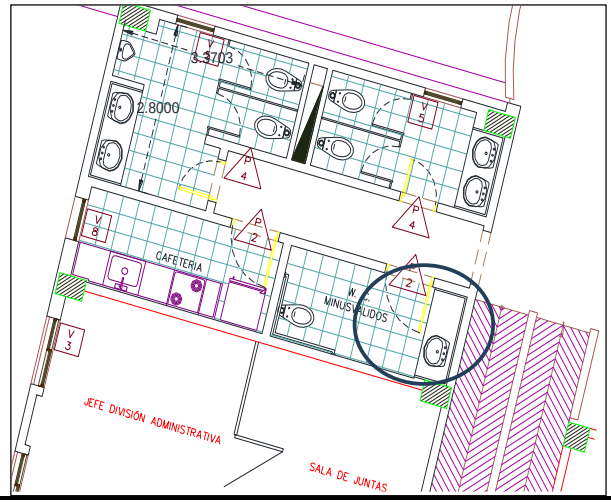

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08 22006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM:	*1.20 DESMONTE DE PUERTA METÁLICA*	UNIDAD	*UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
TERRAZA										
ACCESO A TERRAZA		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***1,00***

CROQUIS

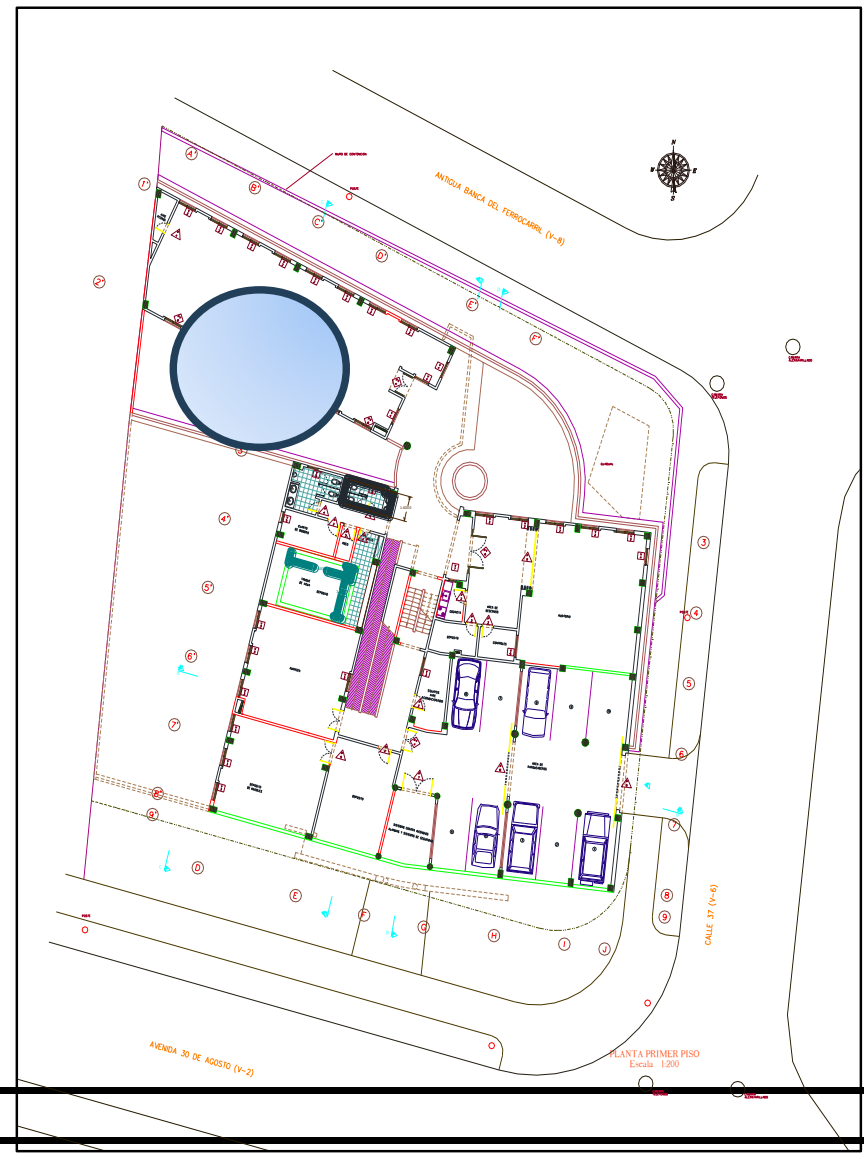

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08?22006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: DIA 5 MES 11 AÑO 2023 — HOJA No 1 DE 1

CONTRATO No. 1674-2023 — CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR: ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.47 REGATA SOBRE MURO+RESANE* — UNIDAD: *ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS										
BAÑOS MUJERES	*PISO 1*	*1,00*	*3,700*							*3,70*
BAÑO HOMBRES	*PISO 1*	*1,00*	*3,80*							*3,80*
										-
OFICINAS JURIDICA	*PISO 1*	*1,00*	*2,500*							*2,50*
	PISO 2	*1,00*	*1,80*							*1,80*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*11,80*

CROQUIS





Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 10 - 12 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | FECHA | DIA 5 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2,10 M* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES	*PARQUEADERO*	*1,00*	*26,000*							*26,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	**26,00**

CROQUIS



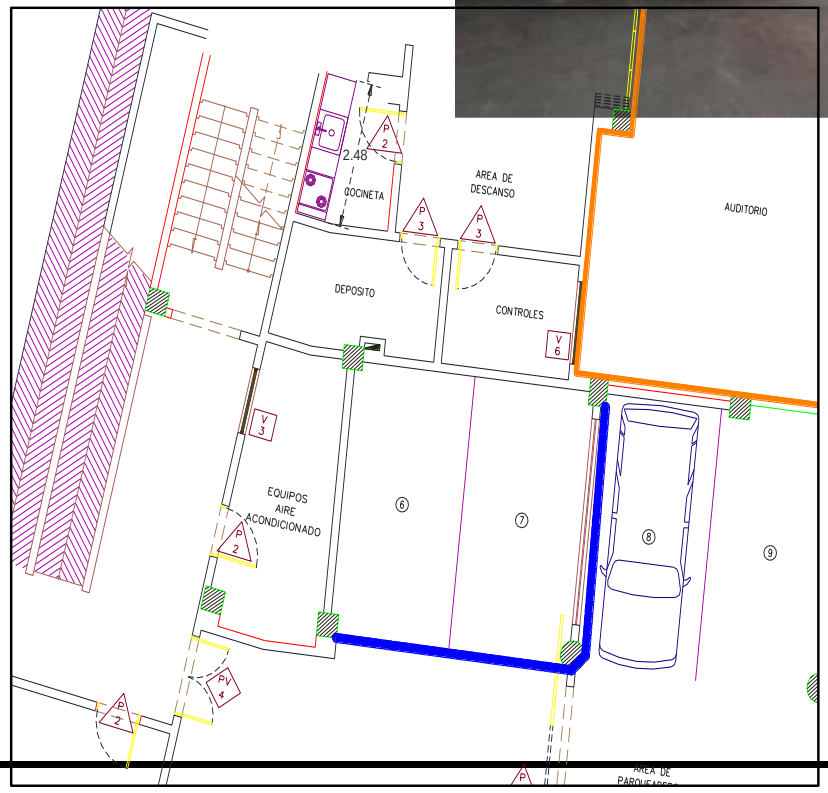

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 19- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 5 MES 11 AÑO 2023 — HOJA No 1 DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 — **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC — **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA* — **UNIDAD** *UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS: CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS: L	a	h	TOTAL
PUERTAS BAÑOS	*PISO 1*	*2,00*								*2,00*
PUERTAS BAÑOS	*PISO 2*	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***4,00***

CROQUIS

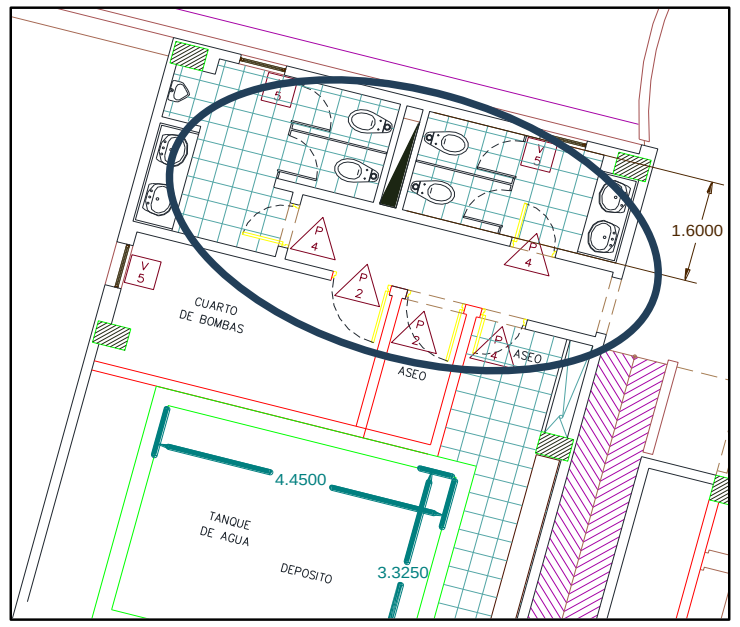

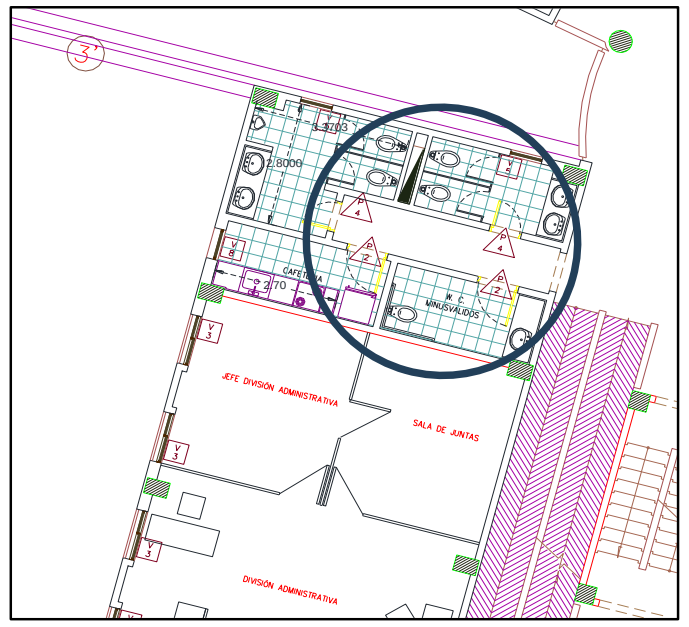

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 05- 11 - 2023**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	2	DE	5


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM:	*5.03 S7 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE IMPERMEABILIZADO										
TANQUE DE AGUA POTABLE		*1,00*	*10,53*		*2,50*					*26,33*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***26,33***

CROQUIS

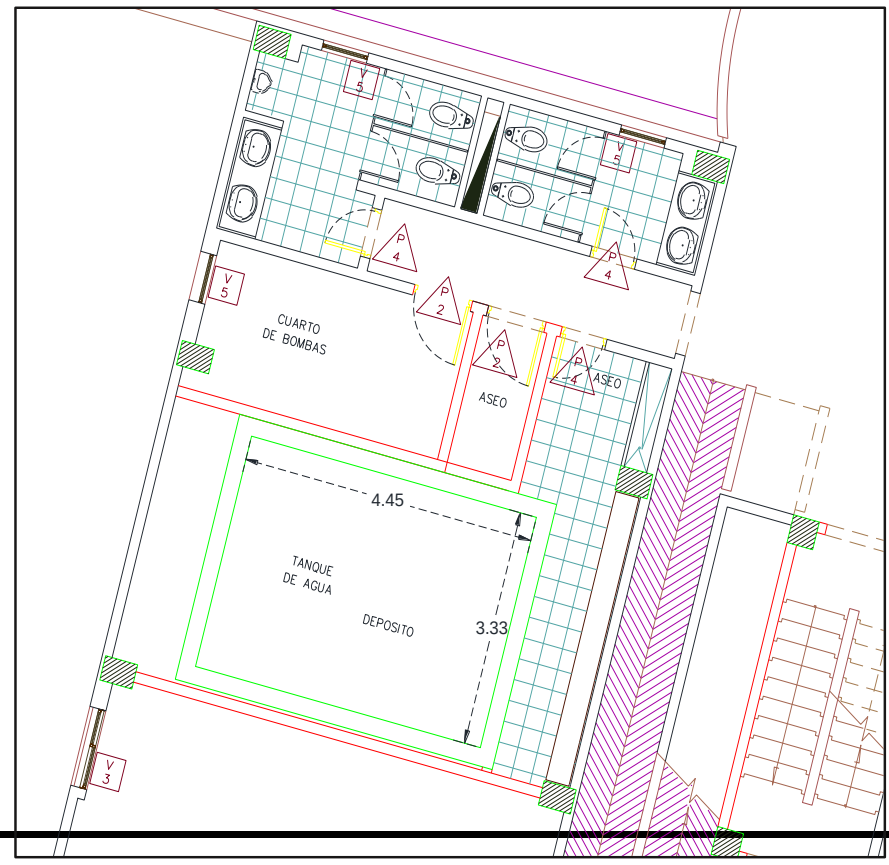

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08[illegible]22006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ


ITEM:	*7.05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS FUNCIONARIOS										-
BAÑOS HOMBRES	*PISO 1*	*1,00*		*1,58*	*2,52*					*3,98*
BAÑOS DAMAS	*PISO 1*	*1,00*		*1,58*	*2,52*					*3,98*
BAÑOS HOMBRES	*PISO 2*	*1,00*		*1,58*	*2,52*					*3,98*
BAÑOS DAMAS	*PISO 2*	*1,00*		*1,58*	*2,52*					*3,98*
										-
BAÑO DE ATENCION AL USUARIO										-
MURETES	*PISO 2*	*2,00*		*1,07*	*0,63*					*1,35*
TANQUE DE AGUA POTABLE	*PISO 1*	*1,00*		*13,78*	*2,52*					*34,71*
										-
										-
DESCUENTO DE PUERTAS		*-2,00*		*0,94*	*2,05*					*-3,85*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***48,14***

CROQUIS



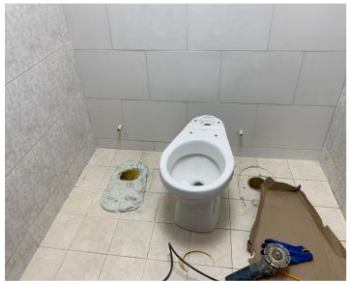

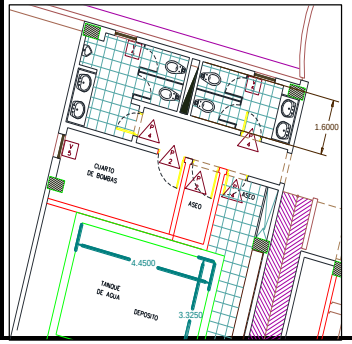



Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
CC 1.08.22006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
CC 1.17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 19- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | FECHA | DIA 5 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 4 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 13.10 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS* **UNIDAD** *UNIDAD*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ARCHIVO	*PISO 1*	*1,00*	*56,300*		*2,55*					*143,57*	
		-1,00	*0,68*		*2,10*					*-1,43*	
DESCUENTO VANOS										-	
		-1,00	*0,68*		*2,10*					*-1,43*	
		-2,00	*4,05*		*2,10*					*-17,01*	
		-2,00	*0,900*		*2,10*					*-3,78*	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	*120*	

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 19- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 5 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 4 | DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 13.11 VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS* **UNIDAD** *UNIDAD*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA INTERNA										-
AUDITORIO		*1,00*	*8,14*	*8,88*						*72,28*
PASILLO REGISTRADOR		*1,00*	*4,775*	*10,00*						*47,75*
										-
AREAS DEBAJO DE ESCALERAS		*1,00*	*4,17*	*1,00*						*4,17*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*124,20*

CROQUIS







AREA 2DO PISO OFICINAS



OFICINA AREA DE JURIDICA

Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08122006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	4	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 14.05 PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE* **UNIDAD** *UNIDAD*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE										-
TANQUE AGUA POTABLE		*1,00*	*4,52*	*3,81*						*17,22*
										-
TERRAZA REGISTRADOR		*1,00*	*19,60*							*19,60*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	**36,82**

CROQUIS



Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A0322006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A1742018-2053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 5 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 3 DE 5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *14.15 ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ALISTADO DE PISOS										-
TANQUE DE AGUA POTABLE DE RESERVA		*1,00*	*4,52*	*3,81*						*17,22*
		1,00	*14,32*	*10,00*						*143,20*
		1,00	*8,45*	*2,41*						*20,40*
		1,00	*13,12*	*1,00*						*13,12*
PASILLO TERRAZA		*1,00*	*2,000*	*5,50*						*11,00*
										-
TERRAZA REGISTRADOR			*40,20*							*40,20*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*245,14*

CROQUIS

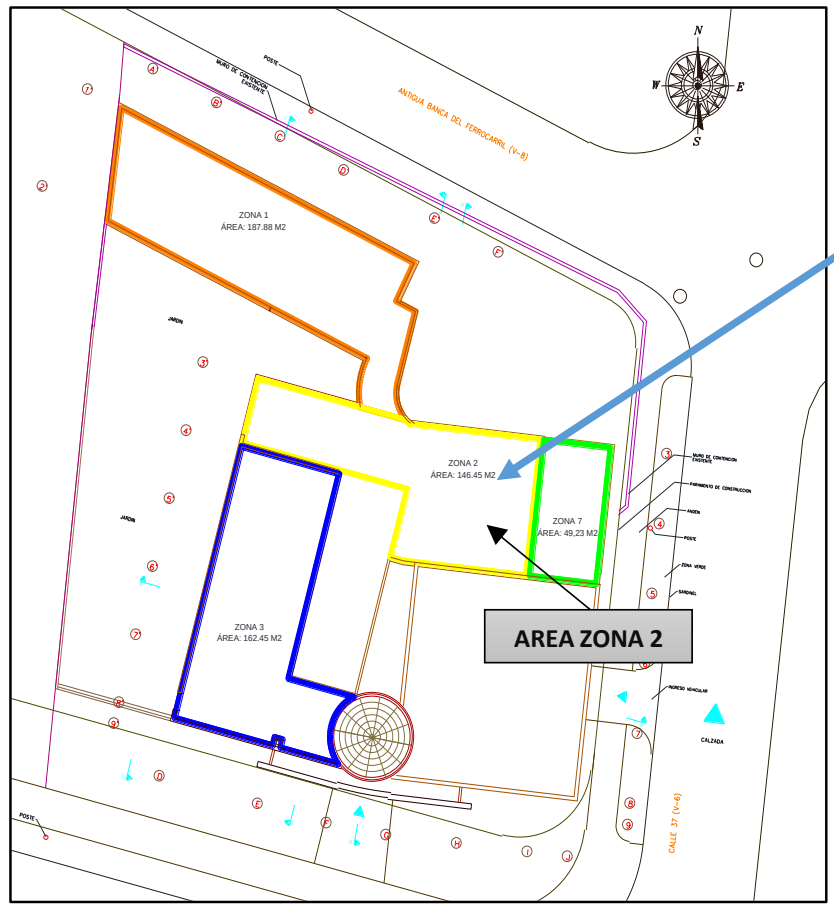







Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A0632-2006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A1782018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR** ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 15.46 S7 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO* **UNIDAD** *UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CUARTO ELECTRICO	*PISO 2*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS

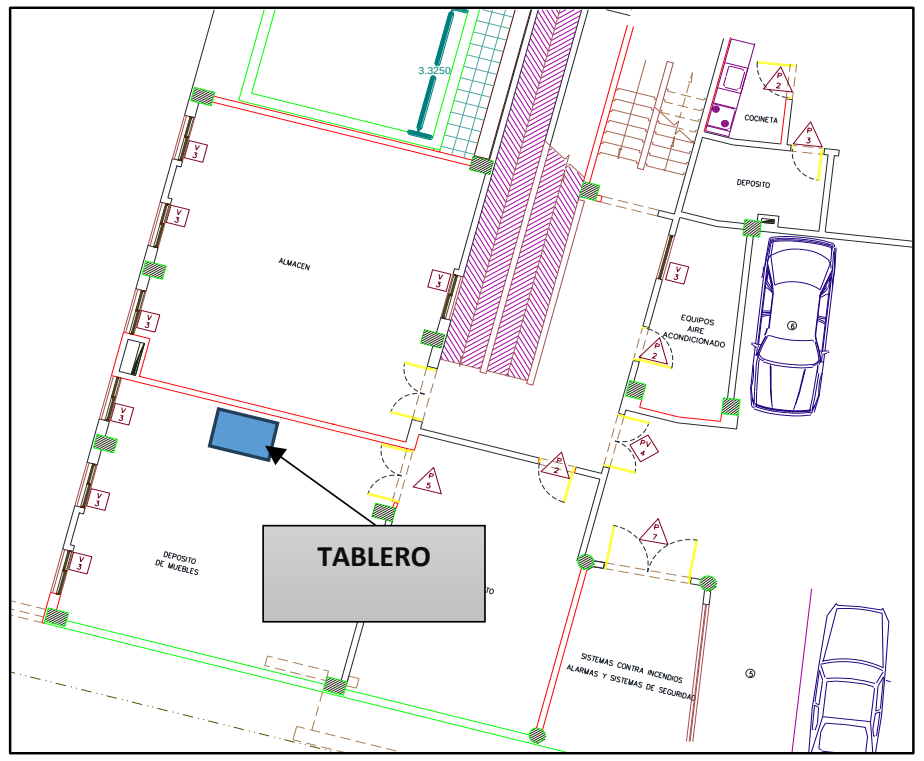





Observaciones

Carlos Mario Garcia Oliva
A08722006-92536604
CONTRATISTA

Juanita Duque Gómez
A17842018-1053835028
INTERVENTORIA/SUPERVISOR
