

CONTRATO DE OBRA 1647-2023
REPROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin
1			**Proyecto Pereira**	**88 días**	**jue 14/9/23**	**lun 15/1/24**
2			Aprobación Balance	0 días	jue 14/9/23	jue 14/9/23
3			Inicio	0 días	lun 18/9/23	lun 18/9/23
4			**Actividades de Obra**	**85 días**	**mar 19/9/23**	**lun 15/1/24**
5	**1**	**1**	**PRELIMINARES**	**85 días**	**mar 19/9/23**	**lun 15/1/24**
6	1.04	1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	1 día	mar 26/9/23	mar 26/9/23
7	1.06	1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	1 día	mié 27/9/23	mié 27/9/23
8	1.07	1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	jue 28/9/23	jue 28/9/23
9	1.08	1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	1 día	mar 19/9/23	mar 19/9/23
10	1.10	1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	lun 25/9/23	lun 25/9/23
11	1.17	1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	10 días	jue 5/10/23	mié 18/10/23
12	1.20	1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	vie 29/9/23	vie 29/9/23
13	1.26	1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	1 día	vie 29/9/23	vie 29/9/23
14	1.33	1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	1 día	mar 19/9/23	mar 19/9/23
15	1.34	1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	1 día	mar 19/9/23	mar 19/9/23
16	1.35	1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODAN	1 día	mar 19/9/23	mar 19/9/23
17	1.37	1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23
18	1.40	1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23
19	1.44	1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	4 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23
20	1.47	1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	2 días	mié 27/9/23	jue 28/9/23
21	1.57	1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OE	4 días	mar 19/9/23	vie 22/9/23
22	1.66	1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	8 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23
23	1.67	1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN	2 días	vie 12/1/24	lun 15/1/24
24	1.73	1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	3 días	mar 19/9/23	jue 21/9/23
25	1.74	1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,	45 días	mar 19/9/23	lun 20/11/23
26	1.75	1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,	15 días	mar 21/11/23	lun 11/12/23
27	**2**	**2**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**15 días**	**lun 18/12/23**	**vie 5/1/24**
28	2.09	2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	5 días	lun 1/1/24	vie 5/1/24
29	2.10	2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	lun 1/1/24	mié 3/1/24
30	2.18	2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
31	2.19	2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23
32	2.21	2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23
33	**3**	**3**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**26 días**	**vie 24/11/23**	**vie 29/12/23**
34	3.04	3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	1 día	mié 6/12/23	mié 6/12/23
35	3.05	3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO I	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23
36	3.11	3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	7 días	vie 24/11/23	lun 4/12/23

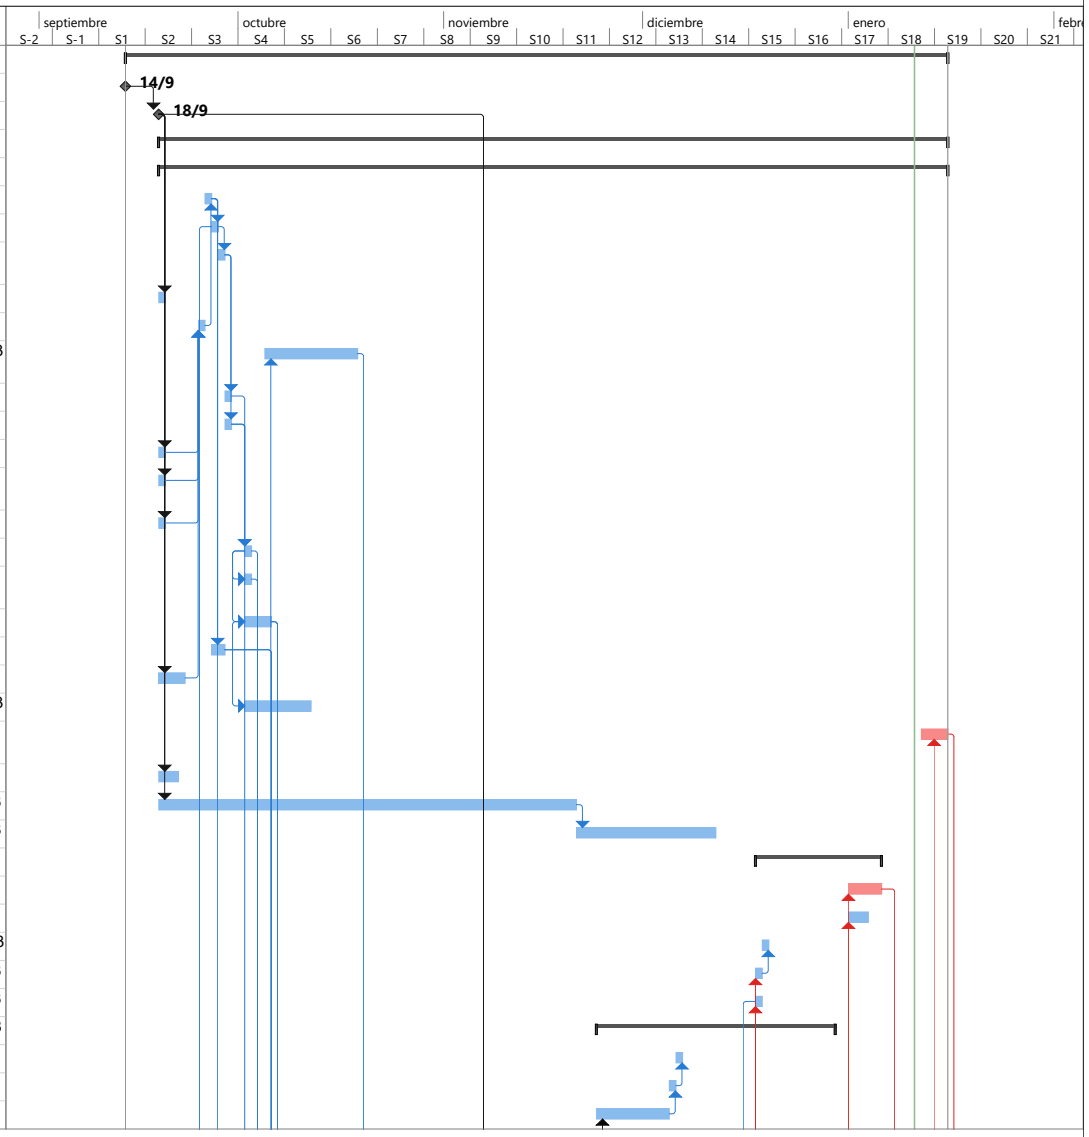

CONTRATO DE OBRA 1647-2023
REPROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin
37	3.17	3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYI	5 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23
38	3.18	3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEI	10 días	lun 18/12/23	vie 29/12/23
39	3.20	3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23
40	**4**	**4**	**CIELORRASOS**	**6 días**	**mié 27/9/23**	**mié 4/10/23**
41	4.06	4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA M	6 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23
42	**5**	**5**	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**25 días**	**vie 6/10/23**	**jue 9/11/23**
43	5.03	5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	25 días	vie 6/10/23	jue 9/11/23
44	**6**	**6**	**CUBIERTAS**	**3 días**	**lun 2/10/23**	**mié 4/10/23**
45	6.17	6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	3 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23
46	**7**	**7**	**ENCHAPE MUROS**	**10 días**	**vie 10/11/23**	**jue 23/11/23**
47	7.05	7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	10 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23
48	**10**	**10**	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**20 días**	**lun 13/11/23**	**vie 8/12/23**
49	10.02	10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	20 días	lun 13/11/23	vie 8/12/23
50	**11**	**11**	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**20 días**	**jue 19/10/23**	**mié 15/11/23**
51	11.03	11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5M	20 días	jue 19/10/23	mié 15/11/23
52	**12**	**12**	**MAMPOSTERÍA**	**1 día**	**vie 6/10/23**	**vie 6/10/23**
53	12.07	12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
54	**13**	**13**	**PINTURAS**	**40 días**	**jue 5/10/23**	**mié 29/11/23**
55	13.04	13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	2 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23
56	13.10	13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	12 días	vie 10/11/23	lun 27/11/23
57	13.11	13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	7 días	jue 5/10/23	vie 13/10/23
58	**14**	**14**	**PISOS**	**27 días**	**mar 3/10/23**	**mié 8/11/23**
59	14.05	14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	8 días	jue 19/10/23	lun 30/10/23
60	14.15	14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	12 días	mar 3/10/23	mié 18/10/23
61	14.16	14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23
62	**15**	**15**	**RED ELÉCTRICA**	**9 días**	**vie 6/10/23**	**mié 18/10/23**
63	15.09	15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/D	3 días	lun 16/10/23	mié 18/10/23
64	15.11	15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPOI	1 día	lun 16/10/23	lun 16/10/23
65	15.15	15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23
66	15.16	15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23
67	15.25	15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	3 días	vie 6/10/23	mar 10/10/23
68	15.29	15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
69	15.30	15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
70	15.31	15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	2 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23
71	15.40	15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EM	3 días	vie 6/10/23	mar 10/10/23
72	15.46	15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23
73	15.50	15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
74	**16**	**16**	**RED HIDRÁULICA**	**60 días**	**jue 5/10/23**	**mié 27/12/23**
75	16.05	16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23

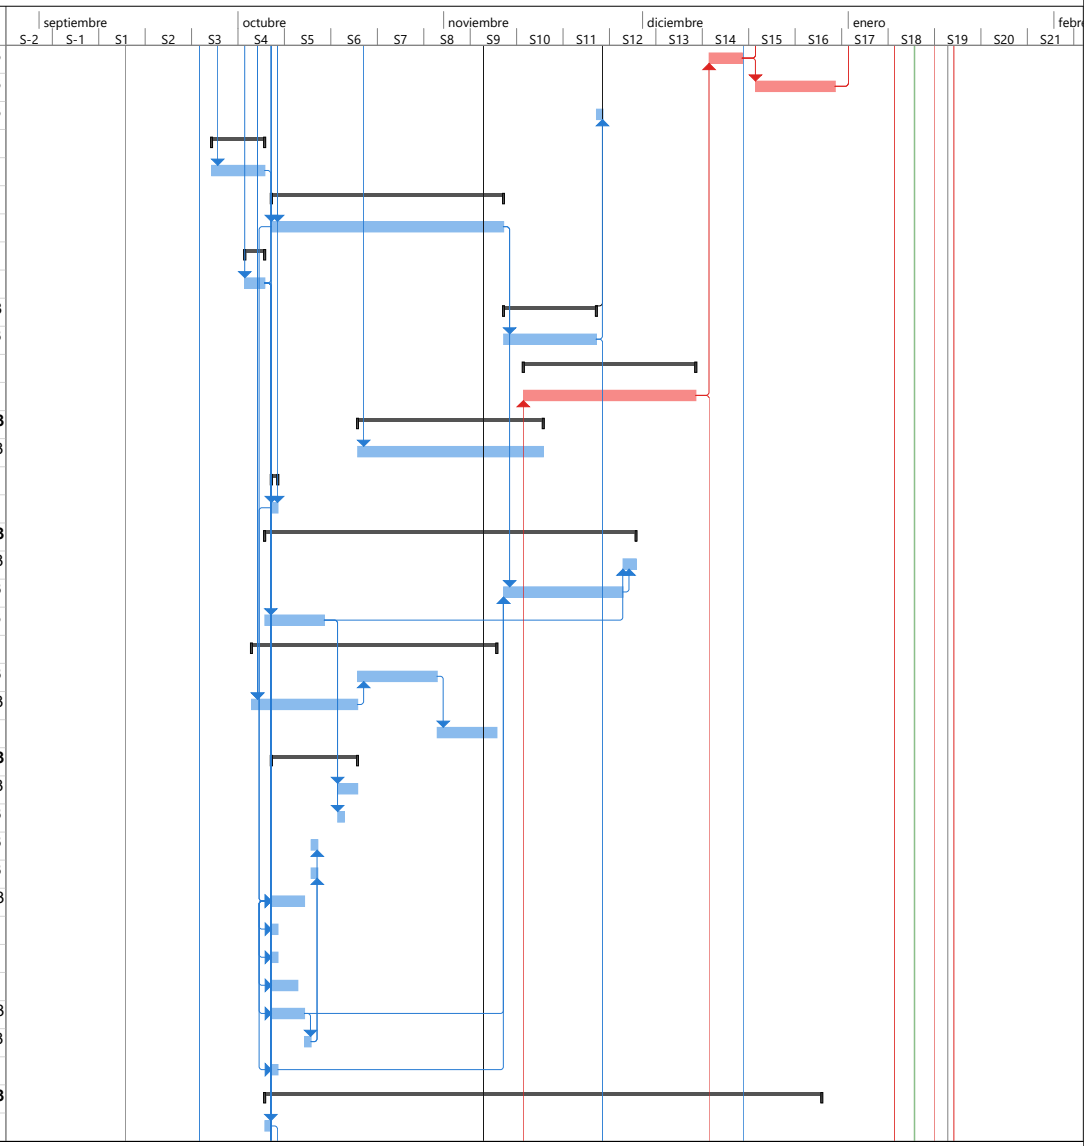

CONTRATO DE OBRA 1647-2023
REPROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin
76	16.07	16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23
77	16.08	16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23
78	16.09	16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23
79	16.11	16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23
80	16.19	16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23
81	16.21	16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	1 día	lun 27/11/23	lun 27/11/23
82	16.23	16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	mar 26/12/23	mié 27/12/23
83	16.26	16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN G	1 día	lun 27/11/23	lun 27/11/23
84	16.29	16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
85	16.32	16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PA	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23
86	16.33	16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PA	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23
87	**17**	**17**	**RED SANITARIA**	**43 días**	**jue 5/10/23**	**lun 4/12/23**
88	17.02	17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23
89	17.05	17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	3 días	jue 5/10/23	lun 9/10/23
90	17.12	17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23
91	17.14	17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23
92	17.20	17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23
93	17.27	17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN D	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23
94	17.28	17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	3 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23
95	17.29	17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLA	1 día	lun 4/12/23	lun 4/12/23
96	**18**	**18**	**URBANISMO**	**1 día**	**mar 12/12/23**	**mar 12/12/23**
97	18.02	18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23
98	**19**	**19**	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**24 días**	**mar 12/12/23**	**vie 12/1/24**
99	19.01	19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	5 días	lun 8/1/24	vie 12/1/24
100	19.02	19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23
101	19.03	19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23
102	19.04	19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23
103	19.05	19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23
104	19.07	19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23
105	**20**	**20**	**NO PREVISTOS**	**59 días**	**mié 27/9/23**	**lun 18/12/23**
106	NP-0	NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	1 día	mié 27/9/23	mié 27/9/23
107	NP-0	NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23
108	NP-0	NP-03	RETIRO DE GRAFITI	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23
109	NP-0	NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23
110	NP-0	NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23
111	NP-0	NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23
112			**Fin**	**0 días**	**lun 15/1/24**	**lun 15/1/24**

