
ACTA		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS A CONTRATISTA CONTRATO CO1.PCCNTR. 5696029 DE 2023		
CIUDAD Y FECHA: 30 de jul. de 24	**HORA INICIO:** 08:00	**HORA FIN:** **09:00**
LUGAR Y/O ENLACE: Centro Multisectorial Ternera Bloque B Centro de Comercio y Servicios, ascensor media cabina	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: revisión de compromisos contractuales de la empresa Inardex		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Establecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa Inardex relacionada con la entrega del contrato CO1.PCCNTR. 5696029 DE 2023 con el fin de cerrar el proceso respectivo bajo condiciones de funcionalidad, seguridad y operatividad del sistema		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

A continuación, se citan los compromisos y las acciones llevadas a cabo:

- Punto 3, se refuerza la puerta del hall con láminas de aluminio para brindar mejor seguridad al pasajero, entonces queda la puerta con lámina de acrílico y el refuerzo de dos láminas de aluminio; en la parte trasera del hall se refuerza la estructura con dos ángulos en acero con el fin de ofrecer al pasajero la seguridad necesaria anta eventuales situaciones propias del funcionamiento del aparato o de índole natural, cambio de cerradura en puerta para mayor seguridad.



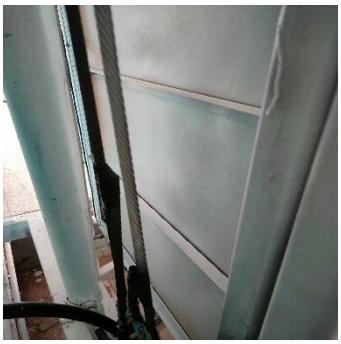

- Punto 4, se realiza aplicación de producto plástico asfaltado para el mejor agarre en la superficie del piso haciendo la salvedad que está soportado con lámina de acero con pintura anticorrosiva, el requerimiento se centra en la seguridad del pasajero para que una vez se produzca el desplazamiento se logre la mejor fijación de los medios de transporte y ayudas para su movilidad.



- Punto 2, instalación de pasamanos lateral en aluminio a la altura reglamentaria, este accesorio es importante para los usuarios pues permite el agarre durante el tiempo de transporte y a la vez brinda mayor fuerza a la estructura, adicional a esto se colocan los avisos respectivos y cinta fluorescente para que en caso de pérdida del fluido eléctrico se tenga la posición exacta del ascensor y tomar las mediad del caso





- Punto 1, se aplica pintura en poliuretano con una base de fijación teniendo en cuenta que para la pintura electrostática requería el desmonte de la cabina, aspecto que se consideró debido a la disposición del contratista y el tiempo de entrega cada vez más largo, el contratista garantiza que con esta pintura no se producirán transferencias de electricidad a los pasajeros



CONCLUSIONES

Una vez atendidos estos requerimientos se procede a realizar pruebas con pasajeros las cuales resultaron satisfactorias en cuanto a desplazamiento y seguridad, se anota que en el día de ayer hubo inconvenientes con la parte electrónica, luego de ajustes de piezas finalmente se pudo probar el aparato el cual sostiene la la garantía para funcionar de manera óptima una vez el Sena logre las adecuaciones necesarias para puesta en marcha y apertura a la población objetivo

Recomendaciones; quedamos atentos a los mantenimientos del ascensor y el apoyo una vez de se disponga el funcionamiento del aparato para los usuarios respectivos en cuanto al ajuste de los sensores en el nivel 2

A continuación, se citan los compromisos y las acciones llevadas a cabo:

- se refuerza la puerta del hall con láminas de aluminio para brindar mejor seguridad al pasajero, entonces queda la puerta con lámina de acrílico y el refuerzo de dos láminas de aluminio; en la parte trasera del hall se refuerza la estructura con dos ángulos en acero con el fin de ofrecer al pasajero la seguridad necesaria anta eventuales situaciones propias del funcionamiento del aparato o de índole natural, cambio de cerradura en puerta para mayor seguridad.

- se realiza aplicación de producto plástico asfaltado para el mejor agarre en la superficie del piso haciendo la salvedad que está soportado con lámina de acero con pintura anticorrosiva, el requerimiento se centra en la seguridad del pasajero para que una vez se produzca el desplazamiento se logre la mejor fijación de los medios de transporte y ayudas para su movilidad.

- instalación de pasamanos lateral en aluminio a la altura reglamentaria, este accesorio es importante para los usuarios pues permite el agarre durante el tiempo de transporte y a la vez brinda mayor fuerza a la estructura, adicional a esto se colocan los avisos respectivos y cinta fluorescente para que en caso de pérdida del fluido eléctrico se tenga la posición exacta del ascensor y tomar las medidas del caso

- se aplica pintura en poliuretano con una base de fijación para mejor adhesión de la pintura; cabe anotar que para la aplicación de pintura electrostática se requería el desmonte de la cabina, aspecto que ocasionaba un retraso considerable en la entrega, se tuvo en cuenta también la disposición del contratista y el tiempo de entrega que se hacía cada vez más más largo, el contratista garantiza que con esta pintura no se producirán transferencias de electricidad a los pasajeros

- Una vez atendidos estos requerimientos se procede a realizar pruebas con pasajeros las cuales resultaron satisfactorias en cuanto a desplazamiento y seguridad, se anota que en el día de ayer hubo inconvenientes con la parte electrónica, luego de ajustes de piezas finalmente se pudo probar el aparato el cual sostiene la garantía para funcionar de manera óptima una vez el Sena logre las adecuaciones necesarias para puesta en marcha y apertura a la población objetivo

En conclusión, se puede decir que luego de realizar las acciones encaminadas a la conclusión del contrato en mención, teniendo en cuenta la importancia del mismo, se ha dado cumplimiento a las exigencias de la entidad de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo.

ASISTENTES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
GAMALIEL DE JESUS BOHORQUEZ VELLOJIN	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
