INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (02 de Julio 2024)

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR. 5696029DE 2023.
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE UN ASCENSOR MEDIA CABINA PARA LA UTILIZACION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL BOLIVAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 74.499.998
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 74.499.998
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES INARDEX E U	MARIA ROSABETH JIMENEZ RAMIREZ-
NIT:	832010241-1
SUPERVISOR:	GAMALIEL BOHORQUEZ VELLOJIN
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(28-12-2023 a 31-12-2023)
PRORROGA 1:	15 de febrero de 2024
PROROGA 2:	17 de mayo de 2024
ACTA DE REINICIO	24 DE junio de 2024 Uber link Colombia S.A.S
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE CARTAGENA
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	29/12/2023
FECHATERMINACIÓN CONTRATO:	08 de Julio de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	2023-2024

Luego de consulta a operario de la empresa Uber Link encargada de la ejecución contractual describimos la situación así:

- Estructura para desplazamiento dispuesta para operación de la plataforma con avance para la operación del elevador; se realiza prueba satisfactoria de desplazamiento del sistema mecánico y funcionamiento del motor

- En la caja eléctrica instalada por la empresa contratista es necesario cambiar las cuñas por unas originales que garanticen el funcionamiento óptimo del sistema de plataforma pues las que tenían no son de buena calidad


- Se procede a armar la cabina de pasajeros para incorporarla al sistema; por parte del arquitecto surge una duda acerca del vidrio a utilizar ante lo cual se hace la respectiva pregunta al encargado de la instalación quien nos comenta que los vidrios a utilizar garantizan la seguridad de los pasajeros y personas que circulan en el área ante un eventual quiebre


- Durante la inspección se observa desde mi inexperta opinión que de un lado del sistema de rieles el sistema de agarre es un poco más corto a lo que el señor Freddy me informa que garantiza la seguridad del sistema

- En construcción el sistema de llamado del elevador el cual consiste en la instalación de parales en primero y segundo piso donde se encuentran los botones para funcionamiento

- Se hace la recomendación de adecuar la entrada a la plataforma en segundo piso aspecto no contemplado en presente contrato, inmediatamente se dispone a un operario de servicios generales para efectuar las labores necesarias según instrucciones

- Queda pendiente un punto de anclaje de la estructura metálica, lo cual debe hacerse según requerimiento de la encargada de SST Katya Merlano

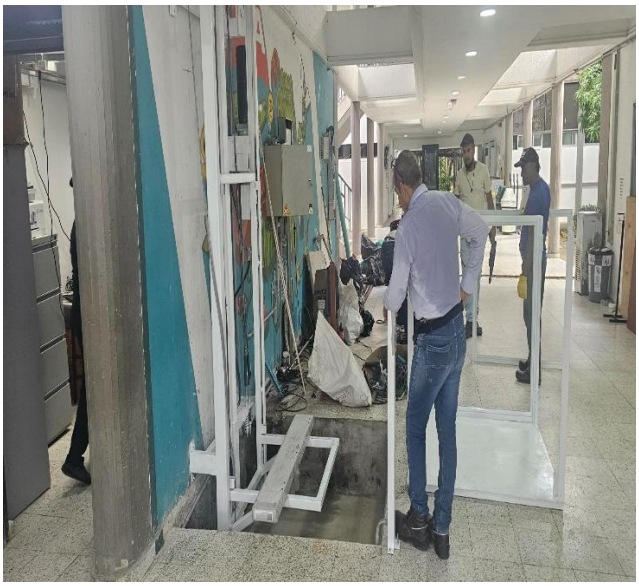

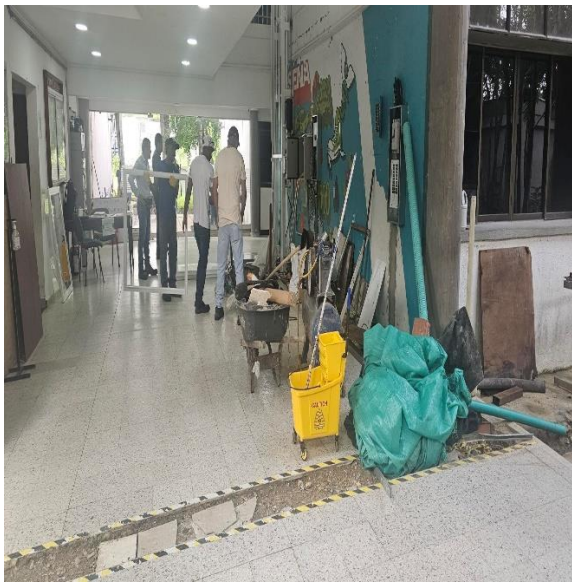





SUPERVISOR DEL CONTRATO
GAMALIEL BOHORQUEZ
