TOTALL INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	Código: GI-FO-002 Versión: 2 Página 1 de 1 Fecha de emisión: 30/03/2022

(Diligenciar en caso de asociaciones temporales) Union temporal ☐ Consorcio ☐

Nombre: Supernotariado Nit.:

ACTA N°

Interna ☐ Externa ☒

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 27-10-2023 HORA INICIO: 4:00 PM HORA FINAL: 6:10 PM

DEPENDENCIAS / EMPRESA: TOTALL SAS.

PROYECTO: NA

UBICACIÓN: Sala de juntas

TEMA A TRATAR: Estado Actual de los proyectos

Reunión ☐ Comité ☒

2. ASISTENTES

Nombres	Dependencia/Empresa	Firmas
Edgar Daza	Director obra	
Katherine Cuañarita	ingeniera HSQ interventoría	
Fernando Jimenez	Director interventoría	
Laureano Granados	Coordinador proyecto	

3. ORDEN DEL DÍA

1) Revisión del estado de Avances en las obras

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se Revisa el estado de ejecucio de las obras de la Siguiente manera.

i. Cali, las obras estan AVANZANDO de buena manera alcanzando y Superando el porcentaje de Atraso que se venia Generando. Se espera Subir el porcentaje de Atraso.

ii. el bordo de acuerdo Con los informes semanals ha tenido un Avance en ejecucion de obras, se espera para las proximas Semanas.

iii. Pereira: esta sede se encuentra avanzando en los enchapes de las terrazas se espera para la proxima semana igualar ó superar el tema del atraso.

iv. Frontino: Contratista manifiesta no recibir una Respuesta sobre la Suspensión de terminos estan en espera por parte de la interventoria y la Supervisión.

- Situacion de Retraso.
- Como se va a Recuperar atrasos.
- Suspension de terminos
- Horarios adicionalmente
- Personal para qué actividades
- Material para qué actividades.
- Cuando llegan??

} para el plan de Contingencia

- se deja constancia que el Contratista demostró su Justificacion para la impermeabilizacion. Area impermeabilizada (≠ 560 M². Con un avance aprox. 39.45% Vs 50% programado, se Requiere hacer ajuste con plan de Contingencia. Viabilizado por el Arq. Fernando Jimenez — Director Interventoria.


V. IOTMINA: se debe Revisar nuevamente los porcentajes del informe Semanal Vs. entre obra y Interventoria.

Las obras a pesar que ~~iniciaron~~ iniciaron tarde ya estan empezando a ejecutarse. se solicita al contratista enviar Comunicado ~~Cuando iniciar~~ llega material a obra.

Vi. Sevillas
~~Frontino~~ se espera meter mas ~~personal~~ trabajadores, del al Material para la Cobierta llega para el dia martes 31 de octubre., asi mismo, enchape, cielo Raso, estructura...

SST.

- IOTMINA: se hace la observación por el personal profesional de la interventoria hace Referencia al manejo de Sobrante, donde lo están instalando están sin Señalizacion.

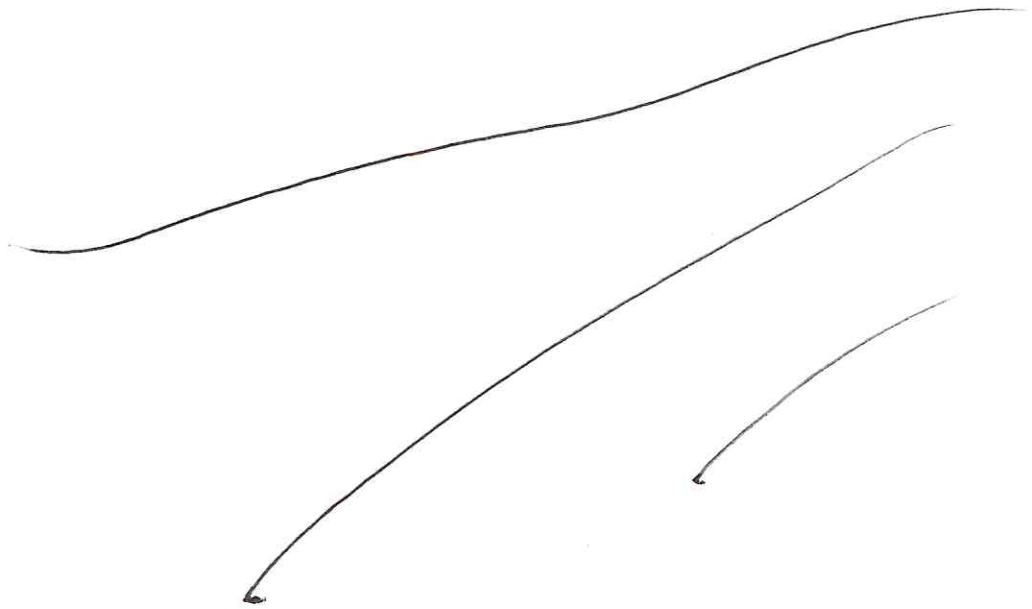

4. Cada uno de los integrantes del comité, exponen sus ideas en pro al diseño e implementación del sistema de gestión integrado.

Actividad	Responsable	Fecha
plan de Contingencia	EDGAR DAZA – Director obra	30-10-2023
enviar oficios SST por interventoria	Katherine Guasgueta	28-10-2023
informes SST septiembre y octubre	EDGAR DAZA – Director obra	31-10-2023

6. CIERRE

ELABORADO POR: Jaureano Gracedo M

CARGO: Coordinador proyectos
