04'11 2023 BITACORA DE OBRA (20)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

04/11/2023

Estado de dia: Dia soleado y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM.

PERSONAL EN OBRA:

- Residante
- Maestro de obra
- Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo Alistado de piso 4cm impermeabilizado, puntos de desagve de 3" y 4" y reposición de piso afinado (E= 5 cm).

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residante interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

1 BITACORA DE CAMPO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA.

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ITSMINA - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRAS Nº. 1674 DE 2023

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S

INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN: TOTALLINC

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES (13 ORIP)

12 10 23 BITACORA DE CAMPO

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJUCUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

12/10/2023

Se realizo reunión con el registrador y los trabajadores, donde se dio a conocer el personal, el acta de ingreso y el cronograma de actividades.

13 10 23 BITACORA DE CAMPO (1)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRULTARA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

13/10/2023
Estado de día: Dia nublado
Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1. Residente de obra
1. Maestro de obra
2. Ayudandes

Actividad de Obra:

Se realizó aislamiento del sitio de obra, de acuerdo a la programación, se comenzó con la demolición de poyo en concreto en la cocina y demolición de muro. (E=15-25cm). DEMOLICIÓN de mesón cocina (E=6-12cm)

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Taladro eléctrico
- Herramienta menos

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:
Nelder Palacios Palacios

14 10 23 BITACORA DE CAMPO (2)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

14/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra.

Se continuo con la demolición de muro y se realizó demolición de pañete muro. (E=1-3(M), desmonte sanitario y lavamanos.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Taladro electrico
- Herramienta menor

15/10/2023 DESCANSO.

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castello M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
Nelder Palomeque Palomeque

16 10 23 BITACORA DE CAMPO ③

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

16/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1. Residente de obra
1. Maestro de obra
2. Ayudandes

Actividad de Obra

se continuo con la demolición de muro (E=15-25(M) y Pañete muro (E=1-3(M).

Se realizó igualmente demolición de piso, desmonte de puerta, desmonte de marco metalico para puerta y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

17 10 23 BITACORA DE CAMPO (4)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CITOCÓ

17/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

se realizo la continuación de demolicion de pañete muro (E-1-3(M), demolición de acabado piso, demolición de enchape de muro y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramientas menor

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

18 10 23 BITACORA DE CAMPO (5)

PROCEDIMIENTO : MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN : ISTMINA - CHOCÓ

18/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: Dia Nublado y soleado 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizó la continuación de demolición de acabado piso, demolición de guardaescoba, demolición de placa contrapiso (E=10-12(M) y retiro de escombros, igual que protección de mobiliario durante obra.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Talabro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Nelder Pallares Pallares

19 10 23 BITACORA DE CAMPO (6)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

19/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizo la continuación de demolición de acabado piso, demolición de guardaescoba, demolición de placa de contrapiso (e=10-15cm) y retiro de escombro, igual que protección de mobiliario durante obra.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelson Palacios Palacios

20 1023 BITACORA DE CAMPO (7)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

20/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7.00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo excavación manual en material común, demolición afinados de piso E=5 cm, Regata sobre muro mas resane, demolición de placa de contra-piso (E=10-15 cm) y retiro de escobros.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladra electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE INTERVENTORIA:

Elkin Samir Castillo M: Nelcler Palacios Palacios

21 | 023 BITACORA DE CAMPO (8)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

21/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 am

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra.

Se realizó la continuación de excavación manual en material comun, demolición de placa contra-piso, desmonte de canaleta plastica y metalica de red de voz y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Taladra electrico
- Herramienta menor

22/10/2023

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Nelson Palomeque Palacios

23/10/23 BITACORA DE CAMPO (9)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA- CHOCÓ

23/10/2023

Estado de dia: dia nublado y soleado

Hora de INICIO: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo caja de inspección .80X.80cm, sondeo y limpieza debajante aguas lluvias, instalación de tuberia sanitaria de 2", 3" y 4". y demolición acabado de piso.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Nolder Palacios Palacios

24 10 23 BITACORA DE CAMPO (10)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

24/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizo excavación en material común, instalación de tubería de 2", 3" y 4" sanitaria, puntas de desagues de 3" y 4"; trelleno material de prestamo seleccionado y reposición de placa de contrapiso (e=10-15cm) con malla electrosoldado de 15x15 cm 5mm.

* Equipos y Herramientas

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin samir castillo M

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelder Palacios Palacios

25 10 23 BITACORA DE CAMPO (11)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

25/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 am

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad de obra:

se realizo la continuación de demolición afinados de pisos (ϵ=5cm), reposición de placa de contrapiso (ϵ=10-15), con malla electrosoldada de 15x15 cm 5mm, caja de inspección .80x.80 cm, muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

26 10 23 BITACORA DE CAMPO (12)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

26/10/2023

Estado de dia: Dia soleado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

se realizo muro ladrillo prensado livrano, reposición de placa de contrapiso (e=10-15 cm) con malla electrosoldada de 15 x 15 cm 5mm y desmonte de vidro para ventanas.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Elkin Samir Castillo M.

27 10 23 BITACORA DE CAMPO (13)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

27-10/2023

Estado de día: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 MAestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizó la continuación de demolición afinados de pisos (E=5cm), muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M. Nelder Palacios Palacios

28/10/23 BITACORA DE CAMPO (14)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

28/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizó la continuación de demolición afinados de piso (E=5cm), desmonte de ventana metalica, muro ladrillo prensado limpio, demolición de guarda-escoba, Reposición de placa de contrapiso (E= 5 cm) y retiro de escombro.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

29/10/2023

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

14/10/2023 pica de ladrillo area Atencion al publico y archivo proteccion mobiliario lijada estuco Area patio Luminacion, se inicia Revoque mortero 1:3 Atencion al publico Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

inspector

15/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico pica de ladrillo Area Archivos y proteccion mobiliario aseo General personal en obra oficiales 3 Auxilia - construccion 1

inspector

16/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico picada de ladrillo oficina funcionarios proteccion mobiliario ingreso y acopio de material (Rio) Arena ubicacion patio Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

inspector

17/10/2023 mortero Revoque 1:3 Areas de Archivos proteccion estanterias Archivos moviles con plastico estuco plastico area Atencion al publico Aseo general oficiales 3 Auxiliar construccion 1

inspector

18/10/2023 mortero Revoque 1:3 areas de archivos proteccion Archivos moviles con polietileno proteccion de pisos Aseo general estuco plastico Atencion al publico personal de obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

inspector

03/10/2023 se continua Mortero de Revoque 1:3 en Area de pasillo se inicia alistado de sitio en Area pasillos De baños y cocineta para mortero Revoque se inicia estuco plastico en cuarto de insumos primera mano

Inspector:

04/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillos de baños y cocina se continua estuco segunda mano cuarto de insumos Aseo y primera mano pasillo

Inspector:

05/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baño y cocina se inicia tercera capa estuco plastico Area insumos y segunda mano en pasillo

Inspector:

06/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baños y cocineta se lija Area de insumos y se aplica capa de pintura Tercera mano estuco plastico Area pasillos
- se Realiza visita interventoria

Inspector:

capturada en moto g(60)s
11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

07/10/2023 alistamiento Area patio luminacion y proteccion de ventana y puertas inicio mortero de Revoque 1:3 primera capa estuco area pasillos baño y cocina

Inspector:

08/10/2023 segunda capa Area de pasillos baño y cocina Desmonte cielorraso atencion al publico oficina 2 Aseo General patio y areas intervenidas

Inspector

09/10/2023 primera capa de estuco patio luminacion Lijada estuco en pasillo de baños y cocina Revoque cuarto de locker Aseo

. se analiza que el cableado luminario De la oficina de Registro presenta problemas se verifica que el cableado esta a la vista plesenta peladuras y empalmes no certificados empalmes entre alambre y cable Duplex para puntos de tomacorrientes

Inspector:

capturada en moto g(60)s

11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

Numero del contrato: 167 de 2023

clase de contrato: obra

localizacion: Frontino Antioquia

objeto: contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste a las obras de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan oficinas de Registro de instrumentos publicos

contratante: superintendencia de notariado y Registro

contratista: soluciones integrales union SAS
Nit: 800 205 914-1
R. legal: Flaminio Sanchez

interventoria:

inspector: Ricardo Bonilla Zuleta

Fecha inicio:

tiempo duracion:

capturada en moto g(60)s
11 de oct. de 2023 12:37 p. m.

28/09/2023 Continuan con la picada del ladrillo y a su vez inician Desmonte cielorraso Fibramineral areas de pasillos cuarto de insumos

Inpector:

29/09/2023 se continua picada de ladrillo area de pasillo y patio iluminacion Desmonte de cieloRaso
- se Realiza visita por parte de interventoria

Inpector:

30/09/2023 se Realiza ingreso de material de Rio Arena Revoque Cemento Herramienta menor para iniciar Revoques en Areas de insumo de aseo y a su vez se acopia el material en sitio estipulado patio

Inpector:

1/10/2023 se inicio mortero de Revoque 1:3 Area de insumo de aseo y pasillos tambien se Realiza proteccion Del inmueble computadores ventanas y puertas

Inpector:

02/10/2023 se continua mortero de Revoque 1:3 Area insumo de aseo y pasillos

Inpector:

capturada en moto g(60)s
11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

20/09/2023 se realizo reunion con el registrador donde nos informa que la autorizacion por parte de la superintendencia no ha llegado por lo cual el personal no puede ingresar al sitio de trabajo

INSPECTOR:

21/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

22/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

23/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

25/09/2023 se informa al personal la autorizacion para hacer ingreso y dar comienzo a la ejecucion de obra
se realiza alistamiento de sitio para despejar areas de trabajo

INSPECTOR:

26/09/2023 se inica picada de ladrillo para retirar la capa de laca y permitir que el mortero 1:3 adhiera a la superficie

INSPECTOR:

27/09/2023 se continua con la picada del ladrillo en areas de pasillos y cuarto de insumo de aseo

INSPECTOR:

28/09

29/09

30/09

1/1

02/1

capturada en moto g(60)s
11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

Bitacora 2023

Numero del contrato: 167 de 2023

clase de contrato: obra

localizacion: Frontino Antioquia

Objeto: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste a las obras de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan oficinas de Registro de instrumentos publicos

Contratante: superintendencia de notariado y Registro

Contratista: soluciones integrales union S.A.S
Nit: 800 205 914-1
R. legal: Flaminio Sanchez

Interventoria: totall inc SAS. BIC
Nit:
Inpector: Ricardo Bonilla Zuleta

Fecha inicio: 20/09/2023

tiempo duracion: 2 meses 24 Dias

20/09/2023 se Realizo REUNION con el Registrador DONDE NOS INFORMA que la autorizacion por parte de la superintendencia no ha llegado por lo cual el personal NO puede ingresar al sitio de trabajo

INSPECTOR:

21/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

22/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

23/09/2023 SIN autorizacion para ingreso del personal

INSPECTOR:

25/09/2023 se INFORMA al personal la autorizacion para hacer INGRESO y dar COMIENZO a la ESECUCION de obra se Realiza alistamiento de sitio para Despejar Areas de trabajo

INPECTOR:

26/09/2023 se INICA picada de ladrillo para Retirar la capa de laca y permitir que el mortero 1:3 ADHiera A la superficie

INPECTOR:

27/09/2023 se CONTINUA CON la picada del LADRILLO EN Areas de pasillos y cuarto de INSUMO de aseo

INPECTOR:

28/09/2023 Continuan con la picada del ladrillo y a su vez inian Desmonte cielorraso Fibra mineral aveas de pasillos cuarto de insumos

Inpector:

29/09/2023 se continua picada de ladrillo area de pasillo y patio iluminacion Desmonte de cielorraso
- se Realiza visita por parte de interventoria

Inpector:

30/09/2023 se Realiza ingreso de material de Rio Arena Revoque Cemento Herramienta menor para iniciar Revoques en Areas de insumo de aseo y a su vez se acopia el material en su sitio estipulado patio

Inpector:

1/10/2023 se inicia mortero de Revoque 1:3 Area de insumo de aseo y pasillos tambien se Realiza proteccion Del inmueble computadores ventanas y puertas

Inpector:

02/10/2023 se continua mortero de Revoque 1:3 Area insumo de aseo y pasillos

Inpector:

03/10/2023 se continua Mortero de Revoque 1:3 en Area de pasillo se inicia alistado de sitio en Area pasillos De baños y cocineta para mortero Revoque se inicia estuco plastico en cuarto de insumos primera mano

Inspector:

04/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillos de baños y cocina se continua estuco segunda mano cuarto de insumos Aseo y primera mano pasillo

Inspector:

05/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baño y cocina se inicia tercera capa estuco plastico Area insumos y segunda mano en pasillo

Inspector:

06/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baños y cocineta se lija Area de insumos y se aplica capa de pintura tercera mano estuco plastico Area pasillos
- se Realiza visita interventoria

Inspector:

07/10/2023 alistamiento Area patio luminacion y proteccion de ventana y puertas inicio mortero de Revoque 1:3 primera capa estuco Area pasillos baño y cocina persona en obra oficiales 3 Auxiliar de construccion 1
Inspector:

08/10/2023 segunda capa Area de pasillos baño y cocina Desmonte cielo raso atencion al publico oficina 2. Aseo General patio y areas intervenidas
Personal en obra oficiales 3 Auxiliar de construcción 1
Inspector

09/10/2023 primera capa de estuco patio luminacion Lijada estuco en pasillo de baños y cocina Revoque cuarto de locker, Aseo obra
- se analiza que el cableado luminario de la oficina de Registro presenta problemas
se verifica que el cableado esta a la vista plesenta peladuras y empalmes no certificados empalmes entre alambre y cable Duplex para puntos de tomacorrientes.
- personal en obra oficiales 3 Auxiliar de construccion 1

Inspector:

10/10/2023 se Realiza segunda capa de estuco plastico pasillos y patio luminacion mortero de Revoque 1:3 Area de Archivo 2, proteccion del inmueble, Desmonte estructura cielo raso Area de Archivo.
Se evidencia que el cableado Red de Datos presenta daños, conexiones interferidas y solucionadas con cinta aislante, cable de redes mezclado con cableado electrico cableado de redes expuesto
Personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar de construccion
Inspector:

12/10/2023 se Realiza mortero 1:3 impermeabilizado con sika 1 en el area del patio se continua con el estuco plastico en patio de iluminacion y cuarto locker Aseo general al finalizar la Jornada laboral
personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar de construccion

Inspector

12/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado con sika 1 en el area del patio estuco plastico en patio luminacion cuarto de locker pasillo Aseo genal
Personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion

INpector

13/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado estuco en areas de las oficina de Registro de instrumentos publicos proteccion mobiliario Area Antencion al publico para iniciar pica de ladrillo para Retiro capa de laca y permitir la correcta Adherencia del mortero personal obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion
se Realizo visita interventoria

11/10/2023 se Realiza mortero 1:3 impermeabilizado con Sika 1 en el area Del patio se continua con el estuco plastico en patio de iluminacion y cuarto locker Aseo general al finalizar la Jornada laboral
personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar de construccion

Inspector

12/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado con sika 1 en el area del patio estuco plastico en patio luminacion cuarto de locker pasillo Aseo genal
Personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion

INspector


13/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado estuco en areas de las oficina de Registro de instrumentos publicos proteccion mobiliario Area Antencion al publico para iniciar pica de ladrillo para Retiro capa de laca y permitir la correcta Adherencia del mortero. personal obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion

- se Realizo visita interventoria se identifica que A la fecha no se Cuenta Con personal de Seguridad y Salud en el trabajo, Requerimiento Fundamental para el trabajo en Alturas, y obligación Contractual Adicionalmente Con el desmonte de cielo entablado manual, se identifica que la red electrica de las luminarias estan en Cable duplex N° 12 y la mayoria de las instalaciones tienen empalme de Cuentas Con cinta, se Recomendó Al Contratista la Realización de Cubierta de Corozos. Item Contractual que a la fecha no se realiza, en reunion Con el Registrador se informo de la situación electrica, por otra parte se Revisa el avance de obra y Segun la programación se tiene un atraso Considerable aproximado Al 33%, A la Fecha no se da inicio Con Actividades de desmonte de Cubierta, instalación de Estructura metalica, o instalacion de Cubierta existe, de parte de la interventoria vemos con gran Preocupación y Con el compromiso que nos plan de Choque adelante.


Auxiliar Camaro P. C.C. 1.802.075.

Inspector


14/10/2023 Pica de ladrillo area Atencion al publico y archivo proteccion mobiliario Lijada estuco Area patio Luminacion. se inicia Revoque mortero 1:3 Atencion al publico Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


15/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico pica de ladrillo Area Archivos y proteccion mobiliario aseo General personal en obra oficiales 3 Auxilia - construccion 1


inspector

16/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico picada de ladrillo oficina funcionarios proteccion mobiliario ingreso y acopio de material (rio) Arena ubicacion patio Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


17/10/2023 mortero Revoque 1:3 Areas de Archivos proteccion estanterias Archivos moviles con plastico estuco plastico area Atencion al publico Aseo general oficiales 3 Auxiliar construccion 1


Inspector


18/10/2023 Mortero Revoque 1:3 areas de archivos proteccion Archivos moviles con polietileno proteccion de pisos Aseo general estuco plastico Atencion al publico personal de obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


19/10/2023 mortero Revoque 1:3 Archivos proteccion oficina funcionarios piso equipos computadores impresoras escritorios de computo con polietileno inicio Revoque mortero 1:3 continuacion mortero 1:3 impermeabilizado Area de patio estuco plastico Area Atencion al publico Aseo general personal en obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1



20/10/2023 mortero Revoque 1:3 Archivo y oficina funcionarios proteccion pisos, equipos computadores, impresoras escritorios de computo, y Archivos Rodantes moviles mortero impermeabilizado Area patio se suspende Actividad por lluvias en horas de la tarde
personal obra 3 oficiales Auxiliar construccion 1



21/10/2023 Mortero Revoque 1:3 Archivo y oficina funcionarios mortero 1:3 impermeabilizado patio
personal en obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1
visita interventoria



22/10/2023 Lizada estuco Area atencion al publico y Archivo Auxiliar Aseo general personal obra oficiales 1 Auxiliar construccion 1

Inspector

23/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios Archivo proteccion pisos computadores impresoras y escritorios Archivos Rodartes Moviles filos y detalles estuco Listo para pintura Area insumo Archivo auxiliar personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

Inspector

24/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios proteccion pisos, computadores, impresoras y escritorios filos y detallado estuco cuarto insumos Archivo Auxiliar Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

Inspector

25/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios Alistamiento Area cuarto de Ram proteccion tableros, Ram Aire acondicionado estuco Area Archivo Aseo general personal obra oficiales 3

Inspector

26/10/2023 mortero Revoque 1:3 cuarto frio ~~Ram~~ se continua con estuco plastico Area Archivo principal y se comienza estuco plastico Area oficina funcionarios Aseo general personal obra oficiales 3

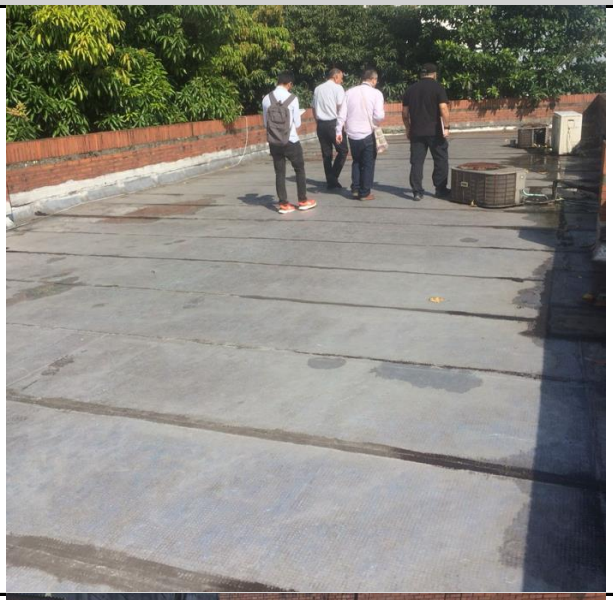
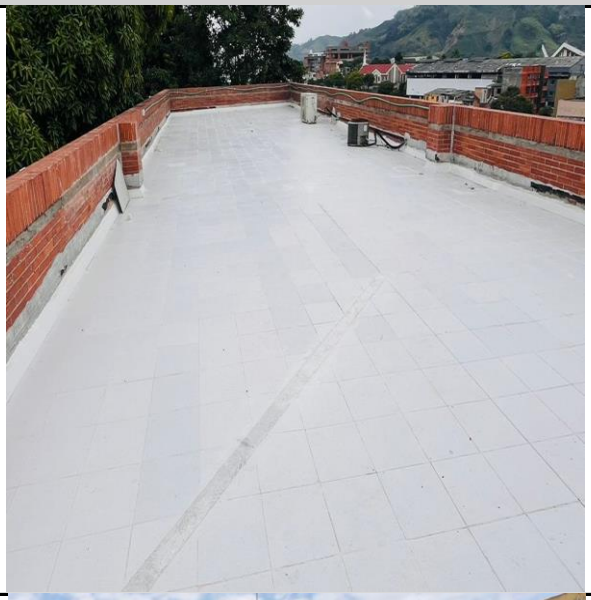
Inspector

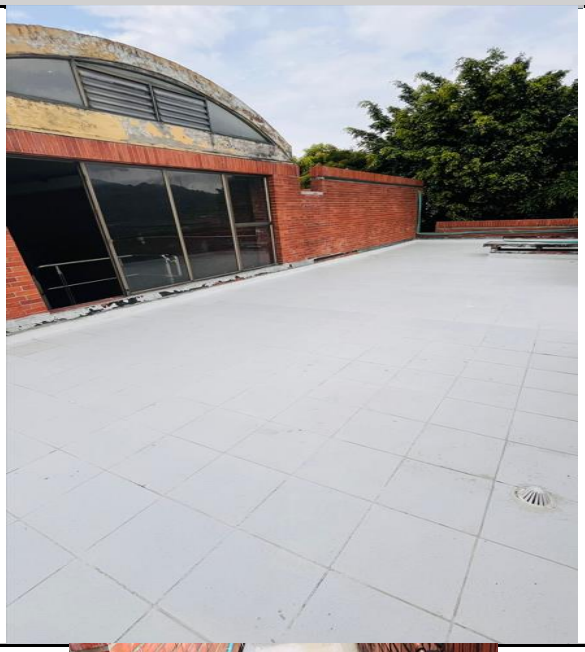
27/10/2023	Continuacion mortero Revoque 1:3 cuarto F.I.O estuco plastico Archivo principal OFICINA FUNCIONARIOS Aislamiento y protección Area OFICINA Registrador para inicion mortero Revoque 1:3 Aseo General personal obra OFICIALES 3 inspector
28/10/2023	En visita de interventoría de Total INC S.A.S. desde el área de SST el día sábado 28 de octubre del 2023, se evidencia incumplimiento en todos los items correspondientes al pliego de condiciones y el marco normativo nacional en la ejecución de actividades correspondientes al área de SST y el cumplimiento del SGSST. Se establece un plazo maximo para la contratación del personal responsable de SST directo y permanente por parte del contratista a más tardar el próximo miércoles 1 de noviembre del 2023 debido al cronograma de actividades operativas en las cuales para dar cumplimiento a los tiempos de las actividades de desmonte de cubierta el día sábado 4 de noviembre se debe haber ejecutado una inspección de riesgos y peligros derivados de la actividad por el responsable de SST y plasmarlos en la matriz de riesgos y peligros del proyecto, permisos de trabajo, listas de chequeo, concepto de actitud física, concepto medico del personal autorizado, certificados de TSA. Coordinador y/o vigia para Trabajo seguro en alturas Adicionalmente dar inicio a los demás anexos correspondientes al pliego de condiciones por parte del contratista tanto físicos como digitales en el diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por el responsable de SST Wilson Flores 98763657. inspector

09/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina principal Registrador
estuco plastico oficina FUNCIONARIOS proteccion Mobiliario
Aseo General personal obra 3 oficiales

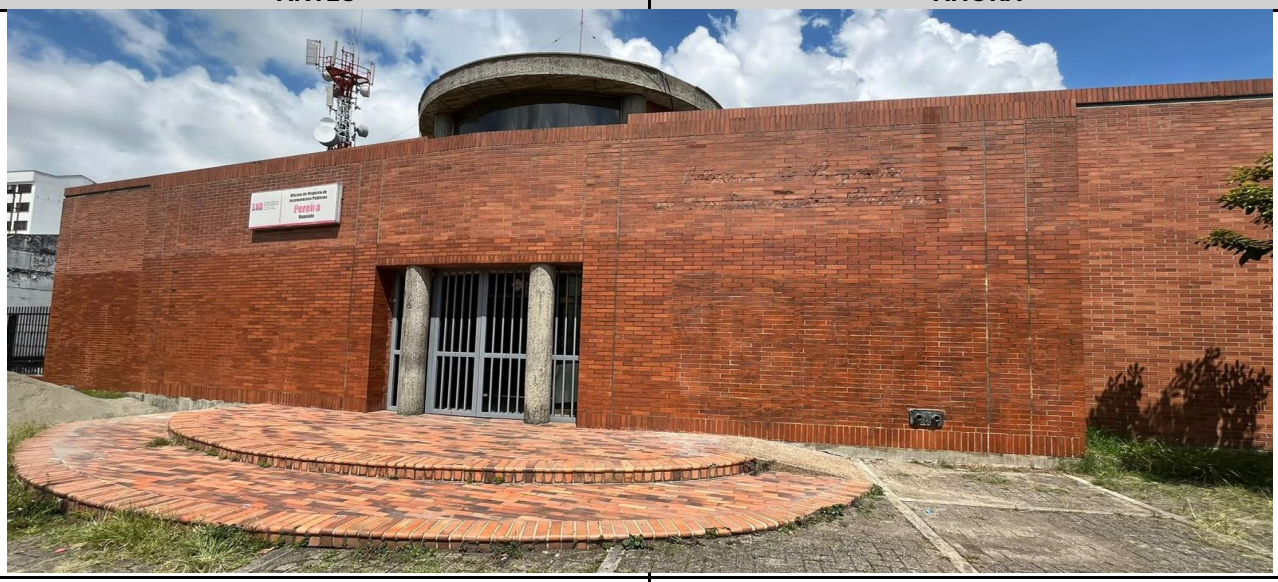
Inspector

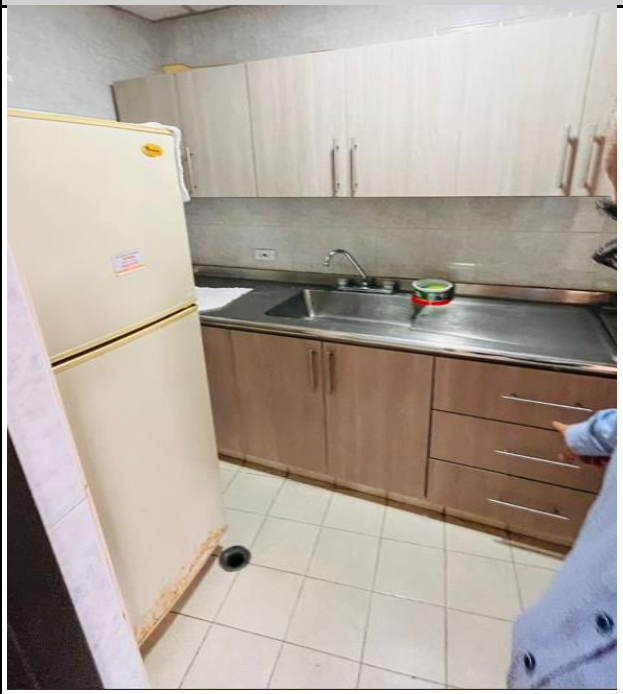
Anexo 20. Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP PEREIRA	
ANTES	AHORA
	
	

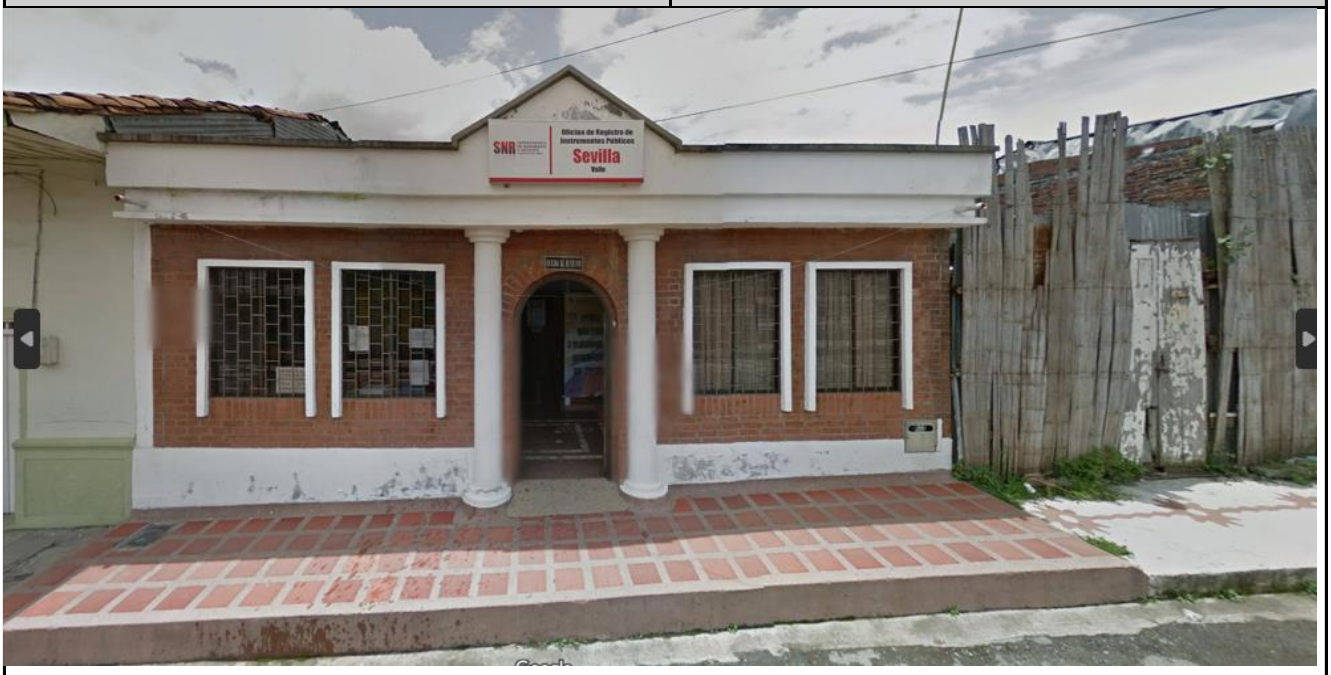
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP PEREIRA	
ANTES	**AHORA**
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP PEREIRA	
ANTES	**AHORA**
	
	

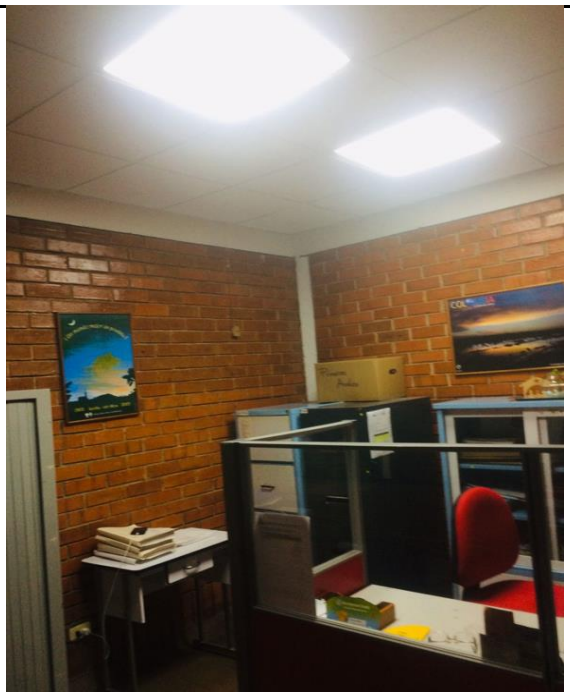
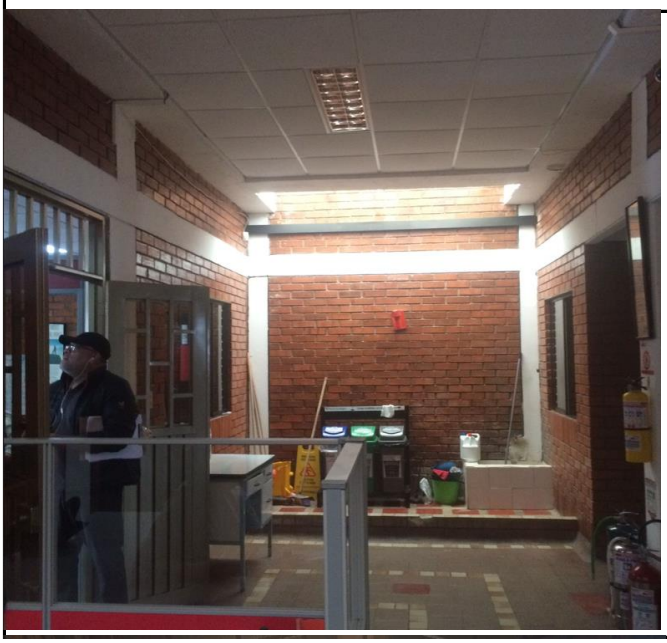
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP PEREIRA	
ANTES	AHORA
	
	

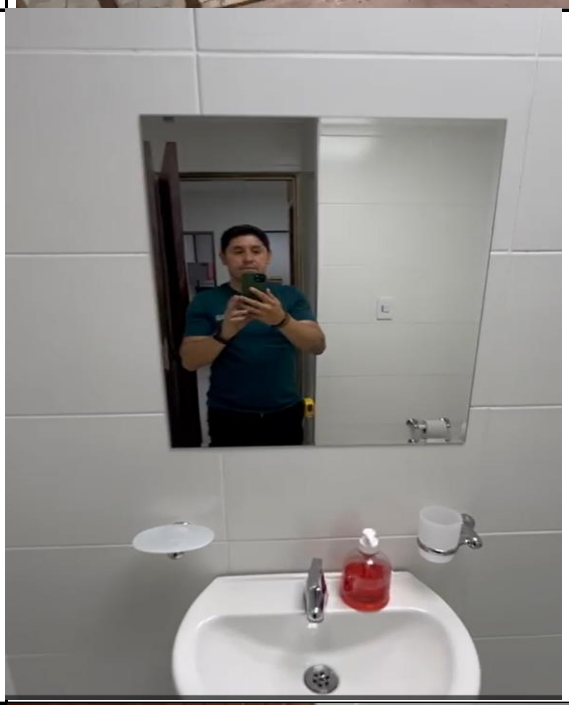
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP PEREIRA	
ANTES	AHORA
	
	

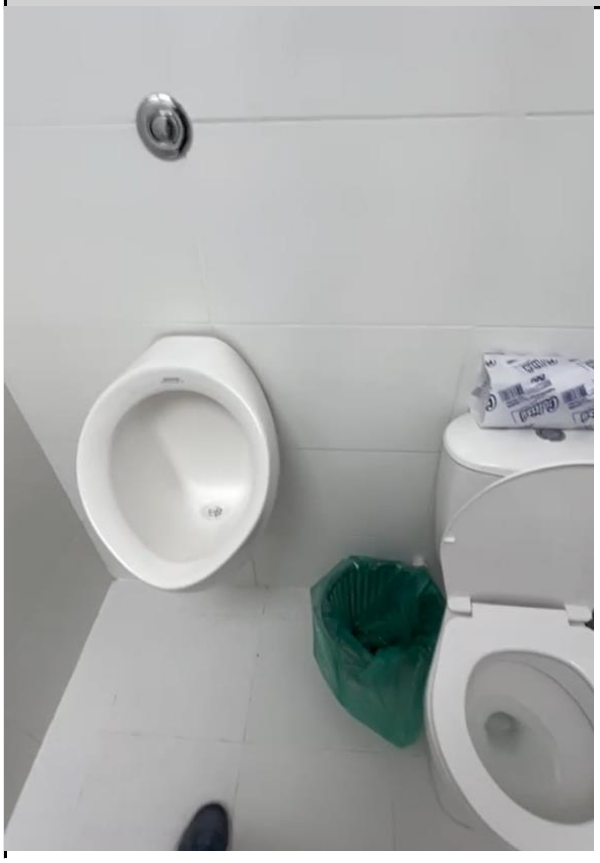
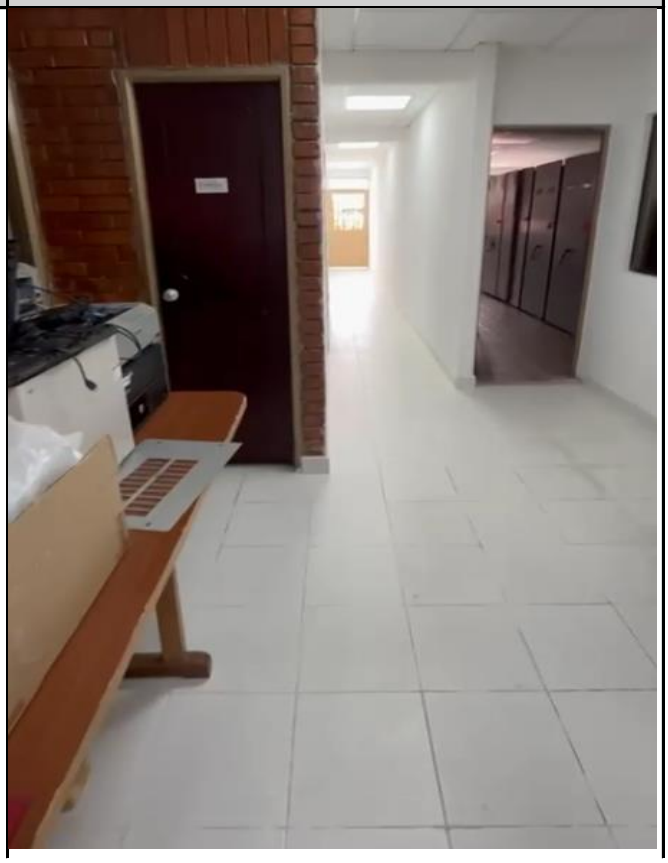
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP SEVILLA	
ANTES	AHORA

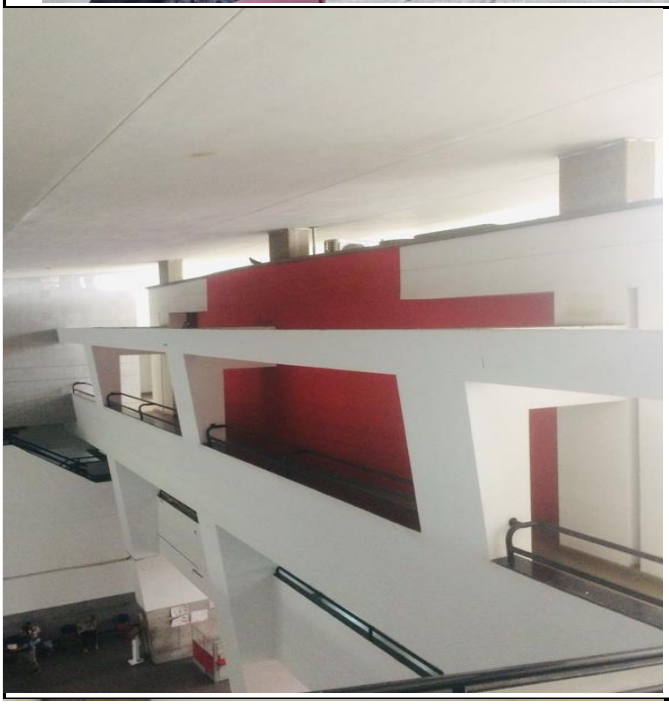


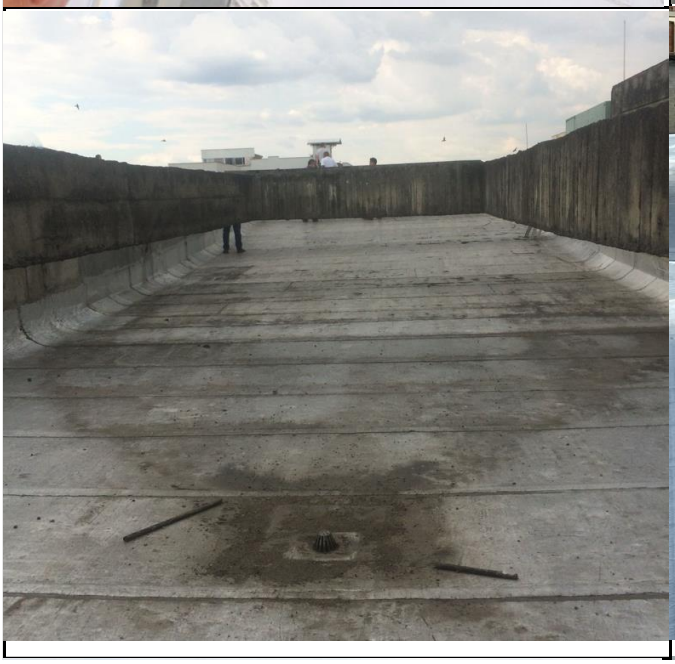


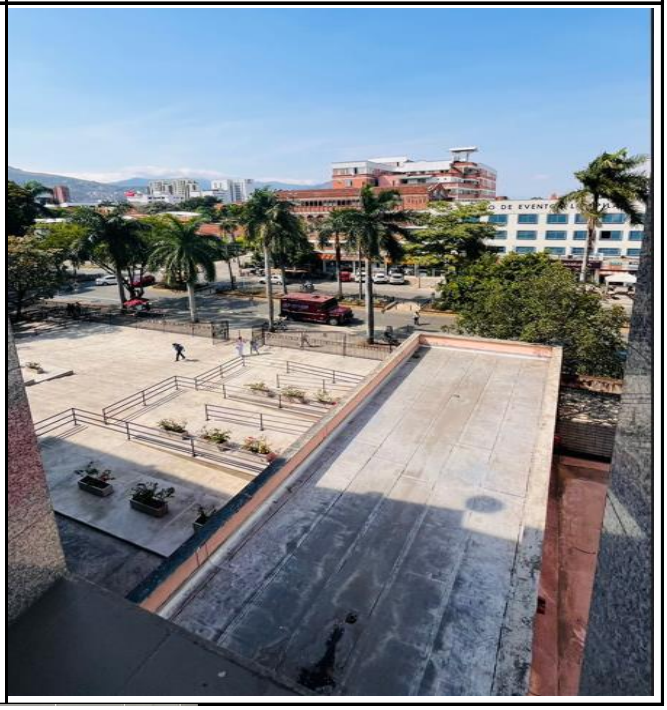
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP SEVILLA	
ANTES	AHORA
	
	
	

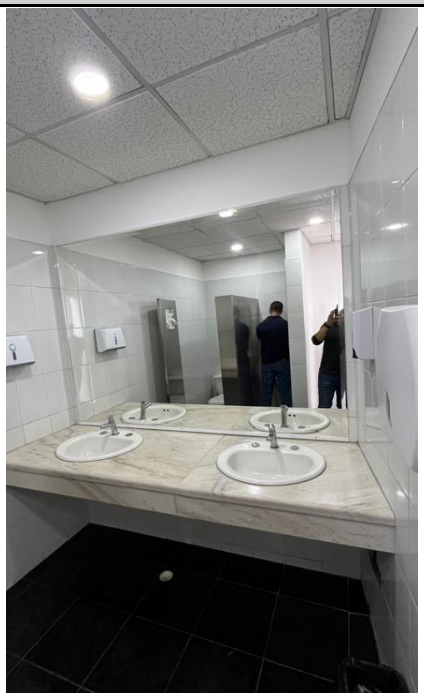
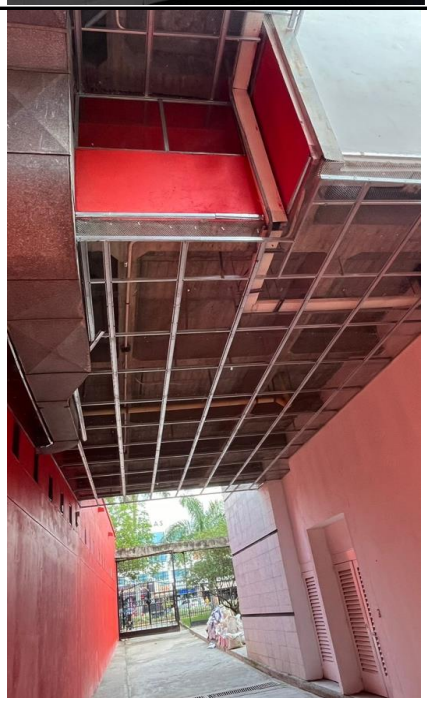
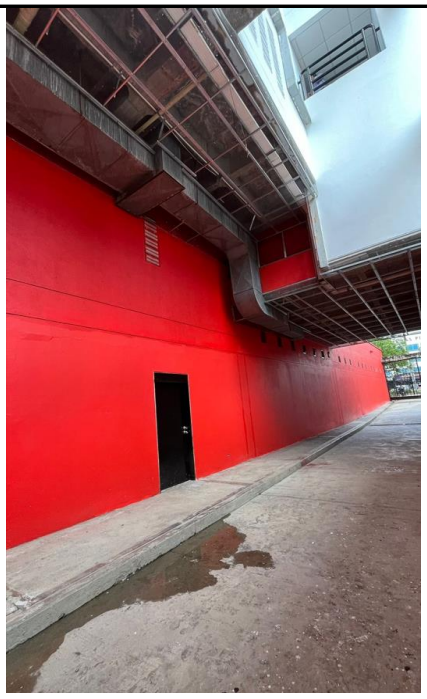
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP SEVILLA	
ANTES	AHORA
	
	

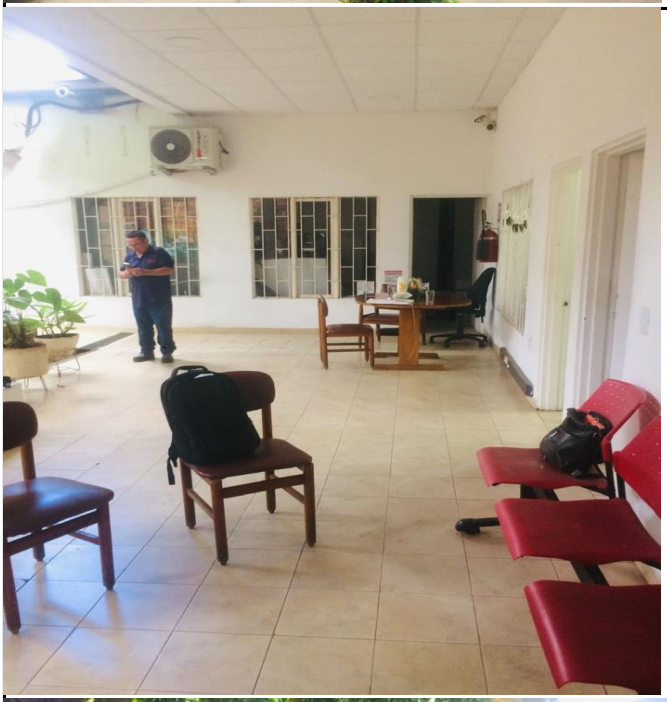
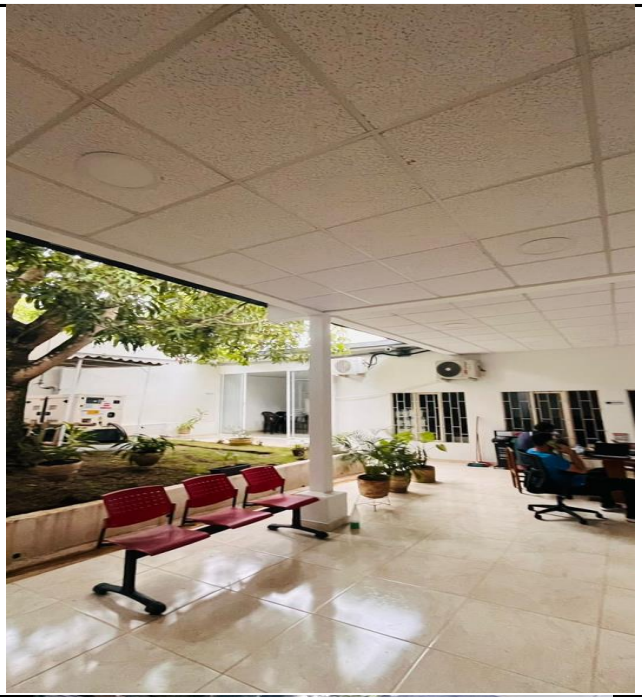
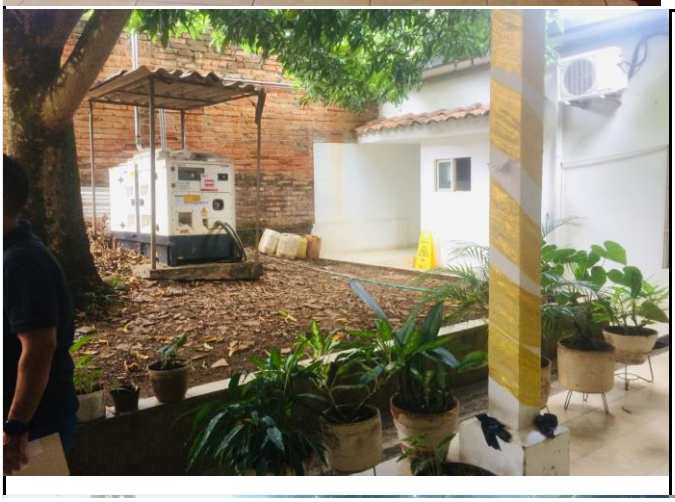
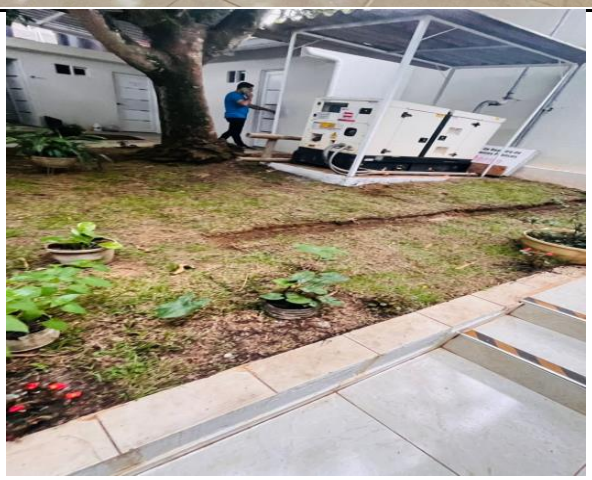
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP SEVILLA	
ANTES	AHORA
	

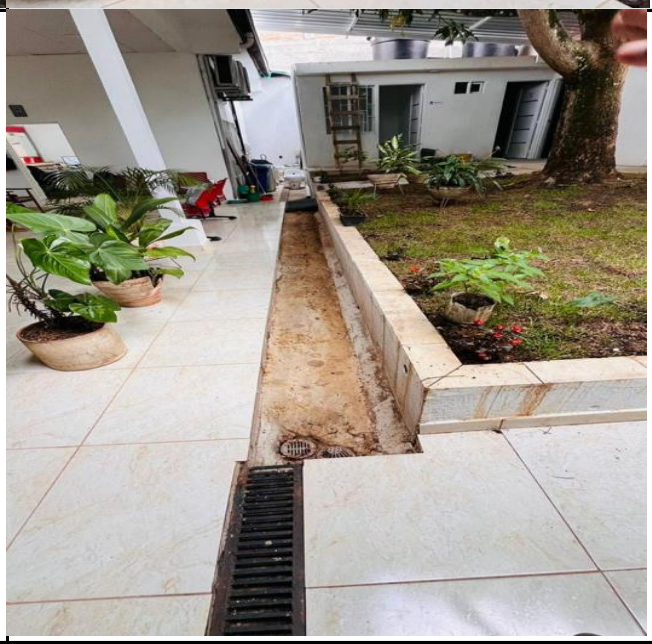
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP CALI	
ANTES	AHORA
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP CALI	
ANTES	AHORA
	
	


REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP CALI	
ANTES	AHORA
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP CALI	
ANTES	AHORA
 	
 	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP BORDO	
ANTES	AHORA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP BORDO	
ANTES	AHORA
	
	
	

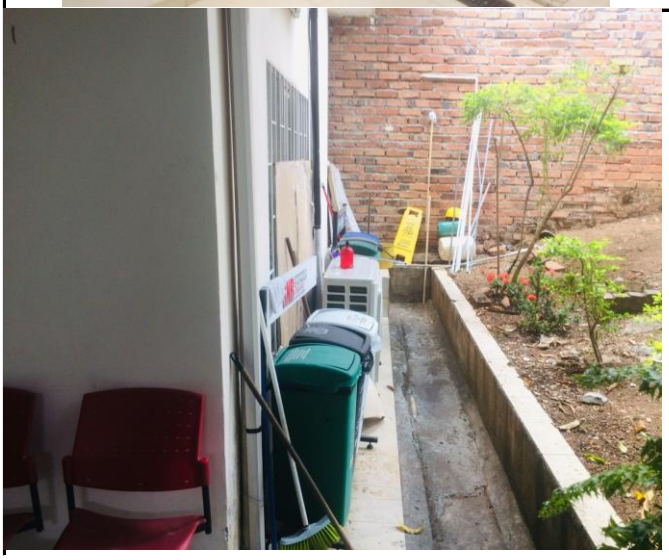
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP BORDO	
ANTES	AHORA

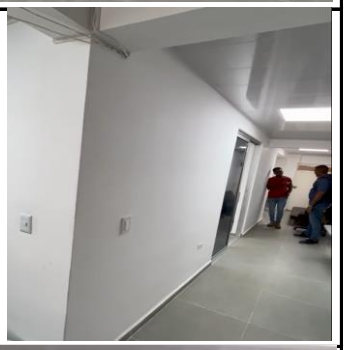




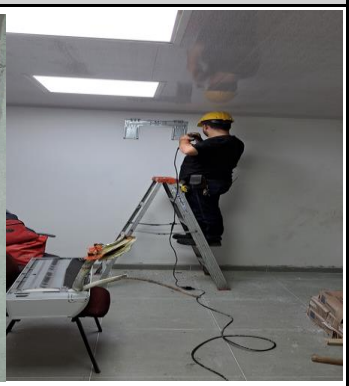


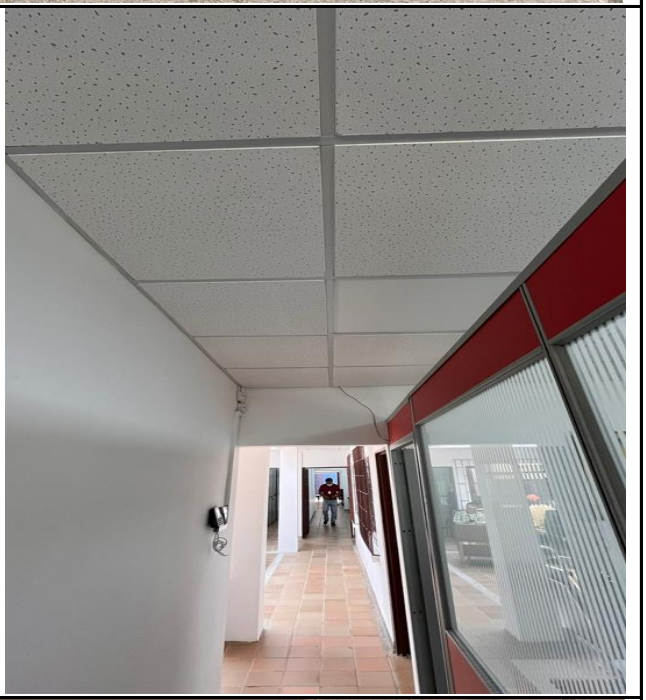


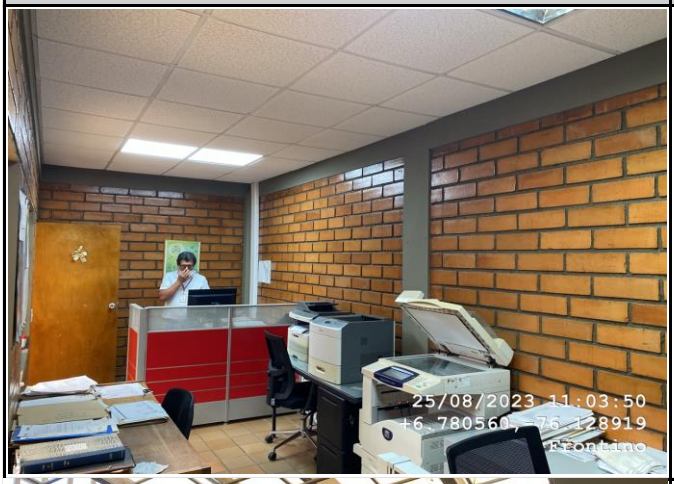
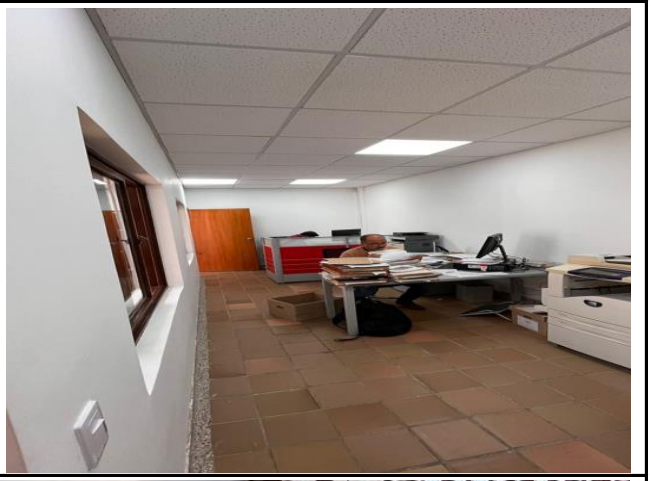
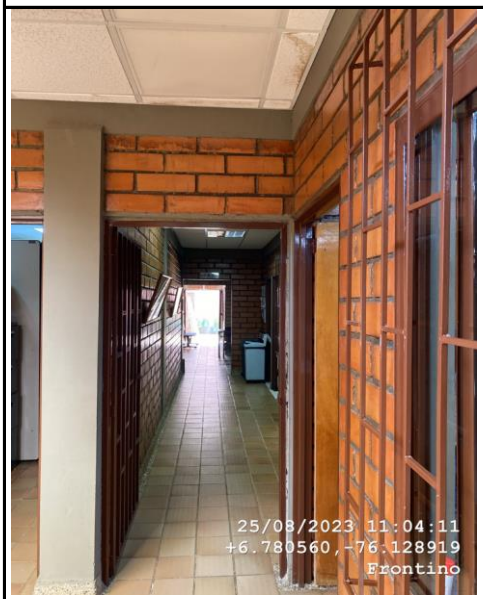

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP BORDO	
ANTES	AHORA
	
	

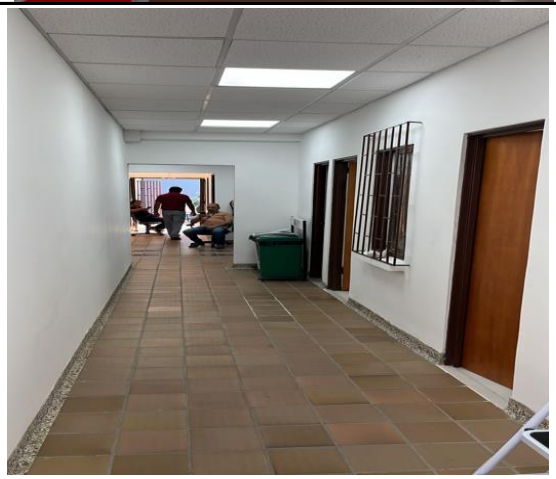
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP ISTMINA	
ANTES	AHORA
	
	
 	 
 	 

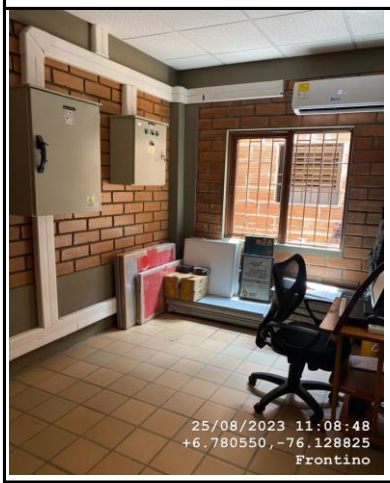
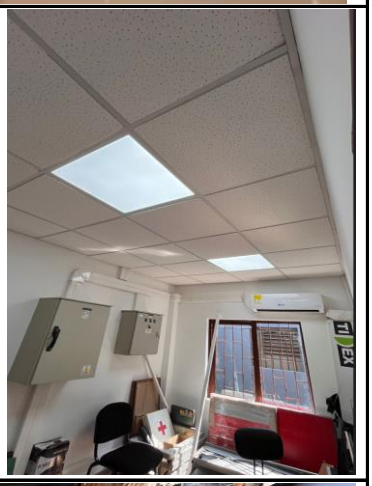
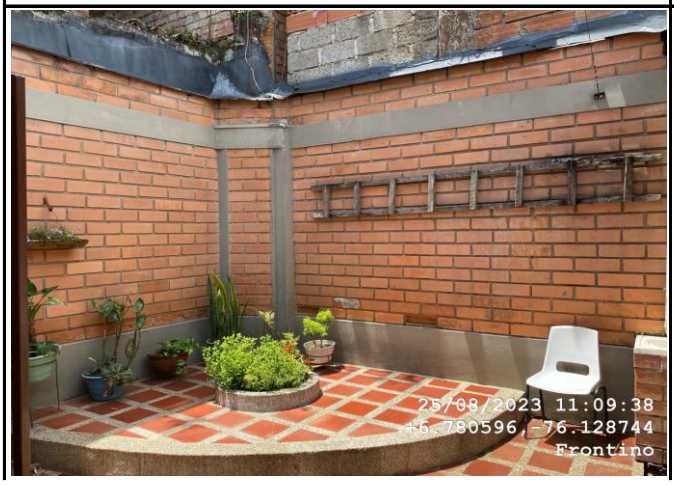
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP ISTMINA	
ANTES	AHORA
 	
 	
  	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP ISTMINA	
ANTES	AHORA
 	 

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP FRONTINO	
ANTES	AHORA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP FRONTINO	
ANTES	AHORA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP FRONTINO	
ANTES	AHORA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP FRONTINO	
ANTES	AHORA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
ORIP FRONTINO	
ANTES	AHORA
	
