ALCALDÍA DE SIBATÉ
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

MUNICIPIO DE SIBATE - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 001 DE 2024		
OBJETO:	REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA		
VALOR INICIAL:	$ 340.645.650,00	PLAZO INICIAL:	TRES MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 0,00	FECHA DE INICIO:	lunes, 5 de agosto de 2024
VALOR ADICIONAL 2:	$ 0,00	PRORROGA No.1:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 340.645.650,00	SUSPENCIÓN No.1	N/A
SUPERVISOR:	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	REINICIO No.1:	N/A
CONTRATISTA:	SONA INGENIEROS S,A,S,	FECHA DE TERMINACIÓN	lunes, 4 de noviembre de 2024
ACTA PARCIAL	No. 2	FECHA:	1 de octubre de 2024

SONA INGENIEROS SAS.
NIT : 901.447.989-6

En el Municipio de Sibaté - Cundinamarca, al (01) primer día de mes de octubre de 2024, se reunieron por parte de la Administración Municipal la supervisora designada del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 de 2024, Ing. Katherine Andrea Velasquez Bobadilla, identificado con cc No. 1.030.550.538 de Bogotá D.C., quien actua como Secretaria de Infraestructura, por otro lado el Ing. Jackson Soto Lopez, identificado con CC No. 79.519.740 de Bogota, quien actua como representante legal de la firma SONA INGENIEROS SAS, en calidad de Contratista de Obra, se reunen con el proposito de conciliar las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Septiembre de 2024.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					MODIFICACIONES CONTRATO				CORTE ACTA PARCIAL NO 1		CORTE ACTA PARCIAL NO 2		CORTE ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
					BALANCE DEL CONTRATO				ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
DESCRIPCIÓN	UND	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	200	$ 231.520,0	$ 46.304.000,00	0,00	0,00	200,00	46.304.000,00	100,94	$ 23.370.716,94	81,60	18.891.711,00			182,54	$ 42.262.428,29	17,46	4.041.572,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46	$ 34.324,0	$ 1.578.904,00	0,00	0,00	46,00	1.578.904,00	22,86	$ 784.646,64	3,74	128.372,00			26,60	$ 913.018,40	19,40	665.886,00
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	46	$ 218.759,0	$ 10.062.914,00	0,00	0,00	46,00	10.062.914,00	21,04	$ 4.602.689,36	1,52	332.514,00			22,56	$ 4.935.203,04	23,44	5.127.711,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	200	$ 1.408.573,0	$ 281.714.600,00	0,00	0,00	200,00	281.714.600,00	102,75	$ 144.737.496,04	80,44	113.303.661,00			183,19	$ 258.041.157,29	16,81	23.673.443,00
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	4	$ 246.308,0	$ 985.232,00	0,00	0,00	4,00	985.232,00	0,00	$ -	1,00	246.308,00			1,00	$ 246.308,00	3,00	738.924,00
			TOTAL COSTOS	340.645.650,00		TOTAL COSTOS		340.645.650,00		173.495.549,00		132.902.566,00		TOTAL COSTOS		306.398.115,00		34.247.536,00
			COSTOS DIRECTOS	256.124.548,87		COSTOS DIRECTOS		256.124.548,87		130.447.781,00		99.926.741,00		COSTOS DIRECTOS		230.374.522,56		25.750.026,00
			AIU (33%)	84.521.101,13		AIU (33%)		84.521.101,13		43.047.768,00		32.975.825,00		AIU (33%)		76.023.592,44		8.497.509,00
			TOTAL COSTOS	340.645.650,00		TOTAL COSTOS		340.645.650,00		173.495.549,00		132.902.566,00		TOTAL COSTOS		306.398.115,00		34.247.535,00

FIRMA

ING. JACKSON SOTO LOPEZ
R. L. SONA INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
ING. SERGIO ANDRES PÁEZ BELLO	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ
JEFE DE OFICINA DE INTERVENTORÍA Y VIAS	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
OCTUBRE DE 2024		

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	**ACTA No. 02**
1	M3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
TRAMO VIA AL PARAMO					
36	2,20	2,55	0,12	1	0,6732
37	2,95	12,10	0,12	1	4,2834
38	2,10	10,45	0,12	1	2,6334
39	3,95	3,35	0,12	1	1,5879
	1,00	1,01	0,12	1	0,1206
40	3,30	2,30	0,12	1	0,9108
41	5,57	5,04	0,12	1	3,3687
	1,00	0,64	0,12	1	0,0763
42	2,30	8,60	0,12	1	2,3736
43	16,00	6,30	0,12	1	12,0960
	1,00	0,44	0,12	1	0,0530
44	5,80	9,80	0,12	1	6,8208
45	1,23	1,21	0,12	1	0,1786
46	2,50	0,80	0,12	1	0,2400
47	9,90	2,30	0,12	1	2,7324
48	8,20	4,00	0,12	1	3,9360
49	6,40	2,10	0,12	1	1,6128
				SUB-TOTAL	**43,20**
				TOTAL	43,20

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez

Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	**ACTA No. 02**
1	M3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
Calle 5					
50	7,1	1,05	0,10	1,00	0,7455
51	2	2	0,10	1,00	0,2000
52	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
53	1,2	1,2	0,10	1,00	0,1440
54	1,87	1,36	0,10	1,00	0,2543
55	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
56	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
57	5	4	0,10	1,00	2,0000
58	5	2,5	0,10	1,00	1,2500
	5	4,5	0,10	1,00	2,2500
	1	1	0,10	1,00	0,1000
CALLE 3c					
59	3,3	3,5	0,23	1,00	2,6565
60	6,9	4,7	0,10	1,00	3,2430
				SUB-TOTAL	**14,90**
				TOTAL	58,10

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	**ACTA No. 02**
1	M3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
CALLE 6a					
61	8	2	0,10	1,00	1,6000
62	2,6	1,95	0,10	1,00	0,5070
CALLE 6 A abajo					
63	4	1,7	0,10	1,00	0,6800
64	5,3	1,8	0,10	1,00	0,9540
65	4,5	2,5	0,10	1,00	1,1250
66	2	2,15	0,10	1,00	0,4300
CALLE 4					
67	11,6	6,7	0,12	1,00	9,3264
	1	1,64	0,10	1,00	0,1640
				SUB-TOTAL	**14,46**
				TOTAL	72,56

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	**ACTA No. 02**
1	M3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total 0**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
TRAM0 CALLE 11 NO 10 20					
68	2,2	1,7	0,10	1,00	0,3740
calle 16 BARRIO SAN JUAN (PLAZA DE TOROS)ENTRE CALLE 8 Y DIAG 10					
69	2,37	3,1	0,10	1,00	0,3674
70	3,12	2,6	0,10	1,00	0,8112
71	5,15	5,65	0,13	1,00	3,7827
	1	1,44	0,13	1,00	0,1872
72	2,27	4,17	0,10	1,00	0,9466
73	2	3,2	0,10	1,00	0,6400
	1	0,44	0,10	1,00	0,0440
74	2,48	4,8	0,10	1,00	1,1904
75	2,25	2,08	0,10	1,00	0,4680
CALLE 13 FRENTE DI SIBATE					
76	2,7	2,56	0,10	1,00	0,6912
				SUB-TOTAL	**9,04**
				TOTAL	81,60

Realizo:

ING. JACKSON SOTO LOPEZ
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024


EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO		**PRELIMINARES**		
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
2	M3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO

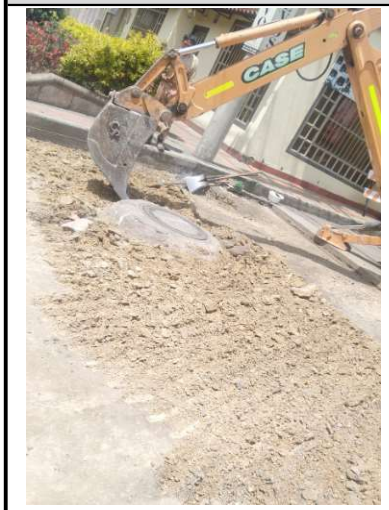



Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**		
CALLE 4					
67	4,2	6,7	0,12	1,00	3,3768
	2	0,6	0,30	1,00	0,3600
			SUB-TOTAL		3,74
			TOTAL		3,74

Realizo:

VoBo:

ING. JACKSON SOTO LOPEZ
Director de Obra

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

#¡DESBORDAMIENTO!

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
3	M3	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**		
CALLE 6					
59	3,3	3,5	0,10	1,00	1,1550
67	2	0,6	0,30	1,00	0,3600
				SUB-TOTAL	1,52
				TOTAL	1,52

Realizo:

ING. JACKSON SOTO LOPEZ
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
4	M3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
TRAMO VIA SAN JOSE LA UNION					
36	2,20	2,55	0,12	1	0,6732
37	2,95	12,10	0,12	1	4,2834
38	2,10	10,45	0,12	1	2,6334
39	3,95	3,35	0,12	1	1,5879
	1,00	1,01	0,12	1	0,1206
40	3,30	2,30	0,12	1	0,9108
41	5,57	5,04	0,12	1	3,3687
	1,00	0,64	0,12	1	0,0763
42	2,30	8,60	0,12	1	2,3736
43	16,00	6,30	0,12	1	12,0960
	1,00	0,44	0,12	1	0,0530
44	5,80	9,80	0,12	1	6,8208
45	1,23	1,21	0,12	1	0,1786
46	2,50	0,80	0,12	1	0,2400
47	9,90	2,30	0,12	1	2,7324
48	8,20	4,00	0,12	1	3,9360
49	6,40	2,10	0,12	1	1,6128
				SUB-TOTAL	**43,20**
				TOTAL	43,20

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez

Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO **PRELIMINARES**

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	
4	M3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO

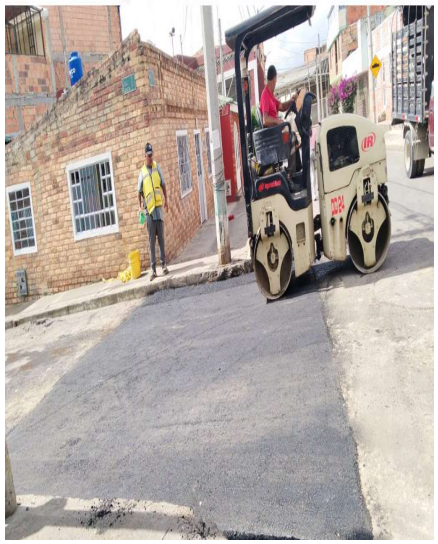



Localización	Dimensiones			CANT	total M3
	Longitud (m)	Ancho (m)	ESPESOR (m)		
Calle 5					
50	7,1	1,05	0,10	1,00	0,7455
51	2	2	0,10	1,00	0,2000
52	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
53	1,2	1,2	0,10	1,00	0,1440
54	1,87	1,36	0,10	1,00	0,2543
55	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
56	7,15	1,05	0,10	1,00	0,7508
57	5	4	0,10	1,00	2,0000
58	5	2,5	0,10	1,00	1,2500
	5	4,5	0,10	1,00	2,2500
	1	1	0,10	1,00	0,1000
CALLE 6					
59	3,3	3,5	0,13	1,00	1,5015
60	6,9	4,7	0,10	1,00	3,2430
				SUB-TOTAL	**13,74**
				TOTAL	56,94

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretario de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
4	M3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total M3**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
CALLE 6a					
61	8	2	0,10	1,00	1,6000
62	2,6	1,95	0,10	1,00	0,5070
CALLE 6 A abajo					
63	4	1,7	0,10	1,00	0,6800
64	5,3	1,8	0,10	1,00	0,9540
65	4,5	2,5	0,10	1,00	1,1250
66	2	2,15	0,10	1,00	0,4300
CALLE 4					
67	11,6	6,7	0,12	1,00	9,3264
	1	1,64	0,10	1,00	0,1640
				SUB-TOTAL	**14,46**
				TOTAL	71,40

Realizo:

Ing. Jackson Soto Lopez
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretario de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO	**PRELIMINARES**			
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
4	M3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total 0**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**ESPESOR (m)**		
TRAM0 CALLE 11 NO 10 20					
68	2,2	1,7	0,10	1,00	0,3740
calle 16 BARRIO SAN JUNA (PLAZA DE TOROS)ENTRE CALLE 8 Y DIAG 10					
69	2,37	3,1	0,10	1,00	0,3674
70	3,12	2,6	0,10	1,00	0,8112
71	5,15	5,65	0,13	1,00	3,7827
	1	1,44	0,13	1,00	0,1872
72	2,27	4,17	0,10	1,00	0,9466
73	2	3,2	0,10	1,00	0,6400
	1	0,44	0,10	1,00	0,0440
74	2,48	4,8	0,10	1,00	1,1904
75	2,25	2,08	0,10	1,00	0,4680
CALLE 13 FRENTE DI SIBATE					
76	2,7	2,56	0,10	1,00	0,6912
				SUB-TOTAL	**9,04**
				TOTAL	80,44

Realizo:

ING. JACKSON SOTO LOPEZ
Director de Obra

VoBo:

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**

Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

CONTRATO DE OBRA No.01 de 2024


NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:SONA INGENIEROS SAS

CAPITULO		**PRELIMINARES**		
Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**	
5	UN	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)		**ACTA No. 02**

REGISTRO FOTOGRAFICO

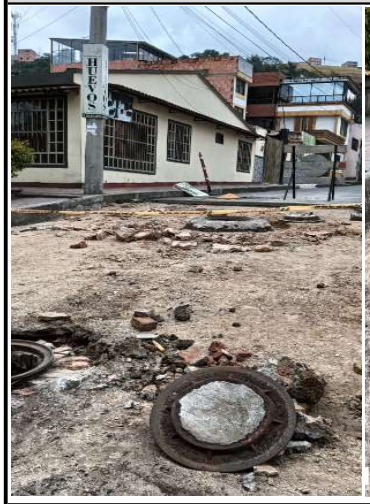

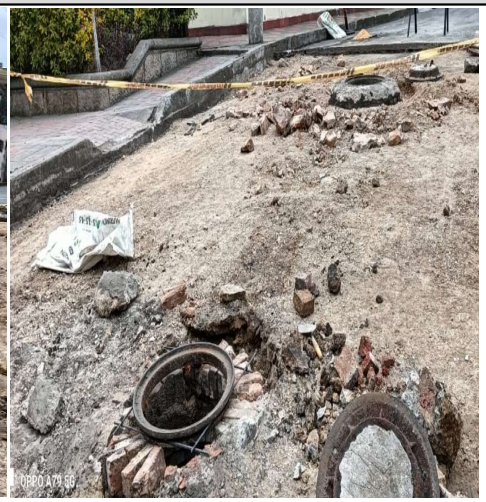

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**total UN**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**		
CALLE 4					
67				1,00	1,0000
				SUB-TOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

Realizo:

VoBo:

ING. JACKSON SOTO LOPEZ

Director de Obra

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

Secretaria de Infraestructura
