**FORMATO**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de 2 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL** | | | **FECHA:** | 12/07/2024 |
| **Semana No** | **6** | **Del :** | 6/07/2024 | AL: | 12/07/2024 |
| **Plazo Total** | | 558 | días | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | 37 | días | | |
| **porcentaje del tiempo transcurrido(%)** | | 6,63% | | | |
| **Nombre del Supervisor :** | | Gisell Sanchez Pastrana | | | |

**OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA**

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPUERTARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

**CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **(%) Programado** | **1,44%** | **6,82%** | **(%) Ejecutado** | **1,06%** | **2,38%** |
| **Valor programado ($)** | **$ 28.749.600,94** | **$ 136.161.304,43** | **Valor ejecutado ($)** | **$ 21.162.900,69** | **$ 47.516.701,55** |
| | | | **Evaluación** | **Porcentaje Adelanto** | **-4,44%** |
| | | | | **Valor Adelanto** | **-$ 88.644.602,89** |

**DATOS CONTRACTUALES**

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | ABILE SAS | **Contratista:** | CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024 |
| **Contrato No:** | 23001186 H4 DE 2023 | **Contrato No:** | 23001301 H3 DE 2023 |
| **Valor Inicial:** | $ 1.996.500.065 | **Valor Inicial:** | $ 1.117.574.559 |
| **Valor Actualizado al modificatorio :** | NA | **Valor Actualizado al modificatorio :** | NA |
| **Valor actualizado 2:** | NA | **Valor actualizado 2:** | NA |
| **Plazo inicial:** | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025 | **Plazo inicial:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Plazo actualizado:** | NA | **Plazo actualizado:** | NA |
| **Fecha de iniciación:** | 5-jun-24 | **Fecha de iniciación:** | 5-jun-24 |
| **Fecha de vencimiento:** | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025 | **Fecha de vencimiento:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Modificatorio No. Prórroga No.** | NA | **Modificatorio No. Prórroga No.** | NA |
| **Fecha de Terminación Según Prórroga No.** | NA | **Fecha de Terminación Según Prórroga No.** | NA |
| **Suspensión No.** | NA | **Suspensión No.** | NA |
| **Periodo de Suspensión No.** | NA | **Periodo de Suspensión No.** | NA |
| **Levantamiento de la suspensión No.** | NA | **Levantamiento de la suspensión No.** | NA |
| **Nueva fecha de terminación** | NA | **Nueva fecha de terminación** | NA |
| **Valor total actual del contrato** | $ 1.996.500.065 | **Valor total actual del contrato** | $ 1.117.574.559 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Se realiza visita técnica por parte de profesionales de apoyo a la supervisión de la Aerocivil, director de interventoría, director de obra y personal de campo de las partes.
Se realiza comité el 11 de julio, se hace énfasis en la entrega de informes mensual y semanal, y de entrega de diagnostico de plan de trabajo, se estable como fecha de entrega el 12/07/2024.

**OBRAS LADO TIERRA**

Retiro de canoa de aguas lluvias en zona de salida a plataforma.
Aplicación de Pintura vinilo en paredes.
Mantenimiento de zonas verdes contiguas a terminal de pasajeros.

**AVANCE DE OBRA**
Retiro de canoa de aguas lluvias en zona de salida a plataforma.
Aplicación de Pintura vinilo en paredes.
Mantenimiento de zonas verdes


**FINANCIERO:**
A la fecha no se han generado pagos parciales.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas: Sin actividades ambientales.

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**
Sin actividades.

**PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| **Personal de Interventoría** | **4** |
| **Personal del Contratista** | **10** |
| **Total Personal en Obra** | **14** |

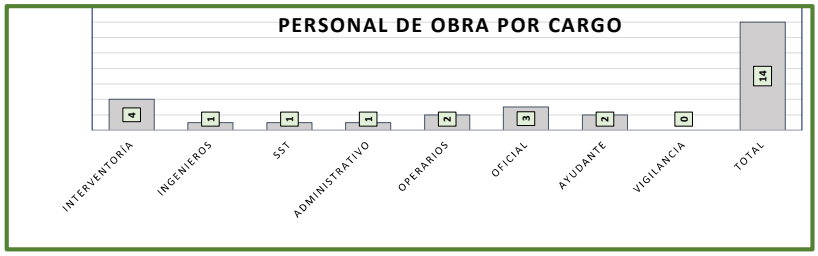


En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

**FORMATO**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de 2 |
|---|---|---|---|---|




En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

**RELACION MAQUINARIA**

| TIPO | CONTRACTUAL | ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| GUADAÑADORA | | 1 | |
| ESCALERA | | 1 | |
| ANDAMIOS | | 3 | |
| HIDROLAVADORA | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total Maquinaria** | | 6 | |

**AVANCE FINANCIERO DE OBRA**

| Acta Parcial de Obra No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| **Total Acumulado** | | |

| AVANCE FINANCIERO |
|---|
| **Valor Total Contrato Obra** |
| **$ 1.996.500.065,00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 0,00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **0,00%** |

**AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA**

| Acta Parcial de interventoria No. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Valor Total Contrato interventoria** | |
| 2 | | | **$ 1.117.574.559,00** | |
| 3 | | | **Valor facturado Contrato Interventoria** | |
| 4 | | | **$ 0,00** | |
| 5 | | | **% Avance facturado Acumulado** | |
| 6 | | | **0,00%** | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| **Total Acumulado** | | | | |

**OBSERVACIONES**

Se cuenta con personal en campo para las actividades de mantenimiento, se hace atención a las prioritarias como retiro de canaleta de aguas lluvias dañada, paisajismo, y se inicia procer ciclo de pintura.
Se requiere la entrega de documentación como informes semanales, mensual y diagnostico y plan de trabajo.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ**
